USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA**

**SEMANA No.:** 33 DEL DÍA 01 MES 02 AÑO 2021 AL DÍA 07 MES 02 AÑO 2021

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

**OBJETO:**

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTOS, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC, QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 4.

**CONTRATO No.:** 140 de 2020

Supervisor USPEC: CATALINA MEDINA HERNANDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión: N/A

| Contrato de Obra: | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 12.942.773.152 |
| Valor Adicional | $ - |
| Valor Actualizado | $ 12.942.773.152 |
| Plazo Inicial | 6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero |
| Plazo prorroga | 2 meses |
| Plazo Actualizado | 8,3 meses |
| Fecha Inicio | 23 de junio de 2020 |
| Fecha Terminación Inicial | 31 de diciembre de 2020 |
| Fecha Terminación Actual | 28 de febrero de 2021 |

| Contrato de Interventoría: | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 4.550.689.198 |
| Valor Adicional | $ 561.610.123 |
| Valor Actualizado | $ 5.112.299.321 |
| Plazo Inicial | 6,3 meses Hasta el 31 de diciembre de 2020 o al agotamiento de los recursos, lo que suceda primero |
| Plazo Prorroga | 2 meses |
| Plazo Actualizado | 8,3 meses |
| Fecha Inicio | 16 de junio de 2020 |
| Fecha Terminación Inicial | 31 de diciembre de 2020 |
| Fecha Terminación Actual | 01 de marzo de 2021 |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

| PROGRAMADO | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | MENSUAL | ACUMULADO |
| PAC Programado (%) | 14,24% | 42,93% |
| Valor del PAC Programado ($) | $ 1.843.375.669,00 | $ 5.556.543.381,71 |

| FACTURADO | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | MENSUAL | ACUMULADO |
| PAC Programado (%) | 14,24% | 42,93% |
| Valor del PAC Programado ($) | $ 1.843.375.669,00 | $ 5.556.543.381,71 |

## OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EPMSC ERE CALI** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **COLISEO** | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 469.185.442 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 469.185.442 |
| **SANIDAD (AREA DE FISIOTERAPIA)** | $ 89.372.196,00 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 24,13% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 7,39% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 21.565.511 | $ 89.372.196 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 6.604.605 | $ 89.372.196 |
| **TUNEL DE ACCESO A SANIDAD** | $ 80.533.118,00 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 80.533.118 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 80.533.118 |
| **PATIO 10** | $ 258.832.405,00 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 34,93% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 25.883.241 | $ 90.410.159 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **RM POPAYÀN** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **BODEGA EXTERIOR** | $ 182.121.141,00 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 182.121.141 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 182.121.141 |
| **SANIDAD** | $ 9.164.202,00 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 9.164.202 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 9.164.202 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BODEGA** | $ 12.415.369,00 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 12.415.369 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 12.415.369 |
| **RANCHO** | $ 60.128.279,00 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 3,85% | 49,16% | Actividades Ejecutadas (%) | 3,00% | 5,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 2.314.939 | $ 29.559.062 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.803.848 | $ 3.006.414 |
| **EPAMS CAS ERE POPAYÁN** | | | | | |
| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **PABELLON 8 (DESMANES)** | $ 111.957.143 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 99,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 111.957.143 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 110.837.572 |
| **CELDAS PRIMARIAS** | $ 279.988.062 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 98,50% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 279.988.062 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 275.788.241 |
| **EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA)** | $ 203.758.579 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 203.758.579 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 203.758.579 |
| **PABELLON 2 (DESMANES)** | $ 185.941.463 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 16,67% | 56,07% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 30.996.442 | $ 104.257.378 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **PABELLON 4 (DESMANES)** | $ 126.432.507 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,25% | 6,25% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 7.902.032 | $ 7.902.032 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS)** | $ 35.330.288 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,00% | 98,23% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 35.330.288 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 353.303 | $ 34.704.942 |
| **PABELLON 12 (DESMANES) - CUBIERTA** | $ 188.518.451 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 7,69% | 46,15% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 14.497.069 | $ 87.001.265 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 188.518.451 |
| **EPMSC PUERTO TEJADA** | | | | | |
| | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **BAÑO RANCHO** | $ 5.196.492 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 90,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 5.196.492 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 4.676.843 |
| | SEMANAL | ACUMULADO | | | |
| **BIBLIOTECA** | $ 29.984.511 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 90,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 29.984.511 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 26.986.060 |
| **RANCHO** | $ 60.611.261 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 12,50% | 67,45% | Actividades Ejecutadas (%) | 10,00% | 39,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 7.576.408 | $ 40.882.296 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 6.061.126 | $ 23.638.392 |

**EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO**

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **AISLAMIENTO (UTE)** | $ 21.636.858 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 25,00% | 85,60% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 5.409.215 | $ 18.521.150 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **AULAS EDUCATIVAS** | $ 96.333.459 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 52,62% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 96.333.459 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 50.690.666 |

**EPMSC BOLÍVAR CAUCA**

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUDITORIO** | $ 133.367.596 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,27% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 133.367.596 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.693.768 | $ 133.367.596 |
| **CONYUGALES UTE** | $ 63.336.604 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 5,88% | 30,59% | Actividades Ejecutadas (%) | 5,00% | 5,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 3.724.192 | $ 19.374.667 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 3.166.830 | $ 4.816.673 |

**EPMSC EL BORDO**

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SANIDAD** | $ 32.909.779 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 32.909.779 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 32.909.779 |
| **CELDAS COLECTIVAS** | $ 30.326.253 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 30.326.253 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 30.326.253 |
| **CELDAS PRIMARIAS** | $ 25.839.150 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 20,00% | 84,56% | Actividades Ejecutadas (%) | 10,00% | 54,22% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 5.167.830 | $ 21.849.585 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 2.583.915 | $ 17.843.682 |
| **RANCHO** | $ 82.818.186 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 45,76% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 8.281.819 | $ 37.897.602 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |

**EPMSC SILVIA**

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **TALLERES** | $ 36.435.423 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 36.435.423 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 364.354 | $ 36.435.423 |
| **BODEGA TALLERES** | $ 3.187.230 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 3.187.230 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 3.187.230 |
| **BODEGA SANIDAD** | $ 8.046.817 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 8.046.817 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 3.187.230 |
| **SANIDAD** | $ 8.775.832 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 8.775.832 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AMPLIACIÓN SANIDAD** | $ 32.070.451 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 14,20% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 4.554.004 | $ 32.070.451 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **REFORZAR SEGURIDAD PATIO** | $ - | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **CELDAS COLECTIVAS** | $ - | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **BATERIAS SANITARIAS DEL UNICO PATIO** | $ - | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **EPMSC - RM PASTO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **CAPILLA** | $ 89.086.568,00 | | | | | $ 570.229.101 |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | | 90,10% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 89.086.568 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 80.266.998 |
| **TALLERES** | $ 397.461.217,00 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 1,20% | 66,30% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 397.461.217 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 4.769.535 | $ 263.516.787 |
| **CELDA 1 - RM** | $ 21.473.392 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 21.473.392 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 21.473.392 |
| **CELDA 2 - RM** | $ 16.324.773 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 88,30% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 16.324.773 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 14.414.775 |
| **PATIO 2 (EMERGENCIA)** | $ 65.343.688 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 65.343.688 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 65.343.688 |
| **CELDAS HOMBRES** | $ 39.107.941 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 39.107.941 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 39.107.941 |
| **SANIDAD HOMBRES** | $ 200.580.598 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 2,00% | 2,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 200.580.598 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 4.011.612 | $ 4.011.612 |
| **PATIO 5 Y 6** | $ 277.254.177 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 277.254.177 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **SANIDAD MUJERES** | $ 58.042.336 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 8,33% | 50,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 41,40% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 4.834.927 | $ 29.021.168 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 24.029.527 |
| **ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3)** | $ 33.809.914 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 33.809.914 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 33.809.914 |
| **ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO** | $ 25.942.744 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,67% | 12,22% | | Actividades Ejecutadas (%) | 7,00% | 17,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.730.381 | $ 3.170.203 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.815.992 | $ 5.747.685 |
| **EMERGENCIA PATIO 4** | $ 342.718.171 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 8,33% | 50,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 2,20% | 5,40% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 28.548.424 | $ 171.359.086 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 7.539.800 | $ 18.506.781 |

| EPMSC TUMACO | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATIVAS | $ 198.988.490 | | | | $ 364.977.589,00 |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 198.988.490 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 198.988.490 |
| PATIO CENTRAL | $ 62.176.240 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 62.176.240 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 62.176.240 |
| PATIOS (DESMANES) | $ 92.746.485 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 92.746.485 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 92.746.485 |
| MURO EXTERIOR | $ 11.066.374 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 11.066.374 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 11.066.374 |
| **EPMSC TUQUERRES** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES | $ 233.768.115 | | | | $ 177.268.840,542 |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,30% | 48,40% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 233.768.115 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 3.038.985 | $ 113.143.768 |
| ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES) | $ 98.197.644 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 30,95% | 30,95% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 30.392.171 | $ 30.392.171 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM | $ 115.401.431 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,20% | 40,80% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 115.401.431 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.384.817 | $ 47.083.784 |
| ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS | $ 121.642.050 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 7,14% | 14,29% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 9,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 8.685.242 | $ 17.382.649 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 10.947.785 |
| SANIDAD HOMBRES | $ 36.664.389 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 8,33% | 31,03% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 8,80% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 3.054.144 | $ 11.376.960 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 3.226.466 |
| RANCHO | $ 46.307.503 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 12,50% | 12,50% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,00% | 4,20% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 5.788.438 | $ 5.788.438 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 463.075 | $ 1.944.915 |
| PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES | $ 160.220.935 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 42,62% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 16.022.094 | $ 68.286.162 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| PATIO Y COLECTIVAS MUJERES | $ 76.843.598 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,20% | 1,20% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 922.123 | $ 922.123 |
| **EPMSC IPIALES** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES) | $ 216.167.719 | | | | $ 209.284.472,93 |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,40% | 38,50% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 216.167.719 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 3.026.348 | $ 83.224.572 |
| ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS) | $ 148.217.753 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 1,10% | 17,90% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 148.217.753 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.630.395 | $ 26.530.978 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECLUSORIO MUJERES** | $ 129.064.593 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 8,33% | 36,67% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 10.751.081 | $ 47.327.986 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **ALOJAMIENTO AISLAMIENTO** | $ 36.018.808 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | | 48,70% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 36.018.808 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 17.541.159 | |
| **PRIMARIAS** | $ 117.541.723 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 3,90% | 50,50% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 117.541.723 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 4.584.127 | $ 59.358.570 | |
| **BAÑOS PATIOS** | $ 279.956.057 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 5,60% | 29,74% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 15.677.539 | $ 83.258.931 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **SANIDAD** | $ 57.727.535 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 39,20% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 57.727.535 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 22.629.194 | |
| **RANCHO** | $ 112.123.554 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **EPMSC LA UNION** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | |
| **SANIDAD** | $ 106.655.228 | | | | $ 27.566.367 | |
| Actividades Programadas (%) | 5,13% | 26,37% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 5.471.413 | $ 28.124.984 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES)** | $ 46.881.576 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 2,60% | 58,80% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 46.881.576 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 1.218.921 | $ 27.566.367 | |
| **AISLAMIENTO GUARDIAS + UT** | $ 50.399.271 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 16,67% | 51,53% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 8.401.558 | $ 25.970.744 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **RANCHO** | $ 42.476.595 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 3,85% | 3,85% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.635.349 | $ 1.635.349 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **PATIO COLECTIVO** | $ 20.542.234 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 11,36% | 36,36% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 2.333.598 | $ 7.469.156 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO** | $ 13.519.222 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 14,29% | 45,12% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.931.897 | $ 6.099.873 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **PATIO COMÚN BATERÍA** | $ 42.440.317 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,67% | 6,67% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 2.830.769 | $ 2.830.769 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - | |
| **EPMSC TULUA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | |
| **RANCHO ANTIGUO** | $ 140.143.499 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 8,95% | 94,600% | |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 140.143.499 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 12.542.843 | $ 132.575.750 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PABELLON 6** | $ 15.595.903 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 15.595.903 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 15.595.903,0 |
| **PABELLON 7** | $ 11.262.583 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 11.262.583 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 11.262.583,0 |
| **EPMSC PALMIRA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **PABELLON No 7** | $ 386.208.686 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 1,56% | 94,92% | Actividades Ejecutadas (%) | 10,00% | 92,10% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 6.024.856 | $ 366.589.285 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 38.620.869 | $ 355.698.200 |
| **PABELLON No 4** | $ 105.731.591 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 97,950% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 105.731.591 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 103.564.093 |
| **EPMSC BUENAVENTURA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **AULAS EDUCATIVAS** | $ 143.132.032 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 6,45% | 95,85% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 143.132.032 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 9.232.016 | $ 137.192.053 |
| **SANIDAD** | $ 171.531.486 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 8,33% | 87,69% | Actividades Ejecutadas (%) | 3,80% | 19,75% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 14.288.573 | $ 150.415.960 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 6.518.196 | $ 33.877.468 |
| **AISLAMIENTO MUJERES** | $ 42.432.237 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 55,18% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 4.243.224 | $ 23.414.108 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **RANCHO** | $ 90.610.246 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 86,01% | Actividades Ejecutadas (%) | 25,00% | 66,000% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 9.061.025 | $ 77.933.873 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 22.652.561,5 | $ 59.802.762 |
| **REDES ELECTRICAS** | $ 104.459.837 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 10,00% | 20,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 10.445.984 | $ 20.891.967 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE** | $ 26.510.628 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 7,14% | 12,70% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.892.859 | $ 3.366.850 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **AISLAMIENTO GUARDIAS** | $ 45.113.987 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **COJAM JAMUNDI** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **PATIO 5** | $ 151.430.305 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 3,70% | 14,57% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 5.602.921 | $ 22.063.395 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **PATIO 2-UTE Y CONYUGALES** | $ 273.317.964 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 3,57% | 85,36% | Actividades Ejecutadas (%) | 8,45% | 27,55% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 9.757.451 | $ 233.304.214 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 23.095.368,0 | $ 75.299.099,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATIO 3-UTE Y CONYUGALES** | $ 344.229.661 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,25% | 68,79% | | Actividades Ejecutadas (%) | 6,35% | 19,45% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 21.514.354 | $ 236.795.584 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 21.858.583,5 | $ 66.952.669,1 |
| **PATIO 4-UTE Y CONYUGALES** | $ 292.045.460 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 3,70% | 45,9% | | Actividades Ejecutadas (%) | 26,50% | 61,28% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 10.805.682 | $ 133.961.253 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 77.392.046,9 | $ 178.965.457,9 |
| **GARITAS Y TRINCHERAS** | $ 96.828.303 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 96.828.303 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **EPMSC CAICEDONIA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **BIBLIOTECA** | $ 13.214.834 | | | | | $ 80.506.283,8 |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,0000% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 13.214.834 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 13.214.834 |
| **AULA EDUCATIVA** | $ 39.058.025 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 99,85% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 39.058.025 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 38.999.438 |
| **SANIDAD** | $ 28.491.452 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,0000% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 99,30% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 28.491.452 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ 28.292.012 |
| **EPMSC CARTAGO** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **AULAS EDUCATIVAS** | $ 141.145.561 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,0000% | | Actividades Ejecutadas (%) | 12,50% | 98,16% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 141.145.561 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 17.643.195,1 | $ 138.548.482,7 |
| **PATIO 4** | $ 78.825.272 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,10% | 51,56% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 4.808.342 | $ 40.642.310 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **EPMSC SEVILLA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **RANCHO** | $ 23.838.150 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 2,00% | 99,45% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 23.838.150 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 476.763,0 | $ 23.707.040,2 |
| **ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER)** | $ 36.587.412 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 12,50% | 49,41% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 4.573.427 | $ 18.077.840 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **BIBLIOTECA** | $ 59.675.771 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 12,50% | 97,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 59.675.771 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 7.459.471,4 | $ 57.885.497,9 |
| **SANIDAD** | $ 23.624.972 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 6,51% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,0% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.537.986 | $ 23.624.972 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **PATIO 4 (BAÑO)** | $ 12.885.805 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 1,50% | 98,50% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 12.885.805 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 193.287,1 | $ 12.692.517,9 |
| **EPMSC BUGA** | **SEMANAL** | **ACUMULADO** | | | **SEMANAL** | **ACUMULADO** |
| **CUARTO HOSPITALIZACION SANIDAD** | $ 34.172.663 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 7,14% | 31,1% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,05% | 100,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 2.439.928 | $ 10.624.281 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 17.086,3 | $ 34.172.663,0 |
| **ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS** | $ 22.139.552 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 4,76% | 8,76% | | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 1.053.843 | $ 1.939.425 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARIAS** | $ 45.470.556 | | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | | Actividades Ejecutadas (%) | 12,00% | 17,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 45.470.556 | | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 5.456.466,7 | $ 7.729.994,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2** | $ 11.116.793 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 0,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ - | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |
| **ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7** | $ 2.852.892 | | | | |
| Actividades Programadas (%) | 0,00% | 100,00% | Actividades Ejecutadas (%) | 0,00% | 0,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ - | $ 2.852.892 | Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ - | $ - |

## RESUMEN CRONOGRAMA

| HORAS TRABAJADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento ERON | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | TOTAL |
| EPAMS CAS ERE POPAYÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM POPAYAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| COJAM JAMUNDÍ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC BUENAVENTURA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC ERE CALI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC - RM PASTO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC TUMACO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC TUQUERRES | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC IPIALES | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC LA UNIÓN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC SANTANDER QUILICHAO | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| EPMSC EL BORDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPAMS CAS JP PALMIRA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC BOLÍVAR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC SEVILLA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC CAICEDONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC PUERTO TEJADA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC BUGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| CPMS TULUÁ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC ROLDANILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC SILVIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 45 |
| EPMSC CARTAGO | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 21 |

| Establecimiento - ERON / Actividad | % Programado (Físico) | % Ejecutado (Físico) | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado | % Variación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EPAMS CAS ERE POPAYÁN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 41,71% )** | | | | | | |
| PABELLON No 8 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 99,00% | -1,00% | No se ha realizado entrega de esta zona. Esta pendiente la instalación de dos rejas de esclusa y 25 iluminarias en celdas. (No se estan realizando actividades). |
| CELDAS PRIMARIAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 98,50% | -1,50% | Porcentaje correspondiente específicamente para atención zonas de aislamiento (Celdas Primarias). Esta pendiente terminar parte electrica y botoneras. Se finaliza cambio de manto asfaltico. |
| EXTERIORES (TUBERÍA SANITARIA FACHADA) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se realizo el cambio de la tuberia exterior en pabellon No. 8. En su totalidad. Se entrego en un 100% |
| PABELLON 2 (DESMANES) | 16,67% | 0,00% | 56,07% | 0,00% | -56,07% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -56,07%. (redes electricas). |
| PABELLON 4 (DESMANES) | 6,25% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | -6,25% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -6,25%. (redes electricas). |
| PABELLON 11 (REDES ELECTRÍCAS) | 0,00% | 1,00% | 100,00% | 98,23% | -1,77% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -1,77% (redes electricas). Esta pendiente realizar la adecuaciíon de tablero principal |
| PABELLON 12 (DESMANES)-CUBIERTA | 7,69% | 0,00% | 46,15% | 100,00% | 53,85% | Se termino reparación de cubierta en fibrocemento, la cual encuentra pendiente por entregar. |
| **RM POPAYAN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 56,25% )** | | | | | | |
| BODEGA ANTIGUA (EXTERIOR) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Area entregada, solucionado manejo de aguas lluvias. Se entrego en un 100% |
| SANIDAD | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| BODEGA | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| RANCHO | 3,85% | 3,00% | 49,16% | 5,00% | -44,16% | Se supendieron actividades por falta de cumplimiento en la entrega del área por parte del contratista de obra. La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de -44,16% |
| **EPMSC - RM PASTO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 55,73%)** | | | | | | |
| CAPILLA | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 90,10% | -9,90% | Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Capilla). |
| TALLERES | 0,00% | 1,20% | 100,00% | 66,30% | -33,70% | Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -33,70% con respecto a programación de obra. |
| CELDA 1 - RM | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 95,00% | -5,00% | Se realizo la entrega del espacio sin embargo está pendiente un repello en la parte exterior, cabe aclarar que la parte interna todo se encuentra a satisfacción. |
| CELDA 2 - RM | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 88,30% | -11,70% | Porcentaje correspondiente específicamente para área aislamiento (Celdas - RM). El área presenta un atraso de -11,70% con respecto a programación de obra. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIO 2 (EMERGENCIA) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance en Patio 2 (novedad). El área se encuentra pendiente por entregar |
| CELDAS HOMBRES | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrega área en 100% |
| SANIDAD HOMBRES | 0,00% | 2,00% | 100,00% | 2,00% | -98,00% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad hombres. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -98% con respecto a programación de obra. |
| PATIO 5 Y 6 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | -100,00% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance patios. No se ha iniciado intervención en el área, por lo cual presenta un atraso de -100% con respecto a programación de obra. |
| SANIDAD MUJERES | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| ZONA COMUN PATIOS (BATERIAS DE BAÑOS 2 Y 3) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance en zona comun patios. El área se encuentra pendiente por entregar. |
| ZONA ALIMENTACIÓN ACCESO | 6,67% | 7,00% | 12,22% | 5,40% | -6,82% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance zona alimentación. el área presenta un atraso de -6,82% con respecto a programación de obra. |
| EMERGENCIA PATIO 4 | 8,33% | 2,20% | 50,00% | 5,40% | -44,60% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance en emergencia patio4. El área presenta un atraso de -44,60% con respecto a programación de obra. |
| **EPMSC TUMACO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 100% )** | | | | | | |
| EDUCATIVAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Educativas). Se realiza entrega del área el avance en 100% |
| PATIO CENTRAL | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| PATIOS (DESMANES) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| MURO EXTERIOR | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Se entrego en un 100%. |
| **EPMSC TUQUERRES (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 26,00% )** | | | | | | |
| ZONA DE AISLAMIENTO 2 BODEGA HOMBRES | 0,00% | 1,30% | 100,00% | 48,40% | -51,60% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Bodega). El área presenta un atraso de -51,60% con respecto a programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO 1 CELDAS (HOMBRES) | 30,95% | 0,00% | 30,95% | 0,00% | -30,95% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de zona aislamiento. El área presenta un atraso de -30,95% con respecto a programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO MUJERES TALLER - RM | 0,00% | 1,20% | 100,00% | 40,80% | -59,20% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres - RM). El área presenta un atraso de -59,20% con respecto a programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO GUARDIAS | 7,14% | 0,00% | 14,29% | 9,00% | -5,29% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Alojamiento guardias). El área presenta un atraso de -5,29% con respecto a programación de obra. |
| SANIDAD HOMBRES | 8,33% | 0,00% | 31,03% | 8,80% | -22,23% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de sanidad hombres . El área presenta un atraso de -22,23% con respecto a programación de obra. |
| RANCHO | 12,50% | 1,00% | 12,50% | 4,20% | -8,30% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance de obra para el area de rancho. El área presenta un atraso de -8,30% con respecto a programación de obra. |
| PATIO Y COLECTIVAS HOMBRES | 10,00% | 0,00% | 42,62% | 0,00% | -42,62% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance reportado por mantenimiento en Patios y colectivos hombres. El área presenta un atraso de -42,62% con respecto a programación de obra. |
| PATIO Y COLECTIVAS MUJERES | 0,00% | 1,20% | 0,00% | 1,20% | 1,20% | Porcentaje correspondiente específicamente para área Patio y Colectivas 1,20%. |
| **EPMSC IPIALES (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 28,52% )** | | | | | | |
| ZONA DE AISLAMIENTO 1 (TALLERES) | 0,00% | 1,40% | 100,00% | 38,50% | -61,50% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Talleres). El área presenta un atraso de -61,50% con respecto a programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO 2 (AULAS) | 0,00% | 1,10% | 100,00% | 17,90% | -82,10% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aulas). El área presenta un atraso de -82,10% con respecto a programación de obra. |
| RECLUSORIO MUJERES | 8,33% | 0,00% | 36,67% | 0,00% | -36,67% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (reclusorio mujeres). El área presenta un atraso de -36,67% con respecto a programación de obra. |
| ALOJAMIENTO AISLAMIENTO | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 48,70% | -51,30% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (vigilantes). El área presenta un atraso de -51,30% con respecto a programación de obra. |
| PRIMARIAS | 0,00% | 3,90% | 100,00% | 50,50% | -49,50% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Celdas Primarias). El área presenta un atraso de -49,50% con respecto a programación de obra. |
| BAÑOS PATIOS | 5,60% | 0,00% | 29,74% | 0,00% | -29,74% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance baños patios. El área presenta un atraso de -29,74% con respecto a programación de obra. |
| SANIDAD | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 39,20% | -60,80% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance en la zona de sanidad. El área presenta un atraso de -60,80% con respecto a programación de obra. |
| RANCHO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EPMSC LA UNIÓN (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 13,76% )** | | | | | | |
| SANIDAD | 5,13% | 0,00% | 26,37% | 0,00% | -26,37% | Porcentaje correspondiente específicamente para avance sanidad. No se han iniciado actividades en el área. El área presenta un atraso de -21,24% con respecto a programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO 1 (COLECTIVOS ESPECIALES) | 0,00% | 2,60% | 100,00% | 58,80% | -41,20% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Colectivas Especiales). El área presenta un atraso de -43,80% con respecto a programación de obra. |
| AISLAMIENTO GUARDIAS + UT | 16,67% | 0,00% | 51,53% | 0,00% | -51,53% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de aislamiento (Aislamiento guardias y UT). El área presenta un atraso de -34,86% con respecto a programación de obra. |
| RANCHO | 3,85% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | -3,85% | No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021 |
| PATIO COLECTIVO | 11,36% | 0,00% | 36,36% | 0,00% | -36,36% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de Patio Colectivo. El área presenta un atraso de -24,74% con respecto a programación de obra. |
| ALOJAMIENTO GUARDIAS BAÑO | 14,29% | 0,00% | 45,12% | 0,00% | -45,12% | Porcentaje correspondiente específicamente para área de Alojamiento Guardias. El área presenta un atraso de -30,83% con respecto a programación de obra. |
| PATIO COMÚN BATERÍA | 6,67% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | -6,67% | No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021 |
| **COJAM JAMUNDÍ (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 42,72% )** | | | | | | |
| CASINO | 3,70% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Una vez se tenga el presupuesto de actividades ejecutadas por el contratista de obra, se realizara el reporte de avance de terminacion dado que todas las actividades en este espacio ya se ejecutaron, se atendio como emergencia. |
| PATIO 5 (RED GENERAL HIDRAULICA) | 24,18% | 15,70% | 24,18% | 15,70% | -8,48% | No se han continuado con las actividades por la falta de material en cuanto a tuberia de presion para el cambio en redes. El área presenta un atraso de -8,48% con respecto a programación de obra. |
| PATIO 2-UTE Y CONYUGALES | 3,57% | 8,45% | 85,36% | 27,55% | -57,81% | Se trabajo en ute y pabellones en cuanto al cambio de valvulas para sanitarios y lavamanos, ademas se realizo el mantenimiento de valvulas de duchas, cambio de luminarias en la parte externa y pintura epoxica en duchas. El área presenta un atraso de -57,81% con respecto a programación de obra. |
| PATIO 3 -UTE Y CONYUGALES | 6,25% | 6,35% | 68,79% | 19,45% | -49,34% | Se esta adelantando la instalacion de acometidas electricas con cableado nuevo dado el deficiente estado en el que esta el sistema en ute. El área presenta un atraso de -49,44% con respecto a programación de obra. |
| PATIO 4- UTE Y CONYUGALES | 3,70% | 26,50% | 45,87% | 61,28% | 15,41% | S realiza aplicación de pintura epoxica en duchas de conyugales y en ute. El área presenta un avance de 15,41% con respecto a programación de obra. |
| GARITAS Y TRINCHERAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | -100,00% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de 100%. |
| **EPMSC BUENAVENTURA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 42,52% )** | | | | | | |
| EDUCATIVAS | 0,00% | 6,45% | 100,00% | 95,85% | -4,15% | Esta pendiente por suministrar e instalar las puertas para baños, terminar de pintar muros y cielos, se espera que tratamiento de humedades aplicado sirva para realizar entrega. El área presenta un atraso de -4,15% con respecto a programación de obra. |
| SANIDAD | 8,33% | 3,80% | 87,69% | 19,75% | -67,94% | Se retomaron las actividades en sanidad donde se esta retirando la pintura y pañetes de muros debido a las afectaciones por humedades, a se aplicara pañetes impermeabilizados, estuco y pintura epoxica. El área presenta un atraso de -67,94% con respecto a programación de obra. |
| AISLAMIENTO MUJERES | 10,00% | 0,00% | 55,18% | 0,00% | -55,18% | Por directriz de la USPEC, esta area no se intervendra ya que hace parte del alcance de otro contrato proximo a ejecutarse con otra entidad. El área presenta un atraso de -55,18% con respecto a programación de obra. |
| RANCHO | 10,00% | 25,00% | 86,01% | 66,00% | -20,01% | Demolicion de contrapisos existentes, retiro de tuberia sanitaria de piso, modificaciones de tuberia hidraulica, excavaciones para construccion de filtro tipo frances.El área presenta un atraso de -20,01% con respecto a programación de obra. |
| REDES ELECTRICAS | 10,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | -20,00% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de 20%. |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA Y TANQUE | 7,14% | 0,00% | 12,70% | 0,00% | -12,70% | La actividad presenta un atraso respecto a la programación de obra de 12,70%. |
| AISLAMIENTO GUARDIAS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021 |
| **EPMSC ERE CALI (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 86,27%)** | | | | | | |
| COLISEO | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ENTREGADO |
| SANIDAD (ZONA DE FISIOTERAPIA Y TBC) | 24,13% | 7,39% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Pendiente por entregar. Fecha de entrega 2 de febrero. |
| TUNEL DE ACCESO A SANIDAD | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ENTREGADO |
| PATIO 10 | 10,00% | 0,00% | 34,93% | 0,00% | -34,93% | No se han iniciado actividades. Retrasos en la entrega de las otras areas. El área presenta un atraso de -34,93% con respecto a programación de obra. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EPMSC SANTANDER QUILICHAO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 44,70%)** | | | | | | |
| AISLAMIENTO (UTE) | 25,00% | 0,00% | 85,60% | 0,00% | -85,60% | No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -85,60% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades). |
| AULAS EDUCATIVAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 52,62% | -47,38% | (No se estan realizando actividades). el área presenta un atraso de -47,38% en la programación de obra. |
| **EPMSC EL BORDO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 55,84% )** | | | | | | |
| SANIDAD | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Entregado |
| CELDAS COLECTIVAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Entregado celdas 1, 2 y 3. |
| CELDAS PRIMARIAS | 20,00% | 10,00% | 84,56% | 54,22% | -30,34% | Cimentación, tuberia sanitarial, muros. Esta semana no se realizo actividades. el área presenta un atraso de -30,34% en la programación de obra |
| RANCHO | 10,00% | 0,00% | 45,76% | 0,00% | -45,76% | No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -45,76% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades). |
| **EPAMS CAS JP PALMIRA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 153,67% )** | | | | | | |
| PABELLON No 7 | 1,56% | 10,00% | 94,92% | 92,10% | -2,82% | Se esta realizando la limpieza y pintura de las rejas de las celdas, continua la pintura de muros y cielos internos de celdas. Construccion Modulos para malla eslabonada para instalacion en cielo. el área presenta un atraso de -2,82% en la programación de obra. |
| PABELLON No 4 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 97,95% | -2,05% | Se esta terminando de realizar los tratamientos para humedades en las losas de cubierta de escalera y cocina del pabellon 4. NO se ejecuto obrra esta semana. Se realizo la entrega del área con una observacón , se colocara el avance del 100%, una vez sea subsanada. |
| **EPMSC BOLÍVAR (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 108,78%)** | | | | | | |
| EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2) AUIDOTORIO | 0% | 1% | 100% | 100% | 0% | Se realizo entrega de esta area con los siguientes requerimientos: Pintura de reja de bodega, tapa de breaker, pintura de rejas de ventanas. Se encuentra pendiente por entregar. |
| CONYUGALES UTE | 6% | 5% | 31% | 5% | -26% | (No se estan realizando actividades). el área presenta un atraso de -26,00% en la programación de obra. |
| **EPMSC SEVILLA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 189,77% )** | | | | | | |
| RANCHO. | 0% | 2% | 100% | 99% | -1% | Se ha realizado enchape con fichas de granito pulido en piso, enchapes de ceramica, repellos y estucos en muros. Esta pendiente por llegar teja para cambio en cubierta se encuentra pendiente por entregar. |
| ZONA DE AISLAMIENTO 2 (TALLER) | 13% | 0% | 49% | 0% | -49% | No se ha iniciado porque no se ha entregado el área de la biblioteca. el área presenta un atraso de -49,00% en la programación de obra. |
| BIBLIOTECA | 0% | 13% | 100% | 97% | -3% | Se ha realizado actividad de instalación de estucos, aplicación de pinturas e instalación de enchapes en muros, Mantenimiento y adicion de estructura metalica para cubierta, cambio de tejas termoacusticas, enchape en ceramica de pisos, instalacion de malla en acero expandido en cielo |
| SANIDAD | 7% | 0% | 100% | 0% | -100% | No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -100% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades). |
| PATIO 4 | 0% | 2% | 100% | 99% | -2% | Se instalaron los sanitarios, lavamanos y duchas, se termino de realizar enchapes y pinturas. Se encuentra pendiente por entregar. |
| **EPMSC CAICEDONIA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 108% )** | | | | | | |
| BIBLIOTECA | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | Adecuaciones entregadas al establecimiento para uso. |
| AULA EDUCATIVA | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 99,85% | -0,15% | Se reparo muro por afloramiento de humedad y se esta a la espera de que no se presente esta novedad para entregar. Se auotorizo el enchape a media altura de muro por la parte externa ya que esta expuesto a intemperie. Se realizo entrega con un pendiente. |
| SANIDAD | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 99,30% | -0,70% | Se realizo el tratamiento de humedad en muro de fachada y se instalo un lavatraperos que estaba al interior de sanidad. Se realizo entrega con pendiente, una vez subsanado el pendiente se colocara en el avance 100% |
| **EPMSC PUERTO TEJADA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 41,10% )** | | | | | | |
| BAÑO GUARDIAS | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 90,00% | -10,00% | Se entrego, con la observación de mejorar aparatos eléctricos y tapa de motobomba. (No se estan realizando actividades).Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones |
| BIBLIOTECA | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 90,00% | -10,00% | Esta pendiente la observación de instalar malla IMT y arreglo de puntos eléctricos. (No se estan realizando actividades). Por lo tanto no se reporta el 100% hasta no ser subsanadas las observaciones |
| RANCHO | 12,50% | 10,00% | 67,45% | 39,00% | -28,45% | Se esta realizando pega de enchape y estuco. el área presenta un atraso de -28,45% en la programación de obra. |
| **EPMSC BUGA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 58,03% )** | | | | | | |
| CUARTO HOSPITALIZACIÓN SANIDAD | 7% | 0% | 31% | 100% | 68,91% | Se realiza el recibido por parte de interventoria, sin embargo establecimiento manifesto que hasta el momento USPEC no ha autorizado el recibido de las mismas ya que es esta entidad la encargada de entregar a INPEC las adecuaciones |
| ZONA DE AISLAMIENTO EDUCATIVAS | 5% | 0% | 9% | 0% | -8,76% | Se esta realizando pega de enchape y estuco. el área presenta un atraso de -8,76% en la programación de obra. |
| ZONA DE AISLAMIENTO CELDAS PRIMARÍAS | 0% | 12% | 100% | 17% | -83,00% | Se inician actividades de demoliciones de mamposteria y enchapes, espacio entregado por la direccion del establecimiento.el área presenta un atraso de -83,00% en la programación de obra. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIAS COMUNES PATIO 1 Y PATIO 2 | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | No se han iniciado actividades en el establecimiento, las actividades sobre programación de obra estan presupuestadas iniciar en febrero de 2021 |
| ZONA DE AISLAMIENTO BATERIA PATIO 7 | 0,00% | 0% | 100% | 0% | -100,00% | No se han iniciado actividades, el área presenta un atraso de -100% en la programación de obra. (No se estan realizando actividades). |
| **CPMS TULUÁ (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 101,10% )** | | | | | | |
| RANCHO ANTIGUO | 0,00% | 8,95% | 100,00% | 94,60% | -5,40% | Contratista esta realizando el retiro de enchapes en los baños de patios en el pabellon 8 dado que humedad en rancho interno volvio a aflorar, ademas se autorizo realizar enchape en muro externo sobre pasillo de comunicación en rancho por humedades |
| PABELLON No. 6 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | YA SE ENTREGO A ESTABLECIMIENTO |
| PABELLON No. 7 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | YA SE ENTREGO A ESTABLECIMIENTO |
| **EPMSC ROLDANILLO** | | | | | | |
| EPMSC ROLDANILLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se intervendra por el contrato, por no presencia de PPL, ni requerimientos. |
| **EPMSC SILVIA (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 148,15% )** | | | | | | |
| TALLERES | 0% | 1% | 100% | 100% | 0,00% | Se recibio esta area con la salvedad de resanar filos de puertas. |
| BODEGA 2 TALLERES | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | ENTREGADA. |
| BODEGA SANIDAD | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | ENTREGADA. |
| SANIDAD | 0% | 0% | 100% | 0% | -100% | No se han iniciado actividades, presentan un atraso de 100% de acuerdo a la programación de obra. |
| AMPLIACIÓN SANIDAD | 14% | 0% | 100% | 0% | -100% | No se han iniciado actividades, presentan un atraso de -86% de acuerdo a la programación de obra. |
| REFORZAR SEGURIDAD PATIOS CONCERTINAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir |
| CELDAS COLECTIVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir |
| BATERIAS SANITARIOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | El contratista no ha remitido el presupuesto y el cronograma del área a intervenir |
| **EPMSC CARTAGO (AVANCE FISICO ESTABLECIMIENTO 122,35% )** | | | | | | |
| AULAS EDUCATIVAS | 0% | 13% | 100% | 98% | -2% | Instalacion de malla de seguridad en acero expandido en cielos de aulas educativas, adecuaciones electricas, estucos y pinturas de muros, enchape de piso y cielo falso en pvc de cuarto medico. Se presenta atraso en las actividades del área. |
| PATIO 4 | 6% | 0% | 52% | 0% | -52% | Direccion de establecimiento no entregara esta area hasta tanto no se defina el cerramiento del patio de aulas educativas y que el contratista entrege obras ejecutadas. Se presenta atraso en las actividades del área. |

## SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

**EPMSC ERE CALI: ZONA DE FISIOTERAPIA**

Se realizo entrega de area de fisioterapia se siguio con area de TBC.




**CPMS TULUÁ:**

**RANCHO ANTIGUO.**

- Enchape de piso y paredes de baños ubicados en el patio del pabellon 8
- Repello impermeailizado en muro interno de rancho antiguo
- Pintura muro exterior lateral rancho antiguo



**EPMSC - RM PASTO:**
**CELDAS RM** * Se realizo la visita del especialista hidráulico, quien recorrió el área para determinar la correcta intervención y así proceder a realizar la entrega final de ella.
**TALLERES** * Se continua con la instalación de mallas, una vez se termine se realizará la intervención de la parte interne de sanidad hombres.
**PATIO 2** *Se continua con la instalación del piso en granito en el corredor y el pasamanos.
**PATIO 3** *Se continua con el levante de muro de mampostería, instalación de tubería hidráulica e instalación de pañete o repello.
**PATIO 4** *Se inicio con la demolición de losa de piso y excavaciones para la instalación de la tubería de aguas lluvias que atraviesa todo el patio.
**SANIDAD HOMBRES**: *Se inicio con la construcción del cuarto de disposición de residuos peligrosos.
**RANCHO** *Se realizo la demolicion del piso y la instalacion del nuevo

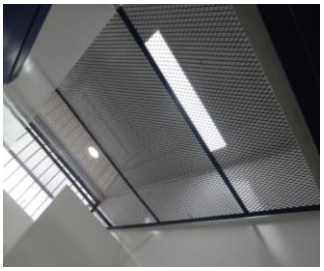


**EPMSC TUMACO** *Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión y visita realizada el día viernes 11 de diciembre del 2021 en la cual asistieron la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, el contratista realizo las subsanaciones pendientes e informo a la interventoría quien una ves al tanto de ello realizo una visita el día viernes 05 de febrero del 2021 para supervisar y corroborar dichas subsanaciones, una ves rectificado se procedió a firmar el acta final por parte de interventoría como por el Director del establecimiento. (se anexa acta)

**EPMSC TUQUERRES:**
**RECLUSORIO MUJERES** *Se inicia con la aplicación de estuco y pintura e instalación de tubería eléctrica.
**AILAMIENTO COVID 1 BODEGA** *Se finaliza con la instalación de la malla con varilla de ½" y se continua con la instalacion de la estructura para el cielo raso
*Se inicia con la instalación de tubería eléctrica Se le
solicita al contratista revisar las presiones en este punto porque se debe garantizar la funcionabilidad de los baños
**COLECTIVO MUJERES** *Se inicia con el desalojo del área para inicia con la demolición del techo existente que está en malas condiciones.







**EPMSC IPIALES:**
**ALOJAMIENTO GUARDIAS** *Se finalizo con el aseo general en la parte interna, queda pendiente la instalación de puertas y se puede realizar la entrega.
*En la parte externa se continua con la instalación de enchape de pared y piso.
**AULAS Y TALLERES** *Se finaliza con la instalación de enchape de piso.
*Se inicia con la instalación del cielo raso en PVC
*Se realiza la aplicación de pintura en la zona de aulas
**PRIMARIAS** *Se continua con la aplicación de pintura y se inicio con la instalacion de tuberia electrica.
El día 02 de febrero de 2021 se le realizo la entrega por parte del establecimiento al contratista de 2 frentes de trabajo Rancho y Motobombas, el contratista manifestó iniciar las actividades de rancho una ves hagan el respectivo desalojo de la zona de oficina y motobombas se iniciara el 08 de febrero del 2021.



**EPMSC LA UNION** *En la semana se realizo la construccion de las gradas de acceso y se finalizo con la fundicion del anden exterior, el espacio que se intervino está en un 90% de ejecución, para realizar la entrega se espera la instalación de puertas, luminarias y la aplicación de la pintura en la parte externa.
Cabe hacer la aclaración que el espacio ya se encuentra habitado debido a que el establecimiento no cuenta con gran espacio por lo cual se tuvo que disponer de el para alojar al personal.



**EPAMS CAS ERE POPAYÁN:**
**CELDAS PRIMARIAS:**
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
**PABELLÓN 8:**
NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
**PABELLON 11:** NO SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES.
**PABELLON 12:** POR ENTREGAR.





**RM POPAYAN:** Iniciaron actividades en rancho.





**EPMSC PUERTO TEJADA**
RANCHO:Se esra realizando estuco y fragua de piso, falata enchape de paredes.
QUEDA PENDIENTE LAS ADECUACIONES PENDIENTES EN BAÑO Y BIBLIOTECA. YA QUE SE ESTA DETERIORANDO LA OBRA.








**EPMSC SANTANDER QUILICHAO**
No se estan realizando actividades, se recomienda seguir el cronograma de actividades ya que algunas actividades que falta por realizar afectaran las ya realizadas. Se requiere personal y materiales, revisar humedad de baños ha aula educativa. Se inicio con actividades de redes electricas.



**EPMSC BOLÍVAR:**
Se realizo entrega de educativas se inicio actividades en ute y colectivas.








**EPMSC EL BORDO:**
Se esta realizando pega de muros e instalación de tuberia hidrosanitaria.






**EPMSC SILVIA:**
TALLERES: Se realizo entrega.
BODEGA: Entregado.



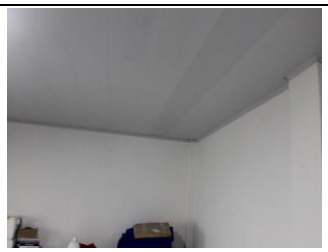


**EPAMS CAS JP PALMIRA:**
**- PATIO 7:** Se rectificaron medidas para divisiones de baños y se espera que en la semana del 8 al 13 de febrero sean instaladas por el proveedor
**- PATIO 7:** Pintura de modulos de celdas y puertas
**- PATIO 7:** Pintura de modulos de malla eslaonada e instalacion de la misma en el pasillo de la nave 1 de este patio.










**EPAMS BUENAVENTURA:**
**- SANIDAD:**
Demolicion de contrapiso en consultorio de odontologia y consultorio general
Estuco y pintura en paredes
**- AULAS EDUCATIVAS:**
Resanes externos, retoques de pintura
Pintura de Rejas
Pintura muros pasillo
**- RANCHO:**
Conformacion y conpactacion de rasante
Demoliciones de contrapiso y enchapes de piso
Nivelacion, conformacion y compactacion de rasante de piso
Relleno con material granular para nivelacion de superficie hasta nivel para construccion de contrapiso







**COJAM JAMUNDI:**

**BLOQUE 2:**
- Cambio de vlavulas de sanitarios
- Mantenimiento de valvulas de duchas y lavamanos
- Pintura epoxica de muros de duchas
- Adecuacion de sistema para descarga de duchas



**PATIO 3:**
- Cambio de vlavulas de sanitarios
- Mantenimiento de valvulas de duchas y lavamanos
- Pintura epoxica de muros de duchas
- Adecuacion de sistema para descarga de duchas

**PATIO 4:**
- Pintura epoxica en duchas de baños en ute y conyugales
- Cambio de tuberia cristalizada o dañada
- Instalacion de tuberia emt y cableado electrico
- Instalacion de reflectores en zonas comunes por iluminacion deficiente para acceso a conyugales y utes

**BAÑOS DE INGRESO A ESTBLECIMIENTO:**
- Cambio de fluxometros de sanitarios
- Retiro de pintura epoxica de paredes
- Resanes en muros, pañetes y estucos
- Mantenimiento de lavamnos





**EPMSC CAICEDONIA:**


**- AULA EDUCATIVA:**

Se esta esperando que no aparezcan nuevos afloramientos de humedades para enttegar

**- SANIDAD:**
- Se esta esperando que pintura y resanes sequen para revision y entrega

**EPMSC CARTAGO:**

**AULAS EDUCATIVAS**
- Instalacion de malla de seguridad en acero expandida en vanos de ventanas de aulas escolares
- Repello en muros de aulas deteriorados o afectados por humedades
- Pintura interna de muros de aulas escolares





**EPMSC SEVILLA:**

**BIBLIOTECA:**
- Pintura epoxica en muros
- Pintura de elementos metalicos
- media cañas perimetrales

**RANCHO:**
- Resanes y pañetes en muros
- Mantenimiento Estructura metalica
- Media caña perimetral
- Suministro mesones en acero inoxidable

**PATIO 4:**
- Suministro e instalacion de puertas para baños








**EPMSC BUGA:**
**CELDAS PRIMARIAS**
- Pintura y resanes menores
- Aseo final para entega
- Interventoria recibe adecuaciones realizadas por contratista, aunque establecimiento manifesto que es la USPEC quien debe entregar los espacios al INPEC.

**Cuartos Celdas Primarias Auxiliares**
- Demolicion de muros en mamposteria dilatados
- Demolicion de enchapes en piso y paredes
- Limpieza de muros y retiro de pinturas








**EPMSC SEVILLA:** Los porcentajes de avance presentados en las areas que se estan atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada area que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada area es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las areas que aun se estan interviniendo y el real ejecutado en las areas ya entregadas. Establecimiento no recibio obra de adeciacion de cuarto de hospitalizacion dado que manifesto que es la USPEC quien debe realizar la entrega al INPEC y esta al establecimiento y que mientras no se informe de lo contrario este espacio no sera usado.

**EPMSC SEVILLA:** Los porcentajes de avance presentados en las areas que se estan atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada area que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada area es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las areas que aun se estan interviniendo y el real ejecutado en las areas ya entregadas.

**EPMSC CARTAGO:** Los porcentajes de avance presentados en las areas que se estan atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada area que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada area es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las areas que aun se estan interviniendo y el real ejecutado en las areas ya entregadas.

**COJAM JAMUNDI:** Reporte en registro fotografico de la atencion en los baños de acceso al establecimiento, no se presenta porcentaje de avance de estas actividades dado que este espacio no estaba contemplado dentro del presupuesto presentado por el contratista, asi como las actividades realizadas en el rancho general y en los diferentes patios que conforman los bloques del establecimento.

**EPMSC PALMIRA:** Los porcentajes de avance presentados en las areas que se estan atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada area que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada area es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las areas que aun se estan interviniendo y el real ejecutado en las areas ya entregadas.

**CPMS TULUA:** Los porcentajes de avance presentados en las areas que se estan atendiendo y que se entregaron no corresponden con exactitud a las cantidades ejecutadas en obra, puesto que los valores de cada area que se toman como base para el porcentaje de avance son inferiores al total ejecutado, es decir, que el valor presupuestado total para cada area es inferior al valor total ejecutado en cada espacio por lo que se debe presentar un ajuste al presupuesto con el balance real aproximado en las areas que aun se estan interviniendo y el real ejecutado en las areas ya entregadas.

**EPMSC BUENAVENTURA:** Se evidencia que el afloramiento de nivel freatico se encuentra al mismo nivel superficial del piso, lo cual ocaciona que el material de relleno del contrapiso tenga exceso de humedad, lo cual genera socavacion y perdida en la compactacion, este fenomeno se presento en las zanjas excavadas donde se esta proyectando realizar el cambio de la tuberia sanitaria, por lo mencionado anteriormente se requiere definir el alcance que se dara a este espacio con el fin de no perjudicar al establecimiento y poder realizar un trabajo acorde a las necesidades de este.
Se realizan actividades en las áreas de Aulas educativas y Rancho.

**COJAM JAMUNDI:** Se detecta una fuga en la red de la tubería hidráulica del casino, debido a la emergencia se autoriza la intervención de este espacio para reparar los daños, vale la pena señalar que este espacio no estaba contemplado en el presupuesto por ser un imprevisto, por ende no tiene porcentajes de avance. El contratista se encuentra en la valoración de la intervención del área para anexar en el presupuesto.
Se realizan antividades en las áreas de Patio 2 y Patio 4.

**EPAMS CAS ERE POPAYÁN:** No se tiene material en obra, no se tiene personal. Pendiente por entregar patio 8 y celdas primarias. Retrasos considerables.

**RM POPAYAN:** Se iniciarin actividades en rancho.

**EPMSC EL BORDO: No se tiene personal ni material en obra. Se recomienda iniciar con las actividades, Solucionar humedad ne colectivo 2.**
**SANIDAD:** Entregado.
**CELDAS EXTERIORES:** EnSe esta realizando pega de ladrillo, instalación de tuberia hidrosanitaria.

**EPMSC SILVIA:**
**TALLERES:** Se realizo entrega de esta area con el compromiso de resanar los filos de puertas.
**BODEGA:** zona entregada.

**EPMSC BOLÍVAR:**
EDUCATIVAS (ZONA AISLAMIENTO 2)
AUIDOTORIO: Se realizo la entrega con la salvedad de pintura de reja de bodega y de ventanas, tapa de breaker.

**EPMSC SANTANDER QUILICHAO**
*Aulas: No se estan realizando actividades, se solicita mas personal y material en obra, seguir el cronograma de trabajo ya que se estan realizando actividades que se veran afectatas con las que se va a realizar. Mejorar acabados de baños.

**EPMSC PUERTO TEJADA: No se esta realizando actividades se solicita personal y materiales en obra.**
*Baño de Rancho: Mejorar puntos electricos, Tapa de bomba.
* Biblioteca: Faltan puntos electricos, se realiza mantenimiento de la reja de ventana e instalación de malla imt.
* Se recomienda resanar filos de columnas.
RANCHO: En esta semana no se ha realizado actividades.

**EPAMS CAS JP PALMIRA:**
Se presentaron dos novedades en esta semana de ejecución de actividades, (i) en primer lugar, mientras se revisaban las acometidas eléctricas de las celdas, se observo que las instalaciones presentan algunos trabajos mal realizados por el establecimiento, dado que se ha realizado un puente eléctrico en la red que alimenta a las celdas, lo que ha ocasionando cortos y que los breakers se disparen porque no son para esa capacidad; se solicito al contratista revisión y presentación de solución para independizar las naves de celdas del patio, existen dos tableros de breakers, (ii) en segundo lugar y con relación al desarrollo de la atención de la demanda, se solicito a contratista la intervención para instalar una ventana en el área bajo la garita de vigilancia puesto que esta presenta filtraciones sobre el cielo interno del pabellón 4.

**CPMS TULUÁ:**
Se presento una novedad con relación a un problema de humedad sobre el pasillo del antiguo rancho, donde se determino que debería instalarse una solapa en la cubierta puesto que solo hay en un tramo y esta ya esta en malas condiciones, también se debe instalar una solapa metálica en cubierta de sanidad puesto que se encuentra adosada a un edificio de otro patio y se esta filtrando agua entre los muros colindantes.

**En el EPMSC - RM PASTO:** Se han presentado 2 novedades, en las cuales ha habido afectaciones en las tuberías y cajas que conciernen a los patios 2, 3 y 4, hasta el momento se inició atender los problemas de patio 2 que corresponde a la primera novedad y para la segunda el contratista se encuentra realizando el presupuesto y debido balance.

**En el EPMSC - RM PASTO:** Teniendo en cuenta el presente informe, hasta la fecha se observa que el atraso que se presenta es considerable y que no se está dando cumpliendo a lo estipulado en el plan de contingencia entregado por el contratista, los rendimientos no son los esperados y no se tiene un flujo continuo de material.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.
El día dieciocho (18) de enero del 2021 se realizó recorrido en compañía del personal del establecimiento, Interventoría y contratista, por los 3 espacios que fueron entregados por el Establecimiento al Contratista, Rancho y Patio 4 para que dé inicio a las intervenciones de manera inmediata y Sanidad hombres para dar inicio el 1 de febrero del 2021 una vez se entregue talleres en un 100%.)

**En el EPMSC TUMACO**: Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la reunión y visita realizada el día viernes 11 de diciembre del 2021 en la cual asistieron la Arquitecta Dayana Lancheros como supervisora de la UPEC, el contratista, la interventoría y el establecimiento, el contratista realizo las subsanaciones pendientes e informo a la interventoría quien una ves al tanto de ello realizo una visita el día viernes 05 de febrero del 2021 para supervisar y corroborar dichas subsanaciones, una ves rectificado se procedió a firmar el acta final por parte de interventoría como por el Director del establecimiento. (se anexa acta)

**En el EPMSC - RM TUQUERRES:** En el presente informe se observa que el contratista presenta un atraso considerable, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

**En el EPMSC IPIALES:** En el presente informe se observa que el contratista presenta un atraso considerable, los rendimientos en obra no son los esperados, dando como resultado el no cumplimiento al plan de contingencia entregado, por esta razón se le reitera al contratista tomar las medidas necesarias para así evitar mayores atrasos, adicionalmente se solicita dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Hasta la fecha no se cuenta con la programación y el balance ajustados los cuales deben ser entregados por el contratista para así nosotros como interventoría realizar un seguimiento más detallado y certero.

**En el EPMSC - RM UNION:** En la semana se realizo la construccion de las gradas de acceso y se finalizo con la fundicion del anden exterior, el espacio que se intervino está en un 90% de ejecución, para realizar la entrega se espera la instalación de puertas, luminarias y la aplicación de la pintura en la parte externa.
Cabe hacer la aclaración que el espacio ya se encuentra habitado debido a que el establecimiento no cuenta con gran espacio por lo cual se tuvo que disponer de el para alojar al personal.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_037 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE) Y EPMCS TUMACO-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_058 -VALIDACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA EN EPMSC CALI (ERE), EPMCS TUMACO, EPAMSCAS POPAYAN (ERE), RM POPAYAN, EPMSC-RM PASTO, CPMS TULUA y EPAMSCAS PALMIRA-, se validó el inicio de las obras en las áreas correspondiente a AISLAMIENTO y CONCORDANTES A LA MATRIZ de actividades requeridas por la entidad.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_105 -APROBACIÓN PRESUPUESTOS, TECHOS PRESUPUESTALES E INICIO DE ACTIVIDADES POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobó presupuestos, techos presupuestales e inicio de actividades en todos los establecimientos objeto del contrato.

* En terminos generales los establecimientos condicionan el avance a la entrega de áreas terminadas para disponer de la siguiente, por tal razón, solo hasta terminar las zonas en intervención actuales se podrá avanzar; esta situación representa restricciones en el avance programado. Se gestioana al interior del estableciento la disponibilidad de zonas y en la medida posible se inician los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_119 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas en todos los establecinientos objeto del contrato, de acuerdo con esto, el presente informe registra los porcentajes de avance y presupuestos contenidos en las aprobaciones, basados en las fechas de inicio de la MATRIZ DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE GESTIÓN Y AVANCE DE OBRA.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_162 -RECIBO Y ESTADO DE LAS OBRAS EN EL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUMACO-; Se solicta dar cierre y finalizar las obras en el establecimiento de Tumaco, hacer la correspondiente entrega y protocolizar el proceso de acuerdo a lo establecido contractualmente.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_164 -SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA – EJECUCIÓN- CONTRATO 140 DE 2020-; Se requiere al contratista presentar PLAN DE CONTINGENCIA para ejecución del contrato dentro de los plazos y montos establecidos contractualmente. Se evidencia un avance de obra semanal muy bajo, lo que genera preocupación con respecto al plazo de ejecución contractual, lo cual nos lleva a calcular que, bajo las condiciones actuales, de continuar el mismo comportamiento difícilmente estarán ejecutadas la totalidad de las actividades en todos los establecimientos y así mismo, agotados los recursos asignados al contrato.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_167 -OBSERVACIONES ESTABLECIMIENTOS EN EJECUCIÓN - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita informar y/o manifestar la situación dada en cada establecimiento, las razones por las cuales las obras se encuentran paralizadas o ejecutadas a bajo ritmo y el suministro de los documentos requeridos junto con la disponibilidad en la implementación de las solicitudes COVID-19.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_169 -OBSERVACIONES CALIDAD DE OBRA EPMSC PUERTO TEJADA - CAUCA- CONTRATO 140 DE 2020-; Se solicita al contratista reparar las observaciones mencionadas de manera imperiosa, así mismo, mejorar la calidad de los acabados e instalaciones y tomar medidas correctivas en los procesos constructivos ya que se ve comprometida la calidad y estabilidad de las obras, además de la disponibilidad del establecimiento en la entrega de áreas para el óptimo avance en la ejecución de los trabajos.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_171 -APROBACIÓN INFORMES DIAGNOSTICOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS POR ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL - CONTRATO 140 DE 2020.-, se aprobaron informes de diagnostico, presupuestos, techos prespuestales, inicio de actividades, intervenciones y cronogramas de los establecimientos EPMSC CARTAGO Y EPMSC SEVILLA.

SI BIEN EL SEGUIMIENTO SE ESTA REALIZANDO BASADOS EN LOS VALORES CALCULADOS Y PROYECTADOS POR EL CONTRATISTA PARA CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES, SE HA IDENTIFICADO QUE, LOS VALORES DEL DIAGNISTICO NO SON PRECISOS CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÁREA. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN UN ÁREA ESPECIFICA, SE CALCULA CON EL AVANCE REGISTRADO DE LAS OBRAS DURANTE LA SEMANA vs VALOR ANTES REFERENCIADO.

*Teniendo en cuenta el avance de las obras, la Interventoría ha solicitado de manera insistente que se tomen las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento del plazo contractual; por parte del contratista, se han presentado problemas de suministros de materiales e inusmos, pero paralelo con ello se ha visto afectada la ejecución de las obras por las condiciones inherentes al funcionmaiento de los centros penitenciarios.
**Nota:** Una vez el contratista obra remita el balance del contrato ajustado, teniendo en cuenta las condiciones actuales y el cual se ha solicitado y requerido en repetidas oportunidades, se lograra equivalencia entre la ejecución fisica y financiera.
**Avance Fisico Acumulado 47.60% Correspondiente a un valor de $6.160.680.370**
**Avance Financiero Acumulado de 42,93% Correspondiente a un valor de $5.556.543.381,71**

*Se suscribe prorroga al Contrato Obra 140-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y el Consorcio MTO ERON 2020 mediante Otro Si N°4, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 140 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. De acuerdo a la prorroga mencionada en el Otro Si, se le solicita al contratista realizar los respectivos ajustes a las programaciones de los centros penitenciarios de acuerdo al nuevo plazo de ejecución del contrato.
*Se suscribe prorroga y adicción al Contrato Obra 129-2020 celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios "USPEC" y GNG Ingeniería SAS mediante Otro Si N°1, el cual establece en la "CLÁUSULA PRIMERA – PRÓRROGAR: El plazo de ejecución del contrato de obra No. 129 de 2020 hasta el 01 de fmarzo de 2021 y en la "CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIONAR un valor de $ 561.610.123 M/CTE.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_237 -CONMINACIÓN POR PARALIZACIÓN DE OBRAS, AUSENCIA DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS Y MATERIALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATO 140 de 2020- enviado el 28 de diciembre de 2020, se requeire al contratista (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos; (iv) suministrar un cronograma por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato y (v) incluir dentro del cronograma las fechas de entrega de las actividades que se registran “sin intervenir” o que no registran fechas de entrega; sin a la fecha recibir ninguna información.

* Mediante oficio GNG_USPEC_129_2020_EMER_OCCIDENTE_257 -CONMINACIÓN POR PARALIZACIÓN DE OBRAS, AUSENCIA DE PERSONAL Y FALTA DE INSUMOS Y MATERIALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATO 140 de 2020- enviado del 28 de enero de 2021, se requeire nuevamente al contratista (i) informar el cronograma de entregas, de acuerdo con la programación recibida para el trámite y suscripción de Otrosí No 4; (ii) exponer los mecanismos y acciones de mejora a implementar, para dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo vigente, considerando objetivamente que, de acuerdo con lo evidenciado a la fecha y bajo lo dispuesto hasta el momento, difícilmente se logrará la inversión total de los recursos asignados a este contrato; (iii) entregar un balance real que permita definir el avance porcentual preciso de ejecución de las obras; deja esta interventoría expresa constancia que, durante el desarrollo del contrato se ha identificado que, los valores establecidos en la matriz de seguimiento no corresponden a lo realmente invertido por áreas y establecimientos; (iv) suministrar un cronograma por establecimiento ajustado al plazo actual vigente del contrato y (v) incluir dentro del cronograma las fechas de entrega de las actividades que se registran “sin intervenir” o que no registran fechas de entrega; sin a la fecha recibir ninguna información.

Se requiere al contratista dar cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA –NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse al Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, que se encuentra soportado a la solicitud de modificación previo aval técnico de la Subdirección de Construcción y Conservación constituido en el OTROSÍ No. 4 DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS “USPEC” Y EL CONSORCIO MTO ERON 2020– NIT.901.383.436-9

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO
Directora Interventoría

Firma
