

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

INFORME MENSUAL No. 5

DICIEMBRE 18 DE 2020 – ENERO 17 DE 2021

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ING. MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 18/01/2021	ING. MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS FECHA: 18/01/2021	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO FECHA: 19/01/2021
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENORÍA	CARGO: INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.

BOGOTÁ D.C.

2021

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
2.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 9
4. CONTROL DE INTERVENTORÍA 10
4.1. CANTIDADES EJECUTADAS. 10
4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 11
4.3. ASPECTO JURÍDICO. 11
4.4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
4.5. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA. 13
5. CONTROL DE CONTRATO DE OBRA 14
5.1. ASPECTO TECNICO 14
5.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 14
5.1.2. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO (ver anexo.1) 14
5.1.3. INFORMES SEMANALES (ver anexo 2.) 14
5.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO 33
5.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 33
5.1.6. ESTADO ACTUAL DE PROYECTO 33
5.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 33
5.2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA 33
5.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA (ver anexo. 3 y 4) 34
5.3. ASPECTO JURIDICO 44
6. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 45
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 88
9. ANEXOS 89

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con los Estatuto Generales de Contratación Pública, Anticorrupción y en aplicación del artículo 209 de la Constitución Publica, las entidades están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un interventor. En consecuencia, la SED, debió implementar la contratación de la interventoría, para la vigilancia y control del contrato de obra DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4. El cual está compuesto por seis instituciones educativas cuya localización es en la localidad No. 19 denominada Ciudad Bolívar.

El objeto de la contratación de esta Interventoría, además de dar cumplimiento a lo ordenado en el estatuto de contratación, corresponde a la necesidad de verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en los términos de referencia y propuesta y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo, puestos por el Contratista de Obra, en el plazo contractual y dentro de los términos del presupuesto contractual. En términos generales su objeto será supervisar, asesorar, controlar y aprobar el desarrollo del contrato de obra pública, de acuerdo con su alcance, haciendo cumplir en lo aplicable, las especificaciones técnicas y actividades administrativas, legales, labores contables, financieras y presupuestales contractuales, al igual que el aseguramiento integral de la calidad.

El presente informe tiene el fin de informar a la entidad de las actividades desarrolladas durante el quinto mes de ejecución tanto del Contratista de obra, como de la Interventoría, de sus actuaciones, el balance a la fecha, las actividades desarrolladas durante el presente mes, observaciones, recomendaciones y conclusiones.


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto objeto de la contratación está ubicado en la localidad Ciudad Bolívar la cual es la número 19 de Bogotá, es la tercera localidad más extensa, se ubica al sur de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. 360 barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural). La dinámica cultural de la localidad se caracteriza por su diversidad, reflejo de su composición social y multicultural.

El presente contrato de interventoría se compone de 1 proyecto independiente, el cual está conformado por 6 instituciones educativas las cuales se relacionan a continuación:

1. Institución Educativa Sierra Morena sede A.
2. Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B
3. Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.
4. Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.
5. Institución Educativa Fanny Mickey.
6. Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.

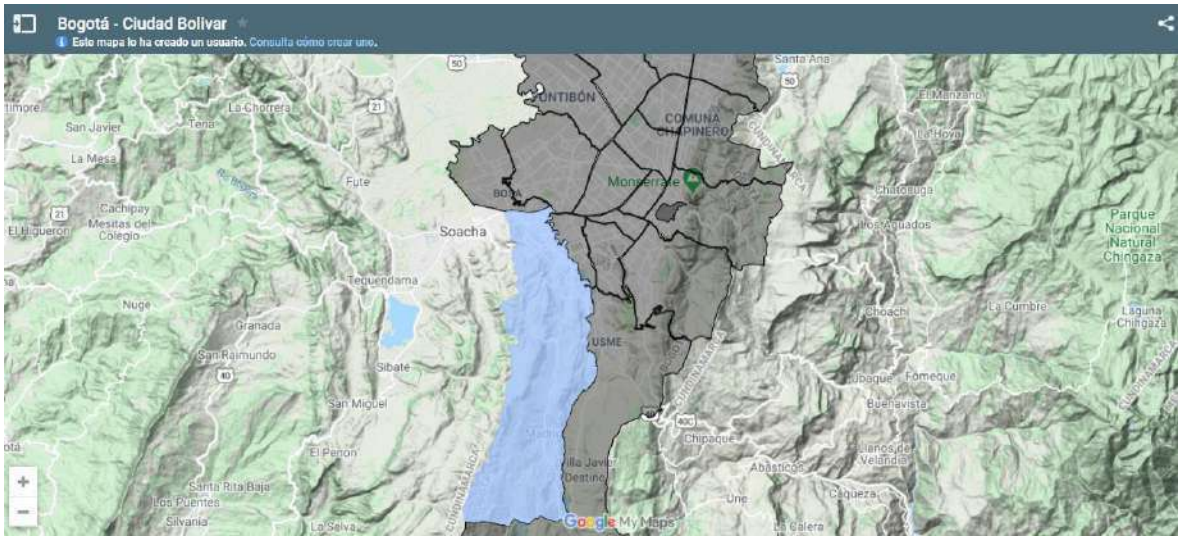

2.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

El estado inicial del proyecto el cual se compone de 6 instituciones educativas a intervenir las cuales son independientes, inicialmente se realizó un diagnostico en donde se evidenciaron las necesidades básicas de cada una, sujeto de mantenimiento y se relacionan a continuación.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Institución Educativa Sierra Morena sede A.	Mantenimiento de ventanearía en los pisos 2, 3 y 4 de la institución.
Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B	Cambio de cubierta, mejoramiento de lavamanos de baterías sanitarias y mejoramiento de muro en sala de sistemas, enchape de pisos en aulas del segundo piso.
Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.	Mejoramiento de zona de esparcimiento con la creación de parque.
Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.	Mejoramiento del sistema de llenado de tanque, y mejoramiento en el sistema de apantallamiento y puesta a tierra de toda la institución, mantenimiento de tablero eléctrico y cambio de algunas lámparas.
Institución Educativa Fanny Mickey.	Mejoramiento del sistema de impermeabilización de algunas placas por problemas de humedad, e instalación de domos cubiertas en terrazas transitables.
Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.	Impermeabilización a tanques, mejoramiento al cerramiento exterior perimetral, realización de sendero peatonal e impermeabilización de una placa.

A transcurrido el quinto mes de ejecución, a la fecha se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 76%, se tiene un programado de 77.65% y ejecutado del 74.13%, de acuerdo a la programación de obra, y se tiene un atraso del 3.52% lo que indica que se han ido superando los porcentajes de atrasos existidos en cada una de las instituciones educativas que se encuentran en intervención, lo que demuestra una leve mejoría en el desarrollo del contrato y se espera que se sigan nivelando los atrasos para así poder llegar a un desarrollo final satisfactorio.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDADES REALIZADAS
	Durante el presente periodo se pudo retomar la actividad de instalación de los vidrios en las

Institución Educativa Sierra Morena sede A.	ventanas del segundo piso y tercer piso, se contó con todo el suministro del vidrio, pero se tuvo que suspender la actividad debido a que el personal administrativo de la institución educativa se encuentra en vacaciones, por lo cual faltaron por instalar 16m2 de vidrio los cuales corresponden tan solo a 2 aulas del tercer piso que corresponden a la biblioteca y aula de profesores, durante el inicio del mes de enero se pudo tener contacto con el personal administrativo y ya se está coordinando para completar esta actividad en el transcurso del mes y poder realizar la entrega de esta institución ya que es la única actividad faltante.
Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B	Durante el presente periodo se continuó con los trabajos en esta institución educativa, se realizó la instalación de la cubierta teja en total, se inició con los trabajos eléctricos como son instalación de tubería, de cableado, entre otros, se continuó con los trabajos en la batería sanitaria, como aplicación y pulida del granito en los mesones, instalación de lavamanos en acero inoxidables, se realizó media caña, enchape en piso, en pared y en mochetas de mesones, se continuó con los trabajos en los pisos de las aulas del segundo piso, como son enchape total, emboquillada de los mismos, se realizó media caña, también se realizaron los trabajos en el aula de sistemas, como son de cubierta, se instaló cielo falso, se realizó demolición de muro y levante de muro estructural.
Institución Educativa Arborizadora baja Sede A.	Durante el presente periodo se continuó con el desarrollo de las actividades de obra, se continuó con la fundida de andenes, se realizó la demarcación de todas las áreas, se realizó lleno de material de común, compactación, instalación de malla en acero, y fundida de todas las placas del parque de acuerdo al diseño aprobado por el rector, se inició con la instalación de pasto en las zonas verdes, se realizó instalación de tableta de tráfico pesado, se tiene el área lista para la construcción de la caseta, se cuenta con el material de obra en un 98%.

Institución Educativa José María Vargas Vila Sede D.	Durante el presente periodo el contratista envió la documentación necesaria para el inicio de actividades, inicio con el desmonte de todo el apantallamiento que se encontraba en la cubierta de toda el colegio, se realizó el suministro de todo el material para el desarrollo de las actividades de apantallamiento y puesta a tierra, se realizó el inicio de la instalación del apantallamiento en toda la cubierta el cual ya se encuentra en un avance del 90%, se tiene previsto terminar en el transcurso del mes con esta actividad completa incluyendo el puesta a tierra.
Institución Educativa Fanny Mickey.	Durante el presente periodo se continuaron con las actividades, se contó con el suministro de materiales como manto para la impermeabilización de las terrazas faltantes, se terminó de realizar el acabado a la terraza transitable 1.
Institución Educativa Confederaciones brisas del Diamante Sede A.	Durante el presente periodo se terminaron de realizar los trabajos en el sendero, se realizó la matera, solo falta realizar dos sillas, se inició con los trabajos en el tanque # 2, se realizó retiro de todo el pañete y se inició con la realización del pañete impermeabilizado, se continuó con la realización de los trabajos en el cerramiento exterior, se realizó el suministro de módulos los cuales se iniciaron a instalar, se realizó la placa de acabado en la terraza transitable.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	18 de Enero de 2021	**PERIODO No.**	05	DEL	**18/12/2020**	AL	**17/01/2021**

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. GRUPO 4.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
CONSORCIO RETORNAR NIT 901.384.708-1 ING. NESTOR ALFONSO ORTIZ CC. 79.109.085 de Bogotá Cra. 65 No. 103 - 81 Int. 4 - 401 Bogotá +57 (1) 315 603 52 02 - 388 43 48 consorcioretornar2020@gmail.com				**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S** NIT 830.123.577-7 ING. Camilo Andrés Rosario Rubio R.L. C.C. 80.228.570 Cra 71a #52a – 17 Normandia +57 (1) 2109456 interventoriausaquen1@gmail.com			
CONTRATO No.	CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020			CONTRATO No.	CO1. PCCNTR 1679920 DE 2020		
FECHA DE SUSCRIPCION:	15/07/2020			FECHA DE SUSCRIPCION:	21/07/2020		
PLAZO INICIAL:	6 MESES			PLAZO INICIAL:	4 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	01/09/2020			FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE AGOSTO DE 2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/02/2021			FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	6 MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	7 MESES		
PLAZO TRANSCURRIDO:	77 Días	EQUIVALE AL	Porcentaje 43%	PLAZO TRANSCURRIDO:	120 Días	EQUIVALE AL	Porcentaje 57 %
VALOR INICIAL :	$1.157.467.111 valor estimado AIU e IVA incluido			VALOR INICIAL :	$ 186.467.050 valor estimado IVA incluido		
VALOR ADICION(ES):	-			VALOR ADICION(ES):	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.157.467.111			VALOR ACTUALIZADO:	$ 186.467.050		
VALOR PAGADO:	$ 303.551.440			VALOR PAGADO:	$ 72.832.963		
VALOR POR PAGAR:	$ 853.915.671			VALOR POR PAGAR:	$ 113.634.087		
INTERVENTOR:	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**			SUPERVISOR:	**LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**		

4. CONTROL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se realiza una trazabilidad de todos aspectos relevantes y no tan relevantes con que ha desarrollado el proyecto en cuanto al control, vigilancia y seguimiento de la interventoría hacia el contratista.

Durante el cuarto mes de ejecución del contrato en mención se puede inferir que la interventoría ha realizado la respectiva revisión de cada una de las actividades que se han venido desarrollando desde la firma del acta de inicio.

El dia 18/12/2020, la interventoría recibió correo electrónico con las observaciones al acta 1 no previstos, por parte de la secretaria distrital de educación, las cuales fueron enviadas al contratista con el objetivo de realizar y radicar nuevamente.

El dia 18/12/2020, la interventoría recibió correo electrónico por parte del contratista con el pago de parafiscales, el cual fue reenviado a la secretaria distrital de educación ya que este hace parte integral de las actas de corte para su respectivo pago.

El dia 18/12/2020, se recibió por parte de la secretaria distrital de educación un correo electrónico como respuesta a solicitud por correo contáctenos –sed, en el cual se realizó la radicación de acta de corte.

El dia 24/12/2020, la interventoría recibió correo electrónico de parte del contratista con la documentación del personal a ingresar en las actividades a desarrollar en el colegio José María Vargas Vila.

El dia 13/01/2021, la interventoría recibió, correo electrónico con oficio en el cual se da las autorizaciones de movilidad para visitas de mejoramientos por parte de la secretaria distrital de movilidad, debido a las restricciones que existen en la ciudad por la pandemia.

El dia 13/01/2021, la interventoría recibió correo electrónico con documento formato acta de entrega y/o recibo a satisfacción obra de mejoramiento.

El dia 13/01/2021, la interventoría recibió correo electrónico por parte del contratista el plan de movilidad segura 2021, para poder desarrollar las actividades en cada colegio en los tiempos de cuarentena.

4.1. CANTIDADES EJECUTADAS.

Durante este quinto periodo de ejecución el contratista continuo con la ejecución de las actividades en los colegios programados tal cual está establecido en los pliegos de condiciones, las cuales se menciona anteriormente tanto el porcentaje de avance de obra como las actividades ejecutadas, las cuales también se relacionan en los informes semanales que se relacionan más adelante.

De igual forma la interventoría durante el presente periodo hemos realizado la respectiva revisión de documentación remitida por el contratista para la realización de las diferentes actividades las cuales se encuentran dentro de la trazabilidad del presente informe, donde se ha revisado y se han realizado las observaciones pertinentes que se han encontrado, lo cual está basado en cada uno de los lineamientos establecidos por el ente contratante.

4.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

RELACION DE PERSONAL INTERVENTORIA		
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Director de Interventoría	Almeida Gamarra Nick Randy	72.005.623
Residente de Interventoría	Meliza Janez Gómez Palacios	1.077.425.387
Especialista en diseño estructural de edificaciones - interventoría	Diego Armando Montoya Medina	7.184.220
Especialista en redes de voz y datos de edificaciones - interventoría	Ricardo Alfredo Ospina López	75.091.899
Especialista en redes hidráulicas sanitarias y de gas en edificaciones - interventoría	Ehida Juliet Ramírez Guina	1.118.537.436
Especialista es salud en el trabajo y salud ocupacional - interventoría	Luz Stella Pineda Bustos	1.026.260.474
Especialista en costos y presupuesto, programación de obra - interventoría	Oscar Javier Godoy Bautista	79.049.924
Especialista en planes de manejo ambiental – interventoría	David Francisco Palacios Torres	11.810.445
Patólogo Estructural – interventoría	Pablo Felipe Estrada Duque	3.229.397
Especialista en Geotecnia – interventoría	José Armando Ruiz Angarita	13.460.203
Abogado – interventoría	Lilian Andrea Rosario Rubio	52.810.605
Inspector de Interventoría	Erika Lizeth González Calderón	1.023.902.943
Inspector de Interventoría	Jhon Fredy García Campos	79.641.482

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	18/08/2020
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	01/09/2020
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

4.3. ASPECTO JURÍDICO.

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. CO1. PCCNTR 1679920 DE 2020	21/07/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA					
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 No. 14-44-101119835 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2020	22/06/2022	$ 37.293.410	Vigente
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/07/2020	22/02/2024	$ 18.646.705	Vigente
	CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2020	22/02/2026	$ 37.293.410	Vigente
ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015 No. 14-44-101119835 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2020	15/07/2022	$ 37.293.410	Vigente
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/08/2020	17/03/2024	$ 18.646.705	Vigente
	CALIDAD DEL SERVICIO	13/08/2020	17/03/2026	$ 37.293.410	Vigente

4.4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO**	**VALOR**	**PAGOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$186.467.050	-	-
VALOR POR EJECUTAR	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	-	$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	-	-	$ 13.319.075
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2		$ 3.803.908.	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2		-	$ 3.803.908.
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3		$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3			$ 13.319.075
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 4		$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 4			$ 13.319.075
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 5		$ 9.166.720	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 5			$ 9.166.720
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 6		$ 6.586.016	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 6			$ 6.586.016
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 7		$ 13.319.075	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 7			$ 13.319.075
VALOR PENDIENTE DE PAGO	-	$ 113.634.087	$ 113.634.087
SUMAS IGUALES	$ 186.467.050	$ 186.467.050	$ 186.467.050

4.5. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE CONTRATO DE OBRA.

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO**	**VALOR**	**PAGOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.157.467.111	-	-
VALOR POR EJECUTAR	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	-	$ 59.004.115	$ 59.004.115
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	-	-	-
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	-	$ 142.251.711	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	-	-	$ 142.251.711
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3	-	$ 102.295.614	-
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 3	-	-	$ 102.295.614
VALOR PENDIENTE DE PAGO	-	$ 853.915.671	$ 853.915.671
SUMAS IGUALES	$ 1.157.467.111	$ 1.157.467.111	$ 1.157.467.111

A la fecha se ha realizado el pago de las 7 facturas de interventoría que se han radicado, así como las 3 del contratista, de igual manera se continuó con la facturación en las fechas establecidas tal cual se relaciona en los balances financieros que se relacionan en el presente informe.

5. CONTROL DE CONTRATO DE OBRA

5.1. ASPECTO TECNICO

5.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante este quinto mes de ejecución se continuaron con las actividades realizadas por parte del contratista las cuales se relacionan a continuación por cada institución educativa.

5.1.2. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO (ver anexo.1)

ACTAS ELABORADAS		
ITEM	ACTA	FECHA
1	ACTA DE VISITAS TECNICA 1	27-08-2020
2	ACTA DE VISITAS TECNICA 2	28-08-2020
3	ACTA DE REUNION 1	01/09/2020
4	ACTA DE REUNION 2	08/09/2020
5	ACTA DE REUNION 3	09/09/2020
6	ACTA DE REUNION 4	18/09/2020
7	ACTA DE REUNION 5	25/09/2020
8	ACTA DE REUNION 6	28/09/2020
9	ACTA DE REUNION 7	29/09/2020
10	ACTA DE REUNION 8	06/10/2020
11	ACTA DE REUNION 9	07/10/2020
12	ACTA DE REUNION 10	16/10/2020
13	ACTA DE REUNION 11	22/10/2020
14	ACTA DE REUNION 12	04/11/2020
15	ACTA DE REUNION 13	18/11/2020
16	ACTA DE REUNION 14	19/11/2020
17	ACTA DE REUNION 15	04/12/2020
18	ACTA DE REUNION 16	18/12/2020
19	ACTA DE REUNION 17	14/01/2021

5.1.3. INFORMES SEMANALES (ver anexo 2.)

INFORMES SEMANALES			
ITEM	INFORMES	OBSERVACIONES	FECHA
1	SEMANA 1	Este periodo transcurrido a partir de la fecha de inicio del contrato de obra del 01 de septiembre de 2020 hasta el 06 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo del 4% en el cual se han realizado las respectivas visitas técnicas de obra de cada una de las instituciones educativas, con el objetivo de realizar la logística necesaria para el inicio de las actividades en cada una de las sedes a intervenir, pertenecientes al grupo 4 en la localidad de ciudad bolívar. Durante la primera semana de ejecución se tiene un programado del 1,94% y un ejecutado del 0,10%, a la fecha se tiene un atraso del 1,84%, el cual no es sustancialmente significativo debido a que se están iniciando los trabajos, además no se han iniciado las labores en los 4 frentes que de acuerdo a los pliegos de condiciones del proceso es lo mínimo exigido, ya que se encuentran en organización de documentos iniciales, en procesos de afiliaciones y en elaboración de los conceptos por cada especialistas para revisión por parte de la interventoría. Durante esta primera semana de ejecución la interventora ha realizado algunas observaciones pertinentes a el contratista, en la entrega de algunos productos como son los formatos que se necesitan para la apertura del PIN AMBIENTAL el cual es necesario para la disposición de los RCD generados durante el desarrollo de las actividades en cada una de las instituciones educativas El contratista en el desarrollo	DEL 01/09/2020

		de esta primera semana de ejecución ha iniciado con la afiliación del personal que va iniciar con el desarrollo de los trabajos en cada una de las sedes educativas pertenecientes al grupo 04. La interventoría desde la firma de su acta de inicio, ha realizado la respectiva revisión de cada uno de los documentos concernientes y considerados como previos y necesarios para la firma del acta de inicio del contrato de obra, iniciando desde la revisión de las hojas de vida, las cuales tuvieron unas observaciones y fueron subsanadas dentro del tiempo establecido, así como los demás documentos concernientes como son: Actas de vecindad para todos los predios aledaños, espacios públicos y zonas del colegio que no se intervendrán. Propuesta económica Programa de ejecución de los trabajos (diagrama de Gantt), indicando secuencia, duración, inicio, final, y ruta crítica de cada una de las actividades relacionadas en la propuesta económica. Programa detallado del recurso humano requerido, indicando la jornada de trabajo para cada una de las semanas. Flujo de inversión Programa de suministros, insumos y equipos a utilizar en el proyecto. Pla de aseguramiento de calidad de obra. Plan de calidad técnico de obra, en el que se indique por cada actividad de obra los ensayos (tipo, caracterización y frecuencia) con los que se garantizara la calidad dela ejecución, junto con los certificados de calidad de materiales por cada frente a invertir. Desglose del A.I.U. Documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato Programa de seguridad industrial Programa de salud ocupacional Programa de manejo ambiental Programa de seguridad y salud en el trabajo Organigrama general del proyecto, en el cual se indique como mínimo para este proyecto, con dedicación exclusiva del personal operativo, cuatro frentes simultáneos de trabajo Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato, para cada uno de los frentes de trabajo y para cada actividad del proyecto Plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición PGRCD Es importante mencionar que se han realizado observaciones a algunos documentos necesarios para la firma del acta de inicio y que a la fecha se encuentra el contratista subsanando, por lo cual toda la documentación allegada por su parte no se encuentra aprobada en un 100%, y una vez sea aprobada será remitida en su totalidad a la supervisión de la SED." "De acuerdo a la programación de obra presentada, los 4 frentes de trabajo con los que se va a iniciar son: Institución Educativa José María Vargas Vila - Sede D - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena En las cuales ya se tiene determinado que actividades se van a desarrollar y cuáles son los frentes a intervenir, en los cuales ya se está organizando el personal y materiales a utilizar." La interventoría espera que el contratista inicie las actividades de obra en la semana siguiente en todos los frentes, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el gobierno nacional y distrital.	AL 06/09/2020
		Este periodo transcurrido a partir del 07 de septiembre de 2020 hasta el 13 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo del 7%, se tiene un programado de 4,28% y ejecutado del 1,70%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, se tiene un atraso cuya diferencia es del 2,59%, esto debido a que en algunos frentes programados aún no se han iniciado las intervenciones. A la fecha ya se iniciaron las actividades de obra en tres frentes como son: Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante, Institución Educativa	

2	SEMANA 2	Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza, Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena. Las cuales se describen más adelante. Es importante mencionar que en la sede Institución Educativa José María Vargas Vila - Sede D - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas aún no se han iniciado los trabajos, ya que el dia 10 de septiembre se recibió por parte del contratista el concepto por parte del especialista encargado, para el desarrollo de los trabajos de apantallamiento y puesta a tierra, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: durante la presente semana se iniciaron los trabajos con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, suministro de materiales e inicio en la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa del segundo piso que cubre la portería y entrada principal de la institución y se iniciaron con los mismos trabajos en la placa que cubre la ludoteca. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: durante la presente semana se iniciaron los trabajos con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra sobre el tanque de almacenamiento de agua en la zona de intermedia de la institución educativa. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se realizó visita por parte del grupo de trabajo del Contratista, Interventoría y SED, con el objetivo de verificar las actividades a realizar y se inició con la toma de medidas del área a intervenir ya que se tiene como prioridad el tercer piso de la institución educativa. A la fecha existen algunos frentes que no se han iniciado actividades, aunque están programados por el contratista, debido a que se encuentran en organización, la interventoría espera que las actividades inicien los más pronto ya que de no ser así, el atraso que se presenta iniciaría a incrementarse y conllevaría a otro tipo de acciones por parte de la interventoría. Es importante mencionar que a la fecha el contratista se encuentra cumpliendo con los protocolos de bioseguridad aprobados por parte de la interventoría. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas a la fecha y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades.	DEL 07/09/2020 AL 13/09/2020
3	SEMANA 3	Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de septiembre de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 11%, se tiene un programado de 6.01% y ejecutado del 3.45%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, y se tiene un atraso del 2,56% por lo cual el contratista debe revisar e implementar planes de acción referente a cada una de las sedes que se encuentra en intervención. A continuación se mencionan los avances de obra en cada una de las sedes que se encuentran en ejecución Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se inició con los trabajos de reforzamiento estructural en las aulas del tercer piso, el cual se ha realizado instalando dos perfiles en aluminio en sentido vertical, dos tubos en sentido horizontal de la mitad hacia abajo, en cada una de las aulas. A la fecha se han intervenido 4 aulas del tercer piso y 4 aulas del segundo piso y se continuara con esta actividad en el resto de las aulas del tercer piso con el objetivo de disminuir el movimiento de la estructura cuando se presentan las fuertes corrientes de vientos. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la ludoteca. También se	DEL 14/09/2020

		contó con la asesoría de en cuanto a sistemas y productos de impermeabilización por parte de la empresa Costella y ATP Construcciones. Además se inició con la realización del mortero en la placa 1. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el retiro de alistado, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la uno de los tanques de almacenamiento de agua. También se contó con la asesoría de en cuanto a sistemas y productos de impermeabilización por parte de la empresa Costella y ATP Construcciones Es importante mencionar que a la fecha el contratista se encuentra cumpliendo con los protocolos de bioseguridad aprobados por parte de la Interventoría, como son lavado de manos, toma de temperatura, utilización de alcohol y gel antibacterial, capacitaciones etc La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades. El dia viernes se realizó recorrido con el profesional apoyo a la supervisión SED, Interventoría, Contratista, con el objetivo de revisar los avances de obra a la fecha, además se realizó comité de seguimiento, donde se establecieron compromisos con el contratista los cuales se mencionan a continuación "COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: El contratista debe enviar los APUs NO PREVISTOS, con sus respectivas cotizaciones, ya que estos deben ser revisados y avalados por parte de la Interventoría así como por parte de la SED. El contratista debe enviar el plano del sendero que se propone realizar en el colegio confederaciones, con el objetivo de revisar, presentar a la SED en este caso rectoría de la institución, para su visto bueno. El contratista debe presentar el sistema de impermeabilización que va a utilizar en cada una de las áreas que se debe realizar. La interventoría sugiere al contratista se cumplan todos los compromisos adquiridos en cada comité de seguimiento.	AL 17/09/2020
4	SEMANA 4	Este periodo ha transcurrido a partir del 21 de septiembre de 2020 hasta el 27 de septiembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 15%, se tiene un programado de 9,51% y ejecutado del 7,43%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra se tiene un atraso de 2,08, el cual es debido a la demora del contratista en presentar los productos que se tiene pendientes por entregar, es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir, de igual manera el flujo de inversiones ya que presentan faltas en los costos por sede. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se continuó con los trabajos de reforzamiento estructural en las aulas del tercer piso, el cual se ha realizado instalando dos perfiles en aluminio en sentido vertical, dos tubos en sentido horizontal de la mitad hacia abajo, un tubo en el centro de la estructura en sentido horizontal en cada una de las aulas. A la fecha se han intervenido 8 aulas del tercer piso y 6 aulas del segundo piso. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos.	DEL 18/09/2020 AL 27/09/2020

		Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra contigua a la ludoteca. Además se continuó con la realización del mortero de nivelación en la placa 1, en la placa de la ludoteca se realizó en su totalidad y se realizó el sellado de fisuras Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se terminó con el retiro de alistado, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría. Todas estas actividades se realizaron en la placa que cubre la uno de los tanques de almacenamiento de agua. Posteriormente se realizó el mortero de nivelación en esta placa en su totalidad. También se realizó revisión de matera y sellado de fisuras. Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se iniciaron las actividades en la parte hidráulica, donde se inició con excavación y apertura para introducir la tubería desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento de agua y poder mejorar el llenado del mismo. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades. El dia viernes se realizó recorrido con el profesional apoyo a la supervisión SED, Interventoría, Contratista, con el objetivo de revisar los avances de obra a la fecha, además se realizó comité de seguimiento, donde se establecieron compromisos con el contratista que se espera se cumplan a cabalidad. "COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: La interventoría deja claro en el acta de comité de seguimiento que existe mucha preocupación debido a que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos por parte del contratista y que de seguir así se realizaran los llamados de atención necesarios, ya que se pactan unos productos y no se entregan, por lo cual se deben reprogramar, por lo que se espera esta vez sí se cumplan estos compromisos." "Entrega de No Previstos con sus cotizaciones Presupuesto del costo de estudios de mediciones de descargas para puesta a tierra y apantallamiento en José María Vargas Vila Sistema de impermeabilización a usar en placas y tanques Propuesta de sendero Propuesta de malla de cerramiento perimetral en confederaciones brisas del diamante.	
5	SEMANA 5	Este periodo ha transcurrido a partir del 28 de septiembre de 2020 hasta el 04 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 19%, se tiene un programado de 13,53% y ejecutado del 8,08%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con el levantamiento de adoquín, alistado, manto existente, acopio de residuos generados en lona, organización de estos residuos en sitios autorizados por la institución educativa y la interventoría, con la disposición final de estos residuos. Todas estas actividades se realizaron en la placa que se encuentra contigua a la ludoteca. Además se realizó el mortero de nivelación en esta placa en su totalidad y se realizó el sellado de fisuras.	DEL 28/09/2020 AL 04/10/2020

		Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se realizó descapote y limpieza de la zona en la que se va a realizar el sendero, el cual ya el contratista presento la propuesta y el diseño y se encuentra en revisión. Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se continuaron con las actividades en la parte hidráulica, donde se inició con excavación de material común y apertura o perforaciones en concreto para introducir la tubería desde la acometida hasta el tanque de almacenamiento de agua y poder mejorar el llenado del mismo, se realizó la tapa para la caja de la acometida principal hidráulica y se inició con la construcción de esta caja. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana se inició con el suministro de los vidrios a instalar y se falta un aula por realizar el reforzamiento estructural ya que se está coordinando con el personal de la institución para el permiso de ingreso. "Para la siguiente semana se tiene previsto realizar el acta de vecindad en la Institución educativa San Isidro Labrador con el objetivo de iniciar con las actividades de mantenimiento contempladas. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades." En la presente semana el contratista presento el sistema de impermeabilización a realizar tanto en Fanny Mickey y Confederaciones brisas del diamante, así mismo se presentó la ficha técnica del producto y presupuesto "COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: Una vez más se da la oportunidad al contratista de cumplir con los requerimientos que realiza la interventoría y se realiza llamado de atención en acta de comité, debido a la falta de compromiso de su parte en temas técnicos y administrativos, además se reitera que la entrega de la cuenta 1 debe ser antes de la fecha de entrega de la entidad contratante. NP Sierra Morena Concepto Técnico Sierra Morena Sistemas de Impermeabilización Sistema de impermeabilización tanques Propuesta Sendero Propuesta Cerramiento"	
6	SEMANA 6	Este periodo ha transcurrido a partir del 05 de octubre de 2020 hasta el 11 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 22%, se tiene un programado de 23,06% y ejecutado del 10,51%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución, la cual a la fecha no se ha entregado y se ha solicitado en reiteradas ocasiones. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se inició con la realización de la impermeabilización de terrazas con manto foil de aluminio, el cual se inicia a instalar después de la aplicación de la emulsión asfáltica. Es importante mencionar que al finalizar la semana esta actividad fue suspendida	DEL 05/10/2020 AL 11/10/2020

		debido a que el contratista no cuenta con materiales en la obra. También se terminó con la realización del mortero de nivelación de las placas. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se inició con la realización del vaciado del tanque 1, e inicio de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización. Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se terminó de realizar la caja donde se encuentra la acometida principal, se realizó la prueba de llenado del tanque la cual duro más de 24 horas, con el objetivo de verificar el estado de la tubería instalada, se procedió a tapar el trazado de la tubería desde la acometida hasta el tanque y se programó la entrega de esta actividad a la institución educativa. El dia marte de 06 de octubre del año en curso, se realizó visita de los especialistas eléctricos de la SED, Interventoría y Contratista, para verificar la parte del apantallamiento y puesta a tierra en el colegio, esto con el objetivo de revisar su estado y revisar la propuesta del contratista. De la visita quedo el compromiso de por parte de la SED de enviar los planos eléctricos del colegios existentes y un informe por parte del especialista electricista acerca del apantallamiento y puesta a tierra. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso. Para la siguiente semana se tiene previsto iniciar con las actividades de mantenimiento contempladas en la Institución Educativa San Isidro Labrador sede B, ya se inició con la realización de las actas de vecindad de las viviendas aledañas, así como de las áreas del colegio que no serán intervenidas. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades. "COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: A la fecha el contratista no ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos. NP Sierra Morena Concepto Técnico Sierra Morena Sistemas de Impermeabilización Sistema de impermeabilización tanques Propuesta Sendero Propuesta Cerramiento.	
7	SEMANA 7	Este periodo ha transcurrido a partir del 12 de octubre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 26%, se tiene un programado de 16,70% y ejecutado del 10,94%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución. Lo que a la fecha no han entregado. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. "Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se realizó el levantamiento de un área pequeña de adoquín de la placa del	DEL 12/10/2020 AL 17/10/2020

		tercer piso frente a la biblioteca, y se realizó el sellado de fisuras y el mortero de nivelación, además se realizó la aplicación de la emulsión en las terrazas para la continuación de la impermeabilización. Actividades faltantes: Impermeabilización de placas de segundo piso, instalación de domos aprobados. Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. "Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización del vaciado del tanque 2, y de retiro de pañete de este tanque, con el objetivo de preparación para su posterior impermeabilización, también se realizó el acopio de escombros generados y retiro de los mismos. Actividades faltantes: Impermeabilización de placa sobre tanque 1 y acabados, impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento del cerramiento perimetral hasta portería 1, sendero. Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizaron actividades debido a que ya se terminaron los trabajos de la parte hidráulica y se está a la espera del informe de la parte eléctrica. La interventoría realizó verificación del estado final de los trabajos. Actividades faltantes: Apantallamiento y puesta a tierra. Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar concepto técnico de las actividades que se deben realizar y que se han realizado firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. "Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se desarrolló ninguna actividad en la institución educativa debido a que el contratista no ha entregado los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación de estos vidrios, así como debe suministrar unos andamios certificados, es importante mencionar que dentro de la intervención fueron 10 aulas en el tercer piso y 6 aulas en el segundo piso. Actividades faltantes: A la fecha falta la instalación de vidrios en las aulas del tercer piso, los cuales no ha podido realizar debido a que a la fecha no ha presentado los andamios certificados y los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación. Documentos faltantes: A la fecha le falta presentar los no previstos que se han generado en esta institución, con tres cotizaciones por NP, y justiciados. Concepto técnico de las actividades realizadas firmadas por el profesional encargado. Presupuesto ajustado, programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. Institución Educativa San Isidro Labrador Sede B: Se inició con el desarrollo de las actividades en las baterías sanitarias, se realizó la demolición del lavamanos de la batería del segundo piso, se realizó el acopio de los residuos generados en lonas y disposición de ellos en sitio de acopio autorizado. Es importante mencionar que debido a la falta en la entrega de la documentación por parte del contratista, la interventoría se vio obligada a suspender las actividades ya que inicialmente se debe anexar lo solicitado. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades	
		Este periodo ha transcurrido a partir del 19 de octubre de 2020 hasta el 26 de octubre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 31%, se tiene un programado de 21,52% y ejecutado del 12,50%, a la fecha de acuerdo a la programación de obra, pero es importante mencionar que la programación de obra debe ser actualizada de acuerdo a lo encontrado en las I.E. que se encuentran en intervención, así como las que se piensan intervenir. La interventoría solicito al contratista la programación y flujo de inversión actualizado de acuerdo a las actividades a desarrollar en cada Institución educativa y de acuerdo al presupuesto disponible para cada institución. Lo que a la fecha no han entregado.	

8	SEMANA 8	AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. "Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con las actividades, se realizó reinicio de la instalación del manto foil de aluminio en las terrazas. El dia 22 de octubre el contratista radico una parte de los documentos faltantes como son, presupuestos, esquema y procedimiento de cada actividad a realizar, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. Actividades faltantes: Impermeabilización de placas de segundo piso, instalación de domos aprobados. Documentos faltantes: Programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado." "Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el retiro de pañete de este tanque, con el acopio de escombros generados y retiro de los mismos. Se realizó la aplicación de la emulsión asfáltica de la placa que se encuentra sobre el tanque 1 y se inició con el perfilamiento y alistado del área del sendero. El dia 22 de octubre el contratista radico una parte de los documentos faltantes como son, presupuestos, esquema y procedimiento de cada actividad a realizar, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. Actividades faltantes: Impermeabilización de placa sobre tanque 1 y acabados, impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua, mejoramiento del cerramiento perimetral hasta portería 1, sendero. Documentos faltantes: Programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. Institución Educativa San Isidro Labrador - Sede B: Se continuó con el desarrollo de las actividades en las baterías sanitarias, se realizó la demolición del lavamanos de las baterías sanitarias, se realizó el acopio de los residuos generados en lonas y disposición final de ellos. El dia 22 de octubre el contratista radico una parte de los documentos faltantes como son, presupuestos, esquema y procedimiento de cada actividad a realizar, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. "Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se inició con el suministro de vidrios de acuerdo a las medidas tomadas en cada una de las aulas. A la fecha se han suministrado 125m2 de vidrios El dia 22 de octubre el contratista radico una parte de los documentos faltantes como son, presupuestos, esquema y procedimiento de cada actividad a realizar, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. Actividades faltantes: A la fecha falta la instalación de vidrios en las aulas del tercer piso, los cuales no ha podido realizar debido a que a la fecha no ha presentado los andamios certificados y los cursos de altura del personal que va a realizar la instalación. Documentos faltantes: Programación de obra ajustada y flujo de inversión actualizado. La interventoría a la fecha se encuentra realizando seguimiento continuo a los protocolos y a todas las normas vigentes que aplican de acuerdo a las actividades realizadas y se espera que en la siguiente semana se tenga un avance significativo en el desarrollo de las actividades	DEL 19/10/2020 AL 25/10/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 26 de octubre de 2020 hasta el 01 de noviembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 33%, se tiene un programado de 30,96% y ejecutado del 12,55%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el dia 26 de octubre de 2020, donde se refleja un atraso del 18,41%. Es importante mencionar que los porcentajes de ejecutado y programado el contratista los tiene de acuerdo al alcance del contrato en cada colegio, de igual manera se sigue presentando atrasos significativos, se observa desabastecimiento de material	

9	SEMANA 9	en obra, y falta de personal de obra, sin embargo el alcance en cada colegio es evidente y se ha dejado claro en cada comité realizado. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la instalación del manto impermeabilizante en las terrazas no transitables, se realizó el retiro el retiro del manto que se encuentra en la cubierta del área de la administración, se realizó sellado y aplicación de emulsión asfáltica, así mismo se realizó en las placas transitables que se han intervenido, se aplicó la emulsión asfáltica. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día sábado 19 de diciembre de 2020. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización del pañete impermeabilizado en el tanque # 1. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 9 de enero de 2021. Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad, se está a la espera del informe eléctrico del profesional de la SED, de la parte eléctrica, para tomar las acciones que sean necesarias. El contratista no ha presentado la reprogramación de obra. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día Sábado 21 de noviembre de 2020. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en las baterías sanitarias, se realizó pañete de paredes, de muretes, se formaleteo para la elaboración de mesones. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 13 de enero de 2021. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: No se han iniciado las actividades aun, solo se presentó el esquema para la revisión y aprobación por parte de la interventoría y la entidad. La interventoría ve con preocupación el avance de obra en la ejecución del contrato en mención, ya que se observa en los diferentes frentes de trabajo la escases de materiales y el poco personal, por lo que ha realizado llamados de atención al contratista con el objetivo de generar preocupación y motivación en él, lo que ha sido imposible y de seguir así la interventoría tomara las medidas necesarias.	DEL 26/10/2020 AL 01/11/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 26 de octubre de 2020 hasta el 01 de noviembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 38%, se tiene un programado de 34,29% y ejecutado del 13,67%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el dia 26 de octubre de 2020, donde se refleja un atraso del 20,61%. Es importante mencionar que los porcentajes de ejecutado y programado el contratista los tiene de acuerdo al alcance del contrato en cada colegio, de igual manera se sigue presentando atrasos significativos, se observa desabastecimiento de material en obra, y falta de personal de obra, sin embargo el alcance en cada colegio es evidente y se ha dejado claro en cada comité realizado. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.	

10	SEMANA 10	SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la instalación del manto impermeabilizante en las terrazas no transitables las cuales quedaron terminadas y se realizó la instalación del manto foil de aluminio en la cubierta del área de la administración, la cual quedo sin terminar debido a que se acabó el material. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día sábado 19 de diciembre de 2020. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización del pañete impermeabilizado en el tanque # 1, se continuó con la perfilación de terreno y entibado en el sendero. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 9 de enero de 2021. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad, se recibió por parte de la SED el informe eléctrico del profesional de la SED, de la parte eléctrica, el cual se encuentra en revisión del contratista y de interventoría para tomar las acciones que sean necesarias. El contratista no ha presentado la reprogramación de obra. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se realizó el suministro de los andamios certificados, se suministraron los cursos de altura y se inició con la instalación de los vidrios en las ventanas del tercer piso. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día Sábado 21 de noviembre de 2020 Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en las baterías sanitarias, se continuó con pañete de paredes, de muretes, se continuó con el formaleteo para la elaboración de mesones. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 13 de enero de 2021. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: No se han iniciado las actividades aun, solo se presentó el esquema para la revisión y aprobación por parte de la interventoría y la entidad. La interventoría ve con preocupación el avance de obra en la ejecución del contrato en mención, ya que se observa en los diferentes frentes de trabajo la escases de materiales y el poco personal, por lo que ha realizado llamados de atención al contratista con el objetivo de generar preocupación y motivación en él, lo que ha sido imposible y de seguir así la interventoría tomara las medidas necesarias.	DEL 02/11/2020 AL 08/11/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 09 de noviembre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 42%, se tiene un programado de 40,61% y ejecutado del 14,43%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el día 26 de octubre de 2020, donde se refleja un atraso del 26,18%. Es importante mencionar que los porcentajes de ejecutado y programado el contratista los tiene de acuerdo al alcance del contrato en cada colegio, de igual manera se sigue presentando atrasos significativos, se observa desabastecimiento de material en obra, y falta de personal de obra, sin embargo el alcance en cada colegio es evidente y se ha dejado claro en cada comité realizado. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.	

11	SEMANA 11	BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la instalación del manto impermeabilizante foil de aluminio en la cubierta del área de la administración, la cual quedo terminada en su totalidad, y fue la única actividad que se realizó en la presente semana. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día sábado 19 de diciembre de 2020. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se terminó con la realización del pañete impermeabilizado en el tanque denominado # 1, se continuó con la realización de trabajos en el sendero, como la realización del bordillo, y se realizó la impermeabilización de la terraza que se encuentra sobre el tanque #1, con manto permaplay. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 9 de enero de 2021. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad, se está a la espera que el contratista emita la propuesta para la realización del mantenimiento de la parte eléctrica, es importante mencionar que la Interventoría emitió el informe eléctrico de la SED, al contratista y de igual manera se emitió la interpretación y recomendaciones del mismo por parte de la interventoría. El contratista no ha presentado la reprogramación de obra. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se continuó con la instalación de los vidrios en las ventanas del tercer piso, a la fecha se ha realizado la instalación de vidrios en 5 aulas completas del tercer piso. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día Sábado 21 de noviembre de 2020. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en las baterías sanitarias, se continuó con pañete de paredes en la batería sanitaria faltante, se realizó la fundida de los tres mesones y la extensión de uno, se inició con el enchape de muros. El contratista entrego la reprogramación de obra, en la cual establece que la fecha de terminación de las actividades en este colegio es para el día 13 de enero de 2021. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: No se han iniciado las actividades aun, solo se presentó el esquema para la revisión y aprobación por parte de la interventoría y la entidad, la cual está en revisión de la SED y se tiene previsto una reunión con rector para definir el esquema. La interventoría ve con preocupación el avance de obra en la ejecución del contrato en mención, ya que se observa en los diferentes frentes de trabajo la escases de materiales y el poco personal, por lo que ha realizado llamados de atención al contratista con el objetivo de generar preocupación y motivación en él, lo que ha sido imposible y de seguir así la interventoría tomara las medidas necesarias. Además es mi portante mencionar que las fuertes lluvias de la presente semana impidieron el desarrollo de trabajos en algunas áreas y zonas de algunas instituciones educativas. El contratista durante la presente semana presento el corte 2, al cual se le realizaron unas observaciones, de igual manera envió la documentación para iniciar proceso de cesión del contrato, la cual también se devolvió debido a que se encontraba incompleta, una vez se alleguen las observaciones realizadas, la interventoría procederá a realizar la respectiva revisión.	DEL 09/11/2020 AL 15/11/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 16 de noviembre de 2020 hasta el 22 de noviembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 46%, se tiene un programado de 41,24% y ejecutado del 15.96%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el día 26 de octubre de 2020, donde se refleja un atraso del 25,27%. Es importante mencionar que los porcentajes de ejecutado y programado el contratista los tiene de acuerdo al alcance del contrato en cada colegio, de igual manera	

12	SEMANA 12	se sigue presentando atrasos significativos, se observa desabastecimiento de material en obra, y falta de personal de obra, sin embargo el alcance en cada colegio es evidente y se ha dejado claro en cada comité realizado. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana no se realizó actividad alguna debido a que se encuentra sin material para la continuación del mismo. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se terminó de realizar unos afinados en el pañete impermeabilizado en el tanque denominado # 1, se continuó con la realización de trabajos en el sendero, como la realización del bordillo, se realizó limpieza de las cajas que se encuentran en el área de influencia del sendero para la respectiva realización de las mismas. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana el contratista realizó visita a la institución educativa con el especialista eléctrico con el objetivo de presentar un propuesta para la realización del mantenimiento de la parte eléctrica del colegio. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se continuó con la instalación de los vidrios en las ventanas del tercer piso, cuya actividad tuvo que ser suspendida debido a que se terminó el vidrio que se tenía en sitio. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en las baterías sanitarias, se continuó con pañete de paredes en la batería sanitaria faltante, se continuó con el enchape de baterías sanitarias en muros. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se realizó reunión con el rector con el objetivo de definir esquema a utilizar, el contratista presentó un esquema que fue aprobado por la SED Rector del colegio y se espera que la siguiente semana el contratista envié la documentación previa inicial para autorizar el inicio de las actividades. La interventoría ve con preocupación el avance de obra en la ejecución del contrato en mención, ya que se observa en los diferentes frentes de trabajo la escases de materiales y el poco personal, por lo que ha realizado llamados de atención al contratista con el objetivo de generar preocupación y motivación en él, lo que ha sido imposible y de seguir así la interventoría tomara las medidas necesarias. Además es mi portante mencionar que las fuertes lluvias de la presente semana impidieron el desarrollo de trabajos en algunas áreas y zonas de algunas instituciones educativas. "El contratista durante la presente semana presento nuevamente la documentación con la solicitud de la cesión total del contrato, la cual se encuentra en estudio por parte de la Interventoría y se tiene previsto dar respuesta el dia lunes 23 de noviembre de 2020. Además se realizó reunión con el equipo técnico de la SED, para revisión del estado del contrato de obra perteneciente al grupo 4."	DEL 16/11/2020 AL 22/11/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 23 de noviembre de 2020 hasta el 29 de noviembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 49%, se tiene un programado de 31,88% y ejecutado del 19,80%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el día 23 de noviembre de 2020, donde se refleja un atraso del 12,07%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha iniciado con el suministro de materiales y con el incremento en los frentes de trabajo.	

13	SEMANA 13	AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad pero se tiene previsto reiniciar actividades la próxima semana. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con la realización de piso impermeabilizado en el tanque denominado # 1, se continuó con la realización de trabajos en el sendero, como lleno y compactación, se realizó inicio con los trabajos de mantenimiento del cerramiento exterior, como retiro de material corroído, masillado. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en las baterías sanitarias de enchape de muros, se inició con la demolición de pisos, se inició con el retiro de pañete en un aula por problemas de humedad, se inició con ls trabajos de cubierta, se suministró materiales como la teja de la cubierta, el enchape del piso de las aulas, etc. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se está a la espera que el contratista envié la documentación previa inicial para autorizar el inicio de las actividades. La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.	DEL 23/11/2020 AL 29/11/2020
14	SEMANA 14	Este periodo ha transcurrido a partir del 30 de noviembre de 2020 hasta el 06 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 53%, se tiene un programado de 33,18% y ejecutado del 24,20%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el día 23 de noviembre de 2020, donde se refleja un atraso del 8,99%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha iniciado con el suministro de materiales y con el incremento en los frentes de trabajo. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se reiniciaron las actividades, se contó con el suministro de materiales como manto para la impermeabilización de las terrazas intervenidas, se inició con la realización de las cañuelas en la primera terraza transitable que se encuentra sobre el área de portería. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento	DEL 30/11/2020 AL 06/12/2020

		exterior, se continuó con los trabajos en el sendero como la fundida de las placas, a la cual se le dio su respectivo acabado y se le aplico agua para su proceso de curado. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica." Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, como enchape, de muros, se inició con la marcada para la cañuela debajo del mesón de lavamanos, se inició con los trabajos de cubierta, como pintura de estructura metálica y platinas, y se continuó con las actividades en los pisos de las aulas del segundo piso, como realización de mortero de nivelación y enchape Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se inició con las actividades de cerramiento provisional en lona verde, descapote y limpieza, retiro de material proveniente de esta limpieza y demarcación de áreas La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.	
15	SEMANA 15	Este periodo ha transcurrido a partir del 07 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 57%, se tiene un programado de 34,77% y ejecutado del 26,94%, de acuerdo a la reprogramación de obra actualizada remitida el día 23 de noviembre de 2020, donde se refleja un atraso del 7,83%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha iniciado con el suministro de materiales y con el incremento en los frentes de trabajo, lo cual indica que se puede obtener una nivelación del atraso. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con las actividades, se inició con la impermeabilización de las terrazas transitables, como es la instalación del manto asfaltico. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento exterior, se realizó el reemplazo de 6 módulos de malla, las cuales se encontraban en mal estado, se inició con la fabricación de módulos en taller, para la instalación de los módulos adicionales de acuerdo a la propuesta aprobada. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica." Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad, se tiene conocimiento que se encuentran en corte de vidrio para su instalación. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, se realizó la media caña, se continuó con enchape de piso en las aulas, se realizó el sellado de fisura en un aula y se instaló membrana para su posterior realización del mortero de nivelación, se iniciaron los trabajos de pintura de la cubierta Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se continuó con las actividades de localización y replanteo de las áreas, se contó con el suministro de material para el desarrollo de los trabajos, se inició con la excavación de material común, se inició con la instalación de sardinel prefabricado.	DEL 07/12/2020 AL 13/12/2020

		La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.	
16	SEMANA 16	Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 61%, se tiene un programado de 44,75% y ejecutado del 39,51%, donde se refleja un atraso del 5,24%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha iniciado con el suministro de materiales y con el incremento en los frentes de trabajo, lo cual indica que se puede obtener una nivelación del atraso. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con las actividades, se terminó con la impermeabilización de la primera terraza transitable, y se continuó con la realización del acabado de esa terraza, se cuenta con el material en obra. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento exterior, se continuó con la fabricación de módulos en taller para la instalación de los módulos adicionales de acuerdo a la propuesta aprobada. Se realizó la instalación del primer módulo como muestra con el objetivo de que sea revisado y aprobado por las partes interesadas, el cual estuvo acorde a lo aprobado por la interventoría. Se terminó el sedero peatonal, al cual solo le falta la jardinera por terminar, y se inició con la instalación del acabado en la terraza transitable. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se inició con el suministro de los vidrios faltantes. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, se realizó la instalación de granito en los mesones de los lavamanos, se instalaron los lavamanos en acero inoxidable, se definió el tipo de grifería a utilizar, se continuó con el enchape de pisos, y se inició con la instalación de la cubierta, en este colegio se tiene el suministro de material en un 95%. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se continuó con las actividades de realización de andenes perimetral, con sardinel y bordillos prefabricados, se realizó lleno con material común y se realizó compactación. La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.	DEL 14/12/2020 AL 20/12/2020
		Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 65%, se tiene un programado de 45,64% y ejecutado del 43,53%, donde se refleja un atraso del 2,11%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha continuado con el suministro de materiales de manera constante y con el incremento en los frentes de trabajo, lo cual indica que se puede obtener una nivelación del atraso. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.	

17	SEMANA 17	SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la actividad de realización del acabado de esa terraza, se cuenta con el material en obra. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento exterior se están instalando todas los módulos que quedaran dobles, se continuó con la fabricación de módulos en taller para la instalación de los módulos adicionales de acuerdo a la propuesta aprobada, se continuo con los trabajos en el sendero, se terminó de realizar escalinatas y matera y se continuó con la instalación del acabado en la terraza transitable. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se retomó la actividad de instalación de vidrios en las aulas de los 2, 3 pisos, se suministró el vidrio faltante en un 100%. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, se realizó la pulida del granito aplicado, en los mesones de los lavamanos, se continuó con el enchape de pisos en las aulas, y se continuó con la instalación de la teja en la cubierta. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se continuó con las actividades de andenes perimetral, con sardinel y bordillos prefabricados, se realizó lleno con material común y se realizó compactación, se realizó malla en sitio con hierro y se inició con fundida de andenes, también se inició con la instalación de bordillos para conformar las zonas para las placas. La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.	DEL 21/12/2020 AL 27/12/2020
18	SEMANA 18	Este periodo ha transcurrido a partir del 28 de diciembre de 2020 hasta el 03 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 69%, se tiene un programado de 73,89% y ejecutado del 68,37%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 5,53%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la portería, se terminaron de realizar las cenefas y se inició con la fundida de las placas. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de módulos encima de los módulos existentes después de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los módulos, se continuó con los trabajos en la terraza, la cual quedo terminada, se sacaron los cilindro como muestras para medir la resistencia del concreto	DEL 28/12/2020 AL 03/01/2021

		"Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se retomaron las actividades en este colegio, se realizó el retiro total de todo el apantallamiento existente y se inició con el suministro de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad debido a que en el colegio por falta de personal de la parte administrativa, no se pudieron instalar 16m2 de vidrio, los cuales se encuentran en la institución educativa a esperas de que llegue de sus respectivas vacaciones el personal administrativo con el objetivo de poder instalar estos vidrios y realizar la respectiva entrega de las actividades realizadas en este colegio. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta, se continuó con la instalación de la teja, la cual se encuentra casi terminada, también se continuó con los trabajos de enchape de piso, se realizó media caña entre muros y pisos en granito pulido, se continuó con los trabajos en mesones de batería sanitaria, enchape de mochetas con cerámica. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se realizó la prueba de densidades, se sacaron las muestras de concreto para medir la resistencia del concreto que se está utilizando en la fundida de los andenes y las placas. La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continúe con el desarrollo de las obras de la misma manera.	
19	SEMANA 19	Este periodo ha transcurrido a partir del 04 de enero de 2021 hasta el 10 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 72%, se tiene un programado de 75,55% y ejecutado del 71,13%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 4,43%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la portería, se continúa con la fundida de las placas. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de módulos encima de los módulos existentes después de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los módulos, y se inició con los trabajos de retiro de pañete existente en el tanque subterráneo de almacenamiento de agua # 2, al cual se le realizó el vaciado del agua que tenía en su interior. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de apantallamiento se inició con la instalación del mismo en toda el área de la cubierta del colegio. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad debido a que en el colegio por falta de personal de la parte administrativa, no se pudieron instalar 16m2 de vidrio, los cuales se encuentran en la institución educativa a esperas de que llegue de sus respectivas vacaciones el personal administrativo con el objetivo de poder instalar estos vidrios y realizar la respectiva entrega de las actividades realizadas en este colegio.	DEL 04/01/2021 AL 10/01/2021

		Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta como son la parte eléctrica, se realizó la instalación de tubería y de cableado, también se continuó con el acabado del enchape de piso. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se realizó la fundida de placas, se realizó la instalación de pasto en las zonas verdes. La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continúe con el desarrollo de las obras de la misma manera.	
20	SEMANA 20	Este periodo ha transcurrido a partir del 11 de enero de 2021 hasta el 17 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 76%, se tiene un programado de 77,65% y ejecutado del 74,13%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 3,52%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades. AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales. SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo. BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID. Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la portería, se continúa con la fundida de las placas la cual quedo terminada. Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de módulos encima de los módulos existentes después de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los módulos, y se inició con los trabajos de retiro de pañete existente en el tanque subterráneo de almacenamiento de agua # 2, al cual se le realizó el vaciado del agua que tenía en su interior, cuya actividad quedo casi terminada. "Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se con continuó con los trabajos de apantallamiento con la instalación del mismo en toda el área de la cubierta del colegio. Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad pero se pudo establecer comunicación con personal encargado de la parte administrativa del colegio y se tiene previsto instalar los m2 faltantes la semana siguiente y así poder realizar la entrega de estas actividades en esta institución educativa. Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta como son la parte eléctrica, se cuenta con el suministro del material como son lámparas, tubería, cableado entre otros, se continúa con la instalación de tubería y de cableado, también se continuó con el acabado del enchape de piso y se suministró material faltante para terminar trabajos en batería sanitaria, también se realizó demolición de muro de la sala de sistemas que tenía problemas de asentamiento, se retiró el escombro generado y se realizó el levantamiento de un muro estructural, dejando el espació respectivo para la instalación de la ventana de acuerdo a los conceptos estructurales. Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se continuó con la fundida de placas, se realizó la instalación de pasto en las zonas verdes. La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continúe con el desarrollo de las obras de la misma manera.	DEL 11/01/2021 AL 17/01/2021

5.1.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

ENSAYOS ELABORADOS			
ITEM	ENSAYO	FECHA	RESULTADO
1	Muestras de concreto	23/12/2020	
2	Muestras de concreto	24/12/2020	
3	Prueba de densidades	29/12/2020	

5.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Este se encuentra de manera detallada en cada uno de los informes semanales que se adjuntan al presente informe.

5.1.6. ESTADO ACTUAL DE PROYECTO

El presente proyecto se encuentra en ejecución, a la fecha de corte del presente informe se encuentran una sede sin actividad, la cual está en un 98% de ejecución y a esperas de terminación.

5.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

5.2.1. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA

Personal aprobado por la interventoría.

RELACION DE PERSONAL CONTRATISTA			
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NESTOR ALFONZO ORTIZ BELLO	79.109.085	
RESIDENTE DE OBRA	GERMAN ALBERTO ARIZA SALCEDO	13.462.954	
RESIDENTE DE OBRA	FERNANDO DELGADO CEBALLOS	79.043.409	
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ FIGUEROA	12.999.7373	
ASESOR ESTRUCTURAL	YESID ALEXANDER MUNAR CASTAÑEDA	79.317.188	
ASESOR ELECTRICISTA	FERNANDO IVAN D GREIFF MUÑOZ	79.512.465	
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	OMAR ACHILA MENDOZA	7.227.618	
ASESOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	EDNA RUBIELA VALCARCEL VARGAS	39.950.069	

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	FERNANDO DELGADO CEBALLOS	79.043.409	
ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO	YULI ANDREA RAMIREZ ORTIZ	26.429.811	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ	1.016.010.926	
PATOLOGO ESTRUCTURAL	CLERIDA CARRION BOLAÑOS	52.706.404	
SISOMA	TATIANA BAUTISTA		

5.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA (ver anexo. 3 y 4)

CORRESPONDENCIA ENVIADA (Ver anexo 3)			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
11/03/2020	AC2R-SED-01-2020	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DERIVADO DEL CONCURSO DE MÉRITOS NO SED-CM-A-DCCEE-151-2019	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
30/07/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD INFORMACIÓN DE CONTACTO A CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR
30/07/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO A COLEGIOS	CONSORCIO RETORNAR
31/07/2020	OFICIO No 02 INT-SED/CB	SOLICITUD INGRESO DE CONTRATISTA A SEDES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
31/07/2020	OFICIO No 03 INT-SED/CB	REMISION DE POLIZAS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
04/08/2020	OFICIO No 04 INT-SED/CB	REQUERIMIENTOS PARA LEGALIZACION ACTA DE INICIO	CONSORCIO RETORNAR
06/08/2020	OFICIO No 05 INT-SED/CB	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARA FINES PERTINENTES.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
07/08/2020	OFICIO No 06 INT-SED/CB	REMISIÓN DE INFORME DE DIAGNOSTICO DE VISITA TÉCNICA INICIAL DEL GRUPO 4. INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
13/08/2020	OFICIO No 07 INT-SED/CB	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA PRESENTADAS	CONSORCIO RETORNAR
13/08/2020	OFICIO No 08 INT-SED/CB	PRESUPUESTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
13/08/2020	OFICIO No 09 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PROTOCOLO (PAPSO) CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR
18/08/2020	OFICIO No 10 INT-SED/CB	DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	CONSORCIO RETORNAR
24/08/2020	OFICIO No 11 INT-SED/CB	SOLICITUD INGRESO INSTITUCIONES EDUCATIVAS GRUPO 4 CONTRATISTA E INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
24/08/2020	OFICIO No 12 INT-SED/CB	SOLICITUD FORMATOS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
25/08/2020	OFICIO No 13 INT-SED/CB	LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. APERTURA DE PIN AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
31/08/2020	OFICIO No 14 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	ENVIO DE FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS PROVEEDORES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

01/09/2020	OFICIO No 15 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
01/09/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES A DOCUMENTOS APERTURA PIN	CONSORCIO RETORNAR
02/09/2020	OFICIO No 16 INT-SED/CB	REMISION DE ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577535	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES A FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	CONSORCIO RETORNAR
05/09/2020	OFICIO No 17 INT-SED/CB	LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL ACTA 1 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CONSORCIO RETORNAR
04/09/2020	OFICIO No 18 INT-SED/CB	ACTUALIZACIÓN DE LA POLIZA DERIVADA DEL ACTA DE INICIO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
07/09/2020	OFICIO No 19 INT-SED/CB	APERTURA DE PIN AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
12/09/2020	OFICIO No 20 INT-SED/CB	CORRECCIÓN DE LA POLIZA DERIVADA DEL ACTA DE INICIO.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
14/09/2020	OFICIO No 21 INT-SED/CB	ENVIO INFORMES SEMANALES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
21/09/2020	OFICIO No 22 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
25/09/2020	OFICIO No 23 INT-SED/CB	INCUMPLIMIENTO	CONSORCIO RETORNAR
28/09/2020	OFICIO No 24 INT-SED/CB	SOLCITUD PROGRAMACIÓN Y FLUJOS DE CAJAS ACTUALIZADOS	CONSORCIO RETORNAR
30/09/2020	OFICIO No 25 INT-SED/CB	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CONSORCIO RETORNAR
01/10/2020	OFICIO No 26 INT-SED/CB	OBSERVACIONES PLAN SST	CONSORCIO RETORNAR
01/10/2020	OFICIO No 27 INT-SED/CB	ENVIO FACTURACIÓN 1 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
02/10/2020	OFICIO No 27A INT-SED/CB	INFORME MES 1 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
08/10/2020	OFICIO No 28 INT-SED/CB	RESPEUSTA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN	CONSORCIO RETORNAR
08/10/2020	OFICIO No 29 INT-SED/CB	RESPUESTA PROPUESTA SENDERO	CONSORCIO RETORNAR
14/10/2020	OFICIO No 30 INT-SED/CB	REITERANDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	CONSORCIO RETORNAR
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMES MES 1 Y FACTURACIÓN MES 1 INTERVENTORIA GRUPO 4	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
19/10/2020	OFICIO No 31 INT-SED/CB	ENVIO ACTA DE REUNION DEL 16/10/2020 Y SE REITERA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	CONSORCIO RETORNAR
21/10/2020	OFICIO No 32 INT-SED/CB	REMISION INFORMES MES 1 CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
21/10/2020	OFICIO No 33 INT-SED/CB	ENVIO CORTE 1 CONTRATO DE OBRA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
21/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS DE INTERVENTORIA PARA REVISION	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
22/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A INFORMACIÓN SAN ISIDRO	CONOSRCIO RETORNAR
22/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RADICACIÓN CUENTA 1 DE OBRA	CONOSRCIO RETORNAR
22/10/2020	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS DE CALCULO EN EXCEL FIRMADAS	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
22/10/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE RADICACIÓN CUENTA E INFORME 2 CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO RETORNAR

25/10/2020	OFICIO No 34 INT-SED/CB	REMISION CUENTA DE COBRO 2 INTERVENTORIA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
25/10/2020	OFICIO No 35 INT-SED/CB	REMISION CUENTA DE COBRO 3 INTERVENTORIA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
25/10/2020	OFICIO No 35A INT-SED/CB	REMISION INFORME MES 2 INTERVENTORIA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
25/10/2020	OFICIO No 36 INT-SED/CB	ACTA DE REUNION DEL 22/10/2020 Y SE REITERA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
26/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMES AJUSTADOS SEMANA 7 Y 8	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
26/10/2020	OFICIO No 37 INT-SED/CB	ENVIO INFORME CON CORTE AL 24 DE OCTUBRE DE 2020 SOLICITADO POR LA SED.	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
26/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMES SEMANALES AJUSTADOS	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
27/10/2020	OFICIO No 38 INT-SED/CB	RESPUESTA A OFICIOS CRE-041-2020 COLEGIO SIERRA MORENA, CRE-042-2020, CRE-043-2020, CRE-044-2020	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE CONSORCIO RETORNAR
29/10/2020	OFICIO No 39 INT-SED/CB	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS DEL ACTA DEL 22/10/2020	CONSORCIO RETORNAR
04/11/2020	OFICIO No 40 INT-SED/CB	REMISION DE APUS NO PREVISTOS DE SIERRA MORENA SEDE A Y SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
04/11/2020	CORREO ELECTRONICO	ESQUEMA ARBORIZADORA BAJA	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
04/11/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE VISITA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 04/11/2020	CONSORCIO RETORNAR
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: I-2020-72776 ACTA PARCIAL 01 CONTRATO OBRA 1577535 MEJORAMIENTOS GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	AVANCE SEMANA CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: INFORME ELÉCTRICO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA	CONSORCIO RETORNAR
09/11/2020	OFICIO No 41 INT-SED/CB	REMISION DE INFORME POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020 CONSORCIO RETORNAR.	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
09/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMES SEMANALES 9 Y 10	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
09/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: INFORME ELÉCTRICO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA – RECOMENDACIONES ESPECIALISTA ELESTRICO DE INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE CONSORCIO RETORNAR
10/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES DE OBRA	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
11/11/2020	CORREO ELECTRONICO	Fwd: DOCUMENTACIÓN PROPUESTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-148-2019	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE CONSORCIO RETORNAR
16/11/2020	CORREO ELECTRONICO	SE REENVIO EL INFORME DETALLADO CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
16/11/2020	CORREO ELECTRONICO	CORREGIR NOMENCLATURA DE NP SIERRA MORENA URGENTE	CONSORCIO RETORNAR
16/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME MENSUAL 2 INTERVENTORIA GRUPO 4.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
17/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMACIÓN PARA SUBIR A APLICATIVO DE LA SED	CONSORCIO RETORNAR
17/11/2020	CORREO ELECTRONICO	FWD: REVISIÓN RADICADOS I-2020-73833- I-73847 ACTAS P. 2 Y 3 CI 1679920-20	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
18/11/2020	OFICIO SIN CONSECUTIVO	PAGO DE FACTURAS DE CONTRATOS CON ENTIDADES DEL DISTRITO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

18/11/2020	CORREO ELECTRONICO	IMPORTANTE – CONSULTA PAGO DE FACTURA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
18/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME SEMANAL 11	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
18/11/2020	CORREO ELECTRONICO	LISTADO DE INSUMOS Y APUS EN EXCEL	CONSORCIO RETORNAR
18/11/2020	OFICIO No 43 INT-SED/CB	ENVIO ACTA DE REUNIÓN DEL 18/11/2020	CONSORCIO RETORNAR
19/11/2020	OFICIO No 44 INT-SED/CB	REMISION CUENTA DE COBRO 4 INTERVENTORIA DEL GRUPO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
21/11/2020	OFICIO No 45 INT-SED/CB	SOLICITUD INFORMACION ESTADO DEL TRAMITE DE APERTURA POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020 CONSORCIO RETORNAR.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME ST Y GA	CONSORCIO RETORNAR
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME ST Y GA	CONSORCIO RETORNAR
23/11/2020	OFICIO No 46 INT-SED/CB	RESPUESTA SOLICITUD CESION CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR 1577535 CUYO OBJETO ES "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONSORCIO RETORNAR SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
24/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES NOVIEMBRE	CONSORCIO RETORNAR
25/11/2020	OFICIO No 47 INT-SED/CB	REMISION DE APUS NO PREVISTOS SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B Y SIERRA MORENA SEDE A.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
27/11/2020	CORREO ELECTRONICO	MAQUINAS ARBORIZADORA BAJA	CONSORCIO RETORNAR
30/11/2020	OFICIO No 48 INT-SED/CB	ENVIO CORTE 2 CONTRATO DE OBRA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
30/11/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA 5 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
01/12/2020	CORREO ELECTRONICO	FACTURA ELECTRONICA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
03/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INSUMOS Y APUS CONSORCIO RETORNAR	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
04/12/2020	OFICIO No 49 INT-SED/CB	ENVIO PROGRAMACIONES Y PRESUPUESTOS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
04/12/2020	CORREO ELECTRONICO	ESPECIFICACIONES TIENDA ESCOLAR	CONSORCIO RETORNAR
04/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS	CONSORCIO RETORNAR
05/12/2020	OFICIO No 50 INT-SED/CB	ENVIO PROGRAMACIONES Y PRESUPUESTOS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
05/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME MES 02 CONTRATO DE OBRA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
08/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMES SEMANALES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
09/12/2020	OFICIO No 51 INT-SED/CB	RESPUESTA ACERCA DE CONCEPTO DE MURO EN COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR.	CONSORCIO RETORNAR SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

09/12/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 02 CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO RETORNAR
09/12/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS ACTUALIZADOS Y MEMORIAS	CONSORCIO RETORNAR
09/12/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA 2 CONTRATO DE OBRA GRUPO 4	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 02	CONSORCIO RETORNAR
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 02 – PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL 02 – PARAFISCALES	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
11/12/2020	OFICIO No 52 INT-SED/CB	ENVIO CORTE CONTRATO DE OBRA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
11/12/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS CORTE 3 PARAFISCALES CONTRATISTAS	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
11/12/2020	OFICIO No 53 INT-SED/CB	REMISION CUENTA DE COBRO 6 INTERVENTORIA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
11/12/2020	OFICIO No 54 INT-SED/CB	REMISION CUENTA DE COBRO 7 INTERVENTORIA DEL GRUPO 4	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
14/12/2020	CORREO ELECTRONICO	REVISIÓN: RADICACIÓN I-2020-83123 DOCUMENTOS ACTA PARCIAL - 05- 1679920-2020 GRUPO 4. INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
14/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL No. 3	CONSORCIO RETORNAR
16/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PRESUPUESTO PROPUESTO PARTE ELECTRICA VARGAS VILA	CONSORCIO RETORNAR
17/12/2020	CORREO ELECTRONICO	REVISION ACTAS PARCIAL 6 Y 7 INTERVENTORIA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: RESPUESTA AL RADICADO I-2020-81629 PROYECTO MEJORAMIENTOS GRUPO 4.	CONSORCIO RETORNAR
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
13/01/2020	CORREO ELECTRONICO	AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS	CONSORCIO RETORNAR
CORRESPONDENCIA RECIBIDA (Ver anexo 4)			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
31/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/08/2020	S-2020-125122	RTA OFICIO No. 05 INT-SED/CB – CO1.PCCNTR.1679920-2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/08/2020	No. CRE-015-2020	PAPSO CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/08/2020	No. CRE-017-2020	HOJAS DE VIDA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/08/2020	No. CRE-018-2020	PRESUPUESTOS DE OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/08/2020	No. CRE-019-2020	HOJAS DE VIDA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	PLANES Y PROGRAMAS DE OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS ACTA DE INICIO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	COLEGIOS PROGRAMAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DESGLOSE AIU	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

24/08/2020	No. CRE-059-2020	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A OFICIO No. 12INT-SED/CB	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	CORREO ELECTRONICO	REENVIO DE AUTORIZACIÓN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/08/2020	No. CRE-059-2020	SOLCIITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	REUNION INICIO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST CONTRATOS MEJORAMIENTOS 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS DE VECINDAD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
27/08/2020	CORREO ELECTRONICO	FIRMADA POR EL DIRECTOR ENVIO ACTA DE INICIO CTO DE INT 1679920 DE 2019 GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/08/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS PROVEEDORES OBRAS E INTERVENTORIA NUEVO SISTEMA BOGDATA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/08/2020	CONSORCIO RETORNAR	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS SST Y AMBIENTAL - CONTRATOS DE MEJORAMIENTOS 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	CRONOGRAMA DE CAPACIÓN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
31/08/2020	CORREO ELECTRONICO	TODOS LOS FORMATOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS DILIGENCIADOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATOS ACTA DE INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
04/09/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/09/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS APERTURA PIN CONSORCIO RETORNAR GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD CORRECCIÓN POLIZA CONTRATO No. CTO.1679920-2020 AL SU RADICADO I-2020-61929	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/09/2020	No. CRE-021-2020	INTERVENCIÓN COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE INFORME DETALLADO Y ACTA APROBACIÓN PROFESINALES DEL CONTRATO DE OBRA 1577535-2020 GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/09/2020	CORREO ELECTRONICO	FORMATO EJEMPLO DE ACTA DE OBRA MEJORAMIENTO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/09/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS PARCIALES REQUISITOS CONTRATISTA E INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/09/2020	S-2020-152224	ASIGNACIÓN DE PIN 18896 PARA MANEJO DEL APLICATIVO WEB DE MANEJO DE RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

		(RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN). RADICADO 2020ER151314 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME No. 1 SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PMA CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/09/2020	CORREO ELECTRONICO	SOCIALIZACIÓN TRAMITE DE CUENTAS DE COBRO DE CONTRATOS DE OBA E INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/09/2020	CORREO ELECTRONICO	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL G4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/10/2020	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS FIRMADAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
02/10/2020	No. CRE-023-2020	PRESUPUESTO DE OBRA COLEGIO FANNY MICKEY	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
02/10/2020	No. CRE-025-2020	ALTERNATIVAS DISEÑO COLEGIO CONFEDERACION SUIZA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/10/2020	No. CRE-026-2020	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
06/10/2020	No. CRE-028-2020	INFORME TECNICO 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS PARCIAL DE OBRA 1	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	FURC	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
07/10/2020	CORREO ELECTRONICO	PLANOS ELECTRICOS COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME GA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
13/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ESTADO CONTRATO GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
14/10/2020	CORREO ELECTRONICO	REPROGRAMACION OBRA SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	APUS NO PREVISTOS COLEGIO SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTAS DE VECINDAD SAN ISIDRO LABRADOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	SEGURIDAD SOCIAL SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUES A SOLICITUD POR CORREO CONTACTENOS-SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	CORREO ELECTRONICO	REUNION INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTADO CONTRATO 1577537-20 GRUPO 4 CIUDAD BOLIVAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	No. CRE-032-2020	PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS TANQUES DE AGUA DEL COLEGIO CONFEDERACIONES	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/10/2020	OFICIO SIN RADICADO	SOLICITUD INGRESO PERSONAL DIFERENTES COLEGIOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INDICADORES DE RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

16/10/2020	CORREO ELECTRONICO	LA GRABACIÓN DE LA REUNION INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTADO CONTRATO 1577537-20 GRUPO 4 CIUDAD BOLIVAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-035-2020	APUS NO PREVISTOS Y COTIZACIONES COLEGIO SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-037-2020	PROPUESTA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS Y CUBIERTA EN EL COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/10/2020	No. CRE-038-2020	INFORME DE NO APLICABILIDAD AL CUMPLIMIENTO DE % DE RCD	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
17/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME NO APROVECHAMIENTO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INDUCCIÓN APLICATIVO WEB SDA G4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
20/10/2020	CORREO ELECTRONICO	COMPROMISOS GRUPO 4 MEJORAMIENTOS 2020.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
21/10/2020	CORREO ELECTRONICO	FWD: AFILIACIÓN LUIS PAEZ	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
21/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMACION SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
21/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: DOCUMENTOS SOPORTES RADICADO I-2020-72776 ACTA PARCIAL 01 CONTRATO OBRA 1577535 MEJORAMIENTOS GRUPO 4.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/10/2020	No. CRE-041-2020	DOCUMENTACIÓN COLEGIO SIERRA MORENA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/10/2020	No. CRE-042-2020	DOCUMENTACIÓN COLEGIO FANNY MICKEY	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/10/2020	No. CRE-043-2020	DOCUMENTACIÓN COLEGIO CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/10/2020	No. CRE-044-2020	DOCUMENTACIÓN COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
26/10/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES DE OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/10/2020	No. CRE-045-2020	PROPUESTA COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/10/2020	CORREO ELECTRONICO	CONCEPTO ESTRUCTURAL COLEGIO SAN ISIDRO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INQUIETUDES CONTRATO 1577535-2020 MEJORAMIENTOS 2020.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/10/2020	CORREO ELECTRONICO	PREDISEÑO COLEGIO ARBORIZADORA BAJA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
28/10/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO NO 30-INT-SED/CB CONTRATO: CO1.PCCNTR.1577535 PÓLIZA: 33-44101202433	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INSCRIPCION PMS Y PAPSO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/10/2020	No. CRE-046-2020	PROPUESTA COLEGIO ARBORIZADORA BAJA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
30/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORMACIÓN PARA CARGAR A APLICATIVO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
30/10/2020	CORREO ELECTRONICO	INQUIETUDES CONTRATO 1577535-2020 MEJORAMIENTOS 2020.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
30/10/2020	CORREO ELECTRONICO	REVISIÓN CONTRATISTA 1577535-2020 GRUPO 4-JURÍDICA- INTERVENTORÍA AC2R	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

03/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME NO.2 SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRATUAL SED GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROPUESTA COLEGIO CONFEDERACION SUIZA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
03/11/2020	No. CRE-048-2020	PROPUESTA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE TRANSITO CONFEDERACIONES BRISAS DEL DIAMANTE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: I-2020-72776 ACTA PARCIAL 01 CONTRATO OBRA 1577535 MEJORAMIENTOS GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: i-2020-72776 acta parcial 01 contrato obra 1577535 mejoramientos grupo 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
05/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: Informe eléctrico José María Vargas Vila	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: Informe eléctrico José María Vargas Vila	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/11/2020	CORREO ELECTRONICO	Fwd: DOCUMENTACIÓN PROPUESTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE148-2019	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/11/2020	CORREO ELECTRONICO	Informe GA No.2	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/11/2020	CORREO ELECTRONICO	Informe No.2 Gestión Ambiental	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
16/11/2020	CORREO ELECTRONICO	Fwd: DOCUMENTACIÓN PROPUESTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE148-2019	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
17/11/2020	No. CRE-065-2020	SOLICITUD CESION DE CONTRATO TOTAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	LISTADO INSUMOS Y APUS EN EXCEL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
19/12/2020	CORREO ELECTRONICO	LISTADO INSUMOS Y APUS EN EXCEL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
20/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME TECNICO No. 2	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
20/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME ST Y GA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
22/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/11/2020	No. CRE-069-2020	ESQUEMA BASICO ARBORIZADORA BAJA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RE: OFICIO NO. 46 INT-SED/CB. RESPUESTA SOLICITUD CESION CONTRATISTA GRUPO 4 PÓLIZA 33-44-101202433	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME ST Y GA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DEL INFORME POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO OFICIO NO. 41INT, DEL CONTRATISTA CONSORCIO RETORNAR - CONTRATO DE OBRA NO. 1577535 DE 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
23/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES NOVIEMBRE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
25/11/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES NOVIEMBRE	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

25/11/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: I-2020-81629 REVISIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 1577535-2020 MEJORAMIENTOS GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
26/11/2020	CORREO ELECTRONICO	MAQUINAS ARBORIZADORA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
29/11/2020	CORREO ELECTRONICO	CORTE DE OBRA 2	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
30/11/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS CORTE 2	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
30/11/2020	CORREO ELECTRONICO	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
01/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: REVISIÓN RADICADO I-2020-80028-DOCUMENTOS SOPORTE ACTA PARCIAL 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1679920-20 MEJORAMIENTOS 2020	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
02/12/2020	No. CRE-072-2020	INSUMOS Y APUS CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
04/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: PROCEDIMIENTO PARA PAGOS A TERCEROS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
04/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: CRONOGRAMA GRUPO 4	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
04/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: ESPECIFICACIONES TIENDA ESCOLAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
05/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIONES AJUSTADAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: ACTA PARCIAL - 02- 1577535-2020 GRUPO 4 OBRA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
09/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: FORMATOS ACTUALIZADOS Y MEMORIAS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	FWD: FURC NO VISADO POR TEMAS DE PAGOS DE SALUD Y PENSION ACTA PARCIAL NO. 21 CONTRATO DE OBRA 1577535-20	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS REPOSITORIO	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	CUADRO PARAFISCALES	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME AMBIENTAL No.3	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
10/12/2020	CORREO ELECTRONICO	INFORME NO.3 SST	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/12/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS CORTE 3 CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/12/2020	CORREO ELECTRONICO	CORTE 3	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
11/12/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS CORTE 3	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
14/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: REVISIÓN: RADICACIÓN I-2020-83123 DOCUMENTOS ACTA PARCIAL - 05- 1679920-2020 GRUPO 4. INTERVENTORÍA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
14/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: RADICACIÓN I-2020-88266 DOCUMENTOS ACTA PARCIAL - 06- 1679920-2020 GRUPO 4. INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
14/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: RADICACIÓN I-2020-88357 DOCUMENTOS ACTA PARCIAL - 07- 1679920-2020 GRUPO 4. INTERVENTORÍA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
15/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

16/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PRESUPUESTO PROPUESTO PARTE ELÉCTRICA VARGAS VILA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
17/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RV: REVISIÓN ACTAS P. 6 Y 7 CI 1679920-20	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES AL ACTA 1 NO PREVISTOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	PAGO DE PARAFISCALES CONTRATISTA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
18/12/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA A SOLICITUD POR CORREO CONTÁCTENOS -SED	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
24/12/2020	CORREO ELECTRONICO	Documentación personal Vargas Vila	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
13/01/2021	CORREO ELECTRONICO	AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
13/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Remisión DE FORMATO Acta de entrega y/o recibo a satisfacción Obra de mejoramiento.	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
13/01/2021	CORREO ELECTRONICO	Fwd: Plan de movilidad segura 2021	

5.3. ASPECTO JURIDICO

Se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista de la Ley 64 de 1978, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios, Ley 828 de 2003.

LEGALIZACION DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. CO1. PCCNTR 1577535 DE 2020	15/07/2020

OTRO SI MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	FECHA
OTRO SI MODIFICATORIO	N/A
EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA

6. COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			Durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2021, el contratista presentó el respectivo informe el cual fue aprobado por esta interventoría	
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			La documentación ambiental original y actualizada reposa en las instalaciones de la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Ubicada en Cra 71ª No 52ª-17 Barrio Normandía	*PMA Contratista Consorcio Retornar Documentos PIN Ambiental Consorcio Retornar*

	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite).			X	Se verifican los permisos de las escombreras donde se realiza la disposición de RCDs.	*Anexo 1*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría "	X			Se presenta informe de componente ambiental N°4 correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021	*Informe componente ambiental N°4 correspondiente al periodo de 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		

2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR almacena los materiales de acuerdo con lo establecido en el PMA	*Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos.* *Anexo 2*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			La mezcla de concreto se realiza en el mismo lugar donde se va a utilizar e inmediatamente se hace la actividad requerida para no contaminar el suelo.	*Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos.* *Anexo 2*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación.			X	Durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 el contratista CONSORCIO RETORNAR no hizo uso de madera para sus actividades.	

	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			Durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 el contratista CONSORCIO RETORNAR no realizó tratamientos a la vegetación y las zonas verdes del plantel se encuentran libres de escombros o cualquier otro material asociado a las actividades de mantenimiento	*Registro fotográfico. Numeral 6.2. Materiales e Insumos.* *Anexo 2*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR después de cada intervención realiza disposición de los residuos en los puntos ecológicos de cada colegio.	*Registro fotográfico. Numeral 6.3. Manejo de residuos sólidos convencionales* *Anexo 3.*

		establecido en el PMA.					
	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			La disposición de estos residuos es realizada con la empresa de aseo asignada por la alcaldía de Bogotá para cada localidad.	*Registro fotográfico. Numeral 6.3. Manejo de residuos sólidos convencionales* *Anexo 3.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		

4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN ambiental asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y el PIN se encuentra actualizado en el aplicativo web de la SDA.	X			Se cuenta con el PIN asignado por la SED PIN 18896 para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). Durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 se ha realizado retiro de escombros de los diferentes frentes de trabajo. Los certificados de disposición serán entregados por el contratista al finalizar el mes de diciembre.	
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			Se realiza el acopio respectivo de los RCD, en este caso el escombro que sale del proceso de levantamiento de adoquín, recogiéndolo en lonas para evitar su propagación y contaminación	*Registro fotográfico. Numeral 6.4. Manejo de RCD.* *Anexo 4.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			Se realizo la respectiva señalización del lugar donde se recolectan los escombros, protegiéndolos y guardándolos en lonas.	*Registro fotográfico. Numeral 6.4. Manejo de RCD* *Anexo 4*

	4.4.	Dentro de lo posible, se realiza reutilización temporal o permanente de los RCD generados en la obra, teniendo en cuenta las características del proyecto.			X	El contratista Consorcio Retornar presenta a la Interventoría, informe técnico de NO aprovechamiento de RCD en obra	
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza retiro de escombros dentro de los tiempos establecidos por la autoridad ambiental	*Registro fotográfico.Numeral 6.4. Manejo de RCD*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de	X				

		la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.					
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza almacenamiento temporal de esta clase de residuos hasta que se complete una cantidad mínima de 20kg para realizar disposición con empresa autorizada, de acuerdo como se estableció en el PMA	*Anexo 5*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA.	X			El contratista Consorcio Retornar ha seleccionado a la empresa Planeta verde para realizar la disposición de sus residuos peligrosos	*Anexo 5*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		

6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Se realiza almacenamiento seguro de las sustancias químicas que se usan en los frentes de trabajo Se mantiene disponible la hoja de datos de seguridad de cada sustancia para la libre consulta	*Anexo 5*
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.			X	No se tienen almacenadas sustancias que por sus características requieran un manejo especial en caso de derrame	*Anexo 5*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Se cuenta con un inventario de sumideros debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.	X			Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizaran actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizaran actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos ni realizando			X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizaran actividades externas que afecten a sumideros, caños, ríos o quebradas	

		descargas no autorizadas.					
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza uso de las instalaciones sanitarias asignadas por cada colegio, se realiza revisión que las redes hidrosanitarias se encuentren en buen estado.	
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.			X	Dentro del contrato de mantenimiento todas las intervenciones son internas y no se realizaran actividades externas que afecten fuentes hídricas y zonas de ronda.	

	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.				El contratista CONSORCIO RETORNAR almacena los agregados cubiertos de manera que se evite el arrastre de material	
	7.7.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR ha realizado el respectivo cerramiento en las áreas donde se requiere	*Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.			X	A la fecha nos e han realizado actividades que requieran la humectación de superficies desprovistas de acabados	

	8.3.	Se realiza el cubrimiento debido de materiales granulares y RCD de forma permanente, con material aprobado para evitar su dispersión.				El contratista CONSORCIO RETORNAR ha realizado el respectivo cubrimiento de los materiales	*Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas.*
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido.				Durante la ejecución de las actividades que requieren uso de ladrillo, tableta o adoquines se genera un bajo impacto de generación de ruido, el contratista realiza estas actividades en áreas que se encuentran desalojadas por el personal de los colegios. Desde que inicio el contrato en losl colegios intervenidos no ha habido presencia de estudiantes.	
	8.5.	El Contratista limpia permanente mente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de				El personal de la obra limpia oportunamente los frentes de trabajo al finalizar cada actividad realizada para evitar dispersión y propagación del material particulado.	*Registro fotográfico. Numeral 6.5. Manejo y control de emisiones atmosféricas.*

		material particulado.					
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X		
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR presenta la documentación del vehículo tipo volqueta que hace parte del proyecto.	*1. Soat* *2. Revisión Tecnomecanicay de gases.* *3. Preoperacional* *4. Licencia de conducción del operador.* *Placa: EKF254* *• Capacidad: 7 m3* *• Pin: 1353* *• Conductor: Jaime Andres pulido*

		material particulado.					• *C.c 80901914*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X			Se cubre de manera adecuada la volqueta recolectora de RCD.	
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE		El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (presentes			X	No aplica para el tipo de contrato	

		en el inventario forestal) incluida en el PIPMA y aprobada por la Interventoría.					
		Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la			X	No aplica para el tipo de contrato	

		Avifauna incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.					
		El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		El Contratista cumple con el procedimiento de empradización incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	

		El Contratista cumple con el procedimiento para el manejo de la capa orgánica incluido en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y se informa al IDU sobre las modificaciones cuando			X	No aplica para el tipo de contrato	

		estas ocurren					
		El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico.			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Otros parámetros relevantes e			X	No aplica para el tipo de contrato	

		innerentes al proyecto.					
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10. 1.	Valla de obra			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Aviso en fachada			X	No aplica para el tipo de contrato	
		Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11. 1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			La interventoría realiza seguimiento alcumplimiento de las actividades ambientales del contratista.La interventoría realiza actividades ambientales al personal	*Registro fotográfico.Numeral 6.6.*
	11. 2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. ORDEN Y ASEO	12. 1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con	X				*Registro fotográfico.* *Anexo 6*

		los programas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.					
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			Se identifica un salón dentro de cada colegio en el cual se realiza almacenamiento temporal de materiales , se mantiene aseado y ordenado	*Registro fotográfico.* *Anexo 6*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	

		realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.					
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	

	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	En el periodo del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X	En el perido del presente informe no se registran solicitudes por parte de la SED	
NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.							
OBSERVACIONES ADICIONALES:							

RADICACIÓN

ELABORÓ



NOMBRE: ***LUZ STELLA PINEDA***
CARGO: PROFESIONAL SST
EMPRESA:AC2R IGENIERIA Y PROYECTOS SAS
FECHA: 17-01-2021

7. COMPONENTE GESTION SST INTERVENTORIA

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME SST							
REQUERIMIENTO SST	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X			Presentación informe del 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021.	
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X			La documentación original y actualizada de la interventoría reposa en las instalaciones de la interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S Ubicada en Cra 71ª No 52ª17 Barrio Normandía.	*Carpeta SST del contrato No. CO1.PCCNTR. 1440646*

	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X			Este informe se presenta de acuerdo con los lineamientos y estructurados por la SED	
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X			La interventoría realiza verificación de seguridad social del personal del contratista mediante muestreo aleatorio de acuerdo a listado semanal. La interventoría verifica el pago de la seguridad social del personal de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	*Planillas de seguridad social interventoría Anexo 2*

	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X			La interventoría solicita semanalmente el listado de personal del contratista	*Planillas de seguridad social interventoría Anexo 2*

	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales , y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X			La interventoría realiza seguimiento a la realización de examen médico ocupacional del personal del contratista y del personal de interventoría al ser contratos de prestación de servicios se aplica la siguiente normatividad. Decreto 1072 de 2015, sección 2.2.4.2.2 ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los	

						exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista…" "Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos". También se indica que en el caso de que el trabajador pierda su condición de contratista por un periodo superior a los seis (6) meses continuos, debe realizarse los exámenes médicos nuevamente para volver a trabajar.	
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratada	X			Durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 no se presentaron retiros de	

		s, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.				personal de interventoría	
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X			La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones de SST presentadas en el SG-SST del contratista.La interventoría realiza charlas a su personal durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre al 17 de octubre de acuerdo con el cronograma de capacitación del SG/SST de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	*Informe SST.Numeral 7.2Anexo 3*

	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			Para el período comprendido entre el 18 de noviembre al 17 de diciembre no se presentaron ingresos de personal de interventoría y se realizó seguimiento al contratista CONSORCIO RETORNAR al cumplimiento de las capacitaciones de ingreso	*Informe SST Numeral 7.3*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X			Se realizo seguimiento a la respectiva señalización sobre los puntos de acopio de escombro, materiales y el punto ecológico asignado en el lugar de trabajo.	*Anexo 4*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Anexo 4*

	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X			Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios y no es viable la instalación de señalización adicional a la yá instalada en el colegio.	*Anexo 4*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X			El contratista realiza la demarcación de los frentes de obra para evitar la el ingreso de personal ajeno.	*Anexo 4*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X			Las intervenciones se realizan dentro de los Colegios Distritales y el contratista utiliza las áreas de circulación señalizadas por el colegio, la interventoría realiza seguimiento para que las áreas de circulación mantengan libres de obstáculos.	*Anexo 4*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e			X		*Cuando aplique*

		innerentes al proyecto.					
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X			La interventoría realiza inspección al contratista y al personal propio sobre el uso de los elementos de protección personal en los frentes de trabajo. Así mismo realiza seguimiento a la entrega de EPP.	*Informe SST Numeral 7.5 Anexo 5*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del	X			La interventoría realiza inspección al contratista y al personal propio sobre el uso de la dotación en los frentes de trabajo.	*Informe SST Numeral 7.5 Anexo 5*

		uniforme como del documento al interior de la obra.					
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.			X	Para el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 no se identificaron nuevos riesgos asociados a las actividades de mantenimiento por tanto el contratista Consorcio retornar no ha presentado actualizaciones en la matriz de riesgos. Las medidas para mitigar los riesgos son presentadas mensualmente en el informe por el contratista.	

	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X			La interventoría realiza verificación al cumplimiento del estándar para trabajos en altura de acuerdo a la resolución 1409 de 2012.	*Anexo 6*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.				La interventoría realiza verificación al cumplimiento del estándar para trabajos en altura de acuerdo a la resolución 1409 de 2012.	*Anexo 6*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X			La interventoría evidencia el cumplimiento por parte del contratista frente a la documentación de los vehículos e idoneidad de quien los opera	*Anexo 7*

	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.	X			La interventoría evidencia cumplimiento del mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista	*Anexo 7*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.	X			La interventoría evidencia cumplimiento por parte del contratista frente al control de las preoperacionales de la volqueta utilizada por el contratista	*Anexo 7*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.	X			Durante el periodo comprendido entre el de 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 el contratista desarrolló las actividades dentro del horario establecido por la alcaldía de	

						Bogotá para el sector de la Construcción 10: am - 7: 00 pm	
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.	X			En bitácora queda registrado para conocimiento de la interventoría la hora de ingreso de vehículos al frente de trabajo	

	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.	X			El contratista realiza inspección de vehículos y verifica que los conductores cuenten con la licencia de conducción. El contratista Consorcio retornar allega los documentos de los vehículos asociados al proyecto.	*Anexo 7*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X			El contratista presenta las planillas de pago del personal dentro del informe mensual, la interventoría verifica que se encuentren al día en los pagos.	*Planillas de seguridad social interventoría Anexo 2*

	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X			La interventoría solicita semanalmente el listado de personal del contratista y verifica que se encuentren cubiertos por ARL, AFP y EPS.	*Planillas de seguridad social interventoría Anexo 2*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. BIENESTAR	9.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X			En cada frente de trabajo se destinó un salón donde los trabajadores se pueden cambiar de ropa y guardar sus pertenencias	*Anexo 8*
	9.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X			Los trabajadores hacen uso de un baño asignado en cada colegio exclusivo para su uso	*Anexo 8*

	9.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			El contratista CONSORCIO RETORNAR suministra hidratación a su personal de obra	
	9.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
10. ORDEN Y ASEO	10.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X			En las inspecciones realizadas se evidencia que el contratista Consorcio Retornar mantiene los frentes de trabajo organizados	*Anexo 9*
	10.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. DIVULGACIÓN	11.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con				El contratista realiza divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo en la inducción	

		los soportes respectivos.					
	11.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.				Se solicito al contratista consorcio retornar que allegue los registros de temperatura del personal de obra. Por su parte al interventoría dota a su personal de kit de bioseguridad y se reporta el registro diario de temperatura del personal en obra	*Anexo 8*
	11.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. INDICADORES DE SST	12.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X			El contratista Consorcio retornar presenta en su informe mensual los indicadores de gestión de SST	
	12.2.	Otros parámetros			X		

		relevantes e innerentes al proyecto.					
13. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	13.1	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X			Para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 no se presentan accidentes laborales.	
	13.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.	X			Para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 no se presentan accidentes laborales.	
	13.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su	X			Para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 no se presentan accidentes laborales.	

		efectividad y se realizan los ajustes necesario.					
	13.4	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.							
OBSERVACIONES ADICIONALES:							

RADICACIÓN

ELABORÓ



NOMBRE: LUZ STELLA PINEDA
CARGO: PROFESIONAL SST
EMPRESA:AC2R IGENIERIA Y PROYECTOS SAS
FECHA: 17-01-2021

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo transcurrido a partir de la fecha de inicio del 18 de diciembre de 2020 hasta el 17 de enero de 2021, se continuó con la ejecución de actividades y a la fecha del presente corte se tiene un porcentaje de avance de ejecución del 74.13%, un porcentaje de avance programado del 77.65% y de acuerdo a la programación de obra se tiene un porcentaje de atraso del 3.52%. Es importante mencionar que el avance de ejecución obedece a que existen unas actividades que se han ejecutado pero no se han podido cobrar debido a que se encuentran en tramites de aprobación.

Lo anterior obedece debido a que el contratista presento una nueva reprogramacion de obra en la cual se han ido nivelando los atrasos en los diferentes colegios que se encuentran en intervención, por lo cual se espera que se sigan nivelando estos y que se pueda ir obteniendo un avance de obra significativo con el fin de poder llegar hasta la terminación satisfactoria del contrato en ejecución.

Se espera que el contratista realice el cumplimiento de cada una de las observaciones que la interventoria ha venido realizando durante las visitas reaizadas con el fin de ir terminando actividades satisactorias y a la hora de entrega no se generen observaciones por ninguna de las partes.

Se tiene previsto iniciar con las entregas de instituciones educativas una vez se vayan terminando las actividades y se encuentren a satisfacción de todas las partes que intervenien.

9. ANEXOS

ANEXO 1	ACTAS DE COMITÉ
ANEXO 2	INFORMES SEMANALES
ANEXO 3	CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 4	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 5	BITÁCORA
ANEXO 6	COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL
ANEXO 7	COMPONENTE GESTION SST

ANEXOS

ANEXO 1
ACTAS DE COMITÉ

Ingenieria & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

INTERVENTORIA

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

FECHA: 18-12-2020 HORA: 8:30 am – 12:00pm LUGAR: Colegios grupo 4 Pag. 1 de _

ASISTENTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1.	IVAN VLADIMIR OVALLE BANOS	Apoyo supervision	LA SED DICEG.	
2.	Melisa Janet Gomez P.	Ing. Res. Interventoria	AC2R Ingenieria	
3.	Tatiana Bautista	Insp. SISOMA	Consorcio Retornos	
4.	John F García C.	Insp. interventoria.	AC2R Ingenieria.	
5.	Chalmen [illegible]	contratista	Consorcio Retorno	
6.	GUSTAVO A. MUNOZ F.	RESIDENTE	CONSORCIO RETORNOS	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

ORDEN DEL DÍA: Se inicia recorrido en colegio San Isidro Labrador luego Colegio Arborizadora baja, Colegio Fanny Mickey y Confederaciones

DESARROLLO:

Siendo las 8:30pm se inicia recorrido por el colegio San Isidro Labrador Sede B, se observa que se estan desarrollando actividades en bateria

DESARROLLO:

Sanitaria como aplicacion de granitos en baños del primer piso, se encuentran realizando trabajos de cubierta instalación de teja se han instalado 3 completos y el área de la escalera, se tiene el suministro de material en un 80%, se tiene personal en obra.

- Colegio Arborizadora baja: Se encuentran desarrollo de actividades tales como instalacion de sardinel, compactación de recebo, excavación y conformación de areas. Se tiene suministro de materiales en un 80% y se cuenta con buen personal de obra.
- Fanny Mickey: Se esta realizando maestras en adoquin para la fundida de placa y transitable. Se tiene material en obra en un 60% y se tiene personal.
- Confederaciones Brisas del diamante: Se estan realizando mantenimiento al cerramiento exterior, se han cambiado totales 5 y se han cambiado 3 mallas en modulos, se esta realizando excavación para mantenimiento de cuneta en el cerramiento, se tiene Sendero en un 85% de elaboración, se inicia con elaboración de maestras en terraza transitable.

- La Interventoria recomienda el buen uso de los EPP y elementos

de bioseguridad en todo el tiempo.

La SED realiza devolución de los NP que se habían radicado en días anteriores de los colegios Sierra Morena y San Isidro Labrador con el objetivo de realizar observaciones lo más pronto posible.

El contratista se compromete a iniciar trabajos en Sierra Morena el día lunes 21 de diciembre, a la fecha ya se tienen los vidrios en el colegio, por consiguiente se espera que las obras sean terminadas en el presente mes.

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

FECHA: 14-01-2021 **HORA:** 8:30 am – 2pm. **LUGAR:** Recorrido Colegios

ASISTENTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1.	Meliza Gomez Palacios	R. Interventoria	AC2R Ing.	
2.	John F García	Insp. interventoria.	AC2R ing	
3.	GUSTAVO A. MUÑOZ F	R. OBRA	RETORNAR.	
4.	Tatiana Bautista	SISOMA	Consorcio Retornar	
5.	Chelman Figueroa	Obra	Consorcio Retornar	
6.	Elizabeth Pineda	Inspectora SISOMA	AC2R Ing	
7.	IVAN VLADIMIR AMAYA	Apoyo Supervision	SED DCC.EE	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

ORDEN DEL DÍA:

Se inicia recorrido por el colegio San Isidro Labrador, Arborizadora baja, Sierra Morena, Jose Maria Vargas Vila, Fanny Mickey y Confederaciones.

DESARROLLO:

Se realiza visita a las obras que se desarrollan en el colegio San Isidro Labrador, se evidencia que esta institución se encuentra

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

DESARROLLO:

en un 98% de avance de obra, solo faltan terminar parte electrica, terminar muro, terminar ventaneria y bateria sanitaria, es importante mencionar que se tiene el suministro de material en un 95% por lo cual se espera que en el transcurso del mes se tenga terminado y entregado toda la intervencion de este colegio
la interventoria deja claro que se debe intervenir el anden que se encuentra debajo del muro de la aula de sistemas ya que para conservar la estabilida del mismo debido al asentamiento que se esta originando por la socavación del anden.
la supervisión de la SED manifiesta que realizara la consulta acerca de si se puede intervenir o no debido a que es espacio público.
- Profesional siso: Se solicita enviar semanalmente el listado de personal actualizado por cada frente de trabajo. Consolidado de registro de temperatura desde el inicio del contrato.
- Se hace visita a la vivienda colindante Cl 59B Sur Nº 77C-18 de propiedad del señor Jose Ernesto Rodriguez - con Nº de Cedula 3.208.834 y Nº de telefono Celular 3023911949 a quien se hace propuesta de Construir el muro lateral contiguo al colegio IED San Isidro labrador, a una altura de 1,20 en bloque con acabado en pañete. quien accepta la propuesta y se programa realizar acta de vecindad.

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Colegio Arborizadora baja: Se realiza recorrido de las obras que se estan desarrollando, se evidencia el desarrollo del parque en un 60%, se tiene el suministro de material en un 80%, faltan los juegos que se piensan instalar los cuales estan en cotización, se realizo descapote del area en la cual va a quedar la cafeteria. Se tiene programado realizar la entrega total a fin del mes de enero, se conto con visita rector.
Colegio Sierra Morena: Se realiza recorrido en el cual falta por instalar 1 cm² de vidrios y retoque de pintura el cual debe quedar terminado a fin de mes de enero ya que es unta obra que se encuentra en un 90% de avance de obra y se cuenta con el suministro del vidrio solo falta instalar.
Colegio Arborizadora baja: Se realiza revisión y verificacion de la instalación del apantallamiento y puesta a tierra, se cuenta con el material en un 90% y se tiene previsto entregar a finales de enero todas las actividades.
Colegio Fanny Mickey: Se realiza revisión de la actividad que se esta realizado la cual es terraza transitable Placa, se tiene material de obra para terminar esta Placa y se encuentra en un 65% de ejecución el colegio.
Colegio Confederaciones brisas del diamante: Se evidencia que se terminó la activa de terraza transitable con observaciones de limpieza de adoquin y emboquillar, el sendero se terminó y se esta rematando, el cerramiento se termino el mantenimiento, Se esta instalando la malla en los existentes, ya se encuentran todas en obra, se realizo canaleta para evacuación de las aguas.

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Pag. _ de _

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Instalar vidrios faltantes y entregar.	Contratista	22-01-2021
2. Cumplir con las normas institucionales en bateria Santa	contratista	22-01-2021
3. Iniciar impermeabilización de tanques	contratista	18-01-2021
4. Corregir - observaciones terraza confederaciones	Contratista	22-01-2021
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA:
HORA:
LUGAR:

CRA 71° #52° -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ANEXO 2
INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No. VERSIÓN: 00 20 DE DICIEMBRE DE 2020

1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020	2. NÚMERO CONTRATO DE INTEVENTORÍA	CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		

4. INFORME NO.	16	5. SEMANA NO.			16
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	14 DE DICIEMBRE DE 2020		HASTA:	20 DE DICIEMBRE DE 2020

7. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	8. CONTRATO DE OBRA		9. CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR	INTEVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	7 MESES
PRÓRROGAS	-	PRÓRROGAS	-
SUSPENSIONES	-	SUSPENSIONES	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL	$ 1.157.467.111	VALOR INICIAL	$ 186.467.050
ADICIONES	-	ADICIONES	-

10. CONTROL DE PROGRAMACION

	16. CONSOLIDADO AVANCES		17. AVANCE PROGRAMADA vs. EJECUTADA POR COLEGIOS						
			Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			
COLEGIO/ LOCALIDAD	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	CAUSAS DE ATRASO
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	$ 79.058.151,00	6,83%	85,00%	79,00%	-6,00%	5,81%	5,40%	-0,41%	SE INICIO CON EL SUMINISTRO DE TODOS LOS VIDRIOS FALTANTES
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	$ 249.990.318,00	21,60%	52,00%	48,00%	-4,00%	11,23%	10,37%	-0,86%	SE SUMINISTRO MATERIAL Y SE ESTA TRABAJANDO EN VARIOS FRENTES PARA RECUPERAR EL ATRASO
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	$ 159.933.160,00	13,82%	15,00%	15,00%	0,00%	2,07%	2,07%	0,00%	SE INICIO ACTIVIDADES
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas	$ 120.671.224,00	10,43%	25,00%	8,00%	-17,00%	2,61%	0,83%	-1,77%	SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PARTE ELECTRICA
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	$ 200.780.664,00	17,35%	55,00%	46,00%	-9,00%	9,54%	7,98%	-1,56%	SE SUMINISTRO MATERIAL Y SE ESTA TRABAJANDO EN VARIOS FRENTES PARA RECUPERAR EL ATRASO
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	$ 347.033.594,00	29,98%	45,00%	42,90%	-2,10%	13,49%	12,86%	-0,63%	SE SUMINISTRO MATERIAL Y SE ESTA TRABAJANDO EN VARIOS FRENTES PARA RECUPERAR EL ATRASO
TOTALES	$ 1.157.467.111,00	100,00%				44,75%	39,51%	-5,24%	

18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

19. PERSONAL		20. EQUIPOS UTILIZADOS				21. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO			CANTIDAD	LUNES	F
Residente Interventoría	1					MARTES	F
Inspector de Interventoría	1					MIERCOLES	F
Inspector de Interventoría	1					JUEVES	F
Residente de obra	3					VIERNES	F
Profesional SST	1					SABADO	F
Maestros de obra	4					DOMINGO	
Ayudantes	8					LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Comité de seguimiento.
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 61%, se tiene un programado de 44,75% y ejecutado del 39,51%, donde se refleja un atraso del 5,24%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha iniciado con el suministro de materiales y con el incremento en los frentes de trabajo, lo cual indica que se puede obtener una nivelación del atraso.

AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.

SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.

BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.

Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con las actividades, se terminó con la impermeabilización de la primera terraza transitable, y se continuó con la realización del acabado de esa terraza, se cuenta con el material en obra.

Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento exterior, se continuó con la fabricación de modulos en taller para la instalación de los modulos adicionales de acuerdo a la propuesta aprobada. Se realizó la instalación del primer modulo como muestra con el objetivo de que sea revisado y aprobado por las partes interesadas, el cual estuvo acorde a lo aprobado por la interventoría. Se termino el sedero peatonal, al cual solo le falta la jardinaera por terminar, y se inicio con la instalación del acabado en la terraza transitable.

Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica.

Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se inicio con el suministro de los vidrios faltantes

Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, se realizó la instalación de granito en los mesones de los lavamanos, se instalaron los lavamanos en acero inoxidable, se definio el tipo de griferia a utilizar, se continuó con el enchape de pisos, y se inicio con la instalación de la cubierta, en este colegio se tiene el suministro de material en un 95%.

Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se continuó con las actividades de realizaión de andenes perimetral, con sardinel y bordillos prefabricados, se realizó lleno con material común y se realizó compactación.

La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.

24. FIRMAS

NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
1 COPIA INTERVENTOR
2 COPIA CONTRATISTA

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Mantenimeinto cerramiento exterior



Acabados en sendero peatonal



Acabados en sendero peatonal



Realización de escaleras al lado de sendero peatonal

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B



Trabajos en parque



Realización de anden con sardinel y bordillo prefabricado



Lleno de material común en anden en parqu



Compactación de material común

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B



Trabajos en bateria sanitaria



Trabajos en bateria sanitaria - Enchape de pisos en aulas





Instalación de cubierta

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A



Suministro de vidrios



Suministro de vidrios



Inicio realización de acabado final de terraza transitable en colegio FANNY MICKEY



Inicio realización de acabado final de terraza transitable en colegio FANNY MICKEY

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No. VERSIÓN: 00 27 DE DICIEMBRE DE 2020

1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020	2. NÚMERO CONTRATO DE INTEVENTORÍA	CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		

4. INFORME NO.	17	5. SEMANA NO.			17
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	21 DE DICIEMBRE DE 2020		HASTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

7. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	8. CONTRATO DE OBRA		9. CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR	INTEVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	7 MESES
PRÓRROGAS	-	PRÓRROGAS	-
SUSPENSIONES	-	SUSPENSIONES	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL	$ 1.157.467.111	VALOR INICIAL	$ 186.467.050
ADICIONES	-	ADICIONES	-

10. CONTROL DE PROGRAMACION

16. CONSOLIDADO AVANCES			17. AVANCE PROGRAMADA vs. EJECUTADA POR COLEGIOS						
COLEGIO/ LOCALIDAD	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			CAUSAS DE ATRASO
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	$ 79.058.151,00	6,83%	88,00%	84,00%	-4,00%	6,01%	5,74%	-0,27%	
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	$ 249.990.318,00	21,60%	55,00%	53,70%	-1,30%	11,88%	11,60%	-0,28%	
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	$ 159.933.160,00	13,82%	20,00%	21,00%	1,00%	2,76%	2,90%	0,14%	
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas	$ 120.671.224,00	10,43%	8,00%	8,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,00%	
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	$ 200.780.664,00	17,35%	58,00%	50,30%	-7,70%	10,06%	8,73%	-1,34%	
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	$ 347.033.594,00	29,98%	47,00%	45,80%	-1,20%	14,09%	13,73%	-0,36%	
TOTALES	**$ 1.157.467.111,00**	**100,00%**				**45,64%**	**43,53%**	**-2,11%**	

18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

19. PERSONAL		20. EQUIPOS UTILIZADOS				21. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO			CANTIDAD		
Residente Interventoría	1					LUNES	F
Inspector de Interventoría	1					MARTES	F
Inspector de Interventoría	1					MIERCOLES	F
Residente de obra	3					JUEVES	F
Profesional SST	1					VIERNES	F
Maestros de obra	4					SABADO	F
Ayudantes	8					DOMINGO	
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Comité de seguimiento.
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo ha transcurrido a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 65%, se tiene un programado de 45,64% y ejecutado del 43,53%, donde se refleja un atraso del 2,11%. Es importante mencionar que con la nueva reprogramación de obra, presentada por el contratista se alcanzó a nivelar un poco el atraso, y el contratista ha continuado con el suministro de materiales de manera constante y con el incremento en los frentes de trabajo, lo cual indica que se puede obtener una nivelación del atraso.

AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.

SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.

BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.

Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la actividad de realización del acabado de esa terraza, se cuenta con el material en obra.

Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con el mantenimiento del cerramiento exterior se estan instalando todas los modulos que quedaran dobles, se continuó con la fabricación de modulos en taller para la instalación de los modulos adicionales de acuerdo a la propuesta aprobada, se continuo con los trabajos en el sendero, se termino de realizar escalinatas y matera y se continuó con la instalación del acabado en la terraza transitable.

Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: El Porvenir - Las margaritas: Se está a la espera de la propuesta para la intervención de mantenimiento de la parte eléctrica.


Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana se retomo la actividad de instalación de vidrios en las aulas del 2 3 piso, se suministro el vidrio faltante en un 100%.

Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en baterías sanitarias, se realizó la pulida del granito aplicado, en los mesones de los lavamanos, se continuó con el enchape de pisos en las aulas, y se continuó con la instalación de la teja en la cubierta.

Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Se continuó con las actividades de andenes perimetral, con sardinel y bordillos prefabricados, se realizó lleno con material común y se realizó compactación, se realizó malla en sitio con hierro y se inicio con fundida de andenes, tambien se inicio con la instalación de bordillos para conformar las zonas para las placas.

La interventoría espera que se siga nivelando el atraso, pero sobre todo que se inicie a notar el avance de obra en los diferentes frentes de obra, debido a que se inició con el suministro de material necesario para atacar varios frentes de obra, lo que es importante para el desarrollo del contrato.

24. FIRMAS



NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
1 COPIA INTERVENTOR
2 COPIA CONTRATISTA

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Mantenimiento a cerramiento exterior



Mantenimiento a cerramiento exterior



Mantenimiento a cerramiento exterior



Mantenimiento a cerramiento exterior

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B



Construcción de anden



Construcción de anden



Realización de parque



Suministro de materiales

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	CONTRATISTA:	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	17	SEMANA No.	17	DEL:	21 DE DICIEMBRE DE 2020	AL:	27 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B



Lavamnos de bateria sanitaria con granito pulido y lavamanos instalado



Emboquillado de enchape de piso en aulas





Instalación de teja - Mantenimiento de cubierta

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A



Instalación de Vidrios



instalación de vidrios



Realización de cenefa en adoquin para acabado de terraza transitable colegio FANNY MICKEY

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	CODIGO No. VERSIÓN: 00 03 DE ENERO DE 2021

1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	**CO1.PCCNTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020**	**2. NÚMERO CONTRATO DE INTEVENTORÍA**	**CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020**
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**		

4. INFORME NO.	**18**	**5. SEMANA NO.**			**18**
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	28 DE DICIEMBRE DE 2020		HASTA:	03 DE ENERO DE 2021

7. INFORMACION CONTRACTUAL

8. CONTRATO DE OBRA		**9. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO RETORNAR**	**INTEVENTOR**	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	7 MESES
PRÓRROGAS	-	PRÓRROGAS	-
SUSPENSIONES	-	SUSPENSIONES	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL	$ 1.157.467.111	VALOR INICIAL	$ 186.467.050
ADICIONES	-	ADICIONES	-

10. CONTROL DE PROGRAMACION

16. CONSOLIDADO AVANCES			**17. AVANCE PROGRAMADA vs. EJECUTADA POR COLEGIOS**						
			Avance Por Establecimiento			**Incidencia en el Contrato**			
COLEGIO/ LOCALIDAD	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**CAUSAS DE ATRASO**
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	$ 79.058.151,00	6,83%	100,00%	97,70%	-2,30%	6,83%	6,67%	-0,16%	
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	$ 249.990.318,00	21,60%	75,87%	70,23%	-5,64%	16,39%	15,17%	-1,22%	
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	$ 159.933.160,00	13,82%	64,21%	69,59%	5,38%	8,87%	9,62%	0,74%	
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas	$ 120.671.224,00	10,43%	53,58%	32,50%	-21,08%	5,59%	3,39%	-2,20%	
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	$ 200.780.664,00	17,35%	77,60%	65,49%	-12,11%	13,46%	11,36%	-2,10%	
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	$ 347.033.594,00	29,98%	75,90%	73,91%	-1,99%	22,76%	22,16%	-0,60%	
TOTALES	**$ 1.157.467.111,00**	**100,00%**				**73,89%**	**68,37%**	**-5,53%**	

18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

19. PERSONAL		**20. EQUIPOS UTILIZADOS**				**21. ESTADO DEL TIEMPO**	
CARGO	**CANTIDAD**	**EQUIPO**			**CANTIDAD**	LUNES	F
Residente Interventoría	1					MARTES	F
Inspector de Interventoría	1					MIERCOLES	F
Inspector de Interventoría	1					JUEVES	F
Residente de obra	3					VIERNES	F
Profesional SST	1					SABADO	F
Maestros de obra	4					DOMINGO	
Ayudantes	8						
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Comité de seguimiento.
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo ha transcurrido a partir del 28 de diciembre de 2020 hasta el 03 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 69%, se tiene un programado de 73,89% y ejecutado del 68,37%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 5,53%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades.

AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.

SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.

BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.

Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la porteria, se terminaron de realizar las cenefas y se inicio con la fundida de las placas.

Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de modulos encima de los modulos existentes despues de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los modulos, se continuó con los trabajos en la terraza, la cual quedo terminada, se sacaron los cilindron como muestras para medir la resistencia del concreto.

Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se retomaron las actividades en este coleio, se realizó el retiro total de todo el apantallamiento existente y se inicio con el suministro de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad debido a que en el colegio por falta de personal de la parte administrativa, no se pudieron instalar 16m2 de vidrio, los cuales se encuentran en la institución educativa a esperas de que llegue de sus respectivas vacaciones el personal administrativo con el objetivo de poder instalar estos vidrios y realizar la respectiva entrega de las actividades realizadas en este colegio.

Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta, se continuó con la instalación de la teja, la cual se encuentra casi terminada, tambien se continuó con los trabajos de enchape de piso, se realizó media caña entre muros y pisos en granito pulido, se continuó con los trabajos en mesones de bateria sanitaria, enchape de mochetas con ceramica.

Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se realizó la prueba de densidades, se sacaron las muestras de concreto para medir la resistencia del concreto que se esta utilizando en la fundida de los andenes y las placas.

La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continue con el desarrollo de las obras de la misma manera.

24. FIRMAS

NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
1 COPIA INTERVENTOR
2 COPIA CONTRATISTA

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Terraza transitable terminada



Terraza transitable terminada



Instalación de modulos en cerramiento exterior



Instalación de modulos en cerramiento exterior

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B



Excavación de manterial común delimitando zonas



Muestras de concreto



Armado de placas para fundir



Pruena de densidades

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS


INFORME No.	**18**	SEMANA No.	**18**	DEL:	28 DE DICIEMBRE DE 2020	AL:	03 DE ENERO DE 2021

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B



Trabajos en cubierta

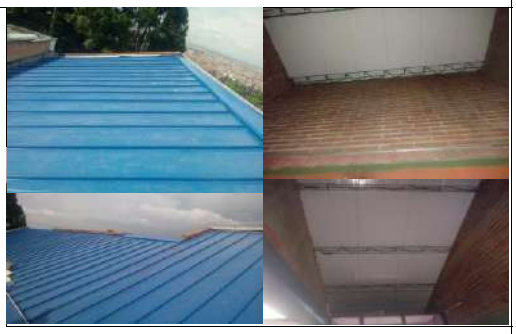

Trabajos en cubierta



Trabajos en pisos de aulas y en mocheta de meson en bateria sanitaria



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLA FLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS



Retiro total de apantallamiento existente



Retiro total de apantallamiento existente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY



Fundida de placas en terrazaz transitable 1



Fundida de placas en terrazaz transitable 1

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO No. VERSIÓN: 00 10 DE ENERO DE 2021

1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	CO1.PCCNTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020	2. NÚMERO CONTRATO DE INTEVENTORÍA	CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		

4. INFORME NO.	19	5. SEMANA NO.			19
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	04 DE ENERO DE 2021		HASTA:	10 DE ENERO DE 2021

7. INFORMACION CONTRACTUAL

8. CONTRATO DE OBRA		9. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	CONSORCIO RETORNAR	INTEVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	7 MESES
PRÓRROGAS	-	PRÓRROGAS	-
SUSPENSIONES	-	SUSPENSIONES	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL	$ 1.157.467.111	VALOR INICIAL	$ 186.467.050
ADICIONES	-	ADICIONES	-

10. CONTROL DE PROGRAMACION

16. CONSOLIDADO AVANCES			17. AVANCE PROGRAMADA vs. EJECUTADA POR COLEGIOS						
COLEGIO/ LOCALIDAD	VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU	% DE INCIDENCIA	Avance Por Establecimiento			Incidencia en el Contrato			CAUSAS DE ATRASO
			% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	% Programado	% Ejecutado	atraso (-) o adelanto (+)	
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	$ 79.058.151,00	6,83%	100,00%	97,70%	-2,30%	6,83%	6,67%	-0,16%	SE ESTA A LA ESPERA DE EL INICIO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 16M2 DE VIDRIO FALTANTES
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	$ 249.990.318,00	21,60%	77,20%	75,23%	-1,97%	16,67%	16,25%	-0,43%	
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	$ 159.933.160,00	13,82%	66,80%	72,50%	5,70%	9,23%	10,02%	0,79%	
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas	$ 120.671.224,00	10,43%	55,90%	35,70%	-20,20%	5,83%	3,72%	-2,11%	
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	$ 200.780.664,00	17,35%	78,60%	67,50%	-11,10%	13,63%	11,71%	-1,93%	
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	$ 347.033.594,00	29,98%	77,90%	75,90%	-2,00%	23,36%	22,76%	-0,60%	
TOTALES	**$ 1.157.467.111,00**	**100,00%**				**75,55%**	**71,13%**	**-4,43%**	

18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

19. PERSONAL		20. EQUIPOS UTILIZADOS				21. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO			CANTIDAD	LUNES	F
Residente Interventoría	1					MARTES	F
Inspector de Interventoría	1					MIERCOLES	F
Inspector de Interventoría	1					JUEVES	F
Residente de obra	3					VIERNES	F
Profesional SST	1					SABADO	F
Maestros de obra	4					DOMINGO	
Ayudantes	8						
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Comité de seguimiento.

2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo ha transcurrido a partir del 04 de enero de 2021 hasta el 10 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 72%, se tiene un programado de 75,55% y ejecutado del 71,13%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 4,43%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades.

AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.

SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.

BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.

Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la portería, se continua con la fundida de las placas.

Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de modulos encima de los modulos existentes despues de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los modulos, y se inicio con los trabajos de retiro de pañete existente en el tanque subterraneo de almacenamiento de agua # 2, al cual se le realizó el vaciado del agua que tenia en su interior.

Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de apantallamiento se inicio con la instalación del mismo en toda el area de la cubierta del colegio.

Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad debido a que en el colegio por falta de personal de la parte administrativa, no se pudieron instalar 16m2 de vidrio, los cuales se encuentran en la institución educativa a esperas de que llegue de sus respectivas vacaciones el personal administrativo con el objetivo de poder instalar estos vidrios y realizar la respectiva entrega de las actividades realizadas en este colegio.

Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta como son la parte electrica, se realizó la instalación de tuberia y de cableado, tambien se continuó con el acabado del enchape de piso.

Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se realizó la fundida de placas, se realizó la instalación de pasto en las zonas verdes.

La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continue con el desarrollo de las obras de la misma manera.

24. FIRMAS

NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
1 COPIA INTERVENTOR
2 COPIA CONTRATISTA

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	**19**	SEMANA No.	**19**	DEL:	04 DE ENERO DE 2021	AL:	10 DE ENERO DE 2021

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Retiro de pañete en tanque # 2



Retiro de pañete en tanque # 2



Trabajos en cerramiento exterior



Realización de cañuela

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B



Trabajos en parque



Trabajos en parque



Trabajos en parque



Trabajos en parque

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B



Fabricación de carpienteria metalica - ventaneria



Fabricación de carpienteria metalica - ventaneria



Trabajos electricos



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLA FLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS



Instalación de apantallamiento en cubierta de colegio



instalación de apantallamiento en cubierta de colegio

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY



Trabajos de acabado en terraza transitable - fundida de placa



Trabajos de acabado en terraza transitable - fundida de placa

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	CODIGO No. VERSIÓN: 00 17 DE ENERO DE 2021

1. NÚMERO CONTRATO DE OBRA	**CO1.PCCNTR.1577535 DE JULIO 15 DE 2020**	**2. NÚMERO CONTRATO DE INTEVENTORÍA**	**CO1.PCCNTR.1679920 JULIO 21 DE 2020**
3. OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.**		

4. INFORME NO.	**20**	**5. SEMANA NO.**			**20**
6. PERÍODO EVALUADO	DESDE:	11 DE ENERO DE 2021		HASTA:	17 DE ENERO DE 2021

7. INFORMACION CONTRACTUAL

8. CONTRATO DE OBRA		**9. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
CONTRATISTA	**CONSORCIO RETORNAR**	**INTEVENTOR**	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO INICIAL	7 MESES
PRÓRROGAS	-	PRÓRROGAS	-
SUSPENSIONES	-	SUSPENSIONES	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL	$ 1.157.467.111	VALOR INICIAL	$ 186.467.050
ADICIONES	-	ADICIONES	-

10. CONTROL DE PROGRAMACION

16. CONSOLIDADO AVANCES			**17. AVANCE PROGRAMADA vs. EJECUTADA POR COLEGIOS**						
COLEGIO/ LOCALIDAD	**VALOR ACTUALIZADO INCLUIDO AIU**	**% DE INCIDENCIA**	**Avance Por Establecimiento**			**Incidencia en el Contrato**			**CAUSAS DE ATRASO**
			% Programado	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	**% Programado**	**% Ejecutado**	**atraso (-) o adelanto (+)**	
SIERRA MORENA - Sede A Sierra moreno	$ 79.058.151,00	6,83%	100,00%	97,70%	-2,30%	6,83%	6,67%	-0,16%	SE ESTA A LA ESPERA DE EL INICIO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 16M2 DE VIDRIO FALTANTES
LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador	$ 249.990.318,00	21,60%	79,58%	77,60%	-1,98%	17,19%	16,76%	-0,43%	
ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja	$ 159.933.160,00	13,82%	68,75%	73,50%	4,75%	9,50%	10,16%	0,66%	
JOSE MARIA VARGAS VILLA - Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas	$ 120.671.224,00	10,43%	59,90%	49,58%	-10,32%	6,24%	5,17%	-1,08%	
FANNY MICKEY-Sede A - Villas del Diamante	$ 200.780.664,00	17,35%	80,50%	68,20%	-12,30%	13,96%	11,83%	-2,13%	
CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE - Sede A - Confederación Suiza	$ 347.033.594,00	29,98%	79,80%	78,52%	-1,28%	23,93%	23,54%	-0,38%	
TOTALES	**$ 1.157.467.111,00**	**100,00%**				**77,65%**	**74,13%**	**-3,52%**	

18. RECURSOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

19. PERSONAL		**20. EQUIPOS UTILIZADOS**				**21. ESTADO DEL TIEMPO**	
CARGO	**CANTIDAD**	**EQUIPO**			**CANTIDAD**	LUNES	F
Residente Interventoría	1					MARTES	F
Inspector de Interventoría	1					MIERCOLES	F
Inspector de Interventoría	1					JUEVES	F
Residente de obra	3					VIERNES	F
Profesional SST	1					SABADO	F
Maestros de obra	4					DOMINGO	
Ayudantes	8						
						LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

22. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Comité de seguimiento.
2. Visitas de las Instituciones Educativas pertenecientes al grupo 4 con profesional de apoyo de la supervisión.

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Este periodo ha transcurrido a partir del 11 de enero de 2021 hasta el 17 de enero de 2021, se lleva un ejecutado en tiempo real de ejecución del 76%, se tiene un programado de 77,65% y ejecutado del 74,13%, de acuerdo a la reprogramación de obra vigente se refleja un atraso del 3,52%. Se nota que se ha presentado un avance de obra significativo de acuerdo al desarrollo de las actividades.

AMBIENTAL: Se asigna el PIN No. 18896 Y se continúa la disposición de Escombros; la certificación de escombrera se entregara finalizado el mes, y se adjuntaran en los respectivos informes mensuales.

SG - SST: El personal de obra cuenta con sus EPP, las áreas se encuentran señalizadas, se realiza aseo del área de trabajo.

BIOSEGURIDAD: En cada uno de los frentes de trabajo se dé cumplimiento el protocolo de Bioseguridad: Registro de ingreso con verificación de sintomatología, toma de temperatura, Desinfección de ropa, Desinfección de herramientas, lavada de manos cada tres horas, distanciamiento y su permanente de tapabocas. No se han registrado casos positivos de COVID.

Institución Educativa Fanny Mickey - Sede A - Villas del Diamante: Durante la presente semana se continuó con la realización del acabado en la terraza que se encuentra sobre la porteria, se continua con la fundida de las placas la cual quedo terminada.

Institución Educativa Confederación Brisas Del Diamante - Sede A - Confederación Suiza: Durante la presente semana se continuó con los trabajos de mantenimiento de del cerramiento exterior, se continuo con la instalación de modulos encima de los modulos existentes despues de que se realizara mantenimiento a esto, se continuó con la elaboración de los modulos, y se inicio con los trabajos de retiro de pañete existente en el tanque subterraneo de almacenamiento de agua # 2, al cual se le realizó el vaciado del agua que tenia en su interior, cuya actividad quedo casi terminada.

Institución Educativa José María Vargas Vila- Sede D - José María Vargas Vila - Bella flor La torre - El Porvenir - Las margaritas: Durante la presente semana se con continuó con los trabajso de apantallamiento con la instalación del mismo en toda el area de la cubierta del colegio.

Institución Educativa Sierra Morena - Sede A - Sierra Morena: Durante la presente semana no se realizó ninguna actividad pero se pudo establecer comunicación con personal encargado de la parte administrativa del colegio y se tiene previsto instalar los m2 faltantes la semana siguiente y asi poder realizar la entrega de estas actividades en esta institución educativa.

Institución Educativa LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - Sede B - San Isidro Labrador: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en cubierta como son la parte electrica, se cuenta con el suministro del material como son lamparas, tuberia, cableado entre otros, se continúa con la instalación de tuberia y de cableado, tambien se continuó con el acabado del enchape de piso y se suministro material faltante para terminar trabajos en batería sanitaria, tambien se realizó demolición de muro de la sala de sistemas que tenia problemas de asentamiento, se retiro el escombro generado y se realizó el levantamiento de un muro estructural, dejando el espació respectivo para la instalación de la ventana de acuerdo a los conceptos estructurales.

Institución Educativa ARBORIZADORA BAJA - Sede A - Arborizadora Baja: Durante la presente semana se continuó con los trabajos en la realización del parque, se continuó con la conformación de zonas, se continuó con la fundida de placas, se realizó la instalación de pasto en las zonas verdes.

La interventoría ve con buenos ojos el desarrollo de las obras, el avance que se ha tenido, la nivelación del atraso que se ha tenido y el buen avance en la ejecución de las obras, se espera que se continue con el desarrollo de las obras de la misma manera.

24. FIRMAS

NOMBRE	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ORIGINAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN
1 COPIA INTERVENTOR
2 COPIA CONTRATISTA

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**	CODIGO No. VERSIÓN: FECHA:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	**20**	SEMANA No.	**20**	DEL:	11 DE ENERO DE 2021	AL:	17 DE ENERO DE 2021

25. ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA



Trabajos en tanque # 2



Trabajos en cerramiento exterior



Trabajos en cerramiento exterior



Trabajos en cerramiento exterior

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B



Trabajos en parque



Trabajos en parque



Trabajos en parque



Trabajos en parque

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO RETORNAR
		INTERVENTOR:	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

INFORME No.	**20**	SEMANA No.	**20**	DEL:	11 DE ENERO DE 2021	AL:	17 DE ENERO DE 2021

ANEXO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B



Trabajos en la parte electrica



Trabajos en la parte electrica



Demolición de muro y levantamaniento del mismo con refuerzo estructural



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLA FLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS



Instalación de apantallamiento en cubierta



Instalación de apantallamiento en cubierta

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY



Trabajos en terraza transitable 1



Trabajos en terraza transitable 1

ANEXO 3
CORRESPONDENCIA ENVIADA

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

Fwd: Aportes en Línea - Pago exitoso

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com> 18 de diciembre de 2020 a las 10:12
Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

1270871246374329873654242l8.pdf
400K

Comprobante de pago en linea seguridad social NESTOR ORTIZ.pdf
23K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

RE: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com> 13 de enero de 2021 a las 14:35
Para: Nestor Ortiz <consorcioretornar2020@gmail.com>, gusmufi3@gmail.com, Chelmanhm@hotmail.com

[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos



image001.png
55K



image001.png
55K



image001.png
55K

Permiso Movilizacion SMLC GRUPO 4 Mejoramientos 2020 f3 (1).pdf
270K

ANEXO 4
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

RV: Respuesta al radicado I-2020-81629 Proyecto Mejoramientos Grupo 4.

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co> 18 de diciembre de 2020 a las 07:02
Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

Buenas ingeniera Meliza remito observaciones Acta 01 NO PREVISTOS 1577535-2020, para su corrección y nueva radicación.

Iván Duarte.

De: ADRIANA GARCIA TARQUINO <agarciat@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2020 9:13 p. m.
Para: IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>
CC: KELLY MEDINA MARTINEZ <kmedinam@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Respuesta al radicado I-2020-81629 Proyecto Mejoramientos Grupo 4.

Buenas noches ingeniero Iván,

Adjunto la respuesta (I-2020-89916) al radicado de solicitud I-2020-81629 del Proyecto Mejoramientos Grupo 4, contrato CO1.PCCNTR.1577535-2020, para trámite y fines pertinentes.

Atentamente,

Arq. Adriana García Tarquino

Profesional-DCCEE- Estudios Previos y Evaluación

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

FIRMADO-Rta. I-2020-89916-DIC. 2020 CTTO.MEJORAMIENTOS 4-SOLICITUD I-2020-81629 (1).pdf
644K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

Fwd: Aportes en Línea - Pago exitoso

Nestor Ortiz <nestorort@gmail.com> 18 de diciembre de 2020 a las 10:12
Para: ac2rsed2020@gmail.com, iduarte@educacionbogota.gov.co

Buenos días:

Reenvio correo de Aportes en lìnea sobre la planilla de seguridad social del mes de noviembre de NESTOR ORTIZ. La clave es: 79109085

Envio adicional el comprobante de pago de la seguridad.

Gracias

---------- Forwarded message ---------
De: <pagos_aportesenlinea@email-aportesenlinea.com>
Date: vie, 11 dic 2020 a las 15:52
Subject: Aportes en Línea - Pago exitoso
To: <nestorort@gmail.com>

Apreciado cliente:

Reciba un cordial saludo.

En el archivo adjunto encontrará los detalles del pago de aportes a Seguridad Social. Para abrir el archivo PDF, por favor utilice como clave los dígitos del número de identificación del Aportante. En caso que éste corresponda a un Nit, ingréselo sin dígito de verificación.

¡Gracias por realizar la liquidación y pago de Seguridad Social a través de Aportes en Línea!

Este correo es de tipo informativo. Agradecemos no responder a este mensaje.

Cordialmente,

aportes en línea

¡Síganos en nuestras redes sociales y manténgase actualizado!

@aportesenlinea aportesenlinea.noticias aportesenlinea

Para resolver cualquier inquietud o comentario ingrese a aportesenlinea.com; Opción Contáctenos y diligencie el formulario Registre Solicitudes.

Aviso Legal: La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial, reservada y se basa en fuentes de conocimiento público, consideradas confiables. Está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de ser conocida por terceros, su carácter es informativo y su responsabilidad exclusiva del lector. Por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción, lectura o uso está prohibido a cualquier persona diferente. Si por error ha recibido éste mensaje por favor discúlpenos, notifíquenoslo y elimínelo. Aportes en Línea S.A. ha adoptado mecanismos tendientes a evitar que éste mensaje y sus anexos, se encuentren libres de virus o defectos que puedan llegar a afectar los computadores o los sistemas que lo reciban. Sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar éste hecho al momento de su recepción y apertura. En consecuencia Aportes en Línea S.A., se exonera de cualquier responsabilidad por daños, alteraciones o perjuicios que se ocasionen en su recepción o uso.

--

Néstor Ortiz
Ingeniero Civil
Tel: 3884348
Dir: Cra 65 No. 103 - 81 INT 4 - 401

---

2 archivos adjuntos

1270871246374329873654242l8.pdf
400K

Comprobante de pago en linea seguridad social NESTOR ORTIZ.pdf
23K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

Respuesta a solicitud por correo Contáctenos -SED

RESPUESTAS OSC <respuestasosc@educacionbogota.gov.co> 23 de diciembre de 2020 a las 05:50
Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

Señor(a) **INTERVENTORIA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**

En respuesta a su solicitud radicada el día **12/22/2020**, le indicamos que fue recibida y remitida a la oficina **5310 - OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO** bajo el número de radicado **E-2020-166188** y código de verificación **RFCKF,** usted puede consultar el estado de esta solicitud o trámite en el siguiente enlace: **http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/consulta_web**

Conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, la Oficina de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Educación del Distrito pone a su disposición el uso de los siguientes canales de atención donde podrá realizar radicación de tramites o solicitudes de manera fácil y segura.

- FUT-CONTACTENOS **http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos_**
- Formulario Único de Trámites (FUT) **http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/**
- Chat institucional ingresando a **www.educacionbogota.gov.co**
- Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas **https://bogota.gov.co/sdqs/**

¡Su opinión es muy importante para nosotros! Ayúdenos a prestarle un mejor servicio diligenciando nuestra encuesta de satisfacción en el siguiente link": https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DlvkOAg5W6smvGUOPxNQUs0J9LsgJJosKNLoNURVJWU09LWU81SUFVTktBVzBGOE5DNklYSy4u

Cordialmente,

¡Te invitamos a participar en la consulta un millón de ideas por la educación de Bogotá! Queremos escuchar tus propuestas y juntos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y que llegue a todos los ciudadanos.

Para participar en la consulta ingresa al siguiente link https://unmillondeideas.edu.co/

Contáctenos SED

Oficina de Atención al Ciudadano

Secretaría de Educación del Distrito

www.educacionbogota.edu.co

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

Documentacion personal Vargas Vila

Tattiana Bautista <tatianna643@gmail.com> 24 de diciembre de 2020 a las 11:52
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>, consorcioeducacion2020@gmail.com

Buenas tardes

Adjunto documentación de personal para Colegio Vargas Vila.

Leidy Tatttiana Bautista
Ing. Ambiental

8 archivos adjuntos

- **EPS.pdf** 22K
- **POSITIVA JONATHAN.pdf** 123K
- **ANDRES JOSE ANAYA BALLESTEROS EPS.pdf** 23K
- **AFP PROTECCIÓN ANDRES ANAYA.pdf** 49K
- **Scan 9.pdf** 363K
- **ANDRES JOSE ANAYA BALLESTEROS POSITIVA.pdf** 124K
- **PORVENIR JHONATAN VELOZA.pdf** 492K
- **CERT MED INGRESO ANDRES.pdf** 364K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

RE: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co> 13 de enero de 2021 a las 14:29
Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

Buenas Ing. Meliza

Anexo permiso de movilidad

Ivan Duarte

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: sábado, 25 de julio de 2020 3:49 p. m.
Para: JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>
CC: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES <lecampos@educacionbogota.gov.co>; IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>; DARIO DANIEL MORALES HERRERA <dmoralesh@educacionbogota.gov.co>; HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>; JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ <jluna@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

Reciba(n) un cordial saludo:

Para continuar tramite. Favor revisar si falto alguno

Cordialmente,



De: JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>
Enviado: sábado, 25 de julio de 2020 13:16
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES <lecampos@educacionbogota.gov.co>; IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>; DARIO DANIEL MORALES HERRERA <dmoralesh@educacionbogota.gov.co>; HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>; JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ <jluna@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

Ingeniero buen día;

De acuerdo a su solicitud, remito las autorizaciones de desplazamiento para los contratistas que llevaran a cabo la ejecución de los contratos de mejoramiento. De acuerdo con lo conversado con Carlos Castañeda, el permiso inicialmente se otorgará hasta el 31 de diciembre de la anualidad cursante, o de ser necesario se otorgará otra autorización hasta que se culmine con la ejecución de las obligaciones contractuales. Lo anterior, para su revisión, aprobación e importantes observaciones.

Atentamente,

JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO

Abogado - DCCEE

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: sábado, 25 de julio de 2020 12:35 p. m.
Para: JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES <lecampos@educacionbogota.gov.co>; IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>; DARIO DANIEL MORALES HERRERA <dmoralesh@educacionbogota.gov.co>; HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>; JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ <jluna@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

Reciba(n) un cordial saludo:

Les pido ser específicos en el periodo de la autorización. No puede quedar abierto.

Cordialmente,

Luis Antonio Pinzón Parra
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría Distrital de Educación
Av El Dorado No. 66 - 63
lpinzonp@educacionbogota.gov.co

De: JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>
Enviado: sábado, 25 de julio de 2020 11:08
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES <lecampos@educacionbogota.gov.co>; IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co>; DARIO DANIEL MORALES HERRERA <dmoralesh@educacionbogota.gov.co>; HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>; JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ <jluna@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

Ingeniero Luis buen día;

En archivo adjunto remito oficios de autorización de movilidad para visitas de mejoramientos, lo anterior, para su revisión aprobación e importantes observaciones.

Atentamente,

JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO

Abogado - DCCEE

De: CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 24 de julio de 2020 9:24 p. m.
Para: JUAN ENRIQUE ORTEGA FORERO <jeortega@educacionbogota.gov.co>
Cc: CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ <csuarez@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>; 'jasotot@gmail.com' <jasotot@gmail.com>
Asunto: AUTORIZACIONES DE MOVILIDAD PARA VISITAS DE MEJORAMIENTOS

Buenas noches Juan Enrique,

Te envío todas las cartas de los grupos de trabajo de mejoramientos de acuerdo al modelo previamente revisado. Esta mañana hablé con el Ingeniero y le comenté el tema.

Agradezco que por favor lo revises y se lo pases de manera urgente al jefe para su firma.

Quedo muy pendiente del retorno del mismo para enviar a los contratistas puesto que las visitas inician el lunes a las 7 am. Gracias.

Cordial saludo,

Arq. Carlos Castañeda

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Permiso Movilizacion SMLC GRUPO 4 Mejoramientos 2020 f3 (1).pdf
270K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

RV: Remisión Acta de entrega y/o recibo a satisfacción Obra de mejoramiento.

IVAN VLADIMIR DUARTE BAUTISTA <iduarte@educacionbogota.gov.co> 13 de enero de 2021 a las 15:51
Para: "ac2rsed2020@gmail.com" <ac2rsed2020@gmail.com>

Ing. anexo formato modelo acta física para el grupo.

Cordialmente.

Iván Vladimir Duarte Bautista

Contratista

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3153

www.educacionbogota.edu.co

Acta Entrega Fisica Obra. docx.docx
127K

Gmail **INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>**

Fwd: Plan de movilidad segura 2021

Tattiana Bautista <tatianna643@gmail.com> 13 de enero de 2021 a las 20:40
Para: INTERVENTORÍA AC2R - SED <ac2rsed2020@gmail.com>

Buenas noches

Adjunto plan de movilidad segura registrado en la página de la secretaría de movilidad, en las cuales se encuentran registrados los colegios que se están interviniendo y CHM INGENIERIA SAS como sedes del CONSORCIO RETORNAR.

Atentamente

Tattiana Bautista
Ingeniera Ambiental


PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 2021.pdf
271K

ANEXO 5
BITÁCORAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE

Contrato No. CO1 PCCNTR. 1577535
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de Comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en los términos de infraestructura para la Prestación del servicio educativo.
Contratista: Consorcio Retornar
NIT: 901.384.708-1
Contrato No. CO1 PCCNTR. 1679920 de 2019
Interventoria técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al Contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la Prestación del Servicio educativo. Grupo 4.
Interventor: AG2R Ingeniería y Proyectos S.A.S.
Nit: 830.123.577-7
Colegio Fanny Mikey - Dirección: Carrera 18N # 70A Sur 25 Bogotá
Fecha de acta de inicio de obra: 01 Septiembre 2020
Personal Interventoria:
Ing. Melisa Janes - Residente
Ing. Erika González - Inspector
Ing. Jhon García - Inspector
Supervisor Contrato SED
Ivan Duarte
Personal Contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente
Tatiana Bautista - Profesional SISOMA (Inspector SISO)

Fecha: 01 de Septiembre 2020
Hora de Inicio = 10:00 Am
Hora de Salida = 06:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima Tarde: Soleado
Personal Interventoria:
Melina Jaraz - Residente
Erika González - Inspector
Jhon García - Inspector
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente
Tatiana Bautista - Inspector - C.C.
Freddy Buitrago Acosta - Oficial - C.C 8073 7205 - ARL SURA
Ulloa Rodriguez William - Ayudante - CC.80559982 - ARL SURA
Cristian Pastran Caballero - Ayudante - C.C. 1131499107 - ARL SURA
Actividades Realizadas:
10:00 Am Se realiza Entrega de EPP por parte del encargado sso al personal de obra y se realiza la ejecución de Protocolos de Bioseguridad Como lo son Toma de temperatura, Lavado de Manos y uso de gel antibacterial, Como evidencia se diligencia una planilla que contiene los datos basicos del personal que ingresa a la obra (nombre, No. Cédula y Cargo) y temperatura corporal; Se acuerda entre las partes Presentes que la planilla debe ser diligenciada a diario como requisito de Ingreso de personal e inicio de actividades.
Se realiza recorrido Para definir las areas prioritarias de intervencion evidenciadas en el siguiente esquema.

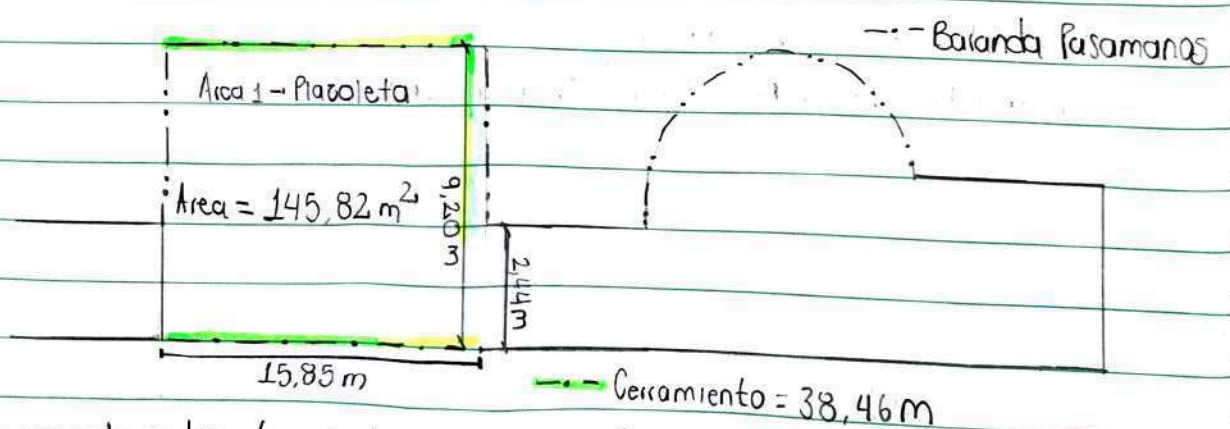

Se acuerda entre las partes el Inicio de actividades en la Plazoleta area 1, y dar inicio a la actividad de demolicion.

Se Realiza la ejecución y colocación del cerramiento Perimetral con lona-Malla Polisombra azul en el area de intervención, tambien se coloca cinta de señalización de Peligro para demarcar el area de obra y restringir el Paso de Personal no autorizado.

Se inicia la actividad de demolicion de Piso con terminado en tablon tipo gress.

La interventoria Realiza las siguientes observaciones y recomendaciones al Contratista:

- Realizar el adecuado manejo y recolección de escombros con el fin de evitar riesgos del personal de obra, y del personal administrativo que transita en el colegio.
- Una vez terminada la actividad de demolición se debe realizar de manera oportuna limpieza y Sondeo para Verificación de Servicio de todos los desagues y bajantes con los que cuenta cada una de las areas a intervenir.
- Se Solicita a el inspector SISO Mantener un listado diario actualizado del Personal de obra; en el que se indique los datos personales de cada uno y la empresa de afiliación de ARL.

ARQ. GUSTAVO NUÑEZ
RES. OBRA

Ing. Katherine Bautista (SISO)
ERIKA LICETH GONZÁLEZ
Inspector Int.

Insp. Interventoria

Fecha: 08 de Septiembre 2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personal interventoria:
Erika Gonzalez - Inspector
Jhon Garcia - Inspector
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente
Tatiana Bautista - Inspector SISO
Fredy Buitrago Acosta - OFICIAL
William Rodriguez Ulloa - Ayudante
Cristian Pastran Caballero - Ayudante
Ingresan:
Yamid Jerez Camargo - Ayudante - CC.80738447 - ARL Sura
Actividades Realizadas:
Seguimiento a la implementación de Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos).
Verificación del estado del Cerramiento de obra y solicitud de mantenimiento del mismo al Contratista.
Seguimiento al adecuado uso de EPP al personal de obra.
Continua la actividad de demolición de acabado de piso y placa Pancpal en el areà de intervencion N.1 Plazoleta. Se registra un avance de 144.40 m^2.
Mediante Inspección se define y hace reconocimiento del espesor del afinado de Piso el cual es de 8 cm, por tanto se define que el APU para el item de demolición de afinado de piso debe ser de 8 cm.
Se registra la Capacitación sobre la importancia y adecuado uso de los EPP impartida al personal de obra por parte del Inspector Siso del contratista.
Se toma registro de la visita del supervisor de la SED Ing. Juan Duarte, quien Verifica el estado de la obra.
Se realizan recomendaciones por parte de la siso al maestro para que en el inicio de la obra en Sierra Morena se cumplan con todos los requisitos de trabajo en Altura.

Erika Lizeth Gonzalez

Fecha: 09 de Septiembre 2020
Hora de inicio: 10 Am
Hora de Salida: 06 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personal Interventoria:
Heliga Jerez - Residente
Erika Gonzalez - Inspector
Jhon Garcia - Inspector
Supervisor SED:
Ivan Duarte
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente
Tatiana Bautista - Inspector SISO Ins. Tatiana Bautista (SISO)
Fredy Buitrago Acosta - Oficial
William Rodriguez Ulloa - Ayudante Yamid Jerez Camargo - Ayudante
Cristian Pastran Caballero - Ayudante
Ingresan:
Michael Conedor Palacios - C.C. 1233350732 - Ayudante - Acl Sura
Actividades Realizadas:
Seguimiento a la implementación de protocolos de bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos)
Verificación del estado del cerramiento de obra y Solicitud de mantenimiento del mismo al contratista.
Seguimiento del adecuado uso de EPP al personal de obra.
Seguimiento a la demolición de afinado de Piso con espesor de Placa de 8.cm.
Demolicion Afinado Piso e=8cm = 72,91 m2. Se inicia Recolección y transpeso de Escombros.
Se realiza Recorrido Por los Colegios Sierra morena en donde se acuerda inicio de actividades el dia Lunes 14 de Septiembre. y el colegio San isidro labrador.

ARQ. GUSTAVO MUÑOZ.
Erika Lizeth Gonzalez
Inspector Int.
Ins. Interventoría

Fecha: 10 de Septiembre 2020
Hora Inicio: 10:00 Am
Hora Salida: 06:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personal Interventoria:
ERIKA Gonzalez - Inspector int.
Jhon Garcia - Inspector int.
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente
tatiana Bautista - Ispector SISO
fredy Buitrago Acosta - Oficial
William Rodrigoez Ulloa - Ayudante
Cristian Pastran Caballero - Ayudante
Yamid Jaier Camargo - Ayudante
Michael Conedor Palacios - Ayudante
Actividades Realizadas:
Se Continua Con la actividad de demolicion de afinado de Piso en la placoleta area # 1, debido al espesor que presenta se hace necesario el uso de un Martillo mecanico. Se Registra el ingreso al colegio fany mikey en la bitacora de la celaduria.
Se Continua con el trasiego de material de demolición desde la placoleta area # 1 hacia el area de acopio ubicada en los Parqueaderos.
Se realiza mantenimiento de cerramiento perimetral en el area de intervención.
Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos) y salud ocupacional a todo el personal de obra.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ
Inspector int.

Fecha 11 de Septiembre de 2020.
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personan Interventoria:
Erika Gonzàlez - Inspector int
Jhon Garcia - Inspector Int.
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz
Tatiana bautista
Fredy Beltrago Acosta
William Rodriguez
Cristian Pastran Caballero
Yamid Jeres Camargo
Michael corredor Palacios
Actividades Realizadas:
Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de EPP) a todo el personal de obra.
Se inicia con el cerramiento en malla polisombra azul en el área de intervención 2, Rotonda, Se realiza mantenimiento al cerramiento en el area de intervención 1 Plazoleta.
Se continua la demolición de afinado de Piso e=8 cm en el area de intervencion 1 Plazoleta, se utiliza un martillo mecànico para esta actividad.
Se continua con el trallego y acopio de material de demolición desde el area de intervención 1 plazoleta hasta el area de acopio ubicada en el parqueadero del Colegio.
Se registra la llegada de 1 VIAJE ( ) de arena de rio la cual se ubica en los Parqueaderos, Se solicita al contratista el uso de plastico negro tanto en el lugar o Piso donde es dejado y Posteriormente para su recubrimiento y Proteccion.

Ing. Tatiana Bautista
C.S.O

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector int.

Ing. Gustavo Muñoz

Interventoria

Fecha 12 de septiembre del 2020
Hora Inicio: 10 Am
Hora de Salida: 06 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personal Interventoria:
Erika Liceth Gonzàlez - Inspector int.
Jhon Garcia: Inspector int.
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente
Tatiana Bautista Inspectora SISO
Fredy Buitrago acosta - Oficial
William Rodriguez ulloa - Ayudante
Cristian Pastran Caballero - Ayudante
Yamid Jeres Camargo - Ayudante
Michael Corredor Palacio - Ayudante
Actividades Realizadas.
Se realiza Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de epp) a todo el Personal de obra.
Se inicia demolición de de piso con Fabla terminado en tabla tipo cress en el Area de Intervención # 2 Rotanda.
Se continua con el traslego y acopia de material de demolición desde el area de intervencion # 1 hasta el acopio ubicado en los parqueaderos.
Se registra el Ingreso del Siguiente material:

1. Cemento tolex bulto x 50 kg 30 bultos
2. Manto Aluminto 3mm 10m² 5 Rollos x 10 m²
3. Emulsion ED. 2 Canecas x 5 Galones

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Liceth Gonzalez Inspector int.

Insp. Interventoria

Fecha 14 de Septiembre de 2020.

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 PM

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Liceth Gonzalez - Inspector Int.

Jhon Garcia - Inspector Int.

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

Cristian Pastran Caballero - Ayudante

Fredy Buitrago Acosta - Oficial

Michael Conrado Palacio - Ayudante. Edilberto Cortañeda - ayudante - Ingreso

Actividades Realizadas:


Se realiza seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) y Salud ocupacional (uso de epp) a todo el Personal de obra.

Se continua con la demolicion de piso con terminado en tabla tipo Gress en el area de intervencion #2 Rotonda.

Se continua con el traslego y acopio de material de demolicion desde las area de intervencion #1 Plazoleta y #2 Rotonda hasta el acopio ubicado en el parqueadero.

Se Solicita al contratista Completar el cerramiento en malla-Polisombra en todo el area de intervencion #2 Rotonda. asi como realizar el mantenimiento necesario al cerramiento en el area de intervencion #1, con la finalidad de evitar la caida de escombro en las demas areas del Colegio.

Se definen la ubicacion de las cañuelas y ubicacion de Sifones para el desague en la Zona de intervencion #1 Plazoleta. Como lo muestra el siguiente esquema:

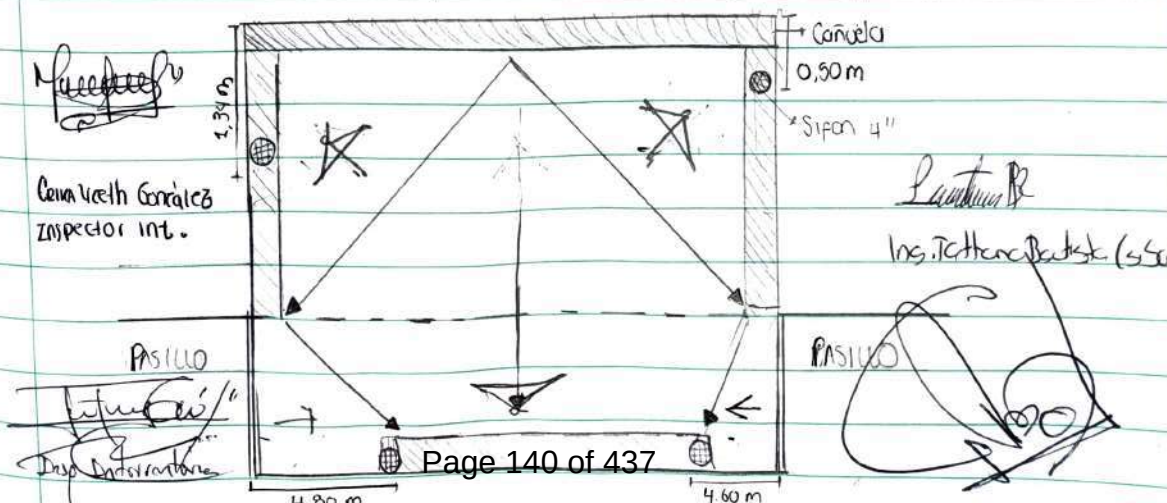

Erika Liceth Gonzalez
Inspector Int.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

15 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Erika Lizeth Gonzalez Inspector

Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SISO

Fredy Buitrago Acosta - Oficial

Michael Collecdor Palacio - Ayudante

Edilberto Castañeda - Ayudante


Yamid Jerez Camargo - Ayudante

Cristian Caballero - Ayudante

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y Lavado de manos → Se deja registro en planilla de ingreso) y Salud ocupacional (uso de EPP) Por Parte del personal de obra.

Se continua Con la demolición de piso con terminado en tableta tipo Cress y afinado de piso e= 6 cm en el area de intervención # 2 rotonda, continua el traslego de material proveniente de demolición, desde el area de intervencion # 2 hasta el acopio en parqueaderos.

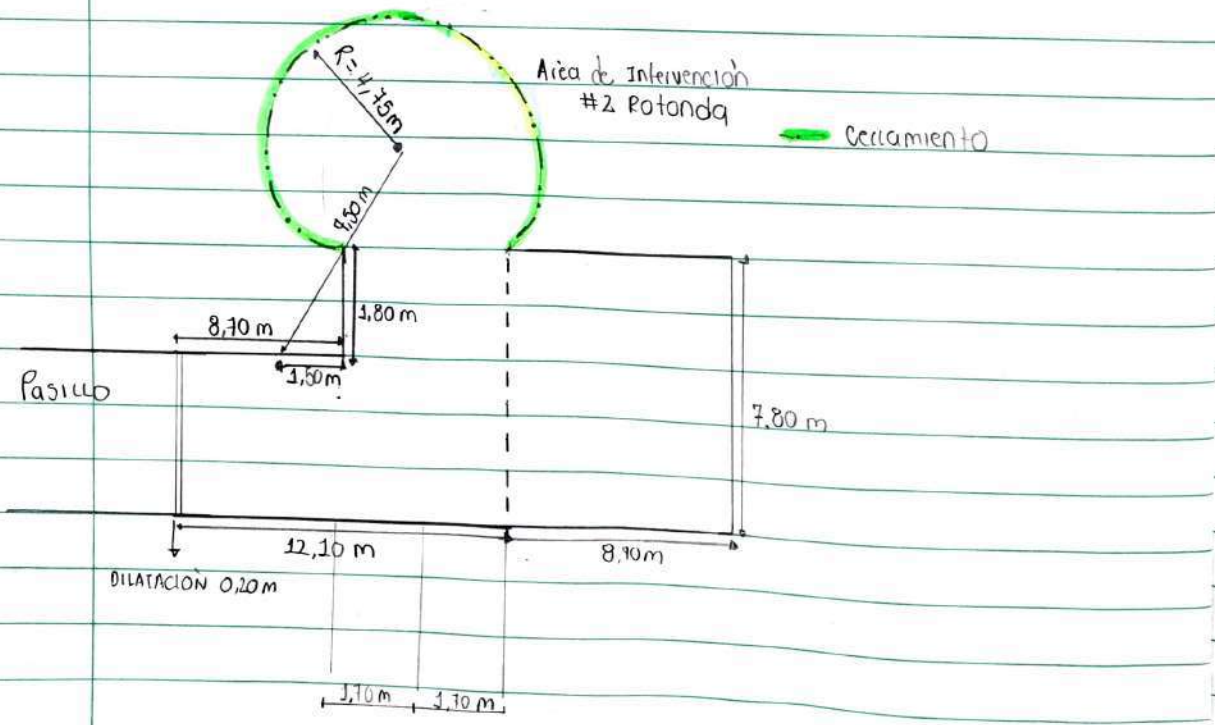

* Se Registra la salida de 2 Viajes de escombro teniendo la Siguiente información =
- Volqueta: Placa EKF254
  Capacidad: 7 m3
  Pin: 1553 80901924
  Conductor = Jaime Andres Pulido cc 80901924
* Se realiza trazado de maestras longitudinales y chequeo de niveles, en el area de intervención # 1 placoleta.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Insp. Interventoria.

GRIKA Liceth Gonzalez - Ins. Int

16 de Septiembre 2020
Hora de inicio: 1000 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima Mañana: Nublado
Clima tarde: Nublado
Personal interventoria:
GRIKA LICETH Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector
Personal Contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 Oficial
Tatiana Bautista - Inspector SISO 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Se realiza seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Tambien se realiza Seguimiento al protocolo de Salud ocupacional (uso de EPP) por Parte del Personal de obra.
Se continua con la demolición de piso con terminado en Tablon tipo Gress y afinado de piso e=6 cm en el area de intervención #2 Rotonda, Continua el trazado y acopio de material de demolicion desde el area de intervención Rotonda hasta el acopio en parqueaderos.
* Se registra la salida de 1 viaje de escombro teniendo la siguiente información:
- Volqueta: Placa EKF254
  Capacidad 7m3
  Pin: 1353
  Conductor: Jaime Andres Pulido cc 80901944


* Se registra en ingreso de 1 viaje 6 m³ de arena de rio, el cual es acopiado en el parqueadero y cubierto con plastico negro.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Insp. Interventoria.

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector int.

17 - Septiembre 2020
Hora de inicio: 10:00 Am
Hora de fin: 06:00 PM
Clima mañana: Soleado
Clima tarde: Nublado
Personal Interventoria:
Erika Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector.
Personal contratista:
Arq. Gustavo - Residente 1 Oficial
Tatiana bautista - Inspector sst 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos, se deja registro en planilla de ingreso) y Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).
Se continua con el traslado y acopio de material de demolición proveniente del area de intervención #2 Rotonda hasta el acopio en parqueaderos.
Se realiza traslado de arena de rio desde el acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazoleta.
Se funden Maestras Pavimento afinado de Piso en el area de intervención # 1 Plazoleta.

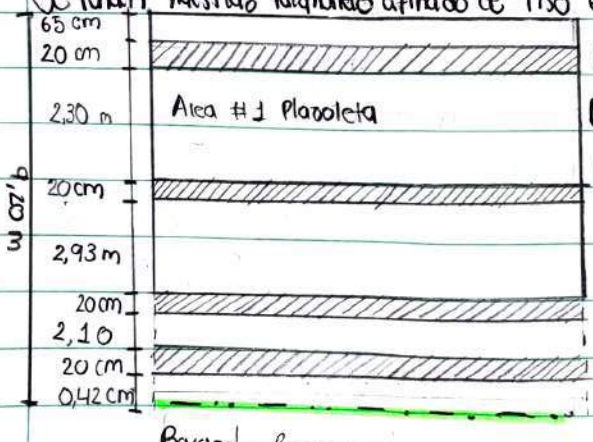

e = 6 cm Cantidad de Hormigon = 0,76 m³
Dosificación: 1:3
F'c = 3000 PSI

Ing. Tatiana Bautista (SISO)
Erika Lizeth Gonzalez
Inspector int.

18 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Fin: 06:00 Pm

Clima mañana: Nublado

Clima tarde: Lluvia fuerte

Personal Interventoria:

Erika Gonzalez Inspector Jhon Garcia - Inspector Nelsa Janes - Residente

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista inspector SISO - Fernando delgado - Residente


2 oficiales - 3 Ayudantes

Se registra Visita del Ing Ivan Duarte, Supervisor SEO y Juan David Asesor Comercial de Castellon, marca especial para impermeabilizacion.

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en la planilla de ingreso; y salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se funde Muro para afinado de piso en el area de intervencion #1 placoleta, en la seccion #1.

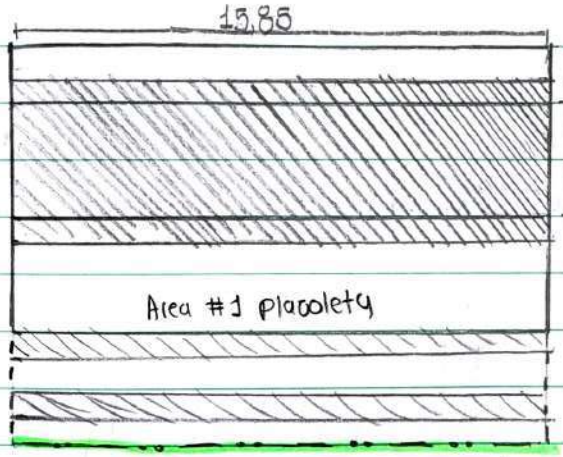

Dosificacion: 1:3 F'c = 3000 Psi

Cantidad de Mortero = 2,18 m³

Se Realiza Inspeccion de Bajantes 2" ubicadas en el area de intervencion #1 placoleta Con la finalidad de verificar su funcionamiento. Se Corrobora su buen estado y funcionamiento.

Ing. Tatiana Bautista (SSO)

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector Int.

Insp. Interventoria

19 de Septiembre del 2020
Hora de Inicio : 10:00 Am
Hora de Fin: 12:00 m Sabado
Clima Mañana: Nublado
Personal Interventoria :
Erika Gonzalez - Interventoria Jhon Garcia - Interventoria Ins.
Personal Contratista :
Arq. Gustavo Nuñez - Residente Tatiana Bautista - Ins. SISO 2 Oficiales - 3 Ayudantes
Actividades Realizadas :
Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso y salud ocupacional uso de epp por parte del personal de obra.
Se continua con el trasiego y acopio de material de demolición proveniente del area de intervención #2 Rotonda hasta el acopio en parqueaderos
Se realiza trasiego de arena de rio desde el acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazoleta.
Se Registra la llegada de 1 viaje (6m³) de arena de rio.
Se realiza mantenimiento del cerramiento en malla azul de las areas que se encuentran en intervención plazoleta 1 y Rotonda 2.
Se Realiza Humectación al concreto de la seccion 1 de la Placa Base afinado de Piso fundida en el area de Intervencion #1 plazoleta.
Se realiza inspección de fisuras en la placa del area de intervención #1 Plazoleta.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector Int.

Insp. Interventoría.

21 de Septiembre de 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Fin: 12 m → Debido a problemas de orden público y transporte, Por Manifestaciones

Clima Mañana: Soleado

Personal Interventoría:

Erika Gonzáles Ins. Interventoría Jhon García Ins. Interventoría

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz Residente Arq. Fernando delgado Residente Tatiana Bautista, Ins SISO

1 oficial

2 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. y salud ocupacional (uso de EPP por parte del Personal de obra).

Se continua con el trasiego y acopio de material de demolición proveniente de la demolición del Piso del area de intervención #2 Rotonda hasta la zona de acopio en parqueaderos.

Se continua con trasiego de arena de RIO y cemento desde el centro de acopios en Parqueaderos hasta el area de intervención #2 Rotonda y #1 Plazoleta.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZALEZ

Inspector Int.

Insp. Interventoría

22 de Septiembre del 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Fin: 05:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Gonzalez Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SISO

Arq. Fernando delgado - Residente 2 oficiales 2 Ayudantes


Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (Toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al Protocolo de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se continua con trasiego de material (arena de río) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de Intervención #2 Rotonda.

Se realiza humectación del mortero fundido en la Sección 1 del area de intervención #1 plazoleta.

Se fonden maestras para mortero de afinado de Piso en el area de intervención #2 rotonda.

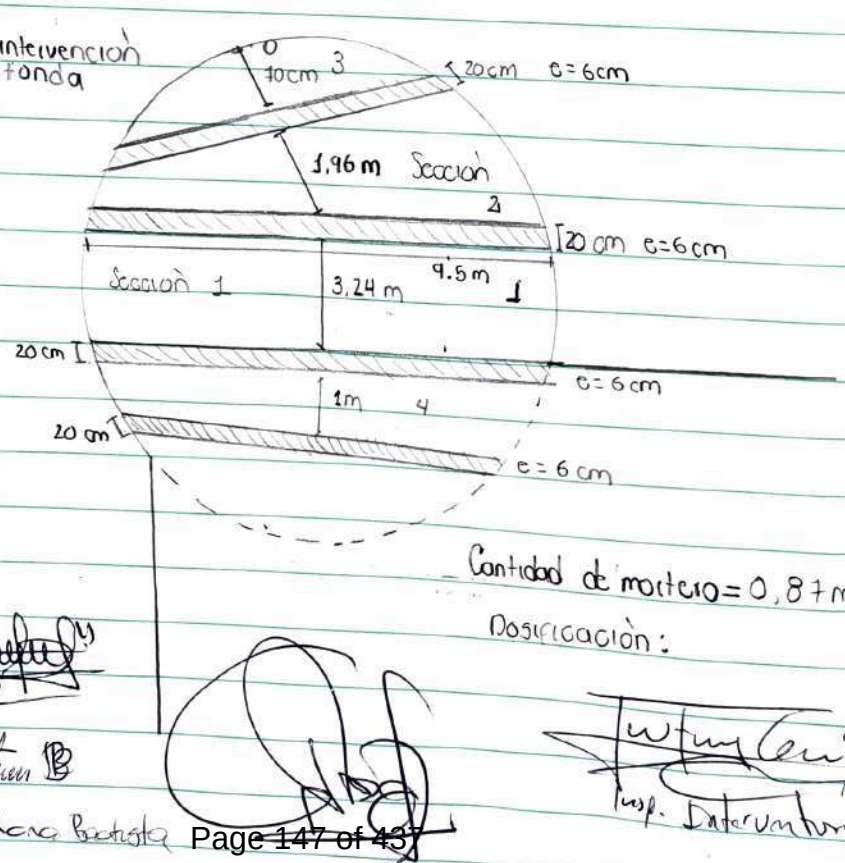

Cantidad de mortero = 0,87 m³

Dosificación:

Ing. Tatiana Bautista

Insp. Interventoria.

23 de Septiembre del 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Lluvioso

Clima tarde: Nublado

Personal de interventoria:

Erika Liceth González - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal del Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SISO

Arq. Fernando Delgado - Residente 1 Oficial - 3 Ayudantes


Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de salud ocupacional y uso de epp por parte del personal de obra)

Se continua con el trasiego de material (arena de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #2 Rotonda.

Se realiza inspección de fisuras en la placa de piso de la rotonda, no se evidencian fisuras superficiales, pero se determina que en la junta de la placa y el bordillo en el area de acceso hay una filtracion de agua que debe ser tratada; para esto se solicita realizar corte al bordillo para mejorar la superficie, evidenciar la junta y hacer tratamiento sistematico con impermeabilizante SIKATOP-122.

Se funde Mortero para afinado de piso en el area de intervención #2 Rotonda, en la seccion #1, como se muestra en el esquema.

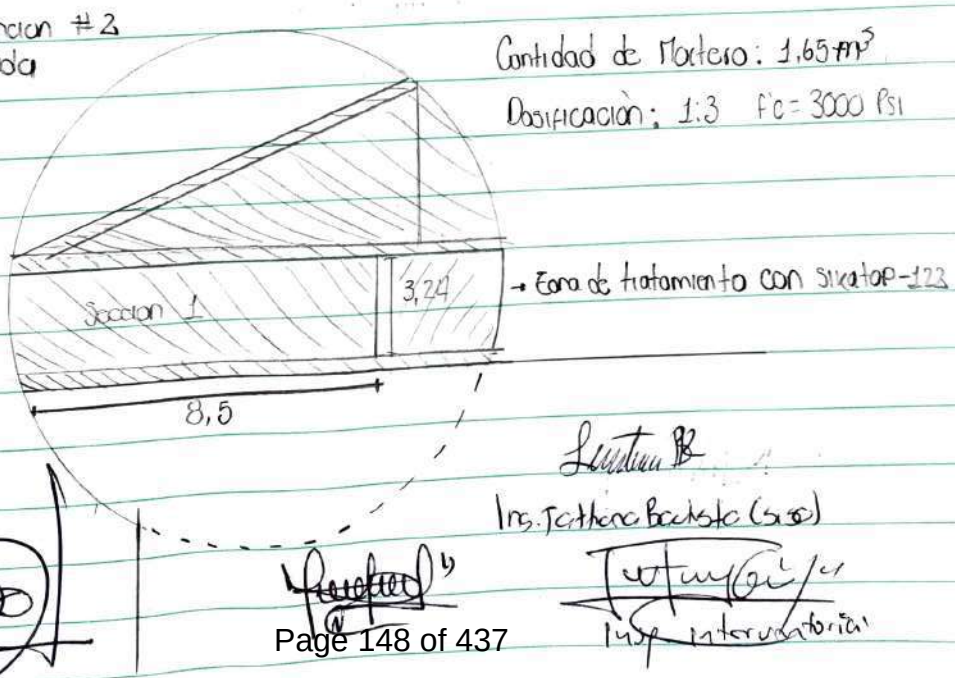

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Ing. Interventoria

24 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal interventoria:

Erika Gonzalez - Interventoria Jhon Garcia - Interventoria

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente ARQ. Fernando Delgado - Residente


Tatiana Bautista - Inspector siso 2 oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de Salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra)

Continua el trasiego de material (Arena de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervencion #2 rotanda.

Se funde mortero para afinado de piso en el area de intervención rotonda Sección #3-4

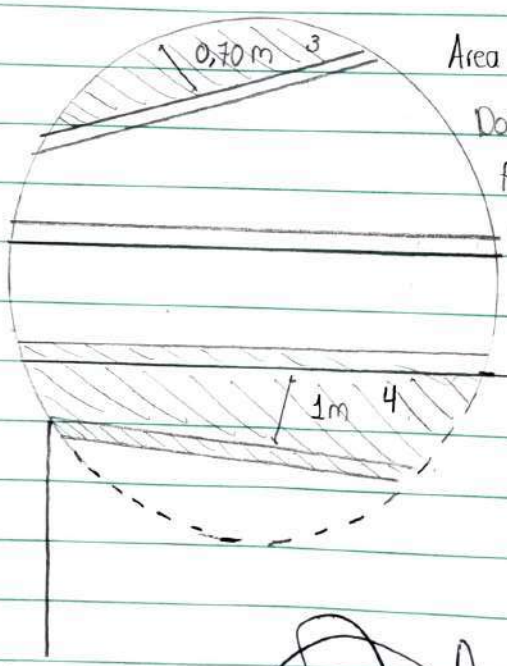

Area de intervención #2 Rotonda

Dosificación: 1:3

F'c = 3000 PSI

Cantidad de mortero = 2,35 m³

Tatiana Bautista

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth González

Ins. Interventoria

25 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Gonzalez - Inspector Int Jhon Garcia - Inspector Int Melisa Jarez - Residente Int.

Estela Pineda - Profesional SST Int.

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Arq. Fernando delgado - Residente Tatiana Bautista Inspector SST

2 Oficiales 3 Ayudantes.

Actividades Realizadas:


Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del Personal de obra).

Continua el traslego de material (Arena de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazoleta.

Humectación del afinado de piso (placa) fundida en la Rotonda.

Inicia demolición de piso con terminado en tableta en el sector # 3.

Se funde Mocheo para afinado de Piso en el sector 2 del area de intervención # 1 Plazoleta.

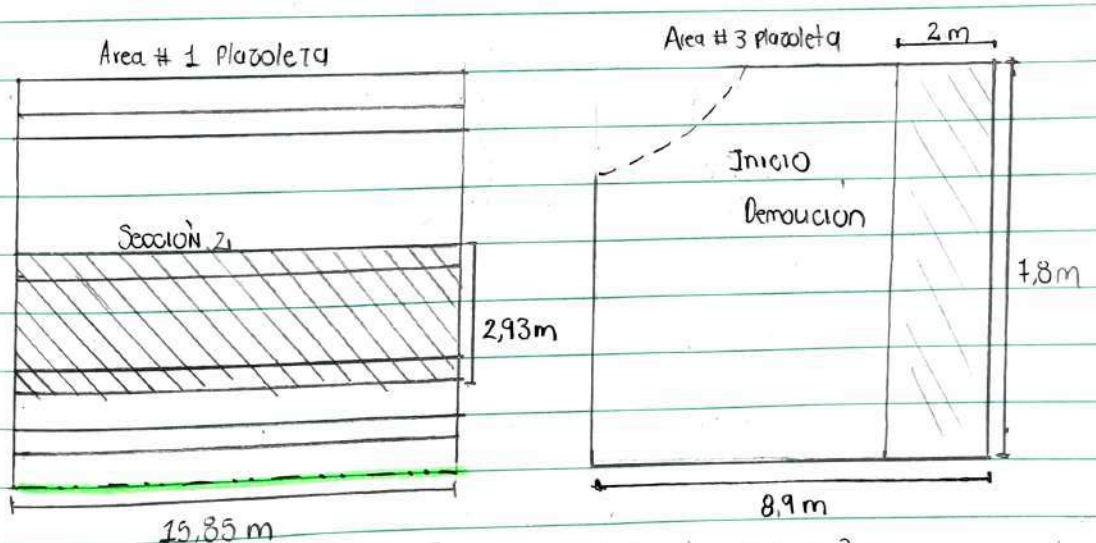

e=6cm Cantidad Mortero: 2,78 m^3 Demolición: 19,6 m^2

Dosificación: 1:3 F'c= 3000 PSI


Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Liceth Gonzalez


Insp. Interventoria

26 de Septiembre del 2020 - Sabado
Hora de inicio: 10:00 am
Hora de Salida: 02:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Personal Interventoria:
Erika Liceth Gonzàlez - Inspector Int Jhon Garcia - Inspector int
Personal Contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SISO
2 Oficiales - 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento al protocolo de Salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra).
Continua el trasiego de material (arena de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervencion #1 Plazoleta.
Humectación afinado de piso (placa) fundida en Rotonda y plazoleta #1.
Continua demolición de Piso con terminado en tableta en el sector 3 Plazoleta.

Area #1 plazoleta

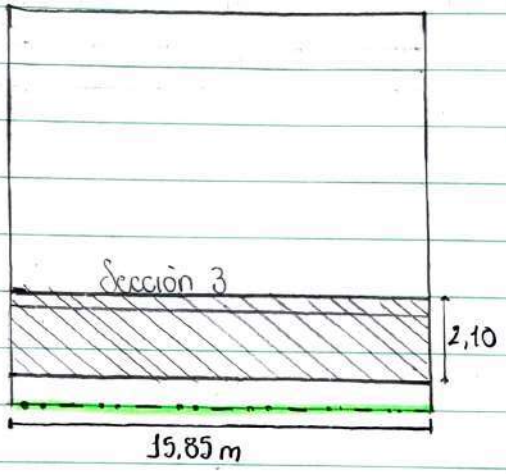

Area # 3 plazoleta

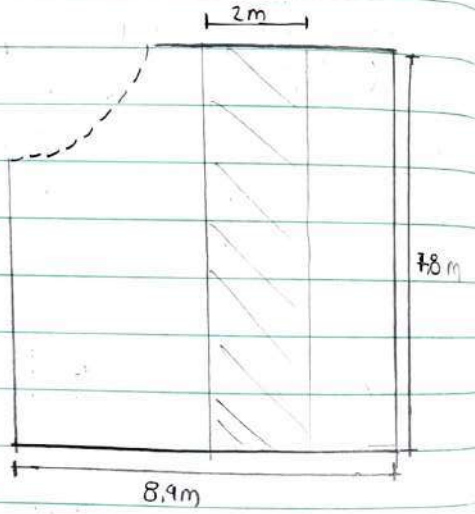


e = 6 cm Cantidad de mortero =
Dosificación: 1:3 F'c = 3000 PSI

Demolición: 15,6 m2

Insp. Tatiana Bautista

Erika Liceth Gonzàlez
Insp. Interventoria

28 de Septiembre del 2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Nublado
Personal Interventoria:
Leika Lizeth Gonzalez - Insp. Interventoria Jhon Garcia - Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST
2 Oficiales 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso, Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra).
Continua el trasiego de material (arena de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #1 plazoleta.
Humectación apisonado de piso (placa) fundida en rotonda y plazoleta #1.
Inicia Retiro de manto de impermeabilización existente en dos terrazas laterales; se aplica Acido nitrico a la superficie con la finalidad de dejarla libre de los restos de material de ligante asfaltico existente, se realiza verificacion de pendientes en las placas y buen servicio en las bajantes; se determina Aumentar las pendientes de desague con la finalidad de optimizar los desagues y evitar empozamientos.
Continua demolición de piso terminado en tableta en el sector 3 plazoleta.

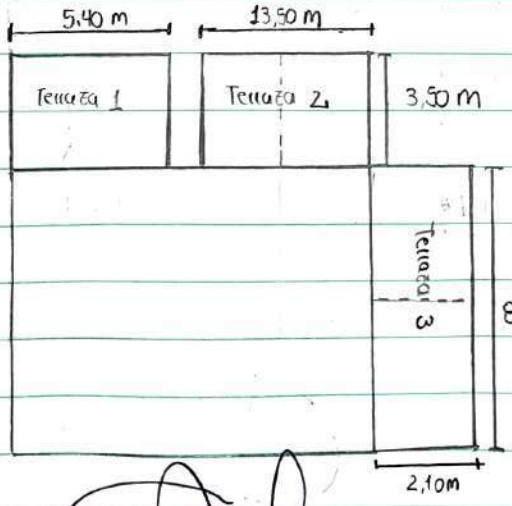

* Retiro manto - Area
$T_1 = 18.90$
$T_2 = 47,25$
$T_3 = 17,85$
$84\ m^2$

Ing. Tatiana Bautista (S.S.O)

Leika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

29 de Septiembre 2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:


Erika Gonzalez - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Nuños - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST 2 Oficiales, 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso, Seguimiento al protocolo de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del personal de obra). Continua trasiego de material (acera de rio) desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de Intervención #3 plazoleta, Trasiego de material de demolición desde el area de Intervencion #3 plazoleta hasta acopios en parqueaderos. Continua demolicion de piso terminado en tableta en el sector 3 plazoleta. Humectacion afinado de piso (placa) fundida en el area de Intervención #1 plazoleta y #3 Rotonda.

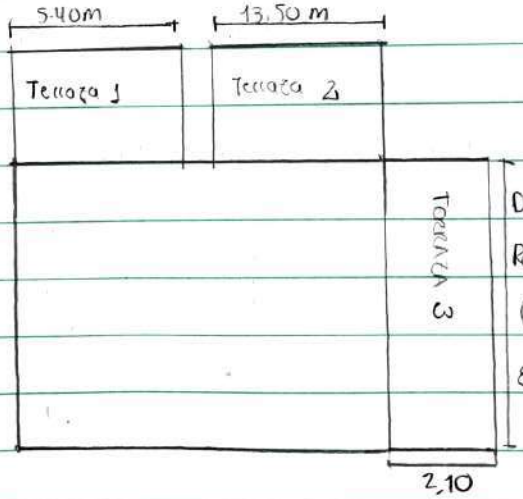

* fundida de mortero para afinado de piso en terrazas.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

30 de Septiembre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Nublado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Erika González - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana bautista - Inspector sst 2 oficiales, 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso, Seguimiento a los protocolos de salud ocupacional (uso de elementos de epp por parte del Personal de obra).

Continua traslego de material (arena de rio desde el centro de acopio en parqueaderos hasta el area de intervención #3 plazoleta). traslego de material de demolición desde el area de intervención # 3 hasta el centro de acopio en parqueaderos.


Continua la demolición de piso con terminado en tableta en el sector 3 plazoleta.

Humectación de afinado de piso (placa) fundida en el area de intervencion #1 plazoleta, #2 Rotonda.

Instalacion de Cerramiento en malla azul en el area de Intervención #3 Plazoleta.

Verificacion de funcionamiento de desagues y bajantes en el area de intervención #3 plazoleta.

Continua retiro de manto en las terraces y se inicia Retiro y Limpieza de material Asfaltico existente.

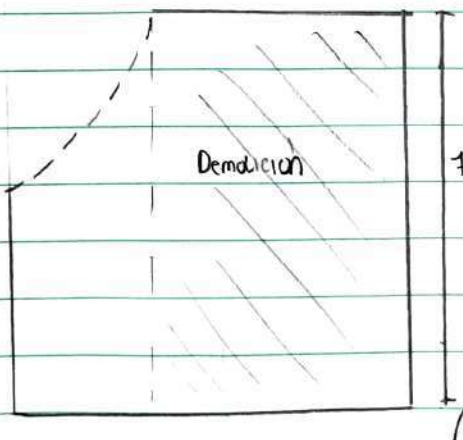


Erika Lizeth González
Ins. Interventoria

02 de octubre 2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima de mañana: Soleado
Clima de tarde: Soleado
Personal Interventoria:
Erika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista Inspector SST 2 oficiales. 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).
Continua traslado de material (arena de rio) desde acopios en el Parqueadero hasta el area de intervencion #3 placoleta. traslado de material de demolición desde el area de intervencion #3 hasta el centro de acopio en parqueaderos.
Se realiza Impermeabilización de terrazas con Emulsión Asfaltica Impermeabilizante EO-9. Con la finalidad que la Superficie quede impermeabilizada correctamente, se dan dos manos y se deja Secar. Area total impermeabilizada en terrazas = 84 m².

Erika Lizeth Gonzalez
Ins Interventoria

03 de octubre 2020
Hora de Inicio: 10:00 Am → Sabado
Hora de Salida: 12:30 Pm
Personal Interventoria:
Erika Lizeth Gonzalez - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST 2 oficiales 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de

Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra)
Continuan traslegos de material de demolición y de Arena de rio.
Se inicia demolición en zona #4, Cancha con la finalidad de ejecutar el mismo proceso hasta llegar a la junta de la placa y hacer un buen Proceso en este Sector el Acabado de Piso es Concreto y el afinado Asienta un espesor de 8 cm.

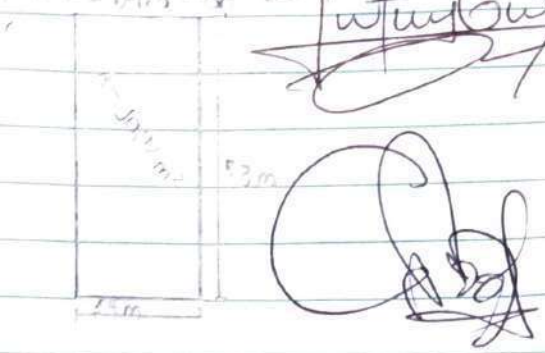

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

05- de octubre del 2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima Mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Personal Interventoria:
Jhon Garcia - Ins. Interventoria Erika Lizeth Gonzalez Ins. Interventoria
Personal Contratista:
Arq. Fernando delgado - Residente Tatiana Bautista - Insp. SISO 2 oficiales 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos (Se deja registro en planilla de Ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).
Continua la demolición del afinado de piso fenicado en concreto en el area de intervención #4.
Se Inicia demolición en la plazoleta #3 BIBLIOTECA con afinado de Piso en tableta.

RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
INS. Interventoria

06 de octubre de 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Nublado

Personal Interventoria:

Laura Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Fernando Delgado - Residente Arq. Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SST 2 Oficiales - 3 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).

Continua demolición de afinado de Piso con terminado en concreto en el area de intervención #4.

Continua demolición de piso en tableta y afinado en la placoleta #3 BIBLIOTECA.

Inicia impermeabilización de terrazas con manto asfaltico.

Ing. Tatiana Bautista ARQ. RESIDENTE Laura Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

07 de octubre 2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Personal de interventoria:

Laura Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal contratista:

Arq Fernando delgado - Residente Arq Gustavo Muñoz - Residente.

Tatiana Bautista - Inspector SST 2 oficiales - 3 ayudantes.

Actividades realizadas

Seguimiento de los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de EPP por parte del personal de obra).

Actividades realizadas.
Humectación y afinado de piso (Placa) fundida area #3, se instalamento en plazoleta " terraza #1; Se solicita al contratista por parte de interventoría. la actualización de laprogramación y flujo de caja para actualizar plazos. y actividades.
Se hace actualización a la entrega de EPP al personal de obra.

Ing. Tatiana Bautista. ARQ. RESIDENTE

Erika Ureth Gonzalez
Insp. Interventoria

08 de Octubre de 2020
hora de inicio 10:00
Clima Soleado.
Personal interventoría.
John García - Erika Gonzalez. "inspectores de interventoría"
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - Fernando Delgado. "Residentes de obra".
Tatiana Bautista - inspector SISO - No hay personal en obra.
Actividades del dia:
El personal de este frente fue desplazado como apoyo a las actividades de demolición y traslado de materiales de demolición de los paños del tanque N=1. del colegio Confederación bravas del diamante sede A

Ing. Tatiana Bautista ARQ. RESIDENTE

Erika Ureth Gonzalez
Insp. Interventoria

09 de octubre de 2020.
hora de inicio 10:00.
Clima soleado.
Personal interventoria
John Garcia - Erika Gonzalez, Inspectores de interventoria
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - Fernando Delgado, Residentes de obra
Tatiana Bautista, inspector SISO, No hay Personal en obra
Actividades del día.
No se registran actividades.

Ing. Tatiana Bautista

RESIDENTE OBRA

Erika Lizeth González
Insp. Interventoria


10 de octubre de 2020.
hora de inicio 10:00.
Clima Soleado.
Personal de interventoria.
John Garcia, Erika Gonzalez. Inspectores de interventoría
Personal del Contratista
Gustavo muñoz, Fernando Delgado, Residentes de obra
Tatiana Bautista inspector siso.
No hay personal en obra.
Actividades del día.
Se realiza visita por parte de especialista estructural para revisar las plazoletas donde se va instalar los domos para generar una propuesta adecuada a los requerimientos de cada espacio.

Ing. Tatiana Bautista

RESIDENTE OBRA


Erika Lizeth González
Insp. Interventoria

13-10-2020
No se reportan actividades.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria


14-10-2020.
Dia Soleado.
Inicio actividades 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia, Erika Gonzalez - Inspectores de interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residentes de obra
Tatiana Bautista - inspector SISOMA.
1 oficial y un ayudante.
actividades de 1 día.
Se termina la demolición del mortero de nivelación en la placa de la biblioteca, se deja organizado para realizar la fundida de placa el dia 15 de octubre de 2020, se hace trasiego de materiales al sitio autorizado.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

15 de octubre de 2020.
Dia soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal de interventoría
John F Garcia, Erika Gonzalez. - Inspectores de interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residente de obra.
Tatiana Bautista - Inspector SISOMA.
1 oficial y un ayudante.


avance de obra.
Se realiza control de Bioseguridad, (toma de temperatura y lavado de manos), se hace control al manejo de EPPs por parte del personal en obra, se funde la placa del sector a intervenir con una dosificación de 24 Paladas de arena por bulto de 50 kg de cemento, en un area de 6,30 x 1,25 m con un espesor de 4 cms.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Ins. Sisomc

16 de octubre de 2020.
No se reportan Actividades



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Ins. Sisomc


17 de Octubre de 2020.
No se reportan actividades



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Ins Sisomc.

19 de octubre de 2020.
No se reportan actividades.



Ins. Sisomc

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria.

20 de octubre de 2020.
No se reportan actividades.




Enka Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

Ins. Sisoma




21 de octubre de 2020.
No se reportan actividades.



Enka Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

ARQ. RESIDENTE


Ins. Sisoma




22 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia - Enka Gonzalez. insp. interventoría.
Personal de contratista.
Gustavo Muñoz - Fernando Delgado - resid obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Avance de obra
Se hace retiro de material de demolición en Volqueta Pin 16671
Placa AAC 774.
Conductor Victor Manuel Ortiz.
Capacidad 6 m³
cc 80370612.
se reporta llegada de material para obra, rollos de manto con Foild Aluminio, dos canecas de emulsión asfaltica.

Ins. Sisoma

ARQ. RESIDENTE





Enka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

23 de Octubre de 2020
Dia Soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John García, Erika Gonzalez - insp. Interventoria.
Personal de Contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - resid. Obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial:
1 Ayudante:
Avance de obra:
Se hace retiro de material de demolición en Volqueta PIV: 16671.
Placa AAC - 774.
Conductor Victor Manuel Ortiz - cc 80370612.
Capacidad 6m³. se retiran 3m³ de esta seda completa con confederación.
Se hace retiro del manto mal instalado en la terrazas no transitables,
se hace curado de la emulsión asfaltica en las zonas afectadas por el
retiro y se inicia la impermeabilización en estas zonas, se hace
Solicitud a la rectora de retirar elementos del area administrativa.


Ins. Sisoma

ARQ. RESIDENTE

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INS. INTERVENTORIA

24 de octubre de 2020.
Diasoleado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal de Contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. Obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Avance de obra.

Se continua con la impermeabilización de las terrazas no transitables

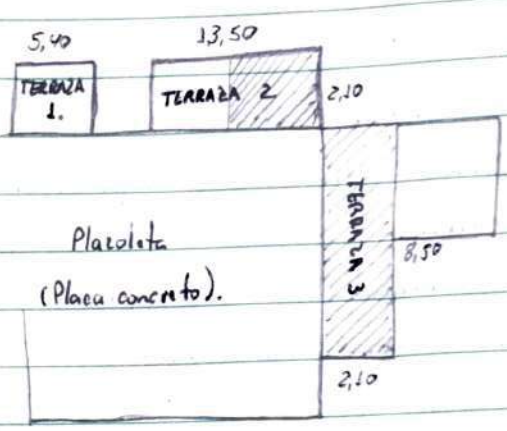

Ing. Gustavo PB
Ins. Siso mc.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lucth Gonzalez
Insp. Interventoría


26 de Octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de labores 10:00.
Personal de interventoría
John García - Erika Gonzalez - Insp interventoría.
Personal del Contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Avance de obra.
Se continua con la impermeabilización con manto en las terrazas no transitables "Terraza Nº 2", se hace prueba de estanqueidad en la terraza Nº 1. para detectar posibles filtraciones.

Ing. Gustavo PB
Ins. Siso mc.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lucth Gonzalez
Insp. Interventoría

27 de octubre de 2020
Dia soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - insp sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Avance de obra.
Se verifican protocolos de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos) buen uso y manejo de EPPs por personal de obra, se verifican fallas en el manto y se corrigen las filtraciones, se continua con la impermabilización de la terraza no transitable N°2 hasta donde alcanzo el material; se hace el retiro del manto en la zona administrativa

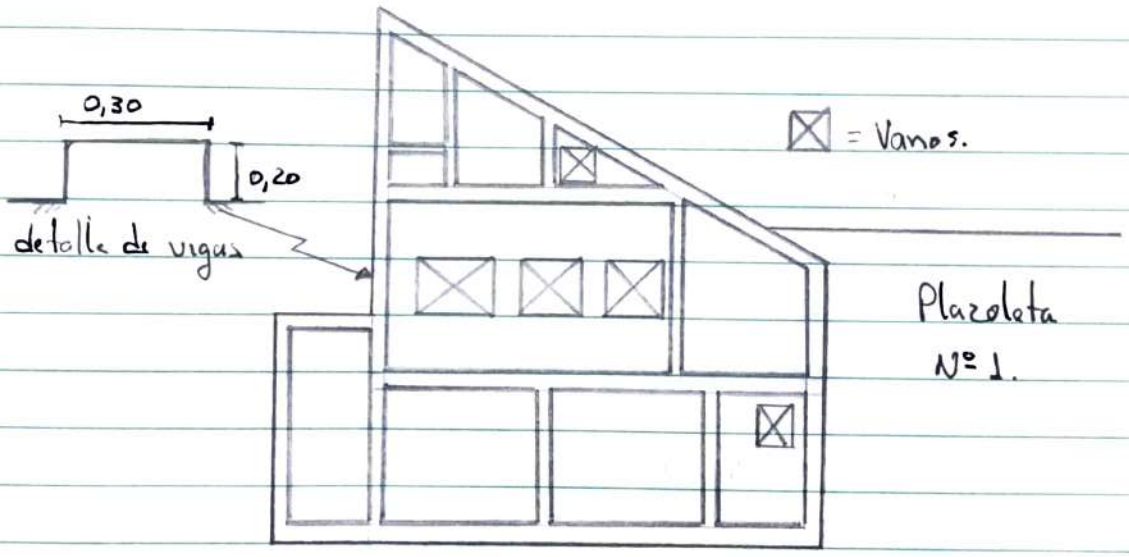


Area de retiro de manto con foild de Aluminio 172,90 m²

Ins Sisoma

ARQ. RESIDENTE

Erika Lineth Gonzalez
Insp. Interventoria


28 de octubre de 2020
Dia Soleado
Inicio de labores 10:00
Personal del contratista
Gustavo Muñoz. Resid obra. Tatiana Bautista insp SISOMA
Personal interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez insp. interventoría.
Personal en obra
un oficial y Un ayudante.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPP, se continua con el retiro de los muntos en la zona administrativa



Erika Lieth Gonzalez
Insp Interventoria

Insp. SISOMA

29 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez insp. interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Resid. Obra, Tatiana Bautista insp. SISOMA
Personal en obra
1 oficial, 1 ayudante.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs al personal en obra; Se termina de levantar el muro de la zona administrativa un total de 172,90 m² y se inicia ubicación de todo el retiro en el sitio autorizado por la rectoria del colegio.



Erika Lieth Gonzalez

Insp. SISOMA

30 de octubre de 2020
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez Insp. Interventoría.
Personal del Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma.
Personal en obra.
1 oficial y 1 ayudante.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs por parte del prsonal en obra, se recoge todo el mento dispuesto en las áreas afectadas por las actividades de mantenimiento, se recibe el material para la impermeabilización de las areas faltantes.

Tatiana B
Insp. Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

31 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
John F García, Erika L Gonzalez – insp interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
Personal en obra.
1 oficial y 1 ayudante.
Luego de verificar los protocolos de Bioseguridad y buen uso y manejo de EPP; se continua con la impermeabilización de la terraza Nº2 y se inicia con la impermeabilización de la Zona administrativa.

Tatiana B
Insp. Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

3 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. Interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma.
Personal en obra.
1 oficial y 1 ayudante.
se verifican protocolos de seguridad y el buen uso y manejo de EPPS;
Se continua con la impermeabilización de la Zona administrativa
Con manto Foild de aluminio.

Insp-Sisoma.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

4 de Noviembre de 2020
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. Interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - Insp. Sisoma
Personal en obra
1 oficial y 1 ayudante.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs;
Se continua con la instalación del Manto con foild de aluminio
hasta donde alcanzo el material; el contratista solicita suministro de
3 rollos de manto para finalizar esta actividad.

Insp-Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

5 de Noviembre de 2020.
No se reportan actividades en el frente ya que los instaladores se encuentran en el colegio Confederacion Suiza Sede A.

Erika Lizeth Gonzalez

Insp. Sisome.

6 de Noviembre de 2020.
No se reportan actividades.

Erika Lizeth Gonzalez

Insp. Sisome.

7 de Noviembre de 2020.
No se reportan actividades

Erika Lizeth Gonzalez


Insp. Sisome

9 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - Insp interventoria.
Gustavo Muñoz - Resid Obra, Tatiana Bautista - insp. sisome
1 oficial y 1 ayudante.
Se continua con la impromada de las plazoletas y el alistado de las superficies para la impermabilizacion y acabado final.

Erika Lizeth Gonzalez

Insp. Sisome.


10 de Noviembre de 2020
Dia soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. Interventoria
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista insp. sisoma
1 oficial, 1 ayudante.
Se inicia la conformación de cañuelas en la plazoleta principal y se culmina la imprimación del piso en las azoteas transitables.



Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez


11 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp-interventoría
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
1 oficial y 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS se continua con la conformación de cañuelas y Nivelación de pisos.



Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

12 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
No se reporten actividades en este frente, los instaladores se encuentran adelantando la impermeabilización del tanque Nº1 de confederacion Suiza sede A.




Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

13 de Noviembre al 18 de Noviembre.
Se encuentra el personal de impermeabilización de pisos realizando la imprimación de la plazoleta del tanque Nº1. en confederaciones.


Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez

19 de Noviembre.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - Insp. Sisoma
1 Instalador - 1 ayudante.
una vez verificados los protocolos de seguridad y buen manejo de EPPS, Se continua con el traslado de los materiales para la impermeabilización de la plazoleta de la zona administrativa hasta que las lluvias permitieron adelantar esta actividad.

Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez

Noviembre 19 al 24 de 2020
No se reportan actividades en este frente debido a falta de Materiales y mal tiempo "lluvias constentes", el instalador se excusa de sus actividades, Sr Carlos Roa, debido a que Su esposa se encuentra con quebrantos de salud y por tanto debe ser hospitalizada.


Erika Lizeth Gonzalez

Insp. Sisoma


25 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 12:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - Insp. interventoria.
Personal del Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma
1 oficial y 1 ayudante.
Una vez verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS por el personal de bioseguridad, debido a solicitudes por parte de la administración del Colegio por la entrada de aguas lluvias en el Salon Judicial y en la oficina de la guardia se realizan reparaciones y sellado provisional de las dilataciones Con Mechas cañas para evitar que las lluvias sigan afectando las zonas antes mencionadas, la humedad encontrada en el Borde del fondo en el primer piso es una afectación recurrente de la placa reparada con anterioridad al presente contrato por tanto hasta No tener confirmación plena sobre el estado de esta placa ésta en cuanto a garantias no se puede intervenir.

Erika Lizeth Gonzalez

26 de Noviembre de 2020.
dia Nublado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA.
1 oficial y 1 ayudante.
una vez verificados los protocolos de seguridad y buen manejo de EPPS, se continua con la impermeabilización de la zona administrativa.




Erika Lizeth Gonzalez






27 de Noviembre de 2020.
dia Nublado - lluvias en la tarde.
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA
1 oficial y 1 ayudante.
Una vez verificados los protocolos de seguridad y buen manejo de EPPS, se continua con la pintura bituminosa en los muros con foil de aluminio y se fundan las canaletas en sitio para las plazoletas transitables.





Erika Lizeth Gonzalez



28 de Noviembre al 03 de diciembre se suspenden Actividades por falta de Suministro de materiales.

Erika Liceth Gonzalez

04-12-2020

Inicio de Actividades: 10:00 am

Personal de interventoria:

Jhon F. Garcia, Erika Gonzàlez - Insp. Interventoria

Personal del Contratista:


Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista Inspecto. SST

1 Oficial, 1 Ayudante

Actividades Realizadas:

Coreccion en fallas detectadas en la instalacion de Foird de Aluminio en la zona administrativa. y Coreccion en Canaletas.

Erika Liceth Gonzalez







- 05-12-2020

Inicio de Actividades: 10:00 Am

Personal Interventoria:

Jhon F. Garcia, Erika Gonzàlez - Insp. Interventoria

Personal Contratista:


Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista - Insp. SST

1 Oficial, 1 Ayudante


Actividades Realizadas:

Coreccion de fallas detectadas en la Instalacion de Foird de aluminio en las Placaletas y se inicia Impermeabilizacion con Perma Play en las Aceras transitales.

Erika Liceth Gonzalez








07-12-2020
Inicio de actividades: 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente; Tatiana Bautista - Inspector SST
1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades Realizadas:
Impermeabilizacion Con Perma Play en las areas transitables
Erika Lizeth Gonzalez

09-12-2020
Inicio de actividades: 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente; Tatiana Bautista - Inspector SST
1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades Realizadas:
Impermeabilizacion con Perma Play en las areas transitables
Erika Lizeth Gonzalez

10-12-2020.
Inicio de actividades. 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del Contratista


Gustavo Muñoz - raid obra, Tatiana Bautista - insp. SST.
1 oficial - 1 ayudante.
Una vez verificados los protocolos de Bioseguridad y buen manejo de EPPs: Se continua con la impermeabilizacion de las areas transitables, Se recibe material para acabado de placa.




Erika Lizeth Gonzalez




11-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - raid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante.
Se finaliza la impermeabilizacion de la plazoleta #1 luego de verificar los protocolos de bioseguridad.






12-12-2020.
Erika Lizeth Gonzalez
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - raid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad; Se inicia traslado de Materiales




Erika Lizeth Gonzalez





14-12-2020.
Dia Sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso manejo de EPPS
se continua con el trasiego de 20 m^2 de adoquin 4 x 20 x 10
y de 20 bultos de cemento.






15-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante
Verificados los controles bioseguridad y el buen uso y manejo de EPPS.
Se continua con el trasiego de material para acabados de pisos.






16-12-2020.
Dia Sabado
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista.
1 oficial y 1 ayudante, Gustavo Muñoz - raid obra, Tatiana Bautista - SST.
Unificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs;
se continua con el traslado de materiales para el acabado de pisos
de las plazoletas.









Erika Lizeth Gonzalez

17 - 12 - 2020
Dia Sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - raid obra, Tatiana Bautista - insp. SST.
Se inicia la construcción de cimientos y dilataciones en la plazoleta Nº1.
Con adequin 20 x 10 x 4. según distribución acordada.

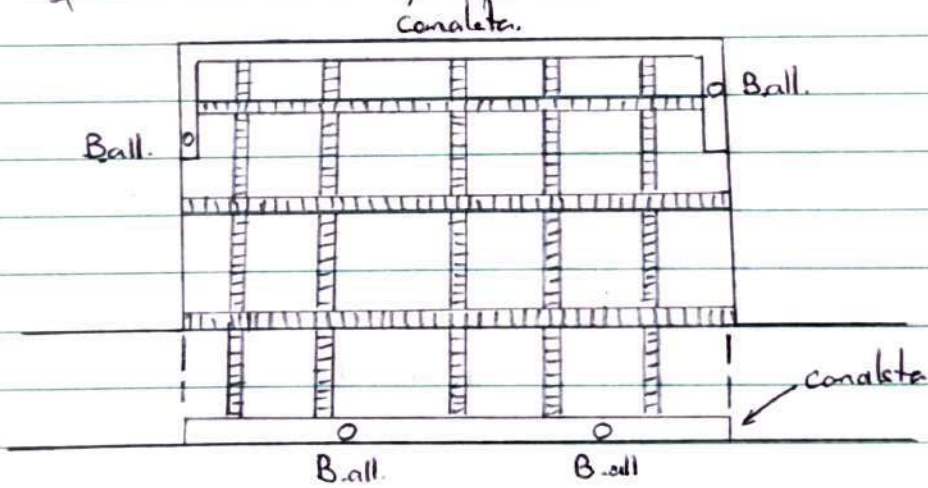


Se realizara acabado con concreto escobiado de 3000 Psi luego de
construidos los cimientos con caida a 2 aguas direccionados a cada
canaleta.





Erika Lizeth Gonzalez




18-12-2020.
Dia Sabado. - Lluvias ligeras en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial - 1 ayudante.
Se continua con la construcción de los confas y dilataciones con adoquin 20x10x4; Esto luego de verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.



Erika Lizeth Gonzalez


19-12-2020.
Dia Sabado. - Lluvias ligeras en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
Se continua con los confas y dilataciones.



Erika Lizeth Gonzalez


21-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.

John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid de obra, Tatiana Bautista - insp SST.
1 oficial y 1 ayudante.
Se continua con la construcción de las cunetas y dilataciones.




Erika Lizeth Gonzalez

22-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SST.
1 oficial, 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
Se continua con la construcción de las cunetas y dilataciones.



Erika Lizeth Gonzalez

23-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra - Tatiana Bautista - insp SST.
1 ayudante, 1 oficial.
Se termina la construcción de cunetas con adoquin 20x10x4.




Erika Lizeth Gonzalez


Contrato Nº COI PCCNTR 1577535.
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo. de los plantes físicas; así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Contratista: Consorcio retornar.
NIT: 901.384.708-1.
Contrato Nº COI PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental al contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de los plantes Fisicas; asi como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo, GRUPO 4.
Interventor: ACZR Ingenieria & proyectos SAS.
NIT 830.123.577-7.
Colegio Fanny Mickey - Dirección Cra 18N # 70A Sur-25 Bogota
Fecha de acta de inicio de obra 01-09-2020.
Personal de interventoria:
Ing. Melisa Jaez - residente.
Ing. Erika L Gonzalez - inspectora.
Ing. John F Garcia - inspector.
Supervisor SED.
ing. Ivon Duarte.
Personal del contratista.
Arq. Gustavo Muñoz - residente.
ing. Tatiana Bautista - inspector siso.

TOMO II.

24 diciembre de 2020.
Se detienen actividades en este frente por motivo de fiestas navideñas

05-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio labores 10:00.
Personal interventoria.
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
1 oficial - 1 ayudante.
Se inicia trasiego de materiales para el acabado de pisos en la placa superior.






06-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoria.
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Se continua trasiego de materiales para acabados en placa de la superior.






07-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio labores. 10:00.
Personal interventoria.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.

Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Verificados los protocolos de seguridad, se continua con el trasiego de materiales para fundida de losetas en placa superior principal, se retiran materiales peligrosos (bolsas de cemento, morteros residuales).




08-11 - Enero - 2021.
Se suspenden actividades por mandato de la alcaldia de Bogotá.

12-01-21.
Dia sabado.
inicio labor 10:00.
Personal interventoria
John Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
1 oficial - 1 ayudante
Verificados los protocolos de bioseguridad; se inicia fundida de losetas en la placa principal superior.




13-01-21.
Dia sabado.
inicio labor 10:00.
personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.


Se verifican protocolos de bioseguridad, se continua con el acabado de piso en concreto escobeado para la plazoleta principal.



14-01-2021
Dia Sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoria
John Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Verificados los protocolos de seguridad; se continua con el acabado de piso en concreto escobeado para la plazoleta principal.



15-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio labor. 10:00.
Personal interventoria.
John Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con el acabado de piso en la plazoleta principal, se verifica el curado y se recomienda revisar fisuras presentes en los acabados.



18-01-2021.
Dia soleado.
Inicio labor 10:00
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Se inicia trasiego de materiales para acabados, se daña la llanta de la carretilla lo cual retraza el avance programado, llega el manto y materiales para recubrimiento impermeabilizante de las placas.

19-01-2021.
Dia soleado.
Inicio labor 10:00
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obras, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial - 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se recaban 5 m^3 de mixto, 70 bultos de cemento, textil de recubrimiento para el permaplay, Se continua con el trasiego de materiales, se verifican correcciones realizadas al acabado del concreto, se recomienda mas agua en el curado.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA

Contrato Nº COL PCCNTR. 1577535
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Firma contratista: CONSORCIO RETORNAR.
Nit: 901. 384. 708 - 1.
Interventoria Contrato COL. PCCNTR. 1679920 de 2019.
Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental del contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. Grupo 4.
Firma contratista AC2R Ingeniería & Proyectos SAS.
Nit. 830. 123. 577-7.
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE, Sede A - Confederación Suiza.
CL 55 Sur # 69b - 61.
localidad 19 Ciudad Bolivar.
Supervisor del Contrato SED.
Ing. Ivan Duarte.
Personal administratwo contratista.
Residente de Obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional sisoma.
Ing. Tatiana Bautista.
Personal Interventoría.
Residente de interventoría.
Ing. Melissa Janez.
Inspectores de interventoria.
Ing. Erica Gonzalez.
CyGA. John Fredy Garcia C.

Inicio de Obra.
Fecha firma del acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020.
Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las areas a intervenir.
Impermeabilización de dos tanques subterraneos.
Impermeabilización de placa sobre un tanque.
Construcción de sendero peatonal.
Mantenimiento y refuerzo de la seguridad del cerramiento perimetral sobre la avenida (Calle 18 i).

Septiembre 11 de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 13:00.
Residente de Obra Arq. Gustavo Muñoz
Inspectores de interventoria.
CyGA. John Fredy Garcia
Ing. Erika Gonzalez
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista
oficial de Obra:
William Ulloa.
Ayudante de Obra
Michael. Nopia.
avance de obra
Se inicia demolición de acabado de placa en tablón y afinado. de 4cm sobre el tanque de suministro denominado Nº 1, se verifica el espacio destinado para el Sendero peatonal; se inicia el vaciado de agua del tanque a intervenir.
Se realiza entrega de dotación y elementos de bioseguridad en el frente de trabajo.

Arq. Gustavo Muñoz
John F Garcia
Insp. Interventoria
Tatiana Bautista
Prof. Sisoma.

Septiembre 12 de 2020.
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00.
Residente de Obra: Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional Sisoma: Ing. Tatiana Bautista.
Inspectores de interventoria.
CyGA John Fredy Garcia.
Ing. Erika Gonzalez
Personal de Obra.
oficial: William Ulloa.
Ayudante: Michael Nopia.
Avance de Obra:
Se continua demolición de tablón de piso en la placa sobre el tanque de suministro N°1; Se determina el acopio de materiales y RCD en el parqueadero de la institución; provicionalmente se hace el acopio en el pasillo contigüo a la placa del tanque intervenido.

ARQ. GUSTAVO MUÑOZ


John F Garcia
Insp Interventoria.

ERIKA LIDETH GONZÁLEZ
Ins. Interventoria

Ing. Tatiana Bautista-Sisoma


Septiembre 14 de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de Obra: Arq Gustavo Muñoz.
Profesional Sisoma: Ing. tatiana Bautista.
Inspectores de obra
CyGA John Fredy Garcia
Ing. Erika Gonzalez.
Personal en Obra.
Oficial: William Ulloa.
Ayudante: Michael Nopia.


Avance de Obra.
Se continua con la demolición de acabado en placa, Tablon y afinado a 4cm; se verifica el cerramiento del area intervenida; se hace seguimiento a la toma de temperatura del personal y la bioseguridad del espacio; se encuentra tubo de suministro de ½" al cual se le realiza reparación de 20 cm de tuberia y se continua con la actividad de demolición y retoleccion de RCD. Se da autorización para el retiro de RCD debido a la activación del PIN # 18896.



Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Grana Ureña Gonzalez
Inspector Int.






Septiembre 15 de 2020.
dia Nublado.
Inicio Actividades 10:00 am.
Residente de obra Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional Sisoma Ing. Tatiana Bautista.
Inspectores de Obra
CyGA John Freey Garcia
Ing. Erika Gonzalez.
Personal en Obra
Oficial: William Ulloa
ayudante: Michael Nopia.
Se hace control de bioseguridad al pesonal en obra y administrativo; se hace mantenmiento del cerramiento en el area intervenida; Se verifica el arreglo realizado a la tuberia de ½"; se continua con el Proceso de demolición del acabado de placa Tablon y afinado a 8mm; Se hace consulta a la almacenista del Colegio docente Liliana sobre el tratamiento que se va a dar a la jardinera que se encuentra en la placa del area intervenida

vía telefónica confirma que la jardinera si debe mantener ya que forma parte de la estructura inicial del colegio "Expresado por el señor rector de la institución".

Esquema del area intervenida para demolición de acabado de placa.

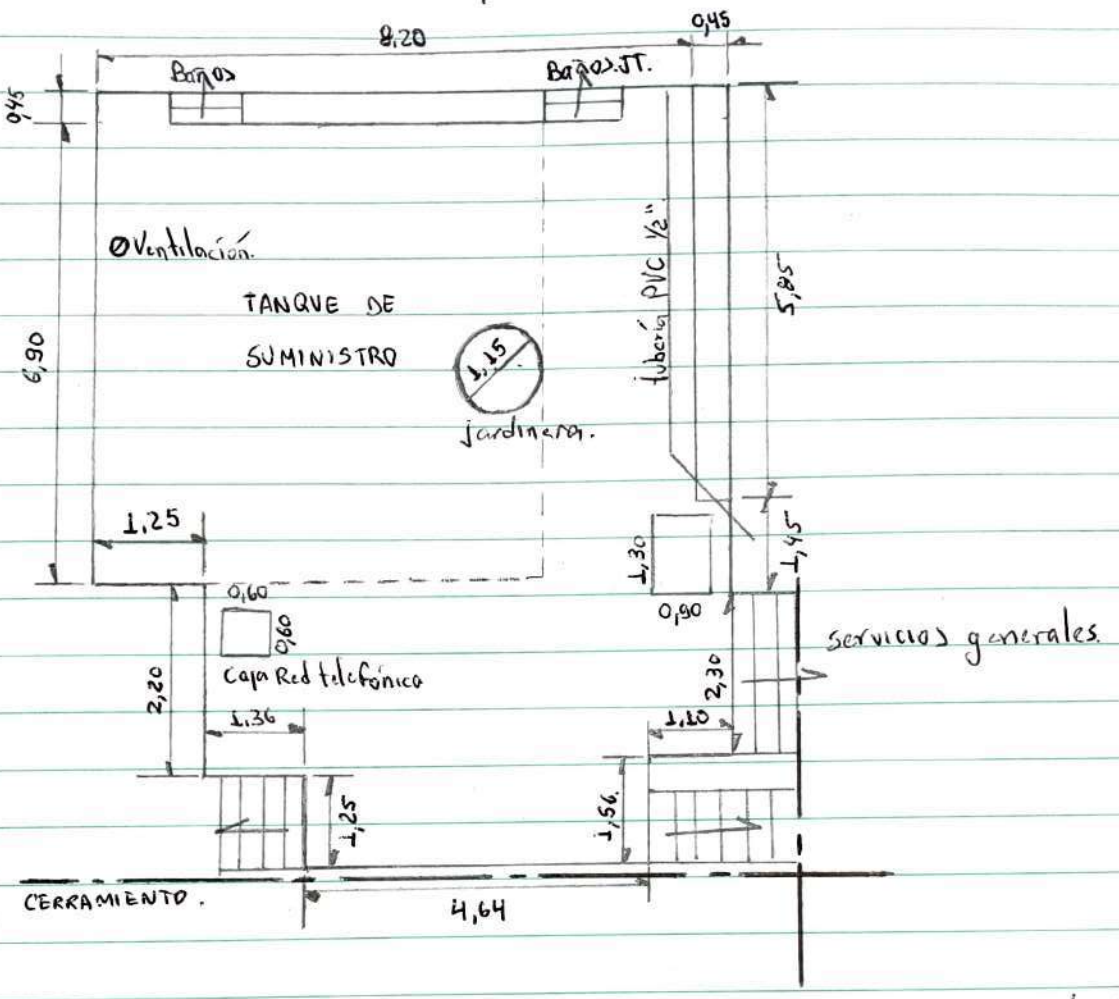

Materialidad de la jardinera: Ladrillo recocido en tizon; Se plantea el retiro de la tierra negra contenida en la jardinera para hacer impermeabilización con Manto y adición de un escurridero; relleno con material existente

Informe 5.50 sin novedad

Ing. Tatiana Bautista
5.50.

Grima Lizeth Gonzalez
Inspector

Ingº. Interventoria

Septiembre 16 de 2020.
Dia Parcialmente nublado
Inicio Actividades 10:00 am
Residente de obra Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional SISO. Ing. Tatiana Bautista.
Inspectores de interventoria.
CyGA John Fredy García.
Ing. Erika Gonzalez.

Personal de obra
oficial: William Ulloa.
ayudante: Michael Nopia.
Se hace control de bioseguridad al personal en obra; se verifica cerramiento en el area intervenida; se continua con la demolición del acabado de placa y del afinado 4cm y 8cm; se define como area para el acopio de RCD en la zona de parqueaderos frente a la entrada vehicular.
Se realiza cambio de guantes al personal debido al deterioro de los mismos.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Genia Lizeth Gonzalez
Inspector

John Fredy García
Inspector de interventoria.

Septiembre 17 de 2020.
Dia Soleado.
Inicio Actividades 10:00 am.
Residente de Obra Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional SISO Ing. Tatiana Bautista
Inspectores de interventoria
CyGA John F García
Ing. Erika Gonzalez.
Se hace control de Bioseguridad (Toma de temperatura, lavado de manos, desinfección de ingreso) por parte del personal encargado en la obra; Se verifica cerramiento del

area intervenida; Se solicita al personal de seguridad del colegio dar acceso al personal de obra para continuar con el vaciado del tenque N°1; se verifican las medidas y cotas de nivel en el espacio designado para el sendero peatonal, esto con el fin de realizar ajustes al diseño y propuesta a presentar por parte del contratista para aprobación; se propone por parte del contratista Soluciones varias para el mantenimiento y aseguramiento de cerramiento perimetral sobre avenida principal (calle 18i); se realiza capacitación por parte de la profesional SISO sobre el sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST; Para este fin el personal de obra se desplaza al colegio Fanny Mickey.

se realizo una capacitacion informando que el SG-SST es una herramienta que permite el desarrollo del ciclo PHVA (planear-hacer-verificar-Actuar) el cual se debe tener en todas las empresas. La implementacion del sistema y por lo tanto del ciclo permite el desarrollo para la intervencion de medidas de control, mitigacion y prevencion de peligros y riesgos que se pueden presentar en el sitio de trabajo.
La implementacion de este sistema esta bajo el decreto 1072 del 2015 -articulo 6. El cual es el decreto unico reglamentario del sector trabajo y la ley 9; titulo III de 1979; articulo 714.
Objetivo: el SG-SST tiene como objetivo principal identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos que se presentan para proteger la salud y seguridad de todos los trabajadores y establecer una mejora continua.
Nuevamente se habla con mas detalle sobre los protocolos de bioseguridad y uso de EPP.
Bioseguridad: Lavado de manos cada 3 horas, antes y despues de cada comida con abundante agua y jabon. Distancia comun de 1 metro entre los trabajadores cuando se [illegible] los labores sobre.

Toma de temperatura todos los días al inicio de cada labor y reporta cuando la temperatura este en 37,2°C o superior a esta. Uso de tapabocas permanente.

Epp= Casco; se informa sobre el uso del casco de seguridad tipo II para evitar golpes en la cabeza por objetos en caída libre o fijos y protección contra la radiación solar. Guantes, para evitar cortes, infecciones y golpes en las manos, dependiendo la labor que se encuentren realizando. Gafas; transparentes de marco liviano para protegen la membrana mucosa del ojo y salpicaduras. Buso manga larga de tela tipo algodón y jean calibre 14. Tapabocas para evitar la inhalación de material particulado y enfermedades respiratorias. Botas; punta de acero para evitar golpes y que cubra los tobillos.

También se reciclo los reportes que tienen que hacer a la SISO como lo son; accidentes de trabajo, enfermedades laborales y se recordó la importancia de rotar al personal en los labores a desempeñar en el transcurso del día, así mismo como los descansos que se deben tomar en el horario laboral e hidratación frecuentemente.

Tatiana B

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Ureth González

Inspector

Insp. Interventoría

Residente Interventoría

Septiembre 18 de 2020.
Dra Soleado.
Inicio de actividades 10:00 am
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz
Arq. Fernando. Delgado.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista
Interventoria.
Ing. Erika lizeth Gonzalez.
Cyga John Fredy Garcia C.
Personal en obra.
oficial William Ulloa.
Ayudante Michael Nopia.
Avance de obra
Se hace control de bioseguridad al personal administrativo, de obra e interventoria; una vez terminada la demolición de los acabados en tablon y afinados se continua con la recolección de los RCD y el acopio en el parqueadero de la institución; Se hace recorrido de socialización con los asesores de DRISORO sobre propuestas y productos acordes a las impermeabilizaciones de la placa y los dos tanques a intervenir, dichos profesionales acuerdan realizar una visita tecnica a la institución para realizar un diagnostico mas acertado sobre la situación actual de los tanques y su posible solución; se socializa la propuesta del contratista con respecto al corredor de acceso inclusivo, se hacen aceberaciones por parte del supervisor y se solicita replantear y presentar nuevas propuestas de aprovechamiento del espacio a intervenir; se hace propuesta para hacer refuerzo del cerramiento perimetral con malla corrugada de orificio 1/2" x 1/2" o malla expandida (acero al carbón) tipo calliroll. aumentando la altura de esta a tres Metros mantenimiento de los paneles existentes y pintura general.

Septiembre 19 de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00 am
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista
Interventoría
Ing. Erika Lizeth Gonzalez
CyGA John Freddy García.
Personal en obra
Oficial William Ulloa.
Avance de obra
Se continua con el acopio de los RCD en el parqueadero, se reporta novedad de ayudante Michael Nopia el cual manifiesta encontrarse mal de salud; se hace retiro de materiales en volqueta.
Placa EKF254.
capacidad 7m³
Pin: 1553 80901924.
conductor Jaime Andres Pulido.
CC. 80901924.
El ayudante Michael Nopic reporta sentir malestar estomacal por lo tanto no se presenta a labores. Se realizan protocolos de bioseguridad y se verifica que el personal cumple con los EPP.

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ
Inspector. Interventoría

Insp. Interventoria.

Septiembre 21 de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residentes de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma.
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoría.
Ing Erika Lizeth Gonzalez.
Cy6A John Fredy García.
Personal en obra
Oficial William Ulloa.
Avance de obra.
Se realiza seguimiento a los protocolos de seguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro del ingreso en planilla y el uso de EPP por parte del personal de obra
Se continua con el trasiego y acopio del material de demolición al parqueadero; debido a problemas de orden publico y transportes por las manifestaciones se da fin a las actividades a las 12:00 m.
El ayudante Michael Nopia no se presento al lugar de trabajo.

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector interventoría

Insp. Interventoría.

Septiembre 22 de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz
Arq. Fernando Delgado.

Profesional Sisoma
Ing. tatiana Bautista.
Interventoría
Ing. Erika lizeth Gonzalez.
CyOA John Fredy García.
Personal en obra
oficial: William Ulloa.
Avance de obra
Se hace seguimiento al control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos); se verifica el uso de elementos EPP, se hace observación al contratista ya que en este frente se encuentra un oficial y el ayudante desde el dia sabado no regresa, se solicita enviar nuevo personal a este frente lo antes posible; El residente manifiesta que el nuevo personal se encuentra en examenes de aptitud e ingreso y que el día 23 ya estara en obra; se adelanta el vaciado de la jardinera para adelantar la impermeabilizacion de esta en conjunto con la placa; en horas de la tarde llega material a obra 30 bultos de cemento tapex por 50 kg, se solicita apoyo de personal del colegio Fanny Mickey para el trasiego del material. Llegan 2 ayudantes.

Ing. Tatiana Bautista (Siso)

Insp. Interventoría.

Erika Lizeth Gonzales
Inspector Int.

Septiembre 23 de 2020.
Dia lluvioso.
Inicio actividades 10:00.
Residente de Obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista

Interventoria
Ing. Erika lizeth Gonzalez.
CyGA John Freely Garcia C.
Personal en obra
oficial William Ulloa.
Ayudante. Javier Velasquez.
Avance de obra
Se verifica control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos); Se verifica el uso y entrega de EPPS al nuevo personal de obra, llega un viaje de arena de rio 7m³ Volqueta.
Placa EKF 254.
Capacidad 7m³
Conductor Jaimes Andres Pulido.
cc. 80901924.
Se entrega dotación al personal nuevo, se da capacitación sobre la importancia del uso de los EPP y respectivo cumplimento con los protocolos de bioseguridad
En la excavación de vaciado de la jardinera se encuentra respiradero adicional del tanque en tuberia sanitaria tipo liviano de 3".

Lectura BB
Inspectora Bachata (Siso)


Erika lizeth González
Interventoria

Insp. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

24 de Septiembre de 2020.
Dia Parcialmente nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq Fernando Delgado

Profesional SISO.
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoria.
Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
CyBA John Fredy Garcia.
Personal en obra.
1 oficial
1 ayudante.
avance de obra.
Se realizan las revisiones y controles Biometricos (temperatura, lavado de manos), y uso de EPP; Se trazan las maestras para el mortero a una altura promedio de 4cm según se evidencia en el esquema, con un ancho de 20cm.

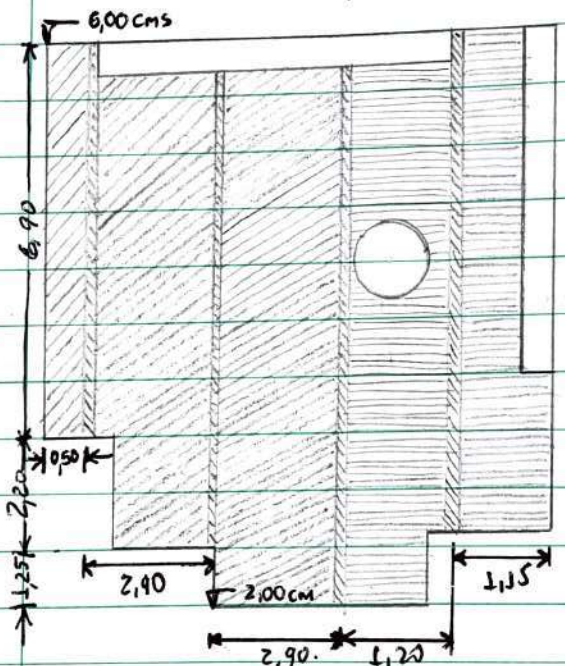

Area demolida 78,70 m² de tablon y afinado 78,70m² altura promedio 4cms se completa el vaciado de la jardinera 1,13 m³, se inicia el tendido el mortero de afinado a una altura promedio de 4cms en las areas señalados en el esquema completando un area de 51,78 m², Se verifica dosificación del mortero 30 Paladas de arena por un bulto de 50 Kg de cemento.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
Interventoria

Ing. Interventoria


25 de Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma.
Ing Tatiana Bautista
Interventoria.
Ing Erika Lizeth Gonzalez.
CyGA John Fredy García.
Personal de obra.
1 oficial.
1 ayudante.
Avance de obra.
Se realizan las revisiones y controles biometricos (temperatura y lavado de manos), Uso de EPP; Se continua con el mortero de afinado a una altura promedio de 4cms completando un area de 26,92 m^2; completando la totalidad de area demolida 78,70 m^2; Se realiza visita por parte de supervisión del contrato como parte del recorrido del comite de obra, Interventoria solicita al contratista programación en formato Project (digital), así como presupuestos y cotizaciones de las actividades no previstas (NP) para las impermeabilizaciones de los tanques y de la placa, El contratista adquiere como compromiso realizar la entrega de las propuestas de diseño de las mallas del cerramiento, el sendero para dar pronta solución a estos requerimientos.

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
Interventoria

Insp. Interventoría.

26 de Septiembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoria
Ing Erika Lizeth Gonzalez
Tyga John Fredy García.
Personal en obra
1 oficial.
1 Ayudante.
Avance de obra.
Se realizan las revisiones y controles de Bioseguridad (temperatura, lavado de manos y EPP), se hace curado de la placa fundida, se realiza traciego de material de demolición, se retira el material de la limpieza de la caja electrica 60X60.




Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Insp. Interventoría.

ERIKA Lizeth Gonzalez
Inspector Interventoria

28 de Septiembre de 2020.
Dia Sabado
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional SISOMA.
Ing Tatiana Bautista.

Interventoria
Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
CyGA John Fredy García.
Personal en obra
1 Oficial.
1 Ayudante.
Avance de obra
Realizadas las revisiones y controles de Bioseguridad (temperatura, lavada de manos, EPP); se realiza curado de la placa; se pareta el interior de la jardinera con reposición de la tubería de ventilación afectada.




Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

29- Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional. SISO
Ing. Tatiana Bautista
Interventoria.
Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
CyGA. John Fredy García.
Personal en obra.
1 Oficial.
1 Ayudante.
Avance de obra
Realizadas las revisiones y controles de bioseguridad (temperatura, lavado de manos, EPP); se solicita al personal en obra el curado de placa; se afina el pañete para la impermeabilización de la jardinera; Se realiza reunión de socialización con el sr rector del Colegio Hector Raul Ortiz tel: 3158016231 y con presencia del apoyo a la Supervisión por parte de SED; Se socializan las actividades priorizadas

para la institución; impermeabilización de los dos tanques de suministro se define el acabado de la placa intervenida con la misma materialidad de las circulaciones existentes (loseta 10x20); la propuesta de realizar la reposición del cerramiento sobre la vía principal y hasta la portería peatonal con cambio de malla de 1/2" x 1/2" o similar; el rector solicita que las mallas retiradas les sean entregadas a la institución para su posterior aprovechamiento; Se da propuesta sobre el sendero peatonal por parte del contratista al rector y se decide dar inicio dar inicio a las actividades de descapote y nivelación de la zona a intervenir

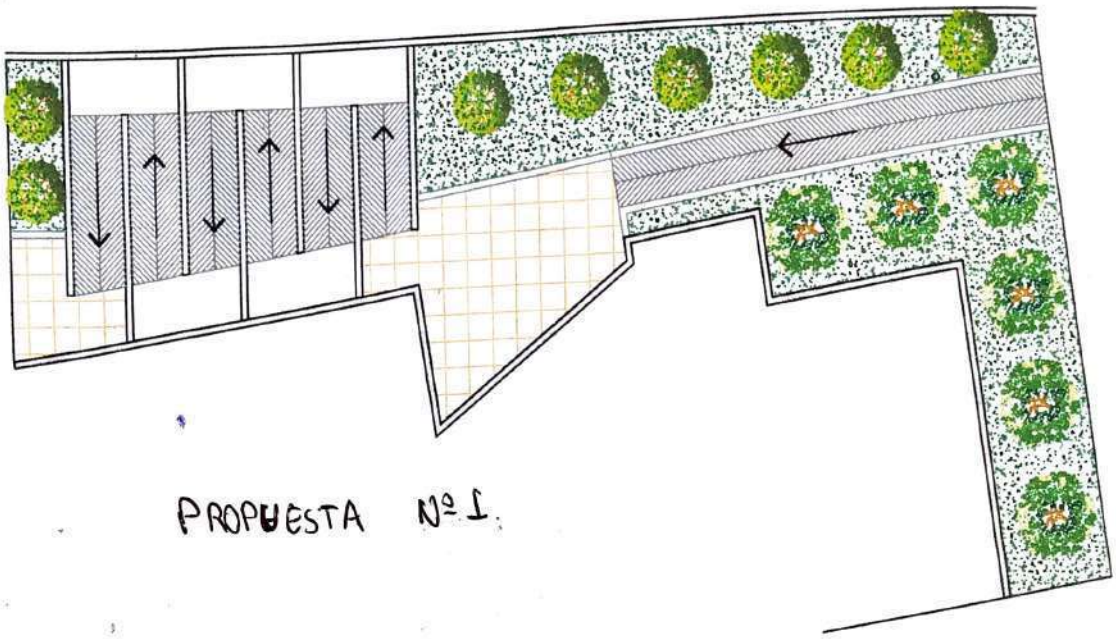

PROPUESTA Nº 1.

En cuanto al cerramiento se propone aumentar la altura a 3 mts y la construcción de un muerete inferior por cada modulo a una altura de 30 cms.


Ing Tatiana Bautista (SISO)

Olga Lucero Gonzalez
Ing. Interventoria

Ing. Interventoria.

Arq. Residente

30 de Septiembre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Siso.
Ing. Tatiana Bautista
Interventoria.
Ing. Erika Gonzalez.
C y G A John F García
Personal en obra
1 oficial
1 ayudante.
Avance de obra
Una vez revisados los controles biometricos (toma de temperatura y lavado de manos) así como el uso de EPP por personal de obra; Se evidencia daño del termometro en este frente de obra y se solicita reposición inmediata, se presenta por parte del contratista segunda propuesta para el sendero peatonal.

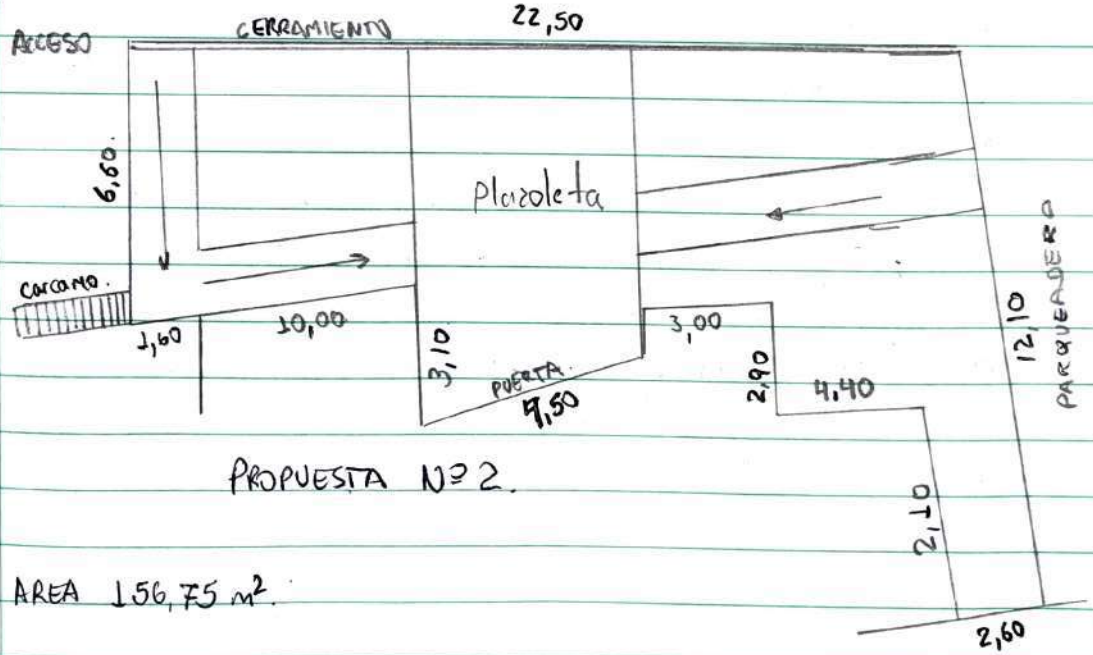


PROPUESTA Nº 2.

AREA 156,75 m².

Se inicia descapote del area a intervenir en el sendero, se solicita cerramiento con polysombra del area a intervenir, se solicita extención electrica y reflector para iniciar el proceso de

Secado del tanque N°1.



Erika Liceth Gonzalez
Ins. Interventoria




Insp Interventoria. ARQ. ~~RESIDENTE~~

01 de Octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz
Fernando Delgado
Prof SISO.
Tatiana Bautista
Interventoria.
Erika Gonzalez.
John F Garcia.
Personal en obra.
1 Oficial.
1 ayudante.
avance de obra
Se verifica uso de EPP por el personal en obra y el lavado de manos; se solicita reposición de termometro para control de temperatura, el contratista manifiesta que por estar en garantia se solicito al proveedor cambio del equipo, se continua con el descapote del area para el sendero, se solicita el cerramiento del area a intervenir.




Erika Liceth González
Ins. Interventoria



Insp Interventoria.

02 de octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado
Prof SISO.
Tatiana Bautista
Interventoria
Erika Gonzalez.
John Garcia.
Personal en obra.
1 oficial
1 ayudante.
avance de obra.
Se verifica el ingreso, lavado de manos, uso de EPP en el personal de obra, aún no se reporte el termometro digital, se continua con la limpieza y descapote del area para el sendero peatonal.




Erika Lizeth Gonzalez
INS. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

Insp. Interventoria

03 de octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado.
Prof SISO.
Tatiana Bautista
Interventoria
Erika Gonzalez.
John García
Personal en obra

1 Oficial
1 ayudante.
avance de obra.
Se verifica lavado de manos, Uso de EPP en personal de Obra, aún no se repone el termometro, esta en laboratorio por parte del proveedor, se inicia el vaciado del tanque Nº 1. Se retira agua manualmente a una altura promedio de 30 cms.
Medidas del tanque Nº1. 8,70m x 6,90m, altura 2,30m



Inspector Sisoma.


Ceika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

Insp Interventoria.


AGR. RESIDENTE

05- Octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado.
Profesional SISO.
Tatiana Bautista.
Interventoria.
Erika Gonzalez.
John F García
Personal en obra
1 oficial
1 Ayudante.
Avance de obra
Se verifica lavado de manos, uso de EPP en personal de obra, aún no se repone termometro, Culminada la actividad de vaciado del tanque se inicia demolición del pañete de recubrimiento en este, ya que para la mayor eficiencia de cualquier proceso de impermeabilización se debe acondicionar la superficie de fundición, Dado placa y en los muros

Se evidencian aceros de refuerzo expuestos, la tubería de acometida es galvanizada y se encuentra altamente deteriorada, se recomienda por interventoría hacer el cambio de dicha tubería,

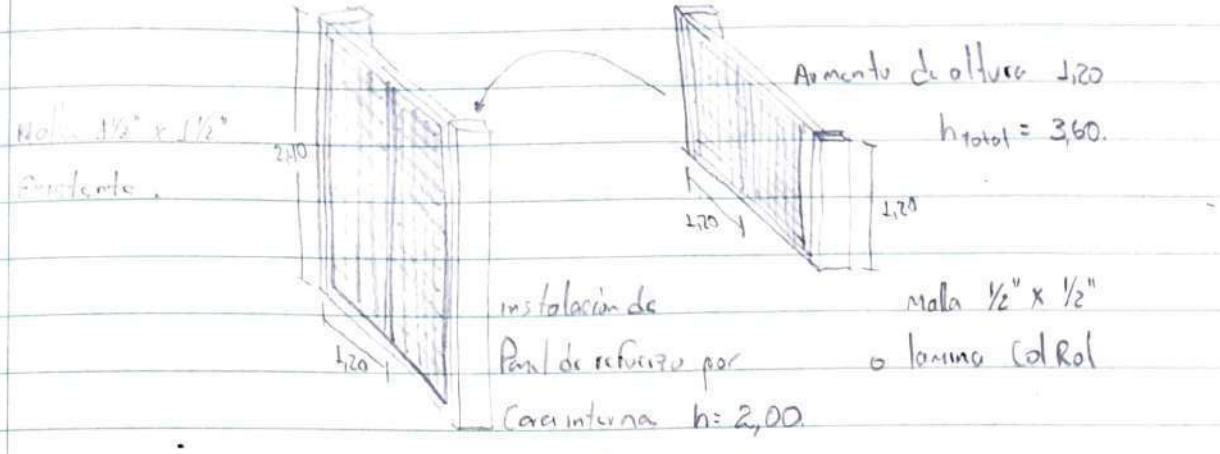

PROPUESTA CERRAMIENTO



Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoría

Inspector SISOMC

ARQ. RESIDENTE

06 de Octubre de 2020
Dia soleado,
inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando delgado.
Prof siso.
Tatiana Bautista
Interventoría.
Erika Gonzalez.
John F Garcia
Personal en obra.
1 oficial
1 Ayudante.
Avance de obra.

Se continua la demolición de paños en el interior del tanque N°1, Esto despues de realizar chequeo de Bioseguridad y uso de EPP, se manifiesta por el contratista la propuesta de reemplazar el cerramiento existente por uno mejorado, la supervisión manifiesta que debido a que en gran parte de la malla no se evidencian daños mayores se puede reparar y utilizarla ya que aún puede seguir cumpliendo su función, el contratista manifiesta que las mallas reparadas y que los accesorios necesarios para su confinamiento se encuentran bastante afectados por el oxido y por daños mecanicos, lo cual genera gastos y costos que podrian llegar a igualar el de realizar la respectiva reposición.

Inspector SISOMC.
Gema Lizeth Gonzalez
Calidecon Ins. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

07 de octubre de 2020
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gostavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector Siso
Tatiana Bautista
Personal Interventoría.
John F García, Erika Gonzalez.
Personal en obra
1 oficial y 1 ayudante
Avance de obra
Se verifica Toma de temperatura y lavado de manos, el uso adecuado de EPP por parte del personal en obra y consignación de datos en la planilla de Bioseguridad, se continua con la demolición de los paños de recubrimiento en el tanque N°1, Se solicita al contratista

actualiza la programación y flujo de caja de este frente para ajustar las actividades y plazos de entrega, se solicita hacer trasiego de materiales de demolición al lugar asignado por el colegio para el acopio de este tipo de materiales.

Inspector SISOMC.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lieth Gonzalez
Insp. Interventoria

Insp. Interventoría

08 de octubre de 2020
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO.
Tatiana Bautista.
Personal Interventoría.
John F García, Erika Gonzalez.
Personal en obra.
1 oficial, 3 ayudantes.
Se verifica controles de Bioseguridad (Toma de temperaturas, Lavado de manos), uso de EPP por parte del personal en obra, se continua con la demolición de los pañetes en el tanque N°1 y se inicia el proceso de trasiego de los materiales de demolición al sitio autorizado.
Por trabajo en espacio confinado se requiere rotación de personal, por tal motivo se solicita apoyo del personal para evitar riesgos en la salud del personal.
El cual llega remitido del colegio Fran, Mikey.

Inspector SISOMC

ARQ. RESIDENTE

Erika Lieth Gonzalez
Insp. Interventoria

Insp. Interventoría

09 de octubre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO.
Tatiana Bautista.
Personal Interventoria.
Erika Gonzalez, John Garcia.
Personal en obra
1 oficial, 3 ayudantes.
Se verifica controles Biometricos (toma de temperatura y lavado de manos), buen uso y manejo de EPP, Se continua con la demolición de pañetes del tanque N°1 y el trasiego al sitio autorizado.

Inspector SISO.

RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria

10 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO: Tatiana Bautista.
Personal en obra 1 oficial, 3 ayudantes.
Se verifica controles de Biometria (Se toma temperatura y lavado de manos), buen uso de EPP por el personal de Obra, Se continua con la demolición de pañetes de recubrimiento en el tanque N°1, se acopia material de demolición en la plazoleta contigua al tanque ya que se terminaron las lonas para su almacenaje, por la hora se hace dificil conseguir estos elementos en el sector, el suministro se hará el dia siguientes 13 de Octubre en la horas


de la mañana, se solicita dejar el material cubierto al contratista.

Inspector SISOMA

ARQ. RESIDENTE

ERIKA LIZETH GONZALEZ
INSP. INTERVENTORIA






13 de octubre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando delgado.
Profesional SISO Tatiana Bautista.
Personal en obra 1 oficial, 3 ayudantes.
Interventoria.
Erika Gonzalez, John Fredy García
Actividades del día.
Se realiza controles biometricos (toma de temperatura, Lavado de manos), buen uso y manejo de EPP por parte del personal en obra; Se continua con la demolición de los pañetes del tanque N°1 y el trasiego al sitio autorizado.

Inspector SISOMA

ARQ. RESIDENTE


ERIKA LIZETH GONZALEZ
INSP. INTERVENTORIA





14 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Gustavo muñoz, Fernando delgado.
Tatiana Bautista, inspector SISOMA.
1 oficial, 1 ayudante.
Personal interventoria.
John F García, Erika Gonzalez.
Actividades del día.

Se realiza control bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos), manejo optimo de EPPs por el personal en obra, se continua con la demolición de paredes del tanque N°1 y el traslado al sitio autorizado.



Erika Uzeth Gonzalez
Insp Interventoria

Ins. SISOMC

Insp. Interventoría

15 - octubre de 2020.
Dia Sabado.
Hora de labores 10:00
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO.
Tatiana Bautista
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez.
1 oficial y un ayudante.
Se realiza control bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos), manejo optimo de EPPs por el personal en obra, se continua con la demolición de paredes en el tanque N°1, el traslado de materiales de demolición al sitio autorizado; se define el lugar donde hacer desalojo del agua contenida en el tanque N°2; se define el lugar del acopio de los materiales de excavación en el parqueadero contiguo al tanque N°2.

Ins SISOMC


Erika Uzeth Gonzalez
Insp. Interventoria



Insp. Interventoría

16- Octubre de 2020
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría -.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid obra -.
Tatiana Bautista - insp. Sisoma -.
1 oficial y 3 ayudantes.
Se hace control biometrico al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos), buen uso y manejo de EPP; se continua con el retiro de los pañetes en el tanque Nº 1.

Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Insp. Interventoría.

17- Octubre de 2020.
Dia Sabado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría -.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid Obra -.
Tatiana Bautista - Insp. sisoma -.
1 oficial y 3 ayudantes.
Se hace control de Bioseguridad al prosonal en obra, (toma de temperatura y lavado de manos, buen uso y manejo de EPPs; se continua con el retiro de pañetes en el tanque Nº 1.

Insp Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez
Insp interventoría

Insp. Interventoría.

80

19 - Octubre de 2020.
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00.
Personal interventoria
John F García, Erika L Gonzalez - Insp. interventoria -.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado, - Resid Obra - .
Tatiana Bautista - insp. sisoma -.
1 oficial - 2 ayudantes.
Se hace control de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura, lavado de manos); buen uso y manejo de EPPs; Se finaliza el retiro de pañetes en el tongue Nº1, se hace traslado al lugar asignado por la institución

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. interventoria

Ins. Sisoma

Insp. Interventoría

20 - Octubre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez, - Insp. Interventoria -.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid Obra. -.
Tatiana Bautista - Insp. sisoma -.
1 oficial y 2 ayudantes.
Se hace control de bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos); buen uso y manejo de EPPs; se inicia el vaciado del tongue Nº2.

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Ins. Sisoma

Insp. Interventoría

21 - Octubre - 2020.
Dia Soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez, - Insp. interventoria -.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residente Obra -.
Tatiana Bautista - insp. sisoma -.
1 oficial y 2 ayudantes.
Se culmina vaciado manual de tanque N°2; esto luego de realizar control de bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos); buen uso de epps; se hace retiro de material de demolición en volqueta placa. AAC 774.
RN: 16671
Conductor: Victor Manuel Ortiz.
capacidad: 6 m³
cc. 80370612.
Se reporta llegada de material para obra 100 bultos de cemento tipo S y 3 canecas de Sika.

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Insp. Sisoma

Insp. Interventoría.

22 de octubre de 2020.
Dia Soleado
Inicio actividades 10:00
Personal interventoría
John Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 2 ayudantes.

Se hace control bioseguridad y manejo de EPPs por parte del personal en obra; Se realiza el replanteo y localización del sendero en el area a intervenir y se inicia con la excavación de los bajos para el corredor y la plazoleta; se realiza humectación en la mañana y en la tarde del polvo retirado del terreno para mantenerlo bien conservado.

Ing. Residente

Ing. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

23 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez - Insp. Interventoria.
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - Insp. Sisoma.
1 oficial, 2 ayudantes.
Se realiza verificación de protocolos de bioseguridad y buen manejo y uso de EPPs en el personal de obra; se continua con la excavación de la base para el corredor y la plazoleta; se hace solicitud al contratista del cerramiento perimetral en la zona intervenida; se retira material en Volqueta PIN: 16671 complemento $3m^3$ con Tonny Mickey.

Ing. Residente

Ing Sisoma


Erika Lizeth Gonzalez

24 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez - Insp. interventoria.

Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - resid obra
Tatiana Bautista - insp. sso sma.
1 oficial, 2 ayudantes.
Se hace verificación de protocolos de bioseguridad y manejo de EPPs del personal en obra; se continua con la excavación manual del sendero peatonal.

Ing. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE




Erika Lizeth Gonzalez

26 de octubre de 2020.
No se reporten actividades en este frente

Ing. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE




Erika Lizeth Gonzalez

27 de octubre de 2020
No se reporten actividades en este frente.

Ing. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE



Erika Lizeth Gonzalez

28 de octubre de 2020
Dia soleado
Inicio actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp interventoria.

Personal del contratista
Gustavo Muñoz - Resd obra, Tatiana Bautista - insp. Suoma.
1 oficial - 2 ayudantes
oficiales:
William Ulloa -
Ayudantes.
Ceser -Javier
Una vez verificado el control de bioseguridad y manejo optimo de EPPS; se continua con el recubrimiento del tanque N°1 y se continua con la excavación del sendero peatonal.



Insp Suoma.

Erika Lizeth Gonzalez

29 de octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muños - resid obra, Tatiana Bautista - insp. Suoma.
1 oficiales - 2 ayudantes.
Una vez verificados los protocolos de seguridad y el buen uso y manejo de EPPS se continua con el recubrimiento del tanque N°1.



Insp Suoma.

Erika Lizeth Gonzalez


30 de octubre de 2020
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
Garcia John F y Gonzalez Erika - Insp. interventoría.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - Insp. Suoma
1 oficial - 2 ayudantes.

Se continua con el recubrimiento del tanque; llega material para hacer el tratamiento de fisuras en los muros del tanque Sika 101 mortar Plus.



Lauren BB
Insp. Sisoma.


Erika Liceth Gonzalez
31 de octubre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
John F García, Erika Gonzalez - Insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid Obra, Tatiana Bautista - Insp. Sisoma.
1 oficial, 2 ayudantes.
Una vez verificados los protocolos de bioseguridad y el buen uso y manejo de EPPS, se continua con el recubrimiento del tanque Nº1.



Lauren BB
Insp. Sisoma.

Erika Liceth Gonzalez
3 de Noviembre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez - Insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. Sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Nuevo Personal
oficial
Jose oliverio Hernandez.
Ayudantes de obra
Jacinto Rodriguez, [illegible] Zambrano.

Una vez realizados los protocolos de bioseguridad y buen uso de EPPs se continua con el descubrimiento del tanque Nº 1 ; verificados las afiliaciones y documentación del personal recien ingresado, se da dotación de EPPs y se inician actividades en el sendero peatonal.



Insp Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez

4 de Noviembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de Bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continua con el descubrimiento del tanque Nº 1. y la Excavación del sendero, se realizan apiques para localización de redes existentes; se encuentran redes de datos, suministro y drenaje, la red de suministro corresponde al abastecimiento del jardin que se encuentra adjunto a la institución.



Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez

5 de Noviembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
Erika Gonzalez, John Garcia - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
3 oficiales, 5 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS se continua con el recubrimiento del tanque Nº1, la excavación y Nivelación del sendero peatonal, llega material para concretos, se inicia la impermeabilización de la placa de la plazoleta sobre el tanque Nº1.




Lucdem BB
Insp. Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez

6 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika Gonzalez - Insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
3 oficiales y 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS se continua con el recubrimiento del tanque Nº1, la excavación del sendero peatonal, Nivelación de plazoleta y replanteo de redes existentes, se continua con la impermeabilización de la placa "Plazoleta transitable" sobre el tanque Nº1.




Lucdem BB
Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez

7 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado. tarde lluviosa.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika Gonzalez insp. interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
3 oficiales y 5 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs se continua con el recubrimiento del tanque N°1, las actividades en el sendero peatonal y la impermeabilización de la plazoleta sobre el tanque N°1.




Lautum BB
Insp. Sisoma.




Erika Lizeth Gonzalez

9 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10 am.
Personal de interventoria
John F Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de seguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continua con el recubrimiento del tanque N°1, se inicia traslado de materiales para el sendero peatonal.




Lautum BB
Insp. Sisoma.




Erika Lizeth Gonzalez

10 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
insp interventoría - John García, Erika Gonzalez.
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz - Resid Obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
2 oficiales - 4 ayudantes
Verificados los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura, lavado constante de manos) revisión del buen uso y manejo de EPPS por el personal de obra, se continua con el recubrimiento del tanque

N°1, Trasiego de material a la zona de acopio autorizada.




Lautaro B.
Insp. Sisoma.




Erika Lizeth Gonzalez

11 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de Interventoria
John F Garcia, Erika Gonzalez – insp. Interventoría.
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz – resid obra, Tatiana Bautista – insp. sisoma.
2 oficiales – 4 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS, Se continua con descapotamiento del tanque N°1, se realiza el terraceo y Nivelación del bordillo lateral izquierdo en sentido de subida y se organizan materiales para su fundida en sitio, clasificación para concreto de 3500 Psi, y el material para el recubrimiento de la plataleta capas 2 y 3 respectivamente.




Lautaro B.
Insp. Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez
12 de Noviembre de 2020.
Dia nublado. llovisnas leves en la tarde. 3:00 PM.
inicio actividades 10:00.
Personal de interventoría
John F Garcia, Erika Gonzalez – insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz – resid Obra, Tatiana Bautista – insp sisoma.
3 oficiales – 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos) el buen uso y manejo de EPPS, Se continua con el recubrimiento del tanque N°1 "Pañete bajo placa"; se funde en

Sitio el bordillo izquierdo de la rampa superior en el sendero peatonal,

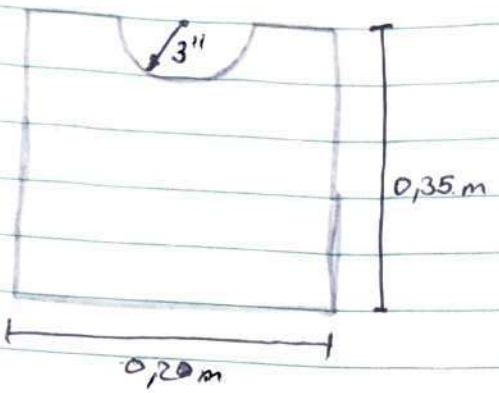

Se realiza la impermeabilización de la plazoleta sobre la placa de tenga Nº1 y se definen niveles para los desagües.

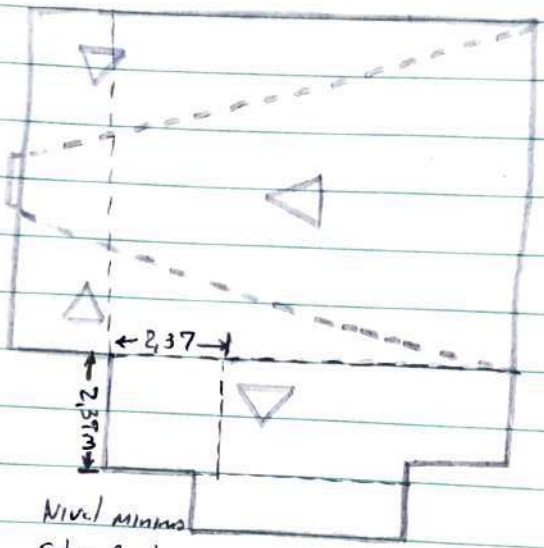

Se definen áreas de 2,37 X 2,37 para dilatación acabado en concreto escobiado y gualiado como presentación final.

Leidy Ulloa B
Insp. Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

13 de Noviembre de 2020.
Día Nublado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García - Insp interventoría.
Erika L Gonzalez - Insp interventoría.

Personal del Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma
3 oficiales y 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS, se hace tarteo del bordillo superior derecho y se inicia trasiego de material 16 m³ de recebo común desde la vía publica al area asignada para el acopio de materiales.

Insp. Sisoma


Erika Lizeth Gonzalez

14 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. Interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
3 oficiales, 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de seguridad y buen manejo de EPPS, se continua con el trasiego del recebo común a la zona asignada para el acopio, se hace traciego de materiales para el piso del tanque Nº1, se hace traciego de materiales para la plazoleta, se hace capacitación por parte de la insp. Sisoma al personal en obra:
se realizo capacitación sobre trabajo en espacios confinado y en alturas. Indicando los cuidados y adecuado uso de EPP. La segunda capacitación se trato sobre los factores de riesgo individuales y su repercusión en el trabajo. y la protección cab. ctd.


Insp. Tactica Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

17 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - Insp. Sisoma.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS, se continua con la fundida del bordillo de la derecha en el sendero peatonal, se hace excavación de localización de redes en la zona donde se realizan las actividades del sendero.

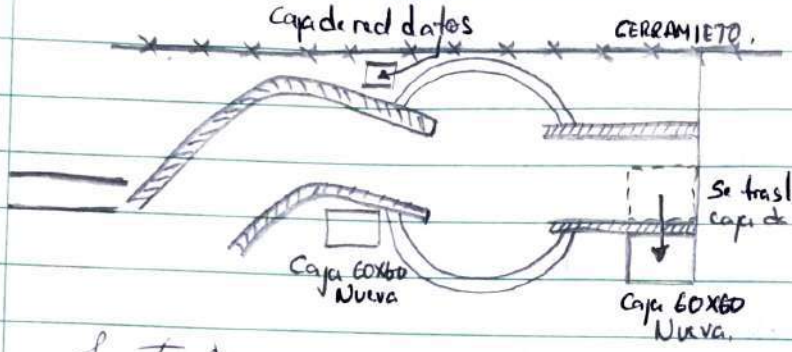


Tatiana B
Insp. Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez

18 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado. - lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Se Verifican protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS, se inicia excavación del replanteo de redes en el sendero y se Tostorea el bordillo derecho de la parte inferior del sendero.

Tatiana B
Insp. Sisoma.



Erika Lizeth Gonzalez

19 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado. - Lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS se continua con el recubrimiento de fisuras con tratamiento con Sika Mortar plus y recubrimiento con mortero Impermeabilizado 1:3, Se limpia la superficie de la placa sobre el tanque N°1, Se inicia replanteo de red 2" Ø suministro que va al Sardinel contiguo al colegio, se hace trasiego de material para la placa de la plazoleta y el piso del tanque N°1.
Se realiza capacitación sobre los factores de riesgo de la comunidad, el hogar y su reperacución en el trabajo.

Lenin BR
Insp. SISOMA.

Erika Lizeth Gonzalez

20 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado. - Lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA.
3 oficiales y 5 ayudantes.
Se continuan actividades de tratamiento de accros a la vista en el tanque, actividades de bordillos en el sendero peatonal.

Lenin BR
Insp. SISOMA

Erika Lizeth Gonzalez

21 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado. - lluvias en la tarde.
Inicio actividades 10:00.
Personal de Interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales y 5 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS. Se continuan y terminan los bordillos de las plataformas lineales, se continua con el recubrimiento de placa y muros del tanque N-1.

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

23 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales y 4 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS se continua con el replanteo de red de suministro Ø 3/4" y red de suministro Ø 1 1/2", se replantea red all Ø 3" a la nueva caja de. inspección, Se inicia trasiego de materiales para el piso del tanque N-1,

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

24 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS, se inicia compactación de recebo común en las rampas rectas del Sendero peatonal, se dejan replanteados los niveles del piso del tongue y se hace uso en este tongue Nº1.
Se realizo capacitación sobre el manejo adecuado de las cargas para evitar lesiones personales y accidentes laborales.

Erika Lizeth Gonzalez

25 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPS, se continua con la compactación del recebo común en las rampas del sendero, se inicia la fundida del piso del tongue Nº1 y se inicia el proceso de Mantenimiento del cerramiento, retirando angulos de la parte inferior en los paneles afectados.

Insp. S. sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

26 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - llovizna en la tarde
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y manejo de EPPs; se continua con el piso del tenque Nº1, se continua con la compactacion de recebo común en el sendero peatonal, se continua con el mantenimiento del cerramiento del colegio en los puntos señalados

1	Cambio	19	mantenimiento.
2	Cambio	20	mantenimiento.
3	Cambio	21	Mantenimiento
4	Mantenimiento	22	mantenimiento.
5	Mantenimiento.	23	Mantenimiento.
6	nivelar y mantenimiento.	24	Cambio
7	Mantenimiento	25	Cambio.
8	Mantenimiento.	26	Mantenimiento
9	Mantenimiento.	27	Mantenimiento.
10	Cambio	28	Mantenimiento.
11	Cambio.	29	Cambio.
12	Mantenimiento	30	Mantenimiento
13	Cambio.	31	Mantenimiento
14	mantenimiento	32	Mantenimiento
15	Mantenimiento.	33	Mantenimiento
16	mantenimiento	34	Mantenimiento.
17	mantenimiento	35	Mantenimiento
18.	mantenimiento.	36.	mantenimiento.

Puerta peatonal en la esquina: Cambio de malla y mantenimiento.

Insp Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez


27 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de seguridad y buen uso de EPPS, se continua con la compactación de recebo común en las rampas de acceso a la plazoleta del sendero peatonal, se termina el piso del tanque Nº1, se hace bacheado del tanque N°2 pero el nivel de agua se mantiene constante, se inicia el mantenimiento de las secciones a las cuales se les definio "mantenimiento" en el cronograma por la via principal según las especificaciones aprobadas.




Erika Uzeth Gonzalez

28 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado - lluvias en la tarde.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y Buen manejo de EPPS se continua con la compactación de las rampas del sendero peatonal, se construye la caja de inspección a la altura de la plazoleta; se dan acabados al tanque N°1 y se hace Aseo general con retiro de escombros y reparación inicial de la red electrica; se adelanta el Nuevo Vaciado del tanque N°2 pero al verificar el nivel del agua este se mantiene constante,

Se hace solicitud a la administración "almacenista de la institución" para activar las bombas y facilitar el vaciado, esta solicitud es aprobada pero el recorredor de vigilancia se niega a hacer dicha activación; se hace muestra del angulo utilizado para hacer reparaciones a la parte inferior del cerramiento y el tubo a utilizar en las secciones intermedias.




Erika Lizeth Gonzalez



30 Noviembre de 2020
Dia Nublado - lluvias en la tarde
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia - Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
2 oficiales, 4 ayudantes.
Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
Se confirman protocolos de Bioseguridad y Buen Manejo de EPPS; se continua con la compactación del recebo con pisadores y se inicia la construcción de la caja de inspección en la salida de la red de aguas lluvias en la parte baja del sendero, se continua con el mantenimiento del sendero peatonal y del cerramiento perimetral sobre la vía principal.



Erika Lizeth Gonzalez




01 - Diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria

John F García - insp interventoría, Erika L Gonzalez - insp interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de seguridad y buen manejo de EPPS; se inicia fundida de la plazoleta superior concreto Escobiado h=10cms reforzado con malla electrosoldada 4mm; se continua con el mantenimiento de los pondos afectados en las partes bajas junto a la canaleta de captación primestral.




Erika Lizeth Gonzalez



02 - Diciembre - 2020.
Día Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS, se continua con el mantenimiento de los pondos señalados para esta actividad en el cerramiento, se determina la necesidad de construir la canaleta de captación de la parte superior y mantenimiento de la parte inferior con la inspección de la caja de inspección en el descole; se continua con la fundida de la rampa superior y se siembra el bordillo izquierdo de la plazoleta.



Erika Lizeth Gonzalez




3 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
se continua con el mantenimiento de los paneles afectados, se evidencia
el proceso de fabricación de los paneles nuevos en taller; se continua con
con la rampa inferior y se deja lista la caja de inspección para panela.



Tatiana B

Erika Liceth Gonzalez

4 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría
John F García - Erika L Gonzalez, insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs,
se continua con el mantenimiento de los paneles programados; se continua
con la fundida de la rampa inferior del sendero y se inicia proceso de
predización de zonas verdes.



Tatiana B

Erika Liceth Gonzalez

Continua labores en [illegible] a partir del 05 de Diciembre de 2020.

Contrato Nº COI PCCNTR 1577535
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mantenimiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del Servicio Educativo
Firma contratista: CONSORCIO RETORNAR.
NIT 901.384.708-1.
Interventoria: Contrato COI. PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoria técnica, administrativa, Jurídica, financiera y ambiental del contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mantenimiento de los comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo. Grupo 4.
Firma contralista ACZR Ingeniería & Proyectos SAS.
NIT 830.123.577-7.
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE, Sede A - Confederación Suiza - TOMO II.
CL 55 sur # 69 b - 61.
Localidad 19 Ciudad Bolivar.
Supervisor del Contrato SED.
Ing. Ivan Duarte.
Personal Administrativo Contratista.
Residente de Obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista.
Personal de interventoría.
Residente de interventoría
Ing. Melissa Jaez.
Inspectores de interventoria.
Ing. Erika L Gonzalez.
Cy GA John F García.

- Pasa desde Diciembre 04 de 2020 en tomo I bitacora de obra -

05-12-2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F García - Erika L Gonzalez, insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - residente obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 ayudantes. - 9 ayudantes.
Se continua con el mantenimiento de los paneles programado en el cerramiento; se finaliza fundida de la rampa inferior del sendero peatonal y se continua con el proceso de pradizacion de las zonas verdes.

Erika Lizeth Gonzalez


07-12-2020.
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria.
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Boutista Insp. SISOMA
2 Ayudantes, 2 oficiales
Actividades Realizadas:
Verificacion de Protocolos de Bioseguridad y EPP, Se continua Con mantenimiento de Paneles programados en el cerramiento, demolicion de Acceso Excesos en el empalme hacia la plazoleta de la entrada Superior y Se continua con empradizacion de las zonas verdes del sendero.
Erika Lizeth Gonzalez

09-12-2020
Dia Soleado
Inicio Actividades: 10:00 AM
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz-Residente - Tatiana Bautista Inspector SST 2 oficiales, 2 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Se termina la Compactación de Recebo común en plazoleta. Se deja Preparado el encofrado y el refuerzo para fundir sardinel en la plazoleta del Sendero Peatonal. Se deja marcada la escalera.
Se Realiza mantenimiento del cerramiento y Verificación de Protocolos de bioseguridad y EPP.
Erika Liceth Gonzalez.


10-12-2020.
Dia Sabado
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SSTMA.
2 oficiales, 3 ayudantes.
se funde la plazoleta con estampado y acabado color amarillo con mineral; se continua mantenimiento de los paneles programados en el Cerramiento; por recomendación del supervisor de la SED se proyecta la construcción de un jardin en el costado del sendero inferior frente al edificio y la escalera.

Erika Liceth Gonzalez

11-12-2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 3 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, buen manejo y uso de EPPS;
Se define la escalera y se inicia pañete de impermeabilizacion en los muros adyacentes al sondeo proteral.

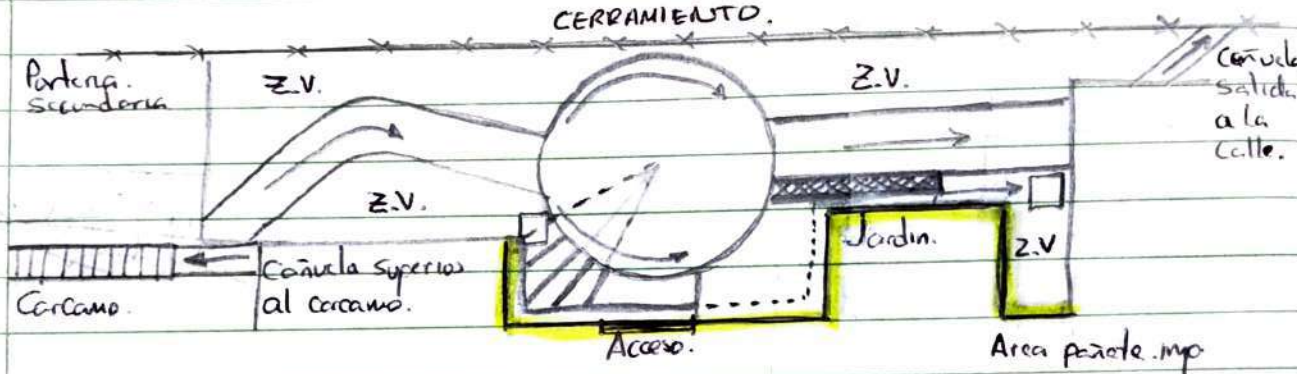


Se define el area para el jardin de proteccion de la zona verde frente al bloque de cadiovisuales.




Erika Lizeth Gonzalez

12-12-20.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez. - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 3 ayudantes.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS;

Se continua mantenimiento de los paneles en el cerramiento, se continua con el peñete de los muros perimetrales, se inicia fundida de la escalera concreto vaciado.







14-12-20.

Dia Soleado.

Erika Lizeth Gonzalez

Inicio de actividades. 10:00.

Personal de interventoría.

John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoría.


Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.

3 oficiales, 3 ayudantes.

Verificados los protocolos de Bioseguridad y bren uso y manejo d EPPs; Se continua con el peñete de muros perimetrales en el sendero peatonal, se continua con el mantenimiento y cambio d paneles del sendero Cerramiento, se definen las cotas en la plazoleta sobre el tanque N.º 1 y se define intervenir la cañuela del sendero en cerramiento.







Erika Lizeth Gonzalez

15-12-2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Personal de interventoría.

John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoría.


Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma

3 ayudantes - 3 oficiales.


Una Vez Verificados los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado segundo de manos), bren manejo y uso de EPPs;

Se continua con el mantenimiento de los paneles prefabricados, se realiza cambio de paneles y se hace instalación del panel interno en el modulo 1 del cerramiento, se verifica y se recomiendan correcciones para el buen funcionamiento y presentación del cerramiento, se recomienda realizar modificaciones en la malla exterior para que el espaciamiento quede ajustado a los modulos interiores, culminan los puntos en los muros perimetrales y se ubica registro tipo jardin en la entrada secundaria sobre la escalera, se funden los tapes de las cajas de inspección; se inician los bases para la construcción de la jardinera.



Erika Lizeth Gonzalez

16-12-20.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
3 oficiales, 3 ayudantes.
Se continue con el mantenimiento del cerramiento, se construye la cañuela de la parte inferior del sendero peatonal y se inicia la construcción de la jardinera lateral del sendero peatonal

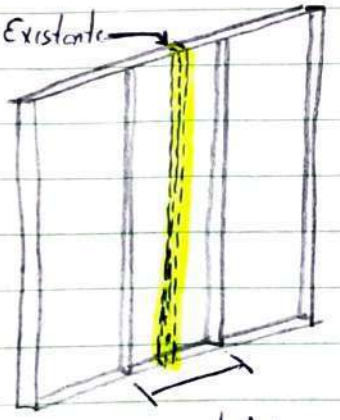


Nueva distribución de los paneles frontales del cerramiento.

tubo cuadrado ½" x ½"
Esta distribución se ajuste a los paneles construidos para la malla interior del cerramiento.
Se cambia de 1 tubo central inicial a dos internos debidamente distribuidos.

17-12-20.

Erika Lizeth Gonzalez

Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo y uso de EPPs; se continua con el mantenimiento del cerramiento, se termina la construcción de la jardinera en el sendero peatonal, se inicia la excavación para la construcción de la cañuela del cerramiento, se reciben material para la plazoleta, llegan 50 m² de adoquin 20x10x4 y dos rollos de malla para gallinero, se replantean los desagües de la plazoleta.

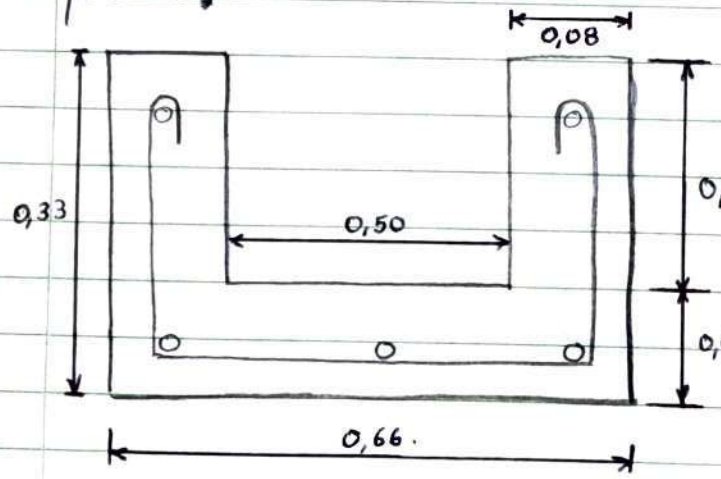


Estribos de 1,20m.
Ø 3/8" con gancho en sentido interno.
refuerzo longitudinal.
Ø 3/8" según el diagrama.

Se realiza trasiego de arena de peña para el colegio Fanny Mickey y se traen adoquines y la malla gallinero.

Erika Lizeth Gonzalez


18-12-20.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de biosegurudad y buen uso y manejo de EPPs;
Se continua con el mantenimiento del cerramiento, se continua con
la excavación y demolición de la cañuela de captación, se realizan
reparaciones y ajustes al sondeo peatonal, se recomienda por la interventoría
el rascomedo de las zonas verdes para mejorar su presentación.



Laura B

Erika Lizeth Gonzalez

19-12-20.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de biosegurudad y buen manejo y uso de EPPs;
Se continua con el mantenimiento del cerramiento en los paneles programados,
se continua con la excavación y demolición para la cañuela perimetral, se
definen las cotas de la plazoleta del tanque N°1.



Laura B

Erika Lizeth Gonzalez

21 - 12 - 20

Dia Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoria.


John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

3 oficiales - 4 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPs; se continua con el mantenimiento del cerramiento, se recomienda por interventoria hacer cambio del panel Nº 11, se continua con la excavación para la cerca, llegan materiales, acero ø 3/8", se retiran escombros a botadero certificado 7 m³, se inician las cimentas de la plazoleta del tanque Nº 1.

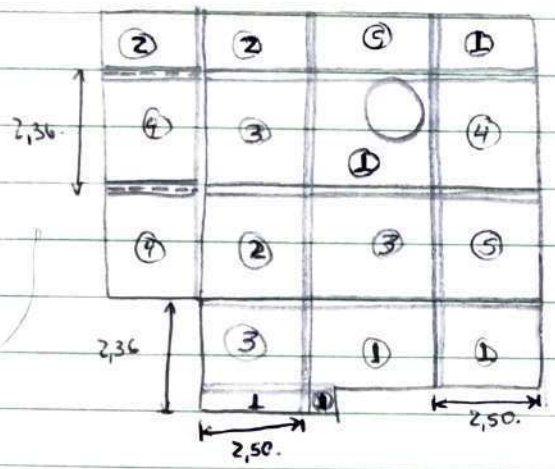


Placa:

Conductor:


C.C.

Pin:



Geina Lizeth Gonzalez





22 - 12 - 2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoria.

John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista

Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

3 oficiales - 4 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y el buen uso y manejo de EPPs

Se verifican los niveles de desagüe para la plazoleta del tanque Nº1, se finaliza la demolición del muro para la construcción de la gargola de desagüe, y se recorta la malla para los tramos que se van a fundir; se continua con la adecuación del terreno para la canvela perimetral, excavación de 0,70 x la altura del terreno, se realizan ajustes en el sondeo pectoral.



Laura BR

Erika Lucth Gonzalez

23. - 12 - 2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoria.

John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria


Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

3 oficiales - 4 ayudantes.

Verificados los niveles de bioseguridad y buen manejo de EPPs; se fundan las primeras placas de concreto de 3000Psi segun el esquema los Numerados con el Nº1.

Laura BR



Erika Lucth Gonzalez

24- 12 - 2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades. 10:00.

Personal de interventoria.

John F. Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.

Personal del Contratista

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.


3 oficiales - 4 ayudantes.

actividades del dia.


Verificados los controles de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs. Llegan 12 paneles de malla interior para iniciar su instalación; se hace aseo al área de la cañuela; se fundan las placas de concreto escobiado según el esquema Nº2.

Laura Bautista

Erika Lizeth Gonzalez



26-12-2020.
Día soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales - 3 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
Se continua con las lozas de concreto escobiado según el esquema Numeradas Nº3.




Laura Bautista

Erika Lizeth Gonzalez

28-12-2020
Inicio actividades 10:00.
Día Soleado.
Personal de interventoría
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 oficiales - 3 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs
Se realiza figuración del acero de refuerzo para la gargola de la plazoleta, se trasiega Material para acabado de piso en la plazoleta,

Se reciben 7m³ de arena y grava para concretos de la cañuela perimetral, se adelanta excavación a 0,70m de base para el fondo de la cañuela y se figuran los Estribos según especificaciones, se hace aseo de los puntos de actividad, se define punto de acopio para residuos en el parqueadero vehicular Nº1, se continua con el mantenimiento del cerramiento perimetral.



Erika Ineth Gonzalez

29 - 12 - 2020.
Dia Sabado.
Inicio actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Se finden lozas en concreto ciclopeo #4 y se adelanta excavación en la cañuela perimetral, avanza mantenimiento del cerramiento.



Erika Ineth Gonzalez

30 - 12 - 2020.
Dia Sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
Garcia John F, Gonzalez Erika L - insp. interventoria
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 3 ayudantes.
Se verifican protocolos de bioseguridad, (toma de temperatura, lavado constante de manos), buen uso y manejo de EPPs por parte del personal en obra, El personal de ornamentación tiene actividades por fuera de fin de año, se hace traslado de materiales para la plazoleta del


tanque N°1, se avanza en la excavación de la canaleta perimetral.



31-12-20

Geiner Ureth Gonzalez


Dia Sabado
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erica L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 3 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se continua con las placas de concreto N°5 en la plazoleta del tanque N°1, se suspenden actividades hasta el 4 de enero de 2021.



04-01-21.

Geiner Ureth Gonzalez

Dia Sabado.
inicio de labor 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se inicia demolición de la canaleta existente, se inicia el vaciado del tanque N°2, se traba material para el tanque, 26 bultos de concreto, mixto, 3 m³, se hacen retoques al sondeo perimetral, se inicia instalación de paneles del cerramiento interno.



Geiner Ureth Gonzalez

05-01-21.

Dia Sabado.

Inicio labor 10:00.

Personal de interventoria.

John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.

3 oficiales - 4 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad, se continua con la demolición de la cañuela existente, se reciben 70 bultos de cemento para la cañuela, se termina el vaciado del tanque Nº2 y se inicia la inspección, se determina que el tanque presenta Filtración de agua por nivel freatico debido al mal estado del concreto en las dientes intermedias y nivel bajo debido a mala compactación de los concretos en los muros, se encuentran tambien bastantes aceros de refuerzo expuestos en muros y placa, se inicia demolición de paños de muros en el tanque N°2, Se continua con el retiro del poste intermedio de la malla externa y su reemplazo con dos postes de tgrales caracteristicas para el montaje de los paneles internos.

Erika Lizeth Gonzalez

06-01-21.

Dia Sabado.

Inicio labor 10:00.

Personal de interventoria.

John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.

Personal del contratista

Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista. - insp seguridad.

3 oficiales - 4 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad se continua demolicion de cañuela existente, se continua con la demolición de paños en tanque Nº2, se continua mantenimiento de fraguado

Erika Lizeth Gonzalez


07-01-21
Dia Soleado
inicio labor 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se continua con la demolición de la cañuela existente, se inicia trasiego de materiales para el piso de la cañuela, se continua con la demolición de paños del tanque, se continua mantenimiento del cerramiento



Erika Lizeth Gonzalez

08-11-01-21.
Se paran actividades por toque de queda en la ciudad.

12-01-21.
Dia soleado
inicio de labor 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se inicia figurado de aceros de refuerzo de la cañuela, se continua el trasiego de material, se continua demolición de paños y se inicia proceso de limpieza y protección de aceros de refuerzo y tratamiento de fisuras, continua mantenimiento del cerramiento.



Erika Lizeth Gonzalez

13-01-21.
Dia Sabado.
inicio labor 10:00
Personal de interventoria
Johm F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA
3 oficiales - 4 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad, Se continua con la figuracion del acero de refuerzo de la cañuela, El trasiego de materiales; se continua con la demolicion de pañetes y tratamientos de aceros expuestos y fisuras, se inicia llenado de muros para pañetes, se inicia llenado de la placa del tanque N°2, se para mantenimiento del cerramiento debido a que se termino el material de los postes.

Erika Lizeth Gonzalez

14-01-21.
Dia Sabado
inicio labor 10:00.
Personal interventoria
Johm F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
3 oficiales - 4 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad, se inicia fundida de placa de piso de 8 cms avance 12 ML, se continuan actividades de demolicion de pañetes y llenado de muros y techo, se reciben ponchos internos para el cerramiento llegan 15 unidades, se retira material de residuos, volqueta placa AEB 119 Pin 1342 conductor Jose Alejandro Ruiz cc. 80774882. La volqueta que recogio el escombro fue JPC 724 P.N.

Erika Lizeth Gonzalez

15-01-21
Dia sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoría
John García, Tatiana Bautista - insp. interventoría
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
revisados los protocolos de bioseguridad, se continua fundida de placa de piso en la cañuela perimetral, se finaliza demolición de pañetes de muro en tanque Nº2, se continua con el mantenimiento del cerramiento


Erika Lizeth Gonzalez

18-01-21.
Dia sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoría
John F García, Erika L Gonzalez, insp. interventoría
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
verificados los protocolos de bioseguridad, se continua fundida de placa de cañuela, se continua con el llenado de pañeta de muro y placa, se inicia demolición de afinado del piso en el tanque Nº2, se continua con el mantenimiento del cerramiento

Erika Lizeth Gonzalez

19-01-21.
Dia sabado.
Inicio labor 10:00.

Personal interventoría
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoría.
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Se verifican protocolos de bioseguridad, continua fundido del piso de la cubierta, se continua con el llenado de pañetes de muro y placa, se termina demolición de afinado en piso del tanque N°2, se continua mantenimiento del cerramiento.



Erika Lizeth Gonzalez

20-01-21.
Dia sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoría.
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Se inicia demolición de cubiertas laterales, se continua con fundida de placa de piso, se verifican Niveles, se continua con el llenado de muros y placa, se inicia llenado de afinado de piso, se realizan 30 bultos de cemento, 3 sika, 2 m³ de mixto, se continua con el mantenimiento del cerramiento, se define cambio del panel exterior N°35 ya que la malla se encuentra soldada a un angulo doble y presenta multiples reparaciones.



Erika Lizeth Gonzalez

21-01-21.
Dia Sabado.
inicio labor 10:00.
Personal interventoria
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se continua con la demolición de cañuelas laterales, se continua con el llenado de muros placa y afinado de piso en tanque N°2, se continua con el mantenimiento del cerramiento.

Erika Liceth Gonzalez

22-01-21.
Dia Sabado.
inicio labor. 10:00
Personal interventoria
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resd. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se funde placa de piso en la primera cañuela lateral junto con dilataciones y disipadores, se plantea construcción de muro de protección de la malla del cerramiento entre los paneles 36 y 35 para la construcción de la cañuela hasta el punto de desagüe, se inicia el afinado de pañetes de muro y placa, se adelanta llenado de afinado del piso en el tanque N°2, se continua mantenimiento del cerramiento.


Erika Liceth Gonzalez

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VARGAS VILA- SEDE D - JOSÉ MARÍA VARGAS VILA - BELLA FLOR LA TORRE - EL PORVENIR - LAS MARGARITAS.

Contrato Nº COI PCCNTR 1577535.
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Firma contratista: Consorcio RETORNAR.
Nit: 901.384.708-1
interventoría contrato COI PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoría técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental del contrato obras de ejecución, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo, grupo 4.
Firma interventoría ACZR Ingeniería & Proyectos SAS.
NIT 830. 123.577,-7.
COLEGIO DISTRITAL JOSE MARIA VARGAS VILA.

localidad 19 Ciudad Bolivar.
Supervisor del contrato SED.
Ing Ivan. Duarte.
Personal administrativo contratista.
Residentes de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma.
Ing. Tatiana Bautista.
Personal Interventoría:
Residente de interventoria
Ing. Melissa Janez.
Inspectores de interventoria.
Ing. Erika Gonzalez.
CyGA John Fredy García C.

Inicio de Obra
Fecha Firma del acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020.
Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las areas a intervenir.
Apantallamiento Reposición de la red existente.
Replanteo de la red de suministro y ampliación del diametro de la tuberia de ½" a 1".
21-09-2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades. 10:00 AM.
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz
Arq. Fernando Delgado.
Personal Siso.
Ing. Tatiana Bautista
Interventoría.
Ing. Erika Gonzalez.
Cy6A John F Garcia
Personal en obra.
Maestro general.
Jesús Duran.
oficial.
Edgar Ortiz.
Avance de obra
Se hace control de Bioseguridad al personal administrativo de obra e interventoría; Se asigna al personal en obra por parte de la administración del colegio el salón 110 para organizar, acopiar y mantener los elementos personales y materiales y equipos necesarios para la ejecución de los labores en el area a intervenir; Se hace entrega de dotaciones al personal de obra; Se hace recorrido junto con el contratista encargado de las actividades correspondientes a la ampliación del diametro de la tuberia de suministro y su replanteo; longitud 132 ml. tendido sobre el pasillo posterior de la institución frente a los canchas multifuncionales; se inicia excavación de 30 ml en terreno natural y 102 ml por la red de tuberia existente.

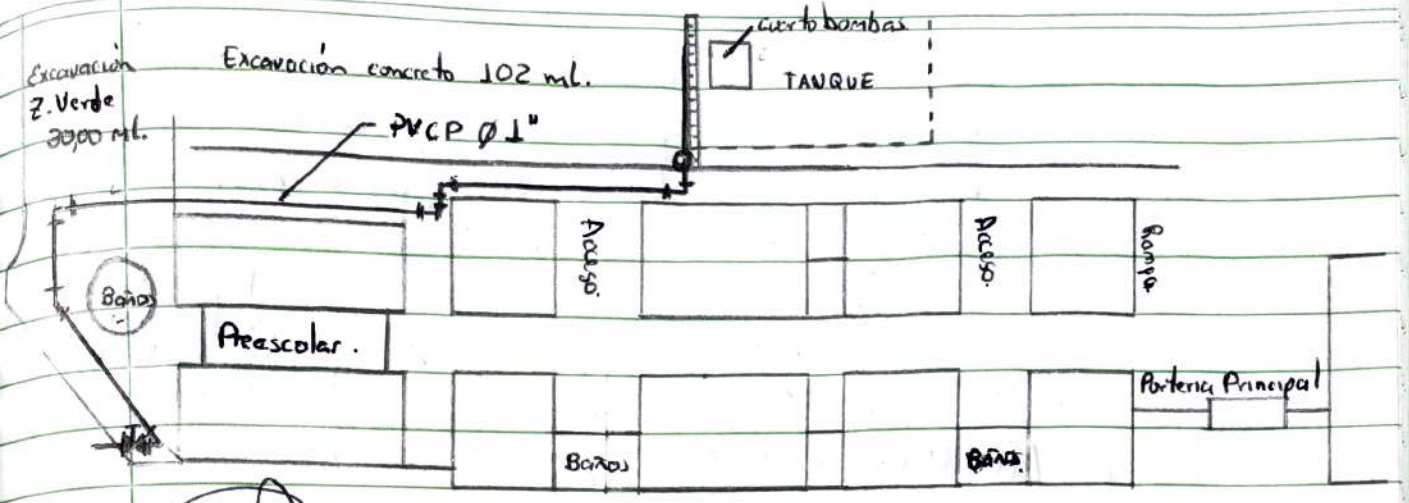

ARQ. GUSTAVO MUÑOZ.
Insp. Interventoría.

ARQ. FERNANDO D.
Ing. Tatiana Bautista (SISO)

ERIKA LICETH GONZÁLEZ
Ins. Interventoría

22 de Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00 am.
Residentes de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoría
Ing Erika Gonzalez.
CyGA. John F García.
Personal en obra.
oficial.
Edgar Ortiz.
Avance de obra.
Se hace control de Bioseguridad al personal administrativo, de obra e interventoría; Se continua con la excavación para el cambio de la tubería existente y se le hace recomendación al contratista para dar mayor profundidad a la excavación existente, por lo menos.

tres centimetros para dar mejor recubrimiento a la tubería nueva instalada, se hace recomendación por parte del contratista de dar acabado a la superficie en media caña en las zonas que bordean los bloques academicos.



ARQ. FERNANDO D.


ARQ. GUSTAVO MUÑOZ.

Ing. Tatiana Bautista (SISA)

Ing. Tatiana Bautista
Insp. Interventoria.

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Inspector. Interven.

23 - de Septiembre de 2020.
Dia lluvioso y nublado.
Inicio de labores 10:00 am.
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma.
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoría.
Ing. Erika Lizeth Gonzalez
CyGA John Fredy García
Personal en obra
Oficial Jesus Durán.
Ayudante Edgar Ortiz.
Avance de obra
Se hace control de Bioseguridad (Lavado de manos y toma de temperatura); Se verifica el uso de EPP por el personal en obra; Se hace observación al contratista encargado sobre la necesidad de aumentar la profundidad de los cortes en concreto por lo menos en cinco centimetros mas y aumentara el ancho en la misma proporción, garantizando asi un recubrimiento efectivo ante los impactos; se reitera dar acabado final en media caña a los linderos de los bloques que colindan con la tubería para dar mayor protección a la red.

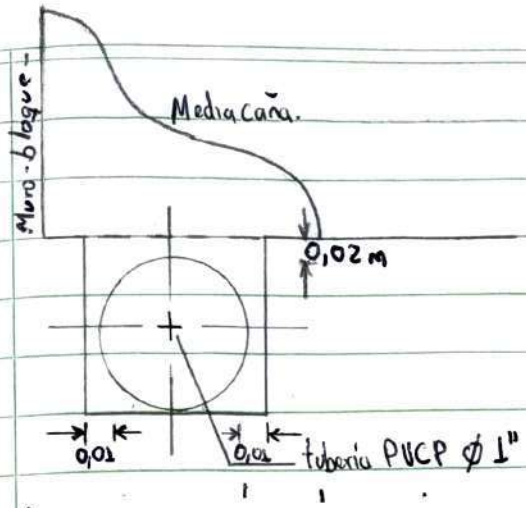

Para protección y facilitar la inspección se define hacer caja de inspección de 60X60 con tapa en concreto, marco y contramarco.
Se solicita la localización de puntos de inspección intermedios para facilitar el mantenimiento y cuidado de la red.

Ing. Tatthana Bautista (SISO)

Insp. Interventoría.

Erika Lizeth Gonzalez
Inspector Int.

24 de Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de labores. 10:00
Residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq Fernando Delgado.
Profesional SISO
Ing Tatiana Bautista.
Interventoría.
Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
CyGA John Fredy García.
Personal en obra
1 Oficial
1 Ayudante.
Avance de obra
Se hace control de bioseguridad (Lavado de manos, toma de temperatura); Se verifica el uso de EPP por el personal de obra; El contratista continua con la profundización de la regata para la instalación de la tubería de suministro. el contratista adiciona a los equipos [illegible] dos retomartillos para

Cumplir con la actividad según lo programado.




Ins. Tatiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ
Inspector Int.

Interventoría.

25 de Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional SISO
Ing. Tatiana Bautista
interventoria
Ing Erika Lizeth Gonzalez.
C y GA John Fredy García.
Personal en obra.
1 oficial.
Se hace control de bioseguridad (temperatura, lavado de manos) uso de EPP por personal en obra; se continua profundización de la regata para acometida de red de suministro Ø 1", se encuentra en recorrido programado a una sola persona en la obra y se hace la recomendación al contratista por parte de la profesional SISO/MA de interventoria sobre la necesidad de cumplir la norma en cuanto a que no debe haber personal solo/a ejerciendo labores constructivas en los frentes, el contratista se compromete a entregar el presupuesto, la programación digital y las cotizaciones para la corrección o reparación del apantallamiento del colegio.




Ins. Tatiana Bautista (SISO)

ERIKA LIZETH GONZALEZ
Inspector Int.

Interventoría.

28 de Septiembre de 2020.
Dia parcialmente nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Siso.
Ing. Tatiana Bautista
Interventoria.
Ing. Erika Lizeth Gonzalez.
CyGA John Fredy Garcia.
Personal en obra.
1 Oficial.
Se hace control de bioseguridad (temperatura, Lavado de manos) uso de EPP por parte del personal en obra; se continua la profundización de la regata para la red de suministro Ø1" con rotomartillo.




Ing. Tatiana Bautista (Siso)

ERIKA LIZETH GONZÁLEZ
Inspector Int.

Interventoria.

28 de Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Siso.
Ing Tatiana Bautista.
Interentoria.
Ing Erika Gonzalez.
CyGA John García.
Personal en obra.
2 Oficiales.

Avance de Obra.
Se hace control de Bioseguridad (temperatura y lavado de manos), uso de EPP por personal en obra, se hace entrega de dotación al personal nuevo en obra, se continua con la profundización de la rasqueta para tubería de Ø 1" y se continua con la excavación en la Zona Verde para el tendido de la red de suministro.



Tatiana BB
Ins. Tatiana Bautista (SISO)

I. Interventoría.

Erika Lizeth González
Inspector Int

29-09-2020.
Dia Soleado.
Inicio Actividades. 10:00
Residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional SISO.
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoría.
Ing Erika Gonzalez.
CyGA John García
Personal en obra
1 Oficial.
1 Ayudante.
Se hace control de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP por personal en obra, se continua con la profundización de la rasqueta para tubería de Ø 1" y se continua con la excavación en la Zona Verde para el tendido de la red de suministro; Se realiza reparación de tubería Ø 1/2" de suministro que se encontro atravesando el area de excavación.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lizeth González
Inspector Int

Ins. Tatiana Bautista

Insp. Interventoría

30 - Septiembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de labores 10:00.
Residente de obra
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado,
Profesional SISO.
Ing. Tatiana Bautista.
Interventoria.
Ing Erika Gonzalez.
CyGA John García
Personal en obra
1 oficial.
1 ayudante.
Avance de Obra
Se hace control de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP por el personal en obra, se continua con la profundización de la regata para tubria de Ø1", se funde la base para caja de inspección de 60X60 en registro de suministro red de agua potable.

ARQ RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Ing Interventoria

Ing. Tatiana Bautista.

Insp Interventoria

01 - octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio labores 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado.
Profesional SISO
Tatiana Bautista
Interventoria.
Erika Gonzalez.

John Fredy Garcia.
Personal en obra
1 oficial
1 ayudante.
avance de obra
Se hace verificación de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP, Se continua con la profundización de la acometida para tubería de agua potable Ø 1" Se hacen muros de la caja 60X60 con ladrillo recocido y se verifica el estado de la base para la caja de inspección así mismo la tapa fundida en sitio.

ARQ. ~~RESIDENTE~~

~~Insp. Interventoría~~

Instt Tatiana Bautista.

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

02-Octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio Actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado.
Profesional SISO.
Tatiana Bautista.
Interventoria.
Erika Gonzalez.
John Garcia
Personal en obra
1 oficial, 1 Plomero.
1 ayudante.

avance de obra
Se verifica y controla Bioseguridad al personal en obra. (toma de temperatura y lavado de manos), uso de EPP, se continua con la profundización y se retira la acometida del tanque principal y del tanque de red contra incendios, se inicia la instalación de tubería de Ø 1" y la acometida a cada uno de los tanques, se verifican puntos de

inspección en la tubería y se da inicio a la prueba hidraulica de la red, el contratista solicita iniciar rellenos y tapar la tubería pero se hace recomendación que no se tape esta red hasta que no complete 24 horas de prueba hidraulica.

ARQ. RESIDENTE

Insp. Interventoría.

Ins. Tatiana Bautista.

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoría

03 - Octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz.
Fernando Delgado.
Profesional SISO.
Tatiana Bautista.
Interventoría
Erika Gonzalez.
John F García
Personal en obra
1 Oficial.
1 Plomero.
Avance de obra
Se hace control de Bioseguridad al personal en obra (toma de temperatura y lavado de manos) se controla el Uso de EPP, se revisa la presión y el funcionamiento de la red, no se evidencian perdidas de presión ni Fallas en las soldaduras de los accesorios, por disposición del contratista se decide dejar los equipos de la prueba hidraulica hasta el dia lunes 05 de octubre para dar mayor firmeza al resultado de la prueba.

ARQ. RESIDENTE

Insp. Interventoría.

Ins. Tatiana Bautista.

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoría

05 de Octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra.
Gustavo Muñoz.
~~Erika~~ Fernando Delgado.
Profesional SISO
Tatiana Bautista.
Interventoria.
Erika Gonzalez.
John Garcia
Personal en obra.
1 oficial.
1 ayudante.
Avance de obra.
Se realiza verificación de Bioseguridad al personal en obra (temperatura, lavado de manos), uso de EPP, se inicia el recubrimiento con media caña desde el corcamo y pañete en tubo de Ø 1" que se encuentra en la pared y se hace recubrimiento en la zona verde, se mantiene el equipo de Prueba un día mas para corroborar resultados y hacer entrega de la red en funcionamiento.

~~RES. RESIDENTE~~
~~Insp. Interventoria.~~

Ins. Tatiana Bautista

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

06 de octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra.
Gustavo Muñoz - Fernando Delgado.
Inspector Siso Tatiana Bautista.
Personal interventoría
John Garcia - Erika Gonzalez

Personal en obra 1 oficial y 1 plomero.
actividades de avance
Se realiza verificación de Bioseguridad al personal en obra (temperatura y lavado de manos), uso de EPP, se inicia el sistema de suministro a tanques, se revisan redes de suministro encontradas y se evidencia el buen funcionamiento de la red de suministro al tanque, se solicita por parte de interventoría la entrega junto con la red Nueva de un manual de buen uso y de mantenimiento preventivo para esta acometida, se hace inspección de la red de apantallamiento de los edificios en el Colegio junto con los especialistas electricos de contratista, Interventoría y SED para verificar el diagnostico inicial y propuesta del contratista con respecto al mantenimiento de esta red; se solicita al contratista la actualización de la programación y el flujo de caja.

Inspector SISOMA.

RES. RESIDENTE

Erika Lizeth González
INS. INTERVENTORÍA

07 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz - Fernando Delgado.
Inspector SISO Tatiana Bautista.
Personal de interventoría.
John García - Erika Gonzalez.

Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.
actividades adelantadas.
Se realiza prueba conjunta de la red de suministro y el mantenimiento de Bombas, se evidencia buen mantenimiento y funcionamiento optimo del llenado y al suministro al colegio, se continua con el recubrimiento de la tubería de Ø 1", se solicita caja de inspección para proteger las acometidas y dar facilidad de acceso a los registros de control de las redes.

Inspector Siso.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

08 de octubre de 2020
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector Siso Tatiana Bautista.
Personal de interventoria.
Erika Gonzalez, John F Garcia
Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.
avance de obra.
Se adelanta la contrucción de la caja de inspección para las redes, se evidencia daño en el chegue valvula de Ø 1" de la red de suministro Principal y debido a que este accesorio dañado ocaciona reflujo de caudal y posible cabitación en las bombas se solicita la reposición, realizando el cambio inmediatamente, se hace verificación de Bioseguridad, Toma de temperatura y lavado de manos, se revisa el uso de EPP por el personal en obra.

Inspector Siso.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

09 de octubre de 2020
Dia Sabado
Inicio de actividades. 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO. Tatiana Bautista.
Personal de interventoría.
John F Garcia - Erika Gonzalez.
Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante.
avance de obra
Se realiza verificación de Bioseguridad (Toma de temperatura y lavado de manos) uso de EPP, se actualiza el uso de EPP "Tapabocas" en el personal de obra, se realiza recorrido de las areas afectadas por el paso de la acometida de suministro, se verifica el buen funcionamiento de la red instalada y el optimo llenado de los tanques; se solicita al contratista realizar resanes generales a los acabados, recubrimiento de area donde se realizo la prueba hidraulica y aseo general de las areas intervenidas, debido a la profundización de la regata de acometida en concreto se define no hacer media caña de recubrimiento en los bordillos de los bloques ya que se considera que con el recubrimiento a nivel de piso se logra proteger la red de daños fisicos por parte del personal del colegio.

Inspector SISO

RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria

10 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades. 10:00.
Residente de obra
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO Tatiana Bautista.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez.
Personal en obra: un oficial y un ayudante.

Avance de obra.
Se realiza control de seguridad biometrica (toma de Temperatura, lavado de manos) uso de EPP al personal en obra, se continua con el aseo de las areas afectadas y la construcción de la caja de inspección para el lugar donde se cruza la tubería instalada Ø 1" con la tubería de suministro de Ø 1/2" con registro valbula de Ø 1/2". Se programa con el contratista de esta obra a la administración del Colegio Jose Maria Vargas Vila.

Inspector Sisomc.

RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

13 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.

Insp. S. Sisomc.

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

14 de octubre de 2020
No se reportan actividades

Insp S. Sisomc.


Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

15 de octubre de 2020
No se reportan actividades.

Insp S Sisomc.

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

16 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.




Erika Lizeth González
Ins. Interventoría

Ins Siscom

---


17 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ins Siscom.

Erika Lizeth González
Ins. Interventoría


19 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ins Siscom.

Erika Lizeth González
Insp. Interventoría

20 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ins Siscom

Erika Lizeth González
Insp. Interventoría


21 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ins Siscom.


Erika Lizeth González
Insp Interventoría

22 de octubre de 2020
No se reporta actividad.




Ing. Sisomc.
ARQ. RESIDENTE
Erika Liceth Gonzalez

23 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.




Ing. Sisomc.
ARQ. RESIDENTE
Erika Liceth Gonzalez

24 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ing. Sisomc.
ARQ. RESIDENTE
Erika Liceth Gonzalez

26 de octubre de 2020.
No se reporta actividad.



Ing. Sisomc.
ARQ. RESIDENTE
Erika Liceth Gonzalez

27 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Se recomienda al contratista realizar las actividades de verificación del Polo a tierra en la institución y el inventario necesario para inicia las actividades del cambio del apuntallamiento según la propue

generada por el especialista en el area pertinente;

Insp. Sicome

Erika Lizeth Gonzalez

28 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Insp. Sicome

Erika Lizeth Gonzalez

29 de octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Insp. Sicome

Erika Lizeth Gonzalez

30 de Octubre de 2020.

No se reporta actividad.

Insp. Sicome

Erika Lizeth Gonzalez

31 de Octubre de 2020.

No se reporta actividad

Erika Lizeth Gonzalez Insp. Sicome

3 de Noviembre de 2020
No se reporta actividad.

Insp. Sisem

Erika Lizeth Gonzalez

4 de Noviembre de 2020
No se reporta actividad

Insp. Sisem

Erika Lizeth Gonzalez

5 de Noviembre de 2020.
No se reporta actividad

Insp. Sisem

6 de Noviembre de 2020
No se reporta actividad.

Insp. Sisem

Erika Lizeth Gonzalez

7 de Noviembre de 2020
No se reporta actividad.

Insp. Sisem

Erika Lizeth Gonzalez

9 de Noviembre de 2020
No se reporta actividad.

Insp. S.SSOMA

Erika Liceth Gonzalez

10 de Noviembre de 2020.
No se reporta actividad

Insp. S.SSOMA

11 de Noviembre de 2020.
No se reporta actividad.

Insp. S.SSOMA

Erika Liceth Gonzalez

12 de Noviembre de 2020.
No se reporta actividad.


Insp. S.SSOMA

Erika Liceth Gonzalez

NOTA: Los trabajos se encuentras suspendidos hasta tanto el contratista entregue la propuesta para el mantenimiento del apantallamiento y puesta a tierra y parte electrica, la cual sera evaluada y revisada por la interventoria y de ser aceptada se da viabilidad para reiniar con los trabajos.


28 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tecnicos electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos), se hace enfasis al personal sobre el buen uso y manejo de EPPs por parte del personal en obra.

Se define como lugar de almacenamiento y deposito de herramientas el cuarto de Electricos del segundo piso de la institución; se inicia retiro del apuntallamiento por el sector de la biblioteca y salón multiple se ingresen a la institución un taladro malambrico, lineas de vida, dos Arnes de seguridad y herramienta menor.



Erika Lieth Gonzalez


29 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio labor 10:00.
Personal interventoría.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec Electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se inicia desmonte del apuntallamiento por la zona del coliseo y empalme del edificio de sistemas.



Erika Lieth Gonzalez

30 diciembre de 2020 – 05 enero de 2021 Se suspenden Actividades por festividades de fin de año.

06-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio labores 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez – insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz – resid obra, Tatiana Bautista – insp. sisoma.
2 tec electricistas
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con el desmonte de la red de apuntallamiento en el edificio principal.



Erika Ureth Gonzalez


07-01-2021
Dia Soleado.
Inicio labores 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez – insp. interventoria.
Personal contratistas.
Gustavo Muñoz – resid obra, tatiana Bautista – insp. sisoma.
2 tec Electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con el desmonte del apuntallamiento en el edificio principal.



Erika Ureth Gonzalez


08 - Enero 2021 al 11 enero de 2021.
Se suspenden actividades por orden de la alcaldia mayor, toque de queda por pandemia.

12-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio actividades 10:00.
personal interventoria
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec Electricistas.
Se verifican los protocolos de bioseguridad; se hace el desmonte del apuntallamiento del edificio de preescolar.



Erika Lizeth Gonzalez


13-01-2021.
dia Soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec Electricistas.
verificados los protocolos de bioseguridad; se recaban materiales para el apuntallamiento y se inicia apuntallamiento por la zona del coliseo de la institución.



Erika Lizeth Gonzalez


14-01-2021.
dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.

Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec. Electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con la instalación del apuntalamiento sobre la zona de edificio principal, se hacen recomendaciones sobre el alambre de conexión y el contratista manifiesta que estos ajustes se realizaran mas adelante.



Erika Lizeth Gonzalez

15-01-2021.
dia Sabado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika Gonzalez, - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec. Electricistas.
verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con la instalación del apuntallamiento en el edificio principal.



Erika Lizeth Gonzalez

18-01-2021.
dia sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 tec. Electricistas.
Se verifican los protocolos de bioseguridad, se inicia apuntallamiento

de las cubiertas laterales en el coliseo y en los domos del pasillo principal.



Erika Lizeth Gonzalez

19-01-2021.

Dia soleado.

Inicio actividades 10:00.

Personal de interventoría


John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.

Personal Contratista

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

2 tec. Electricistas

Verificados los protocolos de bioseguridad; se inicia apuntalamiento en el edificio de preescolar.



Erika Lizeth Gonzalez

20-01-2021.

Dia soleado.

inicio actividades 10:00.

Personal interventoría


John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.

Personal contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

2 tec Electricistas.

Verificados los protocolos de bioseguridad; se culmine la instalación del apuntalamiento en el edificio de preescolar.



Erika Lizeth Gonzalez

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A - SIERRA MORENA

Contrato Nº COI PCCNTR 1577535
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la presentación del servicio educativo.
Firma contratista: CONSORCIO RETORNAR.
Nit: 901.384.708 - 1
Interventoría contrato COI. PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoría técnica, administrativa, Juridica, financiera y ambiental del contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la presentación del servicio educativo.
Grupo 4.
Firma contratista AC2R Ingeniería & Proyectos SAS.
Nit 830.123.577,7
COLEGIO IED SIERRA MORENA.

Localidad 19 Ciudad Bolivar.
Supervisor del contrato SED.
Ing. Ivan duarte.
Personal Administrativo contratista.
Residente de Obra.
Arq. Gustavo Munoz.
Arq. Fernando Delgado.
Profesional Sisoma.
Ing. Tatiana Bautista.
Personal Interventoria.
Ing. Melissa Janez.
Inspectores de interventoria
Ing. Erica Gonzalez.
CyGA John Fredy Garcia.

Inicio de obra

Fecha Firma del acta de inicio: 1 de septiembre de 2020.

Se realizan labores de inspección y estudios para propuestas de las actividades en las areas a intervenir.

14-09-2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana:

Clima tarde:

Personal interventoria

Erika Liceth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista

Villareal Mendez ADALIER - Ayudante Arq. Gustavo Muñoz - Residente

Bejarano Mendez Nelson - Oficial Tatiana Bautista - Inspector SISO

Roa Galvez Diego - Ayudante

Gomez Joanny - Ayudante

Jesus David Pimentel

Actividades.

Se inicia Con el reforzamiento a la estructura en alumino de la Ventaneria del Aula 310; El Reforzamiento Consiste en la instalación de dos PERFILES en aluminio de 4x1 1/2" Anclados al Piso con una lamina y un sistema de Pernos y Soldados a la VIGA IPE, Rigidizando el sistema.

Tambien Se instalaron dos tubos "agua negra" de diametro 1 1/4" x 1,5 mm de espesor como reforzamiento a la baranda pasamanos que funciona como barrera antichoques para la Ventaneria.

Se realiza Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Se realiza Seguimiento al Protocolo de salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra.

Se registra un avance en la instalación de reforzamiento a la estructura en aluminio Para Ventaneria metalica en 3 Aulas ubicadas en el 3 PISO.

Antes de iniciar el reforzamiento a la Estructura de la Ventaneria se realiza retiro de guarda escobas en baldosa granito existente, y retiro de tubo 2" en baranda Pasamanos.

Ing. Jonathan Bautista (SISO)

Erika Liceth Gonzalez
Inspector Interventoria

Ing. Estructuras

Heliza Gomez R. I.

15-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Liceth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 4 Ayudantes

Tatiana Bautista - Inspector SISO 1 Oficial

Actividades Realizadas:

Se realiza toma de medidas en las aulas ubicadas en el 2 piso con la finalidad de comprar materiales y continuar con la instalacion del reforzamiento.

Se inicia con la limpieza de de los elementos instalados como refuerzo a la estructura de la Ventaneria con la finalidad de iniciar la aplicacion del anticorrosivo y la pintura.

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y Lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por Parte del personal de obra).

Lectura BE

Ing. Tatiana Bautista (SISO)

Insp Interventoria.

Erika Liceth Gonzalez

Inspector Interven.

Residente Interventoria

16-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Liceth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional

Uso de epp por parte del personal de obra)
Se realiza la instalación del Reforzamiento a la estructura de ventanería que consiste en la instalacion de 2 parales Verticales rectangulares metálicos de 4" X 1 1/2" Calibre 18, mediante un sistema de pernos para anclaje al piso, y Soldadura en la viga IPE. Se realiza instalacion de 2 Tubos "de agua negra" diametro 1 1/4", Como reforzamiento de barrera antichoque a la baranda pasamanos que protege los vidrios de la Ventanería. EN los 2 Salones faltantes en el 3 piso. Quedando Reforzada la estructura de la ventanería de las AULAS ubicadas en el 3 PISO (6 Aulas en total)
Se realiza instalación de perfil Longitudinal de 4" X 1 1/2" Calibre 18, Como Sistema de reforzamiento a las persianas ubicadas en los salones del 3 piso, los Perfiles son Soldados a la VIGA IPE. (Total 6 Aulas)

Lentura PB
Ing. Ethan Bautista (SISO)

Insp. Interventoría.
Erika Lizeth González
Ins. Interventoría
17-09-2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Hora de Salida: 06:00 Pm
Clima mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado
Resal Interventoria:
Erika González - Inspector Jhon García: Inspector
Personal Contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial
Tatiana Bautista - Inspector SISO 4 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).
Se Realiza Instalación de Anticorrosivo y pintura en todos los elementos ya instalados para el reforzamiento de la estructura de la Ventanería y el Pasamanos de barrera antichoque; Posterior a la revision de soldadura. Quedando

Pintados y detallados todos los elementos instalados en las 6 AULAS ubicadas en el 3 PISO; Junto con los Perfiles instalados como reforzamiento a las cortinas en las 6 AULAS ubicadas en el 3 PISO.

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Insp. Interventoría

ERIKA LICETH GONZÁLEZ

Inspector Interventoría

18-09-2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoría:

Erika González - Inspector Jhon García - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).

Se realiza instalación del reforzamiento a la estructura de la Ventanería de 4 AULAS ubicadas en el Segundo PISO; el reforzamiento consiste en la instalación de 2 Parales Verticales rectangulares metálicos de 4 X 1 1/2" calibre 18, mediante un sistema de pernos para anclaje al PISO y Soldadura en la VIGA IPE; Se realiza chequeo e inspección a la Soldadura.

Se realiza instalación de 2 tubos de "agua negra" diametro 1 1/4" como reforzamiento de baranda antichoque a la baranda pasamanos que Protege los vidrios de la Ventanería. en 4 AULAS ubicadas en el 2 PISO.

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Insp. Interventoría.

ERIKA LICETH GONZÁLEZ

Inspector. Int.

19-09-20 → Sabado

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 02:00 Pm

clima mañana: Soleado

clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Erika Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional. (uso de epp por parte del personal de obra).

Se realiza instalación de anticorrosivo y pintura en los elementos instalados para el reforzamiento de la estructura de la Ventaneria y el Pasamanos como baranda antichoque, posterior a la soldadura, quedando pintados y detallados todos los elementos instalados en las 5 aulas ubicadas en el segundo piso.

Lentum PB

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez

Inspector Int.

Ing. Interventoria.

21-09-20

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 12 m → Debido a Problemas de orden Publico y transporte por manifestaciones

Personal Interventoria:

Erika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente

Tatiana Bautista - Inspector SST.

Actividades Realizadas:

Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se realiza toma de medidas para compra de materiales del reforzamiento a realizar en las aulas solicitadas el pasado viernes 18 de Septiembre del 2020 de la siguiente manera:

- Instalación de Reforzamiento a la estructura de la Ventanería de 4 aulas ubicadas en el 4 PISO
- Instalacion de Reforzamiento a la estructura de la Ventanería de las 2 Aulas de Sistemas.

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Liceth Gonzalez

Inspector Int.

Insp. Interventoría

22-09-20

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Personal de interventoría:

Erika Liceth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente 1 OFICIAL

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los Protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra)

Se da inicio a la instalación del reforzamiento a la estructura de Ventanería de 2 AULAS ubicadas en el 4 PISO; Consiste en la instalación de 2 parales Verticales rectangulares metalicos de 4" x 1 1/2" Calibre 18, mediante un sistema de pernos de anclaje al piso y Soldadura en la VIGA IPE.

Instalacion de 2 tubos "Agua negra" diametro 1 1/4" como reforzamiento de barrera antichoque a la baranda pasamanos que protege los vidrios de la ventanería en 2 aulas ubicadas en el 4 PISO.

Se da inicio la la instalación de un Perfil longitudinal de 1 1/2" x 1 1/2" como Refuerzo a lo ya instalado a mitad del sistema estructural, tal y como se definio en el comite del Pasado Viernes 18 de Septiembre. Se instalan en 3 Salones del 3 PISO.

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Liceth Gonzalez

Ins. Interventoría

Ing. Interventoría

23-09-2020

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima mañana: Lluvioso

Clima tarde: Nublado

Personal de interventoria

Erika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal del contratista

Ing. Gustavo Muñoz Residente 1 Oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Se realiza seguimiento a protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).

Se continua con la instalación del reforzamiento a la estructura de la ventanería descrita anteriormente. en los siguientes 2 Aulas Ubicadas en el 4 Piso para un total de 4 Aulas Reforzadas en el 4 Piso, asi mismo se da inicio a la instalación del reforzamiento en las Aulas de sistemas anteriormente mencionadas.

Se continua con la instalación del Perfil longitudinal de 1 1/2" x 1 1/2" como refuerzo a la mitad del sistema estructural de las 3 Aulas siguientes en el 3 Piso. Para un total de 6 Aulas.

Ins. Tatiana Bautista (SISO)

Erika Lizeth Gonzalez

Inspector Int.

Insp. Interventoría

24-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Personal de interventoria:

Erika Lizeth Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal del contratista:

Ing. Gustavo Muñoz - Residente 1 oficial

Tatiana Bautista - Inspector SST 4 Ayudantes

Se realiza Seguimiento a los Protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y

Lavado de manos). Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra).
Se Continua con la instalación del reforzamiento a la estructura de la Ventanería ubicada en las aulas de sistemas.

Ing. Tatiana Bautista — RESIDENTE

Geiza Liceth Gonzalez
Ins. Interventoria

29 - 09 - 2020
Hora de inicio: 10:00 am
Hora de fin: 06:00 Pm
Personal de interventoria:
Geiza Liceth Gonzalez - Ins. Interventoria Jhon Garcia - Ins. Interventoria
Personal del contratista:
Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista: Inspector SIST 1 oficial — 2 Ayudante
Actividades Realizadas:
Se Realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del personal de obra).
Se continua con la Instalación del Reforzamiento a la estructura de la Ventanería ubicada en las aulas de sistemas.
Se continua con la instalación del Perfil Longitudinal de 1½" x 1½" como refuerzo a la mitad del sistema estructural de la Ventanería en las Aulas de sistemas.
Se inicia el retiro de Guardaescobas y la limpieza del perfil del piso; con la Finalidad de dejarlo listo para iniciar el proceso de aplicación de anti-corrosivo y pintura.

Ing. Tatiana Bautista — RESIDENTE

Geiza Liceth Gonzalez
Ins. Interventoria

26-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 am

Hora de Salida: 12:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Personal de interventoria:

Erika Gonzales. Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal contratista:

Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST 1 oficial 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza Seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (Toma de temperatura y Lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de Epp por parte del Personal de obra) Se continua con el Retiro del guarda escobas en baldosa, y limpieza del perfil de Piso, Se inicia Proceso de aplicación de anticorrosivo.

Ing. Tatiana Bautista.

ARQ. RESIDENTE

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

28-09-2020

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Salida: 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria

Erika Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST 1 oficial - 4 Ayudantes.

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) Se deja registro en planilla de ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (uso de epp por parte del Personal de obra). Inicia Proceso de aplicacion de Anticorrosivo y Pintura en el Reforzamiento Estructural Instalado en la estructura de la Ventaneria en las aulas

Ubicadas en las BIBLIOTECAS.

ARQ. RESIDENTE

Geika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

29-09-2020

Hora de inicio: 10:00 Am

Hora de Salida 06:00 Pm

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: Soleado

Personal Interventoria:

Geika Gonzalez - Inspector Jhon Garcia - Inspector

Personal Contratista:

Arq. Gustavo Muñoz - Residente Tatiana Bautista - Inspector SST 1 Oficial - 4 Ayudantes

Actividades Realizadas:

Se realiza seguimiento a los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos) se deja registro en planilla de Ingreso. Seguimiento a los Protocolos de Salud ocupacional (Uso de epp por parte del personal de obra).

Se Continua Con el Proceso de aplicacion de anticorrosivo y Pintura en el reforzamiento estructural Instalado en la estructura de la Ventaneria en las aulas ubicadas en las BIBLIOTECAS.

ARQ. RESIDENTE

Geika Lizeth Gonzalez
Inspector Int.

30-09-2020.

No se Registran Actividades.

ARQ. RESIDENTE

Geika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

01-10-2020

No se Registran Actividades.

Celka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

02-10-2020

No se Registran Actividades.

Celka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

03-10-2020

No se Registran Actividades.

Celka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

ARQ. RESIDENTE

04-10-2020

No se Registran Actividades

Ing. Bautista

ARQ. RESIDENTE

Celka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

05-10-2020

No se Registran Actividades

Ing. Bautista

ARQ. RESIDENTE

Celka Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

06-10-2020

No se registran Actividades

Inspector Sisoma

ABD. RESIDENTE

ERIKA Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

07-10-2020

No se registran actividades, se solicita al contratista actualización de programación y flujo de caja.

Inspector Sisoma.

ABD. RESIDENTE

ERIKA Lizeth Gonzalez
INSP. Interventoria

08-10-20.

No se registran actividades.

Inspector Sisoma.

ABD. RESIDENTE

ERIKA Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

09-10-20.

No se registran actividades.

Inspector Sisoma

ERIKA Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

ABD. RESIDENTE

10-10-20.

No se registran actividades

Inspector Sisoma.

ERIKA Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

ABD. RESIDENTE

13-10-20.

No se registran Actividades.

Ins. Ssoma

ERIKA Lizeth Gonzalez
Ins Interventoria


14-10-2020.
No se registran actividades.



Ins. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

15-10-2020.
No se registran actividades.



Ins. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria


16-10-2020.
No se registran actividades.



Ins. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Ins. Interventoria

17-10-20.
No se registran actividades



Ins. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria


19-10-20
No se reportan actividades.



Ins. Sisoma


Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

20 - 10 - 2020.
No se registran actividades



Erika Lizeth González
Insp. Interventoría

Insp. Sisoma



21 - 10 - 2020.
Día Soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John García, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría -.
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid Obra -.
Tatiana Bautista - Insp. SISOMA -.
1 oficial y 4 ayudantes.
Se hace acopio de la primera entrega de vidrios para las ventanas, de los salones intervenidos en la institución.
EL CONTRATISTA ACLARA QUE LOS DIAS QUE NO SE PRESENTAN ACTIVIDADES ES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRODUCCIÓN LOS VIDRIOS LAMINADOS A INSTALAR EN EL PROYECTO.




Erika Lizeth González
Insp. Interventoría

Insp. Sisoma



22 - 10 - 2020
Día Soleado
Inicio actividades 10:00
Personal de interventoría
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 4 ayudantes.

Se hace verificación de controles bioseguridad (toma de temperatura, lavado de manos) buen uso y manejo de EPP.s por el personal en obra; Se continua con el acopio de vidrios en esta sede. son 125 m² de vidrios (3+3).




Ins. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE

Geiva Lireth Gonzalez

23 de octubre de 2020.

No se reportan actividades. en obra, se continua con el proceso de armado de los vidrios.



Ins. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE

Geiva Lireth Gonzalez

24 de octubre de 2020

No se reportan actividades en la obra



Ins. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE

Geiva Lireth Gonzalez

26 de octubre de 2020.

No se reportan actividades en la obra



Ins. Sisomc.

ARQ. RESIDENTE

Geiva Lireth Gonzalez

27 de octubre de 2020
No se presentan actividades en la obra.

Insp. SISOMA
ARQ. RESIDENTE
ERIKA Lireth Gonzalez

28 de octubre de 2020.
No se reporten actividades en la obra.

Insp. SISOMA
ARQ. RESIDENTE
ERIKA Lireth Gonzalez

29 de octubre de 2020.
No se reporten actividades.

Insp SISOMA
ERIKA Lireth Gonzalez.

30 de octubre de 2020.
No se reporten Actividades

Insp. SISOMA
ERIKA Lireth Gonzalez

31 de octubre de 2020
No se reporten actividades

Insp SISOMA
ERIKA Lireth Gonzalez

3 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 14:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - Resid de obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 instaladores Johnny Gomez Brinez. PRETAL SAS 17-09-2020.
1 ayudante Jesus David Pimentel Cotiva PRETAL SAS 17-09-2020.
Se verifican cursos de alturas de los instaladores y la certificacion de los andamios que se reciben, se finalizan actividades 17:00 horas por lluvias continuas.

Erika Lizeth Gonzalez

Insp. Sisoma.

4 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría
John F Garcia, Erika L Gonzalez - Insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. Sisoma.
2 instaladores y 1 ayudante.
Se verifican protocolos de seguridad y buen uso y manejo de EPPs en el personal de obra; se inicia el armado de los cuerpos de andamio certificado, se verifica la instalación de lineas de vida y el protocolo de seguridad del instalador aprobado, se hace distribución de los vidrios por salón.

Erika Lizeth Gonzalez


Insp. Sisoma.

5 de Noviembre de 2020.
Dia sabado.
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. Interventoría
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. Sisoma
2 instaladores y 1 ayudante.
Se culmina el armado de los anclamios certificados y se inicia la instalación de vidrios desde el salón 310.




Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez



6 de Noviembre de 2020.
Dia sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid Obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 instaladores, 1 ayudante.
Se continua con la instalación de vidrios en el tercer piso; luego de verificar los protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS; la almacenista de la institución solicita que el acopio de los vidrios que se encuentran en los salones se realice en el salon 305 ya que durante todo el fin de Semana se realizara la prueba del ICFES y los salones serán utilizados por la comunidad para esta actividad por tanto se solicita al personal retirar estos elementos al salón autorizado.



Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez



7 de Noviembre de 2020.
No se presentan actividades en este frente debido a que el Colegio se encuentra realizando la prueba del ICFES durante el fin de semana.

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
9 de Noviembre de 2020.
Dia nublado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoria
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - sisoma
2 instaladores - 1 ayudante
Una vez verificados los protocolos de bioseguridad y el buen uso y manejo de EPPS; se continua con la instalacion de vidrios en los salones del tercer piso; se hacen paradas repentinas por lluvias.

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

10 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado, tarde lluviosa
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez, - insp - interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - inp - sisoma
Una vez verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS personal en obra. "dos instaladores y

un ayudante"; se continua con la instalación de vidrios en los salones del tercer piso. se hacen paradas repentinas por las lluvias del dia sobre todo en la tarde.

Lautaro B
Insp Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

11 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoria
Gustavo Muñoz - Resid obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma.
2 instaladores y 1 ayudante.
Verificados los protocolos de Bioseguridad y el bum uso y manejo de EPPS; se continua con la instalación de vidrios en el tercer piso.

Lautaro B
Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

12 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika Gonzalez. - insp. interventoria.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. Sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante.
Una vez verificados los protocolos de bioseguridad y el bum uso y manejo de EPPS; se continua con la instalación de vidrios en el tercer y cuarto pisos; presencia de lluvias cortas producen paras en la instalación.

Lautaro B
Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

13 de Noviembre de 2020
Dia nublado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Resid obra - Tatiana Bautista, insp. Sisoma
3 instaladores.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS, se continua con la instalación de vidrios con paredes paulatinas por accion de las lluvias.

Tatiana B
Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

14 Noviembre de 2020.
Dia Nublado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - residal obra, Tatiana Bautista - insp Sisoma
3 instaladores.
Se verifican protocolos de bioseguridad y buen manejo de EPPS, se continua con la instalación de Vidrios en los salones del 3er piso, se hace Solicitud de apertura de la biblioteca para hacer la respectiva instalación de los vidrios para no se encuentre a la Sra almacenista de la institución.

Tatiana B
Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

17 de Noviembre de 2020.
Día Nublado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L González – insp. interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp SISOMA.
Se hace verificación de protocolos de Bioseguridad y buen uso de EPPS, se hace revisión de los vidrios instalados y los ajustes de pisavidrios, se retira la solicitud de apertura de la biblioteca.

Insp SISOMA

Erika Lizeth González

18 de Noviembre de 2020.
Se para actividades de instalación de vidrios en este frente debido a que el vidrio 343 necesario se encuentra en fabricación según manifiesta el contratista, se para el frente hasta tanto llegue de nuevo el material para culminar con estas actividades.

17 de Noviembre de 2020.
Dia Nublado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez – insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
Se hace verificación de protocolos de Bioseguridad y buen uso de EPPS, se hace revisión de los vidrios instalados y los ajustes de pisavidrios, se realiza la solicitud de apertura de la biblioteca.

Insp. Sisoma


Erika Lizeth González

18 de Noviembre de 2020.
Se paran actividades de instalación de vidrios en este frente debido a que el vidrio 343 necesario se encuentra en fabricación según manifiesta el contratista, se para el frente hasta tanto llegue de nuevo el material para culminar con estas actividades.


16 de Diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00 a.m.
Personal de interventoria
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista. - insp. sisoma.
2 instaladores, 1 ayudante.
Verificados los protocolos de seguridad Biologica y el buen uso y manejo de EPPS, se revisan cursos de alturas en instaladores y se inicia la entrada de vidrios 5+5 para las aulas pendientes.

Erika Lizeth González


17 de Diciembre de 2020.
dia Sabado
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - residobra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
2 instaladores, 1 ayudante.
Verificados los protocolos de seguridad y buen uso y manejo de EPPS; se continua con el traslado al punto de acopio del vidrio para las aulas del segundo piso; salón asignado 210.




Erika Liceth Gonzalez



18 de Diciembre de 2020.
No se presentan actividades; se espera la llegada de los andamios certificados.
19 de Diciembre de 2020.
dia Sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma
2 instaladores, 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS
Se ingresan andamios certificados a las instalaciones del colegio, se solicita a la administracion de la institución permiso para acceder a los salones a intervenir



Erika Liceth Gonzalez




19 de diciembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS; se hace armado y verificación del estado del andamio certificado, se confirma autorización para el ingreso a los salones a intervenir.

Erika Lieth Gonzalez

21 de diciembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma
2 instaladores - 1 ayudante
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se hace traslado de los vidrios a los salones a intervenir y se inicia instalación en el salon 210.


Erika Lieth Gonzalez

22 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid de obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante.
Se continua con la instalación de vidrios 5x5, pisavidrios y disposición de sobrantes en el lugar asignado para su acopio.



Gema Ureth Gonzalez


23 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante
Se continua con la instalación de vidrios 5x5, Pisavidrios y disposición de vidrios retirados al lugar asignado para su acopio.



Gema Ureth Gonzalez


24 de diciembre de 2020.
Dia Soleado
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante.
Revisados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS; se continua con la instalación de vidrios 5x7 en los ventanales del segundo piso.



Erika Lizeth Gonzalez

28 - de diciembre de 2020.
Día Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista. - insp. sisoma.
2 instaladores - 1 ayudante.
Revisados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS, se culmina la instalación de vidrios en los ventanales del segundo piso quedando al pendiente los salones 305 y 205 a los cuales no se tuvo acceso, en total se instalaron 10 salones con un total de 180 m^2 quedando al pendiente 36 m^2 los cuales se instalaran luego del periodo de vacaciones de los docentes de la institución, el día de hoy se desmontan los andamios.



Erika Lizeth Gonzalez

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B - SAN ISIDRO LABRADOR

Contrato Nº COI PCCNTR 1577535
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de adelantar los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo.
Firma contratista: Consorcio RETORNAR
Nit: 901. 384. 708 - 1.
Interventoría Contrato Nº COI PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoría técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental del contrato de obras de adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de adelanter los requerimientos y necesidades en terminos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Grupo 4.
Firma contratista: ACZR Ingenieria & Proyectos SAS.
Nit: 830. 123. 577 - 7.
COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

Localidad 19 Ciudad Bolivar.
Supervisor del contrato SED
Ing. Ivan Duarte
Personal administrativo Contratista.
Arq. Gustavo Muñoz.
Arq. Fernando Delgado.
Inspector SISO.
Tatiana Bautista.
Personal interventoría
Ing. Meliza Ianez.
Inspector de interventoría.
Ing Erika Gonzalez.
C y G A John Fredy García C.

Inicio de Obra

Fecha firma acta de inicio: 1 de Septiembre de 2020

Se realizan labores de inspección, reconocimiento y estudios para propuesta de las actividades a intervenir.

- Cambio de cubierta existente en los salones del segundo piso y sala de sistemas.
- Adecuación de lavamanos corrido en los baños de niños y niñas de los dos pisos.
- Estudio del estado del muro de fondo de la sala de computo el cual presenta fisuras que podrían afectar su integridad.
- Adecuación de la red electrica y reposición de luminarias en las areas intervenidas.

05 de Octubre de 2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades 8:00

Residente de obra.

Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.

Inspector SISO: Tatiana Bautista.

Personal Interventoría.

John Fredy Garcia, Erika Gonzalez.


actividades del día.

Se realiza recorrido de inspección de fachadas y verificación de direcciones por nomenclatura de los predios vecinos al colegio SAN ISIDRO Sede B y se entrega en cada vecindad oficio informativo sobre las actividades a realizar en el colegio así como solicitando la Colaboración de los vecinos y del colegio para la realización de los respectivos actos de vecindad, las cuales se programan para el día 07 de octubre iniciando labores a partir de las 9:00 am, se solicita al contratista actualización de programaciones y Flujo de caja con el fin de ajustar actividad y plazos de ejecución.

Inspector SISO

APR. RESIDENTE


06 de octubre de 2020
Dia soleado.
Inicio de actividades.
No se realizan actividades en el colegio debido a que el especialista en estructuras del contratista solicita posponer la visita al colegio para el día 08 de octubre de 2020 en las horas de la mañana.



ARQ. RESIDENTE

Inspector Sisomc

07 de octubre de 2020
Dia Soleado.
Inicio de actividades 9:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado. Residentes de obra
Insp Siso: Tatiana Bautista.
actividades del día.
Se realiza recorrido junto con la señora ~~rectora~~ secretaria del colegio Ing. Paula Andrea Cruz y la rectora Ing. María Virginia Salinas. sobre el estado actual de las materialidades de muros y pisos en las areas a intervenir, Salones, Circulaciones y escaleras, se revisan las actividades a realizar en los baños de la institución y se define acompañamiento para la visita del especialista por parte del contratista en cuanto a los temas estructurales, se hace visita a los predios vecinos y solo se logra tener acceso a una unidad residencial realizando la respectiva acta de vecindad.



ARQ. RESIDENTE

Inspector Sisomc

08 de Octubre de 2020.
Dia Soleado
Inicio de actividades 9:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez
Personal de contratista.
Residente de obra Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
Inspector SISO Tatiana Bautista.
Personal en obra No hay.
Actividades del dia.
Se realiza visita técnica del especialista por parte del contratista en Estructuras para definir la propuesta de este con respecto a la cubierta y el muro que presenta afectación en la sala de sistemas, se realiza visita a los predios vecinos y se logra acceder a la vivienda contigua a la parte inferior del Colegio, la cual presenta afectaciones en la fachada y muros internos, Se realiza el respectivo informe y acta de vecindad, en cuanto a la visita de la estructural se manifiesta que la estructura de la cubierta se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones de Norma y funcionalidad, recomienda instalar platinas en las correas para facilitar la sujeción de la nueva cubierta, recomienda demolición del muro de la sala de sistemas y manifiesta la necesidad de realizar un muro de Contención en el sardinel del colegio en la parte baja, esto con el fin de evitar deprendimiento y mayores daños en el sector de esta zona, se queda en espera del respectivo informe y Propuesta por parte del contratista

ARQ. RESIDENTE
Inspector SISO

09 de octubre de 2020.
No se reporta avance de actividades.

ARQ. RESIDENTE
Inspector SISO

10 de Octubre de 2020.
No se reporta avance de obra.

Inspector SISOMA.



RESIDENTE

13 de octubre de 2020.
No se reporta avance de obra.

Inspector SISOMA



RESIDENTE

14 de Octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de obra 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado.
inspector SISO Tatiana Bautista.
Personal en obra.
1 maestro. Luis Maria Paez.
1 ayudante. Jose Salvador Vega.
Actividades del dia.
Se inicia demolición del meson "Lavamanos en concreto corrido", del baño de niñas del segundo piso, se hace socialización al almacenista del colegio y se hacen las recomendaciones de obra y bioseguridad al personal en obra; Siendo las 14:12 se suspenden labores por solicitud de Secretaria de Educación, se manifiesta incumplimiento en cuanto a programación de obra, asi como Flujos de caja, afiliaciones correspondiente al personal en obra (EPS, ARL y Fondo de pensión), incumplimiento de Normas de seguridad y salud en la obra, manejo de EPPs adecuados; solicitud de oficio para ingreso del personal al colegio; se solicita por tanto detener las labores en la obra por parte del inspector

de interventoría asignado a este frente John Fredy García Campos.

EL DIA 8 DE OCTUBRE SE REALIZO LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL COLEGIO SAN ISIDRO, CON LA PRESENCIA DE LA RECTORA DEL COLEGIO, SE REALIZO LA VISITA DEL LUGAR. CALCULISTA EN LA QUE SE INFORMO POR PARTE DE EL QUE NO ES NECESARIO REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y SE HACE SOLICITADO PARA CON RECTORIA E INSPECCION DE INTERVENTORIA. EN COMUN ACUERDO CON LA RECTORIA SE INFORMO EL INICIO DE ACTIVIDADES EL DIA MARTES 13 DE OCTUBRE. (DEMOLICIONES DE MUROS Y LOSA EN BAÑOS).

EL DIA 14 DE OCTUBRE SE ENVIO LA PROGRAMACION PARA REVISION TENIENDO EN CUENTA LAS NUEVAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

- DEMOLICION MURO AULA SISTEMAS
- INSTALACION DE PLATINAS PARA FIJACION DE CUBIERTA
- INSTALACION DE TEMPLETES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA..


ARQ. RESIDENTE

Inspector Sisa.

Insp. Interventoría

Avances del día.
Se permite el acceso del personal de obra luego del control. Biometrico, (toma de temperatura y lavado de manos), se verifica el buen uso y manejo de los EPPs, se hace aseo del baño de niñas del segundo piso; no se permiten mas actividades dentro de la institución hasta que el contratista complete los requerimientos necesarios. para iniciar labores, se solicita esquema y listado con metodologia y materialidad de las actividades a realizar en la institución.

Fuentes PP
Ins. SISOMA.




Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria.

Insp. Interventoría.

16 de Octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John García, Erika Gonzalez. - inspectores de interventoría -
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residentes de obra -.
Tatiana Bautista - Inspector SISOMA -.
1 oficial y 1 ayudante.
Se hace control de Bioseguridad (toma de temperatura y lavado de manos, buen uso y manejo de EPP por parte del personal en obra; se hace aseo del baño de niños del primer piso; no se permite mas actividades en la institución, faltan aún parte de la documentación y programación de esta institución.

Fuentes PP
Ins SISOMA.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria

Insp. Interventoría.

17 de octubre de 2020.
Dia sabado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría
John F García, Erika Gonzalez - Inspectores de Interventoria -
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Residente de obra.
Tatiana Bautista - Inspector Sisoma -
1 oficial y un ayudante.
Se hace control de Bioseguridad en el personal de obra, (toma de temperatura, Lavado de manos) y uso de EPP; Se continua con el aseo de los baños del primer piso, los materiales de retiro son depositados en el sitio autorizado por la institución.

Tatiana B
Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria

Insp. Interventoría.

19 de Octubre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoría.
John Fredy García, Erika L. Gonzalez - Insp. Interventoría -.
Personal del Contratista.
Muñoz Gustavo, Fernando Delgado - Resid Obra -.
Tatiana Bautista - Insp. Sisoma -.
1 oficial y 1 ayudante.
Se finaliza el aseo de los baños de la institución y el acopio de los materiales de retiro en el sitio autorizado.

Tatiana B
Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria


Insp. Interventoría.

20 de Octubre de 2020.
Dia Nublado.
No se registran actividades

Lourdes BB
Ins. Sisoma.




Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria




Insp. Interventoria.

21 de Octubre de 2020.
Dia Soleado.
No se registran actividades.

Lourdes BB
Ins. Sisoma.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria




Insp. Interventoria.

22 de Octubre de 2020.
Dia Lluvioso.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoría -.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. Obra -.
Tatiana Bautista - Insp. Sisoma -.
1 oficial y 1 ayudante.
Se recibe material para continuar las actividades de readecuación y mantenimiento del area de lavamanos en los baños de la institución previo se realiza control de bioseguridad al personal de obra (toma de temperatura y lavado de manos).

Lourdes BB
Ins Sisoma.



Erika Lizeth Gonzalez
Insp Interventoria



Insp. Interventoria.

23 de octubre de 2020
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F García Erika Gonzalez - Insp interventoria.
Personal del Contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante
Se hace verificación de protocolos de Bioseguridad y manejo de EPPs por parte del personal en obra; se inicia el replanteo de las redes de suministro y desagüe en los baños del primer piso; se determina una altura de 0,50 m para el nivel de estos baños y de 0,65 m para el nivel del segundo piso.

Insp. Sisoma.

RESIDENTE

Erika Lizeth González

24 de octubre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resd obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante
Se realiza control bioseguridad y manejo de EPPs al personal en obra; se continua con el replanteo e instalación de las redes de suministro Ø½" y desagüe Ø 2" en los baños del primer piso.

Insp. Sisoma.

RESIDENTE

Erika Lizeth González

26 de octubre de 2020.
Día Soleado.
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - Resid. obra.
Tatiana Bautista - insp. sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Se hace control Bioseguridad y manejo de EPPs al personal en obra; se realizan las instalaciones de suministro y drenaje en los baños del primer piso; se construyen los muretes de soporte y protección de tuberías y del mesón; se inicia el pañete del área intervenida en el baño de niños del primer piso (Segundo Nivel).


Ins Sisoma. ARQ. RESIDENTE Erika Ureth Gonzalez

27 de octubre de 2020.
Día Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John García, Erika Gonzalez. - insp interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz, Fernando Delgado - resid de obra.
Tatiana Bautista - insp sisoma.
1 oficial y 1 ayudante.
Se hace control de bioseguridad y buen uso y manejo de EPP al personal en obra; se construye murete en el baño de niños del (Segundo Nivel) primer piso y se inicia el pañetado de este.


Ins. Sisoma. ARQ. RESIDENTE Erika Ureth Gonzalez

28 de Octubre del 2020
Dia soleado
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez - Insp interventoria
Personal del contratista
Gustavo Muñoz, fernando delgado - Resid obra
Tatiana Bautista - insp Sisoma
1 oficial y 1 ayudante
Se hace verificacion de protocolos de Bioseguridad de EPPS
Se inicia paretes de muro en el baño de niñas del segundo piso, Medidas de los muros 6.50 x 2, 1.80 x 2, 1.30 x 2

Insp Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez




29 de Octubre del 2020
Dia soleado
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria
John F. García Erica Gonzalez insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muñoz, Resid obra Tatiana Bautista insp Sisoma
1 oficial y 1 ayudante
Se hace verificacion del protocolo de bioseguridad de EPPS
Se continua parete de baño de niñas del segundo piso,
Se verifican alturas de 0,50 0,65 m hacia como las acometidas de la redes de suministro y desagüe en cada uno de los baños

Insp. Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez




30 de Octubre del 2020
Dia Soleado
Inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez - insp interventoria
Personal del Contratista
Gustavo Muñoz, Resid obra Tatiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
Se hace Verificacion del protocolo de bioseguridad de EPPS
Se continua pañete de Baño de niños del segundo piso,
se construyen muretes en el baño de niños del segundo
piso

Lautaro PR
Insp. Sisoma




Erika Lizeth Gonzalez




31 de Octubre del 2020
Dia soleado inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez insp interventoria
Personal del Contratista
Gustavo muñoz Resid obra - Tatiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
Se hace Verificacion del protocolo de bioseguridad de EPPS
Se hace pañete de baño de niños del segundo piso, Se
verifica distancias de los puntos de red de suministro para
los lavamanos en todos los baños

Lautaro PR
Insp Sisoma



Erika Lizeth Gonzalez



2 de Noviembre de 2020
Dia nublado
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez - insp interventoria
Personal de contratista
Gustavo Muñoz Resid obra, Tattiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
se hace verificacion de protocolo de bioseguridad de EPPs
Se construyen los mesones de los baños del primer piso
y se continua con paretes

Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

3 de Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez - insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muñoz Resid obra, Tattiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
Se hace verificacion de protocolo de Bioseguridad de EPP
se recibe enchape de muros de baño blanco de 25x3
azul para baños de niños y naranja para baño de
niñas

Insp Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

4 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John f. García Erika Gonzalez - insp interventoria
Personal de contratista
Gustavo Muños Resid obra, Tatiana Bautista insp Sisoma
1 oficia y 1 ayudante
se hace Verificacion de protocolo de bioseguridad de EPPS
se funden mesones de baño del segundo piso y se pañeta lava-traperos en el baño de niños

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

5 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F García Erika Gonzalez - insp interventoria
Gustavo Muños Resid obra, Tatiana Bautista insp sisoma
se hace Verificacion de protocolo de bioseguridad de EPPS
inicio enchape de baño del segundo piso

Insp. Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

6 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez - insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muñoz Resid obra Tatiana Bautista insp sisoma
1 oficial y 1 ayudante
se hace protocolo de bioseguridad de EPPS
se termina enchape de baños de niños primer piso y
se inicia enchape de baños de niños en el primer piso

Insp. Sisoma.


Erika Lizeth Gonzalez

7 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muñoz Resid obra Tatiana Bautista insp sisoma
1 oficia y 1 ayudante
se hace verificacion de protocolo de Bioseguridad de EPPS
Seguimos con el enchape de baño de niños primer piso


Insp. Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez


9 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de contratista
Gustavo Muñoz Resid obra Tatiana Bautista insp Sisoma
1 oficial y 1 ayudante
Se hace verificacion de protocolo de bioseguridad de EPPS.
Se inicia el enchape de baño de niños del primer piso
Lentera PB
Insp Sisoma.




Erika Lizeth Gonzalez



10 Noviembre del 2020
Dia nublado
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de contratista
Gustavo Muñoz Resid obra Tatiana Bautista insp Sisoma
1 oficial y 1 ayudante
Se continua con el enchape de baño de niños del primer piso. Se hace verificacion de protocolos de bioseguridad y de EPPS.
Lentera PB



Erika Lizeth Gonzalez



11 Noviembia del 2020
Dia nublado - lluvias en la tarde
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muños Resid obra Tatiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
se hace verificacion de protocolo de Bioseguridad de EPPS
Se inicia enchape de baños de niña del segundo piso

Insp. Sisoma

Erika Liceth Gonzalez

12 Noviembie del 2020
Dia nublado - tarde con lluvia
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muños Resid obra Tatiana Bautista insp sisoma
I oficial y I ayudante
Se hace verificacion del protocolo de Bioseguridad de EPPS
Se continua con el enchape de baño de niños del segundo piso

Insp. Sisoma

Erika Liceth Gonzalez

13 Noviembre del 2020
Dia nublado - tarde con lluvia
inicio de actividad: 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de Contratista
Gustavo Muños Resid obra Tatiana Bautista insp Sisoma
I oficial y I ayudante
se hace Verificacion del protocolo de bioseguridad de EPPs
inicia enchape de baños de niños en el segundo piso

Insp-Sisoma.

Erika Lizeth Gonzalez

14 Noviembre del 2020
Dia nublado - tarde con lluvia
inicio de actividad 10:00
Personal de interventoria
John F Garcia Erika Gonzalez insp interventoria
Personal de contratista
Gustavo Muños Resid obra Tatiana Bautista insp Sisoma
I oficial y I ayudante
se hace verificacion de protocolo de bioseguridad de EPPS
Se continua enchape de baños de niños en el segundo piso.

Insp-Sisoma

Erika Lizeth Gonzalez

17 Noviembre del 2020
Dia nublado - tarde con lluvia
Inicio de actividad 10:00
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Moños, Residente - Tatiana Bautista Resid Inspector SST. 2 oficiales 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Inicia demolición de Pisos Salon 3.
Erika Lucth Gonzalez


Insp. SISOMA.

18 Noviembre del 2020
Dia Nublado - Lluvias en la tarde
Inicio de actividad 10:00 am
Personal Interventoria:
Jhon Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Moños Residente - Tatiana Bautista Inspector SST
2 oficiales, 3 Ayudantes,
Actividades Realizadas:
Inicia Demolicion de Pisos Salon 1
Erika Lucth Gonzalez


19 de Noviembre del 2020
Dia nublado - Lluvias en la tarde
Inicio de actividad 10:00 am


Personal Interventoria:
Jhon f. Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz Residente - Tatiana Bautista Inspector SST
2 oficiales, 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Inicia demolicion de Pisos salon 2.
Erika Lizeth Gonzalez





20 de Noviembre del 2020
Dia Nublado - Lluvia en la tarde
Inicia de actividad: 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon Garcia - Erika Gonzalez Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz, Residente - Tatiana Bautista inspector SST
2 oficiales, 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Inicia Demolicion de Pisos Salon 3.
Erika Lizeth Gonzalez






21 de Noviembre del 2020
Dia Nublado - Lluvia en la tarde
Inicia Actividad: 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon Garcia - Erika Gonzalez - Insp. Interventoria


Personal contratista:
Gustavo Muñoz Residente - Tatiana Bautista Inspector SST
2 Oficiales, 3 Ayudantes
Actividades Realizadas:
Continua demolición de Pisos en el Salon 3, Se evidencian Fisuras sobre la Viga de entrepiso, con cambio de sentido en el centro de la placa, Se deja a consideracion del especialista en estructuras.
Erika Liceth Gonzalez,




Erika Liceth Gonzalez



23 Noviembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales, 3 ayudantes.
Revisados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se recibe arena y se retiran Escombros; Continua demolición de piso en salon 4 y continua con la sala de sistemas, se hace acopio de los residuos en sala de sistemas. volqueta placa AOF 423 Pin 13024 cond. Marco A Rodriguez cc 79676748




Erika Liceth Gonzalez




24 Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria
Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con la demolición de piso en la sala de sistemas, se inicia pintura de estructura de la cubierta; se verifican cursos de alturas para los encargados de la cubierta, 2 cuentan con curso de alturas y uno va a cumplir labores como ayudante por tanto no presenta curso de alturas.
Cristiniano. Salas Tafur - curso de alturas validado.
Calixto. Pimienta Arrieta - curso de alturas validado.
Cristian Arenas Arrieta - Ayudante sin curso de alturas.



Erika Lizeth Gonzalez

25 de Noviembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se inicia afinado de pisos en salones, se continua con pintura de la estructura de la cubierta, se inicia mantenimiento de viga canal longitudinal.



Erika Lizeth Gonzalez


26 de Noviembre de 2020
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Se continua afinado de pisos en salones, llega material para pisos "Dura piso" se termina el mantenimiento de la canaleta longitudinal con manto impermeabilizado y se continua con la pintura de la estructura para la cubierta.



Erika Lizeth Gonzalez


27 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
inicia instalación de pisos en los salones, llega la teja tipo sandwich y platinas para la cubierta, se hace retiro de escombros aperos a la estructura, se hace retiro de escombros, volqueta AEB 118 Pin 1342, Jose Alejandro Ruiz H. cc 80774882.



Erika Lizeth Gonzalez


28 de Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventuria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo y uso de EPPs por parte del prsonal en obra; se hace capacitación al personal sobre orden y aseo en los frentes de trabajo y lugares de acopio; se

Continua con la instalación de pisos en los salones y se inicia soldada de platinas a la estructura existente, se recibe material para mediacañas, granito Nº1. color blanco y Negro y granito Nº 2 color blanco; se fabrican las platinas para tensores.



Erika Lizeth Gonzalez

30 Noviembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de labores. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3oficiales - 5ayudantes
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se reinician actividades en los baños; acabado de mesones y resanes a los enchapes de muro; se continua con la soldadura de platinas en la estructura de la cubierta y de los tensores, se continua con la instalación de pisos en los salones.




Erika Lizeth Gonzalez

1 diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de labores. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad buen uso y manejo de EPPs

Continuan actividades en los baños, se continuan con la soldadura de platinas, pretensores de la estructura de la cubierta, se continua con la instalación de pisos en los salones.

Erika Lizeth Gonzalez

2 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS.
Se continuan actividades en baños "Mesones y enchapes"; se continua con la soldadura de platinas en estructura y para tensores, se continua con la instalación de pisos en los salones, se preparan los espacios para el Rack y sala de docentes de Edu. física para fundir placas aligeradas - 3000 Psi.
dimensiones 2,00 x 3,00 h = 8 cm

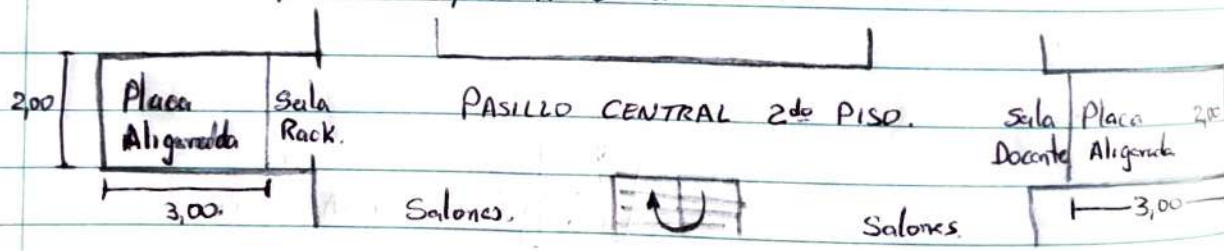


Erika Lizeth Gonzalez

3 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de labores. 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continuan labores en baños, mediacañas en segundo piso; se continuan labores de soldaduras en estructura para cubierta; se continua con la instalación de pisos en los salones, se hacen recortes de remate en salones.

Erika Ureth Gonzalez



4 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de labores. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continuan labores en baños, mediacañas en primer piso; se continuan labores de soldadura en la estructura de la cubierta; se continua con la instalación de pisos en los salones; llega material aislante para la teja tipo sandwich.

Erika Ureth Gonzalez




5 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se.

Continuan mediaciones en los baños; se reinicia pintura a la Estructura de la cubierta y se continuan soldaduras; se continua con pisos de los espacios para Rack y Sala de docentes.

Erika Uzeth Gonzalez



7 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continuan actividades en los baños, se reaben los lavamanos en Acero inoxidable se continua con la adecuación de la estructura para el retiro de cubierta, se instalan los pisos en los espacios laterales y se embaguillan pisos en Salones.





9 de diciembre de 2020.
Dia Sabado.
Inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes
Verificados los protocolos de bioseguridad (lavado de manos, toma de temperatura), buen uso y manejo de EPPs por parte del personal en obra; se continua con aseo de [illegible] en los baños, adecuación de la

Erika Uzeth Gonzalez

Estructura para la cubierta y adecuación de pisos en salones y sala de sistemas.


Erika Lizeth Gonzalez






10 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPS, se continuan actividades de acabados de mesones en los baños del piso 2, se continua con la adecuación de la estructura para la cubierta, se continua con pisos de salones, se reciben bloques para el muro de la sala de sistemas, según diseño aprobado, se definen los puntos electricos y de datos para los salones y la sala de sistemas, se definen materiales para los cielorasos de la sala de sistemas y areas comunes a intervenir "PVC opaco", se definen 1 punto de red de datos para video beam, un punto Electrico Normal y 1 punto regulado.

Erika Lizeth Gonzalez





11 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de labores. 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra Tatiana Bautista - insp. sisoma

3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continua con acabados de muros en el piso 1 "baños"; se acondiciona la estructura y se instalan tensores para la estructura de la cubierta; se continua con los pisos de los salones.

Erika Lizeth Gonzalez






12 de diciembre de 2020.
Dia sabado.
Inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs; se continua con acabados de muros y mediacañas en los baños; se continua con adecuación e instalación de tensores en la estructura de la cubierta, se continua con pisos de los salones.

Erika Lizeth Gonzalez





14 de diciembre de 2020.
Dia sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.

Continua acabados en mesones y mediacañas de los mesones, enchapes de pared, se continua con los pisos de los salones, se inicia cambio de la cubierta de los salones, se hace acopio de los tejas sobrantes en cada salón.

Erika Lizeth Gonzalez

15 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma,
3 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs continuan acabados en Mesones, mediacañas y enchapes de pared, se continua con el cambio de cubierta en el salon Nº4 y continua el salón Nº3, se hace acopio de tejas sobrantes, se continua con los acabados de pisos de los salones, se retiran elementos de la sala de sistemas y se inicia la demolición del piso restante.

Erika Lizeth Gonzalez

16 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoría.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma,
3 oficiales - 5 ayudantes - 1 tecnico electricista.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
Continuan los acabados en mesones, mediacañas y enchapes de muro de los baños,

Se continua con el cambio de cubierta en el salón Nº3 y Area de Escaleras, se continua con el acabado de pisos en los salones y se afina el piso de la sala de sistemas, se inicia replanteo de la red electrica de la cubierta intervenida.
Fredy.
Se retiran escombros volqueta AEB 118 Pin 1342, Jose Alejandro Ruiz H. CC. 80774882.

Erika Lizeth Gonzalez

17 de diciembre de 2020.
Dia soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes, 1 tec. Electricista.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con los acabados de los baños, se continua con la instalación de la cubierta en la zona de Escaleras y se inicia salón Nº2, se continua con los acabados de pisos en los salones, se defina el Nº de luminarias por salon quedando 6 unidades por salon, dos tomas electricas, un punto de red de datos, adicional se define construir un armario de 12 circuitos en la sala de docentes de Educación Fisica en el segundo piso, se define el cambio de las ventanas existentes en los salones 1 y 4, se define el cambio de la ventana en el espacio destinado para el Rack, se define el cambio de las ventanas de los baños del nivel inferior por persianas que faciliten la ventilación de los baños e impidan el acceso visual a estos espacios.

Erika Lizeth Gonzalez

18 de diciembre de 2020.
Día soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, 4 ayudantes 1 tec electricista.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con los acabados de baños, se continua con el cambio de la cubierta en la zona de escaleras y salón Nº2, se continua con los acabados de pisos en los salones y sala de sistemas, se continua con la reconstrucción de la red electrica en los salones y Sala de sistemas

Erika Lizeth Gonzalez

19 de diciembre de 2020.
Día Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez
3 oficiales - 4 ayudantes - 1 tec Electricista.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con los acabados de los baños, acabados de pisos en salones y sala de sistemas, cambio de cubiertas en el salon Nº 2 y se inicia el salón Nº 1, se continua con el replanteo de la red electrica, llegan materiales para el cielo raso (PVC, perfiles, omegas, tornillería, bocales). se hace acopio en el salón Nº1 del primer piso.

Erika Lizeth Gonzalez

21 de diciembre de 2020
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00
personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - residente de obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA
3 oficiales - 4 ayudantes - 1 tec Electricista.
Se continua con acabados en los baños y pisos de los salones, se continua replanteo de la red electrica, se continua con la instalación de la cubierta en el salon N°1, se inicia instalación de Flanches en la cumbrera de la cubierta.

Erika Lizeth Gonzalez

22 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudentes - 1 tec electricista.
Se continua con acabados de baños y pisos en los salones y sala de sistemas, se instala cubierta en salón N° 1 y se inicia la sala de sistemas.


Erika Lizeth Gonzalez

23 de diciembre de 2020.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00


Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales, - 4 ayudantes - 1 tec. Electricista
Se continua con acabados de baños y pisos de los salones, se instala la cubierta de sala de sistemas, se continua con el replanteo de la red electrica del area intervenida en el segundo piso.




Erika Lizeth Gonzalez



24 al 27 de diciembre de 2020.
Se detienen actividades en este frente por fiestas Navideñas.
28 de diciembre de 2020.
Dia Sabado.
inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
3 oficiales - 4 ayudantes - 1 tec. Electricista.
Se continua con acabados en baños y salones del segundo piso, se realiza avance en el replanteo de la red electrica del segundo piso, se inicia proceso de revisión de inconformidades en la cubierta intervenida.




Erika Lizeth Gonzalez



29 de diciembre de 2020.
Dia Sabado.
inicio de labor 10:00.
Personal de interventoria.
John F García - insp. interventoria.
Erika L Gonzalez - insp. interventoria


Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid. obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma
2 oficiales - 2 ayudantes - 2 tec Electricos.
revisados los protocolos de bioseguridad, se recibe material electrico,
se avanza en acabados de salones.



Erika Ureth Gonzalez

30-12-2020 al 04-01-2021.
Se detienen actividades por fiestas de fin de año.


05-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoria.
John Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 1 ayudante - 2 tec electricistas.
revisados los protocolos de seguridad, se continuan actividades en los
salones, se inicia replanteo de la red electrica del segundo piso.



Erika Ureth Gonzalez


06-01-2021.
Dia Sabado.
inicio labor 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 1 ayudante - 2 tec. Electricistas.

Verificados los protocolos de bioseguridad; se reinician actividades en los baños, se continua con acabados de salones y se desmontan redes antiguas de los salones en el segundo piso.



Erika Lizeth Gonzalez

07-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio labor 10:00.
Personal interventoria.
John García, Erika L Gonzalez = insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista. - insp. sisoma.
2 oficiales, 1 ayudante, 2 tec' Electricas.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continuan actividades en baños, acabados en salones y el retiro de redes electricas.
retiro PVC Ø 1½" (sistemas) 32 ML.
retiro PVC Ø ¾" (Aulas) 300 ML.
Desconexión Aula sistemas (P.R) 20 und.
retiro tomas normales e interruptores 25 und.
retro cable acometida tablero regulado 32 ML.
retiro cable Nº 12 aulas 300 ML.
Se hace retiro de tejas sobrantes por personal de reciclaje.



Erika Lizeth Gonzalez

12,-01-2021.
Dia soleado.
inicio labor 10:00
Personal interventoria.
John F Garcia Insp. interventoria.
Erika L Gonzalez. Insp interventoria.

Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 1 ayudante - 2 tec electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad. y llego de una para por orden de la alcaldía desde el día 08 hasta el 11 de enero por bioseguridad se continua con los acabados de los salones, se inicia reconstrucción de la red electrica, se inicia la construcción de ventanas en aluminio en sitio, se paran actividades en baños por falta de materiales.



Erika Lieth Gonzalez

13-01-2021.
Dia Sabado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoría.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales, 1 ayudante, 2 tec electricistas.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se continua con acabados de salones se continua con el montaje de la red electrica, en la tarde llega material para los baños.




Erika Lieth Gonzalez

14-01-2021
Dia Sabado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.


2 oficiales, 1 ayudante, 2 tec electricistas
revisados los protocolos de bioseguridad; se inicia enchape de pisos en los baños, se continua con los acabados de los salones, se continua con el tendido de redes electricas.






Erika Lizeth Gonzalez

15-01-2021.
Dia soleado.
inicio labor 10:00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 1 ayudante - 2 tec Electricistas.
Se verifican protocolos de bioseguridad; se continua con acabado de pisos en los baños, se continua con la acometida de la red electrica del segundo piso, se demuele el muro del fondo en la sala de sistemas y se inicia inmediatamente su construccion, se hace retiro de escombros; volqueta placa JPC 124, Pin: conductor.






Erika Lizeth Gonzalez

18-01-2021.
Dia soleado.
inicio labores 10:00.
Personal interventoria
John F Garcia, Erika Gonzalez - insp interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra.
Tatiana Bautista - insp.

2 oficiales - 1 ayudante - 2 tec Electricos.
Verificado los protocolos de seguridad biometrica; se continua con el cableado del muro y salones; se detiene actividades en los baños ya que el oficial se excusa por enfermedad, se hacen pruebas en la red electrica de los salones; se hace inventario de la red electrica.

instalación cable tab. regulado	3#6 F + 1#6 N + 1#6 T	32 ML
" " acometida	2#8 F + 1#8 N + 1#10 T (Normal)	23,50 ML.
" lampara hermética led	2X18	25 und.
" lampara	60X60 48 w	15 und.
" lampara emergencia, led	2,4 w.	3 und.
" breaker	2X40 Amp enchufable.	1 und.
" "	1X20 Amp "	5 und.
" "	1X20 Amp regulado	2 und.
Identificación y margullaje circuitos		35 und.
distribución circuitos cable # 12		300 ML.
Tomas regulados		6 und.
Tomas datos categoria 6.		6 und.
Tomas Normales con polo		11 und.
interruptos sencillo.		7 und.
Caja de paso 10X10		18 und.
Caja de paso 20X20		5 und.
Salidas para iluminación 2X18 hermetica.		25 und.
Salidas para iluminaci 60X60 led.		15 und.
Salidas para iluminación emergencia		3 und.
Tablero normal 12 circuitos. bifasico		1 und.
instalación emt Ø 2"		9 ML.
" emt Ø 1 1/2"		18 ML.
" emt Ø 1"		36 ML.
" emt Ø 3/4"		45 ML.
" emt Ø 1/2"		192 ML.

Se inicia instalación de cielo rasos en areas seleccionadas.



Erika Lizeth Gonzalez

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE A - ARBORIZADORA BAJA

Contrato Nº COL PCCNTR 1577535
Objeto: adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo.
Contratista: Consorcio RETORNAR
Nit: 901.384.708 - 1.
Contrato Nº COL PCCNTR 1679920 de 2019.
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en los terminos de infraestructura para la prestación del Servicio educativo. Grupo 4.
Interventor: AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S.
Nit: 830.123.577 - 7.
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA.

Fecha de acta de inicio de obra: 01 de Septiembre de 2020.
Personal Interventoría
Ing. Melisa Janez - Residente.
Ing. Erika Gonzalez - Inspector.
C y G A John Fredy García - Inspector.
Supervisor contrato SED.
Ing. Ivan Duarte.
Personal del contratista.
Arq. Gustavo Muñoz - Residente.
Arq. Fernando Delgado - Residente.
Ing. Tatiana Bautista - Inspector SISO.

inicio de obra
Fecha firma acta de inicio: 1 de septiembre de 2020.
Se realizan labores de inspección y estudios para presupuestos de las actividades en las áreas a intervenir.
01-12-2020.
Hora de inicio 10:00.
dia nublado.
Personal interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez -insp. interventoría.
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
Oficial:
Ayudante:
Ayudante: Juan Carlos Baquero.
Actividades a realizar.
Adecuación de zona verde para uso de actividades deportivas, academicas y ludicas para el personal estudiantil en la institución y acceso por la entrada de bachillerato, adecuación de espacio para cafeteria según el alcance del presupuesto.
Avances de la obra.
Se inicia con el cerramiento del area a intervenir y se hace desmonte de sillas existentes en dicha zona, se hace entrega de las respectivas dotaciones y EPPS al personal de obra, asi mismo, se hace capacitación sobre el control y verificación diaria de los protocolos de bioseguridad (forma de temperatura y lavado frecuente de manos), como el buen uso y manejo de EPPS; se realiza reunión con el secretor de la institución para determinar los equipos a instalar así como la disposición de estos en el area a intervenir.

Erika Lizeth Gonzalez

Erika Lizeth Gonzalez


02-12-2020
Hora de inicio. 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia, Erika González - Insp Interventoria.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - Residente de obra. Tatiana Bautista Inspector sisoma
Oficial: Felipe
Ayudante: William
Ayudante: Jean Carlos Baquero
Actividades Realizadas.
Se Culmina el cerramiento perimetral de obra. Se Realiza Descapote y limpieza en la zona de intervencion con minicargador Bobcat.
Se realiza Cargue de Material Común, Volqueta (7m³) Placa AIB118 Pin 1342.
Conductor. Jose Alejandro Baez CC 80774882

Erika Lizeth González

03-12-2020
Hora de inicio. 10:00 Am
Personal Interventoria:
Jhon F. Garcia, Erika González - Insp Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz Residente de obra, Tatianna Bautista - Inspector sisoma
Oficial: Felipe
Ayudante. Jean Carlos Baquero
Ayudante: William
Actividades Realizadas
Aseo y limpieza de la zona de intervencion y replanteo. Excavación de zanja para instalación de bordillos, sardineles y Cunetas.
Erika Lizeth González

04-12-2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Personal de Interventoria:
Jhon F. Garcia, Erika González, Insp. Interventoria
Personal Contratista: Gustavo Muñoz, Residente de obra Tatiana Bautista Inspector sisoma

Oficial: Felipe
Ayudante: Jean Carlos Baquero
Ayudante; William
Actividades Realizadas:
Aseo y limpieza de la zona de intervención, Excavación de zanja para istalación de Sardinel, Bordillos y Cunetas.
Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria




05-12-2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Personal de interventoria:
Jhon F. Garcia - Erika Gonzalez - Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista - Inspector Sisomey
Oficial: Felipe
Ayudante: Jean Carlos Baquero
Ayudante; William
Actividades Realizadas:
Aseo y limpieza de la zona de intervencion. Excavacion de zanja para instalación de Sardinel, Bordillos y Cunetas.
Erika Lizeth Gonzalez
Insp. Interventoria




07-12-2020
Hora de Inicio: 10:00 Am
Personal de Interventoria:
Jhon F Garcia - Erika Gonzalez - Insp. Interventoria
Personal Contratista:
Gustavo Muñoz - Residente; Tatianna Bautista - Inspector SISOMA
Oficial: Felipe
Ayudante: Jean Carlos Baquero
Ayudante; William
Actividades Realizadas:


Aseo y limpieza de la zona de intervención, Excavacion de zanja para instalación de, Sardinel, bordillos y Cunetas.

Erika Lizeth Gonzalez









09/12-2020

Hora de Inicio: 10:00 AM

Personal de interventoria:

Jhon f Garcia, Erika Gonzalez - Insp. Interventoria

Personal Contratista:

Gustavo Muñoz - Residente, Tatiana Bautista Inspector SST

Oficial: Felipe

Ayudante, Jean Carlos Baquero


Ayudante: William


Actividades Realizadas:


Aseo y limpieza de la zona de intervención, Excavación de zanja para instalacion de Sardinel, Bordillos y Cunetas.

Erika Lizeth Gonzalez









10-12-2020.

Dia soleado.

inicio de actividades 10:00

Personal de interventoria

John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

2 oficiales - 5 ayudantes.


Verificados los protocolos de bioseguridad (toma de temperatura y lavado frecuente de manos) y del buen uso y manejo de EPPS por parte del personal en obra, se realiza capacitacion sobre orden y orden en la obra, se continua

excavación de zanjas para bordillos y cunetas, se inicia instalación de cunetas y bordillos en el area peatonal longitudinal posterior luego de la llegada de arena de pozo y de recebo común.



Erika Ureth Gonzalez


11-12-2020
dia Soleado.
inicio de labor 10:00.
personal de interventoria.
John F García, Erika L González - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz. -resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de biosegundad y buen uso y manejo de EPPs se hace inventario de materiales en obra, se encuentran 200 bultos de cemento portland, Sardinel S-80, bordillo B-20-60, cunetas A-120, barras de refuerzo Nº2, Arena, recebo común, una rana, un canguro, trompo de 1 bulto y herramienta menor, se continua la excavación de zanjas para bordillos y cunetas, se continua con la instalación de cunetas y bordillos en el pasillo posterior.



Erika Ureth Gonzalez


12-12-2020.
dia Soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventuría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.

Se continua con excavación de zanjas para bordillos y cunetas, se continua con la instalación de cunetas en el pasillo frontal y delimitadores de areas, se inicia relleno y compactación del corredor longitudinal posterior.



Erika Lizeth Gonzalez


14-12-2020.
Dia soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen manejo y uso de EPPs, se continua con excavación de zanjas para bordillos y cunetas, se continua la instalación de cunetas en el corredor frontal, se retiran jardines en el area destinada para la cafeteria y se replantan en la zona verde adyacente, se hacen reparaciones a tubería de 2" Ø PVCS que se encontraba sin demarcar en la zona del corredor frontal.



Erika Lizeth Gonzalez

15-12-2020.
Dia soleado.
inicio de labores 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con la excavación de zanjas para cunetas, bordillos y sardinales, se instalan bordillos y cunetas de demarcación de las zonas intervenidas,

Se finde el primer tramo del corredor longitudinal posterior, se hace toma de cilindros testigos de la mezcla, se da acabado Escobiado al material.



Erika Lizeth Gonzalez

16-12-2020.

Dia Soleado.

Inicio de actividades 10:00

Personal de interventoria.

John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.


Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

2 oficiales - 5 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad, buen uso y manejo de EPPS

Se continua la excavación de Zanjas y la instalación de bordillos y cunetas de demarcación de areas, se finde el tramo restante del corredor longitudinal/ posterior dando de acabado escobiado.



Erika Lizeth Gonzalez

17-12-2020.

Dia Soleado

Inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoria.

John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.

2 oficiales - 5 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.

Llegan losetas prefabricadas para la plazoleta principal. 40x40 Lisa, Llegan Arena de rio, Grava y recebo común, se continua la excavación de Zanjas y la instalación de bordillos y cunetas de demarcación de areas a intervenir, se inicia el reclenteo final y la nivelación del corredor

peatonal intermedio.



18-12-2020. Erika Liceth Gonzalez

Dia soleado.

inicio de actividades 10:00.

Personal de interventoria.


John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.

Personal del contratista.

Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.


2 oficiales - 5 ayudantes.

Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con la excavación e instalación de bordillos y cunetas para las areas a intervenir, se inicia el relleno y compactación del sendero peatonal intermedio.

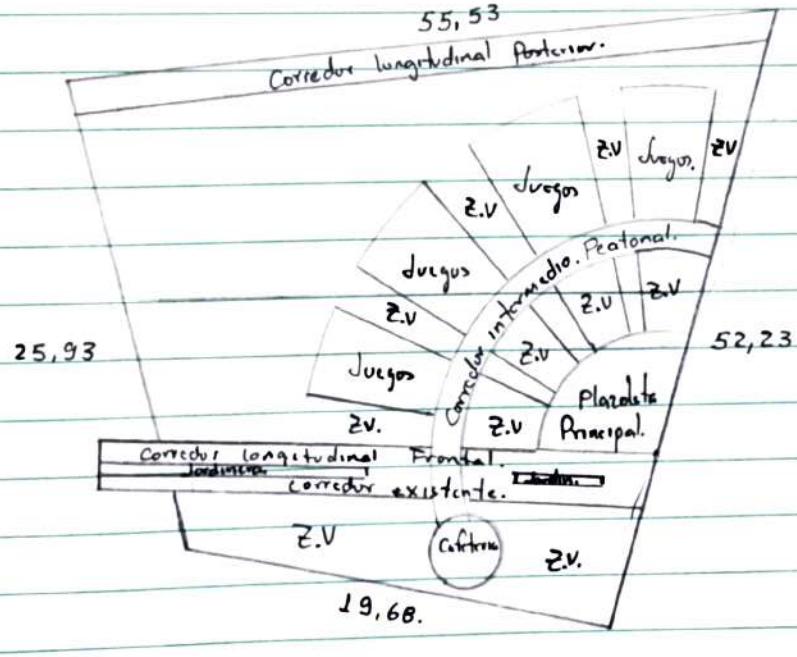


Erika Liceth Gonzalez

19 - 12 - 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00.
personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs. Se continua con la excavación de zanjas para la instalacion de bordillos y cunetas en las areas a intervenir, se adelantan instalaciones, Se continua con el relleno y compactación del sendero peatonal intermedio.



Erika Uzeth Gonzalez

21 - 12 - 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades. 10:00.
Personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs Se continua con la excavación de zanjas para la instalación de bordillos y cunetas, se adelanta la instalación de prefabricados en las areas a intervenir, se funde el corredor peatonal intermedio, dando acabado de escobiado, Se toman muestras de control del concreto, al final del día queda faltando menos de un tercio de la longitud del sendero, 5 mL para continuar el 22 de diciembre, se revisa preparación de juntas frias.




Erika Uzeth Gonzalez

22 - 12 - 2020.
Dia soleado
inicio de actividades 10:00
Personal de interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs, se continua con la excavación de zanjas para la instalación de bordillos y cunetas, se adelanta la instalación de prefabricados en las areas a intervenir, se continua la fundida con concreto escobiado del sendero peatonal intermedio.









Erika Lizeth Gonzalez

23 - 12 - 2020.
Dia soleado.
inicio de actividades 10:00
personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs
Se continua con la excavación de zanjas para la instalación de bordillos y cunetas, se adelanta la instalación de prefabricados y la nivelación de la plazoleta del nivel inferior y plazoleta principal.










Erika Lizeth Gonzalez

24 al 27 de diciembre de 2020.
Se detienen labores en este frente por fiestas Navideñas, se retoma el 28 de diciembre a las

28 de diciembre de 2020.
Día Soleado.
inicio de labores 10:00.
personal de interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad y buen uso y manejo de EPPs.
Se continua con la excavación de zanjas para bordillos y cunetas, se adelanta la instalación de bordillos en areas a intervenir se realiza el relleno y compactación en la plazoleta principal y en la primera zona de Juegos.








29-12-2020.
Erika Lizeth Gonzalez
Día Soleado
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp interventoria
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se funde la placa de piso de la primera plaza de Juegos, se avanza en excavaciones y se hace toma de testigos para laboratorio, se dejan para curado, se continua con excavación y nivelación de plazoletas.




Erika Lizeth Gonzalez




30-12-2020.
Día Soleado.
inicio labor 10:00.

personal interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se adelanta compactación de la segunda placa para juegos y del corredor intermedio.



Erika Lizeth Gonzalez



31 de diciembre de 2020 - 03 de enero de 2020
Se paran actividades en este frente por fiestas de fin de año.

04-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio actividades 10:00.
Personal interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz, - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se funde la placa de juegos Nº2, se continua con excavaciones y nivelaciones.



Erika Lizeth Gonzalez



05-01-2021.
Dia soleado.
Inicio actividades. 10:00.
Personal interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.


Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
2 oficiales - 5 ayudantes
Se adelanta nivelación y compactación para fundida de placa de juegos N°3 se deja armado el acero de refuerzo; se hace ensayo de densidades en la plazoleta N°3 y la plazoleta principal. - GEOCRETO Lab de ingeniería civil - Ing. Ricardo Larrota, se entregan testigos para falla en laboratorio.




Erika Lizeth Gonzalez



06-01-2021
Día soleado.
Inicio actividades 10:00
Personal interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal del contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
2 oficiales - 5 ayudantes
Verificados los protocolos de bioseguridad; se funde la placa de la plaza de juegos N°3, se inicia instalación de loseta en la plazoleta principal, se continua con rellenos y excavaciones para nivelación.




Erika Lizeth Gonzalez




07-01-2021
Día soleado
Inicio labor 10:00.
Personal interventoría.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoría.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. SISOMA.
2 oficiales - 5 ayudantes

Verificados protocolos de bioseguridad, se hace nivelación placa Nº4 de Juegos, se continua con instalación de locetas en la plazoleta principal, se nivela el corredor de acceso al colegio y se hace traslado de jardines en la zona de la cafeteria.



Erika Lizeth Gonzalez

12-01-2021.
Dia soleado.
Inicio actividades 10.00.
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez. - insp. interventoria.
Gustavo Muñoz - resid obra. Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se hace construcción de cajas de 60X60, se funde la placa de juegos Nº4 y se inicia la pradización de zonas verdes.




Erika Lizeth Gonzalez

13-01-2021.
Dia soleado.
Inicio labores
Personal interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal Contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados protocolos de bioseguridad. se hace nivelacion de anden intermedio, se hace la excavación para el anden perimetral de la entrada.




Erika Lizeth Gonzalez

14-01-2021.
Dia soleado.
Inicio labor. 10:00.
Personal interventoria.
John F García - Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal contratista.
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se funde cinta permitral y se adelantan actividades de nivelación en las demas zonas a intervenir.




Erika Ureth Gonzalez



15-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio labores 10:00.
Personal interventoria.
John F García, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se construye plazoleta peatonal por la entrada de bachillerato - instalación de locetas.




Erika Ureth Gonzalez




16-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio de labores 10:00.
Personal interventoria.
John F García - Erika Gonzalez - insp. interventoria.


Personal Contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad; se finaliza plazoleta de entrada puerta de bachillerato, se finaliza corredor lateral y de acceso en locota, se continua con la reparación de zonas verdes, se construyen cajas de paso y mojones de soporte para luminarias del parque; se definen los acometidas de las redes de suministro y desagüe para la cafeteria, así como la red electrica, la de datos que atraviesa la cafeteria y la red electrica de la caseta de vigilancia.




Erika Lucth Gonzalez



19-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.
John F Garcia, Erika L Gonzalez - insp. interventoria.
Personal del contratista
Gustavo Muñoz - resid obra, Tatiana Bautista - insp. sisoma.
2 oficiales - 5 ayudantes.
Verificados los protocolos de bioseguridad, se continua la excavación y nivelación del area de la cafeteria, se continua con la reposición de zonas verdes, se inicia la construcción de las tapas de los cajas de 60X60.



Erika Lucth Gonzalez



20-01-2021.
Dia Soleado.
Inicio de actividades 10:00.
Personal de interventoria.

ANEXO 6
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

- RELACIÓN DE OFICIOS GESTION AMBIENTAL

N° OFICIO	FECHA	CONCEPTO	QUIEN LO EMITE	QUIEN LO RECIBE
Correo electrónico	17 de noviembre de 2020	Información para cargue en aplicativo web SDA	CONSORCIO RETORNAR	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S
Correo electrónico	17 de noviembre de 2020	Aprobación Información para cargue en aplicativo web SDA	AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	CONSORCIO RETORNAR

- VERIFICACION DE PERMISOS O LICENCIAS

La interventoría AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS verifica los permisos de las escombreras en las cuales el contratista realiza la disposición de los RCDs.

- ESCOMBRERA CEMEX
- ESCOMBRERA MAQUINAS AMARILLAS
- ESCOMBRERA SAN ANTONIO

A continuación se presenta el directorio ambiental de sitios de disposición final aprobados por la secretaría distrital de ambiente donde se puede observar que la disposición se está realizando en sitios autorizados como lo exige la ley.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

GRUPO RCD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

DIRECTORIO AMBIENTAL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

No	NOMBRE	MUNICIPIO	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RADICADO OFICIAL (Donde se establece la aprobación)	Fecha de Radicado	Tipo de material autorizado para disponer en el sitio	OBSERVACIÓN
1	PMRRA Central de Mezclas S.A.	BOGOTÁ	Resolución SDA No. 01280 de 2017	SDA	Radicado SDA: 2017EE111539	15/06/2017	En los predios del Registro Minero de Cantera No. 056 de Central de Mezclas S.A. no se desarrollan actividades de extracción, beneficio y transformación de materiales de construcción, no obstante se ejecutaron actividades de disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución 4626 del 3 de junio de 2010.	

DIRECTORIO AMBIENTAL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR LA CAR

1	MAGIR S.A.S. - ESP	Soacha	Vereda Panamá	CAR	Resolución CAR 0680 de 01/04/2016	01/04/2016	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	
2	EL VINCULO	Soacha	KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE	CAR	Resolución 1536 DE 2015 Alcaldía Soacha	2015	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	
3	SOCIEDAD UNICONIC S.A.	Vereda La cuesta Subachoque	Resolución No. 1299 del 21 de agosto de 1997 Modificada por la Resolución 1548 del 16 de septiembre de 1999.	CAR	Radicado SDA No. 2020ER151996	8/09/2020	Autorizado para recibir: Productos de excavación de vías, construcciones y obras civiles, productos de demoliciones que no contengan materiales como hierro, tubos, plásticos, entre otros y material orgánico producto de descapote	No se admite ningún tipo de material que contenga residuos orgánicos, basuras, plásticos, llantas , materiales metálicos, lodos o residuos de procesos industriales
4	AGREGADOS Y RELLENOS TERRENAS.A.S EMPRESADESERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	Mosquera	Resolución CAR No 2051 del 03/08/2017 PMRRA - Vereda Balsillas	CAR	Resolución CAR No 2051 del 03/08/2017 PMRRA	03/08/2017	Escombros, concretos y agregados sueltos de construcción, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, acero, concreto y similares	Tel.: 691 4898

SITIOS APROBADOS PARA ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRICOLAS - APROBADOS POR LA CAR

	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	SOCIEDAD PAISAJO S.A.S.	Mosquera	Vereda San José	CAR	Resolución 2325 de 2015	2015	Suelo orgánico , material de excavación	Tel.: 316 2254
2	PRACTICAS AMBIENTALES S.A.S	Mosquera	La merindad 1 y 2 - Vereda San Jorge	CAR	Resolución 2660 de 21/011/2014	2014	Suelo orgánico , material de excavación	Tel.: 757 9729
3	PRACTICAS AMBIENTALES S.A.S	Madrid	San Diego - Vereda El Corzo	CAR	Resolución 2659 de 21/11/2014	2014	Suelo orgánico , material de excavación	Tel.: 757 9729
4	RAFEL ROMERO	Mosquera	Vereda San José	CAR	Resolución 3976 del 14/12/2016	2016	Suelo orgánico , material de excavación	Cel.: 321 365 3360
5	JAIME WILLIS	Mosquera	Vereda San José	CAR	Resolución 2895 de 29/09/2017	2017	Suelo orgánico , material de excavación	Tel.: 636 4465
6	JAIME MURCIA	Cota	Vereda Pueblo Viejo - Predio La Libertad	CAR	Resolución 2976 del 24/12/2015	2015	Suelo orgánico , material de excavación	Cel.: 311 561 1238
7	TRANSPORTES LAMD	Mosquera	Vereda Balsillas	CAR	Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019	2019	Suelo orgánico , material de excavación	cel: 3212010645
8	INDUSTRIA AGRICOLA Y PECUARIA EL INTERIOR Ltda. INAPIN Ltda	Cota	Km 4.9 Vía Siberia - Cota	CAR	Resolución 0975 del 3 de Abril del 2019	2019	Material de excavación Limos y Arcillas, Tierra negra orgánica	Cel: 320 3394716
9	Sociedad IPSA LIMITADA Nit. 860070922-5	Tenjo	Lote 5 Barro Blanco, ubicado en la vereda El Chacal	CAR	Resolución CAR No. 2851 del 29 de septiembre de 2017	2017		Cel: 318 5937988

SITIOS DISPOSICIÓN FINAL DE RCD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	FUNDACIÓN DIA AZUL FUTURO VERDE	Sibaté	Vereda Chacua	CAR	Registro 001			Cel: 3219949007
2	MINERSA	La Calera	Vereda Aurora Alta	CAR	Registro 002			Tel: 317 4863
3	LAGUNA BLANCA	Bojacá	Vereda Cubia	CAR	Registro 003			Cel: 3138054034
4	SAN JOSE GREEN GROUP S.A.S.	Soacha	Predio ubicado en San José - Piedra Gorda Las Manas, Vereda Panamá	CAR	Registro 004			Cel: 3106665535
5	PREDIO LA ESPERANZA	Ciudad Bolívar	Barrio La Torre - Barrio Tierra Buena 2,5	CAR	Registro 005			Cel: 3102449382
6	CAMPO ALEGRE BAJO	Fusagasugá	Vereda la Venta	CAR	Registro 006			Cel: 3229466027

DIRECTORIO AMBIENTAL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR EL ANLA

	NOMBRE	MUNICIPIO	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RADICADOS ASOCIADOS	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	LAS MANAS -Maquinas Amarillas -	BOGOTÁ	RESOLUCIÓN 1480 DE 2016	ANLA			Disposición final de RCD, EXCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES.	
2	SAN ANTONIO-REX INGENIERIA	BOGOTÁ	RESOLUCION 836 DE JULIO DE 2015	ANLA	RADICADO SDA: 2016ER198164	10/11/2016	Disposición final de RCD, EXCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES.	
3	CEMEX-LA FISCALA	BOGOTÁ	RESOLUCION 1506 DE 28 DE JULIO DE 2006	ANLA			Disposición final de RCD, EXCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES.	
4	CEMEX - TUNJUELO	BOGOTÁ	RESOLUCIÓN 1480 Del 04 de diciembre de 2014	ANLA			Disposición final de RCD, ESCOMBROS, EXCAVACION, Y MATERIALES ESTERILES.	
5	AERONAUTICA CIVIL	CERCA DE LA CABECERA 1.3R PISTA SUR SECTOR	RESOLUCION No. 1000 DE 2013 DE LA ANLA Y RESOLUCION 1886 DE 2015 DE LA CAR	ANLA	RADICADO SDA:2016ER165224 2016ER1 72842, 2016EE137895	23/09/2016	El material a utilizar en la obra de protección (relleno y nivelación) solamente será arcilla procedente de excavaciones profundas la cual será adquirida a terceros y deberá contar con el permiso ambiental correspondiente. NO SE PERMITE LA DISPOSICION DE OTRO TIPO DE MATERIAL.	

DIRECTORIO AMBIENTAL SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL APROBADOS POR ALCALDÍAS MUNICIPALES

1	EL VINCULO	SOACHA. LOTE 2,3 Y 4	Resolución de aprobación Resolución 803 del 10 de Agosto de 2012 Resolución de PRORROGA Resolución 1009 de 2014	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	RADICADO SDA: 2014ER141586, 2015ER88647	22/05/2015	restauración morfológica y construcción banco de suelo Vereda Panamá lotes 2, 3,4 km 2,0 Municipio de Soacha.	

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	C&D GREEN INVESTMENT SAS	CALLE 71 B 75 - 70- Bogotá D.C.	N/A	SDA	RADICADO SDA: 2018EE272676	22/11/2018	Transformación de residuos de instalación de Drywall (placa-yeso).	
2	MAQUINAS AMARILLAS SAS	Avenida Calle 71 Sur No. 12 – 20 (Nomenclatura Actual) o Avenida Boyacá No. 76 – 08 Sur	N/A	SDA	RADICADO SDA: 2019EE100840	03/04/2019	Aprovechamiento y Tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).	
3	AMCON COLOMBIA S.A.S.	CALLE 23 No 116 – 31	N/A	SDA	Informe Técnico 789 de 2020 Rad. 2020IE81051 Radicado SDA 2020EE84482	11/05/2020	tratamiento y aprovechamiento de residuos de origen pétreo (concreto, arcilla, asfalto, piedra, sobrante de mortero), de manera in situ, para transformarlos en (concreto, mortero, relleno, drenante, bases /sub – bases).	

4	Ecoplanet Soluciones AR SAS	Calle 63C No. 113 – 24	N/A	SDA	RADICADO SDA No. 2019EE301364	24/12/2019	Acopio y transformación de Drywall.	
5	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S.	Av Carrera 1 No. 56 - 55 SUR	N/A	SDA	RADICADO SDA No. 2020IE223591	10/12/2020	Residuos de construccion y demolicion petreos, arenas, gravas, gravillas, rocas de excavación, mampostería estructural, no estructural, cerámicas, sobrantes de mezclas de cementos, concretos y mezclas asfálticas	

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR

	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	SECAM JR	BOGOTA	Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	CAR	Registro 001		RCD APROVECHABLES	Cel.: 3002414969
2	DROMOS	MOSQUERA	Kilómetro 3.8 Zona Industrial Balsillas	CAR	Registro 002		RCD APROVECHABLES	Tel.: 742 5376
3	INCOMINERÍA	MOSQUERA	Kilómetro 3.5 Zona Industrial Balsillas (Entrada por Los Puentes)	CAR	Registro 003		RCD APROVECHABLES	Cel.: 322 475 2219
4	CICLOMAT	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.2 vía Siberia - Bogotá entrada Parque Industrial La Florida 600 metros al sur de la calle 80	CAR	RADICADO SDA: 2018ER186266 - RADICADO CAR 09181103501 Registro 004	22/08/2018	RCD APROVECHABLES	Tel.: 487 4315
5	CICLOMAT - CODEOBRAS	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.2 vía Siberia - Bogotá entrada Parque Industrial La Florida 800 metros al sur de la calle 80	CAR	RADICADO SDA: 2018ER186266 - RADICADO CAR 09181103501 Registro 005	22/08/2018	RCD APROVECHABLES	Tel.: 487 4315
6	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	TENJO	Vía Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	CAR	Registro 006		RCD APROVECHABLES	Cel: 3003114712
7	CUNDICOAL	COGUA	Kilometro 7 Vs Ubaté Vereda El Olivo	CAR	Registro 007		RCD APROVECHABLES	Cel.: 311 477 1536
8	UAERMV	BOGOTA	Parque Minero Industrial "El Mochuelo" Kilómetro 3 Vía Pesquilla. Ciudad Bolívar	CAR	Registro 008		RCD APROVECHABLES	Tel.: 747 0909
9	EL VINCULO	SOACHA	Km. 1.4 VIA SOACHA SIBATE	CAR	Registro 009		RCD APROVECHABLES	Tel.: 7251891
10	PUENTE PIEDRA S.A.S.	MADRID	Vereda La Cuesta	CAR	Registro 010		RCD APROVECHABLES	Cel:3187509487
11	TRANSFORMACIÓN NATURAL S.A.S.	MOSQUERA	Vereda Balsillas	CAR	Registro 011		RCD APROVECHABLES	Cel:3187509487
12	CMOP (Centro de Mantenimiento, Operación y Producción) MHC - MARIO HUERTAS COTES	MADRID	Km 12, Vía Bogotá - Medellín	CAR	Registro 012		RCD APROVECHABLES	Cel: 3204903172
13	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S.	COTA	Vereda Siberia, sector La Florida, en la zona agroindustrial	CAR	RADICADO CAR 09162109219 Registro 013		RCD APROVECHABLES	Cel: 3138876569
14	GRANJEROS S.A.S.	MOSQUERA	Vereda Balsillas	CAR	Registro 014		RCD APROVECHABLES	Cel :3203045038
15	RECICLADOS INDUSTRIALES	COTA	Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia	CAR	RADICADO SDA: 2017ER166535 - Registro 015	29/08/2017	RCD APROVECHABLES	Cel: 3102925151
16	ALBORAL S.A.	MOSQUERA	Vereda Balsillas	CAR	Registro 016		RCD APROVECHABLES	Cel: 3153393288
17	CONSORCIO DESARROLLOS ECO-AMBIENTALES	SOACHA	Vereda Panamá	CAR	Registro 017		RCD APROVECHABLES	Tel: 4857683
18	LAMINADOS LAB S.A.S	SOACHA	Carrera 13 No. 13-22 sur - Sector de Santa Ana	CAR	Registro 018		RCD APROVECHABLES	Cel: 3002146821
19	Centro de Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición - CARCD	MOSQUERA	Vereda Balsillas	CAR	Registro 019		RCD APROVECHABLES	Cel: 3124326986 - 3124326992
20	C.C.Q. CONSTRUCCIONES S.A.S.	BOJACA	Vereda Fute	CAR	Registro 020		RCD APROVECHABLES	Cel: 3208483448
21	RECICLADOS INDUSTRIALES	MOSQUERA	Vereda San José	CAR	Registro 021		RCD APROVECHABLES	Cel: 3102925151

22	ASMINCOL	SIBATE	Vereda la Unión	CAR	Registro 022		RCD APROVECHABLES	Cel: 3102886432
23	AGENCIA NACIONAL DE RECUPERACION Y RECICLAJE	MOSQUERA	Vereda Balsillas	CAR	Registro 023		RCD APROVECHABLES	Cel: 3187509487
24	AGREGADOS LA PUNTA S.A.S.	MADRID	Vereda La Punta	CAR	Registro 024		RCD APROVECHABLES	Cel: 3188979849
25	SAN JOSE GREEN GROUP	SOACHA	Predio ubicado en San José - Piedra Gorda Las Manas, Vereda Panamá	CAR	Registro 025		RCD APROVECHABLES	Cel: 3106665535
26	CORESA	BOJACA	Vereda Barro Blanco	CAR	Registro 026		RCD APROVECHABLES	Cel:3134201910
27	COMINERALES SAS	NEMOCÓN	Vereda Patio Bonito	CAR	Registro 027		RCD APROVECHABLES	Cel:3124633503
28	ARENAS HIMALAYA	BOJACA	Predio Santa Bárbara, vereda Santa Barbara	CAR	Registro 028		RCD APROVECHABLES	Cel 3228475920
29	COMTRIRED S.A.S.	ZIPAQUIRA	Carrera 36 No. 84 -87 Barrio la Paz	CAR	Registro 029		RCD APROVECHABLES	Tel: 3007184055
30	SECAM JR EU	SOACHA	Planta en el predio denominado El Tesoro, Lote No. 1, localizado en la vereda Panamá	CAR	Registro 030		RCD APROVECHABLES	CEL:314 4649098
29	Sociedad Renacimiento Mineros San Sebastián SAS, "SOREMISBA S.A.S.	SOACHA	Planta en el predio San Sebastián, en la vereda Panamá. Oficinas Calle 3 Sur No. 69ª – 91 T2 Apto 113	CAR	Registro 031		RCD APROVECHABLES	Cel: 320 4725207

GESTORES PUNTOS LIMPIOS RCD´s EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 MINISTERIO DE AMBIENTE

	NOMBRE	MUNICIPIO	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	PLANTA PRODUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y CULTIVOS DE FRUTAS TIPO EXPORTACIÓN -EXPORHUILA S.A.S	COTA	INTEXZONA LOTE 93. VEREDA SIBERIA	CAR	Registro 001			Cel: 3108583796
2	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	COTA	AUT. MEDELLÍN Km 3.9 BOGOTÁ-SIBERIA	CAR	Registro 002			Tel: 7425410
3	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	TENJO	Vía Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	CAR	Registro 003			Cel: 3003114712
4	CORESA	BOJACÁ	Vereda Barro Blanco	CAR	Registro 004			Cel:3134201910
5	COMINERALES S.A.S.	TUASA	PREDIO LA ROSA VEREDA RASGATA BAJO	CAR	Registro 005			Cel:3124633503

RECUPERADORES ESPECÍFICOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Solo pueden almacenar, acopiar y clasificar el material autorizado, pero no podrán realizar la transformación de los mismos.

Nota: El Recuperador Específico deberá garantizar que los residuos recibidos , potencialmente aprovechables, sean entregados a los CTA´s aprobados por la Autoridad Ambiental Competente.

	NOMBRE	LOCALIZACIÓN	ENTIDAD QUE AUTORIZA	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	AÑO	MATERIALES A DISPONER	CONTACTO
1	RECOLECTOR EL TRIUNFO	Carrera 68 C No. 74 B- 43 Engativá	SDA	RADICADO SDA - 2018ER50154 - 2018EE78872	12/04/2020	La empresa Recolectora El Triunfo realiza dentro de sus actividades realiza recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall- Cable eléctrico.	Tel: 3138030169
2	CHATARRERIA AMBIENTAL FM S.A.S.	Calle 79 No. 69B-35	SDA	RADICADO SDA - 2018EE266302-	15/11/2020	La empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., dentro de sus actividades económicas realiza recolección, transporte almacenamiento y comercialización de residuos aprovechables dentro de los que se puede mencionar: Chatarra y otros metales, aluminio, Cartón, PVC, Madera, Drywall.	Tel:3138030169

3	METALES & VARILLAS A.M S.A.S.	Calle 78 No. 69 B - 60	SDA	RADICADO SDA 2019EE20080	25/01/2019	La empresa Metales y varillas realiza dentro de sus actividades realiza recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall-Icopor	Tel: 3125466526
4	RECICLAJES MARTHA SAS	Carrera 69 K No. 73 A 87	SDA	RADICADO SDA 2019EE56883	2019	Aprobado como Recuperador Especifico de RCD aprovechables: Papel , cartón, plástico, madera y otros (drywall - icopor)	Tel: 5413749
5	RECUPERADORA AMBIENTAL LAS VEGAS	Carrera 69Q No. 78 – 80	SDA	Radicación: 2019EE82550	11/04/2019	Aprobado como Recuperador Especifico de RCD: Papel- Cartón, Plástico, PVC, Drywall , icopor, Madera y Metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 3104868514
6	EXIRECICLABLES MC S.A.S.	Calle 79 No. 68 G – 67	SDA	Informe Técnico No. 01282 del 16 de agosto de 2019, del 16 agosto de 2019 mediante Rad. 2019IE187492 COE: 2019EE192359	23/08/2019	Tipo de material autorizado para disponer: papel- cartón, plástico, PVC, drywall, poliestireno expandido (icopor), madera, vidrio y metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño).	Tel: 9269832
7	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S	Calle 74 Bis Sur No. 87C – 27 (Bogotá)	SDA	Informe Técnico No. 01797, 28 de octubre del 2019 con Rad. 2019IE253080	28/10/2019	Recolección, almacenamiento y comercialización de Residuos aprovechables como lo son: papel cartón, plástico, madera, vidrio y metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño)	Tel: 3115344854
8	Papeles el Norte	Carrera 51 No. 128 – 47 (Bogotá)	SDA	Informe Técnico: SDA No. 2019IE277977	29/11/2019	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, Madera, Metales, Otros como Drywall	Tel: 3881231
9	Ecoplanet Soluciones AR SAS	Calle 63C No. 113 – 24	SDA	Informe Técnico de Aprobación 2020EI47033 Proceso 4691953 Rad SDA No. 2019EE301364	16/01/2020	Recolección, acopio de materiales aprovechables Madera, plástico, metálicos y otros: icopor y drywall.	Tel: 3108852812
10	BIORECICLAJE CASALLAS & S.A.S.	Calle 77 No. 69 K 51	SDA	Informe Técnico de Aprobación: No. 0953 Radicado informe: 2020IE104666	25/06/2020	Se permite la recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como: Papel, Cartón, Plástico, Madera, Metales, Otros como PVC, Drywall- Icopor	Tel: 3108810805
11	ECO Environment de Colombia S.A.S.	Av. carrera 72 No. 39C 09 sur	SDA	Informe Técnico: SDA No.2020IE56195 COE: 2020EE56234	11/03/2020	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: papel, cartón, plástico, vidrio, madera, metales.	Tenga en cuenta que el certificado solo será valido con la firma del representante legal: Eduardo Andrés Pedraza Segura Tel: 3115847164
12	C&L SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.	Calle 12 A No 83 09	SDA	Informe Técnico No. 00841 SDA No.2020IE85600 Rad de aprobación: 2020EE87632	26/05/2020	Recolección, acopio y comercialización de residuos aprovechables como lo son: Papel- Cartón, Plástico, madera, Metales, Otros como PVC- Drywall	Tel: 7027172
13	GESTIONES AMBIENTALES CASTAÑEDA S.A.S.	Carrera 69P No. 73 – 46	SDA	Rad. de aprobación: 2020EE240766 Informe técnico: No. 01682 (2020IE211001)	30/12/2020	Material autorizado para recepcionar: papel, plástico, PVC, chatarra y drywall.	Cel 313 6408520
14	Chatarrería Ambiental La Esmeralda	Carrera 72 A No. 70 - 55 (Bogotá)	SDA	Informe Técnico No. 02696 - 2019IE301932 Rad de aprobación: 2019EE303076	27/12/2019	Recolección, acopio y comercialización de los residuos de metales (acero, hierro, cobre, aluminio, zinc, estaño) potencialmente aprovechables	Tel: 3107580302

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

El contratista CONSORCIO RETORNAR almacena los materiales de acuerdo con lo establecido en el PMA

			
FECHA	14/01/2021	**FECHA**	14/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE**	
			
FECHA	13/01/2021	**FECHA**	14/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B**	

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

El contratista CONSORCIO RETORNAR después de cada intervención realiza disposición de los residuos sólidos convencionales en los puntos ecológicos de cada colegio.

	
FECHA 17/12/2020	**FECHA** 04/01/2021
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B**
	
FECHA 17/12/2020	**FECHA** 14/01/2021
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B**

MANEJO DE RCD

Se cuenta con el PIN asignado por la SED PIN 18896 para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).

			
FECHA	17/12/2020	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE**	
			
FECHA	04/01/2021	**FECHA**	13/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MICKEY - SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B**	

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

El contratista CONSORCIO RETORNAR realiza almacenamiento temporal de esta clase de residuos hasta que se complete una cantidad mínima de 20kg para realizar disposición con empresa autorizada, de acuerdo como se estableció en el PMA. El contratista Consorcio Retornar ha seleccionado a la empresa Planeta verde para realizar la disposición de sus residuos peligrosos

			
FECHA	17/12/2020	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A**	

			
FECHA	14/01/2021	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A**	

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se realiza almacenamiento seguro de las sustancias químicas que se usan en los frentes de trabajo. Se mantiene disponible la hoja de datos de seguridad de cada sustancia para la libre consulta .

1. Alcohol al 70%
2. Gel antibacterial
3. Pintura bituminosa de aluminio
4. Cemento argos
5. Adhesivo cerámico topex
6. Anticorrosivo Pintuland
7. Soldamax Pavco
8. Limpiador de tubería Pavco
9. ACPM

			
FECHA	23/12/2020	**FECHA**	23/12/2020
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A**	

			
FECHA	23/11/2020	**FECHA**	23/12/2020
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A**	

ORDEN Y ASEO

Se identifica un salón dentro de cada colegio en el cual se realiza almacenamiento temporal de materiales , se mantiene aseado y ordenado

			
FECHA	14/01/2021	**FECHA**	05/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B**	
			
FECHA	12/01/2020	**FECHA**	13/01/2020
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B**	

	DOCUMENTO:	CODIGO:
Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** _INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE A - ARBORIZADORA BAJA

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA

ANEXO 7
COMPONENTE GESTION SST

SEGURIDAD SOCIAL

La interventoría realiza verificación de seguridad social del personal del contratista mediante muestreo aleatorio de acuerdo con listado semanal.
La interventoría verifica el pago de la seguridad social del personal de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

INTERVENTORIA PERSONAL AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S						
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**ARL**	**DEDICACIÓN**	**EPS**	**AFP**
NICK RANDY ALMEIDA	72.005.623	DIRECTOR DE OBRA		50%		
MELIZA JANEZ GOMEZ PALCIOS	1.077.425.387	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SEGUROS BOLIVAR	100%	COMPENSAR	COLPENSIONES
DIEGO ARMANDO MONTOYA MEDINA	7..184.220	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	COLFONDOS
RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ	75.091.899	ESPECILISTA EN REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS	SEGUROS BOLIVAR	5%	FAMISANAR	PROTECCION
EHIDA JULIET RAMIREZ GüINA	1.118.537.436	ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS	SEGUROS BOLIVAR	5%	COMPENSAR	PORVENIR
LUZ STELLA PINEDA BUSTOS	1.026.260.474	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	PROTECCION
OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	79.049.924	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	SEGUROS BOLIVAR	5%	FAMISANAR	COLPENSIONES
DAVID FRANCISCO PALACIOS TORRES	11.810.445	ESPECIALISTA EN PLANES DE MANEJO AMBIENTAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	SURA	COLFONDOS
PABLO FELIPE ESTRADA DUQUE	3.229.397	PATOLOGO ESTRUCTURAL	SEGUROS BOLIVAR	5%	NUEVA EPS	COLPENSIONES
JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA	13.460.203	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	SEGUROS BOLIVAR	5%	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
LILIANA ANDREA ROSARIO RUBIO	52.810.605	ABOGADO	SEGUROS BOLIVAR	5%	SANITAS	COLPENSIONES

ERIKA LIZETH GONZALEZ CALDERON	1.023.902.943	INSPECTOR N°1	SEGUROS BOLIVAR	100%	FAMISANAR	PROTECCION
JOHN FREDY GARCIA CAMPOS	79.641.482	INSPECTOR N°2	SEGUROS BOLIVAR	100%	COMPENSAR	COLPENSIONES

A continuación se relacionan las planillas de seguridad social y la planilla de ARL del personal de obra de Interventoría. Las planillas del personal de contratista de obra se relaciona en el informe mensual de contratista.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2021-01-05, 12:04:27 p. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 1033899560

Periodo Cotización: 202011 **Periodo Servicio:** 202011

PAGADA 2020-12-18 15:09:06.0

Se certifica que en la fecha 18/12/2020, la empresa LUZ STELLA PINEDA BUSTOS, con documento de identificación CC1026260474, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PINEDA BUSTOS LUZ STELLA, con CC 1026260474, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION (ING + PROTECCION)
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Identificación	1077425387	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	3116397504
Razón Social	MELIZA JANEZ GOMEZ PALACIOS	Dirección	calle 64c #113c-45	Fecha Pago	28/12/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Noviembre-20
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	47667917	Periodo Pensión	Noviembre -20
Total a Pagar	$346,500	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	$1,200,000	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0		$192,000
Totales				$1,200,000	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0		$192,000

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	$1,200,000	$150,000	$0	$0		$0		$0		150000	$150,000
Totales				$1,200,000	$150,000	$0	$0		$0		$0		$150,000	$150,000

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	1	$848,879	$4,500	$0				4500	$4,500

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	1	$0	$0	$0	0	$0

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

PASENA

	SENA	899999034	1	$0	$0	$0	0	$0
Totales				$0	$0	$0	$0	$0

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1023902943 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	140.500	0	140.500
Período salud:	2020-11	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	109.800	0	109.800
Planilla Nro.:	19398607 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2020-12-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	831090587	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 250.300

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	C.C.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79641482
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDY GARCIA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRV 30 # 58C- 82 SUR	TELÉFONO:	7185156
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7772625341**		TIPO DE PLANILLA:			I - INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		827550881	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										**$ 140.500**	**$ 0**	**$ 140.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
SUBTOTALES:													**$ 109.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 109.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES:					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79641482	GARCIA CAMPOS JOHN FREDY	INDEPEN		$ 877.803	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800					$ 0				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830123577	7	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 71a No 52a 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2109456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	15024416	9415024416	E	2021/01/21	2021/01/14	BANCO AV VILLAS	0	$940,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$3,527,820	$564,600			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$23,100		$0	$0		$940,700
Centro de Trabajo: OFICINAR1 (3 Afiliados)																							$3,527,820	$564,600			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$23,100		$0	$0		$940,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,527,820	$564,600			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$23,100		$0	$0		$940,700
1	CC	1073510410	LOPEZ DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPSC22	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$215,500
2	CC	1030570367	RIVERA DIANA																			0	$0	$0	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF22	30	$877,803	$35,200	14-7	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$75,000
3	CC	80228570	ROSARIO CAMILO																		230301	30	$2,650,017	$424,100	EPS017	30	$2,650,017	$106,100	CCF22	30	$2,650,017	$106,100	14-7	30	$2,650,017	$13,900	30	$0	$0	Si	$650,200
Total	**Afiliados(3)**																						$3,527,820	$564,600			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$176,500			$4,405,623	$23,100		$0	$0		$940,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830123577	7	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 71a No 52a 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2109456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	15024416	9415024416	E	2021/01/21	2021/01/14	BANCO AV VILLAS	0	$940,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$564,600	$0	$0	$564,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$564,600	$0	$0	$564,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$23,100	$0	$0	$23,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$23,100	$0	$0	$23,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$176,500	$0	$0	$176,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$176,500	$0	$0	$176,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$176,500	$0	$0	$176,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$106,100	$0	$0	$106,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				**3**	**$940,700**	**$0**	**$0**	**$940,700**

CAPACITACION

De acuerdo con el cronograma de capacitación de AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS se ejecutaron las siguientes capacitaciones durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021.

- Prevención de enfermedades intestinales
- Peligros mecánicos - Manejo de herramientas manuales

	CRONOGRAMA CHARLAS EN OBRA	SG-SST 09 - 1 V 02
		Creado: 16 - 06 - 2020

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

TEMA	RESPONSABLE	DOCUMENTO A VERIFICAR	RECURSOS			SEMANAL										
						DIC		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY	
			H	F	T	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
DESCRIPCION CAPACITACIÓN																	
Seguridad vial - prevención de accidentes	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X	1	1										
Calentamiento global	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X	1	1										
Investigación de accidentes	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X	1	1										
Prevención de enfermedades intestinales	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X			1	1								
Peligros mecánicos - Manejo de herramientas manuales	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X			1	1								
Recursos renovables y no renovables	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X			1									
Beneficios de EPS, ARL, AFP, Cajas de compensación Familiar	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X					1							
Separación de residuos y reciclaje	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X					1							
Hojas de datos de seguridad de las sustancias quimicas	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X					1							
Identificación de peligros y riesgos de la actividad	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X							1					
Agua potable en Colombia	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X							1					
Trabajo en equipo	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X									1			
Gestión de los RCD generados durante el proyecto	Profesional SST	Registro asistencia, registro fotografico	X	X	X									1			

	MES	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	136	3	3	3	2	2	3
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	14	3	2	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	10%	100%	67%	0%	0%	0%	0%




- Por su parte el contratista de obra CONSORCIO RETORNAR realiza las capacitaciones a su personal de acuerdo con el cronograma de capacitaciones del SG-SST y sus soportes son entregados en el informe mensual de contratista previa revisión de esta interventoría.

A continuación se presenta el listado de asistencia a capacitaciones de la interventoría:

	REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES	SG-SST – 11 V02
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	4/01/2021	**LUGAR:**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	STELLA PINEDA	**DOCUMENTO ID**	1.026.260.474

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación		Peligros mecánicos - Manejo de herramientas manuales
Capacitación		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA	HH
1	MELIZA JANEZ	80018145	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
2	ERIKA GONZALEZ	1023902943	INSPECTOR		
3	JOHN GARCIA GARCIA	79641482	INSPECTOR		
4	STELLA PINEDA	1026260474	INSPECTOR SST		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Ingeniería & Proyectos	**REGISTRO DE ASISTENCIA REUNIONES Y CAPACITACIONES**	SG-SST – 11 V02 Creado: 28 - 04 - 2017 Act: 04 - 04 - 2019

FECHA:	14/01/2021	**LUGAR:**	
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	STELLA PINEDA	**DOCUMENTO ID**	1.026.260.474

ACTIVIDAD REALIZADA		**TEMAS TRATADOS**
Capacitación		Prevención de enfermedades intestinales
Capacitación		

N°	**NOMBRE Y APELLIDO**	**ID**	**CARGO**	**FIRMA**	**HH**
1	MELIZA JANEZ	80018145	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
2	ERIKA GONZALEZ	1023902943	INSPECTOR		
3	JOHN GARCIA GARCIA	79641482	INSPECTOR		
4	STELLA PINEDA	1026260474	INSPECTOR SST		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SEÑALIZACIÓN

Se realiza señalización en las áreas de acopio de materiales y acopio de escombros, sobre la señalización del plan de emergencias el contratista utiliza las áreas de circulación señalizadas por el colegio y no es viable la instalación de señalización adicional a la ya instalada.

			
FECHA	17/12/2020	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Acopio INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B		Acopio INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES	

	
FECHA 17/12/2020	**FECHA** 04/01/2021
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**
Señalización INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B	Señalización INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

	
FECHA 17/12/2020	**FECHA** 04/01/2021
OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES**
Señalización emergencias INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B	Señalización emergncias INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La interventoría en sus vistas a obra realiza inspección a la entrega y uso de EPP del contratista de obra

			
FECHA	28/12/2020	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Uso de EPP		**Uso de EPP**	

			
FECHA	29/12/2020	**FECHA**	04/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Uso de EPP		**Uso de EPP**	

			
FECHA	29/12/2020	**FECHA**	17/12/2020
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
Uso de EPP		**Uso de EPP**	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	**ERIKA GONZALEZ**			**CEDULA No.**	**1.023.902.943**
FECHA:	**4/01/2020**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**		**FECHA INGRESO:**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X				TAPABOCAS	4	Erika Liceth Gonzalez
2		X				ALCHOHOL AL 70%	500 ml	Erika Liceth Gonzalez
3		X				GEL ANTIBACTERIAL	500 ml	Erika Liceth Gonzalez
4								
5								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	Erika Liceth Gonzalez

CEDULA No: 1.023.902.943


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	**JOHN GARCIA GARCIA**			**CEDULA No.**	**79.641.482**
FECHA:	**4/01/2020**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**		**FECHA INGRESO:**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X				TAPABOCAS	4	
2		X				ALCHOHOL AL 70%	500 ml	
3		X				GEL ANTIBACTERIAL	500 ml	
4								
5								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

CEDULA No: 79.641.482

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	**MELIZA JANEZ GOMEZ**			**CEDULA No.**	**80.018.145**
FECHA:	**4/01/2020**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**		**FECHA INGRESO:**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X				TAPABOCAS	4	
2		X				ALCHOHOL AL 70%	500 ml	
3		X				GEL ANTIBACTERIAL	500 ml	
4								
5								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

CEDULA No: 80018145




SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION (ROPA DE TRABAJO)

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	**STELLA PINEDA**			**CEDULA No.**	**1.026.260.474**
FECHA:	**4/01/2020**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**		**FECHA INGRESO:**

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	INGRESO	PERIODICOS	DETERIORO	PERDIDA	FECHA	DESCRIPCION EPP	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
1		X				TAPABOCAS	4	
2		X				ALCHOHOL AL 70%	500 ml	
3		X				GEL ANTIBACTERIAL	500 ml	
4								
5								

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento SSGT como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la IM GRAG SAS.

El presente compromiso aplica para Dotacion y EPP (Ropa de trabajo) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:	

CEDULA No: 1.026.260.474

Ingeniería & Proyectos	**INSPECCION DE EPP**	Versión. 005 codigo F-SST- 05 Fecha. 06-02-2018

Fecha: 14/01/2021 Contratista: CONSORCIO RETORNAR - CONTRATISTA DE OBRA

Elementos de protección personal		Casco de seguridad	Bota de seguridad	Bota caucho, punta de acero	Impermeable caucho	Guante carnaza	Guante vaqueta	Guante Nitrilo	Guante de caucho	Guante soldador	Protect Audt insercion	Protector auditivo copa	gafas de seguridad	gafas oxicorte	Careta de soldar	Mascarilla media Cara	Mascarilla para PM 100	Peto soldador	Mangas de carnaza			**FIRMA**
Nombre trabajador	Cargo																					
Luis Páez		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Justiniano Salas		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jaime Alberto Herrera		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Héctor Hernando Gama		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Calixto Arrieta		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
William Santamaría		B	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Juan Carlos Baquero		B	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
William Fernández		B	B	B	N/A	B	B	B	R	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Luis Felipe Roncancio		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Hugo Roa		B	B	B	N/A	R	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Carlos Roa		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jose oliverio Hernández		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Héctor zambrano		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jacinto Rodríguez		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Brayan Medina		B	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria

CONVENCIONES	
Buen estado	B
Para Cambio	R
No aplica al Cargo	N/A

Responsable de la Inspección

Ingeniería & Proyectos	**INSPECCION DE EPP**	Versión. 005 codigo F-SST- 05 Fecha. 06-02-2018

Fecha: 04/01/2021 Contratista: CONSORCIO RETORNAR - CONTRATISTA DE OBRA

Elementos de protección personal		Casco de seguridad	Bota de seguridad	Bota caucho, punta de acero	Impermeable caucho	Guante carnaza	Guante vaqueta	Guante Nitrilo	Guante de caucho	Guante soldador	Protect Audt insercion	Protector auditivo copa	gafas de seguridad	gafas oxicorte	Careta de soldar	Mascarilla media Cara	Mascarilla para PM 100	Peto soldador	Mangas de carnaza			**FIRMA**
Nombre trabajador	Cargo																					
Luis Páez		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Justiniano Salas		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jaime Alberto Herrera		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Héctor Hernando Gama		B	B	B	N/A	B	R	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Calixto Arrieta		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
William Santamaría		B	B	B	N/A	B	B	B	R	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Juan Carlos Baquero		B	B	B	N/A	B	R	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
William Fernández		B	B	B	N/A	B	B	B	R	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Luis Felipe Roncancio		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Hugo Roa		B	B	B	N/A	R	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Carlos Roa		B	B	B	N/A	B	B	B	R	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jose oliverio Hernández		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Héctor zambrano		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Jacinto Rodríguez		B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria
Brayan Medina		B	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	B	B	B	B	B			Información recolectada sin firma por emergencia sanitaria

CONVENCIONES	
Buen estado	B
Para Cambio	R
No aplica al Cargo	N/A

Responsable de la Inspección

Ingeniería & Proyectos	**LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	SG-SST – 25 - 5 V01
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act:

Fecha: 04 - 01 - 2021	**Cliente o empresa: CONSORCIO RETORNAR**
Lugar de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Actividad realizada: DEMOLICIÓN CIELO RASO**
Ubicación donde se realiza la actividad: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Hora de Inicio: 10:00 AM**
Nombre del responsable: CRISTINIANO SALAS TAFUR	**Hora de finalización: 4:00 PM**

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_____3____mts.

ANALISIS DE LA TAREA				
ITEMS	**DESCRIPCION**	**Si**	**No**	**N/A**
	PLANEACION DE LA LABOR			
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.		X	
2	Se cuenta con permiso de trabajo, firmado y aprobado	X		
3	Se cuenta con analisis de peligros y riesgos (AST)	X		
4	Se realizó inspección pre operacional de equipos y herramientas a utilizar	X		
5	El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.	X		
6	Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.	X		
	AREA DE TRABAJO			
7	El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.	X		
8	Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
	VERIFICACION DE EPP			
9	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	X		
10	Guantes	X		
11	Botas de seguridad	X		
12	Gafas de seguridad	X		
13	Protección auditiva	X		
14	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.	X		
15	Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.	X		
	VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
16	Se cuenta con certificados de arnéses	X		
17	Se cuenta con certificados de eslingas	X		
18	Se cuenta con certificados de andamios			X
19	Se cuenta con certificados de escaleras			X
20	Se cuenta con certificados de cuerdas tie off.			X
21	Se cuenta con registro de mantenimiento de los equipos de protección contra caidas		X	
22	Los equipos de protección contra caidas cuentan con la revisión anual			X
	VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES			
23	Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.			X
24	Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).			X
25	Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.			X
	PLAN DE RESCATE			
26	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	X		
27	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua por personal SISO		X	

Nombre y Cedula de la persona que realiza la inspección	**Nombre y Cedula de la persona que ejecuta el trabajo**
Luz Stella Pineda Bustos	Cristiano Salas Tafur
N° Cedula	**N° Cedula**
1,026,260,474	7.952.764

Ingeniería & Proyectos	**LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	SG-SST – 25 - 5 V01
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act:

Fecha: 14 - 01 - 2021	**Cliente o empresa: CONSORCIO RETORNAR**
Lugar de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Actividad realizada: DEMOLICIÓN CIELO RASO**
Ubicación donde se realiza la actividad: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Hora de Inicio: 10:00 AM**
Nombre del responsable: CRISTINIANO SALAS TAFUR	**Hora de finalización: 4:00 PM**

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_____3____mts.

ANALISIS DE LA TAREA				
ITEMS	**DESCRIPCION**	**Si**	**No**	**N/A**
	PLANEACION DE LA LABOR			
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.		X	
2	Se cuenta con permiso de trabajo, firmado y aprobado	X		
3	Se cuenta con analisis de peligros y riesgos (AST)	X		
4	Se realizó inspección pre operacional de equipos y herramientas a utilizar	X		
5	El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.	X		
6	Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.	X		
	AREA DE TRABAJO			
7	El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.	X		
8	Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
	VERIFICACION DE EPP			
9	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	X		
10	Guantes	X		
11	Botas de seguridad	X		
12	Gafas de seguridad	X		
13	Protección auditiva	X		
14	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.	X		
15	Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.	X		
	VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
16	Se cuenta con certificados de arnéses	X		
17	Se cuenta con certificados de eslingas	X		
18	Se cuenta con certificados de andamios			X
19	Se cuenta con certificados de escaleras			X
20	Se cuenta con certificados de cuerdas tie off.			X
21	Se cuenta con registro de mantenimiento de los equipos de protección contra caidas		X	
22	Los equipos de protección contra caidas cuentan con la revisión anual			X
	VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES			
23	Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.			X
24	Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).			X
25	Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.			X
	PLAN DE RESCATE			
26	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	X		
27	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua por personal SISO		X	

Nombre y Cedula de la persona que realiza la inspección	**Nombre y Cedula de la persona que ejecuta el trabajo**
Luz Stella Pineda Bustos	Cristiano Salas Tafur
N° Cedula	**N° Cedula**
1,026,260,474	7.952.764

Ingeniería & Proyectos	**LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	SG-SST – 25 - 5 V01
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act:

Fecha: 14 - 01 - 2021	**Cliente o empresa: CONSORCIO RETORNAR**
Lugar de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Actividad realizada: DEMOLICIÓN CIELO RASO**
Ubicación donde se realiza la actividad: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Hora de Inicio: 10:00 AM**
Nombre del responsable: CALIXTO PIMIENTA ARRIETA	**Hora de finalización: 4:00 PM**

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_____3____mts.

ANALISIS DE LA TAREA				
ITEMS	**DESCRIPCION**	**Si**	**No**	**N/A**
	PLANEACION DE LA LABOR			
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.		X	
2	Se cuenta con permiso de trabajo, firmado y aprobado	X		
3	Se cuenta con analisis de peligros y riesgos (AST)	X		
4	Se realizó inspección pre operacional de equipos y herramientas a utilizar	X		
5	El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.	X		
6	Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.	X		
	AREA DE TRABAJO			
7	El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.	X		
8	Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
	VERIFICACION DE EPP			
9	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	X		
10	Guantes	X		
11	Botas de seguridad	X		
12	Gafas de seguridad	X		
13	Protección auditiva	X		
14	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.	X		
15	Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.	X		
	VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
16	Se cuenta con certificados de arnéses	X		
17	Se cuenta con certificados de eslingas	X		
18	Se cuenta con certificados de andamios			X
19	Se cuenta con certificados de escaleras			X
20	Se cuenta con certificados de cuerdas tie off.			X
21	Se cuenta con registro de mantenimiento de los equipos de protección contra caidas		X	
22	Los equipos de protección contra caidas cuentan con la revisión anual			X
	VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES			
23	Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.			X
24	Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).			X
25	Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.			X
	PLAN DE RESCATE			
26	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	X		
27	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua por personal SISO		X	

Nombre y Cedula de la persona que realiza la inspección	**Nombre y Cedula de la persona que ejecuta el trabajo**
Luz Stella Pineda Bustos	**CALIXTO PIMIENTA ARRIETA**
N° Cedula	**N° Cedula**
1,026,260,474	88310290

Ingeniería & Proyectos	**LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA**	SG-SST – 25 - 5 V01
		Creado: 28 - 04 - 2017
		Act:

Fecha: 04 - 01 - 2021	**Cliente o empresa: CONSORCIO RETORNAR**
Lugar de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Actividad realizada: DEMOLICIÓN CIELO RASO**
Ubicación donde se realiza la actividad: INSTITUCION EDUCATIVA VARGAS VILA	**Hora de Inicio: 10:00 AM**
Nombre del responsable: CALIXTO PIMIENTA ARRIETA	**Hora de finalización: 4:00 PM**

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_____3____mts.

ANALISIS DE LA TAREA				
ITEMS	**DESCRIPCION**	**Si**	**No**	**N/A**
	PLANEACION DE LA LABOR			
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.		X	
2	Se cuenta con permiso de trabajo, firmado y aprobado	X		
3	Se cuenta con analisis de peligros y riesgos (AST)	X		
4	Se realizó inspección pre operacional de equipos y herramientas a utilizar	X		
5	El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.	X		
6	Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.	X		
	AREA DE TRABAJO			
7	El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.	X		
8	Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.	X		
	VERIFICACION DE EPP			
9	Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo	X		
10	Guantes	X		
11	Botas de seguridad	X		
12	Gafas de seguridad	X		
13	Protección auditiva	X		
14	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.	X		
15	Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.	X		
	VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
16	Se cuenta con certificados de arnéses	X		
17	Se cuenta con certificados de eslingas	X		
18	Se cuenta con certificados de andamios			X
19	Se cuenta con certificados de escaleras			X
20	Se cuenta con certificados de cuerdas tie off.			X
21	Se cuenta con registro de mantenimiento de los equipos de protección contra caidas		X	
22	Los equipos de protección contra caidas cuentan con la revisión anual			X
	VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES			
23	Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.			X
24	Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).			X
25	Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.			X
	PLAN DE RESCATE			
26	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	X		
27	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua por personal SISO		X	

Nombre y Cedula de la persona que realiza la inspección	**Nombre y Cedula de la persona que ejecuta el trabajo**
Luz Stella Pineda Bustos	**CALIXTO PIMIENTA ARRIETA**
N° Cedula	**N° Cedula**
1,026,260,474	88310290



ÁNSAR

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

LICENCIA EN S.O. RES. 6450 DE 2018

N° Certificado

TA-RE-93596556

En cumplimiento de las resoluciónes 1409 del 2012 y 1178 de 2017 del Ministerio de Trabajo

Certifica la capacitación y entrenamiento de:

CRISTINIANO SALAS TAFUR

Con número de identificación 7952764

Asistió y aprobó curso de formación en:

REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO

Con duración de 20 horas

Realizado en Bogotá, los días 05 y 06 del mes de agosto del año 2020.

Se expide el día 06 de agosto del 2020 en la ciudad de Bogotá.

ENTRENADOR

ROGER DOUGLAS POLO LUGO

Licencia S.O. Res. 5443 del 2010

CERTIFICADOS EN LA NORMA NTC 6072 POR EL ICONTEC CS-CER614515

APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO 08SE2018220000000028172

DELEGADO

LINA MARIA FERNANDEZ

ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURAS S.A.S

Este certificado sólo es válido si cuenta con las marquillas de seguridad y su autenticidad puede ser verificada en la pagina web: www.ansarcursosdealturas.com

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

La interventoría evidencia el cumplimiento por parte del contratista frente a la documentación de los vehículos e idoneidad de quien los opera.
Durante las visitas de inspección se han identificado los vehículos relacionados a continuación:

- Volqueta JPC124
- Volqueta OXD800

			
FECHA	13/01/2021	FECHA	04/01/2021
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
			
FECHA	04/01/2021	FECHA	04/01/2021
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012014627

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JPC124	CHEVROLET	C 70 149	1988

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.500	BLANCO DE SEVRES	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
08G0714017	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM809211	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PERDOMO CORREDOR MARIA VICTORIA	C.C. 20514688


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
******
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
I/E
I
FECHA IMPORT.
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRÍCULA
20/12/1988
FECHA EXP. LIC. TTO.
27/06/2016
FECHA VENCIMIENTO
******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE HONDA
LT01006718583

SOAT

SEGURO DEL ESTADO

NIT 860 009 578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00: HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2020-02-12	2020-02-13	2021-02-12

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE VATIOS	MODELO
13636600147480	JPC124	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	4500	1988

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	PLATON

LINEA VEHICULO: C 70 149

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
08G0714017	NA		7.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PERDOMO CORREDOR, MARIA VICTORIA	3143127363	CC	20514688	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	154005217	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 611800	$ 305900	$ 1700

TOTAL A PAGAR

$ 919400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.



CERTIFICADO DE REVISION TÉCNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

N°. DE CONTROL 48140368

PLACA N°	MARCA	LINEA
JPC124	CHEVROLET	C 70 149

SERVICIO	COLOR	MODELO
PARTICULAR	BLANCO DE SEVRES	1988

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
4500	DIESEL	

CLASE	N° DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
VOLQUETA	08G0714017	C 20514688

PROPIETARIO	N° CONSECUTIVO RUNT
MARIA V. PERDOMO C.	145929192

N°. DE CONTROL 48140368

PLACA N°	CHASIS
JPC124	

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	NIT
CDA MI CARRERA EXPRESS	900755392

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA
2020	02	15

FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	MES	DIA
2021	02	15

EMILSON MOSQUERA MORENO
FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	N° CONSECUTIVO RUNT
16-OIN-038-001	145929192

ORIGINAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 79400733
NOMBRE
LUIS FRANCISCO ACOSTA LOPEZ
FECHA DE NACIMIENTO
09-03-1967
SANGRE-RH
A+
FECHA DE EXPEDICION
25-07-2018
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	25-07-2028	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	25-07-2021	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06000896582

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016471889

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OXD800	DODGE	D 600	1976

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.700	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
469GM2U0933156	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	DT605109	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CAMARGO CAMACHO CAMILO ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1012391920

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
002699

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	01/02/1970	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/07/2008	18/07/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
ITBOY - DIST TTO NO 1/COMBITA



LT01007714685

SOAT

AXA COLPATRIA

2020 5 19	2020 5 20	2021 5 19

7098573900	OXD800	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	4700	1976

0	DODGE
	D 600

469GM2U0933156	DT605109	DT605109	7

. CAMILO ANDRES CAMARGO CAMACHO	3208474379	CC	1012381920	BOGOTA

1306	26	53731	10924777	BOGOTA D.C

332	$611.800,00	$305.900,00	$1.700,00

$919.400,00

A GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B INCAPACIDAD TEMPORAL	180
C GASTOS FUNERARIOS	750
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

CLAUSULA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

Tenga usted en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito se lo podrán solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el reclamo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, llame un abogado por el procedimiento de emitirse de un mal rancho a lugar del accidente con por que tengo la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Tengan presente de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195, Decreto 019 de 2012). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fondo lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora debe seguirse el siguiente orden a prioridad:

Tenga presente que:

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos, y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como coberturas, referencias y modelos de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el fin para esto que recibirán los datos personales suministrados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

VIGILADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1012381920



NOMBRE

CAMILO ANDRES CAMARGO CAMACHO

FECHA DE NACIMIENTO

10-07-1991

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

21-06-2016

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEy MOV CUND/SIBATE

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	05-12-2024	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	05-12-2017	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VÁ[illegible] NACIONAL

LC0100737664?

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

OXD800

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016471889

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Información general del vehículo

MARCA:

DODGE

LÍNEA:

D 600

MODELO:

1976

COLOR:

AZUL

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

469GM2U0933156

NÚMERO DE CHASIS:

DT605109

NÚMERO DE VIN:

CILINDRAJE:

4700

TIPO DE CARROCERÍA:

PLATON

TIPO COMBUSTIBLE:

DIESEL

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

17/07/2008

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

ITBOY - DIST TTO No 1/COMBITA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

2

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
7098573900	**19/05/2020**	**20/05/2020**	**19/05/2021**	**AXA COLPATRIA SEGUROS SA**	**VIGENTE**

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
76031234	05/05/2019	06/05/2019	05/05/2020	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE
39037858	02/05/2018	03/05/2018	02/05/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
19659434	30/04/2017	01/05/2017	30/04/2018	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
33782425	26/04/2016	27/04/2016	26/04/2017	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Adquiera su **SOAT** en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)


Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	13/07/2020	13/07/2021	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	SI	147687896	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/04/2019	30/06/2020	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	141004057	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/04/2018	05/04/2019	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	135453331	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/02/2017	20/02/2018	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	129516401	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	17/02/2016	17/02/2017	CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA	NO	124502117	NO	

9. BIENESTAR

En cada frente de trabajo se destinó un salón donde los trabajadores se pueden cambiar de ropa y guardar sus pertenencias
Los trabajadores hacen uso de un baño asignado en cada colegio exclusivo para su uso
El contratista CONSORCIO RETORNAR suministra hidratación a su personal de obra





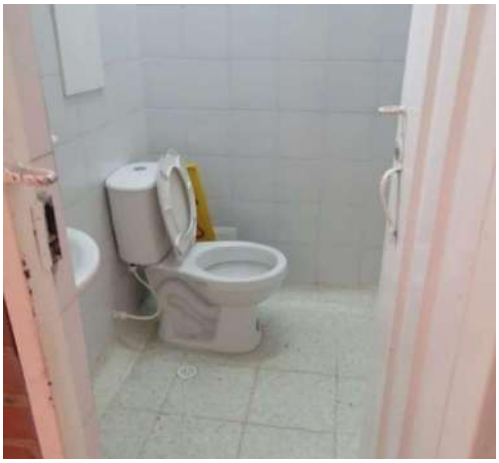



ORDEN Y ASEO

Se identifica un salón dentro de cada colegio en el cual se realiza almacenamiento temporal de materiales , se mantiene aseado y ordenado

			
FECHA	14/01/2021	**FECHA**	05/01/2021
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B**	
			
FECHA	12/01/2020	**FECHA**	13/01/2020
OBSERVACIONES		**OBSERVACIONES**	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B		**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B**	

	DOCUMENTO:	CODIGO:
Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** _INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
Ingeniería & Proyectos	**INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA - SEDE A

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE - SEDE A - CONFEDERACIÓN SUIZA

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	VoBo de Director de Area:
	
FIRMA	FIRMA

	DOCUMENTO:	CODIGO:
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	**HS-IN-05**
		VERSIÓN: **1**

RESPONSABLE LUZ STELLA PINEDA **FECHA:** 14/01/2021 **AREA:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE A - ARBORIZADORA BAJA

PROYECTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.1679920

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS				OBSERVACIONES
GUIA PARA LA INSPECCION	**N.A**	**SC**	**NC**	
Espacios organizados y libres de obstáculos		X		
Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)		X		
Frente de trabajo libre de escombros		X		
Herramientas almacenadas correctamente		X		
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo		X		
Material bien apilado o almacenado		X		
Residuos correctamente separados y zona identificada		X		
Uso racional del espacio de almacenamiento		X		
Paredes limpias		X		
Pisos limpios, en buen estado, y secos.		X		
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado		X		
Agua potable		X		
Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)		X		
Sanitarios limpios		X		
Punto de lavado de manos limpio y con agua potable		X		
Otros				

Convenciones:	**N.A**: No aplica	**SC:** Si cumple	**NC:** No cumple

Quien Inspecciona:	**VoBo de Director de Area:**
	
FIRMA	FIRMA
