"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019
INTERVENTORIA – ARQUITECTURA URBANA LTDA

CONTRATISTA DE OBRA No 4233000-731-2019
CONSORCIO PRUNI SEDES 04

SUPERVISORES DE LA INTERVENTORIA

GINNA ALEXANDRA VACA LINARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARLOS VLADIMIR RODRÍGUEZ VALENCIA
ALTO CONSEJERO PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CARMEN VICTORIA FORERO POLO
SUBDIRECTORA DE LA IMPRENTA DISTRITAL

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020

La Interventoría da fe que ha realizado el seguimiento y verificación al contrato de obra correspondiente, por lo tanto a avalado los informes y reporte presentados por el Constructor, en cada uno de sus componentes, Administrativo, Técnico, Ambiental, SST, Calidad y demás, razón por la cual presenta este informe mediante el cual ratifica lo presentado por el constructor y evidencia el cumplimiento de sus funciones.

Fecha:	REALIZO:	REALIZO:	REVISO Y VERIFICO:
INFORME FINAL	**ARQ. FERNANDO AGUIRRE MEDINA.** Residente Administrativo	**ING. PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ** Coordinadora Técnica Interventoría	**ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO** Director de Interventoría/ Representante legal

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 4
1.1 OBJETIVOS GENERALES 4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
2.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000 – 730 – 2019 5
2.2 FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 7
3.1 PÓLIZAS 7
3.1.1. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS 8
3.2 RELACIÓN DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y REUNIÓN TÉCNICA 10
3.3 COPIA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA. 18
3.3.1 CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 18
3.3.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-731-2019 19
3.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 19
3.5 SOPORTES DE BIENES Y CANTIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO AL ANEXO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 19
3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
4. ASPECTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS 21
4.1 GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 21
4.2 PERMANENCIA DEL PERSONAL EN OBRA 21
4.2.1 REPORTE DE PERMANENCIA PERSONAL DE INTERVENTORÍA 21
4.2.2 REPORTE DE PERMANENCIA PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 23
4.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO POR LA INTERVENTORIA 25
4.3.1 FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA 25
4.3.2 VALORES Y COSTOS INICIALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 25
4.3.3 VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: 26
4.3.4 VALOR FACTURADO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA NO 4233000-731-2019 27
4.3.5 ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000 – 731 –2019 27
4.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA (INICIAL, MODIFICACIONES Y PROGRAMACIONES FINAL EJECUTADA 31
4.5 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS MODIFICACIONES AL DISEÑO APROBADAS POR INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN 31
4.5.1 INFORME TRAZABILIDAD CONSULTORÍA - SEDE IMPRENTA DISTRITAL 31

5. ASPECTOS DE CALIDAD 82
5.1 CONSOLIDADO DE SOPORTES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA 82
5.2 CONSOLIDADO DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 82
5.2.1 MANZANA LIÉVANO 82
5.2.2 SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN 87
5.2.3 SEDE IMPRENTA DISTRITAL. 92
5.2.4 ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO – IMPRENTA DISTRITAL 94
5.3 CONSOLIDADO CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 116
5.3.1 SEDE MANZANA LIÉVANO 116
5.3.2 SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN 116
5.3.3 SEDE IMPRENTA DISTRITAL 118
5.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL COMPONENTE DE CALIDAD. 126
5.4.1 SEDE MANZANA LIÉVANO 126
5.4.2 SEDE IMPRENTA DISTRITAL 140
CERTIFICADO DE CALIDAD CABLE 350 MCM Y CABLE 500 MCM 158
6. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 161
7. ASPECTOS SISOMA 165
7.1.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS VECINOS O PRELIMINARES. 165
7.1.2 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 170
7.1.3 INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL. 172
7.1.4 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITIOS DE OBTENCIÓN DE MATERIALES. 173
7.1.5 REPORTE DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCD. 175
7.1.6 OTROS (INFORMES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD). 179
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 213
8.1. CORRESPONDENCIA CRUZADA 213
8.2. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 265
8.3. ACTAS DE VECINDAD 281
8.4. ASPECTOS LEGALES 281
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 284

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

- Informar a la entidad contratante **SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**, el estado final de los contratos tanto de Interventoría como de Obra en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, legal y financieros adelantados durante el periodo comprendido entre el **VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2020.**

- Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista **CONSORCIO PRUNI SEDES 04,** la cual fue aprobada por la Interventoría mediante oficio con radicado No 1-2019-30361 del 2 de Diciembre de 2019.y las diferentes reprogramaciones motivadas en los diferentes modificatorios dados en el contrato de obra.

- Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dar a conocer a la entidad Contratante **SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,** el estado final del contrato en las actividades técnicas, administrativas, financieras, contables y metodologías de obra, la aplicación de los programas de ***Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Manejo Ambiental*** para la ejecución de Actividades preliminares y las actividades de implementación del componente ***Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Manejo Ambiental***, llevadas durante la ejecución del contrato de obra desde el 28 de Junio de 2019 y hasta el 28 de Noviembre de 2020, Así:

- Velar por la seguridad en la ejecución de la obra, la integridad de los trabajadores y trabajadores de cada sede.

- Dar cumplimiento a la Programación de Actividades presentada por el Contratista.

- Vigilar la correcta utilización del avance e inversión de la obra con respecto a lo programado, con el fin que la entidad contratante esté informada al respecto.

- Mantener informado al Contratante, de la ejecución de los trabajos y de los diferentes sucesos que se presentan en la obra y que afectan, su normal ejecución.

- Prevención y manejo adecuado de ejecución de las actividades en obra y recomendaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas de obra.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

2.1 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000 – 730 – 2019

Mediante Concurso de méritos Abiertos **SGA-CM-04-2019** realizado por **la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** se le adjudica a la empresa **ARQUITECTURA URBANA LTDA**. El **CONTRATO NO. 4233000-730-2019**, que tiene por objeto: **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ECONÓMICA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."**

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 4233000-730-2019	
CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA.
CONCURSO DE MÉRITOS	SGA-CM-04-2019
REPRESENTANTE LEGAL /DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO
NIT:	830.098.495-4
DIRECCIÓN:	CALLE 38 No. 8-12 Oficina. 301
TELÉFONO:	7 035370
No. DE CONTRATO	No. 4233000-730-2019
ACTA DE INICIO	28 de Junio de 2019
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 498.383.698
VALOR DE LA ADICIÓN FIRMADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	$ 268.441.148,00
VALOR DE LA ADICIÓN No 2 SEDE CMPR FIRMADA EL 04 DE FEBRERO DE 2020	$ 37.546.512,41
VALOR ADICIÓN FIRMADA EL 29 DE MAYO DE 2020	$ 269.250.497
VALOR FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$1.073.621.855,41
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL SEGÚN MODIFICATORIO FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	CINCO (5) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020	TREINTA Y SIETE DIAS (137) EQUIVALENTE A CUATRO PUNTO CINCUENTA Y SEIS MESES (4.56)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	QUINCE MESES Y QUINCE DIAS CALENDARIO (15.5)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020	VEINTISIETE (27) DE MAYO DE 2020
SUSPENSIÓN No 1	25 DE MARZO DE 2020 HASTA 13 DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN No 2	14 DE ABRIL DE 2020 HASTA 26 DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN No 3	27 DE ABRIL DE 2020 HASTA 10 DE MAYO DE 2020
REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	ONCE (11) DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FIRMADA EL 29 DE MAYO DE 2020	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2020
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	GINA ALEXANDRA VACA LINARES – DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SECRETARIA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ING. ALEXANDRA SANDOVAL CHAPARRO
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	DR. VICTORIA FORERO POLO – SUBDIRECTORA de la SEDE IMPRENTA DISTRITAL

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 4233000-730-2019	
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ING. GUSTAVO ANDRÉS GARCÍA BERMÚDEZ
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	DR. CARLOS VLADIMIR RODRÍGUEZ VALENCIA – ALTO CONSEJERO PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ING, DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Tabla 01. Control Legal de contrato de Interventoría 4233000 – 730 – 2019

2.2 FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

1. Pagos mensuales hasta completar un noventa (90%) del valor total de la interventoría, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría, de conformidad con los costos directos de personal y otros costos directos (operativos), aprobados por la Secretaria y efectivamente empleados en la ejecución de los trabajos, afectados por el factor multiplicador, previa presentación del informe mensual de avance del trabajo de interventoría con sus respectivos soportes.

2. El último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de interventoría que se pagara previa entrega de los siguientes requisitos:

   I. Recibo a satisfacción de la obra firmada por el interventor y aprobada por el supervisor del contrato.
   II. Acta de liquidación del contrato de obra avalado por el interventor
   III. Acta de liquidación del contrato de interventoría para revisión y aval de los supervisores de la entidad.
   IV. Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra
   V. Informe final del contratista de obra avalado por la interventoría (en medio físico y medio magnético), incluido los planos récord que comprendan plantas, cortes y alzadas de las obras ejecutadas objeto del contrato, memorias de intervención y registro fotográfico.
   VI. Informe final de ejecución del interventor (En medio físico y magnético).

Según la fecha de finalización inicial para la sede CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN la cual era el 4 de Febrero de 2020, el profesional ING. ÁLVARO ANDRÉS NÚÑEZ DÍAZ, residente técnico para la sede CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN acompaño en sus funciones técnicas, administrativas y financiero hasta dicha fecha, a partir de 5 de Febrero de 2020 y una vez finalizada la sede MANZANA LIÉVANO el 20 de Enero de 2020, el ING. CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAÑO paso a ser el residente técnico de dicha sede y hasta la fecha del presente informe mensual ejerce el cargo de residente técnico, para CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.1 PÓLIZAS

A la fecha del presente FINAL, la actualización de las pólizas reportadas para el contrato, se realizan de acuerdo a la suscripción del mismo, en la que se evidencia que la cobertura y los amparos cumplen con respecto a lo estipulado en la cláusula séptima. GARANTÍAS. Las pólizas se relacionan en las siguientes tablas de control de acuerdo a la firma del contrato de interventoría y hasta la ADICIÓN No TRES (3) Y PRORROGA No DOS (2) al contrato de interventoría, así:

EMISIÓN PÓLIZA (SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO) expedición: 21/06/2019. ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 0 – ANEXO DE FIRMA DEL CONTRATO 20/06/2019

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	27/06/2019	$149.515. 109,13
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$99.676.739.42
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	27/12/2022	$ 49.838.369.71

Tabla 02 Control de Pólizas firma del contrato de Interventoría No. No. 4233000-730-2019

EMISIÓN PÓLIZA (ACTA DE INICIO) expedición: 09/07/2019. ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 1 ANEXO DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO 28/06/2019

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	27/06/2020	$149.515. 109,13
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2019	27/12/2024	$99.676.739.42
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	27/12/2022	$ 49.838.369.71

Tabla 03 Control de Pólizas firma del contrato de Interventoría según acta de inicio No 4233000-730-2019

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 2 Y ANEXO 4 – ANEXO MODIFICATORIO No 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	27/12/2020	$230.047.453.50
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$153.364.969
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2019	27/12/2023	$ 76.682.484,50

Tabla 04 Control de Pólizas firma del contrato de Interventoría según modificatorio No 1

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 5 y 6 – ADICIÓN No DOS (2)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	27/12/2020	$241.311.407,40
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$160.874.271,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	27/12/2023	$ 80.437.135,80

Tabla 05 Control de Pólizas firma del contrato de Interventoría según adición No 2

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 7 – SUSPENSIÓN No UNO (1)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	16/12/2020	$241.311.407,40
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$160.874.271,60

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	16/06/2023	$ 80.437.135,80

Tabla 06 Control de Pólizas Suspensión No 1

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 8 – SUSPENSIÓN No DOS (2) - No TRES (3)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	15/04/2020	16/12/2020	$241.311.407,40
CALIDAD DEL SERVICIO	15/04/2020	27/12/2024	$160.874.271,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/04/2020	16/12/2023	$ 80.437.135,80

Tabla 07 Control de Pólizas Suspensión No 2 – No 3

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 9 – REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	14/01/2021	$241.311.407,40
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$160.874.271,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	14/07/2013	$ 80.437.135,80

Tabla 08 Control de Pólizas Reinicio del contrato de Interventoría

No. DE PÓLIZA: 390-47-994000048873 PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO: 10 – PRORROGA DOS (2) ADICIÓN No TRES (3).

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	20/06/2019	28/05/2021	$322.086.556,36
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2019	27/12/2024	$214.724.370,91
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	28/11/2023	$ 107.362.185,45

Tabla 09 Control de Pólizas Adición 3 y prorroga No 2

3.1.1. CONCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS

La actualización de pólizas mencionadas anteriormente según el LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEL ACTA DE INICIO se realizó ante la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para su expedición y posteriormente se radicó en la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C mediante comunicado AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 001 el día veinticinco (25) de Junio de 2019 y CONSIGNADO EN LA PLATAFORMA SECOP II con **ASUNTO**: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019 *para la aprobación por parte de la entidad contratante, así mismo mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 008 del día 12 de Julio de 2019 y CONSIGNADO EN LA PLATAFORMA SECOP II con* **ASUNTO**: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019 ACTUALIZACIÓN AL ACTA DE INICIO.

Es de aclarar que la cobertura y los amparos del contrato de obra No 4233000-730-2019 del día 20 de junio de 2019 *se encuentran vigentes a la fecha en cumplimiento a las GARANTÍAS establecida en el Contrato de Interventoría.*

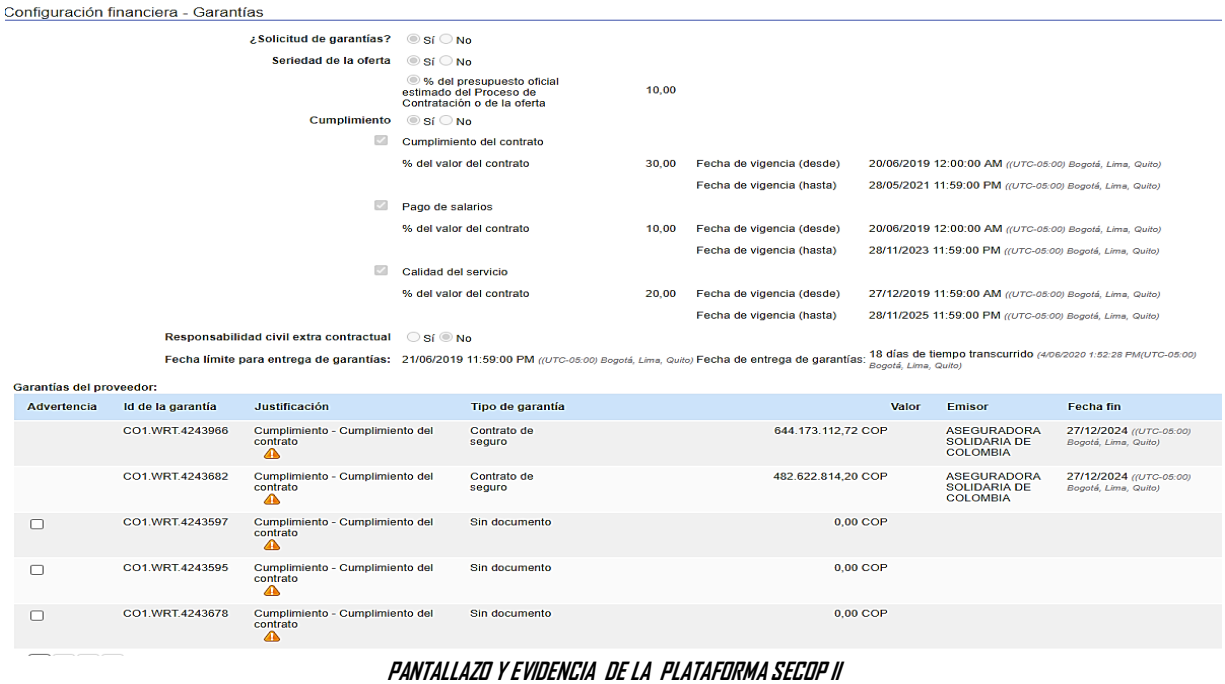
Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-211 del día 2 de Diciembre de 2019 con radicado No 1-2019-30361 del 2 de Diciembre de 2019 y con asunto *SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C." la Interventoría considero recomendarle a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR Adicionar el*

contrato de obra en $1.177.511.766 con una prórroga de 5 meses contados a partir de la fecha de finalización inicial del día 27 de Diciembre de 2019.

Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-212 del día 2 de Diciembre de 2019 con radicado No 1-2019-30362 del día 2 de Diciembre de 2019 y con asunto: *SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE LA REFERENCIA,* la interventoría solicito una prórroga por cinco (5) meses y una adición por *DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS $ 268,441,147.48.*

Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-254 del día 26 de Diciembre de 2019 con radicado No 1-2019-33165 del día 27 de Diciembre de 2019 y con asunto: *PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019.*

A la fecha del presente informe FINAL de interventoría, las actualizaciones de las garantías se encuentran vigentes, informadas a la entidad contratante y aprobada mediante la plataforma SECOP II, tanto para la firma del modificatorio No 1 del día 20 de Diciembre de 2019 como para el modificatorio No 2 firmado el día 29 de Mayo de 2020.



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí / No

Seriedad de la oferta: Sí / No
- % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento: Sí / No
- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 20/06/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 28/05/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Pago de salarios
  - % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 20/06/2019 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 28/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- Calidad del servicio
  - % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 27/12/2019 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual: Sí / No

Fecha límite para entrega de garantías: 21/06/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido (4/06/2020 1:52:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
	CO1.WRT.4243966	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	644.173.112,72 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
	CO1.WRT.4243682	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	482.622.814,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐	CO1.WRT.4243597	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Sin documento	0,00 COP		
☐	CO1.WRT.4243595	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Sin documento	0,00 COP		
☐	CO1.WRT.4243678	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Sin documento	0,00 COP		

PANTALLAZO Y EVIDENCIA DE LA PLATAFORMA SECOP II

3.2 RELACIÓN DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y REUNIÓN TÉCNICA

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
9-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 2	REVISIÓN APUS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 3	CONTEXTUALIZAR CRONOGRAMA IMPRENTA DISTRITAL Y COORDINAR CON ARQ. RONALD MAURICIO PULIDO IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
12-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 4	CONFIRMACIÓN UBICACIÓN CAMPAMENTOS - RECONOCIMIENTO PROVISIONALES OBRA	MANZANA LIÉVANO
12-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 5	PRELIMINARES	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
15-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 6	SEGUIMIENTO INICIO DE OBRA "LOGÍSTICA Y CRONOGRAMA"	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
17-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 7	VERIFICACIÓN CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN ÁREAS A INTERVENIR	MANZANA LIÉVANO
17-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 8	CRONOGRAMA DETALLADO IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
17-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 9	CANTIDADES DE OBRA (COMPONENTE ELÉCTRICO)	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
19-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 10	RECOMENDACIONES PARA LAS MAQUINAS DURANTE EL REFUERZO ESTRUCTURAL	IMPRENTA DISTRITAL
27-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 11	OBSERVACIONES GEOTÉCNICAS	IMPRENTA DISTRITAL
23-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 17	REVISIÓN, EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DETALLADO	IMPRENTA DISTRITAL
19-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 18	VERIFICACIÓN DE CANTIDADES ELÉCTRICAS EN CAMPO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
24-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 19	SOCIALIZACIÓN DE OBSERVACIONES ELÉCTRICAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
25-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 20	REVISIÓN PROGRAMACIÓN QUINCENAL-AVANCE	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
26-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 21	REUNIÓN CON LA CONSULTORÍA ESTRUCTURAL E HIDROSANITARIO	IMPRENTA DISTRITAL
29-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 22	REUNIÓN Nº 2 CON LA CONSULTORÍA COMPONENTE ELÉCTRICO	IMPRENTA DISTRITAL
30-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 24	INGRESO DE PERSONAL A IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
30-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 24-A	REUNIÓN COINSI - CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	MANZANA LIÉVANO
30-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 25	REVISIÓN O SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS SEMANALES	IMPRENTA DISTRITAL
31-jul.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 26	REUNIÓN PARA REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS	IMPRENTA DISTRITAL
6-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 27	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS REUNIÓN INTERNA	IMPRENTA DISTRITAL
2-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 28	PUNTOS ECOLÓGICOS - ACOPIOS PLAN DE EMERGENCIAS	IMPRENTA DISTRITAL
2-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 29	DEFINICIÓN PUNTOS ECOLÓGICOS - MANEJO DE RESIDUOS	MANZANA LIÉVANO
6-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 30	REVISIÓN COMITÉ PRESENTACIÓN DEL 08 DE AGOSTO DE 2019	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
8-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 31	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MANZANA LIÉVANO
13-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 32	SEGUIMIENTO INTERNO EJECUCIÓN OBRA	IMPRENTA DISTRITAL
13-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 33	SOCIALIZACIÓN PROGRAMACIÓN A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
21-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 34	REUNIÓN CON ING. HIDRÁULICO FRANCISCO GALVIS – ESPECIALISTA HIDRÁULICO DE LA INTERVENTORIA	IMPRENTA DISTRITAL
21-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 35	REUNIÓN INTERNA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	IMPRENTA DISTRITAL
22-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN	DISEÑO ELÉCTRICO	OFICINA CONSORCIO PRUNI SEDES 04
22-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 36	REUNIÓN CON CONSULTORÍA No 3 - COMPONENTE ELÉCTRICO	IMPRENTA DISTRITAL
23-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 37	SOCIALIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) ÁREA JURÍDICA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
20-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 38	SOCIALIZACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
27-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 39	CIERRE DE ESCALERAS DE EMERGENCIA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
27-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 40	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
27-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 41	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS INTERNOS - IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
30-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 42	SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO DETALLADO ZONA PRODUCCIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
2-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 43	REUNIÓN CON LA CONSULTORÍA	IMPRENTA DISTRITAL
30-ago.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 45	PROCESO CONSTRUCTIVO EXCAVACIÓN MECÁNICA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
2-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 46	REVISIÓN BALANCE DE OBRA No 1	MANZANA LIÉVANO
2-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 47	REVISIÓN AL PRIMER BALANCE DEL CONTRATO	MANZANA LIÉVANO
4-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 48	SEGUIMIENTO INTERNO	IMPRENTA DISTRITAL
10-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 49	RESPUESTA DE LA CONSULTORÍA A OBSERVACIONES DE OBRA	OFICINA P&D
16-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 50	REUNIÓN CONSULTORÍA RED HIDROSANITARIO Y RED AGUA NEBULIZADA	OFICINA P&D
18-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 51	REUNIÓN INTERNA IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
2-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 52	BALANCE No 1 Y MEMORIAS DE CANTIDADES	MANZANA LIÉVANO
3-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 53	BALANCE CANTIDADES HIDRÁULICAS	MANZANA LIÉVANO
3-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 54	REUNIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPRENTA DISTRITAL
8-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 55	CANTIDADES DE OBRA - REVISIÓN BALANCE DE CANTIDADES	MANZANA LIÉVANO
6-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 56	SOCIALIZACIÓN TEMAS SST FRENTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
10-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 57	SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS	IMPRENTA DISTRITAL
10-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 58	REUNIÓN INTEGRAL CON CONSULTORÍA GEOTÉCNICA, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
10-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 59	PROGRAMACIÓN A 29 DE SEPTIEMBRE PRESENTADA POR CONTRATISTA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
25-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 60	REUNIÓN INTERNA IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
27-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 61	REVISIÓN PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
11-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 62	ACLARACIONES DE CONSULTORÍA COINSI A TEMAS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS PARA MANZANA LIÉVANO	MANZANA LIÉVANO
20-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 63	ENTREGA DE ESPACIOS BICENTENARIO II - OFICINAS GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
18-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 64	RECORRIDO DE OBRA IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES Y CANTIDADES ELÉCTRICAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
12-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 65	TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SECRETARIA DE GOBIERNO
17-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 66	SIMULACRO DISTRITAL - MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SECRETARIA DE GOBIERNO
17-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 67	REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2019	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
20-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 68	RESPUESTA A INQUIETUDES HECHAS A CONSULTORÍA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
9-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 69	REUNIÓN CON LA EMPRESA HÍDRINCO	IMPRENTA DISTRITAL
23-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 70	EVALUAR DAÑOS AL INTERIOR AUDITORIO Y SÓTANO 2	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
30-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 71	INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS EJECUTADAS A LA FECHA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 72	ENTREGA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	MANZANA LIÉVANO
2-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 73	REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN CON FECHA A 19 DE OCTUBRE DE 2019	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
30-sep.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 74	ENTREGA DE OFICINAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MANZANA LIÉVANO
1-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 75	ENTREGA DE OFICINAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MANZANA LIÉVANO
1-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 76	ENTREGA DE SECRETARIA DE GOBIERNO A OBRA E INTERVENTORÍA	MANZANA LIÉVANO
3-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 77	REVISIÓN INFORME MENSUAL - ACTA PARCIAL – ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NOS PREVISTOS (APUS)	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
7-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 78	REVISIÓN A ACTA 071 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL COMPONENTE ELÉCTRICO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 79	INSPECCIÓN DE ESPACIOS POR AFECTACIONES DE FILTRACIONES	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 80	REUNIÓN PIGA - APLICATIVO SDA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
			MAYOR DE BOGOTÁ
11-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 81	ENTREGA DE PISO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
17-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 82	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE GRABADOR SWITCH, PANEL DE ALARMA Y RADIO (EMPRESA SEGURCOL)	IMPRENTA DISTRITAL
14-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 83	REUNIÓN TEMAS AMBIENTALES - PIGA E INFORME MENSUAL	MANZANA LIÉVANO
16-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 84	CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS EN EQUIPOS AL INTERIOR DEL AUDITORIO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
24-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 85	DESCONEXIÓN EQUIPO METROMIL (FIBRA ÓPTICA) DE LA ETB	IMPRENTA DISTRITAL
29-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 86	DIMENSIÓN Y ACLARACIÓN DE APARATOS Y GRIFERÍA APARATOS SANITARIOS	IMPRENTA DISTRITAL
29-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 87	REUNIÓN INTERNA IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
31-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 88	ENTREGA PISO 3 Y 4 DE OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
1-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 89	RECIBO DE PISO 1 BICENTENARIO II COSTADO NORTE	MANZANA LIÉVANO
21-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 90	ENTREGA DE OFICINAS SECRETARIA DE GOBIERNO PISO TRES Y CUATRO	MANZANA LIÉVANO
21-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 91	ENTREGA PISO 2 COSTADO NOR OCCIDENTAL SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
23-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN OTIC	REUNIÓN DE EQUIPO AUDIO Y VIDEO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
30-oct.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 92	EDIFICIO BICENTENARIO 1 PISO 2 SECRETARIA GENERAL	MANZANA LIÉVANO
1-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 93	PIN AMBIENTAL - PERIODO SEPTIEMBRE	SECRETARIA DE GOBIERNO
8-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN OTIC	ADECUACIÓN DE EQUIPO AUDIO Y VIDEO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
12-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 94	ENTREGA DE OFICINAS JURÍDICA Y POLICIVA	MANZANA LIÉVANO
12-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 95	ENTREGA PISO 3 BICENTENARIO II SECRETARIA GENERAL	MANZANA LIÉVANO
12-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN OTIC	INSTALACIÓN DISPOSITIVOS VOZ Y DATOS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
6-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 96	ACTIVIDADES PENDIENTES PARA CERTIFICACIÓN RETIE	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
12-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 97	ENTREGA A CONSORCIO PRUNI SEDES 04 E INTERVENTORÍA PISO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
15-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 98	COMPROMISOS PENDIENTES POR EL CONTRATISTA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
15-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 99	REUNIÓN INTERNA IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
18-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN OTIC	INSTALACIÓN DISPOSITIVOS DE AUDIO Y VIDEO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
19-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN OTIC	INSTALACIÓN DISPOSITIVOS VOZ Y DATOS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
20-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 100	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 A SECRETARIA GENERAL PISO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
26-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 101	PROGRAMACIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
26-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 102	REVISIÓN BALANCE A CORTE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
20-nov.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 103	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 A SECRETARIA GENERAL PISO 3 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
2-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 104	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 A SECRETARIA GENERAL PISO 3 SECRETARIA GENERAL	MANZANA LIÉVANO
2-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 105	ENTREGA OFICINAS PISO 3 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
2-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 106	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 A SECRETARIA GENERAL PISO 1 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
4-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN INTERNA	SEGUIMIENTO DE OBRA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
3-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 107	ENTREGA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES A OBRA E INTERVENTORÍA	MANZANA LIÉVANO
17-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 107A	INSTALACIÓN BOMBA TIPO LAPICERO	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
9-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 108	ENTREGA OFICINAS PISO 3 SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
10-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 109	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 E INTERVENTORÍA PISO 2 BICENTENARIO 1	MANZANA LIÉVANO
10-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 109A	REUNIÓN CON CONSULTORÍA P&D	IMPRENTA DISTRITAL
12-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 110	REVISIÓN DE PENDIENTES POR PARTE DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04	MANZANA LIÉVANO
9-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 111	ENTREGA PISO 1 EDIFICIO BICENTENARIO 1	MANZANA LIÉVANO
26-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 112	REPORTE SDA PLATAFORMA PERIODO OCTUBRE 2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
23-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 113	ACTIVIDADES PENDIENTES EN OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL	MANZANA LIÉVANO
23-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 114	OBSERVACIONES EN OFICINAS SECRETARIA DE GOBIERNO	MANZANA LIÉVANO
18-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 115	ENTREGA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 E INTERVENTORÍA SECRETARIA GENERAL	MANZANA LIÉVANO
7-ene.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 116	RECORRIDO ACTIVIDADES PENDIENTES POR ZONAS	IMPRENTA DISTRITAL
13-ene.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 117	INSTALACIÓN EQUIPO EPU -HIDRINCO	IMPRENTA DISTRITAL
18-dic.-19	ACTA DE REUNIÓN Nº 118	REUNIÓN INTERNA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
23-ene.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 119	CAPACITACIÓN RED Y BOMBA CONTRA INCENDIO	MANZANA LIÉVANO
24-ene.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 120	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS ELÉCTRICO 145	IMPRENTA DISTRITAL
4-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 121	REUNIÓN INTERNA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
4-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 122	BALANCE DE OBRA	IMPRENTA DISTRITAL
4-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 123	RECIBO PARCIAL A CORTE DEL 04 DE FEBRERO DE 2020	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
10-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 124	BALANCE DEL CONTRATO CENTRO DE MEMORIA E IMPRENTA DISTRITAL	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 125	RESPUESTA OFICIO PS04-336-19	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
11-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 126	REVISIÓN BALANCE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
12-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 127	OBSERVACIONES RETIE	OFICINAS SERVIMETERS
5-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 128	REUNIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO	IMPRENTA DISTRITAL
17-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 129	REVISIÓN BALANCE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
17-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 130	PIN AMBIENTAL - CARGUE INFORMACIÓN DICIEMBRE 2019	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
16-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 131	CRUCE ELÉCTRICO E HIDRÁULICO	IMPRENTA DISTRITAL
25-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 132	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No 7	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
14-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 133	MANZANA LIÉVANO - ACTA DE RECIBO	MANZANA LIÉVANO
28-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 134	VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y CURVA S	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
28-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 135	PIN AMBIENTAL - CARGUE INFORMACIÓN ENERO 2020	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
21-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 136	BALANCE PROGRAMACIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
2-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 137	INSTALACIÓN EQUIPO EPU - REDES	IMPRENTA DISTRITAL
3-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 138	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	IMPRENTA DISTRITAL
10-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
14-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	MANZANA LIÉVANO
16-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN	RECORRIDO DE OBRA ENTREGA DE OBRA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
18-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 139	PRUEBA BAÑADORES ESPEJOS DE AGUA CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
16-mar.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 140	REUNIÓN INTERNA REVISIÓN BALANCE Y APUs NO PREVISTOS	IMPRENTA DISTRITAL

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
21-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 141	SOCIALIZACIÓN OBSERVACIONES BALANCE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
23-jun.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 142	ESTADO ACTUAL CUBIERTA HONTER DOUGLAS	IMPRENTA DISTRITAL
27-ago.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 143	ESTADO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	IMPRENTA DISTRITAL
22-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 144	SOCIALIZACIÓN OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL ENTREGADA MEDIANTE OFICIO 389	IMPRENTA DISTRITAL
26-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 145	SOCIALIZACIÓN OBSERVACIONES BALANCE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
26-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 146	VARIOS ELÉCTRICOS Y RED CONTRA INCENDIOS	IMPRENTA DISTRITAL
12-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 147	RECORRIDO POR CALIDAD DE LAS OBRAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
14-may.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 148	RECORRIDO ELÉCTRICO	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
4-ago.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 149	SOCIALIZACIÓN CASO POSITIVO COVID-19 DE LA INGENIERA DIANA CATHERINE MORALES VELÁSQUEZ PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA	VIRTUAL GOOGLE MEAT
4-ago.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 150	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No 12	IMPRENTA DISTRITAL
9-jun.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 151	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	VIRTUAL GOOGLE MEAT
24-jun.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 152	RECORRIDO RECIBO DE OBRAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
28-jul.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 153	REVISIÓN BALANCE, FLUJO Y AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN	IMPRENTA DISTRITAL
19-oct.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 154	ASPECTOS LIQUIDACIÓN	OFICINA DE INTERVENTORÍA-ARQUITECTURA URBANA LTDA
2-sep.-20	ACTA DE REUNIÓN	REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LETREROS Y CASETA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
4-sep.-20	ACTA DE REUNIÓN	BARRIDO DE LAS OBSERVACIONES ELECTRICAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
5-sep.-20	ACTA DE REUNIÓN	RECIBO Y PRUEBA DE LA TRANSFERENCIA EN MANZANA LIÉVANO	MANZANA LIÉVANO
18-sep.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 155	REPORTE INFORMACIÓN RCD PIN AMBIENTAL 17450 - PERIODO AGOSTO 2020	VIRTUAL GOOGLE MEAT
22-sep.-20	ACTA DE REUNIÓN	VISITA VERIFICACIÓN PRESENCIA DE PALOMAS DE PLAZA	MANZANA LIÉVANO
6-oct.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 156	REPORTE INFORMACIÓN RCD PIN AMBIENTAL 17450 - PERIODO SEPTIEMBRE 2020	VIRTUAL GOOGLE MEAT
14-oct.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 157	REVISIÓN DEL ACTA PARCIAL Y SOPORTES No. 14 DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04	IMPRENTA DISTRITAL
4-nov.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 158	DOCUMENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y CIERRE DE COMPONENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PIN AMBIENTAL 17450	IMPRENTA DISTRITAL
5-nov.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 159	PRUEBA DE PLANTA ELECTRICA	IMPRENTA DISTRITAL
18-nov.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 160	PLANO SERIE 3 Y DOCUMENTACIÓN PARA ACOMETIDA DEFINITIVA PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
14-nov.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 161	ACTA PARCIAL No 16	IMPRENTA DISTRITAL
14-nov.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 162	VERIFICACIÓN ÁREAS- ASEO M2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	IMPRENTA DISTRITAL
22-dic.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 163	CIERRE DE ACTAS DE VECINDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL	IMPRENTA DISTRITAL
23-dic.-20	ACTA DE REUNIÓN Nº 164	VERIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES POST VENTAS	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
9-feb.-20	ACTA DE REUNIÓN	RECORRIDO DE OBRA	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-Jul-19	ACTA DE COMITÉ No 1	ACTA DE COMITÉ No 1 – INICIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE INTERVENTORIA	AULAS BARULÉ- EDIFICIO BICENTENARIO II - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
18-Jul-19	ACTA DE COMITÉ No 2	ACTA DE COMITÉ No 2 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
25-Jul-19	ACTA DE COMITÉ No 3	ACTA DE COMITÉ No 3 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	ENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
		LEGALES, AMBIENTALES Y SST	
31-Jul-19	ACTA DE COMITÉ No 4	ACTA DE COMITÉ No 4 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
8-Agos-19	ACTA DE COMITÉ No 5	ACTA DE COMITÉ No 5 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
15-Agos-19	ACTA DE COMITÉ No 6	ACTA DE COMITÉ No 6 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
22-Agos-19	ACTA DE COMITÉ No 7	ACTA DE COMITÉ No 7 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
05-Sept-19	ACTA DE COMITÉ No 8	ACTA DE COMITÉ No 8 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
12-Sept-19	ACTA DE COMITÉ No 9	ACTA DE COMITÉ No 9 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
19-Sept-19	ACTA DE COMITÉ No 10	ACTA DE COMITÉ No 10 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
26-Sept-19	ACTA DE COMITÉ No 11	ACTA DE COMITÉ No 11 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
03-Oct-19	ACTA DE COMITÉ No 12	ACTA DE COMITÉ No 12 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	MANZANA LIÉVANO
10-Oct-19	ACTA DE COMITÉ No 13	ACTA DE COMITÉ No 13 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
17-Oct-19	ACTA DE COMITÉ No 14	ACTA DE COMITÉ No 14 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
24-Oct-19	ACTA DE COMITÉ No 15	ACTA DE COMITÉ No 15 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
31-Oct-19	ACTA DE COMITÉ No 16	ACTA DE COMITÉ No 16 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
07-Nov-19	ACTA DE COMITÉ No 17	ACTA DE COMITÉ No 17 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
20-Nov-19	ACTA DE COMITÉ No 18	ACTA DE COMITÉ No 18 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	MANZANA LIÉVANO
29-Nov-19	ACTA DE COMITÉ No 19	ACTA DE COMITÉ No 19 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	MANZANA LIÉVANO

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
		LEGALES, AMBIENTALES Y SST	
05-Dic-19	ACTA DE COMITÉ No 20	ACTA DE COMITÉ No 20 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
11-Dic-19	ACTA DE COMITÉ No 21	ACTA DE COMITÉ No 21 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
19-Dic-19	ACTA DE COMITÉ No 22	ACTA DE COMITÉ No 22 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
26-Dic-19	ACTA DE COMITÉ No 23	ACTA DE COMITÉ No 23 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
09-Ene-20	ACTA DE COMITÉ No 24	ACTA DE COMITÉ No 24 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
16-Ene-20	ACTA DE COMITÉ No 25	ACTA DE COMITÉ No 25 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
23-Ene-20	ACTA DE COMITÉ No 26	ACTA DE COMITÉ No 26 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
30-Ene-20	ACTA DE COMITÉ No 27	ACTA DE COMITÉ No 27 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
7-Feb-20	ACTA DE COMITÉ No 28	ACTA DE COMITÉ No 28 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	IMPRENTA DISTRITAL
13-Feb-20	ACTA DE COMITÉ No 29	ACTA DE COMITÉ No 29 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	IMPRENTA DISTRITAL
20-Feb-20	ACTA DE COMITÉ No 30	ACTA DE COMITÉ No 30 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
27-Feb-20	ACTA DE COMITÉ No 31	ACTA DE COMITÉ No 31 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
05-Mar-20	ACTA DE COMITÉ No 32	ACTA DE COMITÉ No 32 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
12-Mar-20	ACTA DE COMITÉ No 33	ACTA DE COMITÉ No 33 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
19-Mar-20	ACTA DE COMITÉ No 34	ACTA DE COMITÉ No 34 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN
29-May-20	ACTA DE COMITÉ No 35	ACTA DE COMITÉ No 35 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
		LEGALES, AMBIENTALES Y SST	
19-Jun-20	ACTA DE COMITÉ No 36	ACTA DE COMITÉ No 36 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
25-Jun-20	ACTA DE COMITÉ No 37	ACTA DE COMITÉ No 37 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
02-Jul-20	ACTA DE COMITÉ No 38	ACTA DE COMITÉ No 38 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
09-Jul-20	ACTA DE COMITÉ No 39	ACTA DE COMITÉ No 39 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
16-Jul-20	ACTA DE COMITÉ No 40	ACTA DE COMITÉ No 40 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
23-Jul-20	ACTA DE COMITÉ No 41	ACTA DE COMITÉ No 41 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
30-Jul-20	ACTA DE COMITÉ No 42	ACTA DE COMITÉ No 42 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
6-Agos-20	ACTA DE COMITÉ No 43	ACTA DE COMITÉ No 43 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
13-Agos-20	ACTA DE COMITÉ No 44	ACTA DE COMITÉ No 44 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
21-Agos-20	ACTA DE COMITÉ No 45	ACTA DE COMITÉ No 45 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
28-Agos-20	ACTA DE COMITÉ No 46	ACTA DE COMITÉ No 46 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
03-Sep-20	ACTA DE COMITÉ No 47	ACTA DE COMITÉ No 47 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
11-Sep-20	ACTA DE COMITÉ No 48	ACTA DE COMITÉ No 48 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
18-Sep-20	ACTA DE COMITÉ No 49	ACTA DE COMITÉ No 49 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
25-Sep-20	ACTA DE COMITÉ No 50	ACTA DE COMITÉ No 50 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
01-Oct-20	ACTA DE COMITÉ No 51	ACTA DE COMITÉ No 51 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS,	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET

FECHA	CONSECUTIVO	TEMA	SEDE
		LEGALES, AMBIENTALES Y SST	
08-Oct-20	ACTA DE COMITÉ No 52	ACTA DE COMITÉ No 52 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
15-Oct-20	ACTA DE COMITÉ No 53	ACTA DE COMITÉ No 53 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
23-Oct-20	ACTA DE COMITÉ No 54	ACTA DE COMITÉ No 54 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
29-Oct-20	ACTA DE COMITÉ No 55	ACTA DE COMITÉ No 55 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
05-Nov-20	ACTA DE COMITÉ No 56	ACTA DE COMITÉ No 55 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
12-Nov-20	ACTA DE COMITÉ No 57	ACTA DE COMITÉ No 57 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
20-Nov-20	ACTA DE COMITÉ No 58	ACTA DE COMITÉ No 58 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET
24-Nov-20	ACTA DE COMITÉ No 59	ACTA DE COMITÉ No 59 – SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGALES, AMBIENTALES Y SST	VIDEOCONFERENCIA GOOGLE MEET

Tabla 10 Control de Actas de Reunión y Actas de Comité

Se realizaron las actas de comité de obra y de reunión de seguimiento al contrato de obra No 4233000-731-2019, en cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, Numeral 9.

3.3 COPIA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y OBRA.

3.3.1 CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019

No	TIPO DE DOCUMENTOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
1	Contrato de obra No 4233000-731-2019	20 Junio de 2019	Suscripción del contrato inicial, una vez adjudicado el proceso	Ver anexo No 1
2	Acta de inicio	28 de Junio de 2019	Iniciación del contrato de obra	Ver anexo No 1
3	Adición y prorroga No 1	20 de Diciembre de 2019	Se prorroga el contrato de obra en cinco (5) meses y se adiciono en $1.177.511.766.	Ver anexo No 1
4	Aclaratorio No 1 al contrato que modifico y adiciono y prorroga el contrato de obra pública	13 de Marzo de 2020	Los costos del contrato de interventoría No. 4233000-730-2019 que se generen en el frente de obra del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación durante el período de ejecución de las actividades a desarrollar, es decir,	Ver anexo No 1

No	TIPO DE DOCUMENTOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
	No 4233000-731-2019		entre el cinco (5) de febrero de 2020 y el dieciséis (16) de marzo de 2020, serán asumidos por el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, de acuerdo con la estimación tasada en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30'000.000) M/CTE	
5	Suspensión No 1	25 de Marzo de 2020	Se declara el aislamiento obligatorio por decreto nacional.	Ver anexo No 1
6	Suspensión No 2	14 de Abril de 2020	Se amplía el aislamiento obligatorio por decreto Nacional	Ver anexo No 1
7	Suspensión No 3	27 de Abril de 2020	Se amplía el aislamiento obligatorio por decreto Nacional	Ver anexo No 1
8	Adición y prorroga No 2	29 de Mayo de 2020	Se prorroga el contrato de obra en TREINTA Y SIETE DIAS (137) EQUIVALENTE A CUATRO PUNTO CINCUENTA Y SEIS MESES (4.56) y se adiciono en $460.779.809	Ver anexo No 1

Tabla 11 Control legal del contrato de Interventoría

3.3.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019

No	TIPO DE DOCUMENTOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
1	Contrato de obra No 4233000-730-2019	20 Junio de 2019	Suscripción del contrato inicial, una vez adjudicado el proceso	Ver anexo No 1
2	Acta de inicio	28 de Junio de 2019	Iniciación del contrato de interventoría	Ver anexo No 1
3	Adición y prorroga No 1	20 de Diciembre de 2019	Se prorroga el contrato de obra en cinco (5) meses y se adiciono en $ 268.441.148.	Ver anexo No 1
4	Adición No 2	04 de Febrero de 2020	Se adiciono en $ 37.546.512,41	Ver anexo No 1
5	Suspensión No 1	25 de Marzo de 2020	Se declara el aislamiento obligatorio por decreto nacional.	Ver anexo No 1
6	Suspensión No 2	14 de Abril de 2020	Se amplía el aislamiento obligatorio por decreto Nacional	Ver anexo No 1
7	Suspensión No 3	27 de Abril de 2020	Se amplía el aislamiento obligatorio por decreto Nacional	Ver anexo No 1
8	Adición No 3 y Prorroga No 2	29 de Mayo de 2020	Se prorroga el contrato en treinta y siete días (137) equivalente a cuatro punto cincuenta y seis meses (4.56) y se adiciono en $ 269.250.497	Ver anexo No 1

Tabla 12 Control legal del contrato de Obra

3.4 RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexa al presente informe final el certificado de pago de parafiscales de ARQUITECTURA URBANA LTDA, así como la relación de pago de planillas que soportan el pago de dicha certificación, también se anexa los paz y salvos de todos y cada uno de los profesionales que hicieron parte del contrato de Interventoría. (VER ANEXO No 11)

3.5 SOPORTES DE BIENES Y CANTIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO AL ANEXO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Es de aclarar antes de dar cumplimiento a lo descrito en el título del presente ítem, el cual es propuesto dentro de la planilla de informe final, suministrado por la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, que la interventoría no tiene dentro de

la oferta económica o bien llamada anexo económico, relación de ningún bien o cantidad ejecutada, para el contrato de interventoría, ya que no fuimos los ejecutores del contrato, fuimos los interventores.

Sin embargo a fin de dar respuesta a la solicitud de la plantilla propuesta, es de informar que dentro de los balances finales de cada una de las sedes, se evidencian los equipos suministrados e instalados por el CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El plazo de ejecución del contrato contado a partir de la firma del Acta de inicio para la relación de cada una de las etapas de Pre-Construcción o Construcción, esta descrito en la siguiente tabla, así como el plazo final actualizado según modificatorio No 2 firmado el día 29 de Mayo de 2020.

PROYECTO	ETAPA	PLAZO	PLAZO INICIAL	PLAZO FINAL	RESULTADO
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES	20/06/2019	27/12/2019	OBRA/INTERVENTORIA
	SEGÚN ACTA DE INICIO	SEIS (6) MESES	28/06/2019	28/12/2019	OBRA/INTERVENTORIA
	MODIFICATORIO No 1	CINCO (05) MESES	28/12/2019	27/05/2020	OBRA/INTERVENTORIA
	SUSPENSIÓN No 1	VEINTE (20) DIAS	25/03/2020	13/04/2020	OBRA/INTERVENTORIA
	SUSPENSIÓN No 2	TRECE (13) DIAS	14/04/2020	26/04/2020	OBRA/INTERVENTORIA
	SUSPENSIÓN No 3	CATORCE (14) DIAS	27/04/2020	10/05/2020	OBRA/INTERVENTORIA
	PRORROGA No 2	TREINTA Y SIETE DÍAS (137) EQUIVALENTE A CUATRO PUNTO CINCUENTA Y SEIS MESES (4.56)	11/05/2020	28/11/2020	OBRA/INTERVENTORIA

Tabla 13 Plazo de ejecución contrato de Interventoría.

4. ASPECTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS

4.1 GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019

Mediante LICITACIÓN PUBLICA 004 del 2019 realizado por la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, se le adjudica a la empresa CONSORCIO PRUNI SEDES 04. El CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019, que tiene por objeto" REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C".

GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA No.4233000-731 DEL 2019	
CONTRATISTA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONFORMADOS POR GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S. 50% UNIVERSAL SEC S.A.S. 50%
NIT:	901.294.259-1
LICITACIÓN PUBLICA	LICITACIÓN No.004 DEL 2019
REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS
DIRECCIÓN	Calle 98 No. 70-91 OFC 812 –BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO	7441529
No. DE CONTRATO	No 4233000-731-2019 del día 20 de junio de 2019.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.543.865.874
VALOR ADICIÓN No 1	$ 1.177.511.766
VALOR ADICIÓN No 2	$ 460.779.809
VALOR FINAL INICIAL	$ 6.182.157.449
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO CONTRATO	28 DE JUNIO DE 2019
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGA UNO (1)	CINCO (05) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL SEGÚN MODIFICATORIO No 1 FIRMADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	27 DE MAYO DE 2020
SUSPENSIÓN No 1	25 DE MARZO DE 2020 HASTA EL 13 DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN No 2	14 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN No 3	27 DE ABRIL DE 2020 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2020
REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA	11 DE MAYO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN PRORROGA DOS (2)	CUATRO MESES Y MEDIO (4.5)
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No 2 FIRMADA EL 29 DE MAYO DE 2020	28 DE NOVIEMBRE DE 2020

Tabla 14. Control Legal Contrato de Obra No 4233000-731-2019 del 20 de junio de 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

4.2 PERMANENCIA DEL PERSONAL EN OBRA

4.2.1 REPORTE DE PERMANENCIA PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO	CARGO	NOMBRE	% DE PERMANENCIA	PERMANENCIA EFECTIVA EN DIAS*MES
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ARQ. HERNANDO DAZA BERRIO	50%	15 días

PERIODO	CARGO	NOMBRE	% DE PERMANENCIA	PERMANENCIA EFECTIVA EN DIAS*MES
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE MANZANA LIÉVANO	CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAÑO	100%	30 días
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	JESSICA LOPERA ARANGO	100%	30 DIAS
DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE MARZO DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	NANCY ROCIÓ AYALA GOMEZ	100%	30 DIAS
DEL 16 DE MARZO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	FERNANDO AGUIRRE MEDINA	100%	30 DIAS
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAÑO	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 5 DE FEBRERO DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ÁLVARO ANDRÉS NÚÑEZ DÍAZ	100%	30 DIAS
DEL 6 DE FEBRERO DEL 2020 AL 21 DE MARZO DE 2020	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAÑO	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ	100%	30 DIAS
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	FERNANDO AGUIRRE MEDINA	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020|	INSPECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA	JOSÉ ABELINO VARGAS TENJO	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DEL 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	INSPECTOR SISOMA	JUAN CARLOS BRICEÑO	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	PROFESIONAL SISOMA DE LA INTERVENTORIA	DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR EN ESTRUCTURAS	HERNÁN MAHECHA PULIDO	40%	12 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR EN REDES CONTRAINCENDIO	FRANCISCO ALEJANDRO GALVIS DELGADO	40%	12 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	GEOTECNISTA	JAVIER MILLÁN LÓPEZ	15%	5 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR ELECTRICISTA	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	30%	9 DIAS

Tabla 15. Control Profesionales de la interventoría.

Según la fecha de finalización inicial para la sede CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN la cual era el 4 de Febrero de 2020, el profesional ING. ÁLVARO ANDRÉS NÚÑEZ DÍAZ, residente técnico para la sede CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN acompaño en sus funciones técnicas, administrativas y financiero hasta dicha fecha, a partir del día 5 de Febrero de 2020 y una vez finalizada la sede MANZANA LIÉVANO el día 20 de Enero de 2020, el ING. CARLOS GIOVANNI WILCHEZ MONTAÑO paso a ser el residente técnico de dicha sede y hasta la fecha del presente informe mensual ejerce el cargo de residente técnico, para CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

Mediante oficio No 2-2020-8032 del día 19 de Marzo de 2020 la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, solicita el cambio de la residente de Interventoría ARQ. NANCY ROCIÓ AYALA GÓMEZ, debido a que según la Entidad contratante, la profesional no respondió de manera satisfactoria en los diferentes comités internos y generales.

Razón por la cual la INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA en virtud a lo solicitado por la entidad contratante, mediante oficio con radicado No 1-2020-13430 del día 20 de mayo de 2020, presenta a la entidad contratante el cambio de dicha profesional informando que:

El ARQ. FERNANDO AGUIRRE MEDINA con Cedula de Ciudadanía No 7.182.768 de Tunja - Boyacá, entrara a ejercer el cargo de residente Administrativo a partir de la fecha, para ello se envió la hoja de vida del profesional a fin de que la entidad contratante lo avalara, así mismo y dando respuesta al oficio No 2-2020-8032 del día 19 de Marzo de 2020, donde nos solicitaron el cambio de la profesional NANCY ROCIÓ AYALA- Residente Técnica para la sede IMPRENTA DISTRITAL, profesional esta que ejerció su cargo hasta el día 21 de Marzo de 2020, fecha en la cual se declaró por parte del GOBIERNO NACIONAL el aislamiento Obligatorio, la interventoría no pudo informar que profesionales remplazara a dicha profesional.

En ese orden de ideas, se informó que la profesional que entrara a ejercer el cargo de residente técnica de Interventoría para la sede IMPRENTA DISTRITAL, será la ING PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ con Cedula de Ciudadanía No 52.959.013 de Bogotá D.C., hoja de vida que ya reposa en los archivos de entidad y fue avalada por la misma.

Mediante oficio No 2-2020-14019 del día 27 de mayo de 2020, la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, aprueban las hojas de vida de la ING. PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ como residente técnica de Interventoría para la sede IMPRENTA DISTRITAL y del ARQ. FERNANDO AGUIRRE MEDINA como residente administrativo**.**

El día 15 de Septiembre de 2020 mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 555 y radicado No 1-2020-25039 de la misma fecha, la Interventoría envía hoja de vida del ING. CARLOS GIOVANNI WILCHES MONTAÑO, para el cargo de residente técnico, quien remplazo a la ING PAULA FERNANDA MORALES SÁNCHEZ.

Mediante oficio No 2-2020-28525 del día 18 de Septiembre de 2020 se aprueba la hoja de vida del ING. CARLOS GIOVANNI WILCHES MONTAÑO por parte de la entidad contratante.

4.2.2 REPORTE DE PERMANENCIA PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERIODO	CARGO	NOMBRE	% DE PERMANENCIA	PERMANENCIA EFECTIVA EN DIAS*MES
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FREDY GÓMEZ GARCÉS	50%	15 días
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 20 DE ENERO DE 2020	RESIDENTE DE OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	OSCAR MAURICIO RIBERO MARTÍNEZ	100%	30 días
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESIDENTE DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	INGRID ALEJANDRA BOLAÑOS	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 5 DE FEBRERO DE 2020.	RESIDENTE DE OBRA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ZORAYA RUIZ OLAYA	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	SANDRA LUCIA PARRA JIMÉNEZ	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JULIO DE 2019 AL 28	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	MARILUZ CABARCAS	100%	30 DIAS

PERIODO	CARGO	NOMBRE	% DE PERMANENCIA	PERMANENCIA EFECTIVA EN DIAS*MES
DE NOVIEMBRE DE 2020	PONDERABLE	GÓMEZ		
DEL 28 DE JUNIO DEL 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	PROFESIONAL SISOMA DE OBRA	WILLIAM FONSECA VARGAS	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PROFESIONAL SISOMA DE OBRA	SARA ESPERANZA SERRANO HERNÁNDEZ	100%	30 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR EN ESTRUCTURAS	JUAN JACOBO PINILLA RODRÍGUEZ	40%	12 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR EN REDES CONTRAINCENDIO	CARLOS AUGUSTO SUAREZ MAYORCA	40%	12 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	GEOTECNISTA	PEDRO IGNACIO VELANDIA	15%	5 DIAS
DEL 28 DE JUNIO DE 2019 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ASESOR ELECTRICISTA	CARLOS ALBERTO VALENCIA SÁNCHEZ	30%	9 DIAS

Tabla 16. Control Profesionales del contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

Cada uno de los profesionales anteriormente mencionados y presentados por el contratista, cumplen con todos los requerimientos solicitados formando parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO PRUNI SEDES 04**, Proceso Revisado, Verificado y/o Validado por la **SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.,** todos los perfiles de los profesionales aprobados cumplen con la experiencia específica exigida de acuerdo a los PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONTRATO, la entidad mediante comité de obra No cuatro (4) entrega a la Interventoría un CD, que contiene la evaluación de cada uno de los profesionales para el contrato de obra.

Sin embargo, mediante oficio No 1-2019-21260 del día veintiuno (21) de Agosto de 2019 se solicitó el cambio del residente de obra para la sede MANZANA LIÉVANO bajo los siguientes argumentos:

Nuevamente mediante oficio No 1-2019-21756 del día veintisiete (27) de agosto de 2019 se le solicita al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 el cambio y reemplazo inmediato del residente de obra.

Mediante oficio No 1-2019-24135 del día 24 de Septiembre de 2019 la Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, traslada la hoja de vida del residente técnico ARQ. DARÍO ALBERTO FRANCO FIGUEREDO con Cedula de Ciudadanía NO 86.060.271 del Villavicencio y MP. A25012006-860660271 CND, como remplazo del ARQ. OSCAR MAURICIO RIBERO MARTÍNEZ, para la sede MANZANA LIÉVANO a la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

Mediante oficio No 1-2019-26109 del día 16 de Octubre de 2019 la Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA da traslado de la hoja de vida de la residente en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ING. TANIA ERIKA ROMERO LEAL con Cedula de Ciudadanía No 37.510.531 de BUCARAMANGA Y MP 25228211283 CND en remplazo de la ING. SARA ESPERANZA SERRANO HERNÁNDEZ, a la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.

4.3 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO POR LA INTERVENTORIA

4.3.1 FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA

FORMA DE PAGO: La forma de pago para la etapa de **OBRA** de acuerdo al Contrato de Obra se resume así:

- **FORMA DE PAGO:**

LA SECRETARIA GENERAL de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., cancelara el valor del contrato mensualmente de acuerdo con las actas parciales según avance de la obra ejecutada, revisada y aceptada por parte de la Interventoría, quien será la encargada de presentar a la entidad contratante el documento que certifique el cumplimiento del contratista de obra al cobro realizado para que la Entidad contratante tramite en debida forma la cuenta, incluido el AU. El pago se realizara acorde con los análisis de precios unitarios (APU's) y la correspondiente cantidad de obra con su unidad de medida, según el presupuesto ofertado y adjudicado.

- **VALOR CONTRACTUAL INICIAL DEL CONTRATO**: El presente contrato es por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.543.865.874) M/CTE**, Incluyendo los costos directos e indirectos y demás impuestos aplicables; que se ejecutaran de conformidad con los valores producidos en la etapa construcción que se relacionan a continuación de acuerdo al contrato de obra:
- **VALOR DE LA ADICIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No 1 FIRMADO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019**: Mil ciento setenta y siete millones quinientos once mil setecientos sesenta y seis pesos. ($1.177.511.766)
- **VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ADICIÓN No 1**: Cinco mil setecientos veintiuno millones trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta pesos ($5.721.377.640)
- **VALOR DE LA ADICIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No 1 FIRMADO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019**: Cuatrocientos sesenta millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos nueve pesos. ($ 460.779.809)
- **VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA INCLUIDA ADICIÓN No 2**: Seis mil ciento ochenta y dos millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos. ($ 6.182.157.449)

4.3.2 VALORES Y COSTOS INICIALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Nº DE CDP	Nº DE PROYECTO	CDP	ALCANCE	VALOR CDP
4233000-731-2019	MANZANA LIÉVANO- EDIFICIO PALACIO LIÉVANO, EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, EDIFICIO BICENTENARIO I Y EDIFICIO BICENTENARIO II	859	Ajustes adecuaciones complementaciones y puesta en funcionamiento de los sistemas de detección y extinción que conforman el sistema protección contra incendios incluyendo el sistema eléctrico hasta la puesta en funcionamiento Ajustes adecuación y complementación en Red hidráulica relacionada con la red contra incendios. Adecuación del tanque de almacenamiento de agua existentes	$934.831.000
	IMPRENTA DISTRITAL	882	Reforzamiento estructural Ajustes adecuación y complementación en zonas húmedas en la red de aguas lluvias y en la red Hidrosanitaria y eléctrica Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de detección y extinción que conforman el sistema de protección	$2.791.261.078

Nº DE CDP	Nº DE PROYECTO	CDP	ALCANCE	VALOR CDP
			contra incendios incluyendo el tanque de almacenamiento de agua	
	CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	921	Tratamiento de fisura sobre la estructura en general Construcción de proyecto y filtros perimetrales a los espejos de agua Ajustes adecuación y complementaciones en red Hidrosanitaria y eléctrica	$900.290.169
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL : CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				**$4.543.865.874**

VALORES Y COSTOS FINALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN LA FIRMA DE LOS MODIFICATORIOS No 1 Y No 2

Nº DE CDP	Nº DE PROYECTO	CDP	ALCANCE	VALOR CDP
4233000-731-2019	MANZANA LIÉVANO- EDIFICIO PALACIO LIÉVANO, EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, EDIFICIO BICENTENARIO I Y EDIFICIO BICENTENARIO II	859	Ajustes adecuaciones complementaciones y puesta en funcionamiento de los sistemas de detección y extinción que conforman el sistema protección contra incendios incluyendo el sistema eléctrico hasta la puesta en funcionamiento Ajustes adecuación y complementación en Red hidráulica relacionada con la red contra incendios. Adecuación del tanque de almacenamiento de agua existentes	**$ 308.010.495**
	IMPRENTA DISTRITAL	882	Reforzamiento estructural Ajustes adecuación y complementación en zonas húmedas en la red de aguas lluvias y en la red Hidrosanitaria y eléctrica Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de detección y extinción que conforman el sistema de protección contra incendios incluyendo el tanque de almacenamiento de agua	$ 455.854.710 $ 223.283.702 **EQUIPO EPU** $ 460.779.809
	CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	921	Tratamiento de fisura sobre la estructura en general Construcción de proyecto y filtros perimetrales a los espejos de agua Ajustes adecuación y complementaciones en red Hidrosanitaria y eléctrica	$ 190.362.859
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS				**$1.638.291.575**

4.3.3 VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:

Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-390 del día 18 de Mayo de 2020 con asunto *SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Adicionar el contrato en $460.779.809 con una prórroga de 4.5 meses contados a partir de la fecha de finalización inicial 13 de Julio de 2020.*

Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-391 del día 18 de Mayo de 2020 y con asunto: *SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA* la interventoría solicito una prórroga por cuatro meses y medio (4.5) meses y una adición por CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CERO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($157.062.789,64).

4.3.4 VALOR FACTURADO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA NO 4233000-731-2019

Las cuentas parciales que se ha dado traslado a la entidad contratante mediante Lo siguientes oficios:

- Oficio No 1-201925213 del día 4 de Octubre de 2019 se envía el acta parcial de obra con corte al día 31 de Agosto de 2019.
- Oficio No 1-2019-27403 se envía el acta parcial de obra con corte al día 30 de Septiembre de 2019
- Oficio No 1-2019-30435 se envía el acta parcial de obra con corte al día 31 de Octubre de 2019.
- Oficio No 1-2019-32127 se envía el acta parcial de obra con corte al día 30 de Noviembre de 2019.
- Oficio No 1-2019-32713 se envía el acta parcial de obra por suministro del equipo EPU IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1 correspondiente al mes de diciembre de 2.019
- Oficio No 1-2020-6885 se envía el acta parcial de obra con corte al día 30 de diciembre de 2019.
- Oficio No 1-2020-7437 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Enero de 2020.
- Oficio No 1-2020-14635 se envía el acta parcial de obra a corte del día 29 de Febrero de 2020.
- Oficio No 1-2020- 17374 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Marzo de 2020.
- Oficio No 1-2020-17375 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Mayo de 2020
- Oficio No 1-2020-18010 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Junio de 2020
- Oficio No 1-2020-21350 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Julio de 2020
- Oficio No 1-2020-24843 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Agosto de 2020.
- Oficio No 1-2020-28132 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Septiembre de 2020
- Oficio No 1-2020-32505 se envía el acta parcial de obra a corte del día 30 de Octubre de 2020

Es de aclarar que el contrato de obra y de interventoría ha tenido tres (3) suspensiones desde el día 24 de Marzo hasta el día 11 de Mayo de 2020, razón por la cual no hubo facturación para el mes de abril de los contratos de obra y de Interventoría.

4.3.5 ESTADO DE PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000 – 731 –2019

A la fecha del presente informe mensual la actualización de la póliza reportada para el contrato, se realiza de acuerdo a la suscripción del mismo, en la que se evidencia que las coberturas y amparos cumplen con respecto a lo estipulado en las GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C NIT. 899.999.061-9, garantía única para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en los artículos 111 y 116 del Decreto 1510 de 2103, la cual deberá constituirse dentro de los primeros (01) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Las pólizas se relacionan en las siguientes tablas de control y se encuentran actualizadas de acuerdo a la firma del Contrato de obra y Acta de inicio, aprobado por la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C a través de la PLATAFORMA SECOP II, para el contrato.

EMISIÓN PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL, EXPEDICIÓN: 25 DE JUNIO DE 2020. ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
NO. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO – 0 Y 1 – FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2019	27/06/2020	$1.363.159.764
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	27/12/2022	$227.193.294

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$908.773.176
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.363.159.764

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO – 0 Y 1 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	20/06/2019	27/12/2022	414.058.000

Tabla 17. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO – 3 Y 4 - DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2019	05/07/2020	$1.363.159.764
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2019	04/01/2023	$227.193.294
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.363.159.764
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.363.159.764

Tabla 18. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO – 3 Y 4 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	20/06/2019	04/01/2020	414.058.000

Tabla 19. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 6, 7 y 8 DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No 1 FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	05/12/2020	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	04/06/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 6, 7 y 8 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	04/06/2020	414.058.000

Tabla 20 Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 12 Y 13 DE ACUERDO A LA SUSPENSIÓN No 1 DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	25/12/2020	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	25/06/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 9 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	04/06/2020	414.058.000

Tabla 21. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 14 Y 15 DE ACUERDO A LA SUSPENSIÓN No 2 DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	25/12/2020	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	10/07/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 10 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	04/06/2020	414.058.000

Tabla 22. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 16, 17 y 18 DE ACUERDO A LA SUSPENSIÓN No 3 DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	10/01/2021	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	25/07/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 11 y 12 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	25/07/2020	414.058.000

Tabla 23. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 19 DE ACUERDO AL REINICIO DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	25/01/2019	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	25/07/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 7 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 13 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	25/07/2020	414.058.000

Tabla 24. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

No. DE PÓLIZA: 21-44-101299321 ANEXO 21 DE ACUERDO AL MODIFICATORIO FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2020 DONDE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA TAL COMO SE RELACIONAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMPAROS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2019	11/06/2021	$1.716.413.292
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2019	11/12/2023	$286.068.882
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		$1.144.275.528
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 6 MESES Y 29 DIAS		$1.716.413.292

No. DE PÓLIZA: 21-40-101137341 ANEXO 14 – EMISIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	28/06/2019	10/12/2020	414.058.000

Tabla 25. Control Legal etapa de obra contrato de obra 4233000-731-2019 del día 29 de mayo de 2020 CONSORCIO PRUNI SEDES 04

A la fecha las garantías del contrato de obra se encuentran actualizadas y aprobadas y subidas en la plataforma SECOP II, según informa el CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y una vez revisados y verificados, se adjunta pantallazo de los detalles de cada una de las modificaciones de las garantías en la plataforma SECOP II para el CONSORCIO PRUNI SEDES 04.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Bienes
Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza: 2144101299321

Tomador: CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Beneficiario: DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.854.647.234,70 COP	11/06/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	309.107.872,45 COP	11/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	1.236.421.489,80 COP	28/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1.854.647.234,70 COP	27/06/2021 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	414.058.000,00 COP	10/12/2020 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

4.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA (INICIAL, MODIFICACIONES Y PROGRAMACIONES FINAL EJECUTADA

No	FECHA DE PROGRAMACIÓN	MOTIVO DE PROGRAMACIÓN
1	28 DE JUNIO DE 2021	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA
2	20 DE DICIEMBRE DE 2019	PRORROGA Y ADICIÓN No 1
3	29 DE MAYO DE 2020	PRORROGA Y ADICIÓN No 2

Tabla 26. Trazabilidad programaciones de obra

4.5 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LAS MODIFICACIONES AL DISEÑO APROBADAS POR INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN

4.5.1 INFORME TRAZABILIDAD CONSULTORÍA - SEDE IMPRENTA DISTRITAL

Teniendo en cuenta las mayores cantidades de obra que se presentaron en la sede IMPRENTA DISTRITAL, así como las actividades no previstas que se generaron en el transcurso de la obra y su afectación al presupuesto y cronograma de obra, y que como consecuencia dieron origen a la solicitud de adición y prorroga al contrato de obra 423300-731-2019 y contrato de interventoría 423300-730-2019, a continuación se informa la trazabilidad e implicaciones que se originaron desde la concepción del contrato de obra y la información base entregada por la consultoría P&D SAS

TRAZABILIDAD DE ACLARACIÓN DE DUDAS AL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA FRENTE A PLANIMETRÍA E INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA P&D SAS

En la reunión de inicio de las obras, el día veintiocho (28) de junio de 2019, la entidad entrega a la interventoría y al contratista de obra la información de las consultorías de cada una de las sedes para su análisis y ejecución del contrato.

Dando cumplimiento al numeral 4 del anexo técnico del contrato de obra y de interventoría, se radica ante la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C por parte de la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA documento en el cual se adjunta los informes de ingeniería de detalle o revisión técnica de documentación realizados por la interventoría y por el contratista de obra.

A continuación, se presenta cuadro control de cada una de las fechas de esta trazabilidad, donde se evidencia que las aclaraciones totales frente a las dudas elevadas a la consultoría P&D SAS de la información base entregada, se dio hasta el mes de septiembre, por lo cual fue perjudicada la obra en su proceso de ejecución y tiempos, por la falta de subsanación de las dudas y observaciones de la información inicial entregada

IMPRENTA DISTRITAL-CUADRO CONTROL ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA CONSULTORÍA A LA OBRA Y SUS POSTERIORES ACLARACIONES DE DUDAS Y OBSERVACIONES AL CONTRATISTA DE OBRA Y A LA INTERVENTORIA		
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE ENTREGA	MEDIO DE ENTREGA
ENTREGA DE INFORME DE CONSULTORÍA A CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	28 JUNIO DE 2019	EN REUNIÓN DE INICIO DE OBRAS
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PRECONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA (CONTIENE LAS DUDAS Y OBSERVACIONES FRENTE A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA)	29 JULIO DE 2019	OFICIO A LA ENTIDAD
COMPONENTE ESTRUCTURAL-ACLARACIONES A LAS DUDAS Y OBSERVACIONES DEL	10 SEPTIEMBRE DE 2019	ACTA DE COMITÉ Nº49 Y ENTREGA DE

IMPRENTA DISTRITAL-CUADRO CONTROL ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA CONSULTORÍA A LA OBRA Y SUS POSTERIORES ACLARACIONES DE DUDAS Y OBSERVACIONES AL CONTRATISTA DE OBRA Y A LA INTERVENTORIA		
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	**FECHA DE ENTREGA**	**MEDIO DE ENTREGA**
INFORME DE RECONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORÍA P&D SAS		PLANIMETRÍA ESTRUCTURAL ACLARATORIA
COMPONENTE ELÉCTRICO-ACLARACIONES A LAS DUDAS Y OBSERVACIONES DEL INFORME DE PRECONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORÍA P&D SAS	27 AGOSTO DE 2019	CORREO ELECTRÓNICO
COMPONENTE HIDROSANITARIO-ACLARACIONES A LAS DUDAS Y OBSERVACIONES DEL INFORME DE PRECONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORÍA P&D SAS	16 SEPTIEMBRE DE 2019	ACTA DE REUNIÓN Nº50 Y ENTREGA DE PLANIMETRÍA HIDROSANITARIA ACLARATORIA

Tabla 27. Trazabilidad consultoría.

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y VISITA DE LA CONSULTORÍA P&D SAS A LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL

Durante la ejecución de la obra, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA en cumplimiento del numeral 10 de las notas de los planos estructurales de la consultoría P&D SAS referenciadas en el plano estructural RE-01 que indica "*La información obtenida con los levantamientos, se recopilo con base en una exploración limitada, con lo que solicitamos informar a PROYECTOS Y DISEÑOS SAS sobre cualquier diferencia señalada en estos planos".* Informó a través del profesional de apoyo a la supervisión ARQ. MAURICIO PULIDO SIERRA a la consultoría P&D SAS de los hallazgos encontrados en la obra y solicitó la visita y aclaración de cada uno de los puntos expuestos

De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación cuadro control y trazabilidad que muestra cada una de las solicitudes de visita de la CONSULTORÍA P&D a la obra IMPRENTA DISTRITAL.

CUADRO CONTROL SOLICITUD DE VISITA E INQUIETUDES DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA ANTE LA CONSULTORÍA P&D SAS- SEDE IMPRENTA DISTRITAL				
FECHA DE SOLICITUD	**REALIZADA POR**	**CAUSA DE LA SOLICITUD**	**FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD**	**IMPLICACIONES**
8 DE AGOSTO DE 2019	CORREO	No se encuentra el suelo de fundación en el área administrativa en el nivel que muestra los planos aun cuando se ha excavado más de 2,1 metros- se encuentran zapatas en un nivel de -1.80mts las cuales no se evidencian en la planimetría existente y solicitud de aclaraciones del componente eléctrico	13 AGOSTO DE 2019	Mayores cantidades de excavación y concreto ciclópeo. Se detuvo las actividades durante 5 días mientras se daba respuesta por la consultoría, se aumenta el tiempo de ejecución por riesgo de socavación- estaba prevista en el estudio de suelos pero no estaba así en diseños
13 AGOSTO DE 2019	REUNIÓN	Solución de dudas en planos estructurales y encuentro de tubería de gres	20 AGOSTO DE 2019	Actividad no prevista para la tubería de gres- no previsible
26 AGOSTO DE 2019	CORREO	Solicitud de diseño de estructura y de cimentación para construcción de muro en el edificio de archivo	11 SEPTIEMBRE DE 2019	Afectó en tiempo ya que no se podía iniciar actividades hasta no tener la solución de la consultoría, aumento las cantidades de obra en columnetas, viguetas y en aceros de refuerzo- era previsible en la etapa de diseño
28 DE AGOSTO DE 2019	CORREO	Vigas desvinculadas en cimentación en el área administrativa- viga desplazada en el entrepiso donde se construirá muro pantalla ml m2	2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Afectó en tiempo ya que no se podía iniciar actividades hasta no tener la solución de la consultoría- era previsible en la etapa de diseño
15 OCTUBRE DE 2019	CORREO	Se encuentra que en el área de	8 NOVIEMBRE DE 2019	Afecto en el presupuesto en 200 millones de

CUADRO CONTROL SOLICITUD DE VISITA E INQUIETUDES DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA ANTE LA CONSULTORÍA P&D SAS- SEDE IMPRENTA DISTRITAL				
FECHA DE SOLICITUD	**REALIZADA POR**	**CAUSA DE LA SOLICITUD**	**FECHA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD**	**IMPLICACIONES**
		producción no hay vigas de cimentación y si hay zapatas que no muestran los planos, también se evidencia que las columnas son machones en mampostería		pesos, ya que la solución propone nuevas zapatas, muros, cimentación y vigas. Afecto en tiempo ya que para ejecutar estas nuevas actividades requieren aproximadamente 2 meses- el no encontrar vigas de cimentación no era previsible, el encontrar que las columnas no eran de concreto si era previsible
27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CORREO	Propuesta de solución de reforzamiento de vigas aéreas en concreto sobre las cuales reposan las cerchas en madera	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	Modificación al presupuesto- si era previsible ya que visualmente se puede ver el apoyo directo de las cerchas sobre la viga en concreto
14 DE NOVIEMBRE DE 2019	CORREO	Amarre de vigas a machones en mampostería, arranque de columna en concreto donde se demolerá la columna en mampostería, colocación de malla sobre muros nuevos realizados	10 DE DICIEMBRE DE 2019	Afecto en tiempo ya que se detienen las labores por los hallazgos encontrados- si era previsible saber y detallar como hacer anclajes a machones en mampostería
25 NOVIEMBRE DE 2019	CORREO	Definición muro nuevo para transformador baja en el área de producción.	NO SE TIENE RESPUESTA	Afecto en tiempo ya que no se avanza en las labores por falta de definición- si era previsible
4 DE DICIEMBRE DE 2019	CORREO	Zapatas existentes en el área de producción no tienen concreto ciclópeo	10 DICIEMBRE DE 2019	Afecto en tiempo ya que no se avanza en las labores por falta de definición- si era previsible ya que el nuevo diseño se realizó cuando las excavaciones ya estaban expuestas
13 DE DICIEMBRE DE 2019	CORREO	Solicitud de diseño de columna en concreto en muros m5 y m6 a causa de demolición de machones en mampostería demolidos por falta de cimentación	NO SE TIENE RESPUESTA	Afecto en tiempo ya que no se avanza en las labores por falta de definición- no era previsible
16 DICIEMBRE DE 2019	CORREO	Definición muro nuevo para transformador baja en el área de producción.	NO SE TIENE RESPUESTA	Afecto en tiempo ya que no se avanza en las labores por falta de definición- si era previsible

Tabla 28. Control de solicitudes consultoría

REUNIONES CON LA CONSULTORÍA P&D

La presente interventoría presenta a continuación cuadro control de las visitas a obra y reuniones entabladas con la CONSULTORÍA P&D SAS para la sede IMPRENTA DISTRITAL, en donde se describe la causa de la visita y las conclusiones e implicaciones en el contrato de obra de las decisiones dadas en las visitas.

CUADRO CONTROL REUNIONES CON LA CONSULTORÍA P&D SAS A LA OBRA IMPRENTA DISTRITAL						
Nº	FECHA	PROFESIONAL DE LA CONSULTORÍA	CARGO	CONCLUSIONES	SOLICITUD DE LA VISITA	IMPLICACIONES
1	26 JULIO DE 2019	RUBI PUERTO MOJICA	Directora de consultoría componente estructural	La consultoría queda con el compromiso de entregar la información adicional solicitada por la interventoría y el contratista de obra-acta de comité nº21	Se suscita reunión con el objetivo de aclarar todas las preguntas y observaciones del contratista de obra y de la interventoría	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones
	26 JULIO DE 2019	JAIRO JARAMILLO	Asesor hidrosanitario	El asesor hidrosanitario queda con el compromiso de aclarar en planos las dudas suscitadas por el contratista de obra y la interventoría una vez tenga el informe de ingeniería de detalle-acta de comité nº21	Se suscita reunión con el objetivo de aclarar todas las preguntas y observaciones del contratista de obra y de la interventoría en el componente hidrosanitario	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones
2	29 JULIO DE 2019	ALFONSO NOVOA	Asesor eléctrico	Teniendo en cuenta que la comunicación con el asesor eléctrico fue telefónica y la señal no fue buena, se queda en el compromiso de que el contratista de obra y la interventoría pasara las dudas del componente eléctrico por medio escrito para ser resuelta- pagina 4 libro de acompañamiento estructural	Se suscita reunión con el objetivo de aclarar todas las preguntas y observaciones del contratista de obra y de la interventoría en el componente eléctrico	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones
3	13 AGOSTO DE 2019	JUAN GABRIEL CARREÑO SILVA	Asesor en obra	Se define el reforzamiento estructural de las columnas en el área administrativa por los cuatro lados-pagina 5 libro de acompañamiento estructural	La interventoría solicita la visita de la consultoría para definir el procedimiento constructivo de los anclajes en las columnas de	Mayores cantidades en el acero de refuerzo
	13 AGOSTO DE 2019	GERMAN CIFUENTES	Asesor geotecnista	Se define que las excavaciones para la cimentación deben continuar hasta encontrar suelo arcilla café veteada-pagina 4 libro de acompañamiento estructural	La interventoría solicita la visita de la consultoría ya que no se encontró en las excavaciones de obra el nivel del suelo arcilla café veteado en los niveles que presenta los planos	Mayores cantidades en excavación y concreto ciclópeo
4	20 AGOSTO DE 2019	JUAN GABRIEL CARREÑO SILVA	Asesor en obra	La consultoría recomienda hacer un dado en concreto para proteger la tubería de gres encontrada-pagina 6 libro de acompañamiento estructural	La interventoría solicita la presencia de la consultoría en obra debido al encuentro de tubería de gres nueva encontrada y dudas en la planimetría	Actividades no prevista en el tubo de gres encontrado
5	22 AGOSTO DE 2019	INGENIERO ADOLFO NOVOA	Asesor eléctrico	El ing. Asesor eléctrico informa que dentro del presupuesto no tuvo en cuenta los desmontes eléctricos para el reforzamiento estructural, solo lo	La interventoría solicita la presencia del consultor en el componente eléctrico para la aclaración de las	Actividades no previstas en desmontes de aparatos eléctricos, y cambio en

CUADRO CONTROL REUNIONES CON LA CONSULTORÍA P&D SAS A LA OBRA IMPRENTA DISTRITAL						
Nº	FECHA	PROFESIONAL DE LA CONSULTORÍA	CARGO	CONCLUSIONES	SOLICITUD DE LA VISITA	IMPLICACIONES
				nuevo que se va a realizar, explica también que, prevalece las especificaciones del plano sobre las especificaciones del presupuesto – Acta de reunión Nº36	dudas frente a la planimetría entregada en el inicio del contrato	especificación de cable acometida
6	2 SEPTIEMBRE DE 2019	JUAN GABRIEL CARREÑO SILVA	Asesor en obra	La consultoría recomienda vincular las vigas a las columnas pero enviara el detalle constructivo-bitácora de obra pago 41, acta de reunión nº43	La interventoría solicita la presencia de la consultoría de sus en la obra ya que se encuentra en el proceso de excavación que las vigas de cimentación del área administrativa están desvinculadas de las columnas	Mayores cantidades de acero , de cimentación, demolición de vigas
7	10 SEPTIEMBRE DE 2019	RUBI PUERTO MOJICA	Directora de consultoría – Diseño componente estructural	La consultoría P&D SAS da solución al detalle de como vincular las vigas preexistentes al reforzamiento de las columnas, la consultoría entrega planos donde indica como debe ser la viga de entrepiso y de remate en el muro 2. Realiza detalle de como reforzar los apoyos de la cubierta sobre las vigas, se aclara que no se tuvo en cuenta el apuntalamiento de las cerchas en madera, no se tiene aún respuesta del componente hidrosanitario, se revisa el trazado hidrosanitario para que no toque los arboles ya que el diseño inicial los afecta. Se solicita aclaración sobre equipo EPU-Acta de comité Nº39	Respuesta a las condiciones presentadas en obra vigas desvinculadas, trazado hidrosanitario sobre árboles, respuestas pendientes del informe de ingeniería de detalle	Mayores cantidades en figuración del hierro, actividad no prevista en apuntalamiento de cerchas en madera, aumento de cantidades por cambio en trazado hidrosanitario para no afectar los individuos arbóreos.
8	16 SEPTIEMBRE DE 2019	RUBI PUERTO MOJICA- JAIRO JARAMILLO	Directora de obra y diseño estructural- Asesor hidrosanitario	Aclaración de dudas hidrosanitarias y especificaciones de las redes contra incendio- Acta de comité 50	La interventoría requiere la aclaración de sobre especificaciones de las redes contra incendio	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones
9	9 OCTUBRE DE 2019	RUBI PUERTO MOJICA- JAIRO JARAMILLO	Directora de obra y diseño estructural- Asesor hidrosanitario	Se da aclaraciones sobre la red contra incendio para la sede IMPRENTA DISTRITAL-Acta de comité 69	Aclaración sobre la red contra incendio	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones
10	21 DE OCTUBRE DE 2019	JUAN GABRIEL CARREÑO SILVA	Asesor en obra	El consultor informa que estos hallazgos requiere que en oficina se realice un nuevo cálculo para determinar si es suficiente con el	La interventoría solicita la presencia de la consultoría de sus teniendo en cuenta que en el proceso de	Afecta en tiempo la demora en las aclaraciones

CUADRO CONTROL REUNIONES CON LA CONSULTORÍA P&D SAS A LA OBRA IMPRENTA DISTRITAL						
Nº	FECHA	PROFESIONAL DE LA CONSULTORÍA	CARGO	CONCLUSIONES	SOLICITUD DE LA VISITA	IMPLICACIONES
				diseño planteado o se requiere algo mas	excavación en el área de producción no se encuentran las vigas de cimentación que aparece en planimetría y se evidencia que las columnas son machones en mampostería y no en concreto	
11	10 DICIEMBRE DE 2019	JUAN GABRIEL CARREÑO SILVA	Asesor en obra	La consultoría indica que se requiere visita del asesor geotécnico para determinar si las zapatas se pueden cimentar directamente sobre el suelo natural encontrado, se aprueba la construcción de muro para transformador baja baja en el área de producción-Acta de comité 109, bitácora de obra página 135	La interventoría solicita la visita de la consultoría ya que se evidencia en obra que las zapatas no están cimentadas sobre ciclópeo como lo muestran los planos, también se solicita para poder aclarar las dudas frente a la planimetría entregada el día 8 de noviembre de 2019	Mayor cantidad en construcción de muro en mampostería. Ahorro en concreto ciclópeo en el área de producción.
12	16 DE DICIEMBRE DE 2019	GERMAN CIFUENTES				

IMPLICACIONES Y CAUSAS QUE AFECTARON BALANCE OBRA Y GENERARON MAYORES CANTIDADES

COMPONENTE HIDROSANITARIO

El componente hidrosanitario aumenta las cantidades en obra en tubería de exteriores y en tuberías interiores teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1. La CONSULTORÍA P&D SAS entrega en planimetría un diseño de redes hidrosanitarias exteriores que pasaba por encima de las zonas verdes afectando individuos arbóreos. Sin embargo, el contrato de obra del CONSORCIO PRUNI SEDES 04 no cuenta con los permisos ambientales para afectar raíces de estos árboles. Como consecuencia la solución en obra fue determinar un nuevo trazado de las redes sanitarias exteriores para que no pasara por las zonas verdes de la imprenta, esto implico mayores cantidades de tubería, accesorios y cajas.
2. La CONSULTORÍA P&D SAS entrega planimetría de las zonas interiores, sin embargo, se encuentra que en el edificio de archivo y cafetería la distribución arquitectónica de los espacios no es consecuente con lo encontrado en planimetría, esto conlleva a realizar un ajuste al trazado hidrosanitario para adecuar dichos espacios, afectando las cantidades del presupuesto.

3. Se encuentra que en la planimetría de P&D SAS los aparatos sanitarios de la batería de baños del edificio No. 1 de la IMPRENTA no se encuentran conectados con la red de reventilación, lo cual si se conecta en obra y afecta las cantidades del presupuesto aumentándolas
4. No se contempló los desmontes de las bajantes existentes ni su reinstalación para poder realizar el reforzamiento estructural de las columnas en el área administrativa, afectando el presupuesto
5. No se contempló la demolición de las cajas que reciben las aguas lluvias, acción necesaria para hacer el reforzamiento de cimentación de las columnas en el área de producción. Esta actividad afecto el presupuesto de obra.
6. No se contempló que las cimentaciones del área administrativa anulaban las cajas que recibían las aguas lluvias preexistentes lo cual requirió en obra buscar una solución con un cárcamo que tampoco estaba presupuestalmente para evacuar las aguas lluvias de esta área.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

El componente estructural aumenta en cantidades de obra y se afecta presupuestalmente debido a los siguientes hechos

1. No se evidencio en el estudio de suelos entregado a obra los lugares donde se habían hecho los apiques exploratorios y la planimetría entregada mostraba que el suelo de arcilla café veteada se encontraba a unos 50cm de profundidad, esto incidió en los tiempos de ejecución ya que al realizar excavaciones más profundas se requiere un procedimiento constructivo diferente y más cuidadoso para no desestabilizar el terreno y además las mayores cantidades de excavación y concreto ciclópeo no estuvo contemplado presupuestalmente
2. No se tuvo en cuenta el desmonte y reinstalación de las ventanas en el área administrativa, procedimiento que se requería para poder hacer anclajes a las columnas que estaban en sus laterales. Afectando el presupuesto y en tiempo de ejecución de una actividad no prevista
3. No se tuvo en cuenta la Demolición y reconstrucción de los muros de antepecho en el área administrativa, actividad necesaria como procedimiento constructivo para poder anclar el acero de refuerzo en las columnas laterales, afectando el presupuesto como una mayor cantidad
4. No se tuvo en cuenta la demolición del muro de fachada sobre el eje A en el área administrativa para la construcción del muro pantalla de concreto para reforzar.
5. No se tuvo en cuenta el desmonte y reinstalación de las puertas que estaban en las inmediaciones de las columnas del área administrativa lo cual era necesario para poder realizar el reforzamiento estructural
6. No se tuvo en cuenta dentro de las especificaciones técnicas el apuntalamiento de las placas para hacer cimentación.
7. No se tuvo en cuenta dentro de las especificaciones técnicas el apuntalamiento de las cerchas en madera del área de producción para reforzamiento de las mismas
8. No se tuvo en cuenta la demolición del cuarto de bombas que estaba aledaño a las columnas (5´-E) Y (5´-F) el cual fue necesario para el reforzamiento estructural de estas columnas
9. No se tuvo en cuenta el desmonte de mesones de baños, mesón de cocineta, muebles de cocina, lo cual fue necesario para el reforzamiento estructural y adecuación Hidrosanitaria en el área administrativa
10. La planimetría entregada por la consultoría P&D SAS contemplaba las columnas en el área de producción como elementos en concreto, sin embargo, en obra al realizar las escarificaciones la especificación de la materialidad de esta columna se evidencia que es en mampostería. Esta condición implico un cambio en el diseño estructural afectando el presupuesto en 200 millones de pesos, ya que el nuevo diseño contempló nuevas zapatas, vigas de cimentación, muros pantalla, demolición de

muros, excavaciones, concretos, perforaciones y vigas aéreas, así mismo se tuvo una implicación en el tiempo de ejecución ya que para efectos de poder realizar un nuevo diseño se debían suspender las actividades de obra que se estaban ejecutando y por otro lado el cambio del diseño implica por tanto más tiempo de ejecución frente a mayores cantidades.

COMPONENTE ELÉCTRICO

El componente eléctrico aumenta en cantidades de obra y se afecta presupuestalmente debido a los siguientes hechos

1. No se tuvo en cuenta dentro del presupuesto ningún desmonte de aparatos eléctrico en el área administrativa y en el área de producción para reforzamiento estructural, en este orden fue necesario hacer actividades no previstas tales como: Desmonte de luminarias del cielo falso, desmonte de canaletas, desmonte de tuberías en de conexión a las maquinas desmonte de tomas normales, tomas reguladas, puntos de voz y datos, interruptores eléctricos, desconexión de ups en Datacenter, tableros eléctricos normales, tableros eléctricos generales, racks, reflectores, sensores de movimiento, bandejas cableofil. A lo anterior se suma que una vez realizado el reforzamiento estructural todos los desmontes deben ser reinstalados nuevamente.
2. No se tuvo en cuenta que en el transformados baja baja que está localizado en el área de producción no tenía el suficiente espacio para maniobrar, apertura de puertas y área de seguridad, por lo que se requiere la construcción de un espacio adecuado.
3. No se tuvo en cuenta que los muros donde estará localizada la planta generadora debían estar con columnetas y vigas de amarre lo cual representó un aumento de cantidades en el presupuesto para la realización de esto.
4. En el presupuesto se contempló acometida de en cable de cobre de 3*350 MCMF sin embargo la planimetría aprobada contemplaba la acometida de cable con una especificación de 500 lo cual afecto el presupuesto de obra.

Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-242 con radicado No 1-2020-1942 del día 20 de Diciembre de 2019 la Interventoría envió el informe de trazabilidad frente a los cambios en los diseños de la sede IMPRENTA DISTRITAL,

4.6 COPIA DE CORTES PARCIALES Y ACTA DE PAGO DEL CONTRATO INTERVENTORIA RELACIONANDO EL RADICADO.

A la fecha se ha recomendado a la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, el pago de QUINCE (15) actas parciales hasta el mes de Octubre de 2020,

La Interventoría informa que a la fecha del día 28 de Noviembre de 2020, fecha de corte del presente informe final se ha facturado el 94% del contrato de obra, lo que corresponde a 5, 817, 999,781 pagado al contratista de obra el mismo valor.

De igual manera, para el contrato de interventoría se ha facturado el 90% que corresponde a $ 966,259,668

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$1,073,621,853	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$6,182,155,448.10	
ACTA MES AGOSTO DE 2019		**FECHA DE RADICACIÓN**
VALOR ACTA DE OBRA	188,290,924	1-2019-25213 del 4 de Octubre de 2019
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	20,652,275	1-2019-25214 del 4 de octubre de 2019
ACTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
VALOR ACTA DE OBRA	239,202,281	1-2019-27403 del 29 de Octubre de 2019

VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	26,236,375	1-2019-28010 del 5 de Noviembre de 2019
ACTA MES DE OCTUBRE DE 2019		
VALOR ACTA DE OBRA	389,078,990	1-2019-30045 del 28 de Noviembre de 2019
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	42,675,272	1-2019-30435 del 3 de Diciembre de 2019
ACTA MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
VALOR ACTA DE OBRA	383,742,690	1-2019-32127 del 16 de Diciembre de 2019
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	42,089,971	1-2019-32119 del 16 de Diciembre de 2019
ACTA MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
VALOR ACTA DE OBRA	1,132,873,596	1-2019-32713 del 20 de Diciembre de 2019
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	151,836,844	1-2019-32714 del 19 de Diciembre de 2019
ACTA MES DE DICIEMBRE DE 2019		
VALOR ACTA DE OBRA	574,656,746	1-2020-3980 del 4 de Febrero de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	80,791,309	1-2020-3981 del 4 de Febrero de 2020
ACTA MES DE ENERO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	883,773,804	1-2020-7437 del 3 de Marzo de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	168,783,765	1-2020-7439 del 3 de Marzo de 2020
ACTA MES DE FEBRERO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	345,923,461	1-2020-14635 del 2 de Junio de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	48,633,570	1-2020-14629 del 2 de Junio de 2020
ACTA MES DE MARZO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	369,821,336	1-2020-17374 del 30 de Junio de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	51,993,386	1-2020-17377 del 30 de Junio de 2020
ACTA MES DE MAYO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	98,381,745	1-2020-17375 del 30 de Junio de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	17,085,431	1-2020-17378 del 30 de Junio de 2020
ACTA MES DE JUNIO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	37,984,103	1-2020-18010 del 6 de Julio de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	150,307,059	1-2020-18689 del 6 de Julio de 2020
ACTA MES DE JULIO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	128,882,316	1-2020-37441 del 11 de Agosto de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	22,382,302	1-2020-21561 del 11 de Agosto de 2020
ACTA MES DE AGOSTO DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	311,249,092	1-2020-24843 del 14 de Septiembre de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	54,052,964	1-2020-24840 del 14 de Septiembre de 2020
ACTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	315.883.956	1-2020-28132 del 15 de Octubre de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	55,487,411	1-2020-28128 del 15 de Octubre de 2020
ACTA MES DE OCTUBRE DE 2020		
VALOR ACTA DE OBRA	414,629,741	No 1-2020-32505 del 17 de Noviembre de 2020
VALOR DEL ACTA DE INTERVENTORIA	33,251,733	1-2020-32666 del 17 de Noviembre de 2020

Tabla 29. Actas parciales de obra y de Interventoría

A la fecha del presente informe final está en revisión la cuenta final del contrato de obra, una vez esté aprobado los informes mensuales finales, y todo lo correspondiente a la liquidación del contrato, se recomendara a la SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, el pago final del contrato de obra.

4.7 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LOS PLANOS RECORD

No	FECHA DE REVISIÓN	CAMBIOS Y/O OBSERVACIONES	IDENTIFICACIÓN SOPORTE
1	22 DE DICIEMBRE DE 2020	Solicitud de la entrega de los planos record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-627 del 22 de diciembre de 2020 y RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36688, con asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
2	28 DE DICIEMBRE DE 2020	Solicitud de la entrega de los planos record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-632 del 28 de diciembre de 2020, con radicado No RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1300
3	9 DE JUNIO DE 2020	Revisión de los planos record	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-423 DEL 9 DE JUNIO DE 2020
4	22 DE DICIEMBRE DE 2020	Solicitud de la entrega de los planos record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-629 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020
5	18 DE ENERO DE 2021	Una vez revisado los planos record y atendidas las observaciones hechas por la Interventoría se solicitó la Impresión de los planos record.	No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637 del 18 de Enero de 2021, y RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1318, con asunto: SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 30. Trazabilidad Planos Record.

4.8 MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DEBIDAMENTE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL.

No	FECHA DE REVISIÓN	CAMBIOS Y/O OBSERVACIONES	IDENTIFICACIÓN SOPORTE
1	22 DE DICIEMBRE DE 2020	Solicitud de la entrega de los planos record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-627 del 22 de diciembre de 2020 y RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36688, con asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
2	28 DE DICIEMBRE DE 2020	Solicitud de la entrega de los planos record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-632 del 28 de diciembre de 2020, con radicado No RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1300
3	9 DE JUNIO DE 2020	Revisión de los planos record	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-423 DEL 9 DE JUNIO DE 2020
4	22 DE DICIEMBRE DE	Solicitud de la entrega de los planos	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-629 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	record de las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
5	18 DE ENERO DE 2021	Una vez revisado los planos record y atendidas las observaciones hechas por la Interventoría se solicitó la Impresión de los planos record.	No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637 del 18 de Enero de 2021, y RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1318, con asunto: SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tabla 31. Trazabilidad Manual de Mantenimiento

4.9 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

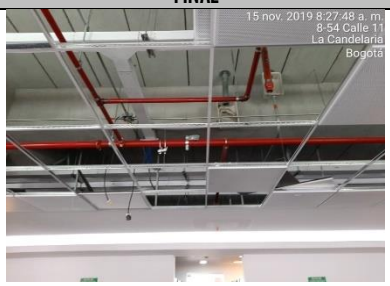
4.9.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS - SEDE MANZANA LIÉVANO.

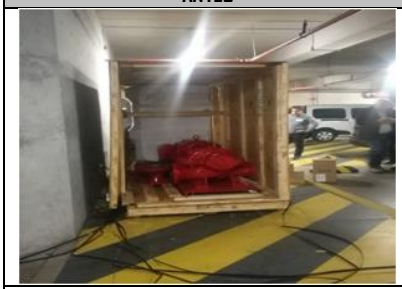
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: EDIFICIO BICENTENARIO 2 (SÓTANO 1 Y SÓTANO 2)		
Capítulo 1: CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 1: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio BICENTENARIO 2 en los sótanos 1 y 2.	**FOTO No. 2**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio BICENTENARIO 2 en los sótanos 1 y 2.	**FOTO No. 3**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio BICENTENARIO 2 en los sótanos 1 y 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 1		
Capítulo 1: CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 4: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 1	**FOTO No. 5**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 1	**FOTO No. 6**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 1

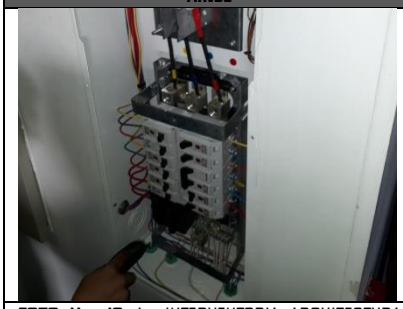
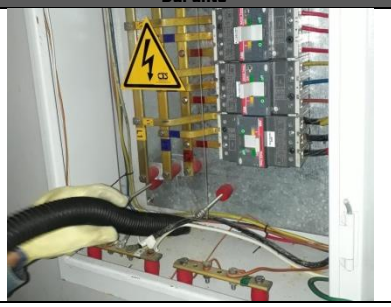
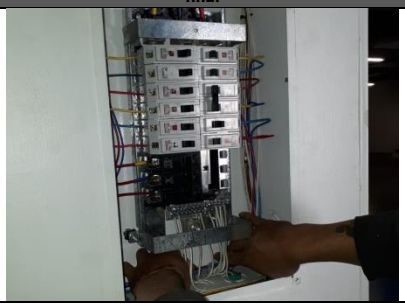
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.		
Capítulo 1: CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 7: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el espacio SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.	**FOTO No. 8**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el espacio SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.	**FOTO No. 9**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el espacio SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.

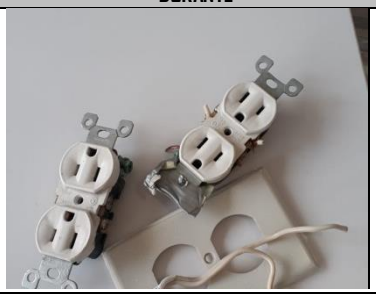
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 2		
Capítulo 1: CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 10: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio Secretaria de gobierno piso 2	**FOTO No. 11**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio Secretaria de gobierno piso 2	**FOTO No. 12**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio Secretaria de gobierno piso 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: SECRETARIA DE GOBIERNO PISO 2		
Capítulo 1: CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 13: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el espacio SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.	**FOTO No. 14**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el espacio SALA ESTRATÉGICA EN EDIFICIO BICENTENARIO II PISO 4 SECRETARIA DE GENERAL.	**FOTO No. 15**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra numero 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación) de tubería acero al carbón con sus respectivos diámetros y accesorios de acuerdo a planos de diseño en el edificio Secretaria de gobierno piso 2

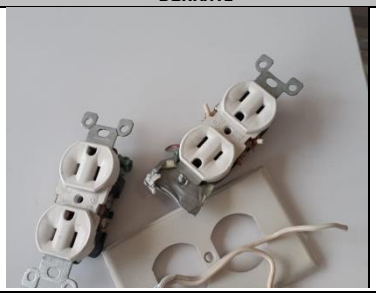
4.9.2 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 1 COMPONENTE ESTRUCTURAL		
Capítulo 1.1 ESTRUCTURAS		
ÍTEMS: 1.1.5 Limpieza, reparación y sello de fisuras en elementos de concreto.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 16: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Limpieza, reparación y sello de fisuras en elementos de concreto.	**FOTO No. 17**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Limpieza, reparación y sello de fisuras en elementos de concreto.	**FOTO No. 18**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Limpieza, reparación y sello de fisuras en elementos de concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 2 COMPONENTE ELÉCTRICO.		
Capítulo 2.1 PRELIMINARES		
ÍTEMS: 2.1.1.REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.		
Antes	**Durante**	**final**
		
FOTO No. 19: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 20**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 21**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 2 COMPONENTE ELÉCTRICO.		
Capítulo 2.2 DIAGNOSTICO, REVISIÓN Y PRUEBA DE LA RED ELÉCTRICA INTERNA NORMAL Y REGULADA.		
ÍTEMS: 2.2.1. Salidas para tomacorriente normal con polo a tierra 120 VAC, GFCI, en. Incluye cable tubería metálica EMT, cableado en 3 No. 12, empalmadores certificados, tomacorriente 110 VAC con polo a tierra, GFCI cuando se indique.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 22: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 23**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 24**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 2 COMPONENTE ELÉCTRICO.		
Capítulo 2.3 PRUEBAS DE UPS		
ÍTEMS: 2.3.1. Salidas UPS 10 de 3 kVA, incluye baterías, puesta en marcha y funcionamiento. Para tomacorriente normal con polo a tierra 120 VAC, GFCI, en. Incluye cable tubería metálica EMT, cableado en 3 No. 12, empalmadores certificados, tomacorriente 110 VAC con polo a tierra, GFCI cuando se indique. / **ÍTEMS: 2.3.2.** Mantenimiento UPS / **ÍTEMS: 2.3.3.** Servicio inicio UPS.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 25: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Mantenimiento UPS.	**FOTO No. 26**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Mantenimiento UPS.	**FOTO No. 27**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Mantenimiento UPS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 2 COMPONENTE ELÉCTRICO.		
Capítulo 2.2 DIAGNOSTICO, REVISIÓN Y PRUEBA DE LA RED ELÉCTRICA INTERNA NORMAL Y REGULADA.		
ÍTEMS: 2.2.1. Salidas para tomacorriente normal con polo a tierra 120 VAC, GFCI, en. Incluye cable tubería metálica EMT, cableado en 3 No. 12, empalmadores certificados, tomacorriente 110 VAC con polo a tierra, GFCI cuando se indique.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 22: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 23**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.	**FOTO No. 24**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra REDISEÑO EN SITIO DE REDES ELECTRICAS, NORMALES, REGULADAS, VOZ Y DATOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Componente: 2 COMPONENTE ELÉCTRICO.		
Capítulo 2.3 PRUEBAS DE UPS		
ÍTEMS: 2.3.1. Salidas UPS 10 de 3 kVA, incluye baterías, puesta en marcha y funcionamiento. Para tomacorriente normal con polo a tierra 120 VAC, GFCI, en. Incluye cable tubería metálica EMT, cableado en 3 No. 12, empalmadores certificados, tomacorriente 110 VAC con polo a tierra, GFCI cuando se indique. / **ÍTEMS: 2.3.2.** Mantenimiento UPS / **ÍTEMS: 2.3.3.** Servicio inicio UPS.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 25: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Mantenimiento UPS.	**FOTO No. 26**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Mantenimiento UPS.	**FOTO No. 27**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Mantenimiento UPS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Capítulo 2.8.1: Sistema de puesta a tierra y apantallamiento		
ÍTEMS: 2.8.1.17 Sistema de puesta a tierra para el apantallamiento con 6 electrodos de cobre 5/8 2,40 interconectado con cable #2/0 y soldadura exotérmica.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 31: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra puesta a tierra para el apantallamiento con 6 electrodos de cobre 5/8 2,40 interconectado con cable #2/0 y soldadura exotérmica.	**FOTO No. 32**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra puesta a tierra para el apantallamiento con 6 electrodos de cobre 5/8 2,40 interconectado con cable #2/0 y soldadura exotérmica.	**FOTO No. 33**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra puesta a tierra para el apantallamiento con 6 electrodos de cobre 5/8 2,40 interconectado con cable #2/0 y soldadura exotérmica.

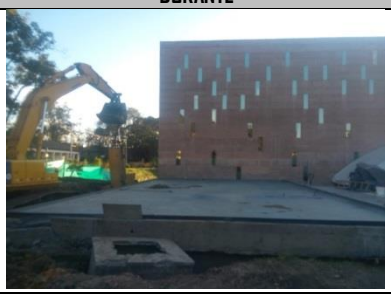
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
Capítulo 2.8.1: Sistema de puesta a tierra y apantallamiento		
ÍTEMS: 2.8.1.2 Alambrón de Aluminio calibre 8 mm / **ÍTEMS: 2.8.1.3** Punta Captora con rosca en la base / **ÍTEMS: 2.8.1.4** Bases Para Puntas Captoras / **ÍTEMS: 2.8.1.5** Conector para cruces del alambrón		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 34: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra punta Captora con rosca en la base y conector para cruces del alambrón con su respectivo Alambrón de Aluminio calibre 8 mm.	**FOTO No. 35**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra punta Captora con rosca en la base y conector para cruces del alambrón con su respectivo alambrón de Aluminio calibre 8 mm.	**FOTO No. 36**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra punta Captora con rosca en la base y conector para cruces del alambrón con su respectivo alambrón de Aluminio calibre 8 mm.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

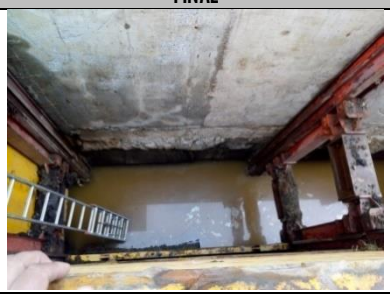
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

Capítulo 3.12: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ESPEJOS DE AGUA

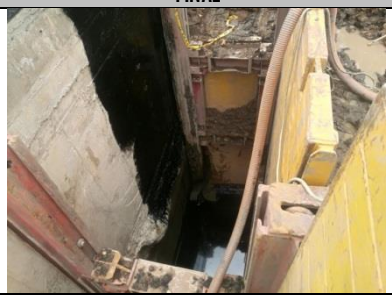
ÍTEMS: 3.12.1 Mantenimiento sistema de espejos de agua, tanques de filtrado, bombeo, incluye suministro de tablero de control, adecuación eléctrica y arreglo de fugas del sistema hidráulico, incluye cambio de un cheque hidro de 2" / **ÍTEMS: 3.12.2** Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componente (Poliurea), para impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.

ANTES	DURANTE	DURANTE
		
FOTO No. 37: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.	**FOTO No. 38**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.	**FOTO No. 39**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.
DURANTE	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 40: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para impermeabilización	**FOTO No. 41**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para	**FOTO No. 42**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente a la actividad de obra Demolición y retiro de lámina de PVC actual, retiro y re-ubicación de piedras negras existentes sobre los actuales espejos; suministro y aplicación de recubrimiento sintético de resina de úrea de dos componentes (Poliurea), para

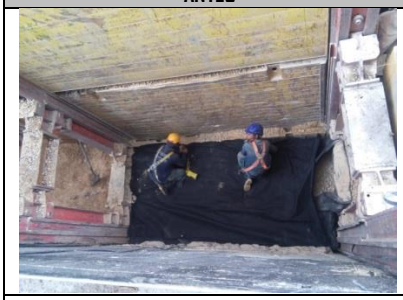
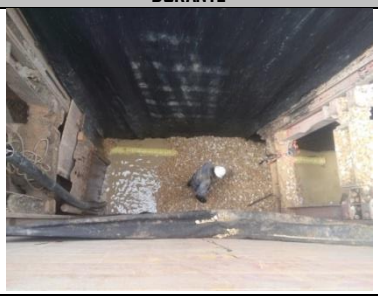
de placa. Espejos de agua costado norte.	impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.	impermeabilización de placa. Espejos de agua costado norte.

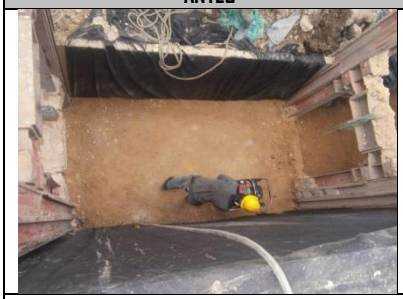
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.1: EXCAVACIONES		
ÍTEMS: 4.1.1 Excavación mecánica H>1,50 m; retiro de material y disposición final en sitios autorizados. / **ÍTEMS: 4.1.2** Excavación mecánica H>1,50 m; retiro de material y disposición final en sitios autorizados.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 43: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra excavación mecánica H>1,50 m; retiro de material y disposición final en sitios autorizados.	**FOTO No. 44**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe excavación mecánica H>1,50 m; retiro de material y disposición final en sitios autorizados.	**FOTO No. 45**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine excavación mecánica H>1,50 m; retiro de material y disposición final en sitios autorizados.

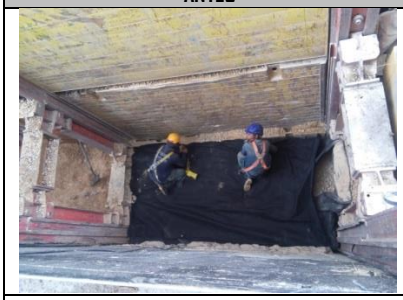
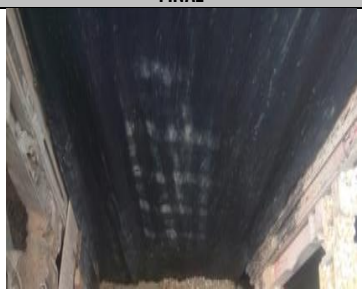
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 3.8.3: OBRAS ADECUACIÓN GENERAL		
ÍTEMS: 3.8.3.1 Construcción de Caja de Insp Sencilla		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 46: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra construcción de Caja de Insp Sencilla	**FOTO No. 47**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra construcción de Caja de Insp Sencilla.	**FOTO No. 48**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra construcción de Caja de Insp Sencilla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.2: EXCAVACIONES		
ÍTEMS: 4.2.1 Entibado metálico		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 49: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Entibado metálico para realizar filtro.	**FOTO No. 50**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Entibado metálico para realizar filtro.	**FOTO No. 51**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Entibado metálico para realizar filtro.

Registro fotográfico		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.3: RELLENOS		
ÍTEMS: 4.3.1 Capa vegetal ≤ 0,15 m		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 52: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad capa vegetal.	**FOTO No. 53**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad capa vegetal.	**FOTO No. 54**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad capa vegetal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.3: RELLENOS		
ÍTEMS: 4.3.2 Relleno Base granular BG_Grl o B-600		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 55: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Relleno Base granular BG_Grl o B-600.	**FOTO No. 56**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Relleno Base granular BG_Grl o B-600.	**FOTO No. 57**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Relleno Base granular BG_Grl o B-600.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.3: RELLENOS		
ÍTEMS: 4.3.3 Material granular filtrante MF-150		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 58: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Relleno Base granular BG_Grl o B-600.	**FOTO No. 59**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra relleno Base granular BG_Grl o B-600.	**FOTO No. 60**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Relleno Base granular BG_Grl o B-600.

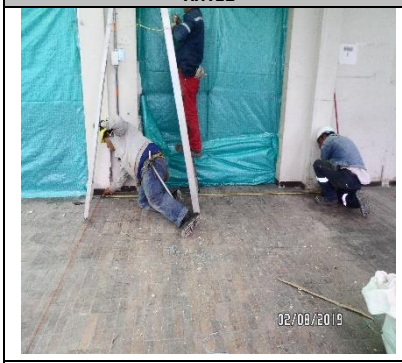
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capítulo 4.4: GEOTEXTILES		
ÍTEMS: 4.4.1 Geotextil NT-2500 o similar / **ÍTEMS: 4.4.2** Lamidren o similar		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 61: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Geotextil NT-2500 o similar y/o lamidren o similar.	**FOTO No. 62**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra Geotextil NT-2500 o similar y/o lamidren o similar.	**FOTO No. 63**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra Geotextil NT-2500 o similar y/o lamidren o similar.

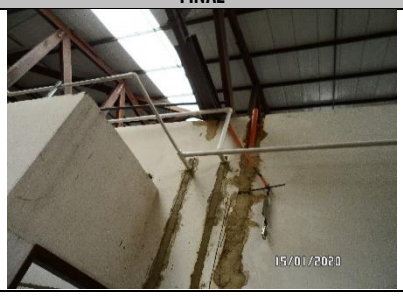
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE HIDRÁULICO		
Capítulo 4.4: SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
ÍTEMS: 3.9.1.1. TUB PERFORADA PVC 4", INCLUIDO ACCESORIOS		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 64: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie con la instalación de tubería perforada PVC 4" incluidos accesorios.	**FOTO No. 65**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la instalación de tubería perforada PVC 4" incluidos accesorios.	**FOTO No. 66**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine la instalación de tubería perforada PVC 4" incluidos accesorios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE HIDRÁULICO		
Capítulo 4.4: SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
ITEMS: 3.9.1.3. TUB PVCCORRU EXT, LISA INT, PS57 PSI, D315MM.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 67: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.	**FOTO No. 68**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.	**FOTO No. 69**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN		
COMPONENTE: 4 - COMPONENTE HIDRÁULICO		
Capítulo 4.4: SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
ITEMS: 3.9.1.3. TUB PVCCORRU EXT, LISA INT, PS57 PSI, D315MM.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 67: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.	**FOTO No. 68**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.	**FOTO No. 69**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la instalación de la tub PVC corru ext., lisa int, ps57 psi, d315mm.

4.9.3 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.1.0: PRELIMINARES		
Ítems 1.1.0.1: Replanteo / **Ítems 1.1.0.2** Cerramiento Polisombra		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 73: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra Replanteo correspondiente al capítulo 1.1.0.1 Preliminares.	**FOTO No. 74**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra CERRAMIENTO POLISOMBRA correspondiente al capítulo 1.1.0.1 Preliminares.	**FOTO No. 75**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra CERRAMIENTO POLISOMBRA correspondiente al capítulo 1.1.0.1 Preliminares.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.2.0: Red de suministro		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 76: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra red de suministro de agua potable con tubería PVC de diámetros 2" - 1 1/2" / 1 1/4" /3/4" y ½" con sus respectivos accesorios de acuerdo a la distribución expuesta en planos de diseño	**FOTO No. 77**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra red de suministro de agua potable con tubería PVC de diámetros 2" - 1 1/2" / 1 1/4" /3/4" y ½" con sus respectivos accesorios de acuerdo a la distribución expuesta	**FOTO No. 78**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra red de suministro de agua potable con tubería PVC de diámetros 2" - 1 1/2" / 1 1/4" /3/4" y ½" con sus respectivos accesorios de acuerdo a la distribución expuesta en planos de diseño

correspondiente al capítulo 1.2.0 Red de suministro.	en planos de diseño correspondiente al capítulo 1.2.0 Red de suministro.	correspondiente al capítulo 1.2.0 Red de suministro.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.3.0: Punto Hidráulico Agua Fría		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 79: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra punto hidráulico agua fría de acuerdo a la distribución expuesta en planos de diseño correspondiente al capítulo 1.3.0 punto de agua fría.	**FOTO No. 80**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra punto hidráulico agua fría de acuerdo a la distribución expuesta en planos de diseño correspondiente al capítulo 1.3.0 punto de agua fría.	**FOTO No. 81**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra punto hidráulico agua fría de acuerdo a la distribución expuesta en planos de diseño correspondiente al capítulo 1.3.0 punto de agua fría.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.4.0: Cuarto de bombas		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 82: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra Cuarto de Bombas expuesta en planos de diseño.	**FOTO No. 83**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra Cuarto de Bombas expuesta en planos de diseño.	**FOTO No. 84**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la actividad de obra correspondiente al capítulo de obra Cuarto de Bombas expuesta en planos de diseño.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.5.0: Red de aguas negras		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 85: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería NOVAFORT de diámetro 6 pulgadas en áreas exteriores para conformar la red de desagües de las unidades sanitarias y aguas lluvias de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 86**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería NOVAFORT de diámetro 6 pulgadas en áreas exteriores para conformar la red de desagües de las unidades sanitarias y aguas lluvias de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 87**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería NOVAFORT de diámetro 6 pulgadas en áreas exteriores para conformar la red de desagües de las unidades sanitarias y aguas lluvias de la sede imprenta distrital.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.5.0: Red de aguas negras		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 88: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería sanitaria de diámetro 4 pulgadas y 2 pulgadas con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.	**FOTO No. 89**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería sanitaria de diámetro 4 pulgadas y 2 pulgadas con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.	**FOTO No. 90**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad suministro e instalación de tubería sanitaria de diámetro 4 pulgadas y 2 pulgadas con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.6.0: PUNTOS SANITARIOS		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 91: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra PUNTOS SANITARIOS para sanitarios, lavamanos y orinales con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.	**FOTO No. 92**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra PUNTOS SANITARIOS para sanitarios, lavamanos y orinales con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.	**FOTO No. 93**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra PUNTOS SANITARIOS para sanitarios, lavamanos y orinales con sus respectivos accesorios de acuerdo a distribución Hidrosanitaria plasmada en planos de diseño en las unidades sanitarias planta primer y segundo piso área administrativa y área de archivo.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.7.0: OBRAS CIVILES		
Ítems 1.7.0.4 Retiro Ladrillo cemento		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 94: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra RETIRO LADRILLO CEMENTO para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 95**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra RETIRO LADRILLO CEMENTO para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 96**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra RETIRO LADRILLO CEMENTO para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.7.0: OBRAS CIVILES		
Ítems 1.7.0.6 Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 97: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 98**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 99**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados para realizar la red de distribución de agua negras ubicada en las áreas exteriores de la sede imprenta distrital.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.7.0: OBRAS CIVILES		
Ítems 1.7.0.7 Relleno en material seleccionado B-400 / **ítems 1.7.0.8** Relleno Base granular BG_Grl o B-600 / **ítems 1.7.0.9** Relleno en arena		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 100: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 101**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 102**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.7.0: OBRAS CIVILES		
Ítems 1.7.0.11 Retiro del Material		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 103: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 104**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 105**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.7.0: OBRAS CIVILES		
Ítems 1.7.0.12 Caja de Inspección hmax=0,60m 40x40 con caja pesada / **Ítems 1.7.0.13** Caja de inspección hmax=0,60m 60x60 con caja pesada / **Ítems 1.7.0.13** Caja de inspección hmax=0,80m 80x80		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 106: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 107**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.	**FOTO No. 108**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra RELLENO EN ÁREA Y BASE GRANULAR B-400 Y B-600 de acuerdo a diseño en planos de diseño hidrosanitario.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.8.0: DESMONTAJE DE APARATOS		
Ítems 1.8.0.1 Desmonte de Aparatos Sanitarios		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 109: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Desmonte de Aparatos Sanitarios en las unidades sanitarias planta primer piso, segundo piso y área de archivo.	**FOTO No. 110**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Desmonte de Aparatos Sanitarios en las unidades sanitarias planta primer piso, segundo piso y área de archivo.	**FOTO No. 111**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Desmonte de Aparatos Sanitarios en las unidades sanitarias planta primer piso, segundo piso y área de archivo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.9.0: MONTAJE DE APARATOS		
Ítems 1.9.0.7 Montaje Bomba Eyectora / **Ítems 1.9.0.8** Instalación Equipo Hidroneumático / **Ítems 1.9.0.9** Válvula de Admisión de Aire 2"		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 112: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Montaje Bomba Eyectora para el suministro de la red de agua potable de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 113**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Instalación Equipo Hidroneumático para el suministro de la red de agua potable de la sede imprenta distrital.	**FOTO No. 114**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Válvula de Admisión de Aire 2" para la ventilación de la red de desagües de las unidades sanitarias planta primero y segundo piso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.10.0: RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS		
Ítems 1.10.0.1 Caja para químicos en concreto		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 115: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie con la ejecución de la actividad de obra Caja para químicos en concreto.	**FOTO No. 116**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Caja para químicos en concreto.	**FOTO No. 117**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Caja para químicos en concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.11.0: VARIOS		
Ítems 1.11.0.1 Prueba De Estanqueidad		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 118: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Estanqueidad para la red de desagües en las unidades sanitarias planta primero y segundo piso.	**FOTO No. 119**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Estanqueidad para la red de desagües en las unidades sanitarias planta primero y segundo piso.	**FOTO No. 120**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Estanqueidad para la red de desagües en las unidades sanitarias planta primero y segundo piso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.11.0: VARIOS		
Ítems 1.11.0.2 Prueba de Presión		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 121: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Presión para la red de suministro de agua potable.	**FOTO No. 122**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Presión para la red de suministro de agua potable.	**FOTO No. 123**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Prueba de Presión para la red de suministro de agua potable.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 1.12.0: VARIOS		
Ítems 1.12.0.1 Suministro Equipo Presión Tipo Lapicero 2 Bombas 2 Hp + 1 Hidro 200 Lts Con Tablero Variador De Velocidad		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 124: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro Equipo Presión Tipo Lapicero 2 Bombas 2 Hp + 1 Hidro 200 Lts Con Tablero Variador De Velocidad.	**FOTO No. 125**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro Equipo Presión Tipo Lapicero 2 Bombas 2 Hp + 1 Hidro 200 Lts Con Tablero Variador De Velocidad.	**FOTO No. 126**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro Equipo Presión Tipo Lapicero 2 Bombas 2 Hp + 1 Hidro 200 Lts Con Tablero Variador De Velocidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.1.0 : PRELIMINARES		
Ítems 2.1.0.1: Campamento de obra / **Ítems 2.1.0.2:** Localización y replanteo / **Ítems 2.1.0.3:** Baño móvil / **Ítems 2.1.0.4:** Aseo general.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

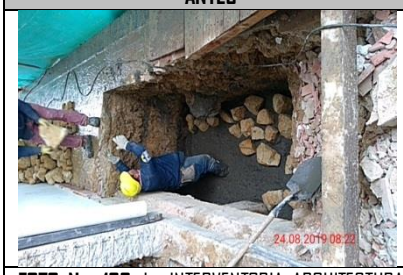
		
FOTO No. 127: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ejecute la actividad de obra Campamento de obra.	**FOTO No. 128**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Localización y replanteo.	**FOTO No. 129**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Baño móvil

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0 : Cimentación		
Ítems 2.2.0.2: Excavación manual para ciclópeo y zapatas		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 133: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual para ciclópeo y zapatas en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).	**FOTO No. 134**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual para ciclópeo y zapatas en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).	**FOTO No. 135**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Excavación manual para ciclópeo y zapatas en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0 : Cimentación		
Ítems 2.2.0.1: Demoler piso y contrapiso		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

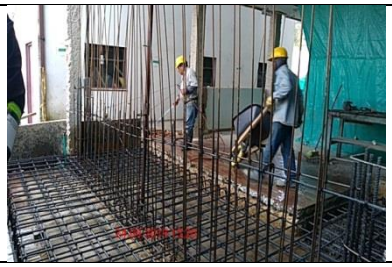
		
FOTO No. 130: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra demoler piso y contrapiso en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).	**FOTO No. 131**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra demoler piso y contrapiso en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).	**FOTO No. 132**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad obra demoler piso y contrapiso en el área administrativa y producción para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación).

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0 : Cimentación		
Ítems 2.2.0.3: Rellenos en recebo áreas sin concreto, Se considera recebo B-400		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 136: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra rellenos en recebo áreas sin concreto, Se considera recebo B-400 en el área producción para conformar la rasante de la placa de contrapiso intervenida para el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.	**FOTO No. 137**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra rellenos en recebo áreas sin concreto, Se considera recebo B-400 en el área producción para conformar la rasante de la placa de contrapiso intervenida para el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.	**FOTO No. 138**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra rellenos en recebo áreas sin concreto, Se considera recebo B-400 en el área producción para conformar la rasante de la placa de contrapiso intervenida para el reforzamiento estructural de la cimentación del área de producción.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0: Cimentación		
Ítems 2.2.0.6. Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi		

ANTES	DURANTE	FINAL
		
FOTO No. 139: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi en el área administrativa para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas).	**FOTO No. 140**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi en el área administrativa para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas).	**FOTO No. 141**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Concreto ciclópeo, Piedra media zonga y concreto de 3.000 psi en el área administrativa para el reforzamiento estructural de la cimentación (zapatas).

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0 : Cimentación		
Ítems 2.2.0.7. Concreto de zapatas - 4,000 PSI		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 142: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Concreto de zapatas - 4,000 PSI para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 143**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Concreto de zapatas - 4,000 PSI para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 144**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Concreto de zapatas - 4,000 PSI para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.2.0 : Cimentación		
Ítems 2.2.0.8. Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 145: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 146**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 147**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento estructural de la cimentación en área administrativa y área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.3.0 : Columnas y muros		
Ítems 2.3.0.1. Escarificar columnas y adhesivo, Incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 148: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra escarificar columnas y adhesivo, Incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo para el reforzamiento estructural de las columnas del área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 149**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra escarificar columnas y adhesivo, Incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo para el reforzamiento estructural de las columnas del área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 150**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra escarificar columnas y adhesivo, Incluye la escarificación y el adhesivo especial para unir concreto existente a concreto nuevo para el reforzamiento estructural de las columnas del área administrativa y área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL
Capítulo 2.3.0 : Columnas y muros

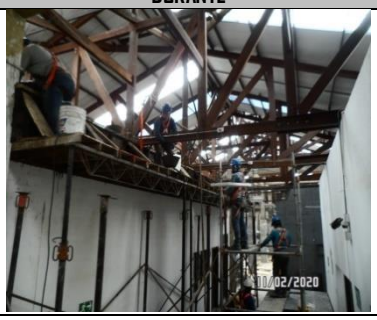
Ítems 2.3.0.2. Concreto de columnas y muros - 4,000 psi		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 151: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Concreto de columnas y muros - 4,000 psi de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 152**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Concreto de columnas y muros - 4,000 psi de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 153**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Concreto de columnas y muros - 4,000 psi de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.3.0 : Columnas y muros		
Ítems 2.3.0.3. Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 154: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para columnas y muros de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 155**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para columnas y muros de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 156**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para columnas y muros de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.4.0 : VIGAS AÉREAS		
Ítems 2.4.0.2. Escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 157: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 158**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 159**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.4.0 : VIGAS AÉREAS		
Ítems 2.4.0.2. Escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 157: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 158**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 159**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra escarificar vigas y adhesivo concreto nuevo para vigas aéreas ubicadas en el área de producción de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.4.0 : VIGAS AÉREAS		
Ítems 2.4.0.3. Concreto nuevo de vigas - 4,000 psi		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 160: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra concreto nuevo de vigas - 4,000 psi para vigas aéreas ubicadas en el área de producción	**FOTO No. 161**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra concreto nuevo de vigas - 4,000 psi para vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 162**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra concreto nuevo de vigas - 4,000 psi para vigas aéreas ubicadas en el área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.4.0 : VIGAS AÉREAS		
Ítems 2.4.0.4. Suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 163: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa. Psi para vigas aéreas ubicadas en el área de	**FOTO No. 164**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa. Psi para vigas aéreas ubicadas en	**FOTO No. 165**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra suministro (instalación) figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa. Psi para vigas aéreas ubicadas en el área de

producción.	el área de producción.	producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.5.0 : PERFORACIONES Y EPÓXICO		
Ítems 2.5.0.1. Perforación y epóxico # 3 L= 0.15 / **Ítems 2.5.0.2.** Perforación y epóxico # 3 L= 0.30 / **Ítems 2.5.0.3.** Perforación y epóxico # 5 L= 0.20		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 166: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Perforación y epóxico para los diferentes anclajes teniendo en cuenta diámetros y longitudes de acuerdo a planos de diseño de reforzamiento estructural.	**FOTO No. 167**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Perforación y epóxico para los diferentes anclajes teniendo en cuenta diámetros y longitudes de acuerdo a planos de diseño de reforzamiento estructural.	**FOTO No. 168**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra con la ejecución de la actividad de obra Perforación y epóxico para los diferentes anclajes teniendo en cuenta diámetros y longitudes de acuerdo a planos de diseño de reforzamiento estructural.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.6.0 : CIELOS RASOS		
Ítems 2.6.0.1. Retiro y reinstalación cielos falsos, Se considera el retiro y reinstalación de los cielos falsos de 1o y 2o nivel para ejecutar el reforzamiento. Se considera un reemplazo del 10% por posibles daños.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 169: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución	**FOTO No. 170**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la	**FOTO No. 172**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución

de la actividad de obra retiro y reinstalación cielos falsos, Se considera el retiro y reinstalación de los cielos falsos de 1o y 2o nivel para ejecutar el reforzamiento. Se considera un reemplazo del 10% por posibles daños en el área administrativa segundo piso.	ejecución de la actividad de obra retiro y reinstalación cielos falsos, Se considera el retiro y reinstalación de los cielos falsos de 1o y 2o nivel para ejecutar el reforzamiento. Se considera un reemplazo del 10% por posibles daños en el área administrativa segundo piso	de la actividad de obra con la ejecución de la actividad de obra Retiro y reinstalación cielos falsos, Se considera el retiro y reinstalación de los cielos falsos de 1o y 2o nivel para ejecutar el reforzamiento. Se considera un reemplazo del 10% por posibles daños en el área administrativa segundo piso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL

Capítulo 2.7.0 : CUBIERTAS – ÁREA ADMINISTRACIÓN

Ítems 2.7.0.2. Adición de elementos metálicos reforzamiento / **Ítems 2.7.0.3.** Aseo y pintura anticorrosiva de estructura metálica, Se mide por área plana

ANTES	DURANTE	FINAL
		
FOTO No. 173: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Adición de elementos metálicos reforzamiento y /o Aseo y pintura anticorrosiva de estructura metálica, Se mide por área en la cubierta metálica del área administrativa segundo piso.	**FOTO No. 174**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Adición de elementos metálicos reforzamiento y /o Aseo y pintura anticorrosiva de estructura metálica, Se mide por área en la cubierta metálica del área administrativa segundo piso.	**FOTO No. 175**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Adición de elementos metálicos reforzamiento y /o Aseo y pintura anticorrosiva de estructura metálica, Se mide por área en la cubierta metálica del área administrativa segundo piso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL

Capítulo 2.8.0: RESTITUCIÓN DE ACABADOS

Ítems 2.8.0.2 Reparación y restauración contrapisos y pisos, Se considera igual al área cortada para la intervención.

ANTES	DURANTE	FINAL
		

FOTO No. 176: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra reparación y restauración contrapisos y pisos, Se considera igual al área cortada para la intervención del reforzamiento estructural de la cimentación del área administrativa primer piso y anden perimetral en el edificio 1.	**FOTO No. 177**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra reparación y restauración contrapisos y pisos, Se considera igual al área cortada para la intervención del reforzamiento estructural de la cimentación del área administrativa primer piso y anden perimetral en el edificio 1.	**FOTO No. 178**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra reparación y restauración contrapisos y pisos, Se considera igual al área cortada para la intervención del reforzamiento estructural de la cimentación del área administrativa primer piso y anden perimetral en el edificio 1.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.8.0: RESTITUCIÓN DE ACABADOS		
Ítems 2.8.0.6 Rotura del muro para colocar Columneta / **Ítems 2.8.0.7** Perforaciones y epóxico 1/2" - L= 0.15 Rotura del muro para colocar Columneta / **Ítems 2.8.0.9** Concreto de 3000 PSI / **Ítems 2.8.0.10** Viga de remate encima de muros - 3,000 psi / **Ítems 2.8.0.13** Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 179: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de obra rotura de muro, perforación Y epóxico ½", concreto de 3000 psi, Viga de remate encima de muros - 3,000 psi y Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento de muros no estructurales del área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 180**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de obra rotura de muro, perforación Y epóxico ½", concreto de 3000 psi, Viga de remate encima de muros - 3,000 psi y Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento de muros no estructurales del área administrativa y área de producción.	**FOTO No. 181**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de obra rotura de muro, perforación Y epóxico ½", concreto de 3000 psi, Viga de remate encima de muros - 3,000 psi y Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI 420 Mpa para el reforzamiento de muros no estructurales del área administrativa y área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 2.8.0: RESTITUCIÓN DE ACABADOS		
Ítems 2.8.0.11 Pañete de muros en 5 cms, para reforzamiento / **Ítems 2.8.0.12** Malla electrosoldada - para área de pañete.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 182: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de Pañete de muros en 5 cms, para reforzamiento y Malla electro soldada - para área de pañete en los muros no estructurales de acuerdo a planos de diseños estructurales.	**FOTO No. 183**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de Pañete de muros en 5 cms, para reforzamiento y Malla electro soldada - para área de pañete en los muros no estructurales de acuerdo a planos de diseños estructurales.	**FOTO No. 184**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de Pañete de muros en 5 cms, para reforzamiento y Malla electro soldada - para área de pañete en los muros no estructurales de acuerdo a planos de diseños estructurales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.1.0: GENERADOR ELÉCTRICO		
Ítems 3.1.0.1 Suministro e instalación de Generador eléctrico de Stand by de 400kVA, 4400v, 60hz, incluye cabina de insonorización, según especificaciones técnicas. / **Ítems 3.1.0.2** Suministro e instalación de tubería de escape en 5" calibre 16 con acabado en pintura de alta temperatura, incluye aislamiento térmico en lana mineral de roca de 2" espesor con acabado en chaqueta de aluminio para Generador eléctrico de Stand by de 400kVA / **Ítems 3.1.0.3** Suministro e instalación de codo de escape de amplio radio en 5" calibre 16 Coll Roller con acabado en pintura de alta temperatura, incluye aislamiento térmico en lana mineral de roca de 2" espesor con acabado en chaqueta de aluminio para Generador eléctrico de Stand by de 400kVA./ **Ítems 3.1.0.4** Suministro e instalación de tubo enfocado para salida de aire caliente de Generador eléctrico de Stand by de 400kVA.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 185: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 186**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 187**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.1.0: GENERADOR ELÉCTRICO		
Ítems 3.1.0.6 Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 440/220 225 kVA en Aluminio		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 188: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra eléctrica suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 440/220 225 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 189**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra eléctrica suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 440/220 225 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 190**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra eléctrica suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 440/220 225 kVA en Aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.2.0: INSTALACIONES ELECTRICAS		
Ítems 3.2.0.1 Suministro e instalación de Tubería PVC 3x4"+2X2" tipo pesado DB. / **Ítems 3.2.0.4** Suministro e instalación de caja de inspección tipo norma Codensa 276. / **Ítems 3.2.0.5** Excavación manual Incluye retiro de material y Disposición final en sitios autorizados.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 191: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 192**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 193**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 194: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 195**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 196**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 197: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 198**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.	**FOTO No. 199**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de las siguientes actividades de obras eléctricas correspondiente al capítulo de obra GENERADOR ELÉCTRICO.

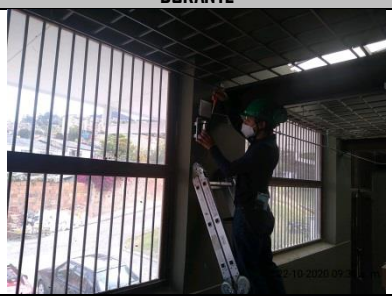
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.3.0: INSTALACIONES ELECTRICAS		
Ítems 3.3.0.4 Suministro e instalación de puerta en metálica celosía doble ala 1.80m ancho *2.50m alto, incluye chapa antipánico		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 200: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de puerta en metálica celosía doble ala 1.80m ancho *2.50m alto, incluye chapa antipánico.	**FOTO No. 201**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de puerta en metálica celosía doble ala 1.80m ancho *2.50m alto, incluye chapa antipánico.	**FOTO No. 202**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de puerta en metálica celosía doble ala 1.80m ancho *2.50m alto, incluye chapa antipánico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.4.0: SISTEMA CONTRA INCENDIO		
Ítems 3.4.0.2 Suministro e instalación de Acometida en Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0 AWG T incluye amarres, bornes y todos los elementos para su correcto funcionamiento.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 203: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de Acometida en Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0 AWG T incluye amarres, bornes y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	**FOTO No. 204**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de Acometida en Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0 AWG T incluye amarres, bornes y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	**FOTO No. 205**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de Acometida en Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0 AWG T incluye amarres, bornes y todos los elementos para su correcto funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.4.0: SISTEMA CONTRA INCENDIO		
Ítems 3.4.0.9 Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**

		
FOTO No. 206: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 207**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 208**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.5.0: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.		
Ítems 3.5.0.1 Suministro e instalación de Panel de control de alarma direccionable de 198 punto SLC de 24V alimentación 220V tipo MS-9200UDLSE incluye fuente de poder 6A 12/24V, tipo HP600ULX Y 2 BATERIAS DE 12 v 7Amp y punto de conexión de energía regulada. / **Ítems 3.5.0.2** Suministro e instalación de sistema anunciador serial de 80 caracteres blanco tipo ANN-80-W, incluye Wireless Display Driver tipo W-DIS-D. y salida cable FPL 2x14OS		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 209: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 210**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 211**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.5.0: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.		
Ítems 3.5.0.7 Suministro e instalación de Módulos de monitor direccionables estilo b / d (clase a / b) circuito de dispositivo de iniciación para el monitoreo de n / o dispositivos de contacto, incluye led de encendido tipo FFM 300		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 212: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 213**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 214**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.5.0: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.		
Ítems 3.5.0.3 Suministro e instalación de Wireless Gateway tipo W-GATE concluye salida para conexionado en tubería EMT		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 215: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 216**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.	**FOTO No. 217**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de transformador seco tipo h baja-baja 220/440V 150 kVA en Aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.5.0: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.		
Ítems 3.5.0.9 Suministro e instalación de Bobina de choque para desconexión de carga de Breaker de 1000 Amp, incluye Cableado para sistema en serie desde sistema de control de detención y sistema de control de extinción de incendios		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 218: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de Bobina de choque para desconexión de carga de Breaker de 1000 Amp, incluye Cableado para sistema en serie desde sistema de control de detención y sistema de control de extinción de incendios.	**FOTO No. 219**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de Bobina de choque para desconexión de carga de Breaker de 1000 Amp, incluye Cableado para sistema en serie desde sistema de control de detención y sistema de control de extinción de incendios.	**FOTO No. 220**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra Suministro e instalación de Bobina de choque para desconexión de carga de Breaker de 1000 Amp, incluye Cableado para sistema en serie desde sistema de control de detención y sistema de control de extinción de incendios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.6.0: SUB ESTACIÓN		
Ítems 3.6.0.1 Suministro e instalación de celda SF6 dúplex incluye entrada salida y remonte		
ANTES	DURANTE	FINAL
		
FOTO No. 221: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda SF6 dúplex	FOTO No. 222: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda SF6 dúplex incluye entrada	FOTO No. 223: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda SF6 dúplex incluye entrada salida y

incluye entrada salida y remonte.	salida y remonte.	remonte.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.6.0: SUB ESTACIÓN		
Ítems 3.6.0.5 Suministro e instalación de celda de protección para transformador existente de 225 kVA		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 224: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda de protección para transformador existente de 225 kVA.	**FOTO No. 225**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda de protección para transformador existente de 225 kVA.	**FOTO No. 226**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de celda de protección para transformador existente de 225 kVA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 3.6.0: SUB ESTACIÓN		
Ítems 3.6.0.14 Suministro e instalación de transformador seco tipo h mt 11400/208v 225 kva en aluminio.		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		

FOTO No. 227: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de transformador seco tipo h mt 11400/208v 225 kva en aluminio.	**FOTO No. 228**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de transformador seco tipo h mt 11400/208v 225 kva en aluminio.	**FOTO No. 229**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra suministro e instalación de transformador seco tipo h mt 11400/208v 225 kva en aluminio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Ubicación: IMPRENTA DISTRITAL		
Capítulo 4: SUMINISTRO SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1		
ANTES	**DURANTE**	**FINAL**
		
FOTO No. 230: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de la actividad de obra SUMINISTRO SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1.	**FOTO No. 231**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de la actividad de obra SUMINISTRO SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1.	**FOTO No. 232**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de la actividad de obra SUMINISTRO SISTEMA EPU 05 IMPRENTA DISTRITAL EDIFICIO 1.

5. ASPECTOS DE CALIDAD

A continuación, se reporta lo referente a las acciones de seguimiento y verificación de plan de calidad de obra.

5.1 CONSOLIDADO DE SOPORTES DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA.

5.1.1 MANZANA LIÉVANO

Nº	EQUIPO	FECHA DE REVISIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
1	MANÓMETRO ANÁLOGO (Manómetro Análogo - Calculo de presión en tuberías)	19/08/2019	Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 "Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems "	Informe de resultado

5.1.2 IMPRENTA DISTRITAL

Nº	EQUIPO	FECHA DE REVISIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
1	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	01/12/2019	Cumple de acuerdo a lo exigido por la norma ASTM E290	Informe de resultado

5.2 CONSOLIDADO DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD

5.2.1 MANZANA LIÉVANO

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Tercer Piso Bicentenario II - Zona I - SubZona 1					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
1	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	3/08/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Tercer Piso Bicentenario II - Zona I - SubZona 2 y 3					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
2	Prueba de presión Red Contra Incendios	3/08/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red de Rociadores Primer Huitaca I					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
3	Prueba de presión Red Contra Incendios	14/08/2019	196 bar (2842 PSI)	No cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión, se evidencio perdida de presión a causa de fuga en un rociador existente se ajustara el rociador y nuevamente se realizó la prueba.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red de Rociadores Primer Piso Bicentenario I					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
4	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	14/08/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Ubicación: Tramo Red de Rociadores Sótano I					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
5	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	16/08/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendios Sótano 2 Red Nueva - Almacenes					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
6	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	4/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Sótano II - Zona De Bodegas "Red Contra Incendio Nueva"					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
7	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	12/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Tercer Piso Bicentenario 1.					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
8	Prueba de presión Red Contra Incendios	13/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro

	(NFPA-14)			determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Primer Piso Bicentenario 2 Cafetería, Baños y Pasillo.					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
9	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	20/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Tercer Piso Bicentenario 1.					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
10	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	20/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Segundo Piso Bicentenario 2 Cafetería, Baños y Pasillo.					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
11	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	21/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Cuarto Piso Bicentenario 2					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
12	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	27/09/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Primer Piso Bicentenario 2 Secretaria de Gobierno					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
13	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	9/10/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Cuarto piso Bicentenario 2 Sala Estratégica					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
14	Prueba de presión Red	15/10/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Cuarto piso Bicentenario 2 Sala Estratégica					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
	Contra Incendios (NFPA-14)			este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Primer Piso Bicentenario 2 Secretaria de Gobierno					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
15	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	18/10/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Primer Piso Bicentenario 2 Gimnasio					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
16	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	20/10/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Cuarto Piso Bicentenario 2 Secretaria de Gobierno					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
17	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	28/10/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Segundo piso Bicentenario 2 Secretaria General					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
18	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	1/11/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Primer Piso Bicentenario 2 Secretaria de Gobierno Sector Central					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
19	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	9/11/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Segundo Piso Bicentenario 2 Secretaria de Gobierno Sector Central					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO

		REALIZACIÓN	DEL ENSAYO		SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
20	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	19/11/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Piso 1 Bicentenario I Secretaria de Gobierno Zona 6					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
21	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	/12/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Piso 2 Bicentenario I Secretaria de Gobierno Zona 6					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
22	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	10/12/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta Piso 3 Bicentenario I Secretaria de Gobierno Zona 6					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
23	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	16/12/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tramo Red Contra Incendio Planta piso 2 Auditorio Huitaca					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
24	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	20/12/2019	210 bar (3045PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

5.2.2 SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 2 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
25	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	22/01/2020	4307 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debida a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 3 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
26	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	22/01/2020	4313 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debida a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 4 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
27	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13	23/01/2020	4206 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

	y/o NTC 673				enunciadas es debida a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 5 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
28	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	23/01/2020	4023 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debida a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 6 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
29	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	30/01/2020	4222 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 7 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
30	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE	31/01/2020	4818 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra.

	CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673			seguimiento al diseño de mezcla.	NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	"CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 8 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
31	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	03/02/2020	4277 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 9 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
32	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	07/02/2020	4381 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 10 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
33	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	13/02/2020	4381 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 11 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
34	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	15/02/2020	3981 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación
Elemento Estructural: Anillo Pequeño No 12 Caisson
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
35	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	19/02/2020	4207 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

					410, NTC 550 Y NTC 673).	

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación Elemento Estructural: BASE DEL CAISSON Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada). Edad del espécimen: 28 días						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
36	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	27/02/2020	4043 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

- **Proctor modificado**

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación Material: RECEBO					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
37	Proctor modificado NORMA ASTM D-1557	15/09/2019	98 % de Proctor modificado	Si cumple de acuerdo a la NORMA ASTM D – 1557 EL CUAL EXIGE UN 95 %.	Informe ensayo laboratorio SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S.

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación Material: TRITURADO DE 1 1/2"					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
38	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 37,5 mm (1 1/2") POR ABRASIÓN E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES - INV-E-219-13	08/10/2019	Desgaste en seco 200 revoluciones = 7 < 8%. Desgaste en seco 1000 revoluciones = 44 < 50 %	Si cumple de acuerdo a la NORMA INV-E-219-13	Informe ensayo laboratorio

Ubicación: Centro de Memoria Paz y Reconciliación Material: base granular B 600					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
39	LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLÁSTICO (NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	21/10/2019	Limite liquido: 22 Limite Plástico: 19 Índice de plasticidad: 13 Humedad natural: 3.6	Si cumple de acuerdo a la clasificación AASTHO (1.6) A-1b	Informe ensayo laboratorio G&S laboratorio de suelos, pavimento y concreto S.A.S.

5.2.3 SEDE IMPRENTA DISTRITAL.

Ubicación: Unidad Sanitaria de Caballeros - Planta Primer Nivel Ubicados en Área de Producción					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
40	Prueba Estanqueidad NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	14/11/2019	No se evidencio cambio de nivel.	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de estanqueidad a tubería sanitaria de desagües para determinar si hay fugas en los pegues entre tubería y accesorios de distribución.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Unidad Sanitaria y Cocina - Planta Segundo Nivel Ubicados en Área Administrativa					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
41	Prueba Presión NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	20/01/2020	No se evidencio cambio de presión.	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de presión a la tubería de la red de suministro de agua potable a una presión de 150 PSI durante un periodo de tiempo de dos (2) horas para verificar si existen fugas entre los pegues de tubería y accesorios.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Cuarto de Bombas "Tubería polipropileno PN 16-2"					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
42	Prueba Presión NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	27/01/2020	No se evidencio cambio de presión.	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de presión a la tubería de la red de suministro de agua potable a una presión de 150 PSI durante un periodo de tiempo de dos (2) horas para verificar si existen fugas entre los pegues de tubería y accesorios.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Cuarto de Bombas "Área Exterior Costado Sur, Norte y Oriente"					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
43	Prueba Presión NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	27/01/2020	No se evidencio cambio de presión.	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de presión a la tubería de la red de suministro de agua potable a una presión de 150 PSI durante un periodo de tiempo de dos (2) horas para verificar si existen fugas entre los pegues de tubería y accesorios.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tanque de Almacenamiento de Agua Potable					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
44	Prueba Presión NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	27/01/2020	No se evidencio cambio de presión	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de presión a la tubería de la red de suministro de agua potable a una presión de 150 PSI durante un periodo de tiempo de dos (2) horas para verificar si existen fugas entre los pegues de tubería y accesorios.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Tanque de Almacenamiento de Agua Potable					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
45	Prueba Estanqueidad NTC 1500 "Código colombiano de fontanería"	14/11/2019	No se evidencio cambio de nivel.	Si cumple de acuerdo a la norma NTC 1500 "Código Colombiano de Fontanería" la cual solicita realizar prueba de estanqueidad a tubería sanitaria de desagües para determinar si hay fugas en los pegues entre tubería y accesorios de distribución.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Sistema Red contraincendios agua nebulizada Edificio 1 – Área Administrativa Primer Piso)					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
46	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	27/08/2020	220 bar (3190 PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Sistema Red contraincendios agua nebulizada Edificio 1 – Área Administrativa Primer Piso)					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
47	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	27/08/2020	220 bar (3190 PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Sistema Red contraincendios agua nebulizada Edificio 1 – Área Administrativa Segundo Piso)					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
48	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	27/08/2020	220 bar (3190 PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

Ubicación: Sistema Red contraincendios Agua Nebulizada Edificio 1 – Área de Producción)					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
49	Prueba de presión Red Contra Incendios (NFPA-14)	27/08/2020	20 bar (3190 PSI)	Si cumple de acuerdo a la norma "National Fire Protection Association" NFPA-14 la cual solicita realizar este ensayo a una presión de 210 Bares en un tiempo determinado de dos (2) horas sin pérdida de presión.	Formato elaborado en obra para toma de datos del ensayo resultado con su respectivo registro fotográfico.

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
50	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO "Ensayo de doblado de barras corrugadas para refuerzo de concreto"	17/09/2019	Las barras tienen una única resistencia a la fluencia mínima, conocida como 420 MPa (60 000 psi), designado como grado 420 (60)."	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO) "	Formato elaborado en obra para toma de datos del resultado con su respectivo registro fotográfico.

5.2.4 ENSAYOS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO – IMPRENTA DISTRITAL

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Ejes 5 entre A-B y dado en Zapata 2 Eje 1 E-F y Eje a Entre 1-2 U Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada). Edad del espécimen: 28 días						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
51	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	24/08/2019	4325 PSI	3537 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo zapata 2 entre Ejes E - F y Ejes 1` y 2`
Resistencia Requerida = 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
52	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	24/08/2019	4693 PSI	3751 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo zapata 1 entre Ejes A - B y Ejes 4` y 5`
Resistencia Requerida = 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
53	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	24/08/2019	4693 PSI	3751 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo zapata 1 entre Ejes A - B y Ejes 4` y 5`
Resistencia Requerida = 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
54	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA	28/08/2019	4215 PSI	4037 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo zapata 1 entre Ejes A - B y Ejes 4` y 5`
Resistencia Requerida = 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
	I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673				TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo Zapata 2 entre Ejes E - F y Ejes 1` y 2`
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
55	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	28/08/2019	4248 PSI	4356 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo zapata 1 entre Ejes A - B y Ejes 4` y 5` (Mixer 1)
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
56	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	31/08/2019	4285 PSI	3767 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y

						CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Ciclópeo Zapata 1 Eje A
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
57	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	06/09/2019	3676 PSI	3883 PSI 3683 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata 2- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
58	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	19/09/2019	4771 PSI	5008 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata 2- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
59	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE	19/09/2019	4015 PSI	5175 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E	Informe de laboratorio por parte del contratista

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata 2- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
	CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673				INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata 1- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F / Columnas TIPO C1 y C2 Eje 1` entre ejes A y E
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
60	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	19/09/2019	4393 PSI	5360 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata 1- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F / Columnas TIPO C1 y C2 Eje 1` entre ejes A y E
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
61	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	22/10/2019	4393 PSI	5360 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Zapata 1- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F / Columnas TIPO C1 y C2 Eje 1` entre ejes A y E Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada). Edad del espécimen: 28 días						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
					equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Zapata 1- Entre Ejes 1` - 2` y Ejes E y F / Columnas TIPO C1 y C2 Eje 1` entre ejes A y E Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada). Edad del espécimen: 28 días						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
62	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	22/10/2019	5024 PSI	5173 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Muros M1 , M2 y columnas C4,C6 y C7 Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada). Edad del espécimen: 28 días						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
63	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	31/10/2019	5459 PSI	5663 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muros M1 , M2 y columnas C4,C6 y C8
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
64	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	31/10/2019	4542 PSI	5359 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnas TIPO C1 ubicada en el Eje 5´ C -D Columnas Tipo C2 Eje 1´ A-B-C-D viga sobre muro M2 zapata columna C1 Eje 5.
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
65	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	11/10/2019	4543 PSI	5093 PSI 5237 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muros M1 , M2 y columnas C4, C6 y C7 Columnas Tipo C1 ubicadas en el Eje 1´ entre Ejes B, C, D Columnas TIPO C2 ubicada en el Eje 1´A Columnas Tipo C1 Ubicadas en el Eje 5´ B,C, Planta segundo nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
66	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE	23/11/2019	4522 PSI	2994 PSI 2997 PSI 4374 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muros M1 , M2 y columnas C4, C6 y C7 Columnas Tipo C1 ubicadas en el Eje 1´ entre Ejes B, C, D Columnas TIPO C2 ubicada en el Eje 1´A Columnas Tipo C1 Ubicadas en el Eje 5´ B,C, Planta segundo nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
	CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673			5260PSI	requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnetas y viguetas Área de producción administración
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
67	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	19/11/2019	3679 PSI	3172 PSI 3292 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro m3, m4, columnas c3, c5, c6 planta primer nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
68	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	05/12/2019	4123 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1". La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnetas y viga cinta antepecho de ventanas segundo piso zona administrativa Eje 1' entre Ejes A-D
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
69	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	06/12/2019	3679 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Dados de concreto reforzamiento viga de cimentación Eje 5` entre Ejes D-F
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
70	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	12/12/2019	4786 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M3, M4, Columnas C3, C5, C6 planta primer nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
71	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	18/12/2019	4123 PSI	4211 PSI 4242 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M3, M4, Columnas C3, C5, C6 planta primer nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
					equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnas tipo C1 Eje 5'entre Ejes E-D- Planta primer nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
72	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	21/12/2019	4059 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnas tipo C1 Eje 5'entre Ejes E-D- Planta primer nivel
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
73	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	22/12/2019	4456 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Vigas de cimentación eje 7 entre Ejes K - S TRAMO 1 Zapata TIPO Z5 Zapatas TIPO Z3 Zapata TIPO Z4 -Eje 3 entre Ejes N, O, P Columnetas Eje 13 entre Ejes O-P
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
74	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	03/01/2020	4148 PSI	5194 PSI 5219 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Anden perimetral
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
75	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673.	23/01/2020	4356 PSI	5024 PSI 5336 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Anden perimetral
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
76	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13	23/01/2020	4356 PSI	5024 PSI 5336 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Anden perimetral
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
	y/o NTC 673.				muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata Z-4A eje DP VC - 1 ejes D-D, zapata Z-4 ejes 3-M
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
77	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	27/01/2020	6150 PSI	5253 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M5 columnas 8 ejes L-11 N-11 columnas C-10 ejes M-4, columnas C-11 eje 7
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
78	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	27/01/2020	6005 PSI	5494 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnetas eje 2 entre ejes R - U (6 elementos)
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
79	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	30/01/2020	3017 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnas C-10 (-8 ejes 11-D - 11-P) columna (-9 ejes 7-Q) columna (-12 ejes 7-5) vigas encima muro M-5)
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
80	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	01/02/2020	4250 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Mortero estructural antepechos zona de producción eje 14 entre Q-4
Resistencia Requerida: 1500 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
81	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	03/02/2020	2850 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Mortero estructural antepechos zona de producción eje 14 entre Q-4
Resistencia Requerida: 1500 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
					trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Mortero estructural eje 14 entre Q-U
Resistencia Requerida: 1500 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
82	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	06/02/2020	4192 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata Z-7 Tramo 1
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
83	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	06/02/2020	5381 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: VIGA AÉREA VG-1 Eje 7 entre Ejes G-K
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
84	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	11/02/2020	4206 PSI	4421 PSI 4501. PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M7 Eje Q Entre Ejes 11-13
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
85	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	11/02/2020	4133 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M-7 eje Q entre ejes 11-13
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
86	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	18/02/2020	4670 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M-7 eje Q entre ejes 11-13
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
					equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columnas C - 11 (X2) ejes; (7 - M) (7-D)
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
87	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	18/02/2020	4670 PSI	4080 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Viga aérea VG-2 Eje 7 entre Ejes Q /, viga aérea VG-12 entre Eje 12 y VG-13 entre Ejes L-D
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
88	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	21/02/2020	4496 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Columna C-9 Ejes; (7-K) Viga; (VG-9) y (VG-1) Ejes; (7-K)
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		

						ESTE DOCUMENTO
89	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	21/02/2020	4532 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Zapata Z-5 ejes; (4-K) y zapata Z-7 ejes; (12-Q).
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
90	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	21/02/2020	4757 PSI	4080 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Vigas aéreas; (V6-2) eje;(7) entre ejes; (Q-V), (V6-13) entre ejes; (L-O).
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
91	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	27/02/2020	4177 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M-6 entre los ejes K-L y 6.
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
92	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	27/02/2020	4356 PSI	4080 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Muro M5 yM6 - Tramo 3
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
93	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	23/05/2020	4235 PSI	4080 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Vigas aéreas; (VG-7) /vg-8 y VG-9 último Tramo.
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
94	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13	28/05/2020	4148 PSI	4080 PSI	Los espécimen tomados y ensayados por las dos partes "CONTRATISTA E INTERVENTORIA" cumplen la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable" Informe de laboratorio

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Vigas aéreas; (VG-7) /vg-8 y VG-9 último Tramo.
Resistencia Requerida: 4000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
	y/o NTC 673				muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	por parte de la interventoría "SIERRA LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS G & S".

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Placa de Contrapiso Zona de Producción y Rampa Planta Eléctrica
Resistencia Requerida: 3000 PSI (Libra Por Pulgada Cuadrada).
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			CONTRATISTA	INTERVENTORIA		
95	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA I.N.V.I.A.S 410-13 y/o NTC 673	17/06/2020	3103 PSI	Se realizó el contra muestreo con los ensayos y seguimiento al diseño de mezcla.	Los espécimen tomados y ensayados por CONTRATISTA DE OBRA cumple la resistencia requerida de acuerdo a la NRS 10 "TITULO C TABLA 3.2.2.1" La diferencia entre las muestras enunciadas es debido a factores de trasporte, tipo de falla y calibración de equipos de laboratorio (Norma INVIAS 410, NTC 550 Y NTC 673).	Informe de laboratorio por parte del contratista de obra. "CONCRELAB medición confiable"

Ensayos Resistencia a la Tracción.

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 1` entre Ejes A - D
Resistencia Requerida: 16500 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº7 = 7/8"

Nº TIPO DE ENSAYO		FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
96	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ACERO DE REFUERZO Nº7 (7/8") - Norma ASTM A 708 y/o NTC 2289	13/09/2019	16500 Kgf	6000 Kgf	El Ensayo realizado no cumple, se presenta falla en el concreto y ADHESIVO ANCHORFIX 3001. El material base, concreto, no alcanzo la resistencia esperada, al ser sometido a esfuerzo a tracción perpendicular sin confinamiento por hierros de esfuerzos, al presentar falla (Rotura) por cortante, como de falla, en aproximadamente la mitad de la longitud de adherencia, en ambos casos. Observaciones: debido a que el ensayo realizado no cumplió con lo exigido se procedió a ejecutar la demolición de la viga de	Informe ensayo de laboratorio Fijaciones torres

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 1` entre Ejes A - D Resistencia Requerida: 16500 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº7 = 7/8"						
Nº		FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL
					cimentación existente y realizar una nueva viga de cimentación.	

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 1` entre Ejes A - D Resistencia Requerida: 16500 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº5 = 5/8"						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
97	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ACERO DE REFUERZO Nº5 (5/8") - Norma ASTM E 488 / E 488M.	13/09/2019	16500 Kgf	7500 Kgf	El Ensayo realizado no cumple, se presenta falla en el concreto y ADHESIVO ANCHORFIX 3001. El material base, concreto, no alcanzo la resistencia esperada, al ser sometido a esfuerzo a tracción perpendicular sin confinamiento por hierros de esfuerzos, al presentar falla (Rotura) por cortante, como de falla, en aproximadamente la mitad de la longitud de adherencia, en ambos casos. Observaciones: debido a que el ensayo realizado no cumplió con lo exigido se procedió a ejecutar la demolición de la viga de cimentación existente y realizar una nueva viga de cimentación.	Informe ensayo de laboratorio Fijaciones torres

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 1` entre Ejes A - D Resistencia Requerida: 11300 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº5 = 5/8"						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
98	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ACERO DE REFUERZO Nº5 (5/8") - Norma ASTM E 488 / E 488M.	13/09/2019	11300 Kgf	7500 Kgf	El Ensayo realizado no cumple, se presenta falla en el concreto y ADHESIVO ANCHORFIX 3001. El material base, concreto, no alcanzo la resistencia esperada, al ser sometido a esfuerzo a tracción perpendicular sin confinamiento por hierros de esfuerzos, al presentar falla (Rotura) por cortante, como de falla, en aproximadamente la mitad de la longitud de adherencia, en ambos casos. Observaciones: debido a que el ensayo realizado no cumplió con lo exigido se procedió a ejecutar la demolición de la viga de cimentación existente y realizar una nueva viga de cimentación.	Informe ensayo de laboratorio Fijaciones torres

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 1` entre Ejes A - B
Resistencia Requerida: 3000 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº3 = 3/8"

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
99	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ACERO DE REFUERZO Nº3 (3/8") - Norma ASTM E 488 / E 488M	18/09/2019	3000 Kgf	4500 Kgf	Si cumple el material base, mampostería maciza, alcanzó la resistencia esperada, al ser sometido a esfuerzo a tracción perpendicular sin confinamiento por hierros de refuerzo, al no presentar falla (rotura) por cortante. El anclaje de varilla Nº 3 (3/8") con un empotramiento de 30 cm ensayado alcanzo el 150% de la resistencia esperada (As x Fy) con un empotramiento de 15.79 veces el diámetro de la varilla.	Informe ensayo de laboratorio Fijaciones torres

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Elemento Estructural: Viga de cimentación Eje 5` entre Ejes C - D
Resistencia Requerida: 3000 Kgf (kilogramo-fuerza)- Acero Nº3 = 3/8"
Edad del espécimen: 28 días

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
100	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN ACERO DE REFUERZO Nº3 (3/8") - Norma ASTM E 488 / E 488M	18/09/2019	3000 Kgf	4500 Kgf	Si cumple, el material base, concreto armado, alcanzó la resistencia esperada, al ser sometido a esfuerzo a tracción perpendicular sin confinamiento por hierros de refuerzo, al no presentar falla (cono de falla) por cortante. El anclaje de varilla N.º 3 (3/8") con un empotramiento de 15 cm ensayado alcanzo el 125% de la resistencia ultima (Rotura) (As x Fy) con un empotramiento de 15.79 veces el diámetro de la varilla.	Informe ensayo de laboratorio Fijaciones torres

Doblado de Barras Corrugadas para Refuerzo de Concreto

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL
Material: Varilla)- Acero Nº5 = 5/8"
Resistencia Requerida: 60000 PSI (Libra por pulgada cuadrada)

Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
			RESISTENCIA ESPERADA.	RESISTENCIA OBTENIDA		
101	DOBLADO DE BARRAS CORRUGADAS Nº5 (5/8") – Norma NTC 2289	10/09/2019	60000 PSI	60000 PSI	El Ensayo realizado si cumple, de acuerdo a la norma NTC 2289 y la NRS 10	Informe ensayo de laboratorio GGS LABORATORIO DE SUELOS

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Material: Varilla)- Acero Nº5 = 5/8" Resistencia Requerida: 60000 PSI (Libra por pulgada cuadrada)						
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE	RESULTADO DEL ENSAYO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO
						PAVIMENTOS

LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLÁSTICO (NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13).

Ubicación: SEDE IMPRENTA DISTRITAL Material: Grava Areno limosa					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
102	LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLÁSTICO (NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	17/10/2019	Gravas = 44.9 %. Arena = 29.3% Finos= 25.9 %	Si cumple de acuerdo a la NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	Informe ensayo laboratorio LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Material: Grava Areno limosa					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
103	LIMITE LIQUIDO - LIMITE PLÁSTICO (NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	17/10/2019	Gravas = 44.9 %. Arena = 29.3% Finos= 25.9 %	Si cumple de acuerdo a la NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	Informe ensayo laboratorio LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Material: Diseño de mezclas para Concreto de 3000 PSI y 4000 PSI					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
104	GRANULOMETRÍA (ARENA COLOR GRIS CANTERA EL VINCULO) – NTC 174	17/11/2019	MASA TOTAL: 4129 Gramos MASA RETENIDA: 4129 Gramos MASA CORREGIDA: 4129 Gramos	Si cumple de acuerdo a la NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	Informe ensayo laboratorio LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Material: Diseño de mezclas para Concreto de 3000 PSI y 4000 PSI					
Nº	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADO DEL ENSAYO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
105	GRANULOMETRÍA (GRAVA COLOR GRIS CANTERA EL VINCULO) – NTC 174	17/11/2019	MASA TOTAL: 7766 Gramos MASA RETENIDA: 7766 Gramos MASA CORREGIDA: 7766 Gramos	Si cumple de acuerdo a la NORMA INV-E-125-13 / INV-E-126-13)	Informe ensayo laboratorio LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS SIERRA LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S

Ubicación: Sede IMPRENTA DISTRITAL Material: BASE GRANULAR B 400					
Nº	**TIPO DE ENSAYO**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADO DEL ENSAYO**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO**	**IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO**
106	DENSIDADES (DENSÍMETRO NUCLEAR) NTC 1667	19/07/2020	RESULTADO = 100.8% RESULTADO = 98.8% RESULTADO = 99.1. % RESULTADO = 99.21%, RESULTADO = 97.3.4%	Si cumple de acuerdo a la NORMA NTC 1667 EL CUAL EXIGE UN 95 %	Informe ensayo laboratorio LABORATORIO CONCRELAB

5.3 CONSOLIDADO CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

5.3.1 SEDE MANZANA LIÉVANO

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	PINTULUX – PINTURA (Esmalte alquídico)	PINTUCO	Ficha de seguridad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
2	WASH PRIMER (Acondicionador de superficies metálicas)	HEXION	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
3	TUVALREP SAS (Redes contra incendios A-795 Negro)	COLMENA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
4	TUVALREP SAS (Tubería presión negro A-53)	COLMENA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.

5.3.2 SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
5	ENTIBADO METÁLICO "OGUV TEST"	EURO TEST CERTIFICATE	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
6	CAJAS DE CONEXIÓN CONDUIT "METÁLICAS"	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
7	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES PARA FUERZA. "Serie 8000 Para Fuerza 600v"	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
8	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS "Serie 8000 Para Fuerza 600v"	COLMENA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
9	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	LENOR COLOMBIA S.A.S	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
10	INTERRUPTORES MANUALES	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
11	TOMACORRIENTES	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
12	COMBINACIÓN INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
13	SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA	CERTECNICA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
14	SIKA FLEX - 1A PLUS" Sellador profesional de alto desempeño"	SIKA	Certificado de	Cumple de acuerdo a los diseños en

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
			Calidad	planos y especificaciones técnicas.
15	SIKALASTIC – 8850 "Membrana de poliuria pura de dos componentes aplicada con equipo de aspersión, con alta resistencia química y mecánica"	SIKA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
16	TABLEROS PARA BAJA TENSIÓN MARCA LUMINEX	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
17	SIKADUR-32 PRIMER" Resina viscosa"	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
18	SIKAGROUT 212 "Mortero color gris concreto"	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
19	TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO	CELTA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
20	GEOTEXTIL TEJIDO "MARV"	PAVCO	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
21	ADHESIVO EPÓXICO DURAFORT" CELTA"	CELTA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
22	LUMINARIAS	NYCE COLOMBIA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
23	BOMBILLOS LED LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	LENOR	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
24	IGOL DENSO PLUS "Protección impermeable con aditivo antiraiz para estructuras enterradas y jardineras"	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
25	IGOL IMPRIMANTE "Imprimante bituminoso forma parte del sistema IGOL DENSO PLUS"	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
26	LUMINARIAS TIPO LED "Luminarias tipo LED para uso exterior (Ojo de bwey)"	SGS COLOMBIA S.A.S	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
27	SIKAFLEX CONSTRUCTION "Sellador para fachadas de concreto y mampostería".	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
24	PUERTA CORTAFUEGO "Puerta cortafuego abisagrada metálica, de una hoja y doble galvanizada resistente al fuego"	CERTECNICA	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
25	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCHA CHINT "Monopolares, bipolares y tripolares desde 1 hasta 63 A"	ONAC	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
26	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MARCHA CHINT "En caja moldeado desde 10 hasta 1250 A"	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
27	TOMAS Y CLAVIJAS" Industriales"	ONAC	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
28	C THHN7THWN-2 6 AWG Cu(B)	PROCABLES	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
29	LUMINARIAS	LENOR COLOMBIA S.A.S	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
30	PLATINAS DE COBRE (C11000 Espesores 1/8" a 1/2")	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
31	LUMINARIAS TIPO LED "Luminarias tipo LED para uso exterior (Ojo de bwey)"	SGS COLOMBIA S.A.S	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
32	LED BALA 60W HIGH POWER "Luminarias Monolito central"	DIALux	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
33	RESINA DE POLIÉSTER - CRISTALAN 863 "Poliéster Isoftálicos con resistencia química para tuberías y tanques"	ANDERCOL	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
34	LUMINARIAS "Led bala HIGH POWER, Led Kardan Una Luz, Led Kardan Dos Luces, Led Kardan Tres Luces, Led Spot Track, Led Ecokit"	LENOR COLOMBIA S.A.S	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
35	BOMBILLOS LED LUMINARIAS DE EMERGENCIA	LENOR	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
36	CIRCUIT INTERRUPTERS "KCXS. E48380"	UL PRODUCT IQ	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
37	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE O ALUMINIO "Cables y conductores eléctricos Serie 8000 - 600 V"	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
38	VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	CIDET	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
39	MOTOBOMBA "Pozo eyector sistema de filtro perimetral"	Pozo eyector sistema de filtro perimetral	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
40	S-FTP CABLE CAT 6A - XG SERIES "Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),"	HOWELL NETWORK	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
41	KEYSTONE JACKS CAT6A "Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),"	HOWELL NETWORK	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
42	PATCH CORDS CAT6A "Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),"	HOWELL NETWORK	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
43	PATCH PANELS CAT6A "Transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN),"	HOWELL NETWORK	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
44	SWITCHES INTELIGENTES "SERIE 220"	CISCO	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
45	ID CABLE PANEL VOZ Y DATOS "Cable Tyco CAT 6A F/UTP CMR"	LINKWARE PC	Certificado de Calidad	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
46	SIKA ANCHOR FIX – 3001 "Adhesivo para anclajes de alta resistencia a base de resinas EPOXICA"	SIKA	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.

5.3.3 SEDE IMPRENTA DISTRITAL

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
47	CEMENTO "Cementos grises, blancos y de pozos de petróleo"	HOLCIM	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
48	MASTER EMACO P-1040 "Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo "	BASF	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas.
49	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO (Acero 5/8")	SIDENAL	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
50	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO (Acero 5/8")	LABORATORIO G&S	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
51	MANÓMETRO ANÁLOGO "Manómetro Análogo"	ICONTEC	certificado de calidad	Cumple de acuerdo a lo solicitado en planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.
52	CEMENTO "Cemento Hidráulico"	FORTECEM	Ficha Técnica	Cumple de acuerdo a la norma NTC 121 "Tipos de cemento y características"
53	SIKAGROUT 212 "Mortero sin contracción para anclajes y	SIKA	Ficha Técnica	Cumple de acuerdo a lo solicitado y aplica de acuerdo a

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	rellenos de precisión"			la ficha técnica del producto bajo la norma Icontec.
54	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO (Acero 5/8")	SIDENAL	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
55	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO (Acero 7/8")	SIDENAL	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
56	BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO "Rollo Corrugado No 3 (3/8")	SIDENAL	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
57	LADRILLO COMUN RECOCIDO	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 4205 (ingeniería y arquitectura unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos.
58	TUBERÍA ACCESORIOS PRESIÓN (PVC)	CELTA	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 382 - 2011 "TUBOS DE PVC CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (serie RDE).
59	TUBERÍA Y ACCESORIOS DURAFORT ALCANTARILLADO	CELTA	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 5055 - 20116 "TUBOS Y ACCESORIOS POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) PERFILADOS PARA USO EN ALCANTARILLADOS POR GRAVEDAD, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INTERNO.
60	TUBOS DE PRESIÓN (PVC)	CELTA	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 382 - 2011 "TUBOS DE PVC CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (serie RDE).
61	TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO	CELTA	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 5055 - 20116 "TUBOS Y ACCESORIOS POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) PERFILADOS PARA USO EN ALCANTARILLADOS POR GRAVEDAD, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INTERNO.
62	ACCESORIOS PARA PRESIÓN (PVC)	CELTA	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 382 - 2011 "TUBOS DE PVC CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (serie RDE).
63	TUBO DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS "CELTA"	EURO TEST CERTIFICATE	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
64	ALAMBRÓN "HIERRO FIGURADO"	GERDAU	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
65	ALAMBRÓN "HIERRO FIGURADO"	PAZ DEL RIO	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
66	BLOQUE ESTÁNDAR No 4 (30X20X10)	LADRILLERA LA ESTRELLA	Ficha Técnica	Cumple de acuerdo a la norma NTC 4205 (ingeniería y arquitectura unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos.
67	PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE (MS-9200UDLS)	FIRE - LITE	Ficha Técnica	Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
68	BARRA CORRUGADA" Acero de refuerzo"	PAZ DEL RIO	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2289 "BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZO DE CONCRETO)
69	CEMENTO "Cementos grises, blancos y de pozos de petróleo"	HOLCIM	Ficha Técnica	Cumple de acuerdo a la norma NTC 121 "Tipos de cemento y características"

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
70	MORTERO 12,5 Mpa "Diseño de mezcla"	IDICOL	Ensayo de laboratorio	Cumple de acuerdo a la norma NTC 3546 "Elaboración de diseño de morteros.
71	CONCRETO DE 4000 PSI "Diseño de mezcla"	IDICOL	Ensayo de laboratorio	Cumple de acuerdo a la norma NTC 31 "INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA. CEMENTO Y DEFINICIONES."
72	PERFILERÍA "Ductería Pota cable, metálico, perfilería, sistema estructural liviano, defensas viales, cofres metálicos, cajas de paso "	ICONTEC	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas.
73	TUBERÍA (Welded Tube)	ICONTEC	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas y especificaciones técnicas del proyecto.
74	TUBOS CONDUIT METÁLICOS RIGID "Diámetro 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4" y 6" incluye uniones, niples, codos y curvas"	CIDET	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
75	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS "Cobre desnudo, suave, semiduro y duro, cableado concéntrico"	CIDET	Certificado de calidad	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
76	D-WT (Inmunizante para madera)	BAYER	Ficha técnica	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas del proyecto.
77	COLL ROLLED CAL A-36 "Platina hot rolled cal A-36 IMT - 60 -4.5 mm"	COLMALLAS	Certificado de calidad	Si cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a la norma NTC 2365.
78	ADOQUÍN PARA USO VEHICULAR (20CM*10CM*6CM) "Adoquín para uso vehicular".	CENTRAL DE ENSAYOS Y DISEÑOS LTDA.	Certificado de calidad.	Si cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a la norma NTC 4205 (ingeniería y arquitectura unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos.
79	ESTRUCTURA PARA CIELO RASO "Angulo /Viguetas y Omegas."	PLETORA PCV Y LAMINADOS.	Ficha técnica.	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a la norma NTC 4373
80	POZO DE INSPECCIÓN "cargues y fondo diámetro 1.70m/ cono de reducción".	CONCRELAB.	Ensayo de laboratorio.	Ensayo a la compresión (NTC 673-2010) prefabricados pozo de inspección. Cargues y fondos diámetro 1.70m = 5235 PSI Cono de reducción = 4220 PSI.
81	GENERADORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS." Certificado de conformidad de producto."	ACREDITADO ONAC "ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN COLOMBIANA.	Certificado de calidad.	Si cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN TIPO SELLO 5- ISO/IEC 17067.
82	PINTURA VINILO TIPO 1 -COLOR GRIS BASALTO.	INDUPIN EVOLUCIÓN AL FUTURO	Ficha técnica.	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a la norma NTC 1335.
83	PINTURA VINILO TIPO 1 -COLOR BLANCO	PINTURAS TITO PABON	Ficha técnica.	Cumple de acuerdo a lo solicitado en especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a la norma NTC 1335.
84	CERTIFICADO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADOR "Generador eléctrico de stand by de 400kva, 4400v, 60hz".	AWA INGENIERÍA LTDA	Certificado de calidad.	Si cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de diseño de acuerdo a ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN TIPO SELLO 5- ISO/IEC 17067.

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
85	CABLE 500 MCM COBRE/CABLE 350 MCM COBRE/CABLE DESNUDO -210 "Certificado de Conformidad de Producto."	AWA INGENIERÍA LTDA	Certificado de calidad.	CIDET "corporación centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector eléctrico
86	PLATA ELECTRICA " DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN "AGENCIA DE ADUANAS AQUASIA S.A.S NIVEL 2."	AGENCIA DE ADUANAS AQUASIA S.A.S NIVEL 2	Certificado de calidad.	Plantas eléctricas & SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.A.S.
87	CABLES MONOPOLARES Y MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE O ALUMINIO SERIE 8000, PARA FUERZA, 600V.APTOS PARA USO EN CT (CABLE TRAY) "	CIDET "CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELECTRIC	Certificado de calidad.	Características e identificación de cables y conductores eléctricos fabricados por productora de cables PROCABLES S.A.S.
88	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 30MM *2.5*5800MM "HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIÁMETRO 38 MM *3 H MADE IN ITALY"	A.D TUBI INOSSIDABILI SPA "MARIOFF HI-FOG"	Certificado de calidad.	Cumple de acuerdo a lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a la norma NFPA 14.
89	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 30MM *2.5*5800MM "HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 30 MM *2.5 H MADE IN ITALY"	A.D TUBI INOSSIDABILI SPA "MARIOFF HI-FOG"	Certificado de calidad.	Cumple de acuerdo a lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a la norma NFPA 14.
90	TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 12MM *1.2*5800MM "HI-FOG SPRINKLER SYSTEM W HEAT - TUBE EN 10217-7TC1W2R DIAMTREO 12 MM *1.2H MADE IN ITALY"	A.D TUBI INOSSIDABILI SPA "MARIOFF HI-FOG"	Certificado de calidad.	Cumple de acuerdo a lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto de acuerdo a la norma NFPA 14.
91	TUBERÍA METÁLICA Y ACCESORIOS METÁLICOS " STEEL ELECTRICAL METALLIC TUBING ELBOWS 90 DEGREES, "Codos de tubería metálica eléctrica de acero de 90 grados". STEEL ELECTRICA METALLIC TUBINGS "tubos metálicos eléctricos acero".	ELECTRICA METALLIC TUBING	Certificado de calidad.	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
92	CELDA SF6 "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO (CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CELDAS PARA MEDIA TENSIÓN.)	ELECTRICA METALLIC TUBING	Certificado de calidad.	Cumple de acuerdo a la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
93	IW-EPOXYFILLER CON IW-NIV (CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO POLÍMERO EPÓXICO LIQUIDO (KATALIZACION))	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Polímero epóxico líquido, que endurece por reacción química (catalizacion) entre dos componentes, usado como primer, puente de adherencia, capas de nivelación o regulación y búsqueda.
94	IW- MASILLEPOX (CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE	INDUWORKER	FICHA	Masilla epóxico para reparación de huecos, grietas,

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	PRODUCTO MASILLA EPOXICA)		TÉCNICA.	fisuras y/o como barrera de vapor.
95	IW- EPOXIFILLER CON IW-WET (CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO POLÍMERO EPÓXICO LIQUIDO (CATALIZACION)	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Polímero epóxico líquido, que endurece por reacción química (canalización) entre dos componentes, usando como primer puente de adherencia, cuando la superficie a trabajar está húmeda.
96	IW- MORTEROEPOX (MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN DE JUNTAS, HUECOS, CRATERES, ETC.).	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Mortero epóxico usado para la reparación rápida de juntas, huecos, cráteres, etc., que endurece por reacción química (canalización) entre tres componentes, brindando reparaciones de características a las del concreto, junto con las ventajas inherentes de los EPÓXICOS.
97	IW-EPOXYCOVER CON IW-TCR 800 "PINTURA EPOXICA 100% SOLIDOS PARA RECUBRIMIENTOS EXIGENTES."	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Recubrimiento de bajo espesor a base de resinas epoxicas de altos sólidos, que endurece por reacción química (catalizacion) entre dos componentes, brindando protección, endurecimiento e impermeabilización de las superficies.
98	IW-EPOXYCOVER CON IW-TCR 800 "PINTURA EPOXICA 100% SOLIDOS PARA RECUBRIMIENTOS EXIGENTES."	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Recubrimiento de bajo espesor a base de resinas epoxicas de altos sólidos, que endurece por reacción química (catalizacion) entre dos componentes, brindando protección, endurecimiento e impermeabilización de las superficies.
99	CARGAS DE CUARZO DE SILICE "SON CARGAS DE CUARZO DE SILICE DE DIFERENTES GRANULOMETRÍAS"	INDUWORKER	FICHA TÉCNICA.	Mezcla con productos epoxicos para generar espesor y mayor resistencia mecánica.
100	CELDA DE MEDIA TENSIÓN "SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA ALOJAR TRASFORMADORES"	QCERT "ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN"	FICHA TÉCNICA.	Si cumple de acuerdo a especificaciones técnicas y planos de diseño teniendo en cuenta lo exigido en la norma RETIE y la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
101	TRASFERENCIA AUTOMÁTICA PARA 250 KVA, TIPO AC-3A.CON CONTACTORES PARA 400 AMP 440V	CIDET CERTIFICACIÓN	FICHA TÉCNICA.	Si cumple de acuerdo a especificaciones técnicas y planos de diseño teniendo en cuenta lo exigido en la norma RETIE y la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
102	TERMINAL PREMOLDEADA USO EXTERIOR/INTERIOR PARA 35 KV PARA CABLE 2-4/0 AWG.	CIDET CERTIFICACIÓN	FICHA TÉCNICA.	Si cumple de acuerdo a especificaciones técnicas y planos de diseño teniendo en cuenta lo exigido en la norma RETIE y la norma NTC 2050 – código eléctrico colombiano.
103	TUBOS Y CURVAS DE PVC "TUBOS Y CURVAS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS".	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	FICHA TÉCNICA.	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN Nº 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20,6,1,1.
104	BOMBAS ALTAMIRA SERIE4 LOTUS "BOMBAS MULTI ETAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE"	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	FICHA TÉCNICA.	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RAS 2000.
105	CABLE FPL 14 OS	FPLR 14 AWG 2 SOLID CONDUCTORS	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		RISER		
106	CRF- 300(A) RELAY MODULE "EL MÓDULO RALY DIRECCIONABLE CRF -300 (A) EL SISTEMA CON SALIDA DE CONTACTO SECO PARA ACTIVAR UNA VARIEDAD DE DISPOSITIVOS AUXILIARES"	FIRE-LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
107	DETECTOR INTELIGENTE DE RAYOS REFRACTIVOS I-910 SR "EL DETECTOR INTELIGENTE DE RAYOS REFLECTANTE CON AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y DE UNA AUTONOMÍA DE ENTRE 8 A 100 METROS, FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE OSCURECIMIENTO DE REFLEXIÓN DEL HAZ DE INFRARROJOS."	FIRE-LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
108	INDOOR SELECTABLE -OUTPUT HORNS, STROBES, AND HORN STROBES FOR WALL APPLICATIONS. "LOS PRODUCTOS DE NOTIFICACIÓN VISIBLE AUDIBLE DE LA SERIE L DEL SENSOR DE SISTEMA SON RICOS CON CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS PARA REDUCIR LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN Y MAXIMIZAR LAS GANANCIAS CON UN DISEÑO DE CORRIENTE MÁS BAJO Y ESTÉTICA MODERNA".	FIRE-LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
109 110	W- BG 12LX & W-BG-12LXSP (SWIFT WIRELESS PULLSTATIONS. "LA ESTACIÓN DE TRACCIÓN DIRECCIONABLE SWIFT DE FIRE-LITE ES UNA ESTACIÓN DE TRACCIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN CON UNA FUNCIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE BLOQUEO DE LLAVE QUE PROPORCIONA UNA ENTRADA DE INICIACIÓN DE ALARMA DIRECCIONABLE"	FIRE-LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
111	MS-9600 LS €/MS -9600 UDLS "SON FACPS (PALETES DE CONTROL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS) COMPACTOS, RENTABLES E INTELIGENTES CON UNA AMPLIA LISTA DE POTENTES FUNCIONES."	FIRE-LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
112	FN -300-UXL, FN -400-ULX, FN - 400-UXL, FN-600-UXL, FN-1024-ULX. "SON EXTREMADAMENTE RENTABLES EXTENSORES DE ENERGÍA REMOTOS REGULADOS POR VOLTAJE."	HOCHIKI AMÉRICA CARPARATIONS.	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
113	SWIFT WIRELESS GATEWAY "EL SISTEMA INALÁMBRICO SWIFT SE PUEDE APLICAR EN MUCHAS SITUACIONES QUE SON PROBLEMÁTICAS PARA LOS DISPOSITIVOS CON CABLE TRADICIONALES."	HOCHIKI AMÉRICA CARPARATIONS.	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
114	SD365T AND SD365T-IV (INTELIGENTE PHOTOELECTRIC AND TEMPERATURE SENSORS "LOS MODELOS SD 365T-IV SON SENSORES DE HUMO MULTISENSOR TIPO ENCHUFE QUE COMBINAN UNA CÁMARA DE SENSOR FOELECTRÓNICA Y UN DETECTOR DE CALOR DE TEMPERATURA FIJA DE 135º F (57,2ºC) A TRAVÉS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS DIRECCIONABLES."	FIRE -LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
115	MMF -300 (A) SERIES, MDF -300 "ESTÁN DISPONIBLES CUATRO MÓDULOS DE MONITOR DIFERENTES PARA LOS	FIRE -LITE ALARMS BY	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA

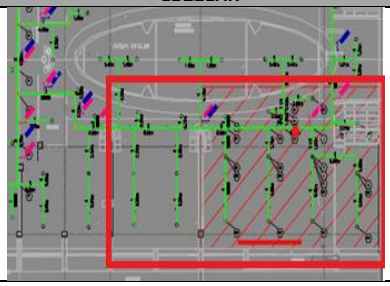
Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
	PANELES DE CONTROL INTELIGENTES DE FIRE-LITE PARA ADAPTARSE A UNA VARIEDAD DE APLICACIONES, LOS MÓDULOS DE MONITOR SE UTILIZAN PARA SUPERVISAR UN CIRCUITO DE APLICACIONES".	HONEYWELL		14 y NTC 1669.
116	KB 1272 12 V7, 0 ah" LA SERIE ESTÁNDAR CONSTA EN BATERÍAS VRLA-TECNOLOGÍA AGW (MAT DE VIDRIO ABSORBENTE). CON UNA VIDA ÚTIL DE DISEÑO DE 3-5 AÑOS Y ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES GENERALES COMO UPS, TELECOMUNICACIONES Y APLICACIONES ELÉCTRICAS."	KAISE BATERIAS.	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
117	BG -12 LXSP ADRRESSABLE PULL STATION "LA ESTACIÓN DE TRACCIÓN DIRECCIONABLE BG-12LXSP ES UNA ESTACIÓN DE TRACCIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN NO CODIFICADA CON UNA FUNCIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE BLOQUEO CON LLAVE."	FIRE -LITE ALARMS BY HONEYWELL	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
118	CHAPA ANTIBANDALICA ISEO SERRATURE S.P.A "SE REFIERE A LA SERIE IDEA DE BARRAS DE EMPUJE Y PERNOS, SERIE DE PERNOS, BASE IDEA Y PERNOS DE SALIDA DE PÁNICO Y DISPOSITIVOS DE SALIDA DE PERNO IDEA PAD Y N, COMO SE DETALLA EN ESTE CERTIFICADO".	SEO SERRATURE S.P. A	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.
119	TANQUE PRECARGADOVERTTICAL DE DIAGRAMA ALTAMIRA." SERIE PRO XLB, ACERO AL CARBON, 56 GAL, PRESIÓN MÁXIMA 125 PSI".	ALTAMIRA (FIBRAS Y NORMAS DE COLOMBIA S.A.S	FICHA TÉCNICA.	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
120	BRIDAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA NIKO "DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS BRIDAS Y ACCESORIOS MARCA NOKI EN ACERO INOXIDABLE / BRIDAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE MARCA NIKO"	NIKO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.
121	ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE 150 LB "ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE 150 LB NPT EXTREMO MARCA NIKO."	NIKO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669. Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
122	ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE 150 LB "ACCESORIOS ROSCADOS DE ACERO INOXIDABLE 150 LB NPT EXTREMO MARCA NIKO".	NIKO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669. Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
123	ACCESORIOS SOLDADOS EN ACERO INOXIDABLE "ACCESORIOS SOLDADOS EN ACERO INOXIDABLE A 403 ANSI B16.9 MARCA NIKO"	NIKO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669. Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
124	ACCESORIOS SOLDADOS EN ACERO INOXIDABLE "ACCESORIOS SOLDADOS EN ACERO INOXIDABLE A 403 ANSI B16.9 MARCA NIKO"	NIKO	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669. Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
125	VÁLVULAS "VÁLVULAS MARCA SIGMA, BRIDA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y VÁLVULAS MARCA SIGMA".	SIGMA S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Cumple lo exigido en planos de diseño y especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma NFPA 14 y NTC 1669.

Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
				Cumple de acuerdo a la norma NFPA 14 y NTC 1669.
126	AISLADORES ELÉCTRICOS DE RESINA EPOXICA, PORTABARRAS, PASAMUROS, BORNES AISLADOS Y AISLADORES ELÉCTRICOS DE RESINA POLIÉSTER.	MATRIMOL S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
127	CORAZA LIIQUIDTIGHT COR-ACERO DE 3/8" HASTA 4"	COR ACERO S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
128	CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCAS CONDUMEX Y LATINCASA "ALAMBRES Y CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600 V".	CONDUMEX S.A DE C.V.	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
129	TUBOS CONDUIT "METÁLICOS MARCA FUJI - TUBERÍA EMT (DIÁMETROS (1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2" - 21/2" - 3" - 4")	CODUIT DEL ECUADOR S.A.	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
130	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS "CABLES MULTICONDUCTORES DE COBRE SUAVE FLEXIBLES TIPON DUPLEX CPE-SPT Y TERMOFLEX CON AISLAMIENTO PVC - NYLON PARQA 105ªC COMN CHAQUETA EN PVC PARA 600 V".	PROCABLES S.A C.	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
131	TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN "	AUTOMEX S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
132	JUNTAS DE EXPANSIÓN DE GOMA, ESFERA ÚNICA BRIDA EDNS ANSI B 16	MATRIMOL S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
133	SD365 SERIES ADDRESSABLE PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTORS "LAS ALARMAS FIRE -LITE SD365 (A) Y SD365HT (A) LOS DETECTORES DE HUMO INTELIGENTES ENCHUFADLES ESTÁN DISEÑADOS TANTO PARA EL RENDIMIENTO COMO PARA LA ESTÉTICA Y SON REEMPLAZOS DIRECTOS DE LA SERIE SD365."	MATRIMOL S.A.S	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN Nº 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
134	BORNERAS Y TERMINALES DE CONEXIÓN "TERMINALES DE CONEXIÓN POR TORNILLO, CONEXIÓN RÁPIDA, ALTA CORRIENTE, MULTINIVEL, SENSOR, DESCONEXIÓN Y DISTRIBUCION"	MARCA KLEMSAN	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN Nº 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.

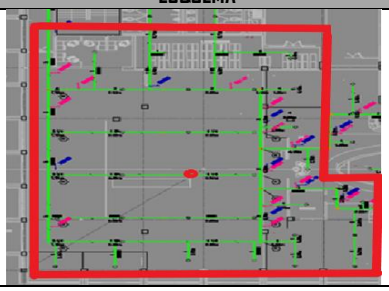
Nº	MATERIAL	ORIGEN	CERTIFICADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
135	CONDUCTORES ELÉCTRICOS. "COBRE Y ALUMINIO, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICOS, 600V, TIPOS TW, THW, THHN/THWN, THHN/THWN-2 Y THWN-2, APTOS PARA USO EN TC (TRAY CABLE) Y RESISTENTE A LA LUZ SOLAR".	FIRE -LITE ALARMS BY HONEYWELL	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
136	MMF-300 MONITOR MODULE INSTALLATION INSTRUCTIONS "EL MÓDULO DE MONITOR MMF-300 ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN SISTEMAS DIRECCIONABLES DE DOS CABLES, DONDE SE SELECCIONA LA DIRECCIÓN INDIVIDUAL DE CADA MÓDULO UTILIZANDO LOS INTERRUPTORES GIRATORIOS INCORPORADOS."	FIRE -LITE ALARMS BY HONEYWELL	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.
137	CRF-300 RELAY CONTROL MODULE INSTALLATION INSTRUCTIONS. "EL MÓDULO DE CONTROL DE RELÉ CRF-300 ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN SISTEMAS DIRECCIONABLES DE DOS HILOS, DONDE SE SELECCIONA LA DIRECCIÓN INDIVIDUAL DE CADA MÓDULO UTILIZANDO LOS INTERRUPTORES GIRATORIOS INTEGRADOS. PERMITE UN PANEL DE CONTROL COMPATIBLE PARA CAMBIAR CONTACTOS DISCRETOS POR CÓDIGO DE COMANDO".	FIRE -LITE ALARMS BY HONEYWELL	CERTIFICADO DE CALIDAD	Si cumple de acuerdo a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N. º 90708 de 2013 del ministerio de minas y energía -RETIE 2013-capitulo3, articulo 20,6 y 20, 6, 1,1.

5.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL COMPONENTE DE CALIDAD.

5.4.1 SEDE MANZANA LIÉVANO.

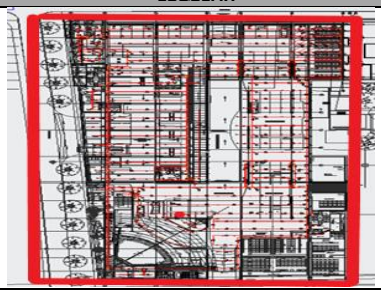
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - TERCER PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 08 de Agosto de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 233: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área TERCER PISO BICENTENARIO 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 234**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área TERCER PISO BICENTENARIO 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 235**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		

Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - TERCER PISO (Suministro e Instalación)
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14.
Fecha de Registro fotográfico: 03 de Agosto de 2019

ANTES	DESPUÉS	ESQUEMA
		
FOTO No. 236: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área RED DE ROCIADORES EN TERCER PISO BICENTENARIO 2 ZONA 1 SUB ZONA 2 Y 3 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 237**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine la prueba de presión en el área RED DE ROCIADORES EN TERCER PISO BICENTENARIO 2 ZONA 1 SUB ZONA 2 Y 3 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 238**: Se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

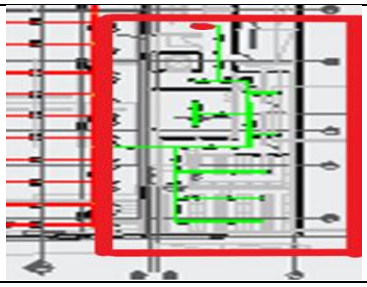
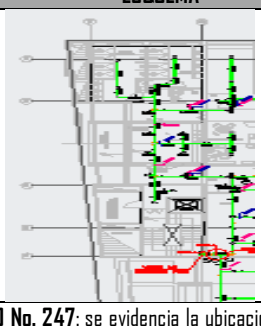
Capítulo: 1 CUARTO DE BOMBAS (Suministro e instalación)
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14
Fecha de Registro fotográfico: 16 de Agosto de 2019

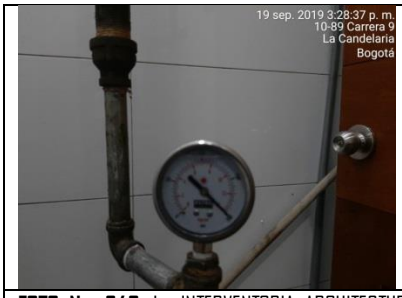
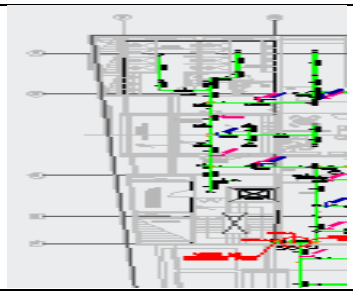
ANTES	DESPUÉS	ESQUEMA
		
FOTO No. 239: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área sótano 1 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 240**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine la prueba de presión en el área sótano 1 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 241**: Se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Capítulo: 3.1 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - SÓTANO 2 (Suministro e instalación)
Prueba: SÓTANO 2 ZONA DE BODEGAS RED CONTRA INCENDIO NUEVA
Fecha de Registro fotográfico: 4 de Septiembre de 2019

ANTES	DESPUÉS	ESQUEMA

		
FOTO No.242: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área SÓTANO 2 ZONA DE BODEGAS RED CONTRA de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 243**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine la prueba de presión en el área SÓTANO 2 ZONA DE BODEGAS RED CONTRA de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 244**: Se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – TERCER PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 245: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área BICENTENARIO 1 TERCER PISO (Suministro e Instalación) de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 246**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área BICENTENARIO 1 TERCER PISO (Suministro e Instalación) de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 247**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.2 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - PRIMER PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 248: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – primer piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 249**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – primer piso edificio bicentenario 2 (Suministro e Instalación) de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 250**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – TERCER PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 251: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – tercer piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 252**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – tercer piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 253**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - SEGUNDO PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 21 de septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

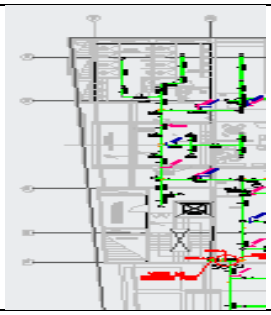
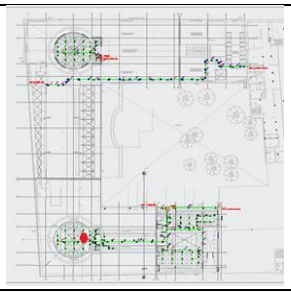
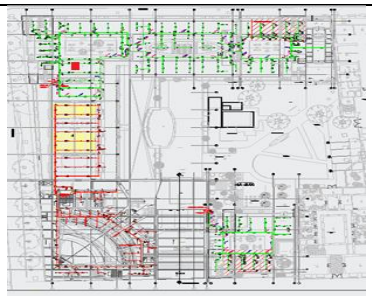
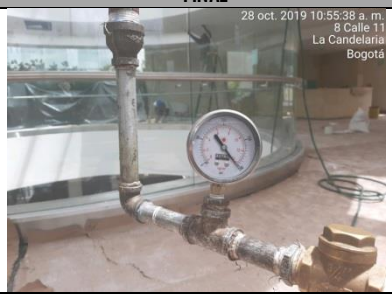
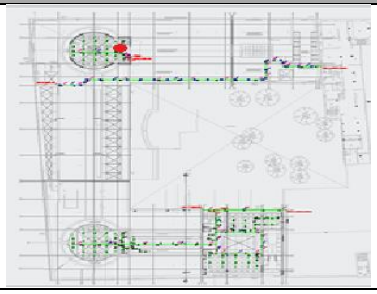
		
FOTO No. 254: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – Segundo piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 255**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área de cafetería, baños y pasillo – Segundo piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 256**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.5 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - CUARTO PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 257: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA rev7isa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 258**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 259**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.5 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - CUARTO PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

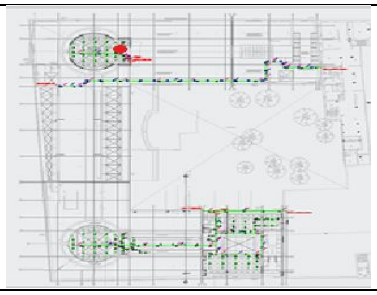
		
FOTO No. 260: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 261**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 262**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.2 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - PRIMER PISO (Suministro e Instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 10 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 263: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – primer piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 264**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – primer piso edificio bicentenario 2 de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 265**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.5 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - CUARTO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 15 de Septiembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 266: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 267**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área sala estratégica – cuarto piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 268**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS -SEGUNDO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 18 de Octubre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 269: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria general– Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 270**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria general– Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 271**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.2 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS - PRIMER PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Octubre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 272: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área GIMNASIO– Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 273**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área GIMNASIO– Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 274**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.5 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – CUARTO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 28 de octubre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 275: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – cuarto piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 276**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – cuarto piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 277**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – TERCER PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 28 de Octubre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 278: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Tercer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 279**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – tercer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 280**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – SEGUNDO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 01 de Noviembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 281: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 282**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 283**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.2 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – PRIMER PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 01 de Noviembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 284: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 285**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 286**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – SEGUNDO PISO (suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 19 de Noviembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 287: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 288**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área secretaria de gobierno – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 289**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – SEGUNDO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 02 de Diciembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 290: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área AUDITORIO HUITACA – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 291**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área Secretaria de gobierno – Segundo piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 292**: se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.2 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – PRIMER PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 07 de Diciembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 293: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área AUDITORIO HUITACA – Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 294:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área Secretaria de gobierno – Primer piso edificio bicentenario 2, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 295:** se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – SEGUNDO PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 10 de Diciembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

		
FOTO No. 296: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área SECRETARIA DE GOBIERNO – Segundo piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 297:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área SECRETARIA DE GOBIERNO – Segundo piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 298:** se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

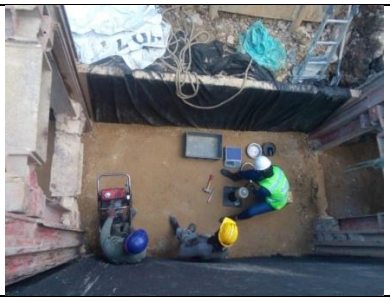
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.4 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – TERCER PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 16 de Diciembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**
		
FOTO No. 299: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área SECRETARIA DE GOBIERNO – Tercer piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 300:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área SECRETARIA DE GOBIERNO – Tercer piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 301:** se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Capítulo: 3.3 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS – Segundo PISO (Suministro e instalación)		
Prueba: Prueba de Presión NFPA 14		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de Diciembre de 2019		
ANTES	**FINAL**	**ESQUEMA**

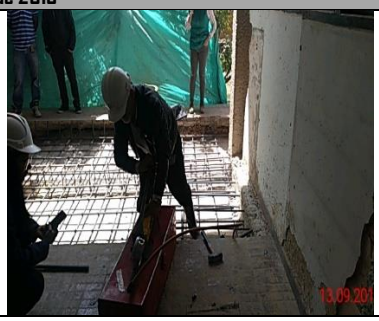
		
FOTO No. 302: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Inicie la prueba de presión en el área AUDITORIO HUITACA – Segundo piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 303**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 Termine la prueba de presión en el área AUDITORIO HUITACA – Segundo piso edificio bicentenario 1, de acuerdo a la norma NFPA 14 a una presión de 200 PSI.	**FOTO No. 304:** se evidencia la ubicación del tramo de red contra incendios a la cual se le realizo prueba de presión de acuerdo a la norma NFPA 14.

CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capitulo: 4.3 RELLENOS / Ítems: 4.3.2 Relleno Base granular BG_Gr1 o B-600		
Ensayo: Densidades: método de Cono y Arena – Norma INV E- 161 -07		
Fecha de Registro fotográfico: 01 de Noviembre de 2019		
		
FOTO No. 305: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 1 y costado oriental.	**FOTO No. 306:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 1 y costado oriental.	**FOTO No. 307** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 1 y costado oriental.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capitulo: 4.3 RELLENOS / Ítems: 4.3.2 Relleno Base granular BG_Gr1 o B-600		
Ensayo: Densidades: método de Cono y Arena – Norma INV E- 161 -07		
Fecha de Registro fotográfico: 08 de Febrero de 2020		

		
FOTO No. 308: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 2 y costado occidental.	**FOTO No. 309**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 2 y costado occidental.	**FOTO No. 310**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 2 y costado occidental.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: COMPONENTE GEOTÉCNICO		
Capitulo: 4.3 RELLENOS / Ítems: 4.3.2 Relleno Base granular BG_Gr1 o B-600		
Ensayo: Densidades: método de Cono y Arena – Norma INV E- 161 -07		
Fecha de Registro fotográfico: 10 de Marzo de 2020		
		
FOTO No. 311: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 3 y costado occidental.	**FOTO No. 312**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 3 y costado occidental.	**FOTO No. 313**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución del ensayo de densidades por el método de CONO Y ARENA "Norma INV E- 161 -07" en el relleno base B-600 sobre filtro en Tramo 3 y costado occidental.

5.4.2 SEDE IMPRENTA DISTRITAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2		
Ensayo: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M		
Fecha de Registro fotográfico: 13 de septiembre de 2019		
		
FOTO No. 314: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 7 (7/8") y Nº 5 (5/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.	**FOTO No. 315**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 7 (7/8") y Nº 5 (5/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.	**FOTO No. 316**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 7 (7/8") y Nº 5 (5/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M		
Fecha de Registro fotográfico: 24 de septiembre de 2019		
		
FOTO No. 317: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 inicie con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 3 (3/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.	**FOTO No. 318:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 continúe con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 3 (3/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.	**FOTO No. 319:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 termine con la ejecución de ensayo de RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (ASTM E488 / E488M) para aceros de refuerzo Nº 3 (3/8") anclados en la viga de cimentación área de producción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI Y 4000 PSI. (CONCRETERA HORMIGÓN ANDINO)

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 / Ensayo: Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 24 de Agosto de 2019		
		
FOTO No. 320: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 321:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.	**FOTO No. 322:** El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 / Ensayo: Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 28 de Agosto de 2019		
		
FOTO No. 323: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 324:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.	**FOTO No. 325:** El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 31 de Agosto de 2019		
		
FOTO No. 326: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 327:** Realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-3 y Z-4.	**FOTO No. 328**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-3 y Z-4.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 **/ Ensayo:** Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 06 de Septiembre de 2019		
		
FOTO No. 329: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de	**FOTO No. 330**: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.	**FOTO No. 331**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.

diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 **/ Ensayo:** Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 21 de Septiembre de 2019		
		
FOTO No. 332: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 333**: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.	**FOTO No. 334**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 **/ Ensayo:** Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 24 de Septiembre de 2019		
		
FOTO No. 335: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la	**FOTO No. 336**: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.	**FOTO No. 337**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado vaciado en el ciclópeo de las zapatas Z-1 y Z-2.

compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 **/ Ensayo:** Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 23 de Octubre de 2019		
		
FOTO No. 334: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	**FOTO No. 335**: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en las columnas área administrativa.	**FOTO No. 336**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado previo al descargue y vaciado en las columnas área administrativa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 **/ Ensayo:** Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 05 de Diciembre de 2019		
		
FOTO No. 337: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar	**FOTO No. 338**: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en las columnas tipo C1, C3, C5 y C6 ubicadas entre Ejes 1´ - 2´ y Ejes D-F.	**FOTO No. 339**: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado previo al descargue y vaciado en las

cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	PLANTA PRIMER NIVEL.	columnas tipo C1, C3, C5 y C6 ubicadas entre Ejes 1´ - 2´ y Ejes D-F. PLANTA PRIMER NIVEL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Ensayo: Asentamiento De Concreto- Ntc 396 / Ensayo: Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto –NTC 673		
Fecha de Registro fotográfico: 18 de Diciembre de 2019		
		
FOTO No. 340: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el concreto premezclado que le suministra la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDE 04 ingrese con el seguro de despacho con su respectiva remisión para verificar cantidad, asentamiento y la resistencia a la compresión requerida y exigida en planos de diseño y/o especificaciones técnicas del proyecto.	FOTO No. 341: realiza y verifica el ensayo de Asentamiento De Concreto Premezclado suministrado por la empresa HORMIGÓN ANDINO al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 previo al descargue y vaciado en las columnas tipo C1, C3, C5 y C6 ubicadas entre Ejes 1´ - 2´ y Ejes D-F. PLANTA PRIMER NIVEL.	FOTO No. 342: El contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA realizaron y verificaron el ensayo Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto (NTC 673) al concreto Premezclado previo al descargue y vaciado en las columnas tipo C1, C3, C5 y C6 ubicadas entre Ejes 1´ - 2´ y Ejes D-F. PLANTA PRIMER NIVEL.

CURADO DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 4000 PSI

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Fecha de Registro fotográfico: Se realizó durante el tiempo de ejecución del contrato		
		
FOTO No. 343: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el curado del concreto de 3000 PSI Y 4000 psi después del	**FOTO No. 344:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el curado del concreto de 3000 PSI Y 4000 psi después del	**FOTO No. 345:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el curado del concreto de 3000 PSI Y 4000 psi después del

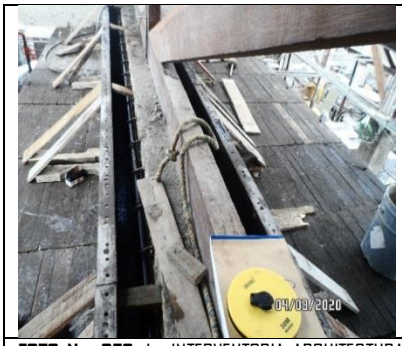
inicio del fraguado en los diferentes concretos vaciados en los diferentes elementos estructurales que conforman el componente reforzamiento estructural.	inicio del fraguado en los diferentes concretos vaciados en los diferentes elementos estructurales que conforman el componente reforzamiento estructural.	inicio del fraguado en los diferentes concretos vaciados en los diferentes elementos estructurales que conforman el componente reforzamiento estructural.

VERIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Fecha de Registro fotográfico: 04 de Enero de 2020		
		
FOTO No. 346: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las zapatas y vigas de cimentación.	**FOTO No. 347**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las zapatas y vigas de cimentación.	**FOTO No. 348:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las zapatas y vigas de cimentación.

VERIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN		
Fecha de Registro fotográfico: 07 de Febrero de 2020		
		
FOTO No. 349: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA Revisa y verifica el recubrimiento de concreto en la zapata Z-7 la cual debe corresponder a 4 cm.	**FOTO No. 350:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA Revisa y verifica el recubrimiento de concreto en la zapata Z-7 la cual debe corresponder a 4 cm.	**FOTO No. 351:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA Revisa y verifica el recubrimiento de concreto en la zapata Z-7 la cual debe corresponder a 4 cm.

		
FOTO No. 352: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 353**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 354**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el recubrimiento de concreto en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.

UNIÓN DE CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO "JUNTAS FRÍAS Y CALIENTE"

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.4.0 VIGAS AÉREAS		
Fecha de Registro fotográfico: 04 de Enero de 2020		
		
FOTO No. 355: La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la ficha tecnica del producto SIKADUR 32 y el estado en que ingresa a la SEDE IMPRENTA DISTRITAL debe ser sellado.	FOTO No. 356: La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la ficha tecnica del producto SIKADUR 32 y el estado en que ingresa a la SEDE IMPRENTA DISTRITAL debe ser sellado.	FOTO No. 357: La interventoria ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la ficha tecnica del producto SIKADUR 32 y el estado en que ingresa a la SEDE IMPRENTA DISTRITAL debe ser sellado.

VERIFICACIÓN DE ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS AÉREAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Capitulo: 2.4.0 VIGAS AÉREAS
Fecha de Registro fotográfico: 04 de Enero de 2020

		
FOTO No. 358: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el espaciamiento entre barras de acero de refuerzo de acuerdo a planos de diseño en vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 359:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el espaciamiento entre barras de acero de refuerzo de acuerdo a planos de diseño en los arranques cada 15 cm y en espacios intermedios cada 20 cm.	**FOTO No. 360:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el espaciamiento entre barras de acero de refuerzo de acuerdo a planos de diseño en los arranques cada 15 cm y en espacios intermedios cada 20 cm.
		
FOTO No. 361: La Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de los flejes Nº3 (3/8") cada 0.20 m en los intermedios de la viga aérea VG-13.	**FOTO No. 362:** La Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de los flejes Nº3 (3/8") cada 0.20 m en los intermedios de la viga aérea VG-13.	**FOTO No. 363:** La Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de los flejes Nº3 (3/8") cada 0.20 m en los intermedios de la viga aérea VG-13.
		
FOTO No. 364: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de acero de refuerzo Nº4 (1/2") cada 0.20 m.	**FOTO No. 365:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de acero de refuerzo número Nº3 (3/8") cada 0.15 m.	**FOTO No. 366:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice el amarre de acero de refuerzo número Nº3 (3/8") cada 0.15 m.

VERIFICACIÓN DE ANCLAJE CON RESINA EPOXICA SIKA ANCHORFIX 3001

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS.		
Fecha de Registro fotográfico: Durante la Ejecución de la Actividad de obra		
		
FOTO No. 367: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº3 (3/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 368:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº3 (3/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 369:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº3 (3/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.
		
FOTO No. 370: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº3 (3/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 371:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº3 (3/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.	**FOTO No. 372:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento técnico para realizar anclajes Nº7 (7/8") de longitud de 0.15m con resina epóxica SIKA ANCHORFIX 3001 en las vigas aéreas ubicadas en el área de producción.
		
FOTO No. 373: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA	**FOTO No. 374:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA	**FOTO No. 375:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA

URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice las perforaciones para los anclajes Nº 6(3/4") ubicados en el dado de concreto existe.	URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice las perforaciones para los anclajes Nº 6(3/4") ubicados en el dado de concreto existe.	URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice las perforaciones para los anclajes Nº 6(3/4") ubicados en el dado de concreto existe.

DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS PARA ELABORAR CONCRETOS EN OBRA DE DOSIFICACIÓN 4000 PSI.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS. /		
Fecha de Registro fotográfico: 13 de Enero de 2020		
		
FOTO No. 376: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la dosificación de agregados para elaborar concreto de 4000 psi de acuerdo al diseño de mezclas, lo cual para 25 kg de cemento se agregan 3 baldes de arena y 4 baldes de grava fina baldes de 10 lts para los elementos estructurales tales como columnas y vigas aéreas.	**FOTO No. 377:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la dosificación de agregados para elaborar concreto de 4000 psi de acuerdo al diseño de mezclas, lo cual para 25 kg de cemento se agregan 3 baldes de arena y 4 baldes de grava fina baldes de 10 lts para los elementos estructurales tales como columnas y vigas aéreas.	**FOTO No. 388:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la dosificación de agregados para elaborar concreto de 4000 psi de acuerdo al diseño de mezclas, lo cual para 25 kg de cemento se agregan 3 baldes de arena y 4 baldes de grava fina baldes de 10 lts para los elementos estructurales tales como columnas y vigas aéreas.

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE OXIDACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO COMO REFUERZO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGAS AÉREAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS. /
Fecha de Registro fotográfico: 13 de enero de 2020

		
FOTO No. 389: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.	**FOTO No. 390:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.	**FOTO No. 391:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.

VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO INGRESADO A LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS.		
Fecha de Registro fotográfico: Durante la ejecución de las actividades de obra del presupuesto del contrato.		
		
FOTO No. 392: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.	**FOTO No. 393:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.	**FOTO No. 394:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 cada vez que ejecute la actividad de obra amarre de acero de refuerzo se evidencie limpio sin presencia de óxido o cualquier otra sustancia que impida la debida adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.

VERIFICACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA RED AGUA NEBULIZADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS.		
Fecha de Registro fotográfico: 05 de Marzo de 2020		
		
FOTO No. 395: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica los materiales como tubería y accesorios ingresado a la sede IMPRENTA DISTRITAL con fines de realizar la red de agua nebulizada cumpla con las especificaciones técnicas y fichas técnicas.	**FOTO No. 396:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica los materiales como tubería y accesorios ingresado a la sede IMPRENTA DISTRITAL con fines de realizar la red de agua nebulizada cumpla con las especificaciones técnicas y fichas técnicas.	**FOTO No. 397:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica los materiales como tubería y accesorios ingresado a la sede IMPRENTA DISTRITAL con fines de realizar la red de agua nebulizada cumpla con las especificaciones técnicas y fichas técnicas.

PROCEDIMIENTO DE VACIADO DE CONCRETO DE 4000 PSI Y 3000 PSI EN LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, COLUMNAS Y VIGAS AÉREAS.

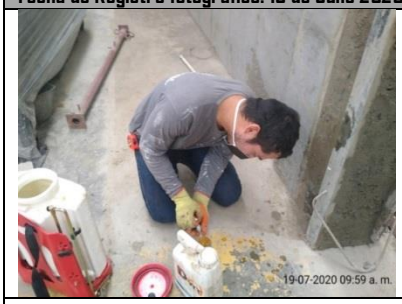
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN / 2.3.0 COLUMNAS Y MUROS/ 2.4.0 VIGAS AÉREAS.		
Fecha de Registro fotográfico: Durante la ejecución de las actividades de obra del presupuesto del contrato.		
		
FOTO No. 398: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 aplique sikadur 32 para unión y adherencia juntas de concreto de diferentes edades.	**FOTO No. 399:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA después de liberar y verificar recubrimientos de concreto revisa y verifica que el contratista humedezca con agua el acero de refuerzo para la adherencia con el concreto vaciado.	**FOTO No. 400:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la compactación del concreto mediante equipo vibrador de concreto.

VERIFICACIÓN ENSAYO DE DENSIDADES NORMA INVIAS INV E-164-07.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Capitulo: 2.2.0 CIMENTACIÓN
Fecha de Registro fotográfico: 26 de junio de 2020

		
FOTO No. 401: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento del ensayo de densidades del relleno B400 ejecutado para estructura placa de contrapiso zona de producción.	**FOTO No. 402:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento del ensayo de densidades del relleno B400 ejecutado para estructura placa de contrapiso zona de producción.	**FOTO No. 403:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el procedimiento del ensayo de densidades del relleno B400 ejecutado para estructura placa de contrapiso zona de producción.

VERIFICACIÓN INMUNIZACIÓN DE MADERA- (VIGAS DE 10X18 CMS, PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA ÁREA DE PRODUCCIÓN)

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.7.0 CUBIERTAS		
Fecha de Registro fotográfico: 19 de Julio 2020		
		
FOTO No. 404: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA se realizó seguimiento a la actividad de inmunización de madera con el producto Dwt revisando y verificando la dosificación de acuerdo a la ficha técnica del producto lo cual dice que por cada un (1) litro de agua se le agrega 20 mililitros de inmunizante Dwt cuando vaya ser aplicado por el método de aspersión.	**FOTO No. 405:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA se realizó seguimiento a la actividad de inmunización de madera con el producto Dwt revisando y verificando la dosificación de acuerdo a la ficha técnica del producto lo cual dice que por cada un (1) litro de agua se le agrega 20 mililitros de inmunizante Dwt cuando vaya ser aplicado por el método de aspersión.	**FOTO No. 406:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA se realizó seguimiento a la actividad de inmunización de madera con el producto DWT revisando y verificando la dosificación de acuerdo a la ficha técnica del producto lo cual dice que por cada un (1) litro de agua se le agrega 20 mililitros de inmunizante Dwt cuando vaya ser aplicado por el método de aspersión.

VERIFICACIÓN INMUNIZACIÓN DE MADERA- (VIGAS DE 10X18 CMS, PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA ÁREA DE PRODUCCIÓN)

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Capitulo: 2.7.0 CUBIERTAS
Fecha de Registro fotográfico: 24 de Junio 2020

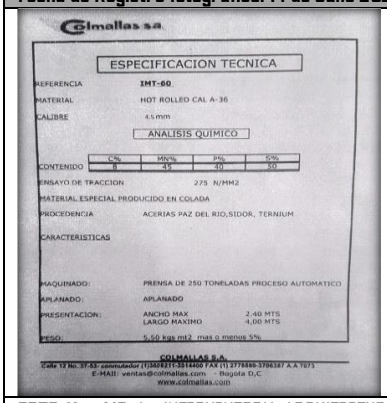
		
FOTO No. 407: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización se por el método de inmersión, para lo cual se introduce la madera por 2 horas y luego se gira la viga de madera por la otra cara la cual no está sumergida durante otras 2 horas.	**FOTO No. 408:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización se por el método de inmersión, para lo cual se introduce la madera por 2 horas y luego se gira la viga de madera por la otra cara la cual no está sumergida durante otras 2 horas.	**FOTO No. 409:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización se por el método de inmersión, para lo cual se introduce la madera por 2 horas y luego se gira la viga de madera por la otra cara la cual no está sumergida durante otras 2 horas.
		
FOTO No. 410: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización por el método de aspersión, fumigando los elementos de madera que conforman la estructura de la cubierta del área de producción.	**FOTO No. 411:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización por el método de aspersión, fumigando los elementos de madera que conforman la estructura de la cubierta del área de producción.	**FOTO No. 412**: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el proceso de inmunización por el método de aspersión, fumigando los elementos de madera que conforman la estructura de la cubierta del área de producción.

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA A CAMBIAR EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA ÁREA DE PRODUCCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.7.0 CUBIERTAS		
Fecha de Registro fotográfico: 14 de Julio 2020		
		

FOTO No. 413: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica los elementos en madera que presenta hongos de pudrición que afectan la resistencia de los elementos en madera.	**FOTO No. 414:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica elementos en madera los cuales fueron reemplazados, ya que se evidencio presencia de gorgojos y hongos.	**FOTO No. 415:** La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica elementos en madera los cuales presentan fisuras mayores a 5 mm con una profundidad hasta el alma de la viga en madera afectando su resistencia de carga.

VERIFICACIÓN PLATINAS GRADO A- 36.- PARA ANCLAJES DE ELEMENTOS EN MADERA ÁREA DE PRODUCCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
COMPONENTE: 2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL		
Capitulo: 2.7.0 CUBIERTAS		
Fecha de Registro fotográfico: 14 de Julio 2020		
		
FOTO No. 416: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica l Certificado Calidad Platinas Grado A- 36.	**FOTO No. 417:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica las dimensiones de acuerdo al análisis de precios unitarios (APU) de la platina de anclaje entre elementos en madera la cual tiene un ancho de 5cm.	**FOTO No. 418:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica las dimensiones de acuerdo al análisis de precios unitarios (APU) de la platina de anclaje entre elementos en madera la cual tiene un ancho de 5mm.

VERIFICACIÓN DE VINILO TIPO 1 (COLOR BLANCO Y GRIS BASALTO)

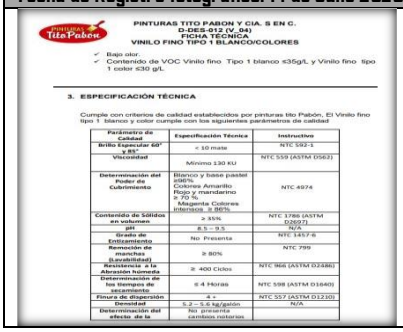
REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
COMPONENTE: ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
Capitulo: 2.7.0 Cubiertas		
Fecha de Registro fotográfico: 14 de Julio 2020		
 PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C. D-DES-012 (V_04) FICHA TÉCNICA VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES ✓ Bajo olor. ✓ Contenido de VOC Vinilo fino Tipo 1 blanco ≤35g/L y Vinilo fino tipo 1 color ≤30 g/L 3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas tito Pabón, El Vinilo fino tipo 1 blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad		

FOTO No. 419: La INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el Certificado Calidad del vinilo Tipo I color blanco.	**FOTO No. 420:** Insumo pinturatipo 1 - blanca marca TITO PABON.	**FOTO No. 421:** Insumo pintura Tipo I - gris basalto marca INDUPIN.

VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES VIGA METÁLICA TIPO PERLÌN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
COMPONENTE: ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
Capitulo: NP-CIVIL-IMP-88 Suministro e instalación de viga perlìn (en pacha) para soporte de tramo de cubierta incluye platinas, no incluye anclajes de 1/2''		
Fecha de Registro fotográfico: 14 de Julio 2020		
		
FOTO No. 422: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica las dimensiones de la viga metálica tipo perlin de acuerdo a planos de diseño la altura de la viga metálica tipo perlìn igual a 22 centímetros (cm).	**FOTO No. 423:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica las dimensiones de la viga metálica tipo perlìn de acuerdo a planos de diseño el ancho de la viga metálica tipo perlìn igual a 8 centímetros (cm).	**FOTO No. 424:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica las dimensiones de la viga metálica tipo perlìn de acuerdo a planos de diseño el espesor de la viga metálica tipo perlìn igual a 8 centímetros (mm).

DOSIFICACIÓN DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD NP CIVIL-IMP 93 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y RESANE DE FISURAS Y NP CIVIL-IMP 97 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA EPÓXICA SEMIRRÍGIDA ANCHO MÁXIMO APROX. 1,5 CM.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
COMPONENTE: ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
Capitulo: NP CIVIL-IMP 97 Suministro y aplicación de junta epóxica semirrígida ancho máximo aprox. 1,5 cm.		
Fecha de Registro fotográfico: 14 de Julio 2020		
		
FOTO No. 425: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el producto IW –	**FOTO No. 426:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el producto IW-	**FOTO No. 427**: En referencia al producto IW – EPOXICOVER CON IW-TCR 800 se dosifica una

EPOXICOVER CON IW-TCR 800.	MORTERDEPOX-mortero epoxico de reparacion de juntas ,crateres,etc.	cantidad de este producto por un porcentaje del 10 % del producto IW-EPOXYFILLER de lo anterior se especifica lo anteriormente mencionado.

PROCESO CONSTRUCTIVO ACTIVIDAD DE OBRA NP CIVIL-IMP 97 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA EPÓXICA SEMIRRÍGIDA ANCHO MÁXIMO APROX. 1,5 CM.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
COMPONENTE: ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
Capitulo: NP CIVIL-IMP 97 Suministro y aplicación de junta epóxica semirrígida ancho máximo aprox. 1,5 cm.		
Fecha de Registro fotográfico: 25 de Septiembre de 2020		
		
FOTO No. 428: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica realización de regatas sobre juntas de construcción de losas	**FOTO No. 429:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el ancho de la junta de construcción limpia y con dilatación de un 1.5 centímetro (Cm)	**FOTO No. 430:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el destronque y pulida de piso en área de producción.
		
FOTO No. 431: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de premier en las regatas y juntas de construcción inducidas.	**FOTO No. 432:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la Instalación de malla de polietileno de 12 cm sobre el Eje de las juntas de construcción.	**FOTO No. 433:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la pulida de piso sobre las juntas de construcción de losas selladas con Instalación de malla de polietileno de 12 cm "POLÍMERO EPÓXICO IW – EPOXIFILLER"

PROCESO CONSTRUCTIVO ACTIVIDAD DE OBRA NP CIVIL-IMP 93 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISO EN ÁREA DE PRODUCCIÓN, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y RESANE DE FISURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
COMPONENTE: ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Capitulo: NP CIVIL-IMP 97 Suministro y aplicación de junta epóxica semirrígida ancho máximo aprox. 1,5 cm.
Fecha de Registro fotográfico: 29 de septiembre de 2020

		
FOTO No. 434: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la primera capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 435:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la brillada y pulida primera capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 436:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la segunda capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.
		
FOTO No. 437: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la brillada y pulida segunda capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 438:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la tercera capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 439:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la brillada y pulida tercera capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.
		
FOTO No. 440: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la cuarta capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 441:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la cuarta capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.	**FOTO No. 442:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica la aplicación de la cuarta capa de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras.

CERTIFICADO DE CALIDAD CABLE 350 MCM Y CABLE 500 MCM

REGISTRO FOTOGRÁFICO.
Componente: COMPONENTE ELÉCTRICO
Capitulo: 3.4.0 SISTEMA CONTRA INCENDIO. / ÍTEMS 3.4.0.2 Suministro e instalación de Acometida en Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0

AWG T incluye amarres, bornes y todos los elementos para su correcto funcionamiento.		
Fecha de Registro fotográfico: 28 de agosto de 2020		
		
FOTO No. 443: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el ingreso del Cable de cobre 3x350MCM F+ 1x350+2/0 AWG T.	**FOTO No. 444:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 350 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 445:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 350 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.
		
FOTO No. 446: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 447:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 448:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: COMPONENTE ELÉCTRICO		
NP-ELECTRICO-IMP-145 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE 2 (3X500MCM F + 1X500MCM N + 1 1X250MCM T)		
Fecha de Registro fotográfico: 02 de octubre de 2020		
		
FOTO No. 449: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 450:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 451:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: COMPONENTE ELÉCTRICO		
NP-ELECTRICO-IMP-145 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE 2 (3X500MCM F + 1X500MCM N + 1 1X250MCM T)		
Fecha de Registro fotográfico: 02 de octubre de 2020		
		
FOTO No. 452: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 453**: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.	**FOTO No. 454**: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica el certificado y marca del cable 500 MCM utilizado para las acometidas eléctricas de la red contra incendios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.		
Componente: REDES HIDROSANITARIAS		
Capítulo 1.11.0 VARIOS		
Ítems: 1.11.0.2 PRUEBA DE PRESIÓN		
Fecha de Registro fotográfico: 20 de enero de 2020		
		
FOTO No. 455: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la prueba de presión a la red de distribución de agua potable para inspeccionar que no exista presencia de fugas entre las conexiones de accesorios y tubería.	**FOTO No. 456**: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la prueba de presión a la red de distribución de agua potable para inspeccionar que no exista presencia de fugas entre las conexiones de accesorios y tubería.	**FOTO No. 457**: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA revisa y verifica que el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 realice la prueba de presión a la red de distribución de agua potable para inspeccionar que no exista presencia de fugas entre las conexiones de accesorios y tubería.

6. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

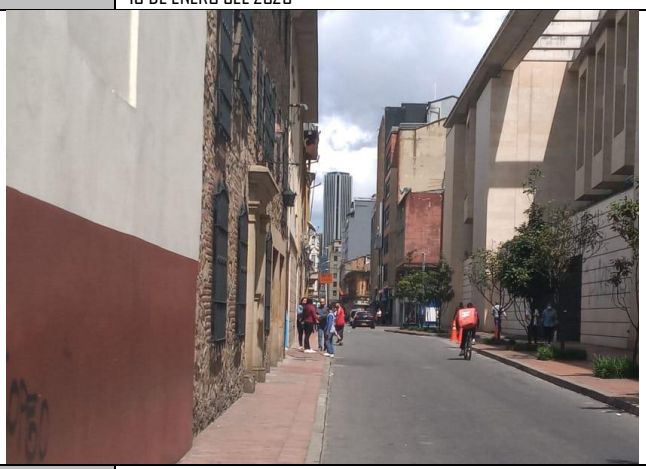
Para el periodo del DÍA VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL DÍA VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, los proyectos que fueron ejecutados MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL de la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D, C, contaron con sus respectivos planes de manejo de tránsito (PMT), los cuales tuvieron la siguiente trazabilidad:

6.1. CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES AL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

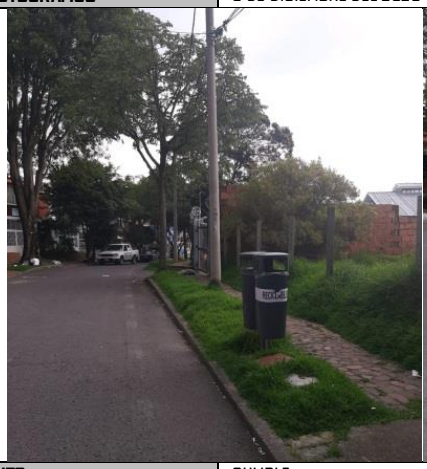
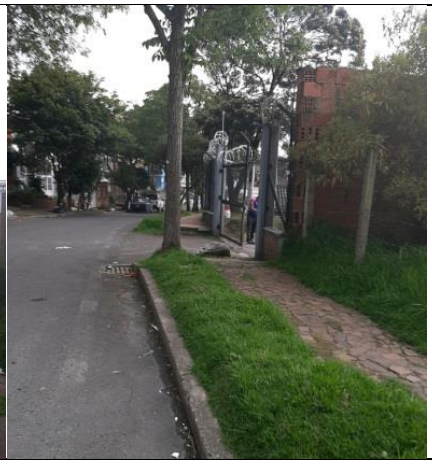
MANZANA LIÉVANO			
VERSIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN**	**PLAZO DE MODIFICACIÓN**	**IDENTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN (COI O COOS)**
Versión 1	5 de septiembre del 2019	24 de octubre del 2019 (Fecha final) – 6 de septiembre (Fecha de inicio)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 36
Versión 2	24 de octubre del 2019	9 de enero del 2020 (Fecha final) – 25 de octubre del 2019 (Fecha de inicio)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 43
CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN			
VERSIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN**	**PLAZO DE MODIFICACIÓN**	**IDENTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN (COI O COOS)**
Versión 1	5 de septiembre del 2019	24 de octubre del 2019 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 36
Versión 2	7 de octubre del 2019	9 de enero del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 42
Versión 3	16 enero del 2020	2 de abril del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 3
IMPRENTA DISTRITAL			
VERSIÓN	**FECHA DE APROBACIÓN**	**PLAZO DE MODIFICACIÓN**	**IDENTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN (COI O COOS)**
Versión 1	7 de octubre del 2019	9 de enero del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 42
Versión 2	16 enero del 2020	2 de abril del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 3
Versión 3	6 de febrero del 2020	29 de abril del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 6
Versión 4	4 de junio del 2020	27 de agosto del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 23
Versión 5	20 de agosto del 2020	26 de noviembre del 2020 (Fecha final	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 34
Versión 6	19 de noviembre del 2020	24 de diciembre del 2020 (Fecha final)	Consolidado de obras de infraestructura (COI) No. 47

Tabla 32. Consolidado de Planes de Manejo de Transito

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	7 DE SEPTIEMBRE CEL 2019
 	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	DESINSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	10 DE ENERO CEL 2020
	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SENDERO Y SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	DESINSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	8 DE FEBRERO DEL 2020
 	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	8 DE OCTUBRE DEL 2019
  	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	DE OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (SEÑALES)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	3 DE DICIEMBRE DEL 2020
 	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

Para el componente PLANES DE MANEJO DE TRAFICO, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 dio cumplimiento a lo establecido en los consolidados de obra de infraestructura (COI), aprobados por la entidad SECRETARIA DE MOVILIDAD, donde no se presentó ninguna queja o falta a la normatividad establecida en dichos planes, así mismo acorde al registro fotográfico mencionado se evidencio la desinstalación de la señalización de los frentes de obra MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

7. ASPECTOS SISOMA

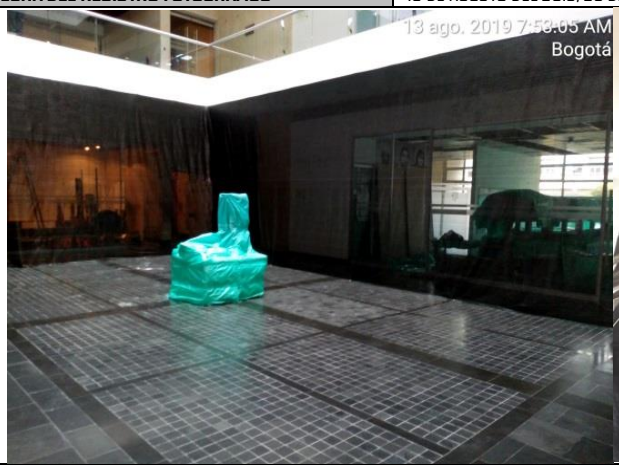
La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., que los planes pre operacionales ***PLAN DE MANEJO AMBIENTAL*** y en el ***PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,*** fueron aprobados mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF062 del día 27 de agosto del 2019 mediante radicado No. 1-2019-21774, así como el ***SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,*** el cual fue aprobado mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF027 del día 29 de julio del 2019 mediante radicado No. 1-2019-19367.

7.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL COMPONENTE AMBIENTAL.

7.1.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS VECINOS O PRELIMINARES.

La presente interventoría, informa que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, los proyectos que fueron ejecutados MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL de la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, realizó la implementación de las siguientes medidas ambientales, con el fin de minimizar y preservar los ecosistemas vecinos y preliminares para cada una de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, las cuales se pueden evidenciar en el siguiente registro fotográfico:

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/ CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	AISLAMIENTO DE ZONAS DE INTERVENCIÓN – ÁREAS VECINAS DENTRO DE LA SEDE
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	13 DE AGOSTO DEL 2019, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ZONA DE INTERVENCIÓN POLISOMBRA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 26 DE OCTUBRE DEL 2019, 4 DE DICIEMBRE DEL 2019, 4 DE MARZO DEL 2020









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	FINALIZACIÓN ACTIVIDADES CONTRACTIVAS
ACTIVIDAD	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES AFECTADAS POR LA INTERVENCIÓN
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	15 DE MARZO DEL 2020



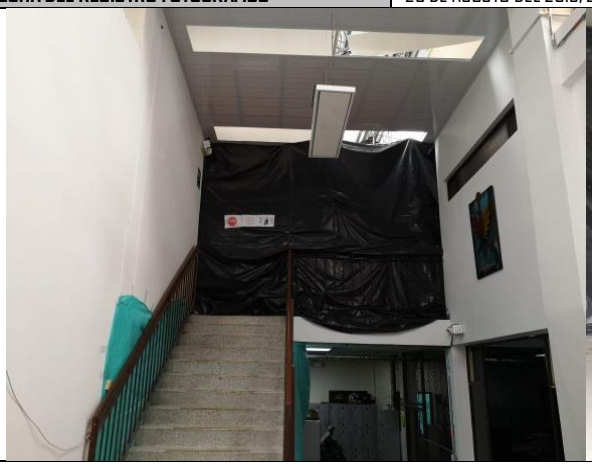






ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ZONA DE INTERVENCIÓN CON POLIETILENO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	20 DE AGOSTO DEL 2019, 28 DE OCTUBRE DEL 2019, 24 DE JULIO DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES AFECTADAS POR LA INTERVENCIÓN
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	2 DE DICIEMBRE DEL 2020







ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

Así mismo, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa que para la sede MANZANA LIÉVANO se llevaron a cabo socializaciones con el personal de las zonas intervenidas, con el fin de informar de las actividades de obra como las medidas de seguridad a tener en cuenta en cada zona señalizada, lo anterior se puede evidenciar en los informes mensuales de interventoría, así como en los informes de socialización para el periodo de AGOSTO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, los cuales se presentan en el **ANEXO No. 12**

7.1.2 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, implemento las medidas ambientales para la minimización y control de los impactos ambientales generados para el proyecto, en las sedes IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, donde la interventoría realizo el seguimiento y

verificación de dicha ejecución de las actividades, establecidas en el ***PLAN DE MANEJO AMBIENTAL*** específicamente en la ***MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES,*** los cuales se mencionan a continuación:

ASPECTO	IMPACTO	CONTROL OPERACIONAL	FECHA IMPLEMENTACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Uso de maquinaria amarilla y vehículos para la realización de obras civiles	Alteración en las concentraciones de gases	Permisos de los vehículos (Revisión técnico mecánica)	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Realización de trabajos por medias calzadas	Alteración de la infraestructura vial	Planes de Manejo de Transito (Consolidado de obras de infraestructura – COI)	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Uso de maquinaria pesada y herramienta menor	Afectación a la infraestructura de los servicios públicos	Inspecciones pre operacionales de las maquinas, permisos de los vehículos (Revisión técnico mecánica), pagos de los servicios públicos (Energía y Agua)	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Uso de agua para procesos de compactación de la vía	Presión sobre el recurso hídrico	Implementación de uso de canecas para el almacenamiento de agua lluvia, uso del cierre de las llaves al finalizar las actividades constructivas (Programa de ahorro y uso eficiente del agua)	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Uso de agua para la humectación de la vía	Alteración demanda de servicios públicos	Implementación de uso de canecas para el almacenamiento de agua lluvia, para riego de las zonas (Programa de ahorro y uso eficiente del agua).	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Uso de agua para fresado	Presión sobre el recurso hídrico	No aplica	No aplica	NO APLICA
Generación de aguas residuales	Alteración de las propiedades del agua superficial	Uso de las unidades sanitarias de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL. Implementación de unidades sanitarias portátiles con gestores autorizados y con los permisos ambientales para el tratamiento de aguas residuales	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Generación de excavaciones y remoción de materiales pétreos	Degradación del suelo	Reutilización de material para relleno de excavaciones	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Generación de excavaciones y remoción de materiales pétreos	Cambio de paisaje	Recuperación de zonas verdes afectadas	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Calidad de aire	Generación de material particulado PM10	Uso de centros de acopio temporal de materiales pétreos y pre fabricados con su respectiva señalización, y cubrimiento con polietileno. Jornadas de orden y aseo para el retiro de material particulado, de zonas con cerramiento temporal.	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Uso de maquinaria amarilla	Cambio en los niveles de presión sonora	Planes de Manejo de Transito (Consolidado de obras de infraestructura – COI) Horarios de trabajo acorde a lo establecidos en los permisos emitidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE

ASPECTO	IMPACTO	CONTROL OPERACIONAL	FECHA IMPLEMENTACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Uso de agua potable	Pérdida del recurso	Compra de agua potable para consumo humano a través de garrafones, implementación del programa de ahorro y uso eficiente del agua	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Instalación de infraestructura temporal	Cambios en la calidad paisajística	Desmantelamiento de la infraestructura, orden y aseo de las zonas y recuperación de las mismas a través de actividades de calidad de las obras	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Generación de residuos de cespedones, pendones, residuos finos expansivos y no expansivos	Generación de conflictos con la comunidad	Implementación de la gestión disposición y/o tratamiento de los residuos generados, a través de gestores externos autorizados por las autoridades ambientales competentes. Reutilización de residuos finos expansivos y no expansivos en procesos de construcción	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE
Transportes de material en cercanía a predios	Daños a la infraestructura de predios	Implementación de zonas de tránsito de vehículos con su respectiva señalización, Planes de Manejo de Transito (Consolidado de obras de infraestructura – COI), recuperación de zonas afectadas por tránsito de vehículos	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, implemento las medidas acorde a los impactos ambientales identificados, así mismo en los informes mensuales de interventoría, se remitieron los soportes de implementación en cada una de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

7.1.3 INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, implemento las medidas ambientales acorde al programa establecido en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, así mismo en los informes mensuales de interventoría, se remitieron los soportes de implementación en cada una de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

PROGRAMA O FICHA	ACTIVIDAD	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE EN ESTE DOCUMENTO
MANEJO DE CAMPAMENTOS	Instalación de campamentos temporales en cada uno de los frentes de obra, donde se garantizara el almacenamiento temporal bajo condiciones de protección y señalización	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO No 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL
MANEJO DE CENTROS DE ACOPIO	Los vehículos destinados al transporte de diferentes materiales de construcción, no serán llenados por encima de su capacidad, la carga estará cubierta. Los materiales dentro del frente de obra, permanecerán acopiados y cubiertos, y señalizados.	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO No 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL

	El material de excavación o demolición que pueda ser reutilizado se adecuara un sitio dentro del frente de obra, para su almacenamiento temporal.			
RESIDUOS SOLIDOS, DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y PELIGROSOS	Segregación de los residuos sólidos acorde al tipo, mediante puntos ecológicos, acorde al código de colores, color verde (Orgánicos), color azul (Plástico, vidrio, latas, tretrapack), color gris (Cartón, papel), color rojo (Bolsas de cemento, empaques de químicos, entre otros). Residuos de unidades sanitarias portátiles 8gestor autorizado)	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	Capacitación al personal sobre las medidas para el ahorro y uso eficiente del agua. Implementación de envases para la recolección de agua lluvia para procesos de limpieza e inclusión en actividades de obra.	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO No 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA	Capacitación al personal sobre las medidas para el ahorro y uso eficiente de energía. Implementación de medida de auto apagado en equipos de cómputo. Implementación de la desconexión total de equipos, maquinas.	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO No 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL
ORDEN Y ASEO	Jornadas de orden y aseo en obra, de manera diaria, periódica	28 de Junio del 2019 al 28 de noviembre del 2020	CUMPLE	ANEXO No 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE AMBIENTAL

7.1.4 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SITIOS DE OBTENCIÓN DE MATERIALES.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, adquirió los materiales pétreos, en canteras previamente autorizadas por las autoridades competentes, donde la presente interventoría remitió los soportes de licencias y permisos ambientales en los respectivos informes mensuales, para las sedes CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Así mismo en el **ANEXO No 13,** se presentan los soportes de adquisición de materiales como la documentación legal de los proveedores.

PROVEEDOR	LICENCIA Y/O PERMISO AMBIENTAL	REGISTRO MINERO
LUGEIRO BARRAGÁN OSPINA – JAIDER BARRAGÁN OSPINA (VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA)	Resolución No. 1409 del 24 de mayo del 2010 – Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).	Modalidad concesión (L685) vigencia desde el 11/06/2008 hasta el 10/06/2036
MANUEL ÁLVAREZ JIMÉNEZ ÁLVAREZ, SIBILLA GARBECHI DE JIMÉNEZ, Y JUAN MANUEL JIMÉNEZ GARBECHI (AGREGADOS EL VINCULO)	Resolución 1167 del 10 de julio del 2019 (por el cual se establece el Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones) – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)	Contrato de concesión (D 2655) vigencia desde el 18/09/1991 hasta el 23/08/2024
INGENIERO GV S.A.SM – GALVIS FRACASSI & CIA S (CANTERA EL PENCAL)	Resolución 1519 del 17 de julio del 2009 (por el cual se establece un Plan de Manejo ambiental y se	Contrato de concesión (L 685) vigencia desde 25/05/2007 hasta 24/05/2030

PROVEEDOR	LICENCIA Y/O PERMISO AMBIENTAL	REGISTRO MINERO
	toman otras determinaciones) Contrato de concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción No. GHV-091 celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE GELOLGIA Y MINERÍA INGEOMINAS Y LA COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A	
MINER GROUP S.A. – RICARDO ALFONSO MATALLANA ANDRADE	Resolución No. 1334 del 12 de diciembre de 2002 (Por el cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones) – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)	Contrato de concesión (D 2655) vigencia desde 25/11/1993 hasta 09/01/2028

Tabla 33. Consolidado de proveedores de material pétreo

No.	MATERIAL	ORIGEN	CANTIDAD M3 Y TONELADAS	SOPORTE AMBIENTAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO
1	ARENA DE PEÑA	CANTERA EL VINCULO	14	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
2	CONCRETO PARA CIMENTACIÓN	HORMIGÓN ANDINO S.A.	18.5	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
3	PIEDRA ZONGA	CANTERA EL VINCULO	33	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
4	MIXTO	CANTERA EL GUAMO	14	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
5	PIEDRA RAJÓN	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
6	GRAVA	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
7	CONCRETO PRE MEZCLADO	HORMIGÓN ANDINO S.A.S.	28	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
8	HIERRO PARA REFORZAMIENTO	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S. PERFILMETALES Y LAMINAS LTDA HOMECENTER FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S.	0.82	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
9	PIEDRA RAJÓN	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
10	GRAVA	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
11	CONCRETO PRE MEZCLADO	HORMIGÓN ANDINO S.A.S.	28	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
12	HIERRO PARA REFORZAMIENTO	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S. PERFILMETALES Y LAMINAS LTDA HOMECENTER FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S.	0.82	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
13	CONCRETO	HORMIGÓN ANDINO S.A.S.	42	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
14	BLOQUE		6	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
15	RECEBO	CANTERA EL VINCULO	6	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
16	ARENA	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
17	RECEBO	CANTERA EL VINCULO	37.4 TON	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
18	ARENAS	CANTERA EL VINCULO	45.92 TON	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
19	GRAVA	CANTERA EL VINCULO	175.1	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES

No.	MATERIAL	ORIGEN	CANTIDAD M3 Y TONELADAS	SOPORTE AMBIENTAL	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO
20	RECEBO	CANTERA EL VINCULO	350.2	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
21	CONCRETO	HORMIGÓN ANDINO S.A.S.	52.12	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
22	ARENA	CANTERA EL VINCULO	36.08	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
23	GRAVA	CANTERA EL VINCULO	108.8	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
24	LADRILLO	CANTERA EL VINCULO	3.8	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
25	ACERO	D&A HIERRO FIGURADO S.A.S. PERFILMETALES Y LAMINAS LTDA	2.71	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
26	RECEBO	CANTERA EL VINCULO	11.9	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
27	CONCRETO	HORMIGÓN ANDINO S.A.S.	25.58	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
28	ARENA	CANTERA EL VINCULO	22.96	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
29	GRAVAS	CANTERA EL VINCULO	23.8	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
30	RECEBO	CANTERA EL VINCULO	14	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
31	ARENA	CANTERA EL VINCULO	7	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
32	SUSTANCIAS QUÍMICAS	PROVEEDOR	0.56 TON	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES
33	ACERO	&A HIERRO FIGURADO S.A.S. PERFILMETALES Y LAMINAS LTDA	2.569 TON	CERTIFICADO DE MATERIAL	CUMPLE	ANEXO No 13 PROVEEDORES

Tabla 14. Consolidado de cantidades de material pétreo usadas en el proyecto.

7.1.5 REPORTE DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCD.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, realizó acopio temporal de los residuos de construcción y demolición (RCD), residuos sólidos y residuos peligrosos, en embalajes respectivos acorde a lo establecido en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y en el PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, los cuales fueron depositados en el punto de acopio temporal, el cual fue designado por el personal del área Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., para los frentes de obra MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, con el fin de realizar la disposición final de los residuos con los gestores externos autorizados por las entidades gubernamentales.

EMPRESA – ESCOMBRERA	PERMISOS AMBIENTALES
HOLCIM COLOMBIA S.A.	Resolución No. 1112 del 27 de diciembre del 2012 – AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
RECOLECTORA EL TRIUNFO S.A.S.	Concepto técnico Radicado No. 2018EE78872 del 12 de abril del 2018 – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
REX INGENIERÍA S.A.S	AUTORIDAD NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES (ANLA) – Resolución No. 01110 del 12 de septiembre del 2017.
TRACOL S.A.S. VALCO CONSTRUCTORES LTDA.,	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Resolución No. 1821 de 14 de julio del 2017 (Por medio de la cual se autoriza la cesión total de derechos y obligaciones de la Licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 989 de 26 de mayo de 2015 y se adoptan otras determinaciones) CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Resolución No. 0989 del 26 de mayo del 2015 (Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones)

EMPRESA – ESCOMBRERA	PERMISOS AMBIENTALES
RECUPERADORA ECA S.A.S	Informe Técnico No. 01282 del 16 de agosto del 2019 – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
PROSAMCOL S.A.S.	MINISTERIO DE AMBIENTE - Licencia ambiental tratamientos y rellenos ambientales S.A.S E.S.P – Resolución 1821 del 14 de julio del 2017
ACRECIFONT ASOCIACIÓN DE RECICLADORES	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AMBIENTALES S.A E.S.P	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Concepto técnico del 4 de junio del 2013 bajo No. de radicado 11131101109
MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	Resolución 1480 del 4 de diciembre del 2014 – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

Tabla 35. Consolidado de gestores externos de disposición de residuos

PERIODO	RCD GENERADO (M3-KG-TON)	RCD DISPOSICIÓN FINAL (M3)	RCD APROVECHADO (M3 Y TON)	VERIFICACIÓN DE TRANSPORTADOR	VERIFICACIÓN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO
JULIO 2019	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
AGOSTO 2019	126 M3	126	13.18 M3	PIN AMBIENTAL 650, 7638, 885,13249,7974,4419	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SEPTIEMBRE 2019	42.82 M3	42.82	7 M3	PIN AMBIENTAL 650, 7638, 885,13249,7974,4419	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
OCTUBRE 2019	98 M3 + 716.6 KG	98 + 716.6 KG	0	PIN AMBIENTAL 650, 7638, 885,13249,7974,4419	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NOVIEMBRE 2019	364 M3 + 402 KG	364 + 402 KG	0	PIN AMBIENTAL 650, 7638, 885,13249,7974,4419	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DICIEMBRE 2019	686 M3 + 1187 KG	686 + 1187 KG	0	PIN AMBIENTAL 650, 7638, 885,13249,7974,4419	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO SITIO DE DISPOSICIÓN	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PERIODO	RCD GENERADO (M3-KG-TON)	RCD DISPOSICIÓN FINAL (M3)	RCD APROVECHADO (M3 Y TON)	VERIFICACIÓN DE TRANSPORTADOR	VERIFICACIÓN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO
					DE MATERIAL DE ESCOMBROS SAN ANTONIO REX INGENIERÍA RECUPERADORA DE METALES HG S.A.S. RECUPERADORA ECA S.A.S.	
ENERO 2020	126 M3+ 1198 KG	126 + 1198 KG	8 TON	PIN AMBIENTAL 4419, 7976, 15540,7638,650	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
FEBRERO 2020	70 M3	70	103.22 TON	PIN AMBIENTAL 15540,7638,650,7638	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MARZO 2020	84 M3 + 1062.9 KG + 3656KG	84 + 1062.9 KG + 3656KG	564 TON	PIN AMBIENTAL 15540, 7638,650	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PROSAMCOL PROCESOS AMBIENTALES	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
ABRIL 2020	0	0	0	-	-	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MAYO 2020	599 KG	599 KG	0	-	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
JUNIO 2020	21 M3	21	0	PIN AMBIENTAL 15540	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
JULIO 2020	14 M3 + 446	14 + 446 KG	0	PIN AMBIENTAL 650	SITIO DE DISPOSICIÓN	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN

PERIODO	RCD GENERADO (M3-KG-TON)	RCD DISPOSICIÓN FINAL (M3)	RCD APROVECHADO (M3 Y TON)	VERIFICACIÓN DE TRANSPORTADOR	VERIFICACIÓN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	IDENTIFICACIÓN DEL ANEXO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO
	KG				DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PROSAMCOL PROCESOS AMBIENTALES	DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
AGOSTO 2020	7 M3 + 2970KG	7+ 2970KG	0	PIN AMBIENTAL 14450	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PROSAMCOL PROCESOS AMBIENTALES	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
SEPTIEMBRE 2020	7 M3 + 677 KG	7 M3 + 677 KG	0	PIN AMBIENTAL 14450	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO TRACOL S.A.S ESP SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PROSAMCOL PROCESOS AMBIENTALES	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
OCTUBRE 2020	7 M3	7 M3	0	PIN AMBIENTAL 14450	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NOVIEMBRE 2020	7 M3 + 1404 KG	7 M3 + 1404 KG	0	PIN AMBIENTAL 650	SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTÉRILES LAS MANAS ACRECIFONT ASOCIACIÓN DE RECICLADORES	ANEXO No 14 REPORTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Tabla 36. Consolidado de residuos generados de construcción y demolición.

7.1.6 OTROS (INFORMES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD).

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, realizó el diligenciamiento de los respectivos indicadores de gestión establecidos en el PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, donde en los informes mensuales de interventoría, se presentaron los soportes del *formato No. 2 de Seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra, el formato de volquetas (CVS), los indicadores y costos de RCD (Residuos de construcción y demolición)*.

Por lo anterior, en la siguiente tabla, se evidencia el consolidado de la trazabilidad mes a mes de los indicadores de EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD, que se llevó para el proyecto en las tres sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

INDICADORES DE GESTIÓN RCD	PORCENTAJE								
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2020	FEBRERO 2020
EFICIENCIA	0	0	43.15	46.22	0	52.28	53.32	21.30	9.67
EFECTIVIDAD	0	0	89.15	277.36	0	0	238.88	88.1	0
EFICACIA	0	0	20	16.34	0	256,78	0	1.5	47.83
INDICADORES DE GESTIÓN RCD	**MARZO 2020**	**ABRIL 2020**	**MAYO 2020**	**JUNIO 2020**	**JULIO 2020**	**AGOSTO 2020**	**SEPTIEMBRE 2020**	**OCTUBRE 2020**	**NOVIEMBRE 2020**
EFICIENCIA	29.82	0	2.5	2.9	4.47	6	3.43	1	7.02
EFECTIVIDAD	60.64	0	0.249	14.35	10	13.61	5.06	4.95	5.36
EFICACIA	1131.46	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 37. Consolidado de indicadores de eficacia, efectividad y eficiencia.

7.2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

7.2.1 REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CIERRE DE PROCESO SST PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA Y OPERATIVO.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, realizo las actividades de INDUCCIÓN Y REGISTRO DE INGRESO DE PERSONAL, dando cumplimiento al sub programa de Seguridad Industrial donde relaciono los formatos como soportes de inducciones correspondientes a cada una de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, los cuales fueron presentados en los informes mensuales de interventoría.

En la siguiente tabla, se relaciona el listado de personal de mano de obra calificada y no calificada, por parte del contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, donde se identifica presenta los soportes de la NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO que se le realizo a cada trabajador, donde se comunicó la realización del examen de egreso durante un rango de tiempo definido siendo de cinco (5) días hábiles, una vez se finalice las actividades y el respectivo contrato laboral, los soportes de estos registros fueron entregados a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los respectivos informes mensuales de interventoria.

No.	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EXAMEN EGRESO / NOTIFICACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO RIBERO MARTÍNEZ	79.321.873	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
2	RESIDENTE	INGRID ALEJANDRA BOLAÑOS CRUZ	55.131.681	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
3	DIRECTOR DE OBRA	FREDI GOMEZ GARCÉS	79.416.146	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
4	RESIDENTE TÉCNICA	CLAUDIA MARÍA ARENAS ORTIZ	39.548.228	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
5	ADMINISTRATIVA	SANDRA LUCIA PARRA JIMÉNEZ	52.261.860	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
6	RESIDENTE SST	SARA ESPERANZA SERRANO HERNÁNDEZ	24049493	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
7	TECNICO ELECTRICISTA	ALEXANDER SANTOFIMIO TRUJILLO	1.083.866.332	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
8	RESIDENTE SST	WILLIAM FONSECA VARGAS	74381366	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
9	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	MARILUZ CABARCAS GOMEZ	45530754	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
10	RESIDENTE TÉCNICA	ZORAYA RUIZ OLAYA	52084547	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
11	AUXILIAR	DYLAN ARGEDIS MAHECHA ESPINOSA	1072658043	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
12	AUXILIAR	JAIR ALIRIO MONTEALEGRE GRANADOS	7723231	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
13	AUXILIAR	CARLOS ESTEBAN SÁNCHEZ PINILLA	1.018.453.472	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
14	AUXILIAR	OSCAR HERNÁN TRUJILLO TOVAR	1.075.213.473	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
15	OFICIAL	JUAN MANUEL GARCÉS YEPES	1000774341	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
16	AYUDANTE	JAIMES LANDINEZ ANDRÉS CAMILO	1000776181	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
17	AYUDANTE	KEVIN STEVEN OCAMPO MORENO	1000783247	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
18	AYUDANTE	GUERRERO CORREDOR HANNER	1.000.783.247	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
19	AUXILIAR ELÉCTRICOS	CARLOS AUGUSTO GARZÓN MARTÍNEZ	5893456	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
20	AUXILIAR ELÉCTRICOS	ALFONSO ARTURO SIBATO MARTÍNEZ	1.023.943.373	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
21	AUXILIAR ELÉCTRICOS	MAILCOL ESTEBAN RUBIANO VEGA	1.023.933.050	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
22	AYUDANTE	JEAN CARLOSBEJARANO	1.232.588.330	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
23	AYUDANTE	JOSE ANTONIO AMARIS PALOMINO	77132092	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
24	AYUDANTE	LUIS ÁNGEL CASIANI CUETO	1.033.120.481	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
25	AYUDANTE	OMAR YESID ALVARADO RUIDIAZ	1.126.119.523	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
26	AYUDANTE	FERMIN PALACIOS PALACIOS	11.806.550	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
27	AYUDANTE	DEINER JESUS BELEÑO CARO	1082909389	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
28	AYUDANTE	NELCY ALEJANDRA MONDRAGÓN GARCÍA	1014276637	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
29	AYUDANTE	MARTÍNEZ MARTÍNEZ YIMIS	1079690056	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
30	AYUDANTE	JESSICA PAOLA BELTRÁN RODRÍGUEZ	1.070.019.412	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
31	AYUDANTE	JOSE GUILLERMO JUNCO CHOCONTA	79.757.550	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
32	AYUDANTE	CARLOS JULIO ZABALA HERNÁNDEZ	1.002.497.406	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
33	AYUDANTE	JOSE MIGUEL MARTÍNEZ GALVIS	1.073.383.474	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
34	AYUDANTE	LUIS ALBERTO LÓPEZ GARAY	3.166.211	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
35	AYUDANTE	EDISON ALBERTO LÓPEZ ROBAYO	80.114.455	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
36	AYUDANTE	NEIDER MACHADO VEGA	1.193.387.009	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
37	AYUDANTE	VÍCTOR HUGO GRANJA PALACIOS	80.871.279	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
38	OFICIAL	LUIS ALBERTO ASCENCIO VERGARA	1.100.395.224	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
39	AYUDANTE	JOSE GIOVANY MATIZ TORRES	1.007.614.754	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
40	AYUDANTE	ÁLVARO PALECHOR ITAZ	4.698.485	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
41	DIRECTOR DE OBRA	DIEGO ALENDRO HILLON VILLAMIL	1.053.584.773	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
42	AYUDANTE	JAIRO ANDRÉS ASCENSIO VERGARA	92.098.927	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
43	SOLDADOR	PEDRO JULIO FAJARDO ANZOLA	79.246.381	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
44	AYUDANTE	YEISON DÍAZ JULIO	1050955439	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE

No.	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EXAMEN EGRESO / NOTIFICACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
45	OFICIAL	MAURICIO ALEJANDRO CASTAÑO GIRALDO	71.277.693	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
46	AYUDANTE	MAURICIO ENRIQUE UPARELA SIMANCA	1.002.497.728	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
47	AYUDANTE	ODIMAR ROBLES MÉNDEZ	1.052.972.888	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
48	OFICIAL	RAÚL ANTONIO VILLALBA GOMEZ	1.143.118.844	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
49	AYUDANTE	CESAR STIVEEN GUTIÉRREZ	1019066733	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
50	OFICIAL	CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	1019012454	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
51	AYUDANTE	JONATHAN NICOLAS FAJARDO BERNAL	1032419423	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
52	MAESTRO	JOSE ISIDRO ALARCÓN PEÑA	79046323	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
53	OFICIAL	LUIS GABRIEL ALFONSO TORRES	79913617	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
54	AYUDANTE	HAROL FIGUEROA SARMIENTO	1046275114	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
55	AYUDANTE	CARLOS AUGUSTO SUAREZ MAYORGA	1053584773	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
56	OFICIAL ELÉCTRICO	DORANCE PERALTA	3019591	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
57	OFICIAL	JAVIER ALEXANDER ORTIZ MORENO	79971621	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
58	OFICIAL	JAMER ANTONIO PÉREZ PIANETA	98652087	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
59	OFICIAL	JAVIER RODRÍGUEZ RINCÓN	79492996	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
60	OFICIAL	CAMILO ANDRÉS PALACIOS ÁVILA	1023933472	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
61	AYUDANTE	MARÍA CAMILA HILLON VILLAMIL	1053585802	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
62	OFICIAL	SEBASTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ VARGAS	1077086615	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
63	AYUDANTE	ERIKA EMILIA RODRÍGUEZ	52205591	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
64	AYUDANTE	CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ	1053844276	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
65	AYUDANTE	ROBERTO CARLOS ARROYO GORDILLO	80.113.278	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
66	AUXILIAR ASEO	NICOLL JAQUELINE GARZÓN GOMEZ	1.000.617.968	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
67	AUXILIAR ASEO	ANGÉLICA PAOLA ÁVILA PARRA	1.019.071.072	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
68	AYUDANTE	JAIME ALBERTO ARDILA RIVERA	79.221.836	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
69	AYUDANTE	YEISON EDUARDO ALARCÓN	1.026.291.393	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
70	AYUDANTE	FREDDY ALEXANDER BARBOSA PINZÓN	80.919.571	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
71	OFICIAL EJERO	OSCAR ANTONIO TORRES CHAPARRO	79.501.997	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
72	AYUDANTE	JAIRO ANDRÉS ZACIPA CÓRDOBA	79.924.799	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
73	AYUDANTE	LEONARDO CÓRDOBA PÉREZ	1.012.361.339	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
74	AYUDANTE	JORGE EDWARD AGUIRRE BLANCO	1.010.183.574	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
75	AYUDANTE	FREDY FERNANDO HERRERA OSORIO	1.104.696.135	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
76	AYUDANTE	JHON JAIDER HERRERA OSORIO	1.104.698.046	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
77	AYUDANTE	JEFFERSON AGUIRRE BLANCO	80.118.148	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
78	AYUDANTE	DIEGO ALFREDO CUADRADO MARTIN	1.014.223.566	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
79	AUXILIAR TECNICO	JAVIER SEBASTIÁN GUZMÁN MUNAR	1.014.266.805	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
80	OFICIAL EJERO	TANIA ERIKA ROMERO LEAL	79.501.996	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
81	AYUDANTE	CESAR DARÍO MUÑOZ MELENDRE	1.040.494.577	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
82	AYUDANTE	NEIDER MACHADO VEGA	1.193.387.009	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
83	AYUDANTE	BRAYAN ARLEY ENZUNCHO ROMERO	1.003.286.974	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
84	OFICIAL EJERO	JOSE PEDRO JULIO DUEÑAS CUFIÑO	79.501.995	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
85	AUXILIAR DE ASEO	SHIRLEIDYS JIMÉNEZ FAJARDO	1,030,661,986	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
86	AYUDANTE	DANIEL FELIPE AYALA TABORDA	1.233.459.866	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
87	AYUDANTE	DAVID SANTIAGO SÁNCHEZ VAQUERO	1.233.896.231	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
88	AYUDANTE	EDGAR YESID HORTUA SANABRIA	1.030.535.493	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
89	AYUDANTE	LUIS MIGUEL GARZÓN MALAGON	1.024.549.489	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
90	OPERADOR RETROEXCAVADORA	SERGIO DUVAN BELTRÁN ARIAS	1.010.181.999	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE

No.	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EXAMEN EGRESO / NOTIFICACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
91	AYUDANTE	CARLOS ALFREDO RUIZ TORDECILLA	1.003.066.311	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
92	AYUDANTE	KEINNER MANUEL MURILLO SÁNCHEZ	1.003.066.621	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
93	RESIDENTE	KEBIN CASTELLANOS RAMOS	1.032.458.504	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
94	RESIDENTE	JORGE ELIECER CASTELLANOS MORENO	79.492.402	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
95	TECNICO	CARLOS OMAR CUBIDES GIRALDO	1.023.869.869	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
96	TECNICO	OMAR NARANJO PICO	1.098.406.778	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
97	AYUDANTE	CAMILO ANDRÉS PALACIO ÁVILA	1.023.933.472	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
98	OFICIAL	MIGUEL ALBERTO LÓPEZ MORA	1.012.370.852	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
99	OFICIAL	EDGAR SAMIR BENÍTEZ SIERRA	7.308.836	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
100	AYUDANTE	RAFAEL ANTONIO RODELO MÉNDEZ	1.193.457.105	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
101	OFICIAL	LIBARDO VALOYES VALENCIA	79.722.611	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
102	OFICIAL	RICHARD JOSE PEREIRA CALDERÓN	1.049.930.112	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
103	AYUDANTE	JUAN DAVID DAZA VERGARA	1.032.445.203	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
104	AUXILIAR DE ASEO	SHIRLEIDYS JIMÉNEZ FAJARDO	1,030,661,986	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
105	AYUDANTE	DANIEL FELIPE AYALA TABORDA	1.233.459.866	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
106	AYUDANTE	DAVID SANTIAGO SÁNCHEZ VAQUERO	1.233.896.231	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
107	AYUDANTE	EDGAR YESID HORTUA SANABRIA	1.030.535.493	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
108	AYUDANTE	LUIS MIGUEL GARZÓN MALAGON	1.024.549.489	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
109	OPERADOR RETROEXCAVADORA	SERGIO DUVAN BELTRÁN ARIAS	1.010.181.999	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
110	AYUDANTE	CARLOS ALFREDO RUIZ TORDECILLA	1.003.066.311	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
111	AYUDANTE	KEINNER MANUEL MURILLO SÁNCHEZ	1.003.066.621	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
112	RESIDENTE	KEBIN CASTELLANOS RAMOS	1.032.458.504	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
113	RESIDENTE	JORGE ELIECER CASTELLANOS MORENO	79.492.402	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
114	TECNICO	CARLOS OMAR CUBIDES GIRALDO	1.023.869.869	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
115	TECNICO	OMAR NARANJO PICO	1.098.406.778	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
116	AYUDANTE	CAMILO ANDRÉS PALACIO ÁVILA	1.023.933.472	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
117	OFICIAL	MIGUEL ALBERTO LÓPEZ MORA	1.012.370.852	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
118	OFICIAL	EDGAR SAMIR BENÍTEZ SIERRA	7.308.836	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
119	AYUDANTE	RAFAEL ANTONIO RODELO MÉNDEZ	1.193.457.105	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
120	OFICIAL	LIBARDO VALOYES VALENCIA	79.722.611	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
121	OFICIAL	RICHARD JOSE PEREIRA CALDERÓN	1.049.930.112	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
122	AYUDANTE	JUAN DAVID DAZA VERGARA	1.032.445.203	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
123	ASEO	XIOMARA XIMENA GARZÓN RAMÍREZ	1.023.939.775	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
124	ASEO	CRISTIAN DAVID SÁNCHEZ GUTIÉRREZ	1.053.844.276	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
125	OFICIAL	ELÍAS PORRAS JAIME	91.151.231	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
126	AYUDANTE	JOSE RAFAEL HERRERA JULIO	1.023.921.273	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
127	OFICIAL	PATROCINIO CASTELLANOS MARTÍNEZ	91.343.172	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
128	OFICIAL	LUIS EDUARDO MUÑOZ MANJARREZ	1.123.730.397	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
129	AYUDANTE	DAVID SOLAR HOYOS	1.037.472.861	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
130	AYUDANTE	LUIS FERNEY REYES RAMOS	10.769.469	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
131	OFICIAL	ERIBALDO ANTONIO CASTRO ROBLES	80.103.230	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
132	OFICIAL	RICHARD JOSE PEREIRA CALDERÓN	1.049.930.112	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
133	AYUDANTE	YEISON DÍAZ JULIO	1.050.955.439	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
134	MAESTRO	VÍCTOR HUGO GRANJA PALACIOS	80.871.279	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
135	OFICIAL	JOSE ALEXANDER ORTIZ MUÑOZ	79.971.621	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
136	AYUDANTE	JUAN DESIDERIO MOSQUERA MOSQUERA	4.837.625	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE

No.	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EXAMEN EGRESO / NOTIFICACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
137	OFICIAL	LIBARDO VALOYES VALENCIA	79.722.611	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
138	OFICIAL	JOSE ALIRIO VALOYES MOSQUERA	11.707.366	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
139	AYUDANTE	JULIO MENA MENA	1.033.789.264	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
140	AYUDANTE	CARLOS MARIO MENA PALACIOS	1.003.932.556	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
141	OFICIAL	JOBER ANTONIO AMARIS PALOMINO	77.132.092	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
142	AYUDANTE	FRANCISCO DADINSON GUERRERO FLOREZ	11.705.453	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
143	OFICIAL	JOSE GIOVANY MATIZ TORRES	1.007.614.754	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
144	OFICIAL	OMAR JESID ALVARADO RUIDIAZ	1.126.119.523	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
145	OFICIAL	ISAÍAS MANUEL MURILLO BORJA	1.003.290.026	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
146	OFICIAL	LUIS ENRIQUE BALDOVINO DELGADO	1.102.119.981	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
147	OFICIAL	JONATHAN JAVIER TORRECILLA MEJÍA	1.047.385.619	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
148	AYUDANTE	BAIRON ANDRÉS CÁRDENAS DÍAZ	1.102.807.987	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
149	AYUDANTE	MILTON JOSE PALMA MOSQUERA	11.806.063	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
150	AYUDANTE	ALBENIDES MESA MOSQUERA	80.009.202	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
151	AYUDANTE	EDGAR CÁRDENAS GALINDO	4.183.310	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
152	AYUDANTE	EVERLEY MOSQUERA CUESTA	11.810.876	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
153	AYUDANTE	YESID ORTEGA IZQUIERDO	1.002.274.242	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
154	OFICIAL	GILBERTO TORRES BUELVAS	73.507.452	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
155	OFICIAL	JAVIER ORTEGA BUELVAS	19.792.992	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
156	AYUDANTE	IVAN MAURICIO NEACHAN	1.071.167.800	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
157	OFICIAL	MANUEL DAVID MURILLO BORJA	1.063.291.097	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
158	AYUDANTE	YUNIOR JOSE LARES MEZA	1.101.877.392	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
159	OFICIAL	MAXIMO CÓRDOBA MOSQUERA	11.706.598	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
160	AYUDANTE	GEIBER MENDOZA VILLEGAS	1.007.323.647	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
161	AYUDANTE	DANIEL ALEXANDER MONSALVE RODRÍGUEZ	1.005.469.415	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
162	AYUDANTE	DIONISIO GUTIÉRREZ VILLEGAS	1.044.908.020	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
163	OFICIAL	JHON FREDY AROCA TOVAR	1.007.248.148	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
164	PINTOR	JORGE WILLIAM OSPINA PÉREZ	79.882.876	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
165	OFICIAL	DAVID ANDRÉS SANTOS VILLARAGA	1.001.314.956	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
166	OPERARIO	ROBERTO PARRA CEPEDA	80.875.881	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
167	AYUDANTE	LUIS CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ	1.067.877.205	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
168	AYUDANTE	CRISTIAN MANUEL LAGOS CHAPARRO	1.013.684.232	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
169	OFICIAL	LUIS FERNANDO COLORADO	80.276.065	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
170	OFICIAL	ENRIQUE NOGUERA CHAPARRO	79.578.440	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
171	INSTALADOR	ALEX SNEIDER FUENTES	1,073,692,700	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
172	INSTALADOR	DANIEL ENRIQUE CABEZA RICO	1.127.344.808	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
173	INSTALADOR	JAIDER ANTONIO SALGADO SUAREZ	1.007.565.069	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
174	INSTALADOR	EMMANUEL CASTELLANOS CORTES	1,001,325,038	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
175	INSTALADOR	LUIS MIGUEL ACEVEDO MOLINA	1,066,529,509	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
176	INSTALADOR	NICOLAS YANPOOL ORTEGON ANZOLA	1,023,957,343	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
177	OFICIAL	ALEXANDER CASTRO CUMBE	80,493,057	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
178	OFICIAL	JURGEN RENE CASTRO ROJAS	1,098,703,052	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
179	OFICIAL	LUIS EDUARDO MUÑOZ MANJARRES	1,123,730,397	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
180	AYUDANTE	HAROLD RICARDO SÁNCHEZ ARAGÓN	79,518,118	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
181	AYUDANTE	DAVID SOLAR HOYOS	1,037,472,861	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
182	OFICIAL	JAVIER BERMÚDEZ OLIVARES	79,461,140	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE

No.	CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	EXAMEN EGRESO / NOTIFICACIÓN	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
183	OFICIAL	PEDRO JAVIER TORROLEDO PINEDA	80,240,323	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
184	INSTALADOR	EMMANUEL CASTELLANOS CORTES	1,001,325,038	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
185	INSTALADOR	LUIS MIGUEL ACEVEDO MOLINA	1,066,529,509	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
186	INSTALADOR	NICOLAS YANPOOL ORTEGON ANZOLA	1,023,957,343	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
187	OFICIAL	ALEXANDER CASTRO CUMBE	80,493,057	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
188	OFICIAL	JURGEN RENE CASTRO ROJAS	1,098,703,052	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
189	OFICIAL	LUIS EDUARDO MUÑOZ MANJARRES	1,123,730,397	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
190	AYUDANTE	HAROLD RICARDO SÁNCHEZ ARAGÓN	79,518,118	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
191	AYUDANTE	DAVID SOLAR HOYOS	1,037,472,861	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
192	OFICIAL	JAVIER BERMÚDEZ OLIVARES	79,461,140	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
193	OFICIAL	PEDRO JAVIER TORROLEDO PINEDA	80,240,323	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
194	SUPERVISOR	OSCAR ANDRÉS OBANDO REYES	1,030,612,235	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
195	PINTOR	HENRY HERNANDO INFANTE ALFONSO	79.993.728	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
196	PINTOR	JONH DEIVI QUINTERO GALLEGO	80,145,789	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
197	PINTOR	YULIAN ANDRÉS GARZÓN AMADOR	1.022.428.010	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
198	PINTOR	NELSON ONOFRE ABRIL ROMERO	79.610.957	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
199	PINTOR	EDILSON ALEJANDRO RAMÍREZ RAVE	1.073.680.170	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
200	TECNICO ELÉCTRICO	RUSBELL JAVIER PIRATOVA CAMELO	86,049,321	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
201	TECNICO ELÉCTRICO	RICARDO RUBIO ESCOBAR	79,472,030	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
202	APLICADOR	GUIDO ALFONSO ORTIZ TÉLLEZ	1,012,430,339	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
203	APLICADOR	JEFFERSON DARÍO PENAGOS ROMERO	1,015,451,419	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
204	APLICADOR	OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ	1,023,880,296	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
205	APLICADOR	FABIÁN LEONARDO MURCIA GÁMEZ	1,030,549,821	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
206	APLICADOR	DAIRO ANDRÉS LLANO IDARRAGA	1,031,177,177	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
207	APLICADOR	YERSI ORLANDO PIZO CORTES	1,033,767,398	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
208	APLICADOR	WUALTER ESNEYDER MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ	1,033,783,539	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
209	PINTOR	ALEXANDER MANCERA SALAMANCA	79,648,888	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
210	ASEO	ANDREA PAOLA VELOSA DÍAZ	1,023,892,115	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
211	PINTOR	BRANDON ANDREY MORENO REINOSO	1,001,281,650	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
212	PINTOR	EDGAR MORENO GOMEZ	79,489,875	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
213	ASEO	MADELEINE MARINA CARDEÑO TORRES	1,243,189,888	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
214	ASEO	SHIRLEYDIS JIMÉNEZ FAJARDO	1,030,661,986	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
215	VIGILANTE	BRAYAN STEVEN OSORIO QUINTERO	1.026.301.207	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
216	VIGILANTE	MAICOL SALCEDO QUINTERO	1.024.527.597	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE
217	VIGILANTE	OSCAR ORLANDO GARZÓN OSPINA	1.033.808.431	NOTIFICACIÓN DE EXAMEN DE EGRESO	CUMPLE

Tabla 37. Consolidado de personal del contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04

Así mismo, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., que acorde al cumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas en el Anexo técnico ítem 32.4 INFORMES, que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, realizó la entrega de los soportes de aportes a la seguridad social (Afiliaciones para ingreso, planillas de pago de salud, pensión y riesgos profesionales), los cuales fueron remitidos mes a mes en el informe mensual de la interventoría.

Por lo anterior, se presenta en el **ANEXO No 16**, los soportes de PAZ Y SALVO por todo concepto de pagos de seguridad social, liquidaciones y otros aportes, de los PROVEEDORES DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA del contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, como los PROVEEDORES DE MATERIALES PETREOS Y DE INSUMOS, que estuvieron relacionados para las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

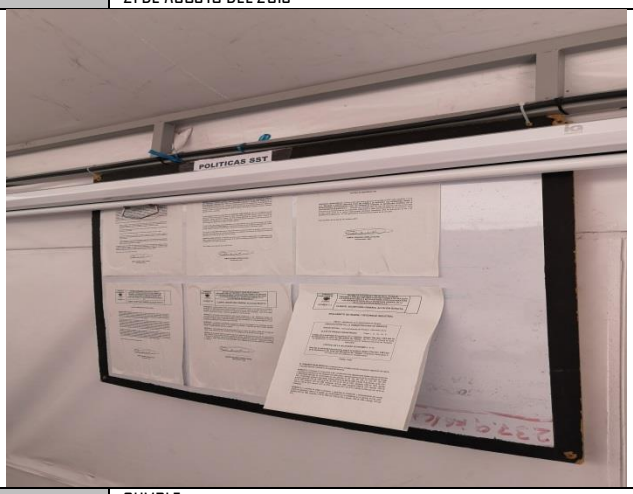
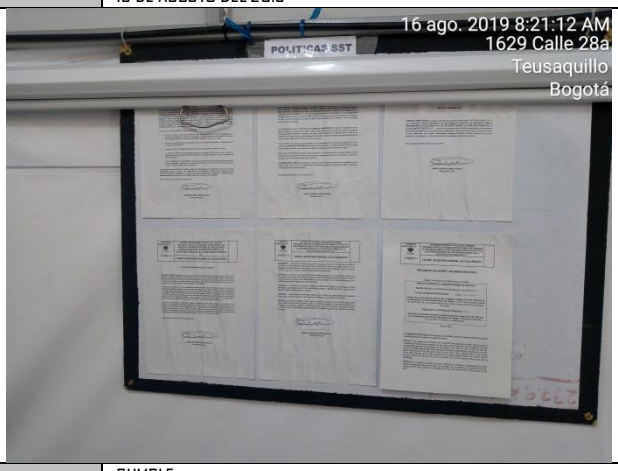
- HIDROALFA S.A.
- ANCER CONSTRUCTOR S.A.S.
- CASTERRA INGENIEROS Y CIA S.A.S.
- ENCHAPES Y ACABADOS ORLANDO RAMÍREZ
- OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
- YEIMMY Y RODRIGO TALERO
- SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOCIAL S.A.S.
- INGENIERÍA Y PROTECCIÓN S.A.S.
- AP CELAN INGENIERÍA S.A.S.
- CORTES CAÑON INGENIEROS CIVILES
- CARTISAVAL CONSTRUCCIONES S.A.S
- INDUWORKER
- H 323 TELECOMUNICACIONES
- CONSORCIO PRUNI SEDES 04
- TRANSPORTES FARIAS SAS
- HIDRINCO S.A.S.
- ANGIE ROMERO DUQUINO
- HORMIGÓN ANDINO S.A.

7.2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN EL SG-SST.

7.2.2.1 SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., que acorde al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, para las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, realizo la implementación de las siguientes actividades:

- Publicación de las Políticas frente al alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, de seguridad. industrial, a través de la cartelera.
- Realización de exámenes médicos de ingreso y notificación de examen de egreso (Retiro).
- Ejecución de indicadores de accidentalidad – ausentismo del personal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE CARTELERA INFORMATIVA POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	21 DE AGOSTO DEL 2019
	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE CARTELERA INFORMATIVA POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	16 DE AGOSTO DEL 2019
	
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE CARTELERA INFORMATIVA POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	30 DE AGOSTO DEL 2019



ESTADO DE CUMPLIMIENTO	
ETAPA/FASE/ITEM	CUMPLE

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que en la siguiente tabla se presentan los consolidados del ausentismo por accidentes de trabajo del contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, para el proyecto:

ITEM	PERIODO	NO. TRABAJADORES	HHT	NO. DE ACCIDENTES	DÍAS PERDIDOS O CARGADOS
1	Veintiocho (28) de junio de 2019 a (treinta) 30 de julio 2019	32	6448	0	0
2	Primero (1) de agosto de 2019 a (treinta) 30 de agosto 2019	65	13520	0	0
3	Primero (1) de septiembre de 2019 a (treinta) 30 de septiembre 2019	50	9600	0	0
4	Primero (1) de octubre al treinta y uno (31) de octubre del 2019	96	18240	1	2
5	Primero (1) de noviembre al treinta (30) de noviembre del 2019	65	13520	0	0
6	Primero (1) de diciembre al treinta y uno (31) de diciembre del 2019	85	16320	1	4
7	Primero (1) de enero al treinta y uno (31) de enero del 2020	80	16640	0	0
8	Primero (1) de febrero al veintinueve (29) de febrero del 2020	75	15600	0	0
9	Primero (1) de marzo al treinta y uno (31) de marzo del 2020	32	6448	0	0
10	Primero (1) de abril al treinta (30) de abril del 2020	0	0	0	0
11	Primero (1) de mayo al treinta y uno (31) de mayo del 2020	32	6448	0	0
12	Primero (1) de junio al treinta (30) de junio del 2020	34	3536	0	0
13	Primero (1) de julio al treinta y uno (31) de julio del 2020	39	8112	0	0
14	Primero (1) de agosto al treinta y uno (31) de agosto del 2020	35	7280	0	0
15	Primero (1) de septiembre al treinta (30) de septiembre del 2020	77	83431	0	0
16	Primero (1) de octubre al treinta y uno (31) de octubre del 2020	25	5200	0	0
17	Primero (1) de noviembre al treinta (30) de noviembre del 2020	23	4784	0	0

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de los exámenes de ingreso se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría, así mimo las políticas de seguridad y salud en el trabajo, se presentaron en el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,

el cual fue radicado mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF027 del 30 de julio del 2019, bajo el radicado No. 1-2019-19367.

7.2.2.2 SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., que acorde al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, para las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, realizo la implementación de las siguientes actividades:

- Ejecución de la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros.
- Realización de notificaciones de riesgo a los trabajadores, en la fase de inducción.
- Ejecución de inspecciones planeadas.
- Implementación de señalización preventiva e informativa.
- Implementación de señalización y demarcación de áreas.
- Implementación de puntos de hidratación para el personal.
- Entrega de elementos de protección personal.
- Implementación de hojas de seguridad, frente al manejo y almacenamiento de las sustancias.
- Capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE ÁREAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	21 DE AGOSTO DEL 2019, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL Y VISUAL DE EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO (ENROSCADORA)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	10 DE AGOSTO DEL 2019, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 10 DE OCTUBRE DEL 2019







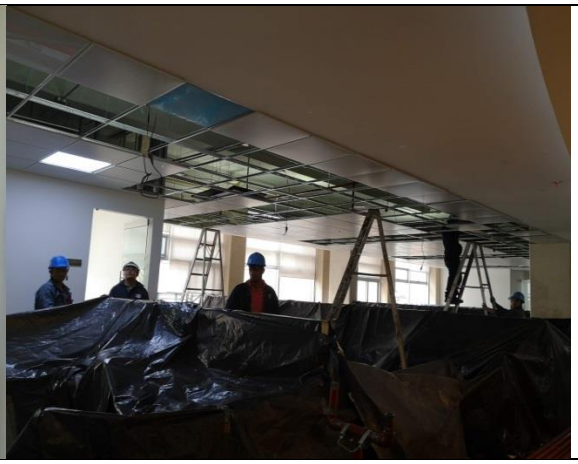


ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN Y VERIFICACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	10 DE AGOSTO DEL 2019, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 10 DE OCTUBRE DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

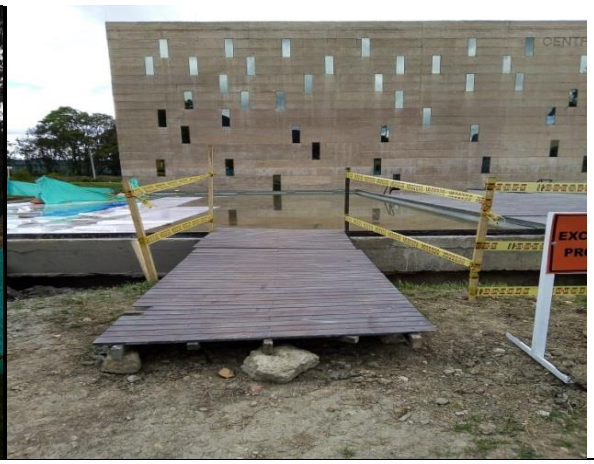


ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	16 DE AGOSTO DEL 2019, 25 DE OCTUBRE DEL 2019, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019



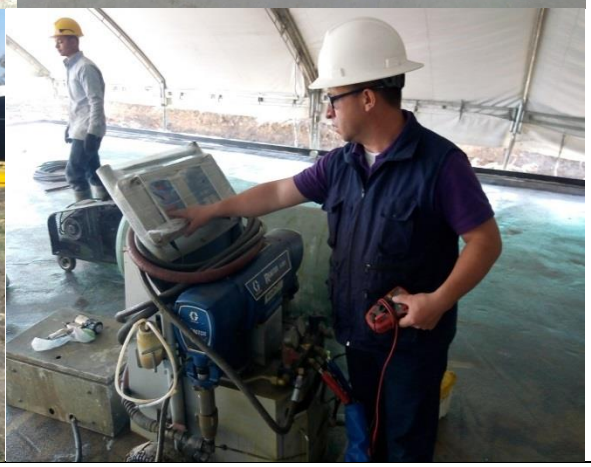






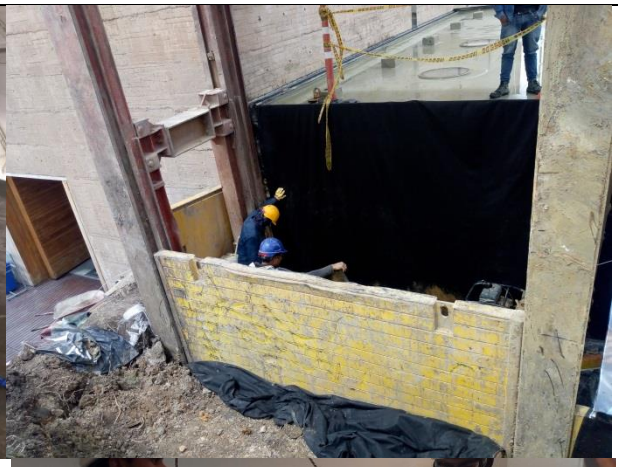
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL Y VISUAL DE EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN (RETRO EXCAVADORA Y MINI CARGADOR), EQUIPO PULIDORA DE CARRO PARA PISO COMO EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE LA POLIURIA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	10 DE AGOSTO DEL 2019, 6 DE OCTUBRE DEL 2019, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE



ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN (BOLSAS DE AGUA) Y VERIFICACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE POLIURIA, EXCAVACIÓN FILTROS PERIMETRALES Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	8 DE OCTUBRE DEL 2019, 9 DE NOVIEMBRE DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	20 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, 11 DE FEBRERO DEL 2020.

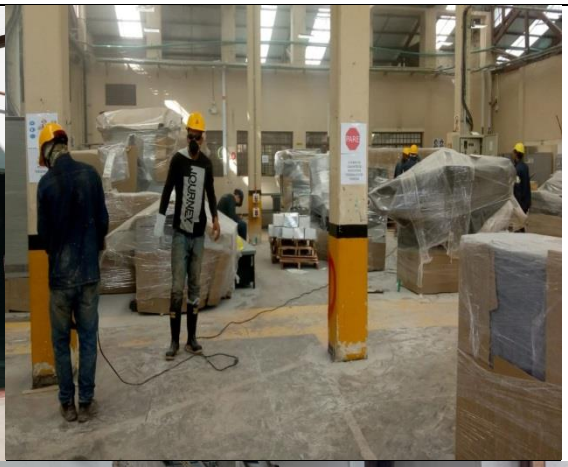






ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	30 DE AGOSTO DEL 2019

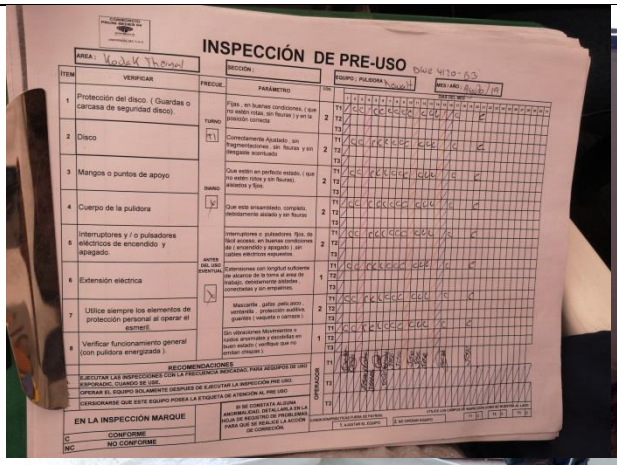








ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ETAPA/FASE/ITEM	INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL Y VISUAL DE EQUIPOS MARTILLO PERCUTOR, PULIDORA Y TABLERO ELÉCTRICO PARA LA ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	17 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 31 DE OCTUBRE DEL 2019, 12 DE DICIEMBRE DEL 2019









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ETAPA/FASE/ITEM	IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN, (BOLSAS DE AGUA) Y VERIFICACIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	9 DE AGOSTO DEL 2019, 16 DE MARZO DEL 2020, 20 DE MARZO DEL 2020, 10 DE AGOSTO DEL 2020







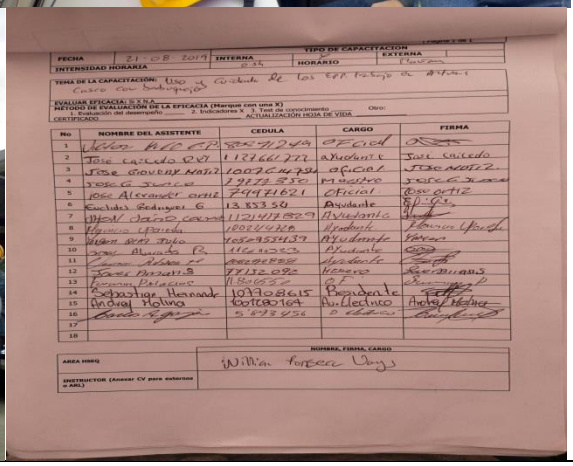


ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ETAPA/FASE/ITEM	IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	9 DE AGOSTO DEL 2019, 20 DE MARZO DEL 2020, 10 DE AGOSTO DEL 2020
ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	FORMATO DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	12 DE AGOSTO DEL 2019, 20 DE ENERO DEL 2020, 16 DE MARZO DEL 2020.









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de las inspecciones pre operacionales de los equipos, adquisición y compra de agua potable como punto de hidratación para el personal, soportes de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, soportes de entrega de elementos de protección personal, se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría. Así mismo, la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se presentó en el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual fue radicado mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF027 del 30 de julio del 2019, bajo el radicado No. 1-2019-19367.

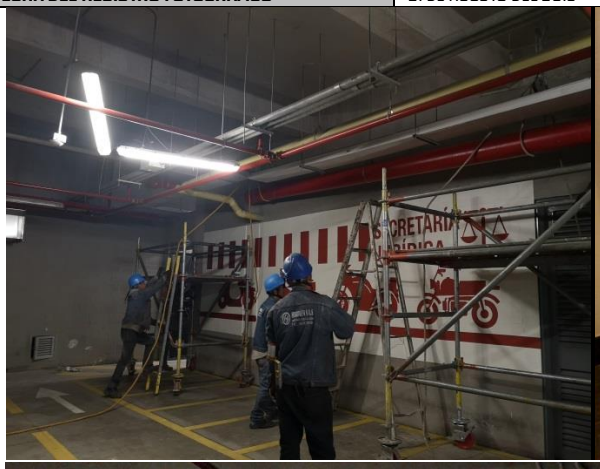
7.2.2.3 SUB PROGRAMA CONTRA CAÍDAS (TRABAJO EN ALTURAS).

la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., que acorde al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO

PRUNI SEDES 04, para las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, realizo la implementación de las siguientes actividades:

- Implementación de hojas de vida de los equipos contra caída (Eslingas, línea de vida, arnés).
- Realización de permisos de trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro (ATS)
- Inspecciones de elementos contra caída, andamios y escaleras.

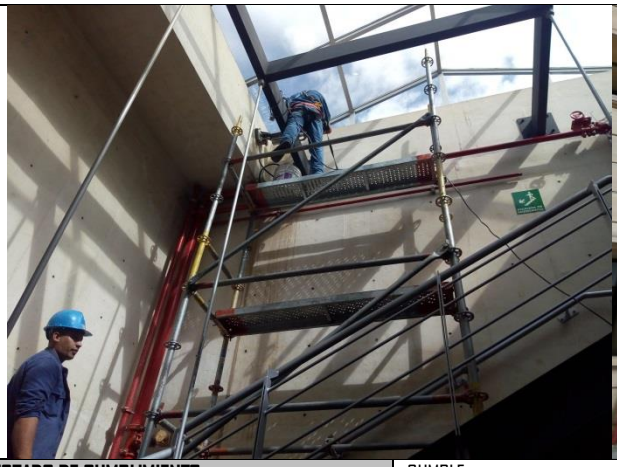
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, VERIFICACIÓN DE ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, USO DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS (ESLINGA, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	21 DE AGOSTO DEL 2019













ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, VERIFICACIÓN DE ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, USO DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS (ESLINGA, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA), INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS (ESLINGA Y ARNÉS)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	20 DE JULIO DEL 2019, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 12 DE ENERO DEL 2020.

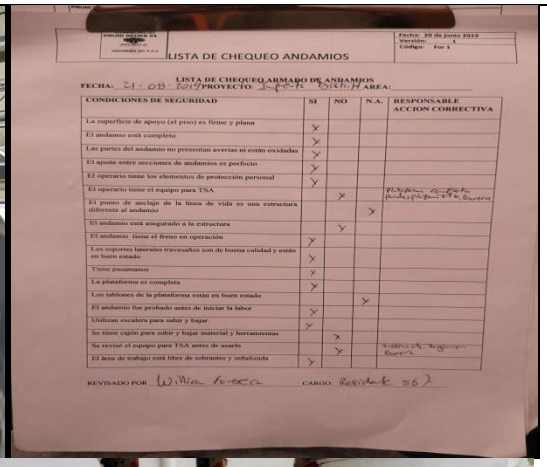






ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS, VERIFICACIÓN DE ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, USO DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS (ESLINGA, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA), INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS (ESLINGA Y ARNÉS)
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	30 DE AGOSTO DEL 2019





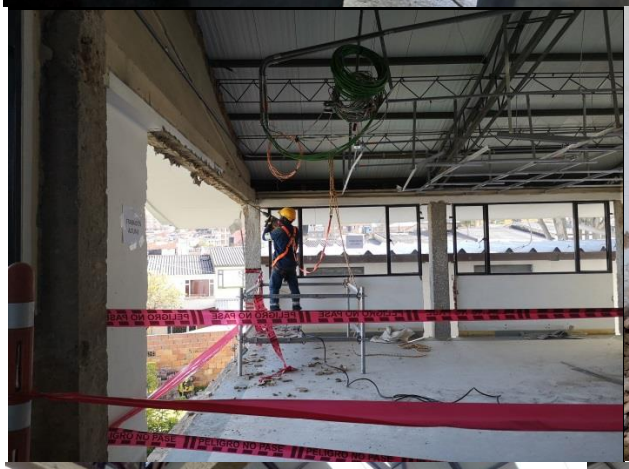
LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS

LISTA DE CHEQUEO ARMADO DE ANDAMIOS

FECHA: 21-08-2019 PROYECTO: AREA:

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N.A.	RESPONSABLE ACCION CORRECTIVA
La superficie de apoyo (el piso) es firme y plana	X			
El andamio está completo	X			
Las partes del andamio no presentan averías ni están oxidadas	X			
El ajuste entre secciones de andamios es perfecto	X			
El operario tiene los elementos de protección personal	X			
El operario tiene el equipo para TSA		X		
El punto de anclaje de la línea de vida es una estructura diferente al andamio			X	
El andamio está asegurado a la estructura		X		
El andamio tiene el freno en operación	X			
Los soportes laterales travesaños son de buena calidad y están en buen estado	X			
Tiene pasamanos	X			
La plataforma es completa	X			
Los tableros de la plataforma están en buen estado			X	
El andamio fue probado antes de iniciar la labor	X			
Utilizan escalera para subir y bajar	X			
Se tiene cuplo para subir y bajar material y herramientas		X		
Se revisó el equipo para TSA antes de usarlo		X		
El área de trabajo está libre de sobrantes y señalizada	X			

REVISADO POR: CARGO:









ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de las inspecciones de los equipos de trabajo en alturas (Arnés, eslingas), inspecciones de los andamios multidireccionales, permisos de trabajo en alturas hoja de vida de los equipos contra caída, se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría, los cuales se implementaron en la sede MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

7.2.2.4 SUB PROGRAMA DE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS).

la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., que acorde al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020, el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, para las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, realizo la implementación de las siguientes actividades:

- Implementación de elementos de emergencia los cuales fueron camilla, elementos de inmovilización, botiquín y extintores.
- Realización de capacitación de emergencia, asistencia a Simulacro Distrital.
- Instalación de señalización los cuales fueron punto de encuentro, salida de emergencia y rutas de evacuación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE MANZANA LIÉVANO	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA SIENDO BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLA DE EMERGENCIA Y EXTINTORES MULTIPROPÓSITO (ABC), Y ASISTENCIA A SIMULACRO DISTRITAL.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	21 DE AGOSTO DEL 2019
	

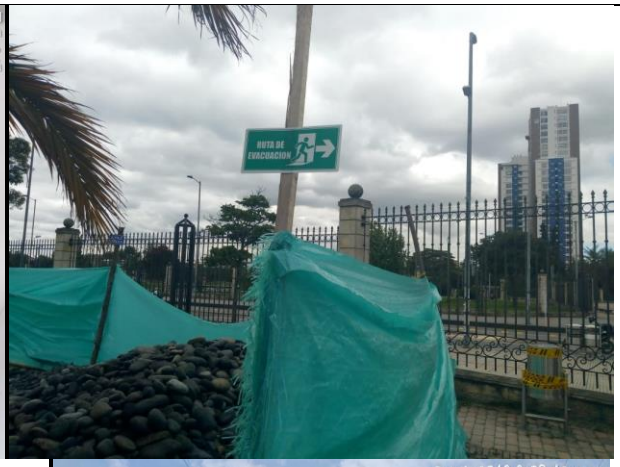


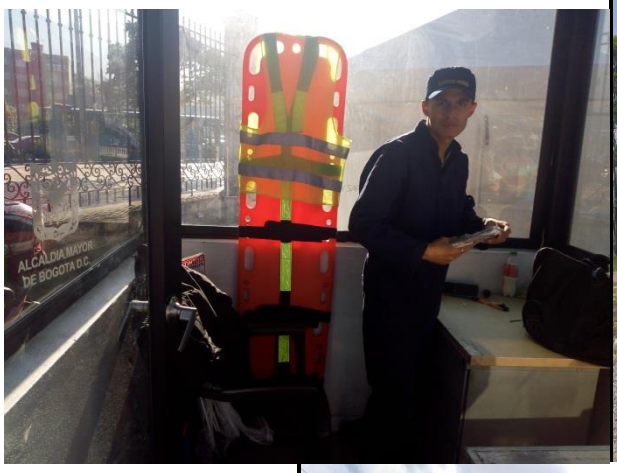




ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE
REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA SIENDO BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLA DE EMERGENCIA Y EXTINTORES MULTIPROPÓSITO (ABC), Y ASISTENCIA A SIMULACRO DISTRITAL.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	16 DE AGOSTO DEL 2019







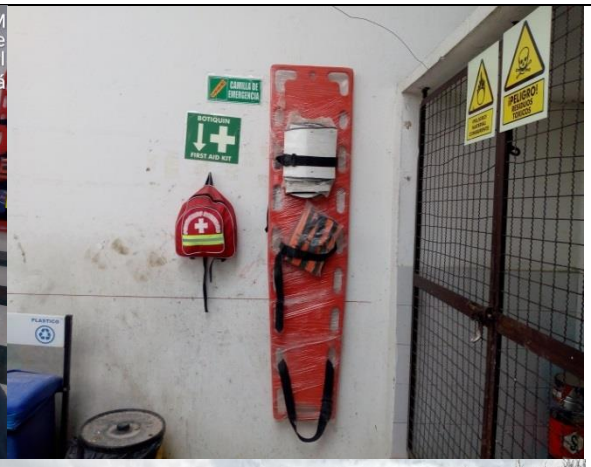


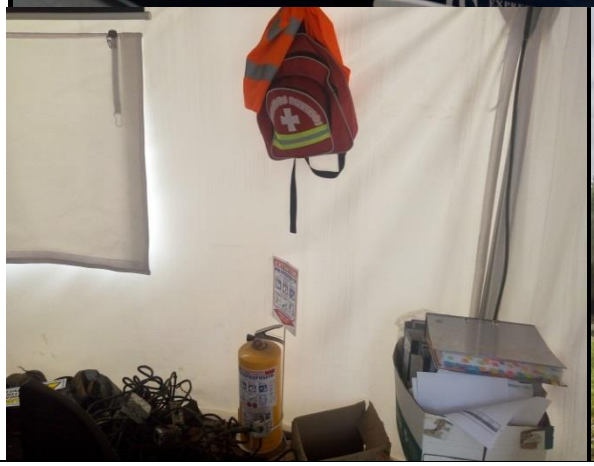


ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	
ETAPA/FASE/ITEM	OBRA/CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA SIENDO BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CAMILLA DE EMERGENCIA Y EXTINTORES MULTIPROPÓSITO (ABC), Y ASISTENCIA A SIMULACRO DISTRITAL.
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO	30 DE AGOSTO DEL 2019















ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de las inspecciones de los equipos de emergencia, asistencia a SIMULACRO DISTRITAL realizado para el periodo de 2019 (22 de septiembre) y 2020 (22 de octubre), se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría, los cuales se implementaron en la sede MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

7.2.3 OTROS (LOS QUE SOLICITE LA ENTIDAD)

7.2.3.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020 El contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, llevo a cabo de manera MENSUAL la ejecución de las reuniones del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y las reuniones del VIGÍA OCUPACIONAL, para el proyecto, teniendo en cuenta que acorde a lo establecido en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, se realizaría teniendo en cuenta el número de trabajadores, para las tres sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

De igual forma, el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, llevo a cabo de manera MENSUAL la ejecución de las reuniones del COMITÉ DE CONVIVENCIA, para las tres sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

Acorde a lo mencionado, en la siguiente tabla se relaciona las reuniones ejecutadas para el COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA.

No.	PERIODO	COMITÉ DE CONVIVENCIA	COMITÉ PARITARIO– VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1	JULIO 2019	N/A (Etapa de diseño planes pre operacionales)	N/A (Etapa de diseño planes pre operacionales)
2	AGOSTO 2019	Si	Si vigía ocupacional
3	SEPTIEMBRE 2019	Si	Si vigía ocupacional
4	OCTUBRE 2019	Si	Si vigía ocupacional
5	NOVIEMBRE 2019	Si	Si vigía ocupacional
6	DICIEMBRE 2019	Si	Si COPASST
7	ENERO 2020	Si	Si COPASST
8	FEBRERO 2020	Si	Si COPASST
9	MARZO 2020	Si	Si COPASST
10	ABRIL 2020	N/A (Suspensión)	N/A (Suspensión)
11	MAYO 2020	Si	Si COPASST
12	JUNIO 2020	Si	Si COPASST
13	JULIO 2020	Si	Si COPASST
14	AGOSTO 2020	Si	Si vigía ocupacional
15	SEPTIEMBRE 2020	Si	Si vigía ocupacional
16	OCTUBRE 2020	Si	Si vigía ocupacional
17	NOVIEMBRE 2020	Si	Si vigía ocupacional

Tabla 38. Consolidado de Comité de Convivencia y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de reuniones realizadas de los comités mencionados, se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría, los cuales se implementaron para todo el proyecto abarcando el personal de las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, por parte del contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

7.2.3.2 CAPACITACIONES E INSPECCIONES PRE OPERACIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., informa que para el periodo del VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL 2019 AL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2.020 El contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, llevo a cabo la ejecución de capacitaciones e

inspecciones pre operacionales de las actividades ejecutadas en las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL, dando cumplimiento al PLAN ANUAL DE TRABAJO establecido en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Acorde a lo mencionado, en la siguiente tabla No. 39, se relaciona las capacitaciones e inspecciones ejecutadas para el proyecto, las cuales fueron realizados por los profesionales de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra administrador WILLIAM FONSECA VARGAS, ingeniera TANIA ERIKA ROMERO LEAL y administradora SARA ESPERANZA SERRANO:

No.	TEMA DE CAPACITACIÓN
1	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
2	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES
3	INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO
4	INSPECCIÓN DE EXTINTORES
5	DIVULGACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INSTALACIÓN DE REDES
6	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN LOS FRENTES
7	PROTECCIÓN AUDITIVA
8	CUIDADO DE MANOS
9	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
10	RETRO ALIMENTACIÓN DEL INCIDENTE TUBERÍA
11	PAUSAS SALUDABLES
12	SOCIALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PULIDORA
13	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
14	PROCEDIMIENTO, USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS
15	SE PROHÍBE EL USO DE LOS CELULARES EN OBRA
16	PROCEDIMIENTO PARA ARMADO DEL ANDAMIO
17	SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE IMPRENTA
18	SOCIALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
19	RECOMENDACIONES PARA EXCAVACIÓN PROFUNDAS
20	RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS EN ALTURAS
21	AUTOCUIDADO, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
22	USO Y CUIDADO DEL BAÑO PORTÁTIL
23	USO Y CUIDADO DEL TROMPO
24	SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DILIGENCIAMIENTO PRE OPERACIONALES
25	USO Y CUIDADO DE LOS EPP
26	USO DE MONO GAFAS DE SEGURIDAD
27	PAUSAS SALUDADLES
28	REFLEXIONES, EL RATO QUE NO QUERÍA ESCUCHAR
29	INSPECCIONES DE EQUIPOS Y ATS
30	USO Y CUIDADO DE LOS EPP
31	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ESPACIOS
32	SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
33	ELABORACIÓN DE MUESTRA DE CONCRETO PARA ENSAYO
34	TRABAJO EN EQUIPO
35	USO Y CUIDADO DEL BAÑO PORTÁTIL
36	ARMADO DE ANDAMIOS
37	PROTECCIÓN AUDITIVA

No.	TEMA DE CAPACITACIÓN
38	CUIDADO DE MANOS
39	BRIGADA PAPSO
40	EL TRABAJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19
41	SOCIALIZACIÓN DEL CASO SOSPECHOSO DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA ARQ FERNANDO AGUIRRE
42	SOCIALIZACIÓN RECOMENDACIONES INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
43	SOCIALIZACIÓN CASO SOSPECHOSO "CIERRE DEL CASO"
44	SOCIALIZACIÓN AUTOCUIDADO EN ÉPOCA DE COVID-19
45	SOCIALIZACIÓN PAPSO
46	SOCIALIZACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
47	AUTOCUIDADO USO DE EPP Y EPCC
48	SOCIALIZACIÓN ACCIDENTES DE TRABAJO
49	AUTOCUIDADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Tabla 32. Consolidado de capacitaciones

En La tabla No.40, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar el consolidado de las inspecciones pre operacionales que fueron realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto, las cuales fueron realizadas por los profesionales de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra administrador WILLIAM FONSECA VARGAS, ingeniera TANIA ERIKA ROMERO LEAL y administradora SARA ESPERANZA SERRANO, acorde a las actividades ejecutadas por el personal en las sedes MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL.

No.	INSPECCIONES PRE OPERACIONALES
1	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
2	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES
3	INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO
4	INSPECCIÓN DE EXTINTORES
5	EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
6	ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL
7	PRE OPERACIONAL TALADRO HILTI 053454
8	PRE OPERACIONAL TALADRO HILTI PH 65A
9	PRE OPERACIONAL PULIDORA DEWALT 4120-B3
10	PRE OPERACIONAL PULIDORA DEWALT D28491-B3
11	PRE OPERACIONAL TROMPO YE 1325B-4
12	INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
13	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNÉS)
14	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ESLINGA)
15	ASEO DE BAÑOS
16	INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA
17	INSPECCIÓN DE PRE-USO TALADRO
18	INSPECCIÓN DE CAMPAMENTO
19	INSPECCIÓN DE ESCALERAS MÓVILES
20	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA
21	INSPECCIÓN EQUIPOS PARA IZAJE DE CARGAS INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Tabla 40. Consolidado de inspecciones pre operacionales

La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar que los soportes de capacitaciones e inspecciones pre operacionales mencionadas, se presentaron a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., en los informes mensuales de la interventoría, los cuales se implementaron para todo el proyecto.

7.3 CONCLUSIONES FINALES COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el periodo final el contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04, dio cumplimiento a las medidas establecidas en el PLAN DE MANEJO DE TRAFICO autorizado por la autoridad competente SECRETARIA DE MOVILIDAD, a través del consolidado de obras de infraestructura COI No. 47 del 2020, el cual tiene como fecha de vencimiento el 24 de diciembre del 2020.
- El contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, para el periodo de reporte realizo la gestión de disposición final de los residuos de construcción y demolición, peligrosos y aprovechables, con el gestor externo autorizado, el cual se puede evidenciar en el ANEXO No 14, del presente informe teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato el cual fue el día 28 de noviembre del 2020.
- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, informa a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., mediante el acta de reunión de cierre del componente ambiental, se llevó a cabo el cargue de la información ambiental ante la plataforma de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, para el pin ambiental 17450 del periodo de NOVIEMBRE del 2020, bajo el radicado No. 2020ER214163.
- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., mediante los siguientes comunicados ha requerido a la entidad SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., la información acerca del proceso de solicitud del cierre del pin ambiental No. 17450 ante la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, teniendo en cuenta que la información referente al componente de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN fue remitida mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 625 del día 17 de diciembre del 2020 con asunto TRASLADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), PARA SOLICITUD DE CIERRE DEL PIN AMBIENTAL 17450 ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. bajo el radicado No. 1-2020-36232., como compromiso adquirido en el acta final de cierre realizado el día 27 de noviembre del 2020 con la profesional PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) DAFNE VIVIANA HUERTAS, quien estaba delegada para el periodo de diciembre de 2020, por la entidad SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Así mismo mediante el oficio No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 656 del día 2 de marzo del 2021 con asunto REITERACIÓN DE INFORMACIÓN CIERRE DEL PIN AMBIENTAL – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DEL PROYECTO PARA FASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019, con número de radicado 1-2021-7144, se reiteró nuevamente la solicitud en mención a la entidad SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., de la cual hasta la fecha de reporte del presente informe, no se ha tenido respuesta alguna. Por lo anterior, la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., reitera la posición frente a que esto hace parte de la liquidación del contrato de obra y de Interventoría, liquidación esta que está en curso, y se hace necesario tener conocimiento pleno, del estado del PIN AMBIENTAL.
- El contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04, dio cumplimiento a lo establecido en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, frente a la implementación de las medidas siendo: ingreso de personal, diligenciamiento de formato de condiciones de salud, toma de temperatura y datos con equipo Oximetro, lavado de manos, desinfección y limpieza de áreas con AMONIO CUATERNARIO y jabón, ejecución de charlas diarias, pausas activas y capacitaciones, uso obligatorio de elementos de protección personal y uso permanente de tapabocas.
- La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., concluye que para el periodo de reporte no se presentó casos de SOSPECHA ni POSITIVOS para COVID-19, por parte del contratista de obra CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y la presente interventoría.

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

8.1. CORRESPONDENCIA CRUZADA

Para el INFORME FINAL de la FASE DE OBRA, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales envió correspondencia al contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04 y del mismo modo se recibió correspondencia del CONTRATISTA y de la entidad CONTRATANTE, por lo anterior nos permitimos anexarla al presente informe.

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
25-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-001	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBIDO EN LA PAGINA DE SECOP II
26-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-002	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. FRANCISCO ALEJANDRO GALVIS DELGADO	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO GAS Y RCI
25-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-003	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. HERNÁN MAHECHA PULIDO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
26-jun.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-004	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. PAOLA REYES COSTILLA	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
04-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-005	SOLICITUD DE ALISTAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18125
04-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-006	MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18125
10-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-007	TRASLADO DE INFORMACIÓN PARA REALIZACIÓN DE INFORME DE PRE-CONSTRUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	ING. PAOLA REYES COSTILLA	ESPECIALISTA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
15-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-008	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-17668
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-009	OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO PARA LOS TRES FRENTES DE TRABAJO OBJETO DE CONTRATO DE OBRA Nº 731 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18125
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-010	OBSERVACIONES A LOS CAMPAMENTOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18124
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-011	OBSERVACIONES PLANES PREOPERACIONALES SIENDO EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18127
16-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-012	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL Y POR FRENTE DE OBRA (MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-17964
17-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-012-A	OBSERVACIONES PLANES PREOPERACIONALES COMO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18126
22-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-013	OBSERVACIÓN DE LA INTERVENTORÍA A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDOS EL 15 DE JULIO DE 2019 Y 18 DE JULIO DE 2019 POR PARTE DEL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18674

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		CONTRATISTA PRUNI SEDES 04			
19-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-014	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA Nº 731 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	-
22-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-015	OBLIGACIONES REPORTE DE PERSONAL MEDIANTE FORMATO DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18673
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-016	ALCANCE AL OFICIO Nº 1-2019-17964 DEL 16 DE JULIO DE 2019 INFORMACIÓN DEL PAC DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-18676
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-017	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ Y RECORDATORIO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-186777
23-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-018	ALCANCE AL OFICIO Nº 1-2019-17964 DEL 16 DE JULIO DE 2019 APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA GENERAL Y POR FRENTE (MANZANA LIÉVANO, CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL).	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-18675
26-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-019	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-RELACIÓN DE PERSONAL FORMATOS DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-18944
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-020	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO PLANES PREOPERACIONALES (SG-SST, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19133
01-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-021	RESPUESTA AL OFICIO Nº PS04 - 014 -19 DEL 25 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 9 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA Y OFICIO Nº PS04-021-19 DEL 30 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 10:43 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 31 DE JULIO DEL 2019 ASUNTO INFORMES SEMANALES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19740
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-022	RESPUESTA AL OFICIO Nº PS04-017-19 DEL 26 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 5 PM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19207
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-023	RESPUESTA AL OFICIO Nº PS04-019-19 DEL 27 DE JULIO DEL 2016 RADICADO A LAS 8 AM A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19208
06-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-024	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-025	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LOS PLANES PRE OPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD, PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – PLAN DE EMERGENCIAS)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	-
29-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-026	RESPUESTA AL OFICIO Nº 2-2019-19510 DEL 25 DE JULIO DE 2019 Y RADICADO EN NUESTRAS OFICINAS DEL 26 DE JULIO DE 2019 A LAS 11:30 AM	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19206
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-027	APROBACIÓN Y TRASLADO DE LOS PLANES PRE OPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19367

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		PG-RCD, PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE EMERGENCIAS		D.C.	
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-028	APROBACIÓN DE PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO - PROTOCOLO INGRESO PERSONAL HORARIO ADICIONAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19369
30-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-029	INFORME DE INGENIERÍA DE DETALLE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-19366
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-029-A	CONTENIDO INFORME MENSUAL COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19936
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-030	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ INTERNO LUNES 29 DE JULIO DE 2019 - MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-031	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PROGRAMACIÓN - MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
02-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-032	CONTENIDO INFORME MENSUAL COMPONENTE SST Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-033	PLANES DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19937
31-jul.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-034	TRASLADO DE INFORMACIÓN ALCANCE A CONSULTORÍA DE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-035	RESPUESTA RADICADO Nº.PS04-024-19 APROBACIÓN DEL PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19938
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-036	DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DE INGRESO PERSONAL - PLANTILLA MÍNIMA ESPECIALISTAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19935
05-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-037	DOCUMENTACIÓN LEGAL AMBIENTAL PARA CANTERAS, ESCOMBRERAS, GESTORES EXTERNOS Y/O VOLQUETAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-19936
08-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-038	OBSERVACIONES PLANES OPERACIONALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20014
08-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-039	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS EN REUNIÓN ÁREA PIGA -SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20015
09-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-040	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS AMBIENTALES ADQUIRIDOS EN REUNIÓN ÁREA PIGA -SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20269
09-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-041	SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA CONSULTORÍA DE IMPRENTA DISTRITAL FRENTE A LAS REUNIONES REALIZADAS Y LO ENCONTRADO EN TERRENO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20268
10-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-042	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMPONENTE ELÉCTRICO DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20421
20-	AU-INTERV-SGA-4233000-	ENTREGA DE 3 PLANES DE CONTINGENCIA A 02 DE	ARQUITECTURA	SECRETARIA	-

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
ago.-19	730-2019-OF-043	SEPTIEMBRE DE 2019	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
06-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-044	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA Y A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-045	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
12-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-046	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL Nº.1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20423
12-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-047	PROTOCOLO INGRESO DE PERSONAL FRENTES DE TRABAJO MANZANA LIÉVANO, IMPRENTA DISTRITAL Y CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-20422
14-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-048	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO PLANES PREOPERACIONALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 20991
16-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-049	CONCEPTO TÉCNICO 1 CON BASE A LA REVISIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA EXCAVACIÓN DEL FILTRO EDIFICIO CENTRO MEMORIA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-050	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
16-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-051	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES A CORTE DEL 11 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-20992
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-052	SOLICITUD DE ACLARACIÓN INFORMACIÓN DADA POR LA CONSULTORÍA FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21398
22-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-053	SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR MAURICIO RIBERO MARTÍNEZ - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21260
22-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-054	OBSERVACIONES PLAN PREOPERACIONALES (PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-21261
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-055	INCUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE CALIDAD PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21399
23-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-056	CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE SISOMA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 WILLIAM FONSECA VARGAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21400
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-057	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-075-19 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23477
25-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-058	SOLICITUD DE PLAN DE COMPRAS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES DE LAS SEDES MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21754
26-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-059	REVISIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-059	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21755

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		No 42330000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-061	OBSERVACIONES TÉCNICAS A PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA Y ENTIBADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO DEL CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21920
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-062	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PLANES PRE OPERACIONALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21774
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-063	OBSERVACIONES ELÉCTRICAS A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA CONSULTORÍA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24077
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-064	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-21594 DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA 22 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21777
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-065	INFORME SEMANAL No OCHO (8) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21753
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-066	TRASLADO DE LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO PARA LA SEDE DE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21752
28-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-067	RESPUESTA RADICADO PS04-116-19 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASUNTO ENTREGA PISO 2 BICENTENARIO 2 ÁREA DE TALENTO HUMANO - SECRETARIA DE GOBIERNO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 24696
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-068	NUEVAMENTE SOLICITUD CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA ARQ. OSCAR MAURICIO RIBEIRO MARTÍNEZ - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21756
27-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-069	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA UNO (1) A LAS SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 21757
28-ago.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-070	ALCANCE OFICIO No AU-INTREV-SGA-4233000-730-2019-OF062 CON No DE RADICADO 1-201921756	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21921
03-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-071	CENTRO DE ACOPIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES Y PELIGROSOS, Y SOLICITUD INMEDIATA DE GESTORES EXTERNOS (PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES VIGENTES)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22429
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-072	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, SOLICITUD DE ENTREGA DE BALANCE DE OBRA No DOS (02) Y SOLICITUD DE ENTREGA MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES MES DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22521
02-	AU-INTERV-SGA-4233000-	REMISIÓN PODER EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUA,	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
sep.-19	730-2019-OF-073	ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	URBANA LTDA	SEDES 04	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22428
02-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-074	REMISIÓN BALANCE No 2, MEMORIAS DE CALCULO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22299
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-075	ENTREGA BALANCE No 2, SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-076	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22519
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-077	RESPUESTA OFICIO PS04-060-19 - INCUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23476
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-078	RESPUESTA OFICIO PS04-069-19 - PLAN DE COMPRA DE EQUIPOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23018
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-079	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO PARA EL FRENTE DE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN (CMPR)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22520
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-080	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: "(...) REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.(...)"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22701
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-081	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-20190 DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 Y OFICIO No 2-2019-22293 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23021
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-082	INFORME SEMANAL No NUEVE (9) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-21752
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-083	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A CORTE DEL 31 DE JULIO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22731
04-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-084	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE JULIO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22732
05-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-085	ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE EL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-21755-DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 Y EL RADICADO No 1-2019-21921 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019 DEL 2019 "ASUNTO RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN E MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DE CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETOS ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22780

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-086	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-058-19 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 REITERACIÓN CAMBIO PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISOMA)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23476
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-088	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23914
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-089	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No 2	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 22837
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-090	BALANCE DE OBRA No 1 A CORTE DEL 27 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22911
09-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-091	RESPUESTA A OBSERVACIONES PLANES PRE OPERACIONALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-22910
10-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-092	RESPUESTA A OFICIOS PS04-068-19 Y PS04-074-19 PROCESO CONSTRUCTIVO EXCAVACIÓN MECÁNICA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23019
11-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-093	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23394
11-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-094	RESPUESTA OFICIO PS-04-079-19- INCUMPLIMIENTO IMPRENTA PLAN DE CONTINGENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23391
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-095	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24692
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-096	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DEL PROCESO REALIZADO AL SELLO DE FISURAS VIGA ZAPATA 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23392
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-097	IMPRENTA DISTRITAL - TRASLADO PODER PARA TRAMITES EN-EL CODENSA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23390
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-098	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-088-19 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ASUNTO: HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO Y RESIDENTE SISOMA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019- 23475
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-099	DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 1 CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24693
13-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-100	INFORME SEMANAL DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-237474
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-101	ALCANCE A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OFI01 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-23669
16-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-102	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23670

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-103	RESPUESTA A OFICIO PS04-078-19 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON RELACIÓN A LA NO PERTINENCIA DE PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24000
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-104	DEVOLUCIÓN FACTURA DE VENTA No 1 CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-24001
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-105	SOLICITUD Y PUESTA EN MARCHA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-23913
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-106	REQUERIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-23915
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-107	INFORME SEMANAL DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-23997
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-108	RESPUESTA OFICIO PS04-090-19 REITERACIÓN DE SOLICITUD SOPORTES Y PLAN DE COMPRAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24076
18-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-108-A	OBSERVACIONES A INFORME ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y RESULTADOS A COMPRESIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO NUMERO 1-2019-23999
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-109	RESPUESTA SOBRE APROBACIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PERIMETRAL AL AUDITORIO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24134
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-110	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24574
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-111	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24573
20-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-112	DIRECTRICES DE APROBACIÓN DE PERSONAL POR MEDIO DE FORMATOS DE INGRESO - FORMATO DE INGRESO DE MATERIALES REQUERIMIENTOS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24002
23-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-113	RESPUESTA AL OFICIO PS04-096-19 RADICADO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2019 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24078
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-114	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS PORINCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOSFIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS EINTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DELA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25222
23-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-115	TRAZABILIDAD IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24079
24-	AU-INTERV-SGA-4233000-	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-097-19 DEL 18 DE	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
sep.-19	730-2019-OF-116	SEPTIEMBRE DE 2019 ASUNTO: HOJAS DE VIDA RESIDENTE MANZANA LIÉVANO Y RESIDENTE SISOMA	URBANA LTDA	SEDES 04	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24133
24-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-117	TRASLADO HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24135
27-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-118	SOLICITUD DE REPARACIONES Y/O REEMPLAZO Y/O ADECUACIONES DE AFECTACIONES FÍSICAS A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24570
28-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-119	RESPUESTA RADICADO PS04-123-19 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ASUNTO HORARIO GOBIERNO DÍAS SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24697
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-120	REQUERIMIENTO DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIO EN ÁREAS EXTERIORES - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24823
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-121	OBSERVACIONES AL BALANCE - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25219
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-122	RESPUESTA AL OFICIO PS04-119-19 RADICADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 2 Y ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24694
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-123	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIDAS AMBIENTALES SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24695
30-sep.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-124	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 CORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24690
01-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-125	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24822
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-126	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-24165 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EL OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-24599 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019 – 24623 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LA OFICINA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-25374 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26106
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-127	INFORME EJECUTIVO RIESGOS ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25218
02-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-128	PROGRAMACIÓN SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-24896
02-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-129	REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-24897
04-	AU-INTERV-SGA-4233000-	REMISIÓN SOPORTES DE CANTIDADES BALANCE UNO (1) -	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
oct.-19	730-2019-OF-130	SEDE MANZANA LIÉVANO	URBANA LTDA	SEDES 04	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25215
03-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-131	INFORME SEMANAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25070
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-132	RESPUESTA DE CONSULTORÍA P&D FRENTE A PREGUNTAS ACERCA DEL EQUIPO CONTRAINCENDIOS DE AGUA NEBULIZADA Y RESPUESTA DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25210
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-133	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 1 A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25214
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-134	TRASLADO DE INFORME EJECUTIVO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25217
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-135	APROBACIÓN Y TRASLADO DEL INFORME EJECUTIVO DE RIESGOS Y PELIGROS ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25216
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-136	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No 1 A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25213
04-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-137	TRASLADO DEL INFORME DE OBRA A CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-25211
07-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-138	ACTUALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-25346
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-139	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26111
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-140	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA SIETE (7) A LA ONCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26110
10-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-141	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No TRES (3) A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RADICADO MEDIANTE OFICIO No PS04-142-19 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26120
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-142	TRASLADO HOJA DE VIDA RESIDENTE SISOMA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26109
09-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-143	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AL COMPROMISO PACTADO SEGÚN ACTA DE REUNIÓN No. 70 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - TERMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE ESPEJOS DE AGUA COSTADO NORTE (07 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26116

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-144	SOLICITUD DE RADICACIÓN DE OFICIOS DE SOLICITUD RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRAFICO DE LAS SEDES CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN, IMPRENTA DISTRITAL Y MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26118
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-145	SOLICITUD DE EXTINTORES PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVO Y BODEGA - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26119
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-146	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CANTERA LA ROCA PARA MATERIAL PÉTREO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26113
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-147	TRASLADO DE COTIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA EPU 05 DE LA FIRMA HIDRINCO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26214
15-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-148	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FINALIZACIÓN DE CAJAS EN EXTERIORES IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26112
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-149	RESPUESTA RADICADO No. 2-2019-29758 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019, ASUNTO: COMUNICACIÓN RADICADO No. 1-2019-27884 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28551
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-150	PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD INSPECCIONES Y ENSAYOS - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26771
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-151	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO EN PROTECCIÓN DE LOS MOBILIARIOS, PISOS Y ZONAS DE INTERVENCIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL EDIFICIO BICENTENARIO 2 SECRETARIA DE GOBIERNO - SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26115
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-152	TRASLADO DE SOLICITUD ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ RADICADO No 2-2019-27546 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019, RADICADO A LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 11 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26114
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-153	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27685 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE OBRA DE OBRA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25213, DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26125
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-154	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO POR ATRASO DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, SEGÚN RECORRIDO DE OBRA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA ELÉCTRICA, APOYO A LA SUPERVISIÓN, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA EN EL CUAL SE CLARIFICARON LA TOTALIDAD DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES A EJECUTAR EN ESTE COMPONENTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26411
16-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-155	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27684 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: DEVOLUCIÓN CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 1 CON CORTE DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CON RAD No 1-2019-25214, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26121
17-	AU-INTERV-SGA-4233000-	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26328

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
oct.-19	730-2019-OF-156	CONTRACTUALES	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
17-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-157	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26412
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-158	ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-25222 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019 RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26340
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-159	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-142-19 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019 REVISIÓN SOPORTES DE CANTIDADES DE ACTA PARCIAL DE COBRO DOS (2) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26410
18-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-160	INFORME SEMANAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26327
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-161	SEGUIMIENTO COMPROMISOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ INTEGRAL No. 14 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26415
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-162	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DEL TERCER BAÑO PORTÁTIL, SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26413
21-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-163	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26414
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-164	REPARACIÓN DAÑOS EN AUDITORIO, SÓTANO 2 Y ESCALERAS DE ACCESO DEL MONOLITO A SÓTANO 2.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26767
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-165	AUSENCIA DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EN EL AUDITORIO CON IGOL DENSO PLUS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26769
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-165-A	MEMORANDO POR LA PROTECCIÓN DE MAQUINAS ZONA DEPRODUCCIÓN – IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26770
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-166	APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26766
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-167	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-27546 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS DEL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26772

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 CON Rad. No. 1-2019-24897		D.C.	
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-168	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 2	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26762
22-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-169	SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA PARA LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y DE ENTIBADO METÁLICO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26765
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-170	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2019-28022I DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF131 OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26952
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-171	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2019-28021 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF125 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27405
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-172	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. 3 A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-26763
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-173	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-26764
24-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-174	TRASLADO DE LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA RADICADA A INTERVENTORÍA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019, MEDIANTE OFICIO No PS04-171-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27054
23-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-175	RESPUESTA A OFICIO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 PS04-172-19 EN RESPUESTA A OFICIO DE LA INTERVENTORÍA AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-165 EN DONDE HACE REFERENCIA A AUSENCIA DE PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EN EL AUDITORIO CON IGOL DENSO PLUS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27160
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-176	SOLICITUD DISPOSICIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD SEDES MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN E IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28543
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-177	ASUNTO: RESPUESTA AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019 SOBRE EL RADICADO No 2-2019-26327 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: INFORME SEMANAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27406
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-178	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, SEDES IMPRENTA DISTRITAL Y MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27884
01-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-179	RESPUESTA OFICIO No PS04-184-19 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-151	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27885
01-	AU-INTERV-SGA-4233000-	RESPUESTA OFICIO No PS04-180-19 DEL 28 DE OCTUBRE	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
nov.-19	730-2019-OF-180	DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-163	URBANA LTDA	SEDES 04	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27887
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-181	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27402
29-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-182	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-27403
01-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-183	RESPUESTA OFICIO No PS04-181-19 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019, ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-161	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27888
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-184	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CONTRATO POR RETRACCIÓN DEL FRAGUADO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-27889
30-oct.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-185	IMPRENTA SOLICITUD CORRECCIÓN PRUEBA TRACCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28860
05-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-186	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 3 CORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28009
05-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-187	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 2 A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28010
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-188	RESPUESTA AL INFORME FINAL DE INCUMPLIMIENTO FRENTE A LOS DESCARGOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28864
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-189	INFORME SEMANAL DEL 07 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28552
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-190	INFORME SEMANAL DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28553
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-191	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA DOCE (12) A LA DIECISÉIS (16)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28540
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-192	SEGUIMIENTO A RENDIMIENTOS Y ÁREAS A INTERVENIR Y SOLICITUD DE AUMENTO DE CUADRILLAS PARA LAS TERMINACIÓN DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28550
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-193	SOLICITUD DE AUMENTO DE PERSONAL Y PLAN DE CONTINGENCIA SEDE CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-29082
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-194	PROBLEMÁTICA SOBRE FILTRACIONES AL INTERIOR DEL AUDITORIO Y ESCALERAS QUE CONDUCEN DEL MONOLITO A SÓTANO 2 SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-29083

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-195	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-193-19 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA OBRAS SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28547
19-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-196	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-29428
26-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-197	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 3	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29944
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-198	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CONCRETO POR RETRACCIÓN DE FRAGUADO - RESPUESTA A OFICIO PS04-2018-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28545
12-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-199	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - SUMINISTRO DE TAPAS PARA CAJAS ELÉCTRICAS EXTERIORES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28549
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-200	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-217-19 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 ASUNTO: ENVIÓ HOJA DE VIDA RESIDENTE ADMINISTRATIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-29079
14-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-201	IMPRENTA DISTRITAL - SOLICITUD DE SUSPENDER LABORES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-28861
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-202	REMISIÓN BALANCE N o DOS (2) CON CORTE AL QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMACIÓN, CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE CAJA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28698
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-203	REMISIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28686
13-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-204	INFORME SEMANAL DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-28688
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-205	APROBACIÓN Y TRASLADO DE PROGRAMACIÓN SEDES MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29076
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-206	COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN No. NOVENTA Y OCHO (98) DEL QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2019 PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-29077
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-207	CAMBIO DEL CABLEADO ACTUAL DE CENTRO MEMORIA, A CAMBIO DE CABLEADO LIBRE DE HALÓGENO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29085
18-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-208	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29086
20-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-209	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	CON RADICADO NUMERO 1-2019-29427

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
28-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-210	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL No TRES (3) A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30045
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-211	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000- 731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30361
29-nov.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-212	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30362
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-213	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 4	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30360
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-214	INFORME SEMANAL DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30358
02-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-215	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30359
03-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-216	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 3 A CORTE DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30435
03-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-217	INFORME SEMANAL DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30740
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-218	SOLICITUD HOJA DE VIDA NUEVO RESIDENTE DE OBRA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-30933
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-219	RETIRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RED CONTRA INCENDIOS BOMBA JOCKEY Y LOS TABLEROS DE LAS BOMBAS EXISTENTES EN MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-30931
04-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-220	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE REUNIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-30741
05-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-221	INFORME SEMANAL DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30739
06-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-222	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No CUATRO (4) CORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2019-30934

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	
09-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-223	ALCANCE A SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, SEGÚN RADICADO No 1-2019-30361 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31209
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-224	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2019-32572 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CON ASUNTO: SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-211 RADICADO No 1-2019-30361	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31692
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-225	IMPRENTA - RESPUESTA A TRASLADO DE OFICIO DE P&D DIRIGIDO AL DOCTOR FRANCISCO SOLER BEJARANO EL CUAL FUE TRASLADADO A LA INTERVENTORÍA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RATIFICADO EN EL COMITÉ DE OBRA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-31693
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-226	APREMIO INCUMPLIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-31538
11-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-227	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-31537
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-228	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5 CORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32174
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-229	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32128
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-230	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 4 A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32119
10-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-230-A	IMPRENTA - TRASLADO DE ULTIMA VERSIÓN DE PLANOS DE LA CONSULTORÍA P&D SAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	-
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-231	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32127
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-232	TRASLADO DE SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32365
16-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-233	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32370

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
18-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-234	ALCANCE OFICIO CON NUMERO DE RADICADO 1-2019-32128 CON ASUNTO "TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32314
18-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-235	REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32366
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-236	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-277-19 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 ASUNTO: APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIONES DE LA INTERVENTORÍA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-542
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-237	INFORME SEMANAL DEL 02 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32820
18-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-238	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 21 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIONES DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-32369
20-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-239	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32713
19-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-240	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32714
20-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-241	ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO NUMERO 1-2019-31209 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 ASUNTO ALCANCE A SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO No. 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32712
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-242	REMISIÓN INFORME TRAZABILIDAD DE LA CONSULTORÍA P&D S.A.S – SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-1942
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-243	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA DIECISIETE (17) A LA VEINTIUNO (21)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-32819
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-244	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32826
23-	AU-INTERV-SGA-4233000-	ALCANCE AL OFICIO No 1-2019-32370 DEL 18 DE	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32817

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
dic.-19	730-2019-OF-245	DICIEMBRE DE 2019 CON ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-246	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32821
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-247	INFORME SEMANAL DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32829
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-248	TRASLADO DE LA FACTURA No 852 DE LA CUENTA No 5 DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-32813
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-249	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA FIRMA DEL MODIFICATORIO No 1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-32833
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-250	RECIBO SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-32838
23-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-251	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-33036
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-252	RESPUESTA A OFICIO PS04-187-19 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO ASUNTO RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-226, REITERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-550
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-253	OTORGAMIENTO DE PODER	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33475
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-254	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33165
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-255	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2019-33163
26-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-256	SOLICITUD ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS FIRMADAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33167
27-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-257	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE MANZANA LIÉVANO - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONTRA INCENDIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33177
27-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-258	SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA PARA LA RED CONTRA INCENDIO SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2019-33178
30-dic.-19	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-259	ESTADO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-73

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		PRUNI SEDES 04		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-260	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101299321 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-548
07-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-261	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-547
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-262	INFORME SEMANAL DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-546
08-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-263	INFORME SEMANAL DEL 23 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-798
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-264	RESPUESTA AL OFICIO No 2-202-71 DEL 3 DE ENERO DE 2019 ASUNTO: TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 0	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-988
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-265	RESPUESTA A OFICIO PS04-285-19 DEL 09 DE ENERO DE 2020 CON ASUNTO RESPUESTA AL OFICIO 2-2020-71 TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 0	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-989
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-266	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-524 DEL 09 DE ENERO DE 2020 OBSERVACIONES SOBRE SIGA - RADICACIÓN No 1-2020-546 INFORME SEMANAL DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019 No 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-985
09-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-267	REMISIÓN FLUJO DE CAJA SEGÚN PRORROGA Y ADICIÓN No 1 FIRMADA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA POR CADA UNA DE LAS SEDES Y LA PROGRAMACIÓN GENERAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-984
10-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-268	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-986
28-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-269	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3204
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-270	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-294-19 DEL 13 DE ENERO DE 2020 - LUMINARIAS ESPEJOS DE AGUA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1442
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-270-A	SOLICITUD REITERADA DE LA ENTREGA DEL BALANCE FINAL DE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1440
14-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-271	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN ACTA DE COMITÉ No 24 DEL 09 DE ENERO DE 2020 - ENTREGA DEL AUDITORIO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1443
19-	AU-INTERV-SGA-4233000-	SOLICITUD DE ACLARACIÓN OFICIAL CONCEPTO TÉCNICO	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2178

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
ene.-20	730-2019-OF-272	P&D	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-273	IMPRENTA - SOLICITUD ROTURA DE TESTIGO DE CILINDROS DE CONCRETO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2182
17-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-274	RESPUESTA OFICIO No. PS04-291-19 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, COMO ASUNTO RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-252	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1944
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-275	RESPUESTA OFICIO No. PS04-0300-19, CON ASUNTO RESPUESTA A CORREO INTERVENTORÍA CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE - DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1949
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-276	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-1948
19-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-277	AUSENCIA DE PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ESCARIFICACIÓN, RETIRO DE PAÑETES Y COLOCACIÓN DE HIERROS EN CUARTO DE INSUMOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2183
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-278	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3199
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-279	TRASLADO DEL INFORME EJECUTIVO DE SOCIALIZACIONES Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REALIZADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-1946
20-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-280	DEVOLUCIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECIBIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2176
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-281	RECOMENDACIÓN APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C." - SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2185
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-282	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL PERIODO DICIEMBRE DEL 2019 - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2180
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-283	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-537 DEL 09 DE ENERO DE 2020 ASUNTO DEVOLUCIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO No. 4233000-730-2019 - RADICACIÓN No 1-2019-33165	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2181
21-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-284	ENTREGA DEL DISCO DURO 4T PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2177
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-285	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No 6 DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 - REITERACIÓN DE OBSERVACIONES AMBIENTALES, SE SEGURIDAD Y SALUD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2501

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		EN EL TRABAJO Y TÉCNICOS			
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-286	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-296-19 DEL 15 DE ENERO DE 2020 Y SOCIALIZADO EN EL COMITÉ No 25 DEL 16 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2502
22-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-287	ALCANCE AL OFICIO No 1-2020-988 DEL 10 DE ENERO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-71 DEL 03 DE ENERO DEL 2020 ASUNTO: TRASLADO RADICACIÓN No 1-2019-33539 - DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CPC, SOLICITUD DE PAGO DE CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2505
23-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-288	INFORME SEMANAL DEL 06 DE ENERO AL 12 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2499
23-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-289	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No SEIS (6) CORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2497
24-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-290	INFORME SEMANAL DEL 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-2738
25-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-291	APREMIO INCUMPLIMIENTO MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3206
27-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-292	DEVOLUCIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 21-44-101299321 CONTRATO DE OBRA NO. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3205
27-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-293	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA VEINTIDÓS (22) A LA VEINTICINCO (25)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-2737
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-294	ALCANCE AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-289 DEL 23 DE ENERO DE 2019, CON RADICADO 1-2020-2797 - ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3201
29-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-295	INFORME SEMANAL DEL 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3207
30-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-296	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF261 CON RADICADO No 1-2020-547 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. 5	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3460
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-297	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-329-19 DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2020 Y OFICIO No PS04-344-19 DEL 102 DE FEBRERO DE 2020 - ASUNTO SOLICITUD DE PRORROGA CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-5957
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-298	RESPUESTA A SU OFICIO CON RADICADO No 2-2020-781 DEL 13 DE ENERO DE 2020 ASUNTO. DEVOLUCIÓN SIGA - RADICACIÓN No 1-2020-548 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101299321 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3466

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-299	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019 REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3461
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-300	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3464
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-301	SOLICITUD DE PAZ Y SALVO OLMO INGENIERÍA SAS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3738
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-302	DEVOLUCIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEDE MANZANA LIÉVANO REMITIDO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 MEDIANTE OFICIO PS04-324-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3743
06-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-303	EMPLAZAMIENTO URGENTE ENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN - ACTIVIDADES EXCAVACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-4193
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-304	SOLICITUD DE INFORME DE CALIDAD E INSTALACIÓN CON INVENTARIO POR ESPACIOS PARA EL ÍTEM 2. COMPONENTE ELÉCTRICO - SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3741
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-305	RESPUESTA OFICIO No. PS04-0317-19 APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3739
03-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-306	RESPUESTA OFICIO No PS04-0300-19, CON ASUNTO RESPUESTA AL CORREO INTERVENTORÍA CON FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE - DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-3742
04-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-307	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3980
04-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-308	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-3981
07-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-309	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL A CORTE DEL 30 DE ENERO DE 2020 CON RADICADO No PS04-330-19 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-4808
31-ene.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-310	ENTREGA DE LOS ROCIADORES DE REPUESTO DE LA RED CONTRA INCENDIO DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-4791
14-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-311	INFORME SEMANAL No TREINTA Y TRES (33) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE FEBRERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-5090
18-	AU-INTERV-SGA-4233000-	DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEL AUDITORIO CENTRO	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-5090

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
feb.-20	730-2019-OF-312	MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-313	TRASLADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS RECOMENDADOS POR INTERVENTORÍA EN RESPUESTA A LOS OFICIOS No PS04-336-19, PS04-332-19, PS04-340-19, PS04-322-19 Y PS04-319-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-5961
18-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-314	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - PROTUBERANCIA EN CONCRETO ENCONTRADAS EN LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-5956
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-315	BALANCE DE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN A FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6607
19-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-316	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-355-19 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 - HOJA DE VIDA RESIDENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-6299
19-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-317	SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO A LA ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RADICADA EL 31 DE ENERO DE 2020 MEDIANTE OFICIO No 1-2020-3464 Y RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-3082 DEL 07 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6300
21-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-318	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6301
24-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-319	REMISIÓN COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-6410
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-320	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-350-19 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020, No PS04-346-19 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020, No PS04-353-19 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-6605
25-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-321	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE RETIE DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6606
26-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-322	INFORME SEMANAL No TREINTA Y CUATRO (34) DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6608
27-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-323	ALCANCE TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 CON RADICADO No 1-2020-3980 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6885
28-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-324	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No 6 Y No 7	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-6965
28-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-325	INFORME SEMANAL DEL 17 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7061
28-feb.-	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-326	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No SIETE (7) A CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2020 - INFORME TÉCNICO,	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7087

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
20		DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
29-feb.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-327	RESPUESTA A LA REVISIÓN DE LA PLACA PARA TANQUES DE EQUIPO EPU POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-328	DEVOLUCIÓN INFORME FINAL HIDROSANITARIO SEDE MANZANA LIÉVANO ENVIADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7749
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-329	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 390-47-994000048873 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4233000-730-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7227
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-330	RESPUESTA HOJA DE VIDA RESIDENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7590
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-331	REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7226
02-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-332	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA VEINTISÉIS (26) A LA TREINTA (30)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7589
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-333	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A CORTE DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL 2020 - INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7438
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-333-A	RESPUESTA OFICIO PS04-0341-19 RESPUESTA OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7586
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-334	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA A CORTE DEL 30 DE ENERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7437
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-335	TERCERA SOLICITUD DEL BALANCE FINAL SEDE MANZANA LIÉVANO CON SOPORTES DE CANTIDADES DE OBRA Y DEBIDAMENTE FIRMADO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7583
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-336	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DONDE NO EXISTE ACUERDO ENTRE LAS PARTES CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7585
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-337	CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 7 A CORTE DEL 31 DE ENERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7439
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-338	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-371-19 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7746
03-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-339	OBSERVACIONES AL INFORME ELÉCTRICO FINAL DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7735
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-340	RESPUESTA AL INFORME DEL ESTADO DE LA MEMBRANA EN EL TANQUE DE AGUA PARA EQUIPO TIPO BOMBA LAPICERO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8305

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	
11-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-341	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL TRAMITE DE CODENSA SEDE IMPRENTA DISTRITAL Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA ALCALDÍA DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ PARA DAR CELERIDAD AL PROCESO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8706
11-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-342	SOLICITUD DE ENTREGA DE ÁREAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C- OBSERVACIONES POR CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8708
10-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-343	SOLICITUD DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8308
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-344	ENTREGA DE BALANCE No DOS (2) SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8709
13-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-345	TRASLADO ENTREGA DE ACTA DE INVENTARIO DE EQUIPO MOTOBOMBA IHM Cod. 88238 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8700
06-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-346	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6) Y No SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 06-03-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
04-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-347	INFORME DE LAS REPARACIONES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-7748
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-348	SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7737
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-349	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7740
05-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-350	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101137341 CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 SEGÚN DECRETO No 1082 DE 2015	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7743
06-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-351	ALCANCE A LA SOLITUD DE PRORROGA PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-7923
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-352	TRASLADO SOPORTES DE PAGO, TRANSACCIONES Y PAZ Y SALVO DEL PROVEEDOR OLMO INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8813
12-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-353	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ACTAS DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6) Y No SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8707
12-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-354	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS SIN ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 E INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8701
12-	AU-INTERV-SGA-4233000-	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL BALANCE	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8704

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
mar.-20	730-2019-OF-355	REMITIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 E INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
13-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-356	INFORME SEMANAL DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8702
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-357	DEVOLUCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-8748
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-358	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS NÚMERO SIETE (7)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8750
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-359	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8749
16-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-360	DEVOLUCIÓN DEL INFORME MENSUAL No 8. DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020 - REITERACIÓN OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-8979
18-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-361	PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y TOMA DE ENSAYOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	G&S LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	RADICADO ING. CAROLINA RUIZ
19-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-362	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-88-19 - DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 19-03-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
24-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-363	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
19-mar.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-364	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS NÚMERO SEIS (6)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-9200
07-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-365	RESPUESTA OFICIO No. PS04-408-20 SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
08-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-366	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
24-mar.-	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-367	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO*

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
20				MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
13-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-368	SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
13-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-369	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-370	LIBRE	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
16-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-371	RESPUESTA OFICIO No. PS04-410-20 SOLICITUD DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
27-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-372	NOTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTINUIDAD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
27-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-373	SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
29-abr.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-374	OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
04-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-375	OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 - SEGUNDA REVISIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
07-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-376	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID 19 - VALIDACIÓN DOCUMENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
07-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-377	REMISIONES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019) Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
11-may.-	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-378	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-413-20 DEL 7 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINA DE LA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
20		INTERVENTORÍA EL 11 DE MAYO DE 2020			RADICADO NUMERO 1-2020-12865
11-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-379	SOLICITUD DE REINICIO DE LAS OBRAS PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL - EN RESPUESTA AL OFICIO RADICADO A LA INTERVENTORÍA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2020 DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 Y SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	*ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO arquitecturaurbana277@hotmail.com DURANTE AISLAMIENTO OBLIGATORIO*
11-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-379-A	INFORME SEMANAL DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12866
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-380	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12862
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-381	SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12863
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-382	TRASLADO DEL INFORME TECNICO DE OBRA A CORTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12868
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-383	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No OCHO (8) CORTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12867
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-384	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA TREINTA Y UNO (31) A LA TREINTA Y CINCO (35)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 10-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15369
14-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-385	REMISIONES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 (CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	CON RADICADO NUMERO SDM 71272
13-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-386	TRASLADO DE ELEMENTOS CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-12861
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-387	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN LA FIRMA DEL MODIFICATORIO CONTRACTUAL DE ADICIÓN No 2 Y PRORROGA No 2 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL 29 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 12-06-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
14-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-388	ALCANCE A RADICADO No 1-2020-12863 DEL 14 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO coordinadoraproyectosau@gmail.com
15-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-389	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-406-20 DEL 30 DE MARZO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINA DE LA INTERVENTORÍA EL 12 DE MAYO DE 2020 - ASUNTO: ACTA PARCIAL No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 19-05-2020 SIN COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
18-	AU-INTERV-SGA-4233000-	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE	ARQUITECTURA	SECRETARIA	ENVIADO MEDIANTE CORREO

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
may.-20	730-2019-OF-390	OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13177
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-391	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13176
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-392	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 - FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE contrato730.au@gmail.com
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-393	OBSERVACIONES A LOS FLUJOS DE CAJA PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019 MEDIANTE OFICIO No PS04-419-19 DEL 16 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE INTERVENTORÍA EL 18 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 19-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13335
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-394	INFORME SEMANAL DEL 16 DE MARZO AL 22 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13178
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-395	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS No OCHO (8)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13984
18-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-396	ALCANCE AL RADICADO No 1-2020-12863 DEL 14 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13240
19-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-397	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID/19 - FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE contrato730.au@gmail.com
20-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-398	REMPLAZO DE CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13430
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-399	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – COVID/19 – FRENTE DE OBRA CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A CONSORCIO PRUNI SEDES 04 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13570
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-400	ALCANCE AL OFICIO No 392 RADICADO No 1-202013335 DEL 18 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: REVISIÓN Y VERIFICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 FRENTE DE OBRA IMPRENTA DISTRITAL SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13542
21-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-401	ALCANCE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF395 DEL 18 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ACTA DE PACTACION DE PRECIOS No 8	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13572
21-	AU-INTERV-SGA-4233000-	ALCANCE AL OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-	ARQUITECTURA	SECRETARIA	ENVIADO MEDIANTE CORREO

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
may.-20	730-2019-OF-402	2019-OF397 DEL 19 DE MAYO DEL 2020, RADICADO VENTANILLA VIRTUAL No. 1-2020-13335 Y AL OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-OF400 DEL 21 DE MAYO DEL 2020 RADICADO VENTANILLA VIRTUAL No. 1-2020-13452.	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13591
22-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-403	RESPUESTA OFICIO RADICADO No 2-2020-13655 DEL 22 DE MAYO DE 2020 – RESIDENTE ADMINISTRATIVO Y RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13688
22-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-404	INFORME SEMANAL DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-13712
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-405	SOLICITUD DE ACLARACIÓN FRENTE AL PROFESIONAL TANIA ERIKA ROMERO LEAL - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14244
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-406	SOLICITUD DE DOCUMENTOS CIERRE DE OBRA FRENTE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14245
27-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-407	SOLICITUD DE INFORME DE REPARACIONES SEDE MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 28-05-2020 COPIA ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14246
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-408	SOLICITUD NÚMEROS DE RADICADO ENVIADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A VENTANILLAELECTRONICA@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15695
28-may.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-409	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-430-20 DEL 27 DE MAYO DE 2020 Y RADICADO EL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: CAMBIO RESIDENTE SSTA EN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 29-05-2020 COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-410	RESPUESTA OFICIO No. PS04-452-19 DEL 9 DE JUNIO DE 2020 – OBSERVACIONES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 12-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15592
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-411	DEVOLUCIÓN DE INFORME MENSUAL No. 9 DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2020 – OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TECNICO Y DE CALIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-14632
01-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-412	INFORME SEMANAL DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14401
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-413	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-432-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO 418-2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO, Y SE PRESENTARON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL INVIAS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-14631
02-	AU-INTERV-SGA-4233000-	TRASLADO DE LA RESPUESTA AL OFICIO No PS04-432-20	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-14630

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
jun.-20	730-2019-OF-414	DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO 418-2019, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITO LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO, Y SE PRESENTARON LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL INVIAS.	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-415	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-434-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: SOLICITUD REORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-14634
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-416	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No OCHO (8) A CORTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-14635
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-417	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No OCHO (8)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-14629
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-418	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-435-20 DEL 28 DE MAYO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO AU-INTERV-SGA-42333000-730-2019-OF407 REPARACIONES MANZANA LIÉVANO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 03-06-2020 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-14633
02-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-419	REPORTE DE PERSONAL CASO SOSPECHOSO COVID -19 OBRA IMPRENTA DISTRITAL DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14622
03-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-420	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4233000-730-2019 POR PRESUNTO CONTAGIO DE COVID 19.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14709
04-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-421	RECOMENDACIÓN DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A LA RESPUESTA DEL OFICIO No PS04-445-20 DEL 3 DE JUNIO DE 2020 ASUNTO: CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y SUS COSTOS OFICIO INTERV-SGA-4233000-731-2019-OF420	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-14913
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-422	OBSERVACIONES A LAS MEMORIAS DE CALCULO DEL BALANCE, PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15103
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-423	OBSERVACIONES AL MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PLANOS RECORD ELÉCTRICOS PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15372
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-424	RESPUESTA AL CORREO ENVIADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: INFORME Y SOLICITUD DE RECORRIDO EN CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15373
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-425	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID -19 APROBADOS MEDIANTE OFICIO NO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF376 DEL 8 DE MAYO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO No 1-2020-15089
05-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-426	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 04 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-421		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-15102
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-427	ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA CONEXIÓN DESDE CUARTO DE TRANSFERENCIA A CUARTO DE BOMBAS (BCI) Y ACTIVIDADES SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO COPIA A CONSORCIO PRUNI SEDES 04 2020-06-19 ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-15370
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-428	RESPUESTA AL OFICIO PS04-456-20 DEL 10 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F430	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15593
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-429	INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15371
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-430	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL POSIBLE CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO COVID-19, PROFESIONAL FERNANDO AGUIRRE MEDINA DE LA ORGANIZACIÓN ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-15345
09-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-430-A	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-449-20 DEL 9 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F425 EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS MEDIANTE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F376	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15410
10-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-431	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-448-20 DEL 8 DE JUNIO DEL 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL 9 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO SOLICITUD DEL CONTRATISTA FRENTE 1) COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19 ES LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-15462
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-432	RESPUESTA AL OFICIO PS04-455-20 DEL 10 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO RESPUESTA AL AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F429 INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS COVID-19	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15594
11-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-433	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL No. DIEZ (10) Y ACTA PARCIAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15595
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-434	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No NUEVE (9) A CORTE DEL 24 DE MARZO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15899
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-435	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No NUEVE (9) CORTE DEL 01 AL 24 DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15693
12-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-436	INFORME SEMANAL DEL 01 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	CON RADICADO NUMERO 1-2020-15694

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	
13-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-437	APREMIO POR INCUMPLIMIENTO AUSENCIA DE PERSONAL FRENTE A LA REACTIVACIÓN DE LAS OBRAS FRENTE IMPRENTA DISTRITAL PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15773
16-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-438	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-458-20 DEL 12 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO CONCEPTO A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 431 Y REITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO PS04-448-20 SOBRE : 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-15955
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-439	RESPUESTA A LOS OFICIOS No PS04-396-19 DEL 16 DE MARZO DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN – RESPUESTA AL OFICIO No PS04-397-19 DEL 16 DE MARZO DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ APU NO PREVISTOS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN – RESPUESTA OFICIO No PS04-438-20 DEL 29 DE MAYO DE 2020 CON ASUNTO: ENTREGA BALANCE FINAL Y SOLICITUD DE ADICIÓN CMPR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16425 Y RADICADO FÍSICO 1-2020-16651
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-440	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-447-20 DEL 9 DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ ACTA PARCIAL E INFORME MENSUAL 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2020, SUBSANADO SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS EN OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF411	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16609
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-441	INFORME SEMANAL DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-16223
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-442	RESPUESTA AL OFICIO PS04-464-20 DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ACTUALIZADO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16269
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-443	REMISIÓN DE RESULTADOS PRUEBA SARS-COV-2 (COVID-19), FERNANDO AGUIRRE MEDINA TRABAJADOR INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA., CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO COPIA A CONSORCIO PRUNI SEDES 04 2020-06-19 ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-16274
18-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-444	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO FEBRERO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-16429
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-445	SOLICITUD DE EMBALAJE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16470
23-	AU-INTERV-SGA-4233000-	SOLICITUD DE AUMENTO DE CUADRILLAS PARA LA SEDE	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	RADICADO 2020-06-24 CON COPIA A

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
jun.-20	730-2019-OF-446	IMPRENTA DISTRITAL	URBANA LTDA	SEDES 04	LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16701
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-447	DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DE MAYO DE 2020 - CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-06-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-16427
19-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-448	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DIEZ (10) A CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16400
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-449	RESPUESTA AL OFICIO ALLEGADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 17 DE JUNIO DE 2020 – DEVOLUCIÓN DEL ACTA OCHO (8) DEL CONSORCIO PRUNI SEDES 04 Y ARQUITECTURA URBANA LTDA, ACTA RADICADA MEDIANTE OFICIOS No SIGA No 1-2020-14635 Y SIGA No 1-2020-14629 DEL 2 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16650
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-450	RESPUESTA AL OFICIO ALLEGADO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 17 DE JUNIO DE 2020 – SOLICITUD DEL INFORME FINAL Y EL ACTA DE CIERRE DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16652
23-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-451	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No DIEZ (10) A CORTE DEL ONCE (11) AL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16653
24-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-452	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No NUEVE (9)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-16693
26-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-453	INFORME SEMANAL DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-17045
27-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-454	REPORTE PERSONAL EXTERNO ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-17095
27-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-455	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-01 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-17098
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-456	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-444 RADICADO No. 1-2020-16429 – DEVOLUCIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE FEBRERO DEL 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No1-2020-17208
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-457	TRASLADO DE LA CUENTA No 9 DE OBRA A CORTE DE MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17374
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-458	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17381

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-459	TRASLADO DE LA CUENTA No 10 DE OBRA A CORTE DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17375
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-460	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17380
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-461	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No NUEVE (9) - PERIODO MARZO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17377
30-jun.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-462	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No DIEZ (10) - PERIODO MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-17378
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-463	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-472-20 DEL 1 DE JULIO DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 446 AUMENTO DE CUADRILLAS EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-18123
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-464	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-468-20 DEL 26 DE JUNIO DEL 2020 DEL ASUNTO CONCEPTO A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF431 Y REITERACIÓN DE NUESTRAS SOLICITUDES SEGÚN OFICIO No PS04-448-20 SOBRE: 1) PAGO DE LOS COSTOS DE LA ACTUAL SUSPENSIÓN DE HECHO DEL CONTRATO, 2) TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN, ANTE LA INVIABILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LA REFERENCIA SI EL TRATAMIENTO DE FUTUROS CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 ES LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-18124
01-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-465	INFORME SEMANAL DEL 22 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-17388
06-jul.-20	6AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-466	RESPUESTA AL OFICIO PS04-471-20 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF455 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL – OFICIO S04-474-2020 ASUNTO ALCANCE AL OFICIO PS04-471-20 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DIRECTOR DE OBRA EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-18126
06-jul.-20	6AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-467	RESPUESTA AL OFICIO PS04-469-20 ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF445 SOLICITUD DE EMBALAJES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-18127
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-468	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No ONCE (11) A CORTE DE JUNIO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-18005
06-	AU-INTERV-SGA-4233000-	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No ONCE (11)	ARQUITECTURA	SECRETARIA	CON RADICADO NUMERO 1-2020-18010

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
jul.-20	730-2019-OF-469	A CORTE DE JUNIO DE 2020	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
06-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-470	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No ONCE (11) - PERIODO JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-18689
09-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-471	SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO SEGÚN CANTIDADES DE OBRA CONTEXTUALIZADAS A LA FECHA – SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-18290
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-472	RESPUESTA OFICIO No PS04-481-20 DEL 9 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS - SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19412
14-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-473	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-479-20 DEL 8 DE JULIO DE 2020 Y No PS04-482-20 DEL 9 DE JULIO DE 2020 ASUNTO: ALCANCE AL OFICIO No PS04-479-20 ENVIÓ MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF423	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO1-2020-18984
09-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-474	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-18291
14-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-475	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No ONCE (11) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-18838 RADICADO FÍSICO 1-2020-37429
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-476	INFORME SEMANAL DEL 06 DE JULIO AL 12 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-18931
15-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-477	RESPUESTA AL OFICIO DEL SIETE DE JULIO DE 2020 RADICADO EN LA OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-340 RADICADO No. 1-2020—8305 TANQUE PARA LA BOMBA TIPO LAPICERO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-19182
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-478	RESPUESTA OFICIO No PS04-487-20 DEL 13 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO RTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019 y OFICIO No PS04-492-20 DEL 14 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO: APU NP CIVIL IMPR 41	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19265
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-479	TRASLADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-19504
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-480	TRASLADO DE ACTAS DE ENTREGA DE LAS REPARACIONES SOLICITADAS EN LA SEDE MANZANA LIÉVANO, REPARACIONES REALIZADAS LOS DIAS 19 DE JUNIO Y 3 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-19506

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
22-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-481	RESPUESTA OFICIO No PS04-478-20 DEL 8 DE JULIO DE 2020 CON ASUNTO ENVIÓ INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE LAS MADERAS DE LAS PASARELAS DEL CMPR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19557
27-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-482	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES INFORME PARCIAL DEL MES MARZO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-458 RADICADO NO. 1-2020-17381 INFORME PARCIAL DEL MES DE MAYO 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-460 RADICADO NO. 1-2020-17380, INFORME PARCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-474 RADICADO NO. 1-2020-18291 – INFORMES DEVUELTOS EL DÍA 14 DE JULIO DE 2020 VÍA CORREO ELECTRÓNICO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-19910
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-483	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-450-20 DEL 24 DE JUNIO DEL 2020 ASUNTO: ENVIÓ DOCUMENTOS FINALES DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19625
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-484	INFORME SEMANAL DEL 13 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-19593
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-485	SOLICITUD DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ESPECIALES ACOPIADOS EN LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19669
23-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-486	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19626
27-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-487	OBSERVACIONES A INSTALACIONES REDES SISTEMA DE DETECCIÓN RED CONTRA INCENDIOS IMPRENTA DISTRITAL - CONFORME AL RECORRIDO REALIZADO POR LA ESPECIALISTA ELECTRICISTA ING YENNY PAOLA REYES COSTILLA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020, Y AL REQUERIMIENTO HECHO EN EL COMITÉ DE OBRA No 41 CELEBRADO EL 23 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-19915
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-488	SOLICITUD DE ENTREGA DE ESPACIO - TANQUE SUBTERRÁNEO AGUA POTABLE SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-20329
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-489	ALCANCE A LAS SOLICITUDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - DEMOLICIÓN DE MURO Y DESMONTE DE DIVISIÓN PISO TECHO EN FIBROCEMENTO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-20330
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-490	SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE FILTRACIONES CUARTO GENERADOR ELÉCTRICO - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-20334
30-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-491	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-476-20 DEL 17 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 21 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-07-31 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
					NUMERO 1-2020-20336
05-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-492	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: ALCANCE REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y BALANCES ACTUALIZADOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-498-20 SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-20926
06-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-493	OBSERVACIONES LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-507-20 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2020 Y OBSERVACIONES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RADICADOS MEDIANTE COMUNICADO PS04-508-20 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-21108
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-494	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-499-20 DEL 28 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 29 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22247
29-jul.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-495	INFORME SEMANAL DEL 20 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-20309
01-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-496	REPORTE DE AISLAMIENTO PREVENTIVO POR CASO DE SOSPECHA COVID-19 INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-20520
04-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-497	REMISIÓN INFORMACIÓN CASO POSITIVO COVID -19, DE LA INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA – CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-20942
10-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-498	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 491 RESPUESTA AL OFICIO No PS04-476-20 DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DE LA INTERVENTORÍA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-21342
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-499	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DOCE (12) A CORTE DE JULIO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-21556 RADICADO FÍSICO 1-2020-37437
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-500	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No DOCE (12) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-21559 RADICADO FÍSICO 1-2020-37229
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-501	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No DOCE (12) - PERIODO JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-21561
11-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-502	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No DOCE (12) A CORTE DE JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-21350 RADICADO FÍSICO 1-2020-37441
13-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-503	INFORME SEMANAL DEL 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	2020-21803
13-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-504	ALCANCE AL OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 502 TRASLADO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO JULIO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-21805
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-505	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-508-20 CON ASUNTO: ENVIÓ APU EN RESPUESTA A OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF472 DEL 4 DE AGOSTO DE 2020 CON RESPECTO AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ELÉCTRICOS y RESPUESTA AL OFICIO PS04-510-20 DE 12 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-493 ENTREGA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22246
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-506	SOLICITUD DE SEGUIMIENTO EN OBRA RUTA CRITICA COMPONENTE ELÉCTRICO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22245
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-507	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-512-20 DEL 12 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-487 OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22244
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-508	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE REVISIÓN PERSONAL MÍNIMA EN OBRA DE LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO EL 11 DE AGOSTO DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22242
14-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-509	REPORTE DE RESULTADOS PRUEBA COVID-19 PERSONAL DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22110
14-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-510	REPORTE DE RESULTADOS PRUEBA COVID-19 PERSONAL DE INTERVENTORÍA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22115
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-511	TRASLADO DE LA RESPUESTA DADA POR P Y D PROYECTOS Y DISEÑOS SAS. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VÍA EMAIL DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2020 FRENTE A BOMBA PARA QUÍMICOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-19 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22239
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-512	REMISIÓN DE CERTIFICADO DE REINTEGRO LABORAL PERSONAL DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA., DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ Y FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22395
18-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-513	REMISIÓN DE CERTIFICADO DE REINTEGRO LABORAL PERSONAL DE INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA., DIANA CATHERINE MORALES VELÁZQUEZ Y FORMATO DE CONDICIONES DE SALUD PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22383
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-514	RESPUESTA AL OFICIO CON ALCANCE AL OFICIO PS04-513-20 – RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF486- REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22422

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-515	RESPUESTA AL OFICIO PS04-521-20 DEL 18 DE AGOSTO DE 2020, ASUNTO: ENVIÓ DOCUMENTO PAZ Y SALVO DE TANIA ERIKA ROMERO LEAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22428
19-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-516	RESPUESTA AL OFICIO PS04-523-20 DEL 18 DE AGOSTO DE 2020, ASUNTO: SITUACIÓN CONTRATISTA OLMO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22429
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-517	TRASLADO DE REQUERIMIENTO PS04-525-20 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020-RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF 505.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22509
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-518	INFORME SEMANAL DEL 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22495
20-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-519	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. DIEZ (10)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22527
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-520	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-506-20 DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-481 INFORME TECNICO DE ESTUDIO DE MADERA DE LA PASARELA DEL CMPR Y RESPUESTA AL OFICIO No PS04-529-20 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA PASARELA DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22847
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-521	RESPUESTA OFICIO PS04-528-20 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF507-OBSERVACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS REDES DE DETECCIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS Y CONCEPTO SOBRE DIRECTOR DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22848
01-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-522	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. ONCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23677
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-523	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA TREINTA Y SEIS (36) A LA CUARENTA Y CUATRO (44)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-22819
24-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-524	REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD CONTRATO No. 4233000-731-2019 SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22841
25-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-525	INFORME SEMANAL DEL 17 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-22936
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-526	TRASLADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS HECHOS POR LA INTERVENTORIA PARA REVISIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA EN RESPUESTA AL OFICIO No PS04-532-20 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-08-27 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23105

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
31-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-527	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-23377 REQUERIMIENTOS UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23523
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-528	ACTA DE REUNIÓN 4 DE AGOSTO DEL 2020 – PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CASO CONFIRMADO COVID-19 Y SOPORTES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23130
26-ago.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-529	ALCANCE AL BALANCE DEL 29 DE MAYO DE 2020 MEMORIAS DE CÁLCULO SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23072
02-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-530	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-537-20 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y RADICADO EN LA OFICINAS DE LA INTERVENTORIA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - ASUNTO: ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No 13	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-03 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23778
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-531	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-536-20 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y PS04-538-20 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - ASUNTO: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO DE LA BANDEJA PORTACABLE, DE LA BOMBA PARA QUÍMICOS y FLAUTA DE 3	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23907
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-532	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO EN RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF517 ENVIADO POR INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23917
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-533	REQUERIMIENTO PARA LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23914
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-534	RESPUESTA AL OFICIO ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN RESPUESTA AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF508 ENVIADO POR INTERVENTORIA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-23916
03-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-535	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS. NP-CIVIL-IMPR 88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA PERLÌN (EN PACHA) PARA SOPORTE DE TRAMO DE CUBIERTA, INCLUYE PLATINAS Y ANCLAJES Y NP-CIVIL-IMPR-56 PISO EN CONCRETO ACELERADO DE 3000 PSI ESPESOR DE 9 CM CON ENDURECEDOR SILÍCEO PARA PLANTA ELÉCTRICA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-04 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-23909
04-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-536	ALCANCE OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 522 RADICADO No 1-2020-23677 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. ONCE (11)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24056
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-537	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24346
07-	AU-INTERV-SGA-4233000-	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS	ARQUITECTURA	CONSORCIO PRUNI	RADICADO 2020-09-08 CON COPIA A

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
sep.-20	730-2019-OF-538	HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO OFICIO CON RADICADO No 2-2020-25804 DEL 1 DE AGOSTO DE 2020.	URBANA LTDA	SEDES 04	LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24272
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-539	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS MEDIANTE OFICIO 2-2020-2704 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-09 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO1-2020-24350
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-540	ESTUDIO DE MERCADO HECHO POR LA INTERVENTORIA FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTO No 159 Y 169.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-09 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24359
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-541	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-540-20 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ INFORME MENSUAL Y ACTA PARCIAL DE COBRO No 13.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-09 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24404
08-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-542	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-533-20 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 Y RADICADO EN LAS OFICINAS DEL 27 DE AGOSTO DE 2020 CON ASUNTO: ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24370
09-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-543	INFORME SEMANAL DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24519
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-544	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-539-20 RADICADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-535 SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS 88 Y 56.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-15 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24879
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-545	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-543-20 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD POR SITUACIÓN EN OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24718
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-546	SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF 546 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020 - BALANCE DE OBRA SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 4233000-731-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-11 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24716
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-547	ACLARACIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24881
11-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-548	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-543-20 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD POR SITUACIÓN EN OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24770
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-549	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No TRECE (13) A CORTE DE AGOSTO DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24844 RADICADO FÍSICO 1-2020-37438
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-550	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No TRECE (13) A CORTE DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
				D.C.	2020-24843 RADICADO FÍSICO 1-2020-37442
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-551	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No TRECE (13) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24884 RADICADO FÍSICO 1-2020-37430
14-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-552	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No TRECE (13) - PERIODO AGOSTO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-24840
15-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-553	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-24997
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-554	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-27806.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25267
15-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-555	REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE TÉCNICO DE INTERVENTORIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25039
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-556	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-27526 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 539 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25238
16-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-557	SOLICITUD DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS (AVES) EN ZONA DE PRODUCCIÓN - IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25189
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-558	RESPUESTA OFICIO PS04-521-ASUNTO ENVIÓ DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES CUADRILLA ALCALDÍA DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2020 Y ANOTACIÓN EN BITÁCORA DE OBRA CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-25281
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-559	RESPUESTA OFICIO PS04-546 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 540 DE LA INTERVENTORIA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 159 Y 160	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-25269
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-560	SOLICITUD DE AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y AJUSTE DE LA CURVA "S"	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-09-18 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-25268
17-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-561	RESPUESTA RADICADO No. 2-2020-28167.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25271
18-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-562	INFORME SEMANAL DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25318
18-	AU-INTERV-SGA-4233000-	TRASLADO DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	ARQUITECTURA	SECRETARIA	ENVIADO MEDIANTE CORREO

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
sep.-20	730-2019-OF-563	CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 - PERIODO AGOSTO DE 2020	URBANA LTDA	GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25422
22-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-564	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. DOCE (12)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-25672
30-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-565	INFORME SEMANAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-26579
30-sep.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-566	INFORME SEMANAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-26580
02-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-567	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-551-20 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ PROGRAMACIÓN DE OBRA, FLUJO DE CAJA Y BALANCE DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-26916
05-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-568	TRASLADO DEL OFICIO CON RADICADO No 2-2020-28570 ACLARACIÓN DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27069
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-569	ALCANCE OBSERVACIONES FICHAS TÉCNICAS BOMBA PARA QUÍMICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL RADICADAS MEDIANTE COMUNICADO PS04-559-20 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27199
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-570	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONEXIÓN DE RED ELÉCTRICA DEFINITIVA ANTE ENEL CODENSA PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-27188
06-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-571	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-556-20 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVÍO APU PUERTA CELOSÍA Y CHAPA ANTIPÁNICO	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-07 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27198
08-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-572	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No 14 A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 E INFORME MENSUAL, RADICADO MEDIANTE COMUNICADO PS04-561-20 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-08 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-27392
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-573	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No CATORCE (14) A CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-27941 RADICADO FÍSICO 1-2020-37439
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-574	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No CATORCE (14) A CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-28132 RADICADO FÍSICO 1-2020-37445
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-575	SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE ÍTEMS DE ASEO PARA LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-27936

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-576	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No CATORCE (14) A CORTE DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 11-2020-28142 RADICADO FÍSICO 1-2020-37432
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-577	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No CATORCE (14) - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-28128
15-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-578	INFORME SEMANAL DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-28004
19-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-579	ENTREGA DE LAS ACTAS DE COMITÉ DE OBRA DE LA CUARENTA Y CINCO (45) A LA CINCUENTA Y DOS (52)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-20 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28360
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-580	SOLICITUD DE ACCIONES Y MEDIDAS INMEDIATAS PARA GARANTIZAR LA INSTALACIÓN DE PISO EPÓXICO Y PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA ESCARIFICACIÓN Y MORTERO DE REPARACIÓN PARA PISO EXISTENTE A LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28784
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-581	SOLICITUD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PENDIENTES POR PRESENTAR A LA INTERVENTORIA ARQUITECTURA URBANA LTDA Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28714
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-582	APREMIO POR CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28712
22-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-583	INFORME SEMANAL DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-28769
23-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-584	ALCANCE COMUNICADO No. PS04-568-20 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: ENVIÓ APU COMPONENTE SENSORES.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-26 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-28843
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-585	OBSERVACIONES TÉCNICAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS DEL COMPONENTE ELÉCTRICO SEDE IMPRENTA DISTRITAL, SOCIALIZADAS EN RECORRIDO TÉCNICO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020 Y SOLICITADAS EN BITÁCORA DE OBRA DE ANOTACIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-29522
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-586	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-574-20 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ APU MORTERO EPÓXICO DE REPARACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-28 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-29519
27-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-587	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-577-20 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2020-OF 582 APREMIO POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-29 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-29684

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS SEDE IMPRENTA DISTRITAL.			
29-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-588	INFORME SEMANAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-29879
30-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-589	RESPUESTA AL OFICIO NO. PS04-578-20 Y PS04-576-20 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 Y PS04-575 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2020, PS04-582-20 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020- CON ASUNTO APU PARA REVISIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-10-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-30120
30-oct.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-590	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD PRIORITARIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-30170
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-591	TRASLADO DEL OFICIO NO PS04-583-20 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2020-OF-568 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-30710
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-592	TRASLADO DEL OFICIO NO PS04-585-20 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020 ASUNTO: RADICACIÓN ANTE CODENSA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-30670
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-593	ENTREGA DE CABLE EXISTENTE DE RED MEDIA TENSIÓN AISLADA EN ALUMINIO MONOPOLAR XLPE 4/0 AWG	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-30668
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-594	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-587-20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PERO RADICADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO NO AU.INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF589 APU ELÉCTRICO 169,170.174Y CIVIL 9.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-05 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-30665
04-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-595	RESPUESTA AL OFICIO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DEL PERSONAL MÍNIMO DE INTERVENTORÍA EN LA SEDE DE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-30666
06-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-596	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS CON ACTA DE APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS No. TRECE (13)	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-31133
06-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-597	RESPUESTA AL OFICIO DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-31218
07-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-598	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-31318
09-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-599	TRASLADO DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN - PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SEDE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-31525 RADICADO FÍSICO 1-2020-37235

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
09-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-600	RESPUESTA AL OFICIO No. PS04-580-20 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2020 CON ASUNTO: ENVIÓ BALANCE A 27 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-31510
09-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-601	OBSERVACIONES AL INFORME FINAL MANZANA LIÉVANO - LIQUIDACIÓN DE LA SEDE	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-10 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-31502
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-602	REQUERIMIENTO POR CALIDAD DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS SOLICITUD DE RESPUESTA AL OFICIO NO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-585 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y AJUSTE A LA REVISIÓN RETIE DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32157
13-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-603	ENTREGA DE FICHAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO EPU Y GENERADOR ELÉCTRICO DE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32199
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-604	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL No 15 OCTUBRE 2020- RADICADA MEDIANTE COMUNICADO PS04-590-20.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-13 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32135
12-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-605	INFORME SEMANAL DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32136
13-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-606	SOLICITUD RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ CON OFICIO No 2-2020-18405 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-14 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-32414
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-607	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-18405 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTER-SGA-4233000-730-2019-OF-340 RADICADO No 1-2020-8305	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32715
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-608	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No QUINCE (15) A CORTE DE OCTUBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32454 RADICADO FÍSICO 1-2020-37440
17-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-609	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE OBRA No DIECISÉIS (16) A CORTE DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32505 RADICADO FÍSICO 1-2020-37446
18-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-610	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No QUINCE (15) A CORTE DEL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32664 RADICADO FÍSICO 1-2020-37433
18-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-611	TRASLADO DE LA CUENTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No QUINCE (15) - PERIODO OCTUBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-32666

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-612	RESPUESTA AL OFICIO No 2-2020-36457 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 -ASUNTO: SOLICITUD PRIORITARIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-33061
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-613	INFORME SEMANAL DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-33028
20-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-614	NUEVAMENTE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE FILTRACIONES CUARTO GENERADOR ELÉCTRICO - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-33057
24-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-615	REQUERIMIENTO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HASTA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 - SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-11-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-33392
25-nov.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-616	INFORME SEMANAL DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-33520
01-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-617	SOLICITUD DE RESPUESTA A LOS EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL ZONA DE PRODUCCIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-12-02 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-34302
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-618	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No DIECISÉIS (16) A CORTE DEL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-35575 RADICADO FÍSICO 1-2020-37436
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-619	TRASLADO DEL ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 DEL 2019	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-35747
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-620	LIQUIDACIÓN CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019 - TRASLADO DEL OFICIO No PS04-602-20 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF617 EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-35406
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-621	TRASLADO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-35408
11-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-622	OBSERVACIONES A LOS PLANOS CON REFERENCIA 5.AE-EDI-05-DETALLES-SUB-GENERADOR-2898-AE-EDI-05-DET-SUB-1	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-12-12 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-35761
14-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-623	TRASLADO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No DIECISÉIS (16) A CORTE DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 - INFORME TÉCNICO, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-35760 RADICADO FÍSICO 1-2020-37427

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
16-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-624	TRASLADO DE LAS LLAVES SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO EN FÍSICO A DRA. CARMEN VICTORIA FORERO POLO-SUBDIRECTORA DE LA IMPRENTA DISTRITAL 16-12-2020
17-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-625	TRASLADO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), PARA SOLICITUD DE CIERRE DEL PIN AMBIENTAL 17450 ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2020-36232
17-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-626	TRASLADO DE LAS LLAVES EQUIPOS SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	RADICADO EN FÍSICO A DRA. CARMEN VICTORIA FORERO POLO-SUBDIRECTORA DE LA IMPRENTA DISTRITAL 17-12-2020
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-627	SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36688
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-628	SOLICITUD DE ATENCIÓN POSVENTAS DEL CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36689
22-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-629	OBSERVACIONES A LOS PLANOS RECORD DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL, MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2020-12-23 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36690
23-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-630	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-36801
30-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-631	TRASLADO DEL INFORME FINAL DE LA SEDE MANZANA LIÉVANO DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-730-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO NUMERO 1-2020-37423
28-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-632	ALCANCE AL OFICIO No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF629 DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1300
29-dic.-20	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-633	OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 –ENVIADA MEDIANTE OFICIO PS04-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2020-37340
29-dic.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-634	DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA No 18 RADICADA MEDIANTE OFICIO No PS04-607-20 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-06-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-1317
30-dic.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-635	RADICACIÓN FÍSICA MEMORIAS DE CÁLCULO SEDE IMPRENTA DISTRITAL SOPORTE DEL BALANCE DEL 29 DE MAYO DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CON RADICADO No 1-2021-260
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-636	LIQUIDACIÓN CONTRATO OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4233000-730-2019 -	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		TRASLADO DEL OFICIO No PS04-602-20 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF617 EQUIPOS ENCONTRADOS CON DAÑOS FÍSICOS EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL		MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2021-1320
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-637	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2021-1318
18-ene.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-638	TERCERA SOLICITUD DE ATENCIÓN POSVENTAS DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-01-27-CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2021-1322
09-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-639	RESPUESTA OFICIO No. PC04-562 DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2020 CON ASUNTO ENVIÓ ACTA PARCIAL No. 15 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD – RESPUESTA OFICIO No. PC04-610-21 DEL 21 DE ENERO DEL 2021 CON ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PAGO ACTA No. 15 DE OCTUBRE DEL 2020 – RESPUESTA OFICIO No. PC04-609-21 DEL 21 DE ENERO DEL 2021 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO No. AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF634 CON ASUNTO DEVOLUCIÓN FACTURA No. 18 Y ACTA No. 18.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-11 -CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2021-4547
10-nov.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-640	TRASLADO DE ACTA PARCIAL No. 15 CONTRATISTA CONSORCIO PRUNI SEDES 04 – PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2021-4889
11-nov.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-641	TRASLADO DE SOLICITUD HECHA POR LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR - FRENTE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-16 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2021-4989
17-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-642	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CIERRE DEL PIN AMBIENTAL – SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DEL PROYECTO PARA FASE DE LIQUIDACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2021-5673
22-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-643	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 627 DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 -LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 4233000-731-2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA4233000-730-2019.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No I-2021-6038
22-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-644	RESPUESTA AL OFICIO NO PS04-618-21 DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTER-SGA-730-2019-OF-622 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-629 PLANOS RECORD, OFICIO PS04-613-21 DEL 22 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OG-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y OFICIO No PS04-616-21 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-627 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OG-637 DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA SEDE CENTRO DE MEMORIA – SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE LA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO I-2021-6070

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA - CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - ENTIDAD - SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,					
FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE	OBSERVACIONES
		DOCUMENTACIÓN OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.			
18-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-645	RESPUESTA OFICIO CON No. DE RADICADO 2-2021-5409 ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2021 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO 640 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-5803
20-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-646	DERECHO DE PETICIÓN - ARTICULO 23 Constitución Nacional - ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-5980
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-647	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-615-21 DEL 27 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SUS OFICIOS AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-628 Y AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-638 ATENCIÓN A POSVENTAS SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-6161
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-648	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2021-6407 DEL 22 DE FEBRERO DE 2021, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA MISMA FECHA.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-6151
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-649	RESPUESTA AL OFICIO No PS04-611-21 DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021 CON ASUNTO: RESPUESTA A SU OFICIO No AU-INTERV-SGA-730-2019-OF-633, CON ASUNTO: OBSERVACIONES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COBRO NO 17 –ENVIADA MEDIANTE OFICIO PS04-606-20 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-24 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-6164
23-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-650	RESPUESTA AL OFICIO CON ASUNTO: REQUERIMIENTO PRIORITARIO TANQUE BOMBA TIPO LAPICERO.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-6294
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-651	RESPUESTA AL OFICIO CON RADICADO No 2-2021-5094 DEL 12 DE FEBRERO DE 2021 ASUNTO: REQUERIMIENTO PRIORITARIO PLANTA ELECTRICA	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-6392
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-652	RESPUESTA AL OFICIO CON SOLICITUD MANIOBRA DE ENERGIZACIÓN SEDE IMPRENTA DISTRITAL	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-6391
24-feb.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-653	TRASLADO DE COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, CON ASUNTO ENERGIZACIÓN FINAL DE LA SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	RADICADO 2021-02-25 CON COPIA A LA SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.: CON RADICADO NUMERO 1-2021-6389
02-mar.-21	AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-OF-654	COMUNICADO INCONFORMIDAD SEDE IMPRENTA DISTRITAL.	ARQUITECTURA URBANA LTDA	SECRETARIA GENERAL -ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ENVIADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VENTANILLA ELECTRÓNICA@ CON RADICADO No 1-2021-

8.2. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe FINAL de Interventoría se firmaron trece (13) actas de fijación de precios, para un total de ciento noventa y un (191) análisis de precios unitarios no previstos.

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
1	NP-CIVIL-CMPR-01	Desmonte, almacenamiento pasarela en DECK de madera	M2	$ 45.000,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
2	NP-CIVIL-IMP-06	Desmonte de ventanillas metálicas, incluye cargue y almacenamiento en sitio donde disponga la interventoría	M2	$ 19.088,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
3	NP-CIVIL-IMP-07	Demolición de caja de inspección con muros en mampostería y tapa más base en concreto, dimensiones de 60X60X70, incluye retiro de escombros hasta escombrera certificada	UN	$ 54.724,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
4	NP-CIVIL-IMP-08	Demolición de caja de inspección con muros en mampostería y tapa más base en concreto, dimensiones de 40X40X70, incluye retiro de escombros hasta escombrera certificada	UN	$ 37.705,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
5	NP-CIVIL-IMP-09	Desmonte tubería de gres de 8" incluye retiro e escombros hasta escombrera certificada	ML	$ 17.498,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
6	NP-CIVIL-IMP-10	Apuntalamiento de placa para construcción de zapatas	DÍA	$ 12.803,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
7	NP-CIVIL-IMP-11	Desmonte bajante metálica embebida en columnas de concreto a reforzar, incluye retiro de escombros	ML	$ 12.742,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
8	NP-CIVIL-LIEV-12	Perforación mecánica de 6" en estructura existente para instalación de tubería	CM	$ 9.967,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
9	NP-CIVIL-LIEV-13	Perforación mecánica de 4" en estructura existente para instalación de tubería	CM	$ 9.159,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
10	NP-CIVIL-LIEV-14	Perforación mecánica de 3" en estructura existente para instalación de tubería	CM	$ 8.589,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
11	NP-CIVIL-LIEV-15	Suministro e instalación de láminas de DryWall en cielo raso desmontado para instalación de red contra incendios	M2	$ 31.671,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
12	NP-CIVIL-LIEV-17	Suministro e instalación de estructura omega deteriorada a causa de la instalación de la red contra incendios para instalación de cielo raso	ML	$ 17.498,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
13	NP-ELECTRICO-CMPR-101	Suministro e instalación de caja de paso eléctrica de 30x30x30 en concreto prefabricado con tapa	UN	$ 166.621,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
14	NP-ELECTRICO-CMPR-102	Suministro e instalación de caja de electrodo de puesta a tierra y conexión	UN	$ 168.579,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
15	NP-ELECTRICO-IMP-103	Desmonte y reinstalación de canaleta metálica 8X4 incluye cargue y almacenamiento en sitio donde disponga la interventoría	ML	$ 34.700,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
16	NP-ELECTRICO-IMP-104	Desmonte y reinstalación de bandeja porta cables tipo cabrofil, incluye cargue y almacenamiento en sitio donde disponga la interventoría	ML	$ 36.350,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
17	NP-ELECTRICO-IMP-105	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de tubería EMT de 3/4"	ML	$ 15.391,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
18	NP-ELECTRICO-IMP-106	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de tubería EMT de 1"	ML	$ 17.463,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
19	NP-ELECTRICO-IMP-107	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de tubería EMT de 1 1/2"	ML	$ 18.659,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
20	NP-ELECTRICO-IMP-108	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de tubería EMT de 2"	ML	$ 23.230,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
21	NP-ELECTRICO-IMP-109	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de toma trifásica	UN	$ 19.930,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
22	NP-ELECTRICO-IMP-110	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de toma monofásica	UN	$ 12.805,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
23	NP-ELECTRICO-IMP-111	Desplazamiento de acometida en tubería PVC de 1" para alimentación de maquinas	UN	$ 23.774,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
24	NP-ELECTRICO-IMP-112	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de toma regulada	UN	$ 22.278,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
25	NP-ELECTRICO-IMP-113	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de salida para datos	UN	$ 24.011,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
26	NP-ELECTRICO-IMP-114	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de salida para voz	UN	$ 24.011,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
27	NP-ELECTRICO-IMP-115	Desmonte y reinstalación tablero de distribución	UN	$ 177.100,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
28	NP-ELECTRICO-IMP-116	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de luminarias de espacio interiores	UN	$ 19.567,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
29	NP-ELECTRICO-IMP-117	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de sensor de movimiento	UN	$ 19.567,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
30	NP-ELECTRICO-IMP-118	Desmonte, almacenamiento y reinstalación cámara de seguridad	UN	$ 33.894,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
31	NP-ELECTRICO-IMP-119	Desplazamiento de circuitos y puntos de datos en bodega 3 piso 1, incluye desmontar bandeja cortacables reinstalarla a 50 CMS del lugar para permitir maniobra de reforzamiento de muro, mover cableado de datos a bandeja sin desconexión	ML	$ 18.605,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
32	NP-ELECTRICO-IMP-120	Desmonte punto de soldadura exotérmica de puesta a tierra	UN	$ 45.000,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
33	NP-ELECTRICO-IMP-121	Certificación de puntos voz y datos categoría 6A	UN	$ 32.100,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
34	NP-ELECTRICO-IMP-122	Desconexión, movimiento y reinstalación de tablero eléctrico en espacio de DATA CENTER para construcción de muro, incluye embalaje de protección del equipo	UN	$ 1.576.000,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
35	NP-ELECTRICO-IMP-123	Desconexión, movimiento y reinstalación de RACK eléctrico en espacio de DATA CENTER para construcción de muro, incluye embalaje de protección del equipo	UN	$ 1.855.500,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
36	NP-ELECTRICO-IMP-124	Desconexión, movimiento y reinstalación de UPS en espacio de DATA CENTER para construcción de muro, incluye embalaje de protección del equipo	UN	$ 1.839.500,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
37	NP-ELECTRICO-IMP-125	Desmonte y reinstalación de caja	UN	$ 78.385,00	1	APROBADO POR	27/08/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		eléctrica polo a tierra				INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	
38	NP-HIDRAULICO-CMPR-201	Desmonte y reinstalación de tubería PVC 1" para agua potable	ML	$ 13.622,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
39	NP-HIDRAULICO-LIEV-203	Suministro e instalación accesorio TEE reducida ranurada acero al carbón 2-1/2" X 2"	UN	$ 34.680,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
40	NP-HIDRAULICO-LIEV-204	Suministro e instalación accesorio válvula mariposa ranurada AL/FM 4"	UN	$ 722.509,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
41	NP-HIDRAULICO-LIEV-205	Suministro e instalación cheque ranurada 4"X 2"1/2"	UN	$ 329.845,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
42	NP-HIDRAULICO-LIEV-206	Suministro e instalación cheque ranurada 6"X 2"1/2"	UN	$ 40.890,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
43	NP-HIDRAULICO-LIEV-207	Suministro e instalación accesorio TEE reducida ranurada acero al carbón 6-1/2" X 2"	UN	$ 22.659,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
44	NP-HIDRAULICO-LIEV-208	Suministro e instalación accesorio copa reducida de 2x1/2"	UN	$ 14.244,00	1	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/08/2019
45	NP-CIVIL-CMPR-03	Retiro y acopio para filtro perimetral (Geotextil + Grava) Incluye trasiego de la grava a punto de acopio y disposición final del Geotextil	ML	$ 11.780,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
46	NP-CIVIL-CMPR-04	Retiro y acopio de rejilla metálica	ML	$ 5.265,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
47	NP-CIVIL-CMPR-05	Demolición viga canal en concreto armado existente de 0,60X0,56 E0,18. Incluye trasiego y retiro de escombros	ML	$ 30.000,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
48	NP-CIVIL-LIEV-19	Desmonte almacenamiento y montaje de elementos de madera para cielo raso	M2	$ 20.836,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
49	NP-CIVIL-LIEV-20	Perforación de láminas microperforadas cielo raso modular para instalación de rociador Red contra incendios	UN	$ 4.366,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
50	NP-CIVIL-LIEV-21	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1	M2	$ 11.028,00	2	APROBADO POR	16/10/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		aplicado a dos manos en muros y techos				INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	
51	NP-CIVIL-LIEV-22	Protección puestos de trabajo, incluye pisos en cartón corrugado, puestos y muebles en plástico calibre 3.5	M2	$ 1.200,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
52	NP-CIVIL-CMPR-23	Demolición cajas colectoras de aguas lluvias existente en concreto reforzado ubicadas en área de excavación mecánica para nuevo filtro perimetral, paredes espesor 0,15m, incluye carga y retire	M3	$ 234.470,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
53	NP-CIVIL-IMP-25	Encamisado con dado en concreto de 3000 PSI DE 80X80 para tubería de 8" en gres	ML	$ 402.055,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
54	NP-CIVIL-IMP-26	Desmonte y reinstalación de puertas en madera, incluye marco, trasiego y almacenamiento	M2	$ 27.590,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
55	NP-CIVIL-CMPR-30	Preparación de superficie espejos de agua para aplicación de poliurea, incluye remoción de material existente	M2	$ 8.500,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
56	NP-CIVIL-CMPR-31	Sello de juntas y tratamiento de fisuras	ML	$ 20.827,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
57	NP-CIVIL-CMPR-32	Suministro y aplicación de imprimante epóxido	M2	$ 13.754,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
58	NP-CIVIL-LIEV-34	Suministro e instalación muro en DryWall 1 cara, incluye dos manos de pintura vinilo tipo 2	M2	$ 32.072,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
59	NP-CIVIL-CMPR-35	Demolición mediacaña existente en espejos de agua no apta para aplicación de poliurea, desarrollo de 0.25x0,15m incluye retiro	ML	$ 12.551,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
60	NP-CIVIL-CMPR-36	Mediacaña en mortero para aplicación poliurea en espejos de agua (incluye picada y alistado de superficie	ML	$ 42.655,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
61	NP-CIVIL-CMPR-37	Suministro y aplicación de impermeabilizante para muro en concreto enterrado, incluye limpieza de superficie (Con IGOL Denso Plus - Aplicación sobre superficie seca)	M2	$ 70.000,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
62	NP-ELECTRICO-CMPR-126	Acometida en cable de CU AWG (3x6f+1x8n+1x12t)	ML	$ 32.497,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA	16/10/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
						FIRMADO POR LA ENTIDAD	
63	NP-ELECTRICO-IMP-127	Desmonte, almacenamiento y reinstalación aire acondicionado DATA CENTER, incluye cargue	UN	$ 337.154,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
64	NP-ELECTRICO-CMPR-128	Punto electico para Salida trifásica. toma 30amp, incluye cableado, toma y conectores	ML	$ 242.265,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
65	NP-ELECTRICO-CMPR-129	Análisis de carga transformador existente	GBL	$ 1.832.600,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
66	NP-ELECTRICO-CMPR-130	Puerta contrafuego hoja doble 2,19 alto X 1,99 ancho, para subestación eléctrica, incluye desmonte de puerta existente, marco, kit completo de cerradura anti pánico, pintura electrostática	GBL	$ 15.734.912,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
67	NP-ELECTRICO-IMP-131	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de reflector referencia IP65 100W	UN	$ 23.250,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
68	NP-ELECTRICO-CMPR-132	Tablero de doce circuitos para acometida eléctrica trifásica de maquina hidrolavadora	UN	$ 1.671.092,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
69	NP-HIDRAULICO-IMP-202	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de bajantes PVC de 4" de cubiertas	ML	$ 17.310,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
70	NP-HIDRAULICO-LIEV-209	Desmonte tubería existente acero 6" incluye retiro y disposición final como material sobrante de obra	ML	$ 54.233,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
71	NP-HIDRAULICO-LIEV-210	Desmonte tubería existente acero 4" incluye retiro y disposición final como material sobrante de obra	ML	$ 29.482,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
72	NP-HIDRAULICO-LIEV-211	Desmonte tubería existente acero 3" incluye retiro y disposición final como material sobrante de obra	ML	$ 24.848,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
73	NP-HIDRAULICO-LIEV-212	Desmonte tubería existente acero 2 1/2" incluye retiro y disposición final como material sobrante de obra	ML	$ 24.600,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
74	NP-HIDRAULICO-LIEV-213	Desmonte tubería existente acero 2" incluye retiro y disposición final como material sobrante de obra	ML	$ 21.568,00	2	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	16/10/2019
75	NP-CIVIL-LIEV-12	Perforación mecánica de 5 1/2" con	CM	$ 9.967,00	3	APROBADO POR	25/11/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		broca diamantada de 6" en estructura existente para instalación de tubería				INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	
76	NP-CIVIL-LIEV-14	Perforación mecánica de 2 1/2" con broca diamantada de 3" en estructura existente para instalación de tubería	CM	$ 8.589,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
77	NP-CIVIL-LIEV-18	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de frescasa	M2	$ 4.565,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
78	NP-CIVIL-IMP-33	Retiro y disposición final de alfombra	M2	$ 5.273,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
79	NP-CIVIL-CMPR-47	Caisson (AnilloConcret+grav) d=1,90m profundidad de 10m	ML	$ 798.542,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
80	NP-CIVIL-LIEV-53	Perforación mecánica de 2" con broca diamantada de 2 1/2" en estructura existente para instalación de tubería	CM	$ 8.507,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
81	NP-ELÈCTRICO-CMPR-135	Suministro e instalación tubo conduit PVC de 1" para salida trifásica	ML	$ 6.777,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
82	NP-ELÉCTRICO-CMPR-136	Suministro e instalación de bala de piso LED referencia IP65 1W	UN	$ 90.900,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
83	NP-ELÉCTRICO-CMPR-138	Suministro e instalación de bombillo LED 18W para luminarias existentes	UN	$ 21.001,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
84	NP-ELÉCTRICO-CMPR-139	Suministro e instalación de bombillo LED 30W para luminarias existentes	UN	$ 44.006,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
85	NP-ELÉCTRICO-CMPR-140	Suministro e instalación de bombillo LED 40W para luminarias existentes	UN	$ 49.361,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
86	NP-ELÈCTRICO-CMPR-141	Suministro e instalación de toma polo a tierra pata trabada	UN	$ 47.551,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
87	NP-HIDRAULICO-CMPR-217	Diseño de conexión de pozo eyector a caja de inspección para desagües de aguas para filtro	UN	$ 2.242.000,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
88	NP-HIDRAULICO-LIEV-220	Suministro e instalación accesorio	UN	$ 334.168,00	3	APROBADO POR	25/11/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		válvula de drenaje 1"				INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	
89	NP-HIDRAULICO-LIEV-221	Suministro e instalación accesorio TEE reducida 4"X2 1/2"	UN	$ 97.259,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
90	NP-HIDRAULICO-LIEV-222	Suministro e instalación accesorio TEE reducida acero al carbón 4"X2"	UN	$ 90.426,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
91	NP-HIDRAULICO-LIEV-224	Suministro e instalación accesorio codo acero al carbón 45º 4"	UN	$ 42.981,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
92	NP-CIVIL-IMP-39	Desmonte, almacenamiento y reinstalación de marcos para luminaria en cielo raso 60X60	UN	$ 10.260,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
93	NP-CIVIL-IMP-46	Construcción de alfajía en ladrillo común E:0,25, hilada parada	ML	$ 36.025,00	3	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	25/11/2019
94	NP-CIVIL-IMP-38	Corte y cicatrización de raíces altura del árbol entre 0-5 mts	UN	$ 210.003,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
95	NP-CIVIL-IMP-45	Suministro e instalación de estructura para instalación cielo raso falso	M2	$ 17.498,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
96	NP-CIVIL-IMP-57	Adecuación puerta metálica acceso principal área bodega, incluye pintura	UN	$ 573.610,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
97	NP-ELÉCTRICO-CMPR-137	Suministro e instalación de bañador RGB controlador DMX trasero bañador de fachada LED de 54 W de potencia RGB (multicolor) con Display trasero DMX, conexión de entrada y salida de señal DMX 512. Sistema RGB controlable que permite fijar colores y generar efectos de luz, chasis metálico y lentes en policarbonato con ángulo de apertura de 60º	UN	$ 2.095.933,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
98	NP-HIDRAULICO-LIEV-218	Suministro e instalación accesorio reducción acero al carbón 4 X 2 1/2"	UN	$ 32.692,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
99	NP-HIDRAULICO-LIEV-219	Suministro e instalación accesorio soporte autoajustable 4"	UN	$ 33.047,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA	29/11/2019

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
						ENTIDAD	
100	NP-HIDRAULICO-LIEV-223	Suministro e instalación accesorio soporte autoajustable 2"	UN	$ 25.417,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
101	NP-HIDRAULICO-LIEV-225	Suministro e instalación accesorio soporte autoajustable 2 1/2"	UN	$ 26.257,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
102	NP-HIDRAULICO-LIEV-229	Suministro e instalación de codo ranurado de 45º de 2" acero al carbón	UN	$ 21.028,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
103	NP-HIDRAULICO-LIEV-232	Suministro e instalación de TEE ranurada de 1 1/4"	UN	$ 17.399,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
104	NP-ELÉCTRICO-CMPR-134	Suministro e instalación de batería eléctrica 12V 80AMP para planta eléctrica	UN	$ 670.424,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
105	NP-HIDRAULICO-LIEV-228	Suministro e instalación de strap de 2 1/2 X 1 1/4"	UN	$ 26.863,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
106	NP-HIDRAULICO-LIEV-230	Suministro e instalación de codo ranurado de 45º de 6" acero al carbón	UN	$ 93.057,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
107	NP-HIDRAULICO-LIEV-231	Suministro e instalación de tapa válvula angular 2 1/2"	UN	$ 110.702,00	4	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	29/11/2019
108	NP-HIDRAULICO-IMP-234	Inspección de redes aguas negras con cámara de video en la red interna del predio	UN	$ 2.439.500,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
109	NP-CIVIL-IMP-58	Demolición de enchape, incluye trasiego, cargue a punto de acopio y retiro de escombros a escombrera certificada	M2	$ 6.865,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
110	NP-CIVIL-IMP-61	Suministro e instalación de dilatación en icopor para junta constructiva en muro	M2	$ 35.288,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
111	NP-CIVIL-IMP-64	Desmonte y almacenamiento de compresor área de administración	UN	$ 26.900,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
112	NP-CIVIL-IMP-66	Desmonte y almacenamiento de mesón de cocina de 0.60X1.80 incluye desmonte lavaplatos, grifería y disposición final	UN	$ 47.160,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA	30/01/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		hasta lugar autorizado por la interventoría				ENTIDAD	
113	NP-CIVIL-IMP 67	Desmonte y almacenamiento de mueble de cocina de 0,60X1,0X0,45 M. incluye disposición final hasta lugar autorizado por la interventoría	UN	$ 25.163,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
114	NP-CIVIL-CMPR-40	Excavación manual para construcción de anillos caissons de 0 a 10,0 m. de profundidad, incluye motobomba, acarreo interno de materiales, cargue transporte y botada del material proveniente de la excavación en botadero autorizado por la interventoría	M3	$ 95.730,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
115	NP-CIVIL-CMPR-59	Alquiler por 15 días de carpa para protección de área faltante de impermeabilización zona de espejos, incluye transporte, instalación y desinstalación.	GBL	$ 2.891.700,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
116	NP-CIVIL-CMPR-62	Construcción de viga canal en concreto, no incluye acero de refuerzo medidas según diseño concreto de 3000 PSI	ML	$ 106.877,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
117	NP-CIVIL-LIEV-29	Suministro e instalación de dintel en DryWall capas de 0,15m	ML	$ 19.589,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
118	NP-HIDRAULICO-LIEV-226	Suministro e instalación dado en concreto prefabricado de 3000 PSI de 0,35X0,35X0,45 altura promedio para soporte de tubería de 4" red contra incendios de cubierta, no incluye epóxico de anclaje para rieles	UN	$ 94.432,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
119	NP-ELECTRICO-LIEV-142	Suministro e instalación de módulo de monitoreo referencia 4090-9001 para la red contra incendios	UN	$ 191.618,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
120	NP-ELECTRICO-LIEV-147	Suministro e instalación de Breaker magnético ajustable REF: TS 400N MTU 320	UN	$ 1.378.610,00	5	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	30/01/2020
121	NP-CIVIL-IMP-02	Apuntalamiento metro cuadrado de placa con vigas de madera, cerchas y parales Área de Administración	M2/MES	$ 60.546,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
122	NP-CIVIL-IMP-16	Reinstalación ventanas en fachadas, no incluye pintura de marcos ni cambio de vidrios	M2	$ 41.602,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
123	NP-CIVIL-CMPR-24	Reinstalación pasarela deck de madera, incluye 30% por restitución de piezas en mal estado y madera rolliza	M2	$ 118.725,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
124	NP-CIVIL-CMPR-44	Reinstalación deck de madera en escaleras, incluye 30% por restitución de piezas en mal estado	M2	$ 111.993,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
125	NP-CIVIL-CMPR-51	Construcción caja de almacenamiento de agua en concreto de 3000 PSI para sistema espejos existentes de 1.72x1.72 altura 0.80	UN	$ 1.273.848,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
126	NP-CIVIL-CMPR-63	Reinstalación de rejilla metálica de 0.22m para viga canal	ML	$ 5.581,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
127	NP-CIVIL-IMP-68	Adecuación ventana metálica de 2.40 x 1.20	UN	$ 282.317,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
128	NP-CIVIL-IMP-69	Adecuación ventana metálica de 2.40 x 1.72	UN	$ 284.692,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
129	NP-CIVIL-IMP-70	Adecuación ventana metálica de 3.70 x 1.72	UN	$ 495.233,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
130	NP-CIVIL-IMP-71	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 a tres manos sobre muro	M2	$ 17.819,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
131	NP-CIVIL-IMP-72	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 a tres manos sobre muro	ML	$ 12.641,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
132	NP-CIVIL-IMP-73	Suministro y aplicación de pañete espesor promedio 2.5 cm sobre muros interiores	M2	$ 29.263,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
133	NP-CIVIL-IMP-74	Suministro y aplicación de pañete espesor promedio 2.5 cm sobre muros interiores	ML	$ 20.166,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
134	NP-CIVIL-IMP-75	Suministro y aplicación de estuco	ML	$ 6.886,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
135	NP-CIVIL-IMP-76	Suministro y aplicación de pañete en exteriores a doble altura espesor promedio 2.5 cm	M2	$ 33.981,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
136	NP-CIVIL-IMP-77	Suministro y aplicación de pañete en exteriores a doble altura espesor promedio 2.5 cm	ML	$ 23.583,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
137	NP-CIVIL-CMPR-82	Construcción caja de inspección de 0.80x0.0 altura 1.0 m en ladrillo tolete, incluye tapa y marco	UN	$ 819.523,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
138	NP-ELECTRICO-CMPR-143	Suministro e instalación de luminaria led bala ref 60w HIGH POWER para la circulación interna de monolito a una altura de 14 m	UN	$ 232.881,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
139	NP-ELECTRICO-IMP-145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE 2 (3X500MCM F + 1X500MCM N + 1 1X250MCM T)	ML	$ 878.280,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
140	NP-ELECTRICO-IMP-146	Maniobra para des energización de sub estación	GBL	$ 6.213.477,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
141	NP-ELÉCTRICO-CMPR-149	Suministro e instalación de bañador lineal DMX	UN	$ 770.648,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
142	NP-ELÉCTRICO-CMPR-150	Suministro e instalación de consola DMX	UN	$ 2.241.488,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
143	NP-ELÉCTRICO-CMPR-151	Instalación, puesta a punto y programación de consola y bañadores, incluye reprogramación 5 escenas a elección (Bañadores + consola)	UN	$ 732.394,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
144	NP-HIDRAULICO-IMP-233	Suministro e instalación de cárcamo rejilla de 35x40x100 en concreto prefabricado de 3000 psi, no incluye preparación de la superficie de apoyo	ML	$ 169.870,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
145	NP-ELÉCTRICO-CMPR-148	Configuración de conmutadores (SWITCH) programables marca sisco modelo SG220-26 en rack de comunicaciones del área administrativa y del monolito sótano 2	UN	$ 476.000,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
146	NP-CIVIL-IMP-48	Apuntalamiento metro cuadrado de estructura a reforzar de doble altura con camillas, cerchas, parales y crucetas en área de producción	M2/MES	$ 103.360,00	6	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
147	NP-CIVIL-IMP-27	Corte, desmonte y reinstalación de reja en zona de bodega principal	UN	$ 351.575,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
148	NP-CIVIL-IMP-28	Suministro e instalación de muro en ladrillo tolete E=0.12 m	ML	$ 42.628,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
149	NP-CIVIL-IMP-60	Suministro e instalación de guarda escoba tablón gres	ML	$ 17.161,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA	27/02/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
						ENTIDAD	
150	NP-CIVIL-IMP-78	Suministro e instalación a doble altura de alero en Superboard de 6 mm a una cara	M2	$ 99.226,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
151	NP-CIVIL-IMP-79	Desmonte de espejos incluye disposición final con gestor autorizado	M2	$ 7.648,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
152	NP-CIVIL-IMP-80	Desmonte y almacenamiento de mesón de baño, incluye disposición final hasta lugar autorizado por la interventoría	M2	$ 40.827,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
153	NP-CIVIL-IMP-81	Suministro e instalación de remate muro de planta eléctrica en Superboard de 8 mm a una cara	ML	$ 75.155,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
154	NP-CIVIL-IMP-83	Suministro e instalación de estructura metálica para cielo raso	M2	$ 34.478,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
155	NP-CIVIL-CMPR-85	Suministro e instalación de tapa alfajor de 1.30x0.80	UN	$ 859.288,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
156	NP-CIVIL-CMPR-86	Suministro e instalación de tapa alfajor de 1.05x0.90	UN	$ 839.323,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
157	NP-CIVIL-IMP-89	Reinstalación de cielo raso falso en PVC en área de administración	M2	$ 14.325,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
158	NP-CIVIL-IMP-90	Desmonte y reinstalación de baranda metálica	ML	$ 34.992,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
159	NP-CIVIL-IMP-91	Suministro y aplicación de estuco	M2	$ 12.021,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
160	NP-ELECTRICO-IMP-152	Suministro e instalación de canaleta metálica calibre 22 de 12x5	ML	$ 42.170,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
161	NP-HIDRAULICO-CMPR-216	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 4", incluye accesorios, para pozo eyector	ML	$ 79.903,00	7	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	27/02/2020
162	NP CIVIL-IMP 84	Suministro, transporte e instalación de vidrio cristal incoloro 5 mm crudo en ventanas, incluye sello con silicona	M2	$ 114.491,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA	18/05/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
						ENTIDAD	
163	NP CIVIL-IMP 87	Desmonte, corte y reinstalación de vidrios existentes para ventanas modificadas de fachada, incluye sello con silicona	M2	$ 67.341,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	18/05/2020
164	NP CIVIL-IMP 92	Construcción pozo de alcantarillado D= 1,20m, H = 2,00m. no incluye cámara de caída, acero de refuerzo, escalera de gato	UN	$ 3.834.951,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	18/05/2020
165	NP CIVIL-IMP 93	Suministro y aplicación de recubrimiento epóxico para piso en área de producción, incluye preparación de la superficie y resane de fisuras	M2	$ 71.893,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	18/05/2020
166	NP CIVIL-IMP 94	Suministro y aplicación demarcación 10 cm de ancho con epóxico amarillo A-90	ML	$ 16.282,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	18/05/2020
167	NP CIVIL-IMP 97	Suministro y aplicación de junta epóxica semirrígida ancho máximo aprox. 1,5 cm	ML	$ 32.492,00	8	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	18/05/2020
168	NP-CIVIL-CMPR-50	Demolición de concreto (Protuberancias) en muro pantalla con compresor	M3	$ 417.442,00	9	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	24/06/2020
169	NP-ELECTRICO-CMPR-153	Suministro e instalación de Breaker 3X50 AMP para tablero eléctrico de las bombas del pozo eyector	UN	$ 116.102,00	9	APROBADO POR INTERVENTORÍA FIRMADO POR LA ENTIDAD	24/06/2020
170	NP-CIVIL-IMP-49	Suministro e instalación de platinas de reforzamiento para maderos de cubierta, instalados en par a lado y lado de cada madero a reforzar, dimensiones 2"X3/16"X1 m (5cmx5mmx1m)	UN	$ 65.384,00	10	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	20/08/2020
171	NP-CIVIL-IMP-95	Relleno en material proveniente de excavación incluye compactación	M3	$ 13.119,00	10	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	20/08/2020
172	NP-CIVIL-IMP-96	Mediacaña en mortero, gravilla lavada, desarrollo 0,10 m (Incluye alistado de la superficie)	ML	$ 35.377,00	10	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	20/08/2020
173	NP-CIVIL-IMP-98	Suministro e instalación de platina de reforzamiento para maderos de cubierta instalados en par a lado y lado de cada madero a reforzar. Dimensiones 3/8" x 180mm x 852mm	UN	$ 170.381,00	10	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	20/08/2020
174	NP-ELECTRICO-IMP-157	Prueba VFL para cable XLPE entre 2-4/0	UN	$ 1.666.000,00	10	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	20/08/2020
175	NP-ELECTRICO-IMP-162	Suministro e instalación de marco de 60	UN	$ 37.048,00	10	APROBADO POR	20/08/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		x 60 para luminaria de cielo raso				INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	
176	NP-CIVIL-IMP-42	Abertura de cielo raso para instalación de marco y luminaria 60x60, incluye refuerzo	UN	$ 19.825,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
177	NP-CIVIL-IMP-54	Nivelación de pisos espesor promedio 8CM para cuarto de bombas	M2	$ 55.369,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
178	NP-CIVIL-IMP-55	Piso en concreto de 3000 PSI espesor de 10CM, incluye dilatación de piso	M2	$ 106.210,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
179	NP-CIVIL-IMP-100	Suministro e instalación de piso gres formato 10x10CM	M2	$ 34.807,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
180	NP-ELECTRICO-IMP-155	Suministro e instalación de tubería IMC 3"	ML	$ 112.435,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
181	NP-ELECTRICO-IMP-156	Suministro e instalación de terminal premoldeada uso exterior/interior para 35 kV para cable 2-4/0 AWG juego X 3 unidades	JUEGO	$ 934.022,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
182	NP-ELECTRICO-IMP-158	Red de media tensión aislada cable de aluminio monopolar XLPE 15kv con nivel de aislamiento de 100% No. 2/0 AWG pantalla en hilos (3x2/0 awg)	ML	$ 92.892,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
183	NP-ELECTRICO-IMP-161	Red de media tensión aislada cable de aluminio monopolar XLPE 15kv con nivel de aislamiento de 100% No. 4/0 AWG pantalla en hilos (3x4/0 AWG)	ML	$ 122.492,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
184	NP-ELECTRICO-IMP-163	Suministro e instalación de transferencia enclavamiento mecánico motorizada automática para 225kVA tipo AC-3A con contactores para 600AMP	UN	$ 14.547.889,93	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
185	NP-ELECTRICO-IMP-164	Suministro e instalación de transferencia enclavamiento mecánico motorizada automática para 150kVA tipo AC-3A con contactores para 240AMP	UN	$ 9.691.500,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
186	NP-ELECTRICO-IMP-165	Provisional electrica de obra	UN	$ 1.706.893,50	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
187	NP-CIVIL-IMP-41	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo estructural de 24x12x6, incluye grouting, no incluye acero de refuerzo	M2	$ 115.107,00	11	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	03/09/2020
188	NP-CIVIL-IMP-88	Suministro e instalación de viga perlin	ML	$ 325.160,00	12	APROBADO POR	22/09/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
		(en pacha) para soporte de tramo de cubierta incluye platinas, no incluye anclajes de 1/2"				INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	
189	NP-ELECTRICO-IMP-154	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo malla de 30 CM de ancho, incluye accesorios soportes y elementos de fijación	ML	$ 61.706,00	12	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	22/09/2020
190	NP-ELECTRICO-IMP-159	Suministro e instalación de protección en Ductolon para tubería metálica electrica de 3/4"	ML	$ 13.151,00	12	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	22/09/2020
191	NP-ELECTRICO-IMP-160	Suministro e instalación de protección en Ductolon para tubería metálica electrica de 3"	ML	$ 15.787,00	12	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	22/09/2020
192	NP-HIDRAULICO-IMP-239	Suministro e instalación de bomba en acero inoxidable para químicos, incluye tablero de control	UN	$ 3.516.689,00	12	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	22/09/2020
193	NP-HIDRAULICO-IMP-240	Complemento para el suministro e instalación para construcción de flauta en 3" para conexión del sistema de presión del cuarto de bombas	UN	$ 6.038.847,00	12	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	22/09/2020
194	NP-CIVIL-IMP-99	Suministro e instalación de mortero autonivelante de reparación, espesor máximo 2 CM, incluye escarificación de superficie	M2	$ 177.056,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
195	NP-ELECTRICO-IMP-166	Puerta metálica calibre 18 en celosía de 0,96 x 2,50 con chapa antipánico y pintura electrostática	UN	$ 2.284.431,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
196	NP-ELECTRICO-IMP-167	Suministro e instalación de chapa antipánico	UN	$ 894.472,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
197	NP-ELECTRICO-IMP-169	Suministro e instalación de DPS pararrayos para transformador de 225kVA	UN	$ 103.750,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
198	NP-ELECTRICO-IMP-170	Suministro e instalación módulo de RELE direccionable inteligente	UN	$ 288.998,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
199	NP-ELECTRICO-IMP-172	Suministro e instalación de cable honey well 2 x 16	ML	$ 6.802,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
200	NP-ELECTRICO-IMP-173	Suministro e instalación de estación pull manual direccionable, con características bg-121 e interfaz montada dentro de la estación pull, no incluye cableado ni tubería EMT	UN	$ 461.939,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020

No	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT	ACTA DE APROBACIÓN	ESTADO	FECHA APROBACIÓN
201	NP-ELECTRICO-IMP-174	Suministro e instalación señal de 20x10 CM en lámina galvanizada cal 22 riesgo eléctrico	UN	$ 31.181,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020
202	NP-ELECTRICO-IMP-175	Suministro e instalación señal de 30x30 CM en lámina galvanizada cal 22 riesgo eléctrico	UN	$ 49.031,00	13	APROBADO POR INTERVENTORÍA REMITIDO A LA ENTIDAD	06/11/2020

8.3. ACTAS DE VECINDAD

Dentro de las obligaciones contractuales por parte del CONSORCIO PRUNI SEDES 04, está definida la realización de las actas de vecindad por cada uno de las sedes, la Interventoria se permite informar que se realizaron acta de vecindad de inicio por cada uno de las sedes tanto para MANZANA LIÉVANO, CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN e IMPRENTA DISTRITAL.

Ahora bien, el contrato de obra se desarrolla en términos normales para la sede MANZANA LIÉVANO Y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, y se produce el cierre de las actas de vecindad.

Sin embargo para la sede IMPRENTA DISTRITAL, se realiza el cierre de las actas de vecindad el día 22 de Diciembre de 2020, se levanta el acta de reunión No 163 de la misma, fecha, donde se indica que no se puede dar cierre a las actas de vecindad de los equipos Maquina embuchadora la cual presenta dos bombillas quebradas, la máquina de verificación de pruebas, ya que la estructura se encuentra rota, así como no se dio cierre al acta de vecindad de la maquina cuatro colores ya que se evidencia los rodillos afectados.

En el mes de febrero de 2021, la entidad traslada a la Interventoria el diagnostico de estas máquinas, para ser valorado por el CONSORCIO PRUNI SEDES 04, el cual a la fecha no ha dado respuesta a la misma. Razón por la cual las actas de vecindad no se han dado cierre, hasta tanto no se aclare la responsabilidad del contratista.

8.4. ASPECTOS LEGALES

La Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., se permite informar el estado del contrato de obra en sus aspectos legales y Jurídicos.

- Mediante oficio No 1-2019-22780 del día 6 de Septiembre de 2019, la Interventoría radicado la ACTUALIZACIÓN SOBRE EL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-21755 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2019 Y EL RADICADO No. 1-2019-21921 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2019 "ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C." , en los aspectos EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

- Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F114 del día 30 de Septiembre de 2019 y radicado No 1-2019-23911 del día 30 de Septiembre la Interventoría dio la RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.", en los aspectos técnicos y de suministro de equipos para la sede de IMPRENTA DISTRITAL y CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN.

- Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F158 del 18 de Octubre de 2019 y radicado No 1-2019-26340 del 30 de Septiembre la Interventoría dio la ALCANCE AL OFICIO CON RADICADO No 1-2019-25222 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019 RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 4233000-731-2019 DE 2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C."

- Mediante la resolución No 744 del día 20 de Noviembre de 2019 Por medio de la cual se cesa el proceso administrativo sancionatorio del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 del contrato de obra pública 4233000-731-2019.

- Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F-281 se recomendó la APLICACIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES DEL CONTRATO DE OBRA No 423300 731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C." - SEDE CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

- Se culmina la ejecución de actividades de obra al frente SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN al día 17 de Marzo de 2020 se realiza recorrido de obra, se realiza observaciones por calidad de las obras y se levanta acta de recorrido No 147 del día 17 de marzo de 2020, donde la interventoría requiere contratista frente a la calidad de la instalación de la Adoquín de plazoleta, acabado de la viga canal perimetral del filtro y pasarela deck.

- Se culmina la ejecución de actividades de obra al frente SEDE MANZANA LIÉVANO, el día 20 de Enero de 2020, quedando pendiente por parte de la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, la prueba a la transferencia, prueba esta que se dispuso para realizar el 14 de Marzo de 2020, prueba que no se pudo llevar acabo, debido a que existió para ese momento actividades en la sede que no permitió realizar la prueba.

- Mediante oficio No AU-INTERV-SGA-4233000-730-2019-0F-363 del día 24 de Marzo de 2020 la Interventoría solicito SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4233000-731-2019 DE 2019, "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DIFERENTES OBRAS E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. debido a:

"(...) Hemos recibido el oficio No PS04-404-20 del 21 de Marzo de 2020 con asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO, por parte del CONSORCIO PRUNI SEDES 04, donde el contratista de obra solicita la suspensión al contrato de obra No 4233000-731-2019 a partir del 24 de Marzo de 2020, bajo la siguiente consideración:

1. *" (...) En virtud a lo decretado por la Presidencia de la Republica, en donde se ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 de marzo, a las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las 00:00 horas y a lo establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Decreto 90 del 19 de Marzo de 2020 en donde se limita totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas...(...)"*

La Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA una vez revisado y verificado los argumentos expuesto y toda vez que las actividades que se encuentran ejecutando en la SEDE IMPRENTA son actividades de obra que requiere mano de obra calificada y no calificada, así como, de la presencia permanente de los profesionales y personal operativo en las instalaciones de la SEDE y ante la imposibilidad y prohibición de la presencia del recurso humano, considera procedente recomendar a la entidad SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR, suspender el contrato de obra desde el 24 de Marzo de 2020 y hasta 13 de Abril de 2020, por las razones ya expuestas en el presente documento, adjuntamos a la misma el oficio de la solicitud hecha por el CONSORCIO PRUNI SEDES 04...(...)"

Se suspende el contrato de obra y de interventoría y dos (2) ocasiones más, y hasta el 10 de mayo de 2020, reiniciando los contratos de obra y de interventoría el 11 de Mayo de 2020, los motivos de la suspensiones, fueron debido por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se culminó el frente de CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN al día 17 de Marzo de 2020 se realiza recorrido de obra, por observaciones por calidad de las obras y se levanta acta de recorrido No 147 del día 17 de marzo de 2020, donde la interventoría requiere contratista frente a la calidad de la instalación de la Adoquín de plazoleta, acabado de la viga canal perimetral del filtro y pasarela Deck, requerimientos que fueron subsanados por el CONSORCIO PRUNI SEDES 04.

- Se culminó la ejecución de actividades de obra de la SEDE MANZANA LIÉVANO, el día 20 de Enero de 2020,

- Se culminó la ejecución de las actividades de obra de la SEDE CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, el día 17 de Marzo de 2020.

- Culmino la ejecución de actividades de obra al frente SEDE IMPRENTA DISTRITAL a fecha del 28 de Noviembre de 2020,

- A Corte del día 28 de noviembre 2020 se evidencia un programado financiero general del contrato de obra del $ $6,125,696,025.10 que corresponde al 100% con respecto a un ejecutado $ $6,125,696,025.10 que corresponde al 100%, el contratista CONSORCIO PRUNI SEDES 04

- Se informa un programado financiero en la sede IMPRENTA DISTRITAL de $ $ 3,880,804,067.00 que corresponde al 100% con respecto a un ejecutado $ 3.842.457.623.00 que corresponde al 95,38%,

- Se informa el estado del balance del contrato para la sede IMPRENTA DISTRITAL realizado por la interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA, con todos y cada uno de los análisis de precios unitarios no previstos presentados a la fecha del presente informe mensual.

  - Valor de la sede según el modificatorio del 29 de Mayo de 2020 IMPRENTA DISTRITAL: $ 3,880,804,066

  - Valor de la sede IMPRENTA DISTRITAL con corte al 28 de Noviembre de 2020: $ 3.842.457.623.00

  - Saldo a favor de la sede: $ 38.346.443.00

- La Interventoría informa que a la fecha del día 28 de Noviembre de 2020, fecha de corte del presente informe mensual se ha facturado el 94% del contrato de obra, lo que corresponde a 5,817,999,781 pagado al contratista de obra el mismo valor.

- De igual manera, para el contrato de interventoría se ha facturado el 90% que corresponde a $ 966,259,668.

.

- El día 26 de Febrero de 2021 se energiza la sede IMPRENTA DISTRITAL, por parte del operador de RED ENEL CODENSA.

- Se firma acta de terminación el día 28 de Diciembre de 2020.
