USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 9 DEL DÍA 10 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 16 MES 08 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ANRO JOSE IZQUIERDO MAZENETH

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 8,411,494,331
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8,411,494,331
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Plazo prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 4,550,689,198
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 4,550,689,198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2,523,448,293

FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2,523,448,293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	6.76%	12.05%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 568,617,017	$ 1,013,215,508.91
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	6.76%	12.05%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 568,617,017	$ 1,013,215,508.91

EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	6.76%	12.05%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 568,617,017	$ 1,013,215,508.91
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	6.76%	12.05%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 568,617,017	$ 1,013,215,508.91

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas								
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
COCUC	8	8	8	8	8	5	0	45
EPMSC PAMPLONA	0	0	0	0	0	0	0	0
RM BUCARAMANGA	7	7	7	7	7	0	0	35
EPAMS GIRON	7	7	7	7	7	7	7	49
EPMSC ARAUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BARRANCABERMEJA	8	8	8	8	8	6	0	46
EPMSC AGUACHICA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	7	7	7	7	7	0	0	35
EPMSC SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC VELEZ	8	8	8	8	8	8	8	56
SAN GIL	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC OCAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC MALAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0	0	0	0	0	0	0	0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 9 DEL DÍA 10 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 16 MES 08 AÑO 2020

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Fisico)	% Ejecutado (Fisico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	0.33%	0.33%	0.84%	1.17%	0%	GNG_USPEC_2020_EMER_OEIRNETE_104, se informo a la USPEC, sobre la situacion de retiro de personal de obra en COCUC y RM Bucarmanga.
EPMSC PAMPLONA	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	
RM BUCARAMANGA	1.20%	1.20%	74.02%	19.29%	55%	Definicion de especificciones tecnicas por parte de USPEC para el diseño de baños. Por medio oficio G_USPEC_2020_EMER_OEIRNETE_104, se informo a la USPEC, sobre la situacion de retiro de personal de obra en COCUC y RM Bucarmanga.
EPAMS GIRON	4.19%	4.19%	30.25%	29.74%	1%	Observaciones de estudio de suelos y diseño placa carpa medicalizada.
EPMSC ARAUCA	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	
EPMSC BARRANCABERMEJA	21.19%	21.19%	59.82%	61.54%	-2%	
EPMSC AGUACHICA	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	1.87%	1.87%	11.67%	3.26%	8%	Definicion de especificciones tecnicas por parte de USPEC para el diseño de baños. Por medio oficio G_USPEC_2020_EMER_OEIRNETE_104, se informo a la USPEC, sobre la situacion de retiro de personal de obra en COCUC y RM Bucarmanga.
EPMSC SOCORRO	0%	0%	0.00%	1.17%	-1%	
EPMSC VELEZ	12%	11.64%	96.00%	94.68%	1%	Pendiente fabricacion y entrega de 5 puertas.
SAN GIL	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	
EPMSC OCAÑA	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	
EPMSC MALAGA	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	A la fecha no se tiene orden de visita por parte de la USPEC

EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0%	0%	0.00%	0.00%	0%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1,Asistencia a comites semanles y adicionales (USPEC-CONTRATISTA-INTERVENTORIA)

2. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_104, por el cual se remite a la entidad contratatnte USPEC, informacion con el fin de poner en contexto a la mencionada, de la situacion presentada con el personal contratado para la ejecucion de las labore soperativas de los ERON Cocuc y RM Bucaramanga.

3. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_105, por el cual se remite a la entidad contratatnte USPEC, la manifestacion por parte del contratista de obra Bulding S.A.S., el cual se abstiene de aceptar acogerse al uso de los listdos de precios LEGIS, argumentando a la variacion de precios debido a la pandemia por la que se esta atravesando actualmente.

4. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_106, por el cual se remite a la entidad contratatnte USPEC, informe semanal No. 08 de secguimiento contrato de obra 138-2020.

5. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_107, por el cual se remite a Building S.A.S. , aprobacion de estudio de suelos y diseño de placa EPAMS GIRON.

6. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_108, por el cual se remite a la entidad contratatnte USPEC, s, aprobacion de estudio de suelos y diseño de placa EPAMS GIRON.

COCUC

Adecuacion Area Aislaimiento

• Desmonte manual de camastro en perfilería de acero con estructura unificada y anclada al piso. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

• Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2" tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

• Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarrearble. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

• Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100 Lm.,120X30X15 fabricada en lamina cold rolled calibre 20, difusor tipo prismático y acrílico de alta resistencia, tubos LED de 18W en policarbonato, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.

• Limpieza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. Incluye aseo de las áreas intervenidas e implementos para trabajos en altura.

• Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.

• Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros.

RM BUCARAMANGA

Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento.
• Resanes de Regatas red hidraulica para duchas.
• Suministro e instalacion de teja termoacustica para zona de aislamiento.
• Rellenos para rampa de acceso para zona de aislamiento.

EPAMS GIRÓN

Atención iluminación perimetral.
Se realizo el desmonte y montaje de luminarias externas.

Adecuación área de aislamiento.
• Aseo general y limpieza final se realizo acta de entrega de espacios de dicha zona el dia sabado 15-08-2020.

• SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE PAREDES
Posterior al lavado de las paredes de las celdas y pasillos de la recepcion, se procedió a aplicar la pintura cuando la superficie se encontraba totalmente seca y en óptimas condiciones para ser pintada. Para esta actividad se suministró 1 capa de imprimante y 2 capas de vinilo plástico tipo 1 con el fin de garantizar un acabo adecuado y estético. Se incluyen paredes de celdas y pasillos del patio UTE en el segundo piso.

• DESMONTE Y MONTAGE CABLEADO DE LUMINARIAS SOBREPUESTAS EN TECHO.
Se llevó a cabo el desmonte y montaje de cableado de luminarias sobrepuestas en el techo de los pasillos de la UTE.
Se llevó a cabo el desmonte la pintada de las puertas y sus correspondientes marcos en las zonas de patio

• SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CON SOSCO PARA PISO. Se realizo la instalacion de las rejillas de las celdas de la zona UTE

• Resanes en paredes de celdas UTE

• ENCHAPE PARA BAÑO PRIMER PISO
Se realizo el enchape para el baño faltante en la zona de recepcion.

• INSTALACION DE SANITARIOS ANTIVANDALICOS
Se realizo una preinstalacion de los baños retirados para limpieza.

• SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS
Se realizo el suministro e instalacion de un combo sanotario en ceramica para la zona de recepcion.

EPMSC BARRANCABERMEJA

adecuacion area de aislaimiento.

• Friso y estuco para paredes del segundo piso asi como estuco y pintura para la bodega del segundo piso
• Mortero y enchape para salon principal de zona e aislamiento.
• Enchape para baterias sanitarias construidas en la zona de aislamiento.
• Desmonte,mantenimiento,montaje de techo de zona de aislamiento.

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

• Se continua la demarcacion y excavacion para la viga cimiento de la malla perimetral del plantel.
• Se suminstraron 11 rejas para la zona de sanidad debido a una emergencia y posible fuga de los ppl al interior de la misma.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA	10	MES	08	AÑO	2020	AL	DÍA	16	MES	08	AÑO	2020

EPMSC VELEZ

Reparación de portón eléctrico externo., dicha actividad ya esta culminada falta realizar recibo de obra

Adecuación área de aislamiento.
• Enchape de piso y pared para salon de aislamiento.
• Suministro e instalacion de sanitario y lavamanos.
• Suministro e instalacion de drywall.
• Estuco y pintura.
• Se realiza pintura para paredes de pasillo y techo de paillos del tercer piso y puntos fijos de los patios.
• Suministro e istalacion de plastico de aislamiento en tercer piso y puntos fijos.
• Suministro e instalacion de sanitarios y lavamanos de celdas de tercer piso.

10. A la fecha se encuentra viabilizado por la interventoria actividades generales en 13 centros penitenciarios de 14, lo cual corresponde al 93% de los centros, actualmente se encuentran en proceso de revision los presupuesto y programaciones por parte de esta interventoria.

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo y del cual, esta Interventoria aprobo al afecha las siguientes ordenes de giro:

1.Orden de giro No. 01 por un valor de $ 730.016.498
2.Orden de giro No. 02 por un valor de $ 12.295.208.
3.Orden de giro No. 03 por un valor de $ 55.624.323.
4.Orden de giro No. 04 por un valor de $ 57.579.838.
5.Orden de giro No. 05 por un valor de $ 95,295,817
6.Orden de giro No. 06 por un valor de $ 15,231,331

REGISTRO FOTOGRAFICO

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría

Firma

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE SEGUMIENTO ESTADO AVANCE DE OBRA - REGIONAL ORIENTE - CONTRATO 138

FECHA DE CORTE: 09/08/2020

ESTATUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ESTABLECIMIENTO	PRESUPUESTO USPEC ANEXO TÉCNICO - RECURSO PREVISORIO	DISTRIBUCIÓN DE RECURSO - SEGÚN MONTO CONTRACTUAL ADJUNDICADO	PESO % COSTO INICIAL PREVISORIO / COSTO ADJUDICADO	AREA A ATENDER SEGÚN DIAGNÓSTICO	PRESUPUESTO POR ÁREAS (DIAGNÓSTICO)*	No. DE CUPOS HABILITADOS ZONA DE AISLAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR SEGÚN DIAGNOSTICO	PRESUPUESTO VIABILIZADO ZONAS DE AISLAMIENTO*	% DE INVERSION EN ZONA DE AISLAMIENTO	INICIO Y AVANCE OBRA				OBSERVACIONES
													ESTATUS FECHA DE INICIO	ESTATUS FECHA DE TERMINACION	% AVANCE OBRA EJECUTADA	% DE AVANCE OBRA POR EJECUTAR	
En comunicación con el Dr. Javier Luna, Secretario de Salud de Arauca, informa que han recibido y revisado el protocolo, una vez se defina y se envíe el personal para inicio de obras se definirá el procedimiento para el seguimiento. Si son de la región se evaluará la zona donde viven y se dará la autorización para trabajar, si son de fuera del departamento de Arauca deben allegar prueba negativa de COVID-19 antes del viaje, llegar al municipio a realizar aislamiento preventivo obligatorio y en el municipio realizar nuevamente prueba para descartar contagio, si dichas pruebas son negativas se autoriza el inicio, de lo contrario no será autorizado		ARAUCA	EPMSC ARAUCA	$ 460,000,000.00	$ 459,078,872.82	99.80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 271,810,021.14	23	$ 533,738,564.78	$ 221,039,835.22	41.41%	28/08/20	14/12/20	0.00%	100.00%	
							Adecuación sanidad, para cupo de zonas de aislamiento, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 221,039,835.22						$ -	$ 533,738,564.78	
							Adecuación rancho, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 40,888,708.42								
APROBADO		CESAR	EPMSC AGUACHICA	$ 380,000,000.00	$ 379,239,068.85	99.80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona de Alojamiento CCV)	$ 260,449,297.94	40	$ 408,850,776.85	$ 25,367,491.25	6.20%	25/08/20	21/11/20	0.00%	100.00%	
							Adecuación sanidad, (Celda Recepcion)	$ 54,195,601.69									
							Adecuación rancho, (Celda Recepcion)	$ 68,838,385.97						$ -	$ 408,850,776.85	
							Adecuación área para carpa medicalizada, (Celda Recepcion)	$ 25,367,491.25								
Con correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 la Secretaría de Planeación Municipal de Ocaña envía formato de registro para ser diligenciado con el listado y los datos del personal que estará trabajando en obra, para hacer el seguimiento a la implementación del protocolo. El formato de registro incluye el listado del personal que estará		NORTE DE SANTANDER	EPMSC OCAÑA	$ 120,000,000.00	$ 119,759,705.95	99.80%	Mantenimiento parcial iluminación externa y semiexterna, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 71,647,711.08	39	$ 150,706,977.99	$ 43,624,949.18	28.95%	26/08/20	23/09/20	0.00%	100.00%	
							Reparación tramo concertina, (Zona 3 UTE Femenina)	$ 35,434,317.73									
							Adecuación área de aislamiento, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 43,624,949.18						$ -	$ 150,706,977.99	
APROBADO			EPMSC PAMPLONA	$ 270,000,000.00	$ 269,459,338.39	99.80%	Adecuación zonas externas, (Zona Perimetral PPL) muro GRANJA y garitas	$ 149,403,149.27	28	$ 340,667,277.81	$ 136,730,652.21	40.14%	28/08/20	27/10/20	0.00%	100.00%	
							Adecuación zonas educativas, (Zona de Educativas salon 1 y 2)	$ 54,533,476.33									
							Adecuación área de aislamiento, ZONA DE SANIDAD	$ 136,730,652.21						$ -	$ 340,667,277.81	
APROBADO			COCUC	$ 2,400,000,000.00	$ 2,395,194,119.05	99.80%	Reparación de muros afectados en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 84,072,955.45	348	$ 2,675,762,203.52	$ 779,580,986.34	29.13%	08/20	12/20	1.17%	98.83%	
							Reparación redes eléctricas en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 619,347,825.33									
							Adecuación 3 áreas de sanidad, (Norte, Sur y Central)	$ 706,386,406.27									

	ORIENTE							Adecuación zonas externas, (Mediana Seguridad Hombres)	$ 486,374,030.13								$ 31,306,417.78	$ 2,644,455,785.74	
								Adecuación área de aislamiento, (Zona de Visitas Conyugales) (Comunidad terapeutica) (bloque minima) (BLOQUE 22)	$ 779,580,986.34										
APROBADO		SANTANDER	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 130,000,000.00	$ 129,739,681.45	99.80%		Revisión y arreglo sistema eléctrico general, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 18,358,340.00	10	$ 116,166,247.97	$ 97,807,907.97	84.20%	22/07/20	27/08/20	61.54%	38.46%	
								Adecuación área de aislamiento, (Area de Recepcion)	$ 97,807,907.97							$ 71,488,709.00	$ 44,677,538.97	
			EPMSC MÁLAGA	$ 120,000,000.00	$ 119,759,705.95	99.80%												
Con fecha 24 de julio de 2020, se realizó la inscripción en la plataforma de la página de la Alcaldía, de acuerdo a la información de la misma plataforma, se dará respuesta en 5 días hábiles			EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	$ 120,000,000.00	$ 119,759,705.95	99.80%		Refuerzo de seguridad	$ 105,000,000.00		$ 120,000,000.00					0.00%	100.00%	
								Arreglo de redes sanitarias	$ 15,000,000.00							$ -	$ 120,000,000.00	
Con oficio SPDM 230-01-04-631 de 6 de agosto de 2020, la Secretaría de Planeación expide autorización provisional, que solo permite actividades de desplazamiento de personal directivo, adecuación de áreas de obra y consecución de personal. Una vez se tenga dicho personal se debe remitir para evaluar aislamiento preventivo de 14 días y dar AUTORIZACIÓN DEFINITIVA para inicio de obra.			EPMSC SOCORRO	$ 225,000,000.00	$ 224,549,448.66	99.80%		Adecuación área de aislamiento, ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5	$ 275,961,384.42	96	$ 275,961,384.42	$ 275,961,384.42	100.00%	28/08/20	09/09/20	0.00%	100.00%	
																$ -	$ 275,961,384	
APROBADO			EPMSC VELEZ	$ 145,000,000.00	$ 144,709,644.69	99.80%		Reparación de portón eléctrico externo, (Entrada Centro Penitenciario)	$ 85,719,291.19	78	$ 168,954,633.15	$ 83,235,341.96	49.26%	22/07/20	18/08/20	94.68%	5.32%	
								Adecuación área de aislamiento, pabellosnes 1 y 2 3er piso, zona de aislamiento casino y zona de aislamiento casita sanidad	$ 83,235,341.96							$ 159,966,246.67	$ 8,988,386.48	
APROBADO			EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	$ 1,000,000,000.00	$ 997,997,549.60	99.80%		construccion malla de cerramiento tipo guayana faltante, (Zona 3) y cerrmiento guayana zona carpa medicalizada	$ 305,254,367.23	30	$ 739,995,940.40	$ 359,584,213.63	48.59%	22/07/20	18/12/20	3.26%	96.74%	
								Construccion de REPEL hospitalarios Y ADECUACION ZONA DE SANIDAD	$ 75,157,359.54									
								construccion de las placas viales tipo MR 43 en el asedero y respel por onden de tutela	$ 359,584,213.63							$ 24,123,867.66	$ 715,872,072.74	
Con el oficio N° 0.1168.2020 del 27 de julio de 2020, la Secretaría de Control Urbano del municipio, da respuesta a la solicitud de aprobación del protocolo, informando que se debe cumplir con el comunicado externo N° 001 2020, el cual incluye el listado de personal con datos completos,			EPMS SAN GIL	$ 170,000,000.00	$ 169,659,583.43	99.80%		Adecuación área de aislamiento, (Comunidad	$ 165,236,874.23	16	$ 207,606,019.59	$ 165,236,874.23	79.59%	27/08/20	13/11/20	0.00%	100.00%	
								reforzamiento de seguridad, puerta rejas , mallas y	$ 42,369,145.36							$ -	$ 207,606,019.59	
APROBADO			EPAMS GIRÓN	$ 2,400,000,000.00	$ 2,395,194,119.05	99.80%		Atención iluminación perimetral, (Patio de Visitas 3)	$ 202,697,968.30	188	$ 2,310,174,651.34	$ 1,258,439,778.12	54.47%	25/07/20	21/09/20	29.74%	70.26%	
								Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico, (Pasillo 3 Pabaellon 1)	$ 54,895,990.47									
								Adecuación rancho	$ 794,140,914.45							$ 687,045,941.31	$ 1,623,128,710.03	
								Adecuación área de aislamiento, (Patio de Visitas 1,2 y 3, 60 cupos), (recepcion 20 cupos), (UTE 108 cupos)	$ 1,258,439,778.12									
APROBADO			RM BUCARAMANGA	$ 488,371,727.31	$ 487,393,787.15	99.80%		Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento, (Salon de Area Educativa)	$ 167,393,890.66	23	$ 203,651,251.89	$ 167,393,890.66	82.20%	24/07/20	22/09/20	19.29%	80.71%	

							arreglos tanque de agua	$ 36,257,361.23						$ 39,284,326.49	$ 164,366,925	
11	TOTALES:	14	$ 8,428,371,727.31	$ 8,411,494,331.00	99.80%			856	$ 8,252,235,929.71	$ 3,367,595,978.72	46.01%			$ 1,013,215,508.91	$ 7,239,020,420.80	
			VALOR ANTICIPO 30%:	$ 2,523,448,299.30				*No se cuenta con informacion para esta columna	98.11%	40.04%				12.05%	86.06%	
														$	8,252,235,929.71	
			1ER. PAGO:	$ -					$ 159,258,401.29					98.11%		
			2DO. PAGO:	$ -												

*Los valores de esta columna se sacaraon por porcentaje de acuerdo al valor de la propuesta ganadora, ya que

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



Se realizo relleno para rampa de acceso a zona de aislamiento (educativas)



Construccion de rampa de acceso a zona de aislamiento



Construccion de muro en concreto ciclopeo para rampa de acceso



Se realizo instalacion de red hidraulica para las duchas construidas



Construccion de lavatraperos



Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA




Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.



Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.



Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.

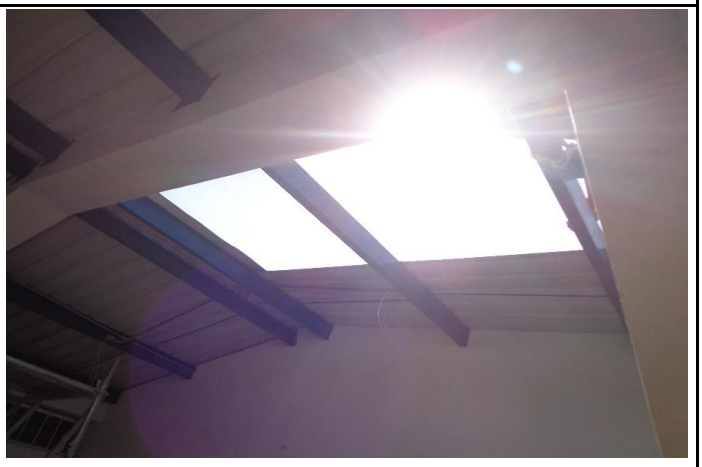

Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.



Relleno para rampa de acceso



friso para filos en la zona Apertura de vano para Comunicación de salones de aislamiento

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS


REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.

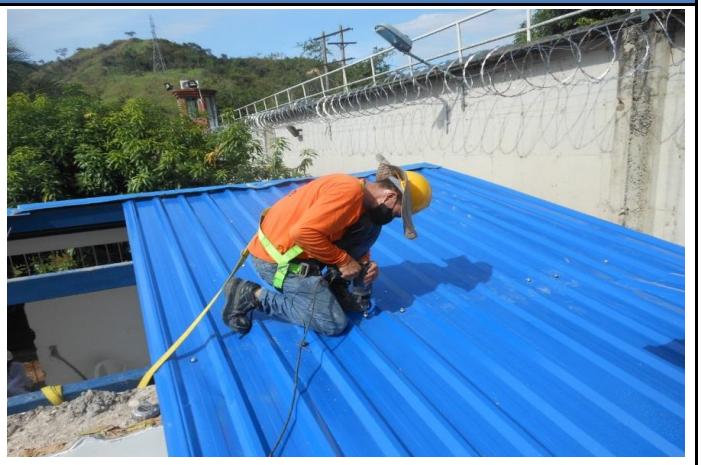

Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.



Suministro e instalacion de teja teromoacustica en zona de aislamiento.



Reparacion de mamposteria averiada en la apertura de la red electrica.



Reparacion de mamposteria averiada en la apertura de la red electrica.



Reparacion de mamposteria averiada en la apertura de la red electrica.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA



Mortero de nivelacion salon principal de aislamiento



Estuco y pintura para zona de oficina segundo piso



Desmonte de estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona primer piso.



e estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona



Desmonte de estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona primer piso.



Desmonte de estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona primer piso.





USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA

	
Desmonte de estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona primer piso.	Desmonte de estructura y cubierta para realce de la misma para cubrimiento zona primer piso.
	
Realce de mamposteria existente.	Realce de mamposteria existente.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA



Reforzamiento de estructura



Realce de mamposteria existente.



Realce de mamposteria existente.



Instalacion de correas para techo




Suministro e instalacion de cubierta de etrnit



Enchape para piso salon de aislamiento



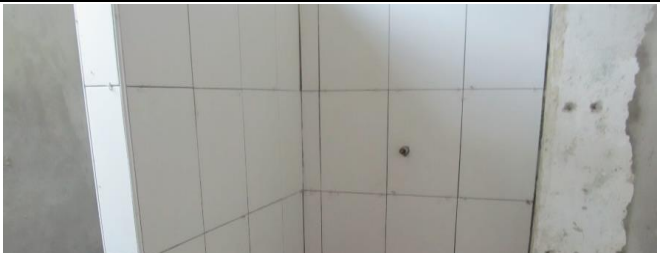


USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA

	
Suministro e instalacion de enchape para bateria sanitarias.	Suministro e instalacion de enchape para bateria sanitarias.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.





USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.	Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Excavacion manual para viga cimiento de cerramiento.



Anclajes para reja de seguridad de zona de sanidad



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
Suministro de rejas de seguridad.	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS


REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPAMS GIRON



Suministro e instalacion de sanitario en zona de recepcion.

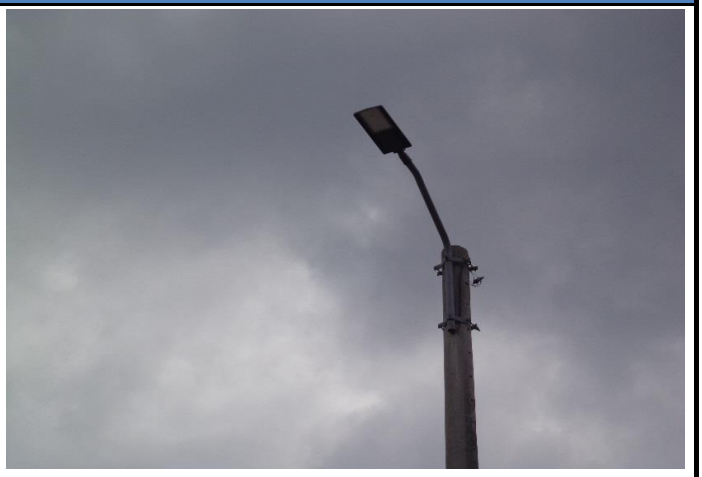

Suministro e instalacion de luminarias externas en la zona de circulacion.



Pintura paredes y techo en la zona UTE segundo piso.



Pintura paredes y techo en la zona UTE segundo piso.



Pintura paredes y techo en la zona UTE segundo piso.



Pintura paredes y techo en la zona UTE segundo piso.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPAMS GIRON



Instalacion de sanitarios antivandalicos zona de Recepcion.



Instalacion de sanitarios antivandalicos zona de Recepcion.



Suministro e instalacion de luminarias internas celdas UTE.



Suministro e instalacion de luminarias internas celdas UTE.



Suministro e instalacion de luminarias internas celdas UTE.



Suministro e instalacion de luminarias externas celdas UTE.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPAMS GIRON



Lavada de celdas zona de UTE (unidad de tratamiento especial).



Lavada de celdas zona de UTE (unidad de tratamiento especial).



Suministro e instalacion de regillas zona UTE



Resanes menores en zona UTE



Pintura para celdas UTE.



Pintura para pasillos Zona UTE.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ



Suministro e instalacion de enchape para zona de aislamiento de funcionarios.



Suministro e instalacion de enchape para zona de aislamiento de funcionarios.



Suministro e instalacion de estructura para drywall zona aislamiento funcionarios.



Suministro e instalacion de plastico para aislamiento de zona covid para internos.



Suministro e instalacion de plastico para aislamiento de zona covid para internos.



Suministro e instalacion de plastico para aislamiento de zona covid para internos.






USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ

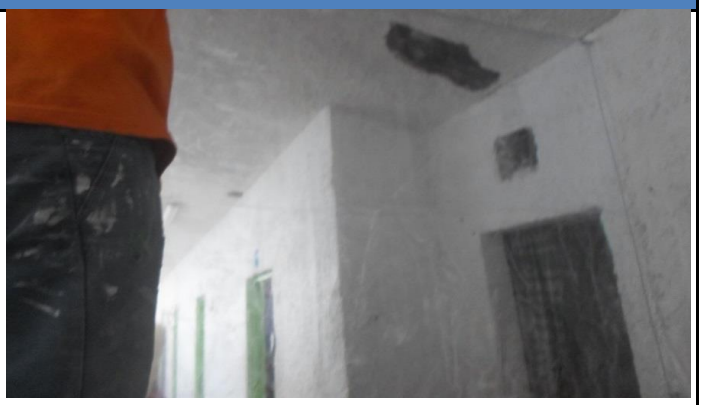	
Suministro e instalacion de plastico para aislamiento de zona covid para internos.	Suministro e instalacion de plastico para aislamiento de zona covid para internos.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ



Instalacion de red electrica nueva zona aislamiento Funcionarios.



Suministro e instalacion de baranda metaslica para acceso a zona aislamiento de funcionarios.



Suministro e instalacion de baranda metaslica para acceso a zona aislamiento de funcionarios.



Desmonte de sanitarios existentes patio 1 y 2




Montaje de sanitarios patio 1 y 2.



montaje de lavamanos patio 1 y 2.






USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ

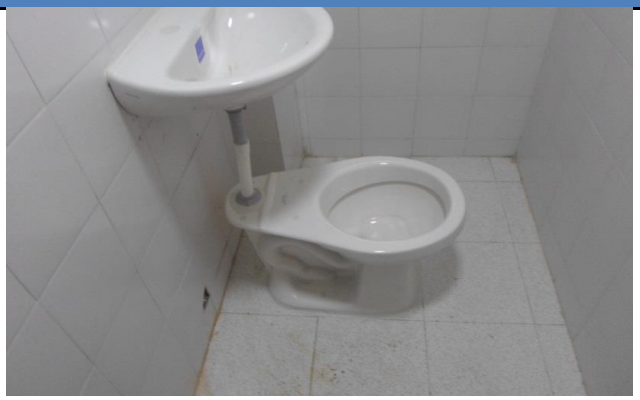	
Sanitarios desmontados y entregados al inpec	Suministro e instalacion sanitario zona de aislamiento funcionarios.

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ

	
Suministro e instalacion luminarias zona de aislamiento de funcionarios.	Suministro e instalacion luminarias zona de aislamiento de funcionarios.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	9	DEL	DÍA: 10	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2020

COCUC



MEJORAMIENTO DE CABLEADO LAMPARAS



SUMINISTRO LUMINARIA ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W



LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES CON HIDROLAVADORA



TRASIEGO DE MATERIALES DE OBRA DESDE LA ENTRADA DEL CENTRO
