USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

**SEMANA No.:** 10 DEL DÍA 17 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 23 MES 08 AÑO 2020

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

**OBJETO:**

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

**CONTRATO No.:** 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ANRO JOSE IZQUIERDO MAZENETH

**Contrato de Obra:**

| | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 8.411.494.331 |
| Valor Adicional | $ 0 |
| Valor Actualizado | $ 8.411.494.331 |
| Plazo Inicial | Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero. |
| Plazo prorroga | NA |
| Plazo Actualizado | NA |
| Fecha Inicio | 16/06/2020 |
| Fecha Terminación Inicial | 31/12/2020 |
| Fecha Terminación Actual | 31/12/2020 |

**Contrato de Interventoría:**

| | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 4.550.689.198 |
| Valor Adicional | $ 0 |
| Valor Actualizado | $ 4.550.689.198 |
| Plazo Inicial | Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero |
| Plazo Prorroga | NA |
| Plazo Actualizado | NA |
| Fecha Inicio | 16/06/2020 |
| Fecha Terminación Inicial | 31/12/2020 |
| Fecha Terminación Actual | 31/12/2020 |

## SEGUIMIENTO FINANCIERO

**PROGRAMADO**

| TOTAL CONTRATO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| PAC Programado (%) | 0% | 30% |
| Valor del PAC Programado ($) | $ - | $ 2.523.448.293 |

**FACTURADO**

| TOTAL CONTRATO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| PAC Programado (%) | 0% | 30% |
| Valor del PAC Programado ($) | $ - | $ 2.523.448.293 |

## OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

**PROGRAMADO**

| TOTAL CONTRATO | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Actividades Programadas (%) | 0,95% | 13,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 79.909.196 | $ 1.093.376.523,79 |

| ETAPA DE EJECUCION | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Actividades Programadas (%) | 0,95% | 13,00% |
| Valor de Actividades Programadas ($) | $ 79.909.196 | $ 1.093.376.523,79 |

**EJECUTADO**

| TOTAL CONTRATO | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Actividades Ejecutadas (%) | 0,95% | 13,00% |
| Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 79.909.196 | $ 1.093.376.523,79 |

| ETAPA DE EJECUCION | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Actividades Ejecutadas (%) | 0,95% | 13,00% |
| Valor de Actividades Ejecutadas ($) | $ 79.909.196 | $ 1.093.376.523,79 |

## RESUMEN CRONOGRAMA

| | Horas Trabajadas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento ERON | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | TOTAL |
| COCUC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| EPMSC PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM BUCARAMANGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| EPAMS GIRON | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| EPMSC ARAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC BARRANCABERMEJA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| EPMSC AGUACHICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC ERE JP BUCARAMANGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| EPMSC SOCORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC VELEZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 45 |
| SAN GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC OCAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 |

| Establecimiento - ERON / Actividad | % Programado (Fisico) | % Ejecutado (Fisico) | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado | % Variación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCUC | 9,87% | 0,68% | 22,36% | 1,85% | 21% | |
| EPMSC PAMPLONA | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0% | |
| RM BUCARAMANGA | 8,35% | 18,64% | 71,78% | 20,00% | 52% | Por medio oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_121, se remitio observaciones con espeficicaciones tecnicas para el diseño de baño tipo. |
| EPAMS GIRON | 30,02% | 30,02% | 60,27% | 59,76% | 1% | Observaciones de estudio de suelos y diseño placa carpa medicalizada. |
| EPMSC ARAUCA | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% | |
| EPMSC BARRANCABERMEJA | 42,21% | 2,24% | 90,90% | 63,78% | 27% | |
| EPMSC AGUACHICA | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0% | |
| EPMSC ERE JP BUCARAMANGA | 4,39% | 2,66% | 77,03% | 5,92% | 71% | Por medio oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_121, se remitio observaciones con espeficicaciones tecnicas para el diseño de baño tipo. |
| EPMSC SOCORRO | 0% | 0% | 0,00% | 1,17% | -1% | |
| EPMSC VELEZ | 0,17% | 0,32% | 100,00% | 95,00% | 5% | |
| SAN GIL | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0% | |
| EPMSC OCAÑA | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0% | |
| EPMSC MALAGA | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0% | A la fecha no se tiene orden de visita por parte de la USPEC |
| EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI | 23% | 23,33% | 23,33% | 23,33% | 0% | |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

**REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA**

**SEMANA No.:** 10 DEL DÍA 17 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 23 MES 08 AÑO 2020

## SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1.Asistencia a comites semanles y adicionales (USPEC-CONTRATISTA-INTERVENTORIA)

2. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_109, por el cual se remite a la entidad contratatnte USPEC, informes semanales ajustados4,5,6, y 8.

3. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_110, por el cual se remite a Building S.A.S., aprobacion orden de giro No. 07 correspondiente al anticipo No. 138-2020.

4. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_111, por el cual se remite a Building S.A.S., oficio E-2020-007588, por medio del cual la entidada contratante USPEC, solicita el cambio de una de las areas de aislaimiento inicialmente determinadas.

5. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_112, por el cual se remite a Building S.A.S., concepto de no objeccion por parte de la entidad contratante USPEC, de las actividades expuestas en el informe de visita a San Vicente de Chucuri.

6. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_113, por el cual se remite a Building S.A.S., aprobacion de la orden de giro de No. 06 ajustada.

7. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_114, por el cual se remite a Building S.A.S., observaciones a los APUS contractuales radicados mediante oficio ERON-ORIENTE-138-103.

8. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_115, por el cual se remite a USPEC, informe semanal No. 08 de seguimiento del contrato de obra No.138-2020.

9. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_116, por el cual se remite a USPEC, informe quincenal No. 04 de seguimiento del contrato de obra No.138-2020.

10. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_117, por el cual se remite a Building S.A.S.,observaciones al diseño del baño tipo.

**COCUC**
- Desmonte manual de camastro en perfileria de acero, habitaciones conyugales.
- Tubería PVCP 1/2" RDE, adecuaciones de Baños conyugales.
- Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", Baños y redes de aguas lluvias segundo piso Conyugales.
- Salida para iluminación interna, adecuación de habitaciones y pasillos conyugales.
- Desmonte de lámparas de interior, habitaciones conyugales.
- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros, aplicado en tres (3) capas, pasillos y habitaciones conyugales.
- Limpieza de muros existentes con hidrolavadora Pasillos y habitaciones conyugales.
- Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) para lavar y descurtir manchas de cemento mortero y otros, pasillos y habitaciones conyugales.
- Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros.

**EPMSC BARRANCABERMEJA**
Se adelantaron actividades propias la adecuacion de la zona de aislaimietno - Patio de sol, actividades de arreglo de humedales, impermeabilizacion y labore de pintura, la adecuacion de esta area es de un 95% de avance.

**EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ**
Se encuentra en fabricacion en taller de paneles para cerramiento tipo guayana y cerramiento cubierta patio de ropas.

**EPMSC VELEZ**
Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas asi:
piso 3 patio 2 zona de alislamiento - Avance 100%
piso 3 patio 1 zona de alislamiento 2 - Avance 95 %.
zona casa sanidad zona de aislamiento 3 - Avance 95%.
zona casa casino zona de aislamiento 4 - Avance 100%

**EPMSC ERE JP BUCARAMANGA**
Se realizo demolicion zonas de construccion placa y bateria de baños.
Se esta en la figuracion de acero para la construccion de la viga para el cerramiento de la guayana,
Se estan fabricando los paneles de cerramiento de guayana,
Se fabricarion e instalaron las 11 rejasde seguridad para sanidad donde se presento el intento de fuga en el mes de Agosto.
Zona de aislamiento - Solados muro guayana- Estado de avance 100%.

**EPAMS GIRÓN**
Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas asi:
zona de aislamiento patio de visitas 1 - Avance 100%. Entregada
zona de aislamiento patio de visitas 2 - Avance 95%. En proceso placa para catrpa medicalizada.
zona de aislamiento patio de visitas 3 - Avance 42%. Esta lista la iluminacion del primer piso esta pendiente por iniciar actividades piso 2
zona de aislamiento recepcion - Avance 72%. Se esta trabajando en la instalacion de los fluxometros y malla de seguridad
UTE primer piso Avance 0% No se ha podido ingresar, alli se encuentran PPL.
UTE segundo piso - Avance 75% se adelantan actividades de pintura, redes electricas e iluminacion y reparacion de las cerraduras.

**RM BUCARAMANGA**
Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas asi:
Area de aislamiento 1 educativas - Avance 51,78%.
Area de aislamiento 2 talleres - Avance 15,23%
Se esta en ajuste a los diseños de baños tipo para la zona de educativas,.
Se realizo la reposicion de la cubierta,
Se termino la impermeabilizacion del tanque del agua y se instalaron las exclusas,
Se iniciaron labores en la zona de aislmamiento 2 talleres con la adecuacion de las redes hidrosanitarias, pañetes impermeabilizados e instalacion de enchape

10. A la fecha se encuentra viabilizado por la interventoria actividades generales en 14 centros penitenciarios de 14, lo cual corresponde al 100% de los centros, actualmente se encuentran en proceso de revision los presupuesto y programaciones por parte de esta interventoria.

## AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo y del cual, esta Interventoria aprobo al afecha las siguientes ordenes de giro:

1.Orden de giro No. 01 por un valor de $ 730.016.498
2.Orden de giro No. 02 por un valor de $ 12.295.208.
3.Orden de giro No. 03 por un valor de $ 55.624.323.
4.Orden de giro No. 04 por un valor de $ 57.579.838.
5.Orden de giro No. 05 por un valor de $ 95,295,817
6.Orden de giro No. 06 por un valor de $ 15,231,331
7.Orden de giro No. 07 por un valor de $ 204,949,175

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoria

Firma

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# MATRIZ DE SEGUMIENTO ESTADO AVANCE DE OBRA - REGIONAL ORIENTE - CONTRATO 138

FECHA DE CORTE:

| ESTATUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD | REGIONAL | DEPARTAMENTO | ESTABLECIMIENTO | AREA A ATENDER SEGÚN DIAGNÓSTICO | PRESUPUESTO POR ÁREAS (DIAGNÓSTICO)* | No. DE CUPOS HABILITADOS ZONA DE AISLAMIENTO | PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR SEGÚN DIAGNOSTICO | PRESUPUESTO VIABILIZADO ZONAS DE AISLAMIENTO* | % DE INVERSION EN ZONA DE AISLAMIENTO | INICIO Y AVANCE OBRA | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ESTATUS FECHA DE INICIO | ESTATUS FECHA DE TERMINACION | % AVANCE OBRA EJECUTADA | % DE AVANCE OBRA POR EJECUTAR | |
| En comunicación con el Dr. Jovel Suna, Secretaria de Salud de Arauca, informa que han recibido y revisado el protocolo, una vez se defina y se envíe el personal para inicio de obras se definirá el procedimiento para el seguimiento. Si son de la región se evaluará la zona donde viven y se dará la autorización para trabajar, si son de fuera del departamento de Arauca deben allegar prueba negativa de COVID-19 antes del viaje, llegar al municipio a realizar aislamiento preventivo obligatorio y en el municipio realizar nuevamente prueba para descartar contagio, si dichas pruebas son negativas se autoriza el inicio, de lo contrario no será autorizado | | ARAUCA | EPMSC ARAUCA | Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona 1 Reclusion de Mujeres) | $ 271.810.021,14 | 23 | $ 533.738.564,78 | $ 221.039.835,22 | 2,00% | 28/08/20 | 14/12/20 | 0,00% | 100,00% | |
| | | | | Adecuación sanidad, para cupo de zonas de aislamiento, (Zona 2 Reclusion de Mujeres) | $ 221.039.835,22 | | | | | | | $ - | $ 533.738.564,78 | |
| | | | | Adecuación rancho, (Zona 2 Reclusion de Mujeres) | $ 40.888.708,42 | | | | | | | | | |
| APROBADO | | CESAR | EPMSC AGUACHICA | Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona de Alojamiento CCV) | $ 260.449.297,94 | 40 | $ 408.850.776,85 | $ 25.367.491,25 | 6,20% | 25/08/20 | 21/11/20 | 0,00% | 100,00% | |
| | | | | Adecuación sanidad, (Celda Recepcion) | $ 54.195.601,69 | | | | | | | $ - | $ 408.850.776,85 | |
| | | | | Adecuación rancho, (Celda Recepcion) | $ 68.838.385,97 | | | | | | | | | |
| | | | | Adecuación área para carpa medicalizada, (Celda Recepcion) | $ 25.367.491,25 | | | | | | | | | |
| Con correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 la Secretaría de Planeación Municipal de Ocaña envía formato de registro para ser diligenciado con el listado y los datos del personal que estará trabajando en obra, para hacer el seguimiento a la implementación del protocolo. El formato de registro | | NORTE DE SANTANDER | EPMSC OCAÑA | Mantenimiento parcial iluminación externa y semiexterna, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos) | $ 71.647.711,08 | 39 | $ 150.706.977,99 | $ 43.624.949,18 | 28,95% | 26/08/20 | 23/09/20 | 0,00% | 100,00% | |
| | | | | Reparación tramo concertina, (Zona 3 LTE Femenina) | $ 35.434.317,73 | | | | | | | $ - | $ 150.706.977,99 | |
| | | | | Adecuación área de aislamiento, (Zona 1 Granja Carpas o Zona de Parqueaderos) | $ 43.624.949,18 | | | | | | | | | |
| APROBADO | | | EPMSC PAMPLONA | Adecuación zonas externas, (Zona Perimetral PPL) muro GRANJA y garitas | $ 149.403.149,27 | 28 | $ 340.667.277,81 | $ 136.730.652,21 | 40,14% | 28/08/20 | 27/10/20 | 0,00% | 100,00% | |
| | | | | Adecuación zonas educativas, (Zona de Educativas salon 1 y 2) | $ 54.533.476,33 | | | | | | | $ - | $ 340.667.277,81 | |
| | | | | Adecuación área de aislamiento, ZONA DE SANIDAD | $ 136.730.652,21 | | | | | | | | | |
| APROBADO | | | COCUC | Reparación de muros afectados en motines, (Primera Generacion Sector Norte) | $ 84.072.955,45 | 348 | $ 2.675.762.203,52 | $ 779.580.986,34 | 29,13% | 04/08/20 | 04/12/20 | 1,85% | 98,15% | |
| | | | | Reparación redes eléctricas en motines, (Primera Generacion Sector Norte) | $ 619.347.825,33 | | | | | | | $ 49.501.600,77 | $ 2.626.260.602,75 | |
| | | | | Adecuación 3 áreas de sanidad, ( Norte, Sur y Central) | $ 706.386.406,27 | | | | | | | | | |
| | | | | Adecuación zonas externas, (Mediana Seguridad Hombres) | $ 486.374.030,13 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIENTE | | | Adecuación área de aislamiento, (Zona de Visitas Conyugales) (Comunidad terapeutica) (bloque minima) (BLOQUE 22) | $ 779.580.986,34 | | | | | | | | | |
| APROBADO | | SANTANDER | EPMSC BARRANCABERMEJA | Revisión y arreglo sistema eléctrico general, (Zona 1 Reclusion de Mujeres) | $ 18.358.340,00 | 10 | $ 116.166.247,97 | $ 97.807.907,97 | 84,20% | 22/07/20 | 27/08/20 | 63,78% | 36,22% | |
| | | | | Adecuación área de aislamiento, (Area de Recepcion) | $ 97.807.907,97 | | | | | | | $ 74.090.832,96 | $ 42.075.415,01 | Se adelantaron actividades propias la adecuacion de la zona de aislaimietno - Patio de sol, actividades de arreglo de humedales, impermeabilizacion y labore de pintura, la adecuacion de esta area es de un 95% de avance. |
| | | | EPMSC MÁLAGA | | | | | | | | | | | |
| Con fecha 28 de julio de 2020, se realizó la inscripción en la plataforma de la página de la Alcaldía, de acuerdo a la información de la misma plataforma, se dará respuesta en 2 días hábiles | | | EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Refuerzo de seguridad | $ 105.000.000,00 | | $ 120.000.000,00 | | | | | 23,33% | 76,67% | |
| | | | | Arreglo de redes sanitarias | $ 15.000.000,00 | | | | | | | $ 27.996.000,00 | $ 92.004.000,00 | |
| Con oficio SPDM 230-01-04-621 del 6 de agosto de 2020, la Secretaria de Planeación expide autorización provisional, que esta permite actividades de desplazamiento de personal directivo, adecuación de áreas de obra y consecución de personal. Una vez se tenga dicho personal se debe remitir para evaluar aislamiento preventivo de 14 días y dar AUTORIZACIÓN DEFINITIVA para inicio de obra. | | | EPMSC SOCORRO | Adecuación área de aislamiento, ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5 | $ 275.961.384,42 | 96 | $ 275.961.384,42 | $ 275.961.384,42 | 100,00% | 28/08/20 | 09/09/20 | 1,17% | 98,83% | |
| | | | | | | | | | | | | $ 3.228.748,20 | $ 272.732.636 | |
| APROBADO | | | EPMSC VELEZ | Reparación de portón eléctrico externo, (Entrada Centro Penitenciario) | $ 85.719.291,19 | 78 | $ 168.954.633,15 | $ 83.235.341,96 | 49,26% | 22/07/20 | 18/08/20 | 95,00% | 5,00% | |
| | | | | Adecuación área de aislamiento, pabellosnes 1 y 2 3er piso, zona de aislamiento casino y zona de aislamiento casita sanidad | $ 83.235.341,96 | | | | | | | $ 160.506.901,50 | $ 8.447.731,66 | EPMSC VELEZ<br>Se adelantaron actividades en las zonas de aislamiento asignadas asi:<br>piso 3 patio 2 zona de alislamiento - Avance 100%<br>piso 3 patio 1 zona de alislamiento 2 - Avance 95 %.<br>zona casa sanidad zona de aislamiento 3 - Avance 95%.<br>zona casa casino zona de aislamiento 4 - Avance 100% |
| APROBADO | | | EPMSC ERE JP BUCARAMANGA | construccion malla de cerramiento tipo guayana faltante, (Zona 3) y cerrmiento guayana zona carpa medicalizada | $ 305.254.367,23 | 30 | $ 739.995.940,40 | $ 359.584.213,63 | 48,59% | 22/07/20 | 18/12/20 | 5,92% | 94,08% | Zona de aislamiento - Solados muro guayana- Estado de avance 100%. |
| | | | | Construccion de REPEL hospitalarios Y ADECUACION ZONA DE SANIDAD | $ 75.157.359,54 | | | | | | | $ 43.807.759,67 | $ 696.188.180,73 | |
| | | | | construccion de las placas viales tipo MR 43 en el asedero y respel por onden de tutela | $ 359.584.213,63 | | | | | | | | | |
| Con fecha 28 de julio de 2020, la Secretaria de Control Urbano del municipio, da respuesta a la solicitud de aprobación del protocolo, informando que se debe cumplir con el comunicado externo N° 250-2030, el cual incluye el listado de personal con datos completos, afiliaciones al sistema de seguridad | | | EPMS SAN GIL | Adecuación área de aislamiento, (Comunidad | $ 165.236.874,23 | 16 | $ 207.606.019,59 | $ 165.236.874,23 | 79,59% | 27/08/20 | 13/11/20 | 0,00% | 100,00% | |
| | | | | reforzamiento de seguridad, puerta rejas mallas y | $ 42.369.145,36 | | | | | | | $ - | $ 207.606.019,59 | |
| APROBADO | | | EPAMS GIRÓN | Atención iluminación perimetral, (Patio de Visitas 3) | $ 202.697.968,30 | 188 | $ 2.310.174.651,34 | $ 1.258.439.778,12 | 54,47% | 25/07/20 | 21/09/20 | 30,02% | 69,98% | |
| | | | | Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico, (Pasillo 3 Pabaellon 1) | $ 54.895.990,47 | | | | | | | $ 693.514.430,33 | $ 1.616.660.221,01 | |
| | | | | Adecuación rancho | $ 794.140.914,45 | | | | | | | | | |
| | | | | Adecuación área de aislamiento, (Patio de Visitas 1,2 y 3, 60 cupos), (recepcion 20 cupos), (UTE 108 cupos) | $ 1.258.439.778,12 | | | | | | | | | |
| APROBADO | | | RM BUCARAMANGA | Actividades de sanidad y agua potable al interior de establecimiento, (Salon de Area Educativa) | $ 167.393.890,66 | 23 | $ 203.651.251,89 | $ 167.393.890,66 | 82,20% | 24/07/20 | 22/09/20 | 20,00% | 80,00% | Area de aislamiento 1 educativas - Avance 51,78%.<br>Area de aislamiento 2 talleres - Avance 15,23% |
| | | | | arreglos tanque de agua | $ 36.257.361,23 | | | | | | | $ 40.730.250,38 | $ 162.921.002 | |
| 11 | TOTALES: | | 14 | | | 856 | $ 8.252.235.929,71 | $ 3.367.595.978,72 | 43,20% | | | $ 1.093.376.523,79 | $ 7.158.859.405,91 | |
| | | | | | | *No se cuenta con informacion para esta columna | 98,11% | 40,04% | | | | 13,00% | 85,11% | |
| | | | | | | | | | | | | $ | 8.252.235.929,71 | |
| | | | | | | | | | | | | 98,11% | | |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| SEMANA No.: | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RM BUCARAMANGA

| | |
|---|---|
|  |  |
| Retiro manual de tuberia Baño Existente | Retiro manual de tuberia Baño Existente |
|   |  |
| Desmonte manual aparatos sanitarios de tipo ceramico - Baño Existente | Desmonte manual aparatos sanitarios de tipo ceramico - Baño Existente |
|  |  |
| Demolición de muro para la nueva puerta que conecta el baño existente con el salón 2 | Demolición de muro para la nueva puerta que conecta el baño existente con el salón 2 |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| SEMANA No.: | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RM BUCARAMANGA

| | |
|---|---|
|  |  |
| Demolición de muro para la nueva puerta que conecta el baño existente con el salón 2 | Demolición de muro para la nueva puerta que conecta el baño existente con el salón 2 |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| SEMANA No.: | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EPMSC BARRANCABERMEJA



Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra



Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.



Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.



Mantenimiento general correctivo de cubierta existente

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| SEMANA No.: | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

| | |
|---|---|
|  |  |
| GUAYANA TRAMO 1 | GUAYANA TRAMO 1 |
|  |  |
| Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de | Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de |
|  |  |
| Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio. | Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio |
|  |  |
| Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta | Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta |

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| SEMANA No.: | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## EPMSC VELEZ



Suministro e instalación de porton de máxima seguridad




Suministro e instalación de porton de máxima seguridad



Desmonte de Tomacorrientes Normales, regulados , tierra aislado GH con polo a Tierra - Zona aislamiento




Revisión del sistema de suministro eléctrico para el motor de traslación, del porton de acceso al penal



Suministro e instalación de barandas en rampa de zona de aislamiento



Suministro e instalación de barandas en rampa de zona de aislamiento

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

| | 10 | DEL | DÍA: 17 | MES: 08 | AÑO: 2020 | AL | DÍA: 23 | MES: 08 | AÑO: 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

COCUC



CENTRO CARCELARIO COCUC




ENTRADA AL CENTRO CARCELARIO COCUC



DESMONTE MANUAL DE CAMASTRO EN PERFILERIA DE ACERO



CAMASTRO ANCLAJE AL PISO

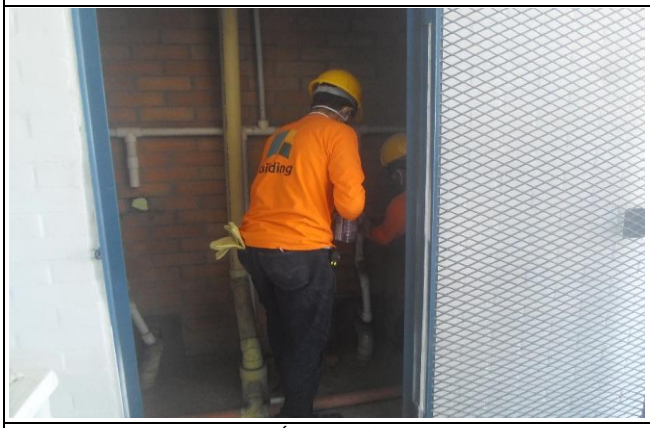

TUBERÍA PVCP 1/2" RDE



ADECUACIONES DE BAÑOS CONYUGALES

| | |
|---|---|
|  |  |
| SALIDA PARA ILUMINACIÓN INTERNA | SALIDA PARA ILUMINACIÓN PASILLOS |
|  |  |
| LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES CON HIDROLAVADORA | LIMPIEZA DE MUROS PASILLOS CONYUGALES |
|  |  |
| PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 | PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 HABITACIONES CONYUGALES |
|  |  |
| CUBIERTA A IMPERMEABILIZAR CONYUGALES | IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS |
