USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA	24	MES	08	AÑO	2020	AL	DÍA	30	MES	08	AÑO	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ANRO JOSE IZQUIERDO MAZENETH

Contrato de Obra:		Contrato de Interventoría:	
Valor Inicial	$ 8.411.494.331	Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ 0	Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8.411.494.331	Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.	Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo prorroga	NA	Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA	Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020	Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020	Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020	Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO			FACTURADO		
TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%	PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293	Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	**TOTAL CONTRATO**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5,96%	36,57%	Actividades Ejecutadas (%)	2,76%	15,76%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 501.325.062	$ 3.076.083.476,85	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 232.157.244	$ 1.325.676.421,94
ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO	**ETAPA DE EJECUCION**	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	5,96%	36,57%	Actividades Ejecutadas (%)	2,76%	15,76%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 501.325.062	$ 1.325.676.421,94	Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 232.157.244	$ 1.325.676.421,94

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas								
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
COCUC	8	8	8	8	8	5	0	45
EPMSC PAMPLONA	0	0	0	0	0	0	0	0
RM BUCARAMANGA	8	8	8	8	8	5	0	45
EPAMS GIRON	8	8	8	8	8	5	0	45
EPMSC ARAUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BARRANCABERMEJA	8	8	8	8	8	5	0	45
EPMSC AGUACHICA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	8	8	8	8	8	5	0	45
EPMSC SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC VELEZ	8	8	8	8	8	5	0	45
SAN GIL	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC OCAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC MALAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0	0	0	0	0	0	0	0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 11 DEL DÍA 24 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 30 MES 08 AÑO 2020

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Fisico)	% Ejecutado (Fisico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	4,98%	1,22%	27,34%	3,07%	-24%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC PAMPLONA	10,8%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
RM BUCARAMANGA	17,82%	9,42%	89,59%	29,42%	-60%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPAMS GIRON	5,64%	5,64%	35,89%	35,89%	0%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC ARAUCA	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
EPMSC BARRANCABERMEJA	7,67%	29,70%	98,57%	93,48%	-5%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC AGUACHICA	4%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	2,54%	5,62%	79,57%	11,54%	-68%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC SOCORRO	7%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
EPMSC VELEZ	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0%	EN EJECUCION, VER COMENTARIO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
SAN GIL	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
EPMSC OCAÑA	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO INICIADO
EPMSC MALAGA	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	A la fecha no se tiene orden de visita por parte de la USPEC
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	6,31%	0,00%	6,31%	0,00%	-6%	NO INICIADO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1.Asistencia a comites semanles y adicionales (USPEC-CONTRATISTA-INTERVENTORIA)

2. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_118, por el cual se remite a Building S.A.S., traslado oficio No. E2020-007687 solicitud informe fechas de inicio de obras remitido por la USPEC

3. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_119, por el cual se remite a Building S.A.S., aObservaciones APUS, PDT Y presupuestos,radicados mediante oficios Eron- Oriente-138-104, No. Eron-Oriente-138-105. Eron-Oriente-138-109, No.Eron-Oriente138-110, No.Eron-Oriente-138-111,No.Eron-Oirente113

4. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_120, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informes semanales ajustados 9.

5. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_121, por el cual se remite a Building S.A.S., por el cual se remite a Building S.A.S., Alcance oficio Gng-Uspec-2020-Emer-Oriente-1117, Observaciones diseño baños, RM Modelo

6. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_122, por el cual se remite a Building S.A.S., observaciones a los diseños del depósito de residuos, placa carpa medicalizada y rampas del eron cpms bucaramanga, contrato de obra no. 138 de 2020.

7. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_123, por el cual se remite a Building S.A.S., observaciones corte parcial no.1 y no.2 radicado mediante oficio no. eron-oriente-138-118

8. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_124, por el cual se remite a Building S.A.S.,observaciones informe mensual no.2 radicado mediante oficio no. eron-oriente-138-117.

9. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_125, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, respuesta oficios no.e-2020-007268, no.e-2020-007269 y e-2020-007714, remitidos por el USPEC.

10. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_126, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, solicitud permisos de movilización permanente para desplazamiento del residente de interventoría en la regional oriente para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

11. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_127, por el cual se remite a la direccion de EPAMS Giron, solicitud ingreso de personal de interventoría al epams giron de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

12. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_128, por el cual se remite a la direccion de RM Bucaramanga, solicitud ingreso de personal de interventoría al RM BUCARAMANGA de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

13. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_129, por el cual se remite a la direccion de EPMSC ERE JP Bucaramanga, solicitud ingreso de personal de interventoría al EPMSC BARRANCABERMEJA de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

14. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_130, por el cual se remite a la direccion de EPMSC Barrancabermeja, solicitud ingreso de personal de interventoría al EPMSC BARRANCABERMEJA de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

15. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_131, por el cual se remite a la direccion de EPMSC San Gil, solicitud ingreso de personal de interventoría al EPMSC San Gil de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

16. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_132, por el cual se remite a la direccion de EPMSC Velez, solicitud ingreso de personal de interventoría al EPMSC Velez de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

17. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_133, por el cual se remite a la direccion deCPMSC San Vicente de Chucuri, solicitud ingreso de personal de interventoría al San Vicente de Chucuri, de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

18. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_134, por el cual se remite a la direccion de CPMSC Socorro, solicitud ingreso de personal de interventoría al CPMSC Socorro de la regional oriente, para labores de seguimiento y control al contrato de obra no.138 de 2020.

19. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_135, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informes semanal 10.

20. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_136, por el cual se remite a Building S.A.S, aprobacion orden de giro No 08 del anticipo.

21. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_136, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informe mensual No. 01 de obra.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA	24	MES	08	AÑO	2020	AL	DÍA	30	MES	08	AÑO	2020

RM BUCARAMANGA
Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento.
*- Acabado de piso con Baldosa de Cerámica de 33,8x33,8 cm
*- Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm
*- Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2"
*- Relleno manual con recebo común compactado
*- Placa de contrapiso en concreto e.20 cm f'c=4000 PSI
*- Acero de 60.000 PSI 420 MPa
*- Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18
*- Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 16, con mirilla de 30x20 cm en varilla lisa de acero ø.=3/4" y marco propio en lámina doblada y soldada

EPAMS GIRÓN
Atención iluminación perimetral
*- Suministro e instalación a cualquier altura luminaria tipo Urbana (alumbrado publico) Led de 100w, 120/220 voltios
*- Suministro e instalación luminaria tipo reflector Led de 100w, 120/220 voltios
Adecuación área de aislamiento
*- Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas
*- Suministro e instalación de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100 Lm.,120X30X15
*- Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para sanitario de discapacitados
*- Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm
*- Suministro e instalación de Platinas en acero de 0.50x0.32 cm con 4 mm de espesor y 4 perforaciones de diámetro=1/2".
*- Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.
*- Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina, r
*- Placa de contrapiso en concreto e.20 cm f'c=4000 PSI.
*- Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.
*- Corte en placa para dilataciones de piso
*- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros

EPMSC BARRANCABEMEJA
Adecuación área de aislamiento
*- Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm
*- Estuco acrílico
*- Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm
*- Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA
Reparación malla de cerramiento averiada
*- Concreto pobre de limpieza /solado e.=5 cm f'c=2000 PSI.
*- Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm
*- Acero de 60.000 PSI 420 Mpa
Adecuación área de aislamiento
*- Instalación de mallas IMT sobre los marcos de seguridad en las ventanas

EPMSC VELEZ
Reparación de portón eléctrico externo
*- Ya se encuentra ejecutado el presente hito
Adecuación área de aislamiento
*- Pintura epoxi-poliamida para acabado
*- Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras fabricadas en sistema drywall
*- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros
*- Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina
*- Suministro e instalación de luminaria LED 2x36W T8 hermética
*- Suministro e instalación luminaria tipo reflector Led de 200w, 120/220 voltios,
*- Desmonte manual de luminarias
Se entregaron obras el 28 y 29 de agosto de 2020, obra, interventoria e INPEC
El lunes 31 se realizo visita del USPEC para recibo de las obras no se dio ninguna observacion

COCUC
Adecuación área de aislamiento
*- Desmonte manual de camastro en perfilería de acero con estructura unificada y anclada al piso
*- Desmonte de cableado 3x#12 existente en el área, que presta servicio en la iluminación interna de las celdas y pasillos
*- Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada en alturas mayores a 10,00 m
*- Desmonte de lamparas de interior
*- Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2"
*- Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR
*- Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG LS-HFFR
*- Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros, aplicado en tres (3) capas
*- Suministro y aplicación de pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo
*- Suministro y aplicación de pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1
*- Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas
• Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico)
• Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra con una distancia promedio de 300 metros.
• Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en muro
• Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro
• Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados

10. A la fecha se encuentra viabilizado por la interventoria actividades generales en 13 centros penitenciarios de 14, lo cual corresponde al 92% de los centros, a la fecha en el ERON EPMSC MALAGA A no se tiene orden de visita por parte de la USPEC.

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo y del cual, esta Interventoria aprobo al afecha las siguientes ordenes de giro:

1.Orden de giro No. 01 por un valor de $ 730.016.498
2.Orden de giro No. 02 por un valor de $ 12.295.208.
3.Orden de giro No. 03 por un valor de $ 55.624.323.
4.Orden de giro No. 04 por un valor de $ 57.579.838.
5.Orden de giro No. 05 por un valor de $ 95,295,817
6.Orden de giro No. 06 por un valor de $ 15,231,331
7.Orden de giro No. 07 por un valor de $ 204,949,175
8.Orden de giro No. 08 por un valor de $ 23,001,275

REGISTRO FOTOGRAFICO

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría

Firma

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE SEGUMIENTO ESTADO AVANCE DE OBRA - REGIONAL ORIENTE - CONTRATO 138

FECHA DE CORTE: 23/08/2020 — 23/08/2020

ESTATUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ESTABLECIMIENTO	PRESUPUESTO USPEC ANEXO TÉCNICO - RECURSO PREVISORIO	DISTRIBUCIÓN DE RECURSO - SEGÚN MONTO CONTRACTUAL ADJUDICADO	PESO % COSTO INICIAL PREVISORIO / COSTO ADJUDICADO	AREA A ATENDER SEGÚN DIAGNOSTICO	PRESUPUESTO POR ÁREAS (DIAGNÓSTICO)*	No. DE CUPOS HABILITADOS ZONA DE AISLAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR SEGÚN DIAGNOSTICO	PRESUPUESTO VIABILIZADO ZONAS DE AISLAMIENTO*	% DE INVERSION EN ZONA DE AISLAMIENTO	INICIO Y AVANCE OBRA: ESTATUS FECHA DE INICIO	ESTATUS FECHA DE TERMINACION	% AVANCE OBRA EJECUTADA	% DE AVANCE OBRA POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
En comunicación con el Dr. Javier Luna, Secretaria de Salud de Arauca informó que no cuenta con medios diferenciados para el traslado y un aislado al personal para inicio de obras se definirá el procedimiento para el seguimiento. Si sucede la región se evaluará la zona donde viven y se dará la autorización para trabajar, si son de fuera del departamento de Arauca deben allegar prueba negativa de COVID 19 antes del viaje, llegar al municipio e realizar aislamiento preventivo obligatorio y en el municipio realizar nuevamente prueba para descartar contagio, si dichas pruebas son negativos se autoriza el inicio, de lo contrario no será autorizado		ARAUCA	EPMSC ARAUCA	$ 460.000.000,00	$ 459.078.872,82	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 271.810.021,14	23	$ 533.738.564,78	$ 221.039.835,22	41,41%	28/08/20	14/12/20	0,00%	100,00%	
							Adecuación sanidad, para cupo de zonas de aislamiento, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 221.039.835,22							$ -	$ 533.738.564,78	
							Adecuación rancho, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 40.888.708,42									
APROBADO		CESAR	EPMSC AGUACHICA	$ 380.000.000,00	$ 379.239.068,85	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona de Alojamiento CCV)	$ 260.449.297,94	40	$ 408.850.776,85	$ 25.367.491,25	6,20%	25/08/20	21/11/20	0,00%	100,00%	Se inicia el 1 de septiembre
							Adecuación sanidad, (Celda Recepcion)	$ 54.195.601,69									
							Adecuación rancho, (Celda Recepcion)	$ 68.838.385,97							$ -	$ 408.850.776,85	
							Adecuación área para carpa medicalizada, (Celda Recepcion)	$ 25.367.491,25									
Con correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 la Secretaría de Planeación Municipal de Ocaña envía formato de registro para ser diligenciado con el listado y los datos del personal que estará trabajando en obra, para hacer el seguimiento a la implementación del protocolo. El formato de registro		NORTE DE SANTANDER	EPMSC OCAÑA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Mantenimiento parcial iluminación externa y semiexterna, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 71.647.711,08	39	$ 150.706.977,99	$ 43.624.949,18	28,95%	26/08/20	23/09/20	0,00%	100,00%	
							Reparación tramo concertina, (Zona 3 UTE Femenina)	$ 35.434.317,73									
							Adecuación área de aislamiento, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 43.624.949,18							$ -	$ 150.706.977,99	
APROBADO			EPMSC PAMPLONA	$ 270.000.000,00	$ 269.459.338,39	99,80%	Adecuación zonas externas, (Zona Perimetral PPL) muro GRANJA y garitas	$ 149.403.149,27	28	$ 340.667.277,81	$ 136.730.652,21	40,14%	28/08/20	27/10/20	0,00%	100,00%	Se inicia el 2 de septiembre
							Adecuación zonas educativas, (Zona de Educativas salon 1 y 2)	$ 54.533.476,33									
							Adecuación área de aislamiento, ZONA DE SANIDAD	$ 136.730.652,21							$ -	$ 340.667.277,81	
APROBADO			COCUC	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Reparación de muros afectados en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 84.072.955,45	348	$ 2.675.762.203,52	$ 779.580.986,34	29,13%	04/08/20	04/12/20	3,07%	96,93%	
							Reparación redes eléctricas en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 619.347.825,33									
							Adecuación 3 áreas de sanidad, (Norte, Sur y Central)	$ 706.386.406,27									
							Adecuación zonas externas, (Mediana Seguridad Hombres)	$ 486.374.030,13							$ 82.145.899,65	$ 2.593.616.303,87	Lavado de muros, pintura, reparacion de cubierta, arreglo de redes electricas, e instalaciones sanitarias, impermeabilizacion cubierta

							Adecuación área de aislamiento, (Zona de Visitas Conyugales) (Comunidad terapeutica) (bloque minima) (BLOQUE 22)	$ 779.580.986,34									
APROBADO	ORIENTE	SANTANDER	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 130.000.000,00	$ 129.739.681,45	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 18.358.340,00	10	$ 116.166.247,97	$ 97.807.907,97	84,20%	22/07/20	27/08/20	93,48%	6,52%	Arreglo de humedades, impermeabilizacion y labores de pintura	
							Adecuación área de aislamiento, (Area de Recepcion)	$ 97.807.907,97							$ 108.592.208,60	$ 7.574.039,37	Se adelantaron actividades propias la adecuacion de la zona de aislaimietno - Patio de sol, actividades de arreglo de humedales, impermeabilizacion y labore de pintura, la adecuacion de esta area es de un 95% de avance.	
			EPMSC MÁLAGA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%											No se realizo visita, estaba programada para el lunes 1 de junio por orden de la USPEC	
Con fecha 16 de julio de 2020, se realizo la inscripción en la plataforma de la página de la Alcaldía, de acuerdo a la información de la nueva plataforma, se dará respuesta en 5 días hábiles			EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Refuerzo de seguridad	$ 105.000.000,00		$ 120.000.000,00					0,00%	100,00%	Se inicia el montaje y actividades en el ERON el 07 de septiembre de 2020, actualmente se está en la fabricación de las rejas y mallas tipo guyana	
							Arreglo de redes sanitarias	$ 15.000.000,00							$ -	$ 120.000.000,00		
Con oficio 3PSM.CID-01-04-631 del 5 de agosto de 2020, la Secretaría de Planeación expide autorización provisional, que solo permite actividades de desplazamiento de personal directivo, adecuación de áreas de oficina construcción de personal. Una vez se tengan todo personal se deber remitir para evaluar anteriormente pronunciado de 14 días y dar AUTORIZACIÓN DEFINITIVA para inicio de obra.			EPMSC SOCORRO	$ 225.000.000,00	$ 224.549.448,66	99,80%	Adecuación área de aislamiento, ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5	$ 275.961.384,42	96	$ 275.961.384,42	$ 275.961.384,42	100,00%	26/08/20	09/09/20	0,00%	100,00%		
															$ -	$ 275.961.384		
APROBADO			EPMSC VELEZ	$ 145.000.000,00	$ 144.709.644,69	99,80%	Reparación de portón eléctrico externo, (Entrada Centro Penitenciario)	$ 85.719.291,19	78	$ 168.954.633,15	$ 83.235.341,96	49,26%	22/07/20	18/08/20	95,00%	5,00%	EPMSC VELEZ PENDIENTE REVISAR CANTIDADES FINALES EJECUTADAS Este ERON ya fue entregado tanto al INPEC y al USPEC. se está esperando el informe de terminación y el balance de mayores y menores cantidades de obra para cerrar los costos reales de ejecución de las actividades	
							Adecuación área de aislamiento, pabellosnes 1 y 2 3er piso, zona de aislamiento casino y zona de aislamiento casita sanidad	$ 83.235.341,96							$ 160.506.901,50	$ 8.447.731,66		
APROBADO			EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	$ 1.000.000.000,00	$ 997.997.549,60	99,80%	construccion malla de cerramiento tipo guayana faltante, (Zona 3) y cerrmiento guayana zona carpa medicalizada	$ 305.254.367,23	30	$ 739.995.940,40	$ 359.584.213,63	48,59%	22/07/20	18/12/20	11,54%	88,46%	Se autorizo placa para carpa No se han remitido ajustes de baños de acuerdo a mesa de trabajo Se esta en la figuracion de acero para la construccion de la viga para el cerramiento de la guyana Se estan fabricando los paneles de cerramiento de guyana Se fabricaron e instalaron las 11 rejaside seguridad para sanidad donde se presento el intento de fuga en el mes de agosto	
							Construccion de REPEL hospitalarios Y ADECUACION ZONA DE SANIDAD	$ 75.157.359,54							$ 85.395.531,52	$ 654.600.408,88		
							construccion de las placas viales tipo MR 43 en el asedero y repel por onden de tutela	$ 359.584.213,63										
Con el oficio N° C-1106-2020 del 27 de julio de 2020, la Inspección de Control Urbano del municipio, da respuesta a la solicitud de aplicación del protocolo, informando que se debe cumplir con el comunicado externo N° 001-2020, el cual incluye el listado de personal con datos completos,			EPMS SAN GIL	$ 170.000.000,00	$ 169.659.583,43	99,80%	Adecuación área de aislamiento, (Comunidad	$ 165.236.874,23	16	$ 207.606.019,59	$ 165.236.874,23	79,59%	27/08/20	13/11/20	0,00%	100,00%		
							reforzamiento de seguridad, puerta rejas mallas y	$ 42.369.145,36							$ -	$ 207.606.019,59		
APROBADO			EPAMS GIRÓN	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Atención iluminación perimetral, (Patio de Visitas 3)	$ 202.697.968,30	188	$ 2.310.174.651,34	$ 1.258.439.778,12	54,47%	25/07/20	21/09/20	35,89%	64,11%	Se entrego zona de aislamiento 1 Zona 2 se esta realizando la actividad de suministro y compactacion de recebo, se proyecta la fundida de la placa para la instalacion de la carpa medicalizada para el dia 28/08/2020 Iluminacion perimetral lleva un avance del 89% ya que se han presentado problemas de cortos en la redes existentes y ha sido necesario aislar los circuitos para encontrar los daños En la UTE se esta terminando el segundo piso En la recepcion se esta en la instalacion de los sanitarios antivandalicos y reparacion de redes hidraulicas de presion	
							Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico, (Pasillo 3 Pabaellon 1)	$ 54.895.990,47										
							Adecuación rancho	$ 794.140.914,45							$ 829.121.682,37	$ 1.481.052.968,97		
							Adecuación área de aislamiento, (Patio de Visitas 1,2 y 3, 60 cupos), (recepcion 20 cupos), (UTE 108 cupos)	$ 1.258.439.778,12										
APROBADO			RM BUCARAMANGA	$ 488.371.727,31	$ 487.393.787,15	99,80%	Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento, (Salon de Area Educativa)	$ 167.393.890,66	23	$ 203.651.251,89	$ 167.393.890,66	82,20%	24/07/20	22/09/20	29,42%	70,58%	Area de aislamiento 1 educativas - Avance 56,38% Area de aislamiento 2 talleres - Avance 18,53% Se esta a la espera de la entrega de la barreria sanitaria para la zona de educativas, ajustada en mesa de tarbajo Se realizo la reposicion de la cubierta Se termino la impermeabilizacion del tanque del agua y se instalaron las exclusas Inicio labores en la zona de aislamiento 2 talleres con la adecuacion de las redes hidrosanitarias, pañetes impermeabilizados e instalacion de enchape	
							arreglos tanque de agua	$ 36.257.361,23							$ 59.914.198,30	$ 143.737.054		
11	TOTALES:		14	$ 8.428.371.727,31	$ 8.411.494.331,00	99,80%			856	$ 8.252.235.929,71	$ 3.367.595.978,72	46,01%			$ 1.325.676.421,94	$ 6.926.559.507,77		
				VALOR ANTICIPO 30%:	$ 2.523.448.299,30				*Sin se cuenta con información para esta columna	98,11%	40,04%				15,76%	82,35%		
															$	8.252.235.929,71		
				1ER. PAGO:	$ -										98,11%			
				2DO. PAGO:	$ -													

*Los valores de esta columna se sacaron por porcentaje de acuerdo al valor de la orcosuesta ganadora, ya que

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



ENCHAPE DE PARED DUCHAS ZONA EDUCATIVA



ENCHAPE DE PARED DUCHAS ZONA EDUCATIVA



ENCHAPE DE PISO DUCHA Y SANITARIO ZONA DE TALLERES



ENCHAPE DE PISO DUCHA Y SANITARIO ZONA DE TALLERES



CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA EN LA ZONA DE EDUCATIVAS



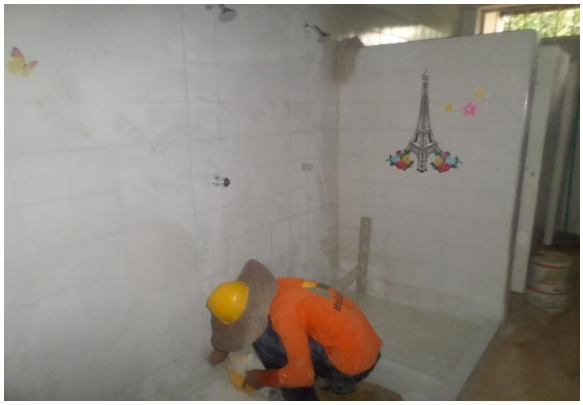
CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA EN LA ZONA DE EDUCATIVAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA

	
INSTALACIÓN DE REJILLA DE SIFÓN DE 2" EN LAS DUCHAS DE EDUCATIVAS	CONSTRUCCION LAVATRAPEROS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA

	
Instalación de cieloraso en superboard.	Aplicación de mortero impermeabilizado.
	
Instalación de enchapes en baños.	Aplicación de mortero impermeabilizado.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
INSTALACIÓN DE MALLA IMT ENR EJAS DE SEGURIDAD	INSTALACIÓN DE MALLA IMT ENR EJAS DE SEGURIDAD
	
INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO
	
FIGURADO DEL ACERO	FIGURADO DEL ACERO
	
DEMOLICION DE MURO	FUNDIDA DE SOLADO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ



Aplicación de pintura epóxica en zona de sanidad.



Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.



Instalación de puesta entamborada en zona de aislamiento.



Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

COCUC

	
PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS
	
ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PUERTAS METÁLICAS
	
DESMONTE DE CABLEADO 3X#12 EXISTENTE	CABLEADO 3X#12

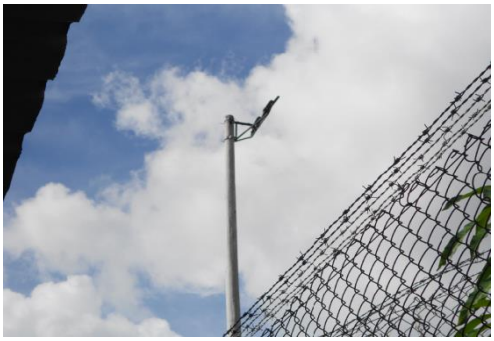
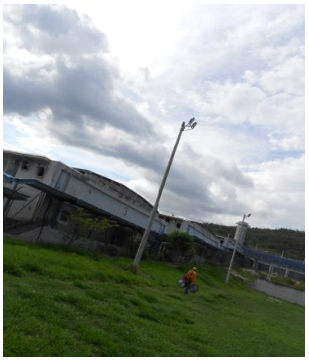
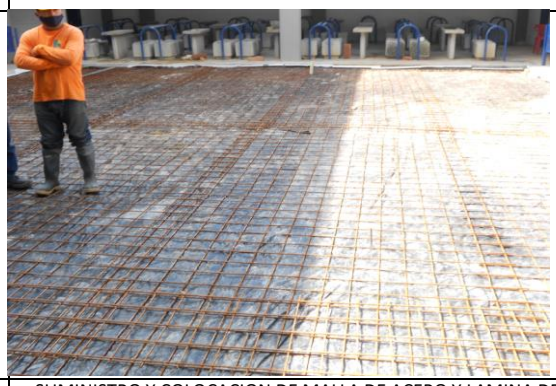
USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

	11	DEL	DÍA: 24	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2020

EPAMS GIRON

	
INSTLALACION DE LUMINARIAS URBANAS EN LOS PABELLONES (INCLUYE DESMONTE)	INSTLALACION DE LUMINARIAS URBANAS EN LOS PABELLONES (INCLUYE DESMONTE)
	
CAMBIO E INSTALACION DE FLUXOMETRO EN CELDA DE LA UTE Y RECEPCION (PILOTO)	CAMBIO E INSTALACION DE FLUXOMETRO EN CELDA DE LA UTE Y RECEPCION (PILOTO)
	
INSTALACION DE PLATINAS EN CELDAS DE LA RECEPCION	INSTALACION DE PLATINAS EN CELDAS DE LA RECEPCION

	
CAMBIO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN LA CANCHA DE FUTBOL	CAMBIO E INSTALACION DE REFLECTORES LED EN LA CANCHA DE FUTBOL
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTAMBORADAS METALICAS EN RECEPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS ENTAMBORADAS METALICAS EN RECEPCION
	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO Y LAMINA DE POLIETILENO PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO Y LAMINA DE POLIETILENO PARA LA PLACA DE CONTRAPISO
	
VIBRACION DE CONCRETO DE PLACA	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y PREPARACION DE ANGULOS PARA INSTALACION DE PANELES EN MALLA METALICA DE LA RECEPCION
