USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 12 DEL DÍA 31 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 06 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: ANRO JOSE IZQUIERDO MAZENETH

Contrato de Obra:	
Valor Inicial	$ 8.411.494.331
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8.411.494.331
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Plazo prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

Contrato de Interventoria:	
Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293

OBRAS EN EJECUCION AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	10,17%	46,74%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 855.448.973	$ 3.931.532.450,31

ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	10,17%	46,74%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 855.448.973	$ 1.439.245.931,06

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,35%	17,11%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 113.555.173	$ 1.439.245.931,06

ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,35%	17,11%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 113.555.173	$ 1.439.245.931,06

RESUMEN CRONOGRAMA

	Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
COCUC	8	8	8	8	8	6	0	46
EPMSC PAMPLONA	0	0	0	0	0	0	0	0
RM BUCARAMANGA	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	4,5	0	47
EPAMS GIRON	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4	0	41,5
EPMSC ARAUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BARRANCABERMEJA	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4	0	41,5
EPMSC AGUACHICA	6	8	8	8	6	0	0	36
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	7	7	7	7	7	4,5	0	39,5
EPMSC SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC VELEZ	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN GIL	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC OCAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC MALAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0	0	0	0	0	0	0	0

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Fisico)	% Ejecutado (Fisico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	8,0%	1,12%	35,33%	4,19%	-31%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC PAMPLONA	24,27%	0%	35,03%	0,00%	-35%	SIN INICIAR
RM BUCARAMANGA	7,03%	4,72%	96,62%	34,14%	-62%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPAMS GIRON	8,40%	1,03%	49,10%	36,92%	-12%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC ARAUCA	6%	0,00%	7,74%	0,00%	-8%	SIN INICIAR
EPMSC BARRANCABERMEJA	1,43%	2,64%	100,00%	96,12%	-4%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC AGUACHICA	12%	0%	16,50%	3,18%	-13%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	12,00%	3,47%	88,73%	15,01%	-74%	VER DESCRIPCION SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
EPMSC SOCORRO	20%	0%	26,92%	0,00%	-27%	SIN INICIAR
EPMSC VELEZ	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0%	TERMINADO
SAN GIL	17%	0%	40,61%	0,00%	-41%	SIN INICIAR
EPMSC OCAÑA	34%	0%	47,02%	0,00%	-47%	SIN INICIAR
EPMSC MALAGA	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO CUENTA CON ACTIVIDADES DEFINIDAS
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	SIN INICIAR

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 12 DEL DÍA 31 MES 08 AÑO 2020 AL DÍA 06 MES 09 AÑO 2020

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1.Asistencia a comites semanles y adicionales (USPEC-CONTRATISTA-INTERVENTORIA)

2. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_142, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, solicitud de modificacion plan de inversion de anticipo .

3. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_143, por el cual se remite a Building S.A.S., oficio E2020-007926, solicitud de informe de razones por las cuales no fue progrmado el PAC.

4. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_144, por el cual se remite a Building S.A.S., planos EPAMS CAS Giron, suministrados por la USPEC.

5. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_145, por el cual se remite a Building S.A.S., aprobacion de hoja de vida especialista estructural contrato No. 138-2020.

6. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_146, por el cual se remite a la entidad contratanTE USPEC, aprobacion con anexos de hoja de vida especialista estructural contrato No. 138-2020.

7. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_147, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informe semanal No 11 de seguimiento de contrato de obra No..138-2020.

8. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_148, por el cual se remite a Building S.A.S., aprobacion de orden de giro No. 09 correpondiente al anticipo del contaro de obra No.138-2020

9. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_149, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informe quincenal No. 05.

10. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_150, por el cual se remite a Building S.A.S., aprobacion de orden de giro No. 10 correspondiente al anticipo del contrato de obra No. 138-2020.

11. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_151, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC., aprobacion de diagnosticos Regioanl Oriente.

12. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_152, por el cual se remite a Building S.A.S., los lineamientos para el tramite de pago de actas parciales y programacion PAC, oficio como complemento de informacion emitida en oficio ERON138-129.

RM BUCARAMANGA
Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento.
1. Resane de muros.
2. Aplicación de estuco.
3. Construcción de muro en mampostería H7.
4. Aplicación de friso.
5. Instalación de enchape en muros
5. Demolición de muro en mampostería.
7. Desmonte de malla de cerramiento.
8. Construcción de muro en ladrillo tolete.

EPAMS GIRÓN
Adecuación área de aislamiento.
1. Desmonte de luminarias de techo anti vandálicas.
2. Instalación de kits de luminarias tipo LED de 18 W.
3. Instalación de enchape de piso de baño.
4. Aplicación de boquilla en enchape de piso.
5. Desmonte e instalación de sanitario.
6. Instalación de platinas de 50x30 sobre la parte posterior de luminarias antivandálicas embebidas.
7. Desmonte de cerramiento existente en malla eslabonada.
8. Suministro e instalación de mallas de cerramiento IMT40.
9. Sello de dilataciones de placa con jumbolom y sikaflkex.
10. Desmonte de tejas termoacusticas.
11. Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo 1 a tres manos.
12. Instalacion de rejillas de sifon.
13. Fundida de muros en concreto para lavaderos.
14. Instalacion de lavaderos.
15. Construccion de asientos en concreto.

EPMSC BARRANCABEMEJA
1. Instalacion de cieloraso con lamina de fibrocemento 6mm.
2. Resane y printura de muros.

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA
Reparación malla de cerramiento averiada.
1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo en viga de cimentación de Guayana perimetral.
2. Instalación de formaleta de madera en viga de cimentación de Guayana perimetral.
3.Fundida de concreto para viga de cimentación de Guayana perimetral.
4. Descapote zona rampa de acceso.
5. Adecuación área de aislamiento - Demolición de placa.

COCUC
Zona de aislamiento.
• Se continua con la actividad, capa última Pintura vinilo acrilica plástica lavable Tipo 1 sobre muros.
• Se continua con la actividad Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie y diluyente.
• Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC ¾
• Trasiego de material de obra desde la entrada del centro penitenciario hasta el sitio de obra.
• Se terminó la actividad Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio.

EPMSC AGUACHICA

Se esta en la elaboracion del estudio de cargas a la espera de la entrega a la interventoria del informe final, se esta en la adecuacion de los baños de la zona de aislamiento, y se esta trabajando en la adecuacion del piso del patio 2 que es zona de aislamiento.

se esta adecuando el sitio para la construccion de la placa de la carpa medicalizada

10. A la fecha se encuentra viabilizado por la interventoria actividades generales en 13 centros penitenciarios de 14, lo cual corresponde al 92% de los centros, a la fecha en el ERON EPMSC MALAGA no se tiene orden de visita por parte de la USPEC.

OBSERVACIONES

EPMSC VELEZ. Ejecutado 100%, las dos ultimas semanas se encuentran en consolidacion final de cantidades finales ejecutadas. Este ERON ya cuenta con acta de recido por parte de la USPEC y ERON (INPEC).

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo y del cual, esta Interventoria aprobo al afecha las siguientes ordenes de giro:

1.Orden de giro No. 01 por un valor de $ 730.016.498
2.Orden de giro No. 02 por un valor de $ 12.296.208.
3.Orden de giro No. 03 por un valor de $ 55.624.323.
4.Orden de giro No. 04 por un valor de $ 57.576.838.
5.Orden de giro No. 05 por un valor de $ 95.296,817
6.Orden de giro No. 06 por un valor de $ 15,231,331
7.Orden de giro No. 07 por un valor de $ 204.949.175
8.Orden de giro No. 08 por un valor de $ 23.001.275
9.Orden de giro No. 09 por un valor de $ 249.800.580
10.Orden de giro No. 10 por un valor de $ 106.818.491

REGISTRO FOTOGRAFICO

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoria

Firma

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE SEGUMIENTO ESTADO AVANCE DE OBRA - REGIONAL ORIENTE - CONTRATO 138

FECHA DE CORTE: 23/08/2020 — 23/08/2020

ESTATUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ESTABLECIMIENTO	PRESUPUESTO USPEC ANEXO TÉCNICO - RECURSO PREVISORIO	DISTRIBUCIÓN DE RECURSO - SEGÚN MONTO CONTRACTUAL ADJUDICADO	PESO % COSTO INICIAL PREVISORIO / COSTO ADJUDICADO	AREA A ATENDER SEGÚN DIAGNÓSTICO	PRESUPUESTO POR ÁREAS (DIAGNÓSTICO)*	No. DE CUPOS HABILITADOS ZONA DE AISLAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR SEGÚN DIAGNOSTICO	PRESUPUESTO VIABILIZADO ZONAS DE AISLAMIENTO*	% DE INVERSION EN ZONA DE AISLAMIENTO	INICIO Y AVANCE OBRA				OBSERVACIONES
													ESTATUS FECHA DE INICIO	ESTATUS FECHA DE TERMINACION	% AVANCE OBRA EJECUTADA	% DE AVANCE OBRA POR EJECUTAR	
En comunicación con el Dr. Jesus Soto, Secretario de Salud de Arauca, informa que han recibido y revisado el protocolo, una vez el visto bueno y se envie el personal para el inicio de obras se definirá el procedimiento para el seguimiento, lo cual de la mejor se evaluará el dia a dia donde viven y se dará la autorización para trabajar, si van al tema del departamento de Arauca deben alegar prueba negativa de COVID-19 antes del viaje, llegar al municipio a realizar aislamiento preventivo obligatorio y en el municipio realizar nuevamente prueba para descartar contagio, si dichas pruebas son negativas se autoriza el inicio, de lo contrario no será autorizado		ARAUCA	EPMSC ARAUCA	$ 460.000.000,00	$ 459.078.872,82	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 271.810.021,14	23	$ 533.738.564,78	$ 221.039.835,22	41,41%	28/08/20	14/12/20	0,00%	100,00%	se inicio obra el dia 7 de septiempre de 2020 con las obras civiles, arreglo de cubiertas, lavado de muros.
							Adecuación sanidad, para cupo de zonas de aislamiento, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 221.039.835,22						$ -	$ 533.738.564,78	
							Adecuación rancho, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 40.888.708,42								
APROBADO		CESAR	EPMSC AGUACHICA	$ 380.000.000,00	$ 379.239.068,85	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona de Alojamiento CCV)	$ 260.449.297,94	40	$ 408.850.776,85	$ 25.367.491,25	6,20%	25/08/20	21/11/20	3,18%	96,82%	se esta en la laboracion del estudio de cargas a la espera de la entrega a la interventoria del infoeme final,ss eesta en la adecuacion de los baños de la zona de aislamiento, y se esta trabajando en la adecuacion del piso del patio 2 que es zona de aislamiento.
							Adecuación sanidad, (Celda Recepcion)	$ 54.195.601,69								
							Adecuación rancho, (Celda Recepcion)	$ 68.838.385,97						$ 13.001.454,70	$ 395.849.322,15	
							Adecuación área para carpa medicalizada, (Celda Recepcion)	$ 25.367.491,25								se esta adecuando el sitio para la construccion d ela placa de la carpa medicalizada
Con correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 la Secretaria de Planeación Municipal de Ocaña envia formato de registro para ser diligenciado con el listado y los datos del personal que estará trabajando en obra, para hacer el seguimiento a la implementación del protocolo. El formato de registro incluye el listado del		NORTE DE SANTANDER	EPMSC OCAÑA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Mantenimiento parcial iluminación externa y semiexterna, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 71.647.711,08	39	$ 150.706.977,99	$ 43.624.949,18	28,95%	26/08/20	23/09/20	0,00%	100,00%	
							Reparación tramo concertina, (Zona 3 UTE Femenina)	$ 35.434.317,73								
							Adecuación área de aislamiento, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 43.624.949,18						$ -	$ 150.706.977,99	
APROBADO			EPMSC PAMPLONA	$ 270.000.000,00	$ 269.459.338,39	99,80%	Adecuación zonas externas, (Zona Perimetral PPL) muro GRANJA y garitas	$ 149.403.149,27	28	$ 340.667.277,81	$ 136.730.652,21	40,14%	28/08/20	27/10/20	0,00%	100,00%	se inician actividades el dia 7 de septiembre, con la demolicion del muro de la granja, arreglo de garitas, y revision de cubiertas
							Adecuación zonas educativas, (Zona de Educativas salon 1 y 2)	$ 54.533.476,33								
							Adecuación área de aislamiento, ZONA DE SANIDAD	$ 136.730.652,21						$ -	$ 340.667.277,81	
APROBADO			COCUC	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Reparación de muros afectados en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 84.072.955,45	348	$ 2.675.762.203,52	$ 779.580.986,34	29,13%	04/08/20	04/12/20	4,19%	95,81%	lavado de muros, pintura, impermeabilizacion d elfa cubierta de la zona de visitas conyugales, adecuaciones hidrosanitarias, cambio de luminarias, cableado de zonas afactadas por vandalismo
							Reparación redes eléctricas en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 619.347.825,33								se esta en la adecuacion d elas redes electricas y a la espera del armario que fue incinerado en los motines
							Adecuación 3 áreas de sanidad, (Norte, Sur y Central)	$ 706.386.406,27								
							Adecuación zonas externas, (Mediana Seguridad Hombres)	$ 486.374.030,13						$ 112.114.436,33	$ 2.563.647.767,19	Lavado de muros, pintura, reparacion de cubierta, arreglo de redes electricas, e instalalaciones sanitarias, impermeabilizacion cubierta
							Adecuación área de aislamiento, (Zona de Visitas Conyugales) (Comunidad terapeutica) (bloque minima) (BLOQUE 22)	$ 779.580.986,34								

APROBADO	ORIENTE	SANTANDER	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 130.000.000,00	$ 129.739.681,45	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 18.358.340,00	10	$ 116.166.247,97	$ 97.807.907,97	84,20%	22/07/20	27/08/20	96,12%	3,88%	Arreglo de humedades, impermeabilizacion y labores de pintura
							Adecuación área de aislamiento, (Area de Recepcion)	$ 97.807.907,97							$ 111.658.997,55	$ 4.507.250,42	en ejecucion
			EPMSC MÁLAGA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%											No se realizo visita, estaba programada para el lunes 1 de junio por orden de la USPEC
Con fecha 16 de julio de 2020, se realizó la inscripción en la plataforma de la página de la Alcaldía, de acuerdo a la información de la misma parroforma, se dará respuesta en 5 días hábiles			EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Refuerzo de seguridad	$ 105.000.000,00		$ 120.000.000,00					0,00%	100,00%	se esta en la terminacion en taller de construccion del cerramiento, malla de techo, las actividades en el eron se inician el 10 de septiembre
							Arreglo de redes sanitarias	$ 15.000.000,00							$ -	$ 120.000.000,00	
Con oficio SPDM 230-EV-04-631 del 4 de agosto de 2020, la Secretaría de Planeación expide autorización provisional, que solo permite actividades de desplazamiento de personal directivo, adecuación de áreas de obra y consecución de personal. Una vez se tenga dicho personal se debe remitir para evaluar nuevamente presentivo de 14 días y dar AUTORIZACIÓN DEFINITIVA para inicio de obra			EPMSC SOCORRO	$ 225.000.000,00	$ 224.549.448,66	99,80%	Adecuación área de aislamiento, ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5	$ 275.961.384,42	96	$ 275.961.384,42	$ 275.961.384,42	100,00%	28/08/20	09/09/20	0,00%	100,00%	
															$ -	$ 275.961.384	
APROBADO			EPMSC VELEZ	$ 145.000.000,00	$ 144.709.644,69	99,80%	Reparación de portón eléctrico externo, (Entrada Centro Penitenciario)	$ 85.719.291,19	78	$ 168.954.633,15	$ 83.235.341,96	49,26%	22/07/20	18/08/20	100,00%	0,00%	EPMSC VELEZ PENDIENTE REVISAR CANTIDADES FINALES EJECUTADAS Este ERON ya fue entregado tanto al INPEC y al USPEC, se está esperando el informe de terminación y el balance de mayores y menores cantidades de obra para cerrar los costos reales de ejecución de las actividades
							Adecuación área de aislamiento, pabellosnes 1 y 2 3er piso, zona de aislamiento casino y zona de aislamiento casita sanidad	$ 83.235.341,96							$ 168.954.633,15	$ -	
APROBADO			EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	$ 1.000.000.000,00	$ 997.997.549,60	99,80%	construccion malla de cerramiento tipo guayana faltante, (Zona 3) y cerrmiento guayana zona carpa medicalizada	$ 305.254.367,23	30	$ 739.995.940,40	$ 359.584.213,63	48,59%	22/07/20	18/12/20	15,01%	84,99%	Se autorizo placa para carpa No se han remitido ajustes de baños de acuerdo a mesa de trabajo Se esta en la figuracion de acero para la construccion de la viga para el cerramiento de la guyana Se estan fabricando los paneles de cerramiento de guyana Se fabricaron e instalaron las 11 rejasde seguridad para sanidad donde se presento el intento de fuga en el mes de agosto Se continua con la construccion del cerramiento de la guayana, la viga se encuentra fundida en su primer fase, hoy se inicia el motaje de la tuberia y el vaciado del segundo tramo en taller ya esta fabricada el 94% de la estructura metalica
							Construccion de REPEL hospitalarios Y ADECUACION ZONA DE SANIDAD	$ 75.157.359,54							$ 111.073.390,65	$ 628.922.549,75	
							construccion de las placas viales tipo MR 43 en el asedero y respel por onden de tutela	$ 359.584.213,63									
Con oficio de 16 de julio de 2020, la Secretaría de Control Urbano del municipio, da respuesta a la solicitud de aprobación del protocolo, informando que se debe cumplir con el comunicado externo N° 0162-2020, el cual incluye el listado de personal con datos completos, relacionar el sistema de seguridad			EPMS SAN GIL	$ 170.000.000,00	$ 169.659.583,43	99,80%	Adecuación área de aislamiento, (Comunidad	$ 165.236.874,23	16	$ 207.606.019,59	$ 165.236.874,23	79,59%	27/08/20	13/11/20	0,00%	100,00%	
							reforzamiento de seguridad, puerta rejas , mallas y concertinas	$ 42.369.145,36							$ -	$ 207.606.019,59	
APROBADO			EPAMS GIRÓN	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Atención iluminación perimetral, (Patio de Visitas 3)	$ 202.697.968,30	188	$ 2.310.174.651,34	$ 1.258.439.778,12	54,47%	25/07/20	21/09/20	36,92%	63,08%	Se entrego zona de alislamiento 1 Zona 2 se esta realizando la actividad de suministro y compactacion de recebo, se proyecta la fundida de la placa para la instalacion de la carpa medicalizada para el dia 28/08/2020 Iluminacion perimetral lleva un avance del 89% ya que se han presentado problemas de cortos en la redes existentes y ha sido necesario alislar los circutos para encontrar los daños En la UTE se esta termiando el segundo piso En la recepcion se esta en la instalacion de los sanitarios antivandalicos y reparacion de redes hidraulicas de presion
							Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico, (Pasillo 3 Pabaellon 1)	$ 54.895.990,47							$ 852.916.481,27	$ 1.457.258.170,07	
							Adecuación rancho	$ 794.140.914,45									
							Adecuación área de aislamiento, (Patio de Visitas 1,2 y 3, 60 cupos), (recepcion 20 cupos), (UTE 108 cupos)	$ 1.258.439.778,12									
APROBADO			RM BUCARAMANGA	$ 488.371.727,31	$ 487.393.787,15	99,80%	Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento, (Salon de Area Educativa)	$ 167.393.890,66	23	$ 203.651.251,89	$ 167.393.890,66	82,20%	24/07/20	22/09/20	34,14%	65,86%	se estan desarrollando actividades de mamposteria, pañete, estuco y pintura
							arreglos tanque de agua	$ 36.257.361,23							$ 69.526.537,39	$ 134.124.714	se estan desarrollando actividades de mamposteria, enchape, pañete pintura, esta semana se instalan las rejas de seguridad en la cubierta.
11	TOTALES:	14	$ 8.428.371.727,31	$ 8.411.494.331,00	99,80%			856	$ 8.252.235.929,71	$ 3.367.595.978,72	46,01%			$ 1.439.245.931,06	$ 6.812.989.998,65	
			VALOR ANTICIPO 30%:	$ 2.523.448.299,30					*No se cuenta con informacion para esta columna	98,11%	40,04%			17,11%	81,00%	
			1ER. PAGO:	$ -										$ 8.252.235.929,71		
			2DO. PAGO:	$ -										98,11%		

*Los valores de esta columna se sacaron por porcentaje de acuerdo al valor de la propuesta ganadora, ya que en el proceso se envio un presupuesto general

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



Construcción de muro en mampostería H7 en zona de educativas.



Construcción de muro en mampostería H7 en zona de educativas.



Aplicación de friso en mampostería en zona de educativas.



Aplicación de friso en mampostería en zona de educativas.



Instalación de enchape en muros de baños zona educativas.



Instalación de enchape en muros de baños zona educativas.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA

	
Instalación de enchape en muros de baños en zona de talleres.	Instalación de enchape en poceta lavatraperos.
	
Resane de muros en zona de educativas.	Resane de muros en zona de educativas.
	
Aplicación de estuco en zona de educativas.	Desmonte de malla en zona de talleres.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA

	
Construcción de muro en ladrillo tolete en zona de talleres.	Orden aseo y desinfección de zonas intervenidas.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA

	
Instalación de cieloraso en superboard.	Resane y pintura de muros.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
Armado de acero de refuerzo viga de cimentacion Guayana.	Fundida de concreto viga de cimentacion Guayana.
	
Instalacion de formaleta de madera para escalonamiento de V.C.	Demolicion de placa de antiguo baño.
	
Descapote en zona de rampa de Respel.	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ



Aplicación de pintura epóxica en zona de sanidad.



Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.



Instalación de puesta entamborada en zona de aislamiento.



Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

COCUC

	
PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1	PINTURA TIPO 1 PASILLOS
	
ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PUERTAS METÁLICAS
	
TRASIEGO DE MATERIAL DE OBRA DESDE LA ENTRADA	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS
	
IMPERMEABILIZACION CAPA SENCILLA	

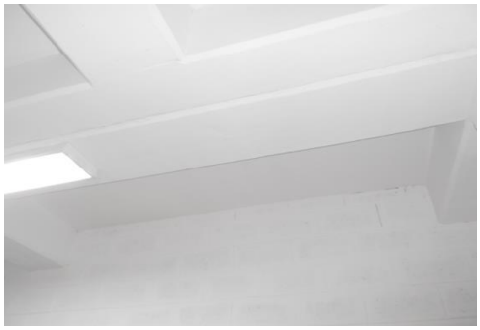
USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

EPAMS GIRON

	
Aplicación de sello de junta en placa (jumbolon y sikaflex).	Aplicación de sello de junta en placa (jumbolon y sikaflex).
	
Desmonte de sanitario.	Aplicación de pintura en pasillos y zona locutorios.
	
Desmonte de malla existente.	Instalacion de malla IMT.

	
Instalacion de rejillas metalicas en sifones.	Aplicación de pintura en puertas de pasillos.
	
Instalacion de enchape de piso.	Desmonte de teja termoacustica.
	
Construccion de asientos en celdas UTE.	Instalacion de lavaderos en celdas UTE y Recepcion.
	
Aplicación de pintura en techos.	Fundida de muros en concreto para lavaderos.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	12	DEL	DÍA: 31	MES: 08	AÑO: 2020	AL	DÍA: 06	MES: 09	AÑO: 2020

AGUACHICA

	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M.	EXCAVACIÓN BAÑOS NUEVOS AREA EDUCATIVA
	
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA EDUCATIVA
	
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CANCHA	CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS CANCHA
