USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 13 DEL DÍA 07 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 13 MES 09 AÑO 2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO, DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DEL GRUPO 5

CONTRATO No.: 138-2020

Supervisor USPEC: LUIS MIGUEL MERCADO

Profesional de Apoyo a la Supervisión: LUIS FERNANDO MEZA DAZA

Contrato de Obra:

Valor Inicial	$ 8.411.494.331
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 8.411.494.331
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que suceda primero.
Plazo prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	$ 4.550.689.198
Valor Adicional	$ 0
Valor Actualizado	$ 4.550.689.198
Plazo Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2020, y/o hasta que se mantenga vigente el cto de obra objeto de la presente Interventoria lo que ocurra primero
Plazo Prorroga	NA
Plazo Actualizado	NA
Fecha Inicio	16/06/2020
Fecha Terminación Inicial	31/12/2020
Fecha Terminación Actual	31/12/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	0%	30%
Valor del PAC Programado ($)	$ -	$ 2.523.448.293

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	13,10%	59,84%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.101.905.757	$ 5.033.438.207,67

ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	13,10%	59,84%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 1.101.905.757	$ 1.549.436.392,11

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,31%	18,42%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 110.190.576	$ 1.549.436.392,11

ETAPA DE EJECUCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	1,31%	18,42%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 110.190.576	$ 1.549.436.392,11

RESUMEN CRONOGRAMA

	Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
COCUC	8	8	8	8	8	8	0	48
EPMSC PAMPLONA	8	8	8	8	6	0	0	38
RM BUCARAMANGA	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	4,5	0	47
EPAMS GIRON	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4	0	41,5
EPMSC ARAUCA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC BARRANCABERMEJA	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4	0	41,5
EPMSC AGUACHICA	6	8	8	8	6	0	0	36
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	7	7	7	7	7	4,5	0	39,5
EPMSC SOCORRO	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC VELEZ	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN GIL	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC OCAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC MALAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	0	0	0	0	0	0	0	0

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 13 DEL DÍA 07 MES 09 AÑO 2020 AL DÍA 13 MES 09 AÑO 2020

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Fisico)	% Ejecutado (Fisico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
COCUC	19,5%	0,51%	54,84%	4,70%	-50%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC PAMPLONA	20,23%	1%	55,00%	1,00%	-54%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
RM BUCARAMANGA	1,82%	6,95%	98,45%	42,26%	-56%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPAMS GIRON	12,40%	2,09%	61,50%	40,11%	-21%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC ARAUCA	9%	0,00%	16,72%	0,00%	-17%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC BARRANCABERMEJA	0,00%	0,02%	100,00%	98,00%	-2%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC AGUACHICA	12%	0,05%	29,00%	3,23%	-26%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	1,31%	0,07%	90,04%	15,08%	-75%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC SOCORRO	9%	0%	35,00%	0,00%	-35%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC VELEZ	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0%	Se encuentra pendiente por parte del contratista de obra, informe detallado de las cantidades finales ejecutadas.
SAN GIL	12%	0%	52,00%	0,00%	-52%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC OCAÑA	34%	0%	81,00%	0,00%	-81%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
EPMSC MALAGA	0%	0%	0,00%	0,00%	0%	NO DEFINICION DE ACTIVIDADES
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	5,94%	0,00%	100,00%	0,00%	-100%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

A continuacion, se citan las actividades representativas adelantadas por el contratista y la Interventoria.

1.Asistencia a comites semanles y adicionales (USPEC-CONTRATISTA-INTERVENTORIA)

2. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_153, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, aprobacion y anexos de acta parcial No. 01 y acta parcial No. 02

3. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_154, por el cual se remite a Building S.A.S., memorando emitido por la entidad contratante USPEC, en el cual solicita la reubicacion de la farmacia del area donde actualmente opera a la zona de aislamiemto al interios de sanidad. - RM Bucaramanga.

4. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_155, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, oficio ERON-ORIENTE-138-144, por medio del cual Building S.A.S. solicita intervencion de la entidad contratante para adelantar tramites administrativos ante la direccion del ERON Cocuc, debido a los inconvenientes para el ingreso del personal de obra e interventoria para adelantar labores propias del contrato 138-20202 y 129-2020.

5. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_156, por el cual se remite a Building S.A.S. aprobacion de ordenes de giro No. 011 y No. 012.

6. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_157, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, acta parcial de obra No. 01 ajustada de acuedo a las observaciones realizadas por la mencionada.

7. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_158, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, informe semanal No. 012 de seguimiento al contrato de obra 138-2020.

8. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_159, por el cual se remite a Building S.A.S. observaciones a acta parcial No 02 allegada a esta interventoria por medio de ofiio ERON-ORIENTE-138-118.

9. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_160, por el cual se remite a Building S.A.S. aprobacion de orden N0. 012.

10. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_161, por el cual se remite a Building S.A.S. oficio ENTERRITORIO no. 2020270017033 y oficio USPEC No.20202-008182 , en los cuales se aclara las actividades a desarrollar por las partes, con el fin de no generar inconvenientes en la ejecucion paralela de los mismos.

11. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_162, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC, acta parcial de obra No. 02 ajustada de acuedo a las observaciones realizadas por la mencionada.

12. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_163, por el cual se remite a la entidad contratante USPEC,informe mesnual de obra No. 02.

13. Se emite oficio GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_164, por el cual se remite a Building S.A.S. aprobacion de orden de giro No. 013.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA	07	MES	09	AÑO	2020	AL	DÍA	13	MES	09	AÑO	2020

RM BUCARAMANGA

Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento.

1. Aplicación de mortero para nivelación de piso.
2. Construcción de muro en ladrillo tolete.
3. Corte, figurado y armado de acero para columnetas.
4. Fundida de concreto para columnetas.
5. Instalación de rejas de techo.
6. Instalación de rejas en ventanas superiores.
7. Demolición de enchape de piso.
8. Desmonte de sanitarios.
9. Instalación de enchape de piso.

Verificación del sistema de iluminación.

No se realizo ninguna actividad en el presente hito.

EPAMS GIRÓN

Adecuación área de aislamiento.

1. Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a tres manos.
2. Suministro y aplicación de pintura de puertas y ventanas metálicas.
3. Instalación de puerta entamborada.
4. Suministro e instalación de chapas tipo poma.
5. Construcción de asientos y repisas en concreto.
6. Manteamiento correctivo de tubería sanitaria de 2".
7. Mantenimiento de tableros eléctricos.
8. Mantenimiento de la estructura de la cubierta.
9. Lavado de muros con hidrolavadora.
10. Aseo y limpieza general de las áreas intervenidas.

De las actividades que acontinuacion se citan , no se realizo ninguna actividad.

Atención iluminación perimetral.
Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico.
Adecuación rancho.

EPMSC BARRANCABEMEJA

Adecuación área de aislamiento.

1. Resane y pintura de muros.
2. Perforación de muro para revisión de fuga.
3. Aseo y Limpieza general en área intervenida.

De la actividad que acontinuacion se cita , no se realizo ninguna actividad.

Revisión y arreglo sistema eléctrico general.

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

Reparación malla de cerramiento averiada.

1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo en viga de cimentación de Guayana perimetral.
2. Instalación de formaleta metálica en viga de cimentación de Guayana perimetral.
3. Fundida de concreto para viga de cimentación de Guayana perimetral.
4. Instalación de postes metálicos para malla.

EPMSC VELEZ

Ejecutado 95%, las dos ultimas semanas se encuentran en consolidacion final de cantidades finales ejecutadas. Este ERON ya cuenta con acta de recido por parte de la USPEC y ERON (INPEC)

COCUC

Adecuación área de aislamiento.

1 Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre muros
2 Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas
3 Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4
4 Suministro e instalacion de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X10W" de 1050 Lm ,67X17X14 fabricada en lamina cold rolled calibre 20
5 Limpieza de muros existentes con hidrolavadora.
6 Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico) para lavar y descurtir manchas de cemento mortero y otros
7 Trasiego de material de obra desde la entrada.

EPMSC AGUACHICA

Adecuación sanidad.

1 Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm
2 Excavación manual en material común h.<=2,00m.
3 Tubería PVCL 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
4 Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
5 Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.

Adecuación área para carpa medicalizada.

1 Localización y replanteo cancha de tierra
2 Relleno manual con recebo común compactado.
3 Excavación manual en material común h.<=2,00m.

EPMSC PAMPLONA

Reparación de muros afectados en motines.

1 Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm
2 Cargue de escombros preexistentes a la obra.

Reparación de garitas afectadas en los motines.

1 Pañete liso impermeabilizado integralmente

Adecuación área de aislamiento.

1 Campamento de obra de 12 m2

OBSERVACIONES

EPMSC VELEZ. Ejecutado 100%, las dos ultimas semanas se encuentran en consolidacion final de cantidades finales ejecutadas. Este ERON ya cuenta con acta de recido por parte de la USPEC y ERON (INPEC).

10. A la fecha se encuentra viabilizado por la interventoria actividades generales en 13 centros penitenciarios de 14, lo cual corresponde al 92% de los centros, a la fecha en el ERON EPMSC MALAGA no se tiene orden de visita por parte de la USPEC.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA	07	MES	09	AÑO	2020	AL	DÍA	13	MES	09	AÑO	2020

AVANDE DE FACTURACION

A la fecha se tiene un porcentaje acumulado de facturacion del 30% del valor del contrato de obra, este, correspondiente al valor del anticipo y del cual, esta Interventoria aprobo al afecha las siguientes ordenes de giro:

1.Orden de giro No. 01 por un valor de $ 730.016.498
2.Orden de giro No. 02 por un valor de $ 12.295.208.
3.Orden de giro No. 03 por un valor de $ 55.624.323.
4.Orden de giro No. 04 por un valor de $ 57.579.838.
5.Orden de giro No. 05 por un valor de $ 95,295,817
6.Orden de giro No. 06 por un valor de $ 15,231,331
7.Orden de giro No. 07 por un valor de $ 204,949,175
8.Orden de giro No. 08 por un valor de $ 23,001,275
9.Orden de giro No. 09 por un valor de $ 249.800.580
10.Orden de giro No. 10 por un valor de $ 106.818.491
11.Orden de giro No. 11 por un valor de $ 7,974,702
12.Orden de giro No. 12 por un valor de $ 115,466,835
13.Orden de giro No. 13 por un valor de $ 21,541,530

REGISTRO FOTOGRAFICO

LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO - Director Interventoría

Firma

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MATRIZ DE SEGUMIENTO ESTADO AVANCE DE OBRA - REGIONAL ORIENTE - CONTRATO 138

FECHA DE CORTE: 23/08/2020 — 23/08/2020

ESTATUS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ESTABLECIMIENTO	PRESUPUESTO USPEC ANEXO TÉCNICO - RECURSO PREVISORIO	DISTRIBUCIÓN DE RECURSO - SEGÚN MONTO CONTRACTUAL ADJUDICADO	PESO % COSTO INICIAL PREVISORIO / COSTO ADJUDICADO	AREA A ATENDER SEGÚN DIAGNÓSTICO	PRESUPUESTO POR ÁREAS (DIAGNÓSTICO)*	No. DE CUPOS HABILITADOS ZONA DE AISLAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL A EJECUTAR SEGÚN DIAGNOSTICO	PRESUPUESTO VIABILIZADO ZONAS DE AISLAMIENTO*	% DE INVERSION EN ZONA DE AISLAMIENTO	INICIO Y AVANCE OBRA: ESTATUS FECHA DE INICIO	INICIO Y AVANCE OBRA: ESTATUS FECHA DE TERMINACION	INICIO Y AVANCE OBRA: % AVANCE OBRA EJECUTADA	INICIO Y AVANCE OBRA: % DE AVANCE OBRA POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
En comunicación con el Dr. Jesus Soto, Secretario de Salud de Arauca, informa que han recibido y socializado el protocolo, una vez el señor y se envie el personal para inicio de obras se asesora el procedimiento para el seguimiento, lo cual de la región se evaluará el cómo donde viven y se dará la autorización para trabajar, si cual el tanto del departamento de Arauca poder otorgar prueba negativa de COVID-19 antes del viaje, llegar al municipio y realizar aislamiento preventivo obligatorio y en el municipio realizar nuevamente prueba para descartar contagio, si dichas pruebas son negativas se autoriza el inicio, de lo contrario no será autorizado		ARAUCA	EPMSC ARAUCA	$ 460.000.000,00	$ 459.078.872,82	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 271.810.021,14	23	$ 533.738.564,78	$ 221.039.835,22	41,41%	28/08/20	14/12/20	0,00%	100,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Adecuación sanidad, para cupo de zonas de aislamiento, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 221.039.835,22						$ -	$ 533.738.564,78	
							Adecuación rancho, (Zona 2 Reclusion de Mujeres)	$ 40.888.708,42								
APROBADO		CESAR	EPMSC AGUACHICA	$ 380.000.000,00	$ 379.239.068,85	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general y planta eléctrica, (Zona de Aloiamiento CCV)	$ 260.449.297,94	40	$ 408.850.776,85	$ 25.367.491,25	6,20%	25/08/20	21/11/20	3,23%	96,77%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Adecuación sanidad, (Celda Recepcion)	$ 54.195.601,69						$ 13.205.880,09	$ 395.644.896,76	
							Adecuación rancho, (Celda Recepcion)	$ 68.838.385,97								
							Adecuación área para carpa medicalizada, (Celda Recepcion)	$ 25.367.491,25								
Con correo electrónico de fecha 17 de junio de 2020 la Secretaria de Planeación Municipal de Ocaña envía formato de registro para ser diligenciado con el listado y los datos del personal que estará trabajando en obra, para hacer el seguimiento a la implementación del protocolo. El formato de registro incluye el listado del		NORTE DE SANTANDER	EPMSC OCAÑA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Mantenimiento parcial iluminación externa y semiexterna, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 71.647.711,08	39	$ 150.706.977,99	$ 43.624.949,18	28,95%	26/08/20	23/09/20	0,00%	100,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Reparación tramo concertina, (Zona 3 UTE Femenina)	$ 35.434.317,73						$ -	$ 150.706.977,99	
							Adecuación área de aislamiento, (Zona 1, Granja Carpas o Zona de Parqueaderos)	$ 43.624.949,18								
APROBADO			EPMSC PAMPLONA	$ 270.000.000,00	$ 269.459.338,39	99,80%	Adecuación zonas externas, (Zona Perimetral PPL) muro GRANJA y garitas	$ 149.403.149,27	28	$ 340.667.277,81	$ 136.730.652,21	40,14%	28/08/20	27/10/20	1,00%	99,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Adecuación zonas educativas, (Zona de Educativas salon 1 y 2)	$ 54.533.476,33						$ 3.406.672,78	$ 337.260.605,03	
							Adecuación área de aislamiento, ZONA DE SANIDAD	$ 136.730.652,21								
APROBADO			COCUC	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Reparación de muros afectados en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 84.072.955,45	348	$ 2.675.762.203,52	$ 779.580.986,34	29,13%	04/08/20	04/12/20	4,70%	95,30%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Reparación redes eléctricas en motines, (Primera Generacion Sector Norte)	$ 619.347.825,33						$ 125.760.823,57	$ 2.550.001.379,95	
							Adecuación 3 áreas de sanidad, (Norte, Sur y Central)	$ 706.386.406,27								
							Adecuación zonas externas, (Mediana Seguridad Hombres)	$ 486.374.030,13								
							Adecuación área de aislamiento, (Zona de Visitas Conyugales) (Comunidad terapeutica) (bloque minima) (BLOQUE 22)	$ 779.580.986,34								

APROBADO	ORIENTE	SANTANDER	EPMSC BARRANCABERMEJA	$ 130.000.000,00	$ 129.739.681,45	99,80%	Revisión y arreglo sistema eléctrico general, (Zona 1 Reclusion de Mujeres)	$ 18.358.340,00	10	$ 116.166.247,97	$ 97.807.907,97	84,20%	22/07/20	27/08/20	98,00%	2,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Adecuación área de aislamiento, (Area de Recepcion)	$ 97.807.907,97							$ 113.842.923,01	$ 2.323.324,96	
			EPMSC MÁLAGA	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%											NO DEFINICION DE ACTIVIDADES
Con fecha 16 de julio de 2020, se realizó la inscripción en la plataforma de la página de la Alcaldía, de acuerdo a la información de la misma paroforma, se dará respuesta en 5 días hábiles			EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	$ 120.000.000,00	$ 119.759.705,95	99,80%	Refuerzo de seguridad	$ 105.000.000,00		$ 120.000.000,00					0,00%	100,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Arreglo de redes sanitarias	$ 15.000.000,00							$ -	$ 120.000.000,00	
Con oficio SPOM 2-20-EI-04-631 del 4 de agosto de 2020, la Secretaría de Planeación expide autorización provisional, que solo permite actividades de desplazamiento de personal directivo, adecuación de áreas de obra y consecución de personal. Una vez se tenga dicho pemsnal se debe remitir para evaluar nuevamente presentivo de 14 días y dar AUTORIZACIÓN DEFINITIVA para inicio de obra			EPMSC SOCORRO	$ 225.000.000,00	$ 224.549.448,66	99,80%	Adecuación área de aislamiento, ZONA 1, ZONA 2 , ZONA 3, ZONA 4, ZONA 5	$ 275.961.384,42	96	$ 275.961.384,42	$ 275.961.384,42	100,00%	28/08/20	09/09/20	0,00%	100,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
															$ -	$ 275.961.384	
APROBADO			EPMSC VELEZ	$ 145.000.000,00	$ 144.709.644,69	99,80%	Reparación de portón eléctrico externo, (Entrada Centro Penitenciario)	$ 85.719.291,19	78	$ 168.954.633,15	$ 83.235.341,96	49,26%	22/07/20	18/08/20	100,00%	0,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Adecuación área de aislamiento, pabellosnes 1 y 2 3er piso, zona de aislamiento casino y zona de aislamiento casita sanidad	$ 83.235.341,96							$ 168.954.633,15	$ -	
APROBADO			EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	$ 1.000.000.000,00	$ 997.997.549,60	99,80%	construccion malla de cerramiento tipo guayana faltante, (Zona 3) y cerrmiento guayana zona carpa medicalizada	$ 305.254.367,23	30	$ 739.995.940,40	$ 359.584.213,63	48,59%	22/07/20	18/12/20	15,08%	84,92%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Construccion de REPEL hospitalarios Y ADECUACION ZONA DE SANIDAD	$ 75.157.359,54							$ 111.591.387,81	$ 628.404.552,59	
							construccion de las placas viales tipo MR 43 en el asedero y respel por onden de tutela	$ 359.584.213,63									
Con oficio de 16 de julio de 2020, la Secretaría de Control Urbano del municipio, da respuesta a la solicitud de aprobación del protocolo, informando que se debe cumplir con el comunicado externo N° 0262-2020, el cual incluye el listado de personal con datos completos, relacionar el sistema de seguridad			EPMS SAN GIL	$ 170.000.000,00	$ 169.659.583,43	99,80%	Adecuación área de aislamiento, (Comunidad	$ 165.236.874,23	16	$ 207.606.019,59	$ 165.236.874,23	79,59%	27/08/20	13/11/20	0,00%	100,00%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							reforzamiento de seguridad, puerta rejas , mallas y concertinas	$ 42.369.145,36							$ -	$ 207.606.019,59	
APROBADO			EPAMS GIRÓN	$ 2.400.000.000,00	$ 2.395.194.119,05	99,80%	Atención iluminación perimetral, (Patio de Visitas 3)	$ 202.697.968,30	188	$ 2.310.174.651,34	$ 1.258.439.778,12	54,47%	25/07/20	21/09/20	40,11%	59,89%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							Mantenimiento de planta eléctrica por daño eléctrico, (Pasillo 3 Pabaellon 1)	$ 54.895.990,47							$ 926.611.052,65	$ 1.383.563.598,69	
							Adecuación rancho	$ 794.140.914,45									
							Adecuación área de aislamiento, (Patio de Visitas 1,2 y 3, 60 cupos), (recepcion 20 cupos), (UTE 108 cupos)	$ 1.258.439.778,12									
APROBADO			RM BUCARAMANGA	$ 488.371.727,31	$ 487.393.787,15	99,80%	Actividades de sanidad y agua potable al interior del establecimiento, (Salon de Area Educativa)	$ 167.393.890,66	23	$ 203.651.251,89	$ 167.393.890,66	82,20%	24/07/20	22/09/20	42,26%	57,74%	SOLICTUD PLAN DE CONTINGENCIA GNG_USPEC_2020_EMER_ORIENTE_167
							arreglos tanque de agua	$ 36.257.361,23							$ 86.063.019,05	$ 117.588.233	
11	TOTALES:		14	$ 8.428.371.727,31	$ 8.411.494.331,00	99,80%			856	$ 8.252.235.929,71	$ 3.367.595.978,72	46,01%			$ 1.549.436.392,11	$ 6.702.799.537,60	
									*No se cuenta con informacion para esta columna	98,11%	40,04%				18,42%	79,69%	
				VALOR ANTICIPO 30%:	$ 2.523.448.299,30										$	8.252.235.929,71	
				1ER. PAGO:	$ -										98,11%		
				2DO. PAGO:	$ -												

*Los valores de esta columna se sacaron por porcentaje de acuerdo al valor de la propuesta ganadora, ya que en el proceso se envio un presupuesto general

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020


RM BUCARAMANGA



Aplicación de mortero de nivelación de piso en zona de talleres.



Aplicación de mortero de nivelación de piso en zona de talleres.

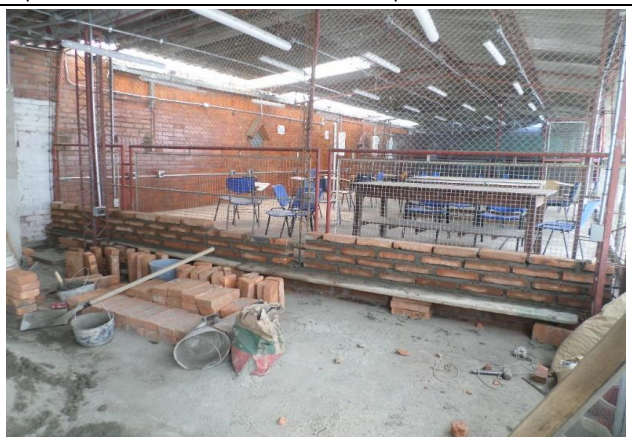

Construcción de muro en ladrillo tolete en zona de talleres.



Construcción de muro en ladrillo tolete en zona de talleres.



Corte, figurado y armado de acero de refuerzo.



Corte, figurado y armado de acero de refuerzo.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



Instalación de rejas de techo en zona de educativas.



Instalación de rejas de techo en zona de educativas.



Instalación de rejas en ventanas en zona de educativas.



Instalación de rejas en ventanas en zona de educativas.



Desmonte de sanitarios en zona de educativas.



Desmonte de sanitarios en zona de educativas.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

RM BUCARAMANGA



	
Demolición de enchape de piso en baño zona de educativas.	Instalación de enchape de piso en baño zona de educativas.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC BARRANCABERMEJA

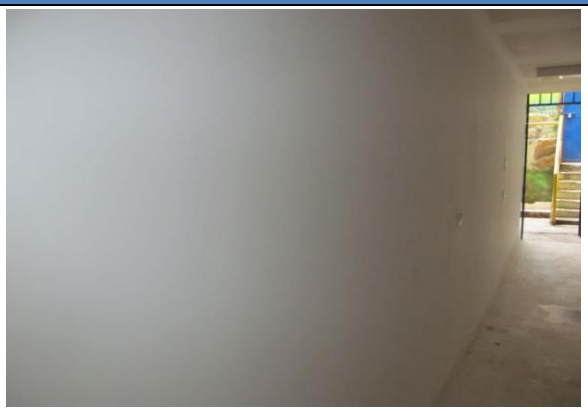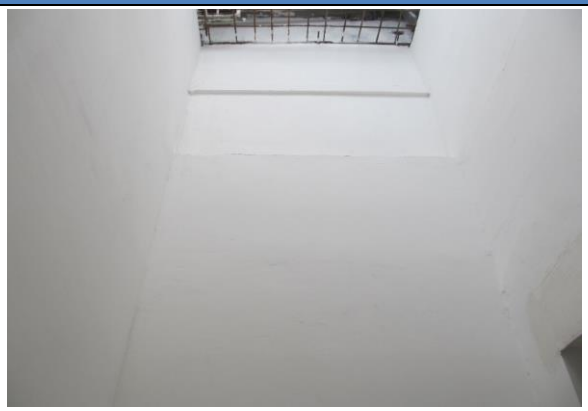	
Resane y pintura de muros.	Resane y pintura de muros.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPAMS GIRON



Lavado de muro en zona patio de visitas 3.



Aplicación de pintura en muros zona patio de visitas 3.



Aplicación de pintura en muros zona patio de visitas 3.



Instalación de puerta entamborada zona patio de visitas 2.



Instalación de chapas tipo poma en zona UTE.



Instalación de chapas tipo poma en zona UTE.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPAMS GIRON

	
Construcción de asientos en concreto en celdas UTE.	Construcción de repisas en concreto en celdas UTE.
	
Reparacion de tuberia sanitaria 2" en zona UTE.	Reparacion de tuberia sanitaria 2" en zona UTE.
	
Mantenimiento de tableros electricos.	Mantenimiento de tableros electricos.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPAMS GIRON

	
Mantenimiento estructura de cubierta en zona pasillo.	Mantenimiento estructura de cubierta en zona pasillo.
	FOTO
Instalación de cubierta termo acústica en zona de pasillo.	DESCRIPCION FOTO

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
Instalación formaleta de metálica en cimentación de Guayana.	Instalación formaleta de metálica en cimentación de Guayana.
	
Instalación de postes metálicos para malla de Guyana.	Instalación de postes metálicos para malla de Guyana.
	
Fundida de concreto en viga de cimentación de Guyana.	Fundida de concreto en viga de cimentación de Guyana.

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC ERE JP BUCARAMANGA

	
Desencofrado de viga de cimentación.	Desencofrado de viga de cimentación.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC VELEZ



Aplicación de pintura epóxica en zona de sanidad.



Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.



Instalación de puesta entamborada en zona de aislamiento.




Instalación de luminaria hermética LED en zona de sanidad.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS


REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

COCUC

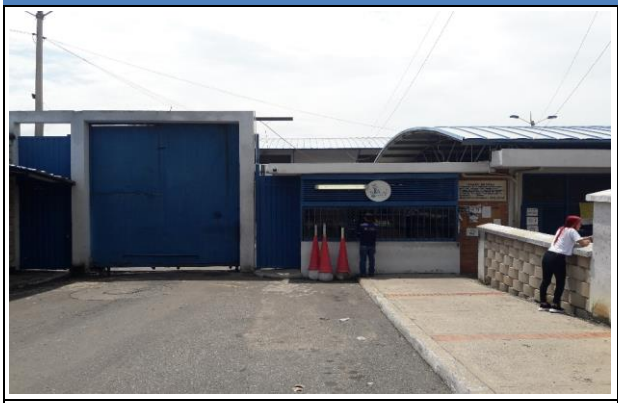

ENTRADA AL CENTRO CARCELARIO COCUC

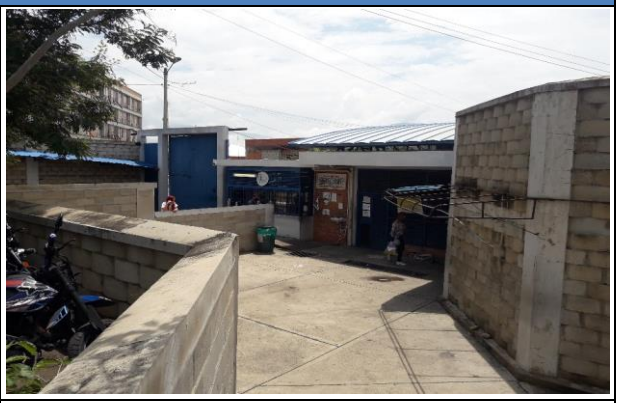

CENTRO CARCELARIO COCUC



PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1



PINTURA TIPO 1 GUARDIA TORRE 4



ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE



ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PUERTAS METÁLICAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

COCUC

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	LUMINARIA ANTIVANDALICA LED LT8 2X10W"
	
LIMPIEZA DE MUROS EXISTENTES CON HIDROLAVADORA	LA LIMPIEZA CON ÁCIDO MURIÁTICO
	
ASEO MANUAL	ASEO GENERAL AREAS INTERVENIDAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

AGUACHICA



ENTRADA AL CENTRO CARCELARIO AGUACHICA



CENTRO CARCELARIO AGUACHICA



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CANCHA



CANCHA DE TIERRA ZONA DE GRANJAS



RELLENO MANUAL



CON RECEBO COMÚN COMPACTADO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

AGUACHICA

	
DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTES	ADECUACIÓN DE ZONAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC PAMPLONA



ENTRADA AL CENTRO CARCELARIO PAMPLONA



CENTRO CARCELARIO PAMPLONA



CAMPAMENTO DE OBRA



TEJA DE ZINC, SIN PISO



DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DOBLES



MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.>20,1<=30,0 CM

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.:	13	DEL	DÍA: 07	MES: 09	AÑO: 2020	AL	DÍA: 13	MES: 09	AÑO: 2020

EPMSC PAMPLONA

	
IMPERMEABILIZACION GARITAS	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE
