
INFORME SEMANAL 1
GRUPO No. 1


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021





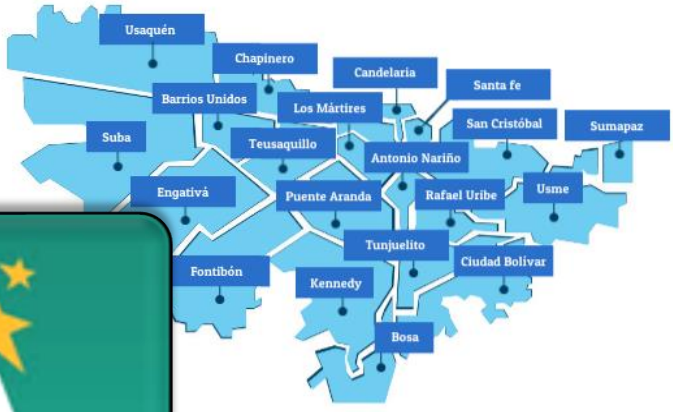

Secretaría del Hábitat

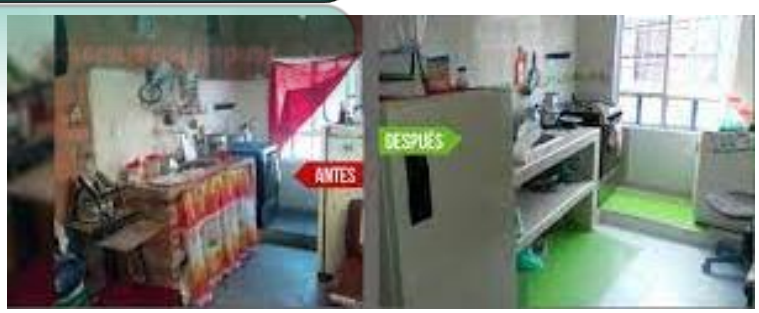

SEMANA 1 DEL 18 AL 22 AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENEIERIA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENEIERIA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCION

Por intermedio de la Secretaria Distrital del Hábitat, se busca adelantar las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, ofreciendo a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaria Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.


ETAPA DE SOCIALIZACIÓN

Este informe ejecutivo se desarrolla en su primera etapa, comprendida del 18 de agosto al 22 de agosto de la presente anualidad, periodo en el cual después de la firma del acta de inicio se desarrollarán en su primera semana las reuniones de socialización con la comunidad, la cual se realizará el día 25 de agosto para 119 beneficiarios del territorio habitarte donde participará el grupo social del contratista interventoría y participación de la secretaria del Hábitat.

Para la fase de validación y obra, se definirá por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) por localidad y/o Territorio, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales serán atendidas de manera oportuna; el cual se definirá una vez se comience con el proceso de obra.


Estas reuniones se realizarán bajo los protocolos de Bioseguridad cumpliendo las exigencias del gobierno nacional.

El **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** para la semana del 18 de agosto al 22 de noviembre, realiza la convocatoria en el territorio habitarte, los cuales se realizan por medio de llamadas telefónicas y correo certificado.

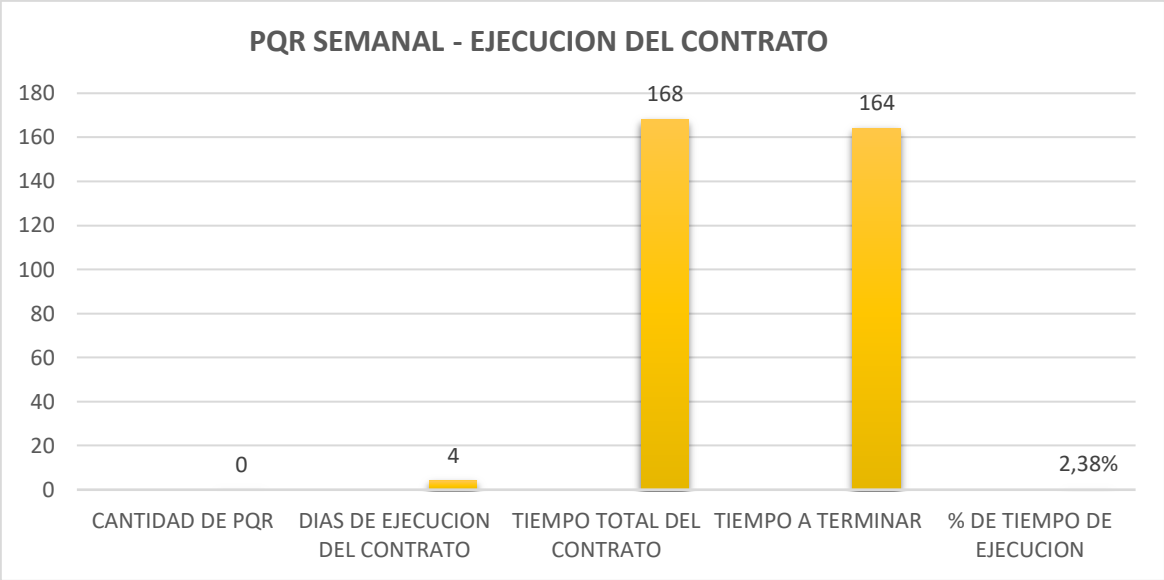

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución de los cuales han transcurrido 4 días después de la firma del acta de inicio por lo que el contratista deberá comenzar a realizar la socialización de manera eficaz para proceder a su ejecución.


Avance de Validaciones.

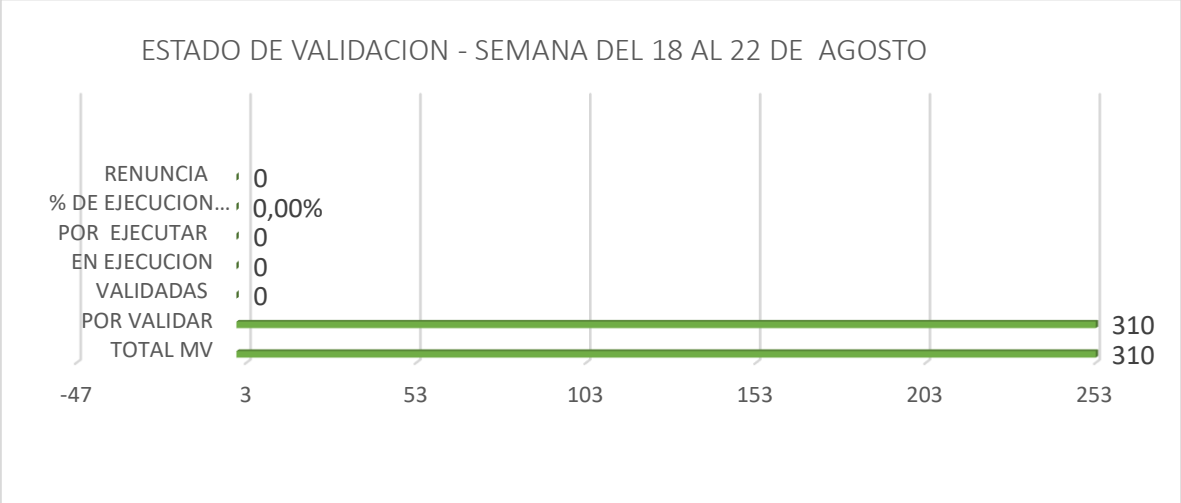

Avance de validaciones realizadas al 22 de agosto 2021: **Total 0**
Validaciones por realizar: **310 en total**.
Renuncia del subsidio: 0

RELACION PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 1 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO

Para esta semana 1 el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020,** se encuentra en periodo de socialización con los beneficiarios NO SE REALIZA INVERSIÓN A LA FECHA.

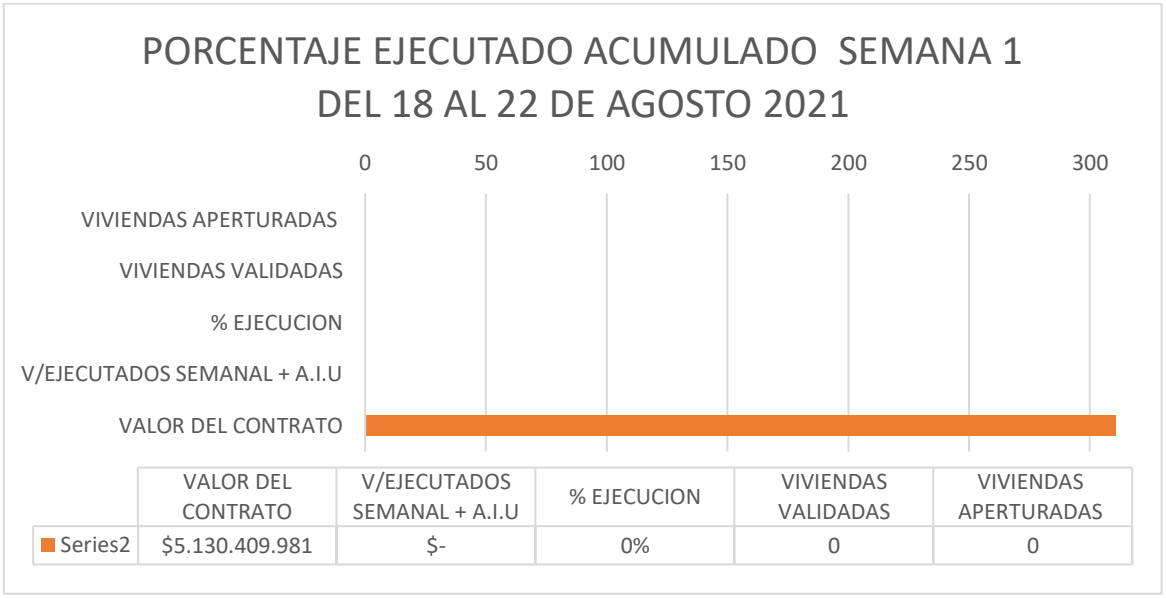

	VALOR DEL CONTRATO	V/EJECUTADOS SEMANAL + A.I.U	% EJECUCION	VIVIENDAS VALIDADAS	VIVIENDAS APERTURADAS
Series2	$5.130.409.981	$-	0%	0	0

NFORME SOCIAL

INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores	**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 1**
	INFORME SEMANAL SOCIAL No 01

Fecha: **22 DE AGOSTO 2021**	**Periodo:** Del 17 de agosto al 22 de agosto		**Informe:** Semanal No.**1**
	Proyecto: "**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021**		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			**Contrato No.:** 797 DE 2021

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	797 DE 2021
OBJETO	**"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD."**
CONTRATISTA	ORIP SAFRICON 2020
INTERVENTORÍA	INPLAYCO SAS

1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:

GRUPO 1

1.1 SOCIALIZACIONES

Durante el periodo transcurrido el contratista ORIP SAFRICON 2020 realizo convocatoria a la reunión de socialización que se llevará a cabo el día 25 de agosto de 2021se realizo a la convocatoria a los 119 beneficiarios del territorio habitarte, de la siguiente manera.

- Correero certificado se envió correo certificado a 14 beneficiarios con los cuales no se logró comunicación telefónica.
- Vía telefónica se convocaron 105 beneficiarios.

.

1.2 CARACTERIZACION O VALIDACION SOCIAL

Durante esta semana no se realizaron caracterizaciones ni validaciones sociales.

VALIDACIONES						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACION**	**OBSERVACIONES**

1.3 APERTURAS

En el actual periodo a reportar NO se generaron aperturas de obra de mejoramiento de vivienda.

APERTURAS						
No	ID_DMV	DIRECCION	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA INICIO DE OBRAS	OBSERVACIONES
1						
2						
3						

1.4 SEGUIMIENTOS DE OBRA

Durante esta semana no se realizó seguimiento de obra.

ATENCION PQRS

PQR				
No	ID_DMV	NOMBRE BENEFICIARIO	ESTADO	OBSERVACIONES
1				
2				
3				

1.5 ENTREGAS

Durante la presente semana NO se realizaron entregas de mejoramientos de vivienda

ENTREGAS DE OBRA					
Nº	ID_DMV	DIRECCION	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA ENTREGA DE OBRAS
1					
2					
3					

1.7 ATENCION A LA COMUNIDAD

El punto de atención al ciudadano se definirá una vez se empiece el proceso de obra, el horario que se tiene definido para la atención al ciudadano es el siguiente:

Martes: 8:30 am a 12:00 p.m.
Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm
Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.

a. HISTORIAS DE VIDA.

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron actividades de este tipo.

b. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

El día 20 de agosto de 2021 se comunicó la presidenta de la JAC del territorio de UNIR I con el área social de obra, manifestando su deseo de que se empiece el proceso lo más pronto posible en su comunidad, se le brindo la información acerca de la disposición y logística de la obra y que por el momento no se iniciará en este territorio.

c. CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	0
Caracterizaciones	0
Aperturas	0
Seguimientos	0
Cierres PQR	0
Entregas	0

OTRAS ACTIVIDADES

Se realiza revisión y entrega del plan de gestión social de obra e interventoría al área social de la SDHT.
Se realiza revisión y entrega de la propuesta metodológica.
Se aprueba el formato de citación a la reunión de inicio
Se realiza revisión formato lista de llamadas para reunión de inicio.

DIANA MARCELA FRADE TAMARA
SOCIAL _INTERVENTORIA

INFORME SISO

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 18 AL 22 AGOSTO 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	18/8/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	1
HASTA	22/8/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

Contratista:
1. Se Elabora protocolo de Bioseguridad para Socializaciones para a las actividades de validación
2. Elaboración de protocolo de Bioseguridad general el cual va a ser desarrollado en el proyecto, los cuales ya fueron enviados a interventoría para su aprobación
3.Se envían formatos para verificar que sean aplicables al proyecto
4.Estamos elaborando el plan de calidad en conjunto con el área técnica
5. Se asistió a reunión de inicio con Secretaria del Hábitat.
6. Revisión de Seguridad Social al personal administrativo y exámenes Médicos.
7. Se programa inducción y divulgación de Protocolo de Bioseguridad al personal administrativo día 25 de Agosto 2021.
8. Elaboración del plan de manejo Ambiental y se envía a revisión.

Interventoría: Se inician las actividades elaborando el protocolo de Bioseguridad ajustado a la resolución 777 de junio de 2021, vigente a la fecha, el cual fue radicado ante la entidad. De igual manera se revisan documentos radicados por el contratista en el oficio 003. A nivel de oficina se socializaron los protocolos de interventoría, al personal administrativo y operativo, así mismo se inicia el diligenciamiento de las encuestas y se toman datos para elaboración de las chaquetas de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad. Se revisó y envió a la secretaría los protocolos y el plan de trabajo presentado por el contratista. Se asistió a reunión de inicio con Secretaria del Hábitat.

CAPACITACION

DIVULGACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DE INTERVENTORÍA	si	100%
	La charla se hace en la oficina, como parte de los requerimientos del protocolo de Bioseguridad de la interventoría.	

2. Gestión Ambiental

Revisión del documento plan de manejo Ambiental al cual se le realizaron observaciones, en espera de la versión final

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL				no se han realizado obras
MENSUAL				
PROYECTO				

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Revisión de protocolos de Bioseguridad enviados por el contratista y elaboración del protocolo de interventoría.
Revisión y solicitud de ajustes a documentos como el plan de trabajo, algunos formatos y en espera de la entrega del plan de calidad.

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Dias de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**264**	0	6	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**264**	0	6	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**264**	0	6	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confimados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Dias de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3. Condiciones y Acciones Substandar

3.3.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
	N/A		

4. Registro Fotográfico

TEMA DE LA FOTO

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD







Divulgación Protocolo seguridad al persona de interventoría

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 18 AL 22 AGOSTO 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

META DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD: 100%

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	11	264	0.0	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
				12	288				6.00	0.00	0.00	0.00	6			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0					
				23	**552**	**0**	**0**	**0.0**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 000 - 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	552
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	552
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	552
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	6.00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	6.00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	6.00

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 18 AL 22 AGOSTO 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1,015,413,551	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1,068,972,008	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52,326,579	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79,511,489	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/8/2021	19/8/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1,014,195,383	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1,019,026,005	19/8/2021	19/8/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64,583,890	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52,476,883	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103,238,457	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 18 AL 22 AGOSTO 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1,015,413,551	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/8/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1,068,972,008	19/8/2021	12/8/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52,326,579	19/8/2021	27/4/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79,511,489	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1,014,195,383	19/8/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1,019,026,005	19/8/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64,583,890	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52,476,883	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103,238,457	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
