
INFORME SEMANAL 4
GRUPO No. 1


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021





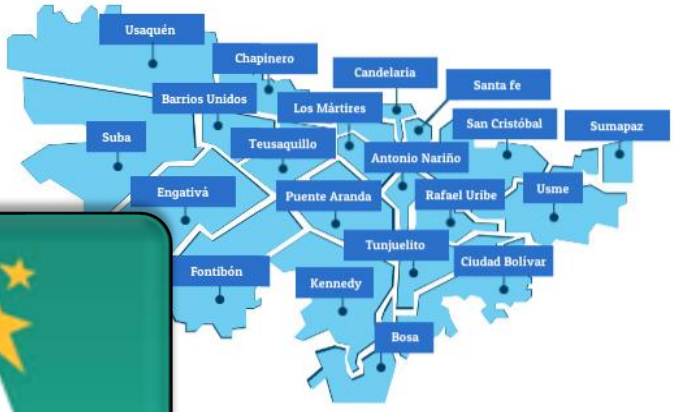

Secretaría del Hábitat

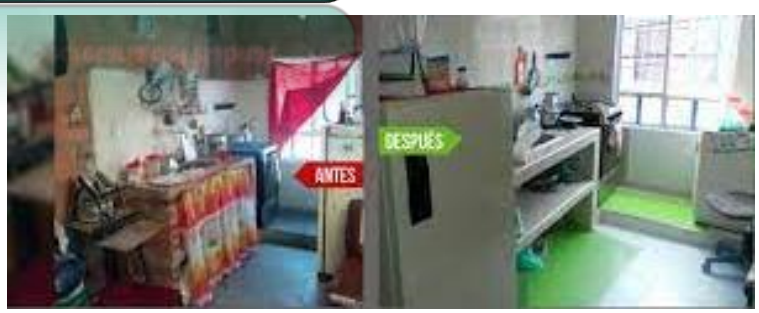

SEMANA 4 DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN

En este informe ejecutivo, comprendido del 06 de septiembre al 12 de septiembre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la cuarta semana las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas.

Para la fase de validación y obra, se definió por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios las cuales serán atendidas de manera oportuna.

El día 8 de septiembre se realizó visitas a las viviendas en compañía de la secretaria del hábitat en conjunto con la parte social y profesional de apoyo a la supervisión, el contratista de obra e interventoría. Esto para inspeccionar el MV 2252 y otras viviendas.


Se siguen los mismos MV que presentan inconvenientes en las cubiertas.

MV CON INCONVENIENTES DE CUBIERTA

TECNICO	ID_DMV	N°	CHIP	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	TELEFONO	PRESUPUESTO INICIAL
Humberto Blanco	MVCB_3410	4	AAA0027LYWF	DG 69 SUR 18N 86	JUAN PABLO II	OCTAVIO VALENCIA LLANO	10089149	3143018910 3202216325	$ 11.427.635,00
Astrid Gonzalez	MVCB_4892	10	AAA0027PAJH	KR 18N 68 04 SUR	JUAN PABLO II	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	17525138	3143694542 7172820	$ 12.247.096,40
	MVCB_4629	12	AAA0027OLRU	CL 67C SUR 18N 25	JUAN PABLO II	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	79822272	3229246482 - 7928841	$ 11.724.531,40
	MVCB_4152	15	AAA0027NMLW	CL 67A SUR 18N 77	JUAN PABLO II	BEATRIZ RODRIGUEZ	39521530	3157444994- 7657426	$ 11.977.537,90
	MVCB_4689	16	AAA0027OOEP	DG 68A SUR 18N 64	JUAN PABLO II	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	51858649	3175950322	$ 10.906.100,50
David Garcia	MVCB_2411	31	AAA0027JDXS	TV 18R BIS A 69 33 SUR	JUAN PABLO II	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	23359890	3118263756 - 3112696273	$ 12.032.573,60
	MVCB_2414	33	AAA0027JEAF	TV 18R BIS A 69 47 SUR	JUAN PABLO II	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	79591867	3007150909-3003915511	$ 12.149.156,80
Camila Giraldo	MVCB_2049	39	AAA0027HLKC	KR 18X 68C 05 SUR	MARANDU	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	40780354	3234768399 3108622593	$ 8.814.490,40
	MVCB_2053	40	AAA0246ZWAW	KR 18X 68C 15 SUR	MARANDU	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	1024471159	3106882878-3132218551	$ 11.716.673,20

Como se expuso en el informe No. 3 el inconveniente encontrado está en que, al realizar estas actividades, se podría correr el riesgo de incurrir en el no cumplimiento de la Norma y de la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.

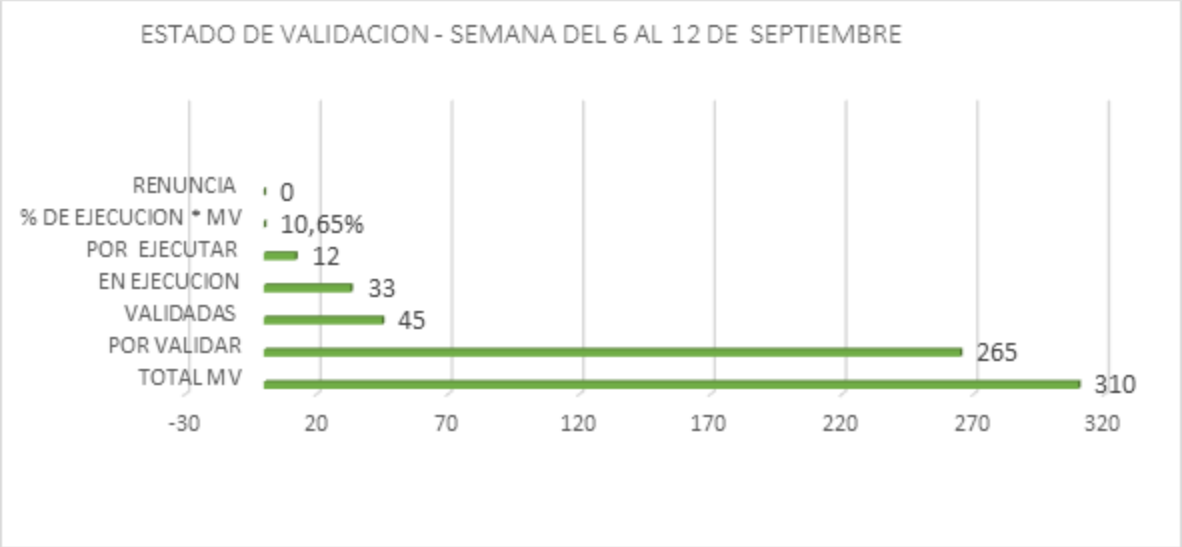

Avance de validaciones realizadas al 11 de septiembre 2021: **Total 45**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 4**
Validaciones por realizar: **265 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**
Se realiza cambio de MV por solicitud de la entidad:

MVJE_214 y MVJE_778 por los MV (MVJE_604 y MVJE_358)

2. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

ING. HUMBERTO BLANCO GONZÁLEZ

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **12-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Humberto Blanco González	JUAN PABLO II	25	28	9	16	0	7	0	18	0,74%	0
		URB. COMPARTIR	3		0	3	0	0	0	3	0,00%	0
Técnico Responsable					0	0	0					
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**9**	**19**	0	**7**	**0**	**21**	**0,74%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											Septiembre
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 4**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO		$ 10.814.804,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	11,17%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO		$ 11.944.526,0	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	9,50%
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO		$ 11.398.939,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%

4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI NO		$ 11.427.635,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI NO		$ 12.204.961,0	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO		$ 11.186.603,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO		$ 11.626.077,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO		$ 10.707.871,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO	$ 12.134.440,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0				0,00%	0,00%
	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0				0,00%	0,00%
	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0				0,00%	0,00%
	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2				0,00%	0,00%
	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4				0,00%	0,00%
	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0				0,00%	0,00%
	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8				0,00%	0,00%
	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3				0,00%	0,00%
	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0				0,00%	0,00%
	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0				0,00%	0,00%
	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0				0,00%	0,00%
	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4				0,00%	0,00%
	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2				0,00%	0,00%
	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8				0,00%	0,00%
	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9				0,00%	0,00%
	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5				0,00%	0,00%

URBANIZACION COMPARTIR											
	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		$ 11.953.028,0				0,00%	0%
	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		$ 11.612.217,0				0,00%	0%
	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		$ 11.789.319,0				0,00%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	6/09/2021	AL	12/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.


***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$402.948.509,67	7,85%	-7,80%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$2.951.856,91	0,06%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

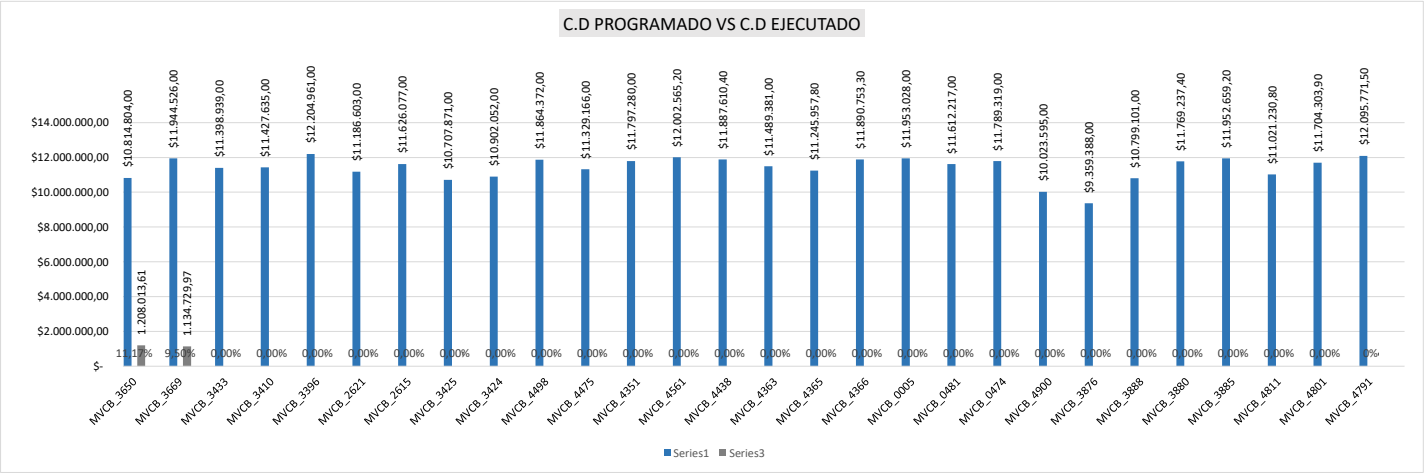

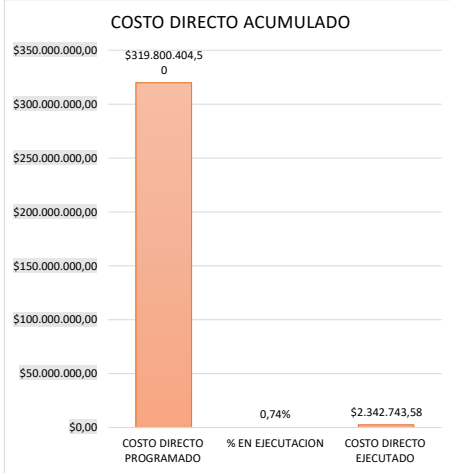

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

El 6 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un comité técnico en las oficinas de la interventoría al que asistió el contratista para tratar temas relacionados con ítems a ejecutar. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas la semana anterior. Se inició el proceso de apertura de viviendas del barrio Juan Pablo II.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

1	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	El día 9 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, sala comedor y alcobas. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. **No se han iniciado actividades de obra.**
2	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	El día 9 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, sala comedor y alcobas. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. **No se han iniciado actividades de obra**

3	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	El día 10 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, sala comedor y alcobas. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. **No se han iniciado actividades de obra**
4	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	El día 7 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, hall de acceso y alcobas. Se explica al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. **Se avanza en ejecución** de actividades de demolición de enchapes de pared y pañetes. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
5	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	El día 8 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, sala comedor y alcobas. Se explica al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. **Se avanza en ejecución** de actividades de pañetes de muros. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
6	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	El día 7 de septiembre de 2021 se realizó el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, zona de lavandería, sala, comedor y alcobas. Durante el protocolo de apertura se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría. Los residentes técnicos del contratista e interventoría explican al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. Se realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. **Se avanza en ejecución** de actividades de demoliciones del mesón y de los enchapes de cocina; pañete impermeabilizado en alcobas 2 y 4; alistado de pisos en alcobas 2 y 4. Se tomaron fotografías para evidenciar el avance de obra.
7	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR
8	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	El día 9 de septiembre de 2021 se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. En esta vivienda se intervendrán áreas de cocina, baño, zona de lavandería, sala, comedor y alcobas. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. **No se han iniciado actividades de obra.**
9	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR: El día 10 de septiembre de 2021 se visitó el predio para proceder a hacer apertura, pero no se encontró al beneficiario.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría estructuraron los respectivos presupuestos de acuerdo con las actividades de mejoramiento priorizadas en la visita de validación.	Equipo técnico interventoría y contratista	6-11 sepbre 2021
Se efectúan visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	6-11 sepbre/2021
La próxima se hará la visita a las viviendas MVCB 3410 y MVCB 2615 con el fin de efectuar el proceso de apertura de estas viviendas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	13/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
A la fecha no se han presentado actividades no previstas. Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollen en las viviendas velando porque se invierta el presupuesto proyectado.
En el inmueble MVCB 3424 fue necesario aumentar el presupuesto inicial de $ 10.902.052 a $ 12.134.440, con el fin de terminar de manera satisfactoria las áreas que ameritaban mejoramiento en dicha vivienda.
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
El día lunes 6 de septiembre de 2021, se llevó a cabo un comité técnico en las oficinas del interventor, en el cual participaron los residentes y directores técnicos de interventoría y contratista, tratando temas relacionados con los ítems a utilizar en las actividades de enchapes cerámicos de paredes y pisos, combo de puertas y se solicitó al contratista que remitiera las fichas técnicas de los materiales y accesorios que utilizará en el desarrollo del contrato. Se levantó acta de dicha reunión.
Durante el presente período se aperturaron siete (7) viviendas de las nueve (9) viviendas validadas en el barrio Juan Pablo II; se abrieron los libros de bitácora y se explicó al beneficiario las obras de mejoramiento a ejecutar.
A la fecha del presente informe se iniciaron obras en tres (3) de las siete (7) aperturadas en el barrio Juan Pablo II.
La mayor parte de la semana se presentó tiempo seco. Lloviznas aisladas después del mediodía.
Se avanza en las actividades proyectadas. Se continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento).
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

APERTURAS DE VIVIENDAS BENEFICIADAS



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3650: MARTHA NUBIA POSADA. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3433: ELENA MOJICA DE GUTIERREZ. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	miércoles, 8 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3669: GABRIELA MUÑOZ. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3424: GIANNI GIOVANNA REYES. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3425: PABLO ANTONIO CUERVO. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3396: ÁNGEL ESTELA MENDOZA. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3650 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de obra en área de cocina: Se demolieron enchapes deteriorados, se pañetan muros	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se observa avance de pañete de muros en el patio	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de pañete de muros en alcoba 3	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muro exterior de la alcoba 3	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se levanta y pañeta mocheta en bloque en área de baño	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de enchape antiguo en área de la ducha	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3669 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de pañete de muros en área de la sala comedor	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de pañete en muros de cocina	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muros en alcoba 2	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete en muro izquierdo de la sala	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Preparación de mortero para pañete	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Inicio de actividades de pañete de muros en alcoba 1	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3433 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se observa demolición de pañete de muros y posterior aplicación de pañete impermeabilizado en alcoba 2	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista de la demolición de pañete antiguo en área de cocina	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de pañete y posterior aplicación de pañete impermeabilizado. Se aprecia alistado de piso en alcoba 4	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Instalación de maestras para alistado de piso en mortero en alcoba 2	

ARQ. ASTRID GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	12-sep-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Astrid Gonzalez Gutierrez	Juan Pablo II	25	28	10	15	0	5		20	0,32%	0
		Urbanizacion Compartir	2		0	0	0					
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	0	0					
					0	0	0					
Subtotal			**28**	**28**	**10**	**15**	0	**5**	**0**	**20**	**0,32%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 4**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1												
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA		0,00%	0,00%
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO		$ 12.077.142,10			VALIDADA		0,00%	0,00%
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION		0,00%	0,00%
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO		$ 12.238.468,00	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION		0,00%	3,91%

5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI NO		$ 11.377.892,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI NO		$ 10.770.153,00	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,93%
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO		$ 12.024.568,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	4,01%
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO		$ 11.841.207,00				0,00%	0,00%
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO		$ 10.652.916,00		VALIDADA		0,00%	0,00%
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO		$ 12.076.903,30				0,00%	0,00%
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO		$ 12.052.125,10				0,00%	0,00%
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI NO		$ 12.150.294,90				0,00%	0,00%
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI NO		$ 11.998.548,50				0,00%	0,00%
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI NO		$ 11.934.657,60				0,00%	0,00%
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI NO		$ 11.606.673,70				0,00%	0,00%
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI NO						0,00%	0,00%
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI NO		$ 11.592.989,00				0,00%	0,00%
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI NO		$ 11.981.782,60				0,00%	0,00%
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI NO		$ 12.198.500,50				0,00%	0,00%
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI NO		$ 11.854.190,20				0,00%	0,00%
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI NO		$ 12.205.262,30				0,00%	0,00%
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI NO		$ 11.991.555,40				0,00%	0,00%

URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2																	
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62		FLORINDA CADENA NINO		SI NO		$ 12.284.986,00						0,00%		0,00%
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75		JOSE LEONARDO SERRANO		SI NO		$ 12.154.953,00						0,00%		0,00%
ACACIAS IV ETAPA 2																	
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR		LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO		SI NO								0,00%		0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	6/09/2021	AL	12/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$387.985.044,13**	7,56%	-7,54%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$1.336.698,37**	0,03%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

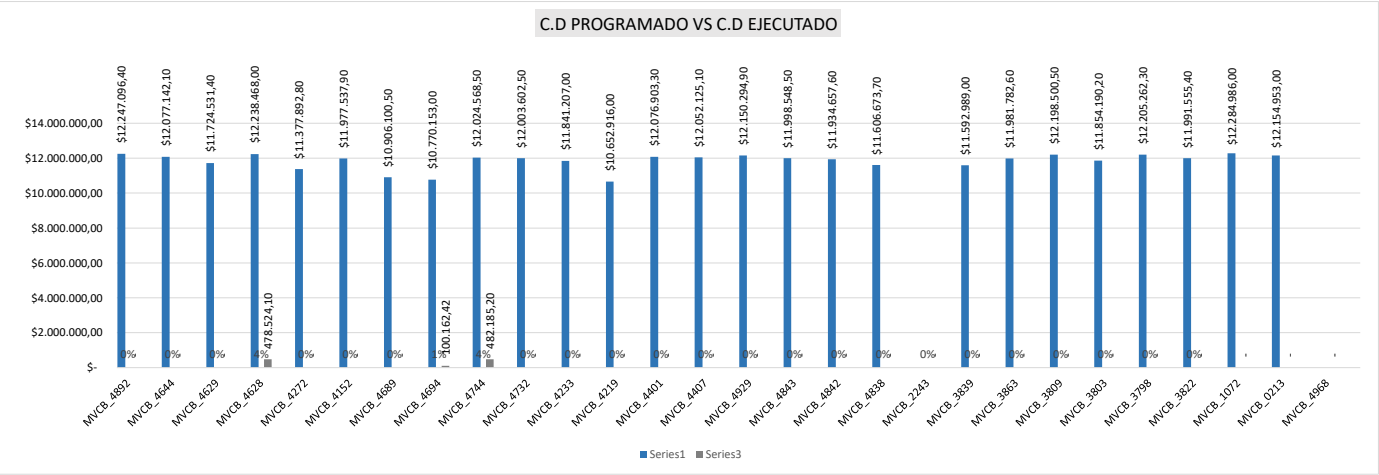

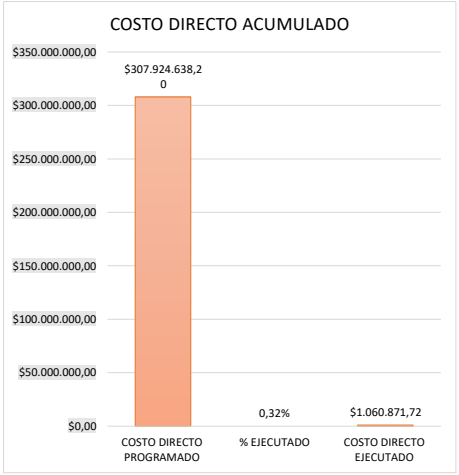

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	La beneficiaria firmo una prorroga hasta el dia 20 de septiembre ya que esta realizando unas mejoras y en estas areas es que se van a realizar las mejoras
3	MVCB 4628	Jose Ebelio León	Se realiza acta de inicio el día 7 de septiembre del 2021, indicando áreas a intervenir y valor del presupuesto adjudicado. El dia 9 de septiembre se presentan los maestros y actividades a realizar. El dia 10 de septiembre llegan al predio 30 bultos de arena de rio, 20 bultos de arena de peña y 5 bultos de cemento. El personal empieza a pasar niveles en la sala y alcoba a intervenir.
4	MVCB 4152	Beatriz Rodriguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat

5	MVCB 4694	Horacio Jesus Torres	Se realiza acta de inicio el día 7 de septiembre del 2021, indicando áreas a intervenir y valor del presupuesto adjudicado. El dia 10 de septiembre del 2021 llega al predio 20 lonas de areana de peña y tres bultos de cemento, se inicia actividad de pasar niveles para cielo raso en PVC
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Alvaro Zubieta Tunjano	Se realiza acta de inicio el día 8 de septiembre del 2021, indicando áreas a intervenir , valor del presupuesto adjudicado y se presenta a maestro de la casa. El día 9 de septiembre llega al predio 30lonas de arena de rio. 10 lonas de arena de peña; cada una de aproximadamente 25kg y 6 bultos de cemento Holcim. El día 10 de septiembre se realiza alistado de piso en sala y picado de piso esmaltado en alcoba del beneficiario
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	Se realiza acta de inicio el día 7 de septiembre del 2021, indicando áreas a intervenir y valor del presupuesto adjudicado. El dia 10 de septiembre se presenta al maestro que iniciara actividades el dia lunes 12 de septiembre del año en curso.
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	Se realiza acta de inicio el día 8 de septiembre del 2021, indicando áreas a intervenir y valor del presupuesto adjudicado. El día 9 de septiembre se presentan los maestros al beneficiario y se informan actividades a realizar. El dia 10 de septiembre se realiza visita al predio y el señor no ha terminado de desocupar las areas a intervenir; se le da plazo hasta el dia lunes 12 de septiembre para iniciar actividades.
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	Se realiza validación el día 9 de septiembre del 2021. El beneficiario solicita realizar inicio de actividades hasta la semana entrante, ya que manifiesta que es administrador de una finca y tiene que mirar como organiza los permisos laborales.
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 8 de septiembre se realiza validación del predio, el beneficiario solicita que no se le intervenga el predio con cielo raso sino mejor las escaleras; esto se notificara a la entidad.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se realiza apertura de predios el día 7 de Septiembre. Realizando visitas con personal técnico, Social y Seguridad Industrial.	Residentes de interventoría y de contratista	07/09/2021-
El hábitat hace visita al pac del contratista e informa que los balances toca dejarlos en cero	Residentes de interventoría, residentes de contratista y Hábitat	9/08/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 6 de septiembre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Martes 7 de septiembre día nublado sin lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Miercoles 8 de septiembre día soleado sin lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Miercoles 9 de septiembre día soleado sin lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo. Dia de paro nacional.

El día Miercoles 10 de septiembre día soleado sin lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4892 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Esperando permiso de la secretaria de habitat para intervenir cubierta	

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	

FECHA	Lunes 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4219 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del hall de entrada	




FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Sala del predio a intervenir	



FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Baño del predio	



FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Cocina estado en validacion	

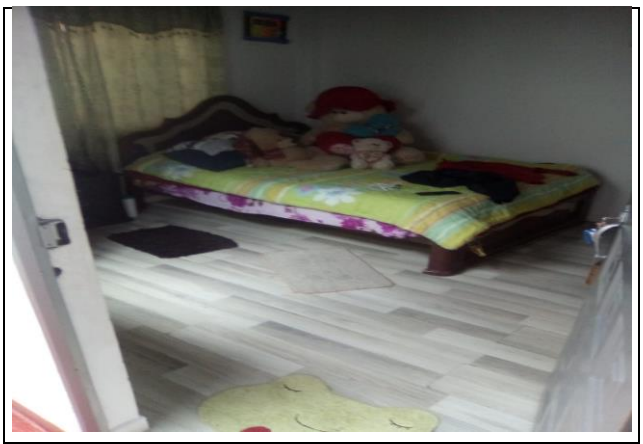

FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 1 de predio antes de realizar intervencion	



FECHA	Miercoles 8 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Zona de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4644 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del hall de entrada	



FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Sala del predio a intervenir	




FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Baño del predio	



FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Cocina estado en validacion	



FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 2 de predio antes de realizar intervencion	

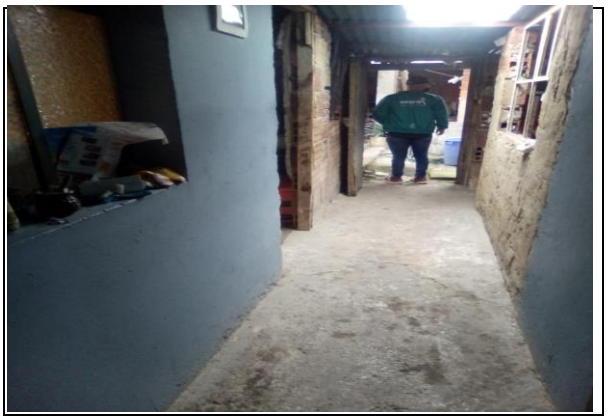

FECHA	Jueves 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Hall en apartamento	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4629 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Miercoles, 8 de septiembre 2021
DESCRIPCION	
Se Realiza apertura de vivienda informando actividades a realizar	

FECHA	Viernes, 10 de septiembre 2021
DESCRIPCION	
El beneficiario no ha terminado de desocupar las areas a intervenir se da plazo hasta el 12 de septiembre del 2021	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4628 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Martes 7 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Apertura de vivienda con hija del beneficiario	



FECHA	Viernes 10 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Se presenta el maestro a iniciar actividades	



FECHA	Martes 7 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Llegada de arena de peña y arena de rio	



FECHA	Viernes 10 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
llegada de cemento	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4272 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR

FECHA	Lunes 6 de Septiembre del 2021
DESCRIPCION	
El beneficiario esta realizando mejoras en el area a intervenir, tiene plazo hasta el 20 de septiembre	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	


FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4152 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR

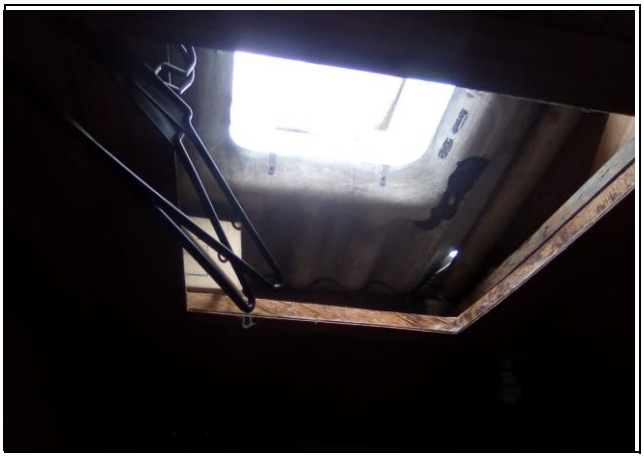

FECHA	Lunes, 6 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Predio a intervenir cubierta esperando autorizacion del habitat	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4689 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Lunes, 6 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Predio esperando autorizacion del habitat para intervenir cubierta	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4694 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura de vivienda con hija del beneficiario	



FECHA	Viernes, 6 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se presenta el maestro que va a realizar actividades	



FECHA	Viernes, 6 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Llegada de arena de peña al predio	



FECHA	Viernes, 6 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Llegada de cemento al predio	



FECHA	Viernes, 6 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se cimbra la altura del cielo raso en PVC	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4744 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Miercoles, 8 de septiembra del 2021
DESCRIPCION	
Se realiza apertura de vivienda indicando actividades a realizar y se presenta maestro	



FECHA	Jueves, 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Se presenta maestro a iniciar actividades	



FECHA	Jueves, 9 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Llegada de 30 lonas de 25Kg de arena de rio, 10 lonas de arena de peña y 6 bultos de cemento Holcim	



FECHA	Viernes, 10 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso en la sala	



FECHA	Viernes, 10 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Picada de piso esmaltado en Alcoba del beneficiario	



FECHA	Viernes, 10 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso sala	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4732 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura de vivienda con beneficiaria	

FECHA	Viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se presenta al maestro que va a iniciar actividades el lunes 12 de septiembre del 2021	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

ARQ. LEONARDO SOLANO

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**12-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	9	9	0	0	0	0	9	0,00%	0
					0	0	0					
Técnico Responsable	Arq.Leonardo Solano				0	0	0					
					0	0						
Subtotal			**9**	**9**	**9**	**0**	0	**0**	**0**	**9**	**0,00%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 4**

BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI NO		$ 11.152.685,90	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI NO		$ 11.211.390,00	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI NO		$ 11.927.560,50	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO		$ 12.087.004,90	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO		$ 12.289.771,00	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO		$ 12.059.809,40	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO		$ 9.602.199,70	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION (NO HAN INICIADO)	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	6/09/2021	AL	12/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$ 131.500.075,52**	2,56%	2,56%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$** -	0,00%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

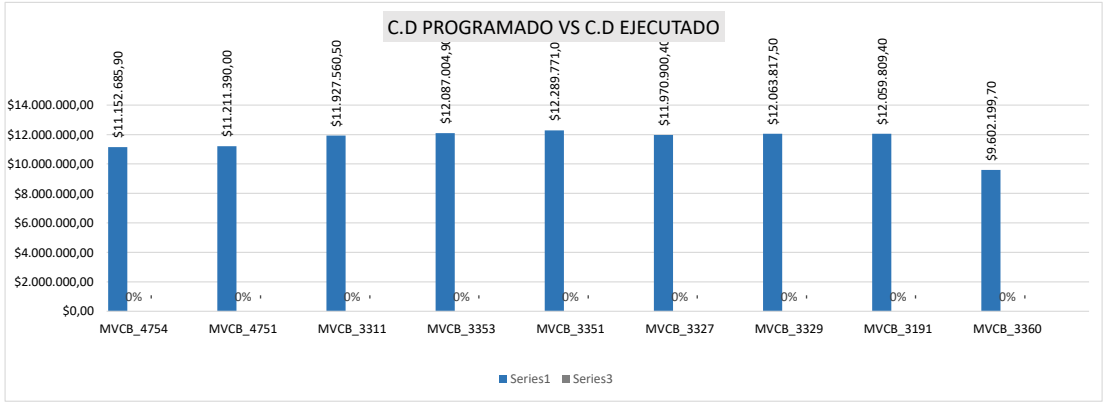

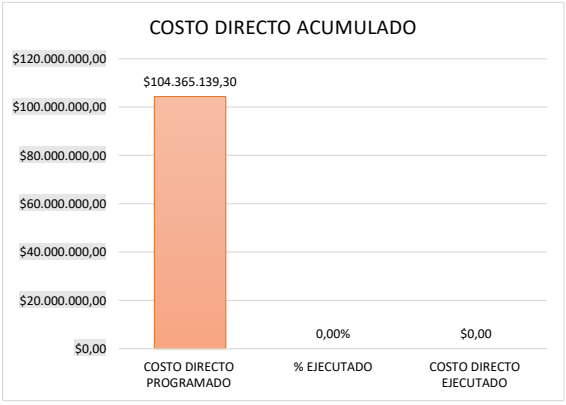

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando aplicacion de estuco en muros area sala y demolicion pisos area baño.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO

7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	12/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se aprobado presupuestos iniciales para determinar Actas de Mayores o menores

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_4754 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (VALIDACION DE VIVIENDA)



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Sala : Placa de concreto ausencia de Piso Ceramico



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Baño : Ausencia Piso Ceramico,Sanitario,Lavamanos y Zona Ducha.



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Cocina : Placa de concreto ausencia de Piso Ceramico y Meson Cocina



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Comedor : Placa de concreto ausencia de Piso Ceramico



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Estudio : Placa de concreto ausencia de Piso Ceramico



viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION
Area Acceso : Placa de concreto ausencia de Piso Ceramico

ARQ. DAVID GARCÍA

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **12-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. David García Cortes	Juan Pablo II	9	9	7	2	0	5		4	1,86%	
					0	0	0					
Técnico Responsable					0	0	0					
					0	0	0					
Subtotal			**9**	**9**	**7**	**2**	0	**5**	**0**	**4**	**1,86%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 4**

BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI NO		$ 12.079.596,40	8/09/2021	23/09/2021	APERTURADA	0,00%	0%
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI NO		$ 11.947.615,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	12%
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI NO		$ 12.032.573,60				0,00%	0%
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI NO		$ 12.169.719,00	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	10%
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI NO		$ 12.149.156,80				0,00%	0%
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI NO		$ 11.701.628,10	9/09/2021	24/09/2021	APERTURADA	0,00%	0%
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI NO		$ 11.769.775,40	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	10%
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI NO		$ 11.326.716,60	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	12%
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI NO		$ 11.528.955,20	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	8%
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.792.129,40				0,00%	0%
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.676.457,80				0,00%	0%
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI NO						0,00%	0%
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI NO						0,00%	0%
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI NO		$ 11.678.378,50				0,00%	0%
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI NO		$ 11.386.359,00				0,00%	0%
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI NO						0,00%	0%
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI NO		$ 11.887.405,00				0,00%	0%
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI NO		$ 11.878.089,50				0,00%	0%
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO		$ 11.904.933,20				0,00%	0%

20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO						0,00%	0%
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		$ 12.028.047,20				0,00%	0%
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.991.549,20				0,00%	0%
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		$ 11.196.334,10				0,00%	0%
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00				0,00%	0%
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80				0,00%	0%
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60				0,00%	0%
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO		$ 11.547.979,00				0,00%	0%
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		$ 10.062.877,30				0,00%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	6/09/2021	AL	12/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$355.292.716,21**	6,93%	-6,78%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$7.697.573,99**	0,15%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

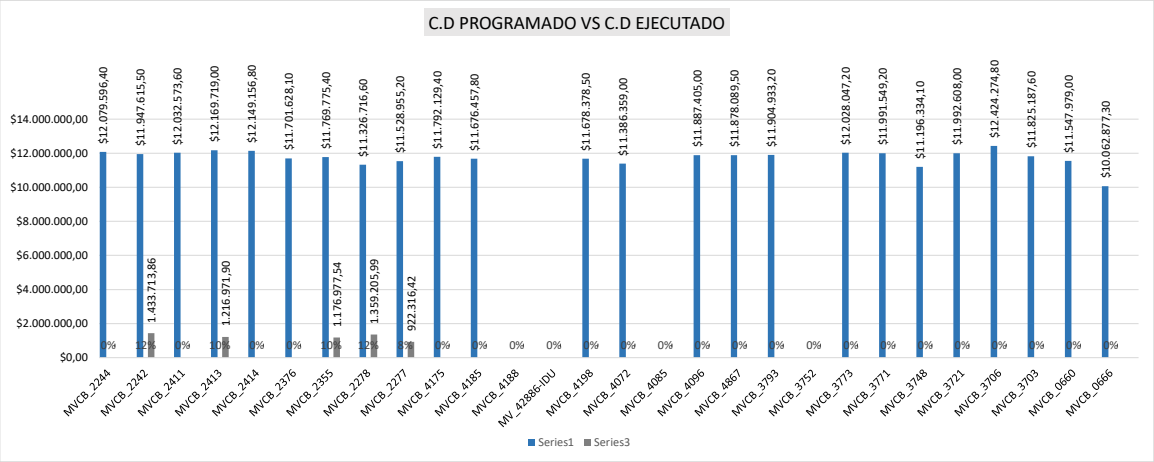

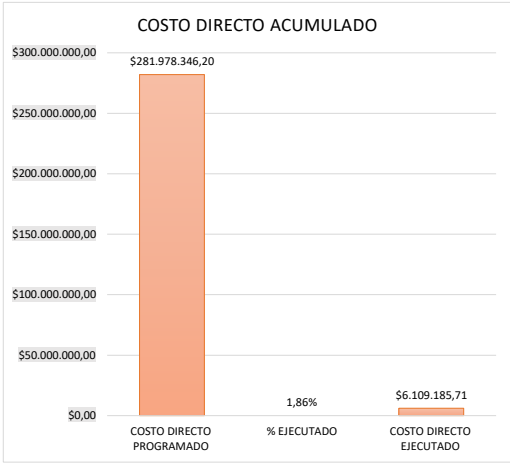

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día martes 7 de septiembre de 2021. La beneficiaria terminó modificaciones acordadas a tiempo.Los maestros inician actividades el miercoles 8 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchape de baño y enchape de piso en el primer nivel, desmonte de aparatos sanitarios, pañete de muros de baño.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día martes 7 de septiembre de 2021. Los beneficiarios terminaron modificaciones acordadas a tiempo. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Demolición de enchape de cocina, desmonte de lavaplatos, demolición de mesón, preparación de piso en sala y alcoba.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	No se ha realizado apertura.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	No se ha realizado apertura.

5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día miercoles 8 de septiembre de 2021. La beneficiaria modificó el área de la cocina del primer nivel. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchape de piso del patio y preparación de piso del mismo, muro en mampostería del patio y pañetes de muro del mismo espacio.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día miercoles 8 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe no han empezado actividades de obra ni transporte de material a la vivienda.
7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día miercoles 8 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Desmonte de lavaplatos, demolición de mesón (solo parte superior sin entrepaño), demolición de enchape de cocina y baño. Se realizarán ajustes al presupuesto debido a que se requiere modificar puntos hidraulicos y de desagüe de cocina, baño y zona de lavado.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día jueves 9 de septiembre de 2021. Los beneficiarios terminaron modificaciones acordadas a tiempo. Hasta la fecha del presente informe no han empezado actividades de obra ni transporte de material a la vivienda. Los beneficiarios tienen material propio en la vivienda para modificaciones previas.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Se realiza visita de apertura y presentación de personal a beneficiario el día martes 7 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de alcobas y muro exterior del baño.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A lo largo de la semana se realizó la visita de apertura a siete (7) predios del barrio Juan Pablo II y se iniciaron actividades de obra en cinco (5) de ellas.	Residentes de interventoría y de contratista	6/09/2021-

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

No se reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2277 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
demolición de enchape de piso	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
demolición de enchape de baño y pañete	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2278 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de mesón de cocina	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Preparación de piso	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de piso para enchape	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2414 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2411 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	martes, 31 de agosto de 2021
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2242 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	miércoles, 8 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de enchape de cocina	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Muro en mampostería y pañete de piso para enchape	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muro en patio de ropas	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2244 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	miércoles, 8 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2413 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	miércoles, 8 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de enchape de cocina	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado del muro despues de demolición de enchape	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de enchape de baño	



DESCRIPCION
Demolición de mesón de cocina

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_2376 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Modificación a la espacialidad por parte de propietarios	

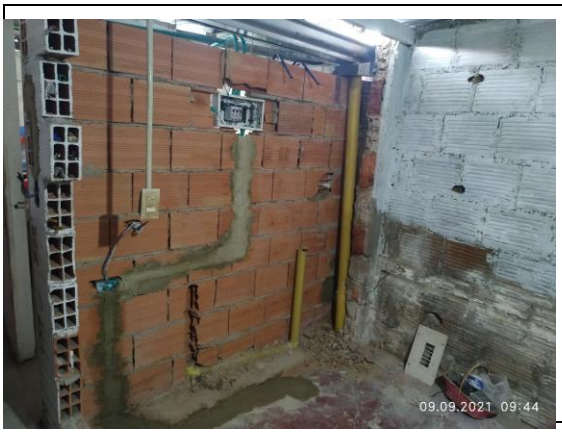

FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Modificaciones previas a la ejecución	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2355 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Apertura	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete alcoba 1	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muro de alcoba 2	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muro exterior de baño	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

ARQ. CAMILA GIRALDO

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**12-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Camila Giraldo Jimenez	Marandu	7	26	7	0	0	5	0	2	0,77%	0
		Juan Pablo II	13		0	13	13	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		0	6	6	0	0	6	0,00%	0
Subtotal			**26**	**26**	**7**	**19**	0	**5**	**0**	**21**	**0,77%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	Septiembre
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 6 AL 12
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 4**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0%

2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0%
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	10%
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO		$ 11.811.116,20	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	10%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO		$ 11.941.531,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 9.757.539,80	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO		$ 11.884.972,10	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	0%
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30			SIN VALIDAR	0,00%	0%
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60			SIN VALIDAR	0,00%	0%
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40			SIN VALIDAR	0,00%	0%
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90			SIN VALIDAR	0,00%	0%
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29			SIN VALIDAR	0,00%	0%
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50			SIN VALIDAR	0,00%	0%

URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO		$ 11.197.949,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	0%
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		$ 11.882.772,80			SIN VALIDAR	0,00%	0%
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO		$ 11.528.505,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO		$ 11.926.026,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO		$ 11.809.681,00			SIN VALIDAR	0,00%	0%
											0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	4	DEL	6/09/2021	AL	12/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$364.887.601,55**	7,11%	7,05%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$2.987.021,30**	0,06%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

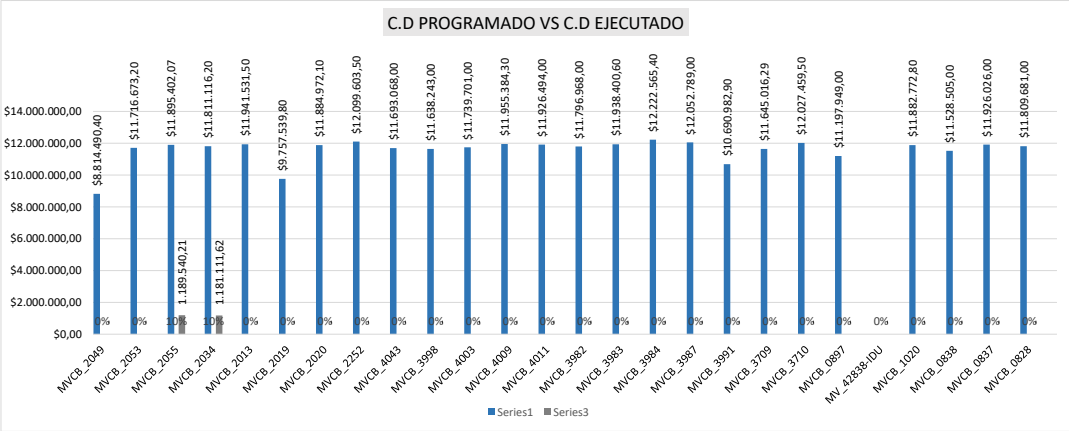



4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU

1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza apertura de la vivienda el dia 07/09/2021, se evidencia avance en actividad de pañete en cocina y hall principal.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza apertura de la vivienda el dia 07/09/2021, se evidencia avance en actividad de pañete en sala, hall principal y escaleras segundo piso
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza apertura de la vivienda el dia 08/09/2021 a la fecha no se ha iniciado actividades ni se presenta personal operativo. Se encuentra material en la vivienda.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza apertura de la vivienda el dia 08/09/2021 a la fecha no se ha iniciado actividades, no se presenta personal operativo ni material en la vivienda.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza apertura de la vivienda el dia 07/09/2021, se presenta fuga de agua en sala, se le informa a la Beneficiaria que no se podra intervenir esta zona por problemas de humedad y que la actividad sera reemplazada, a lo que ella nos indica que se compromete a subsanar dicha humedad para continuar con las actividades iniciales

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2055



FECHA: 10/09/2021



FECHA: 10/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2034



FECHA: 8/09/2021



FECHA: 10/09/2021



FECHA: 8/09/2021



FECHA: 10/09/2021

3. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA

A la fecha el contratista realiza los ajustes correspondientes a la programación general del proyecto, ya que se ha presentado inconvenientes entre los presupuestos de las viviendas, especificaciones técnicas y el presupuesto no se ajusta al valor contratado.

En programación expuesta por el contratista se identifican las siguientes etapas de desarrollo

HABITARTE

Etapa 1: 45 validaciones
Etapa 2: 74 validaciones e inicia el 13 de septiembre


UNIR

Etapa 1: 50 validaciones e inicia el 27 de septiembre

JERUSALÉN Y POTOSÍ

No se ha especificado programación

En así, que en comité de obra del jueves 9 de septiembre el contratista indica que la programación final es entregada la semana del 13 al 17 de septiembre de 2020.

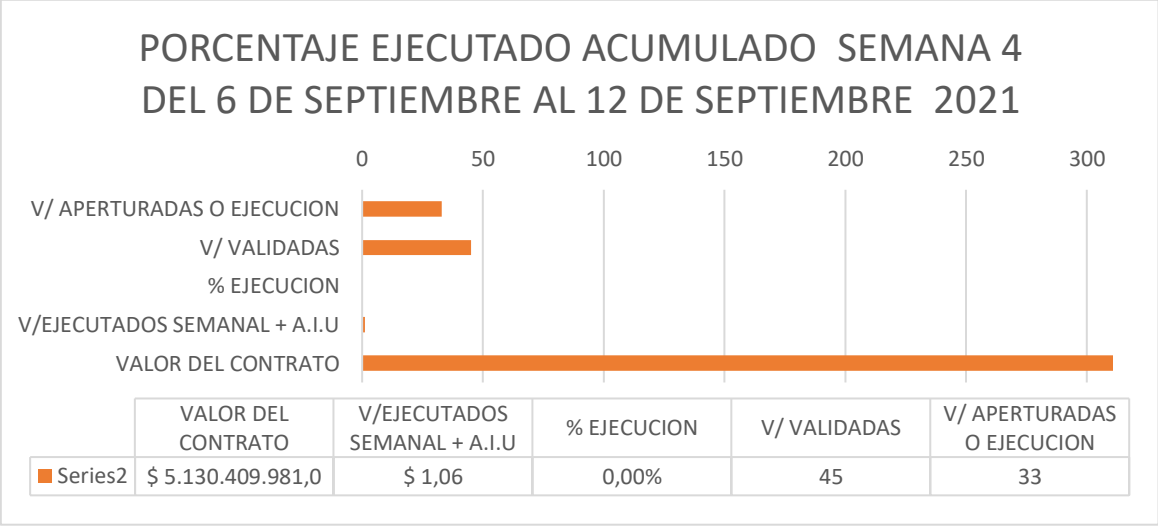

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 3 DEL 30 de AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE.

Para esta semana 4 el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020,** se encuentra en periodo de socialización con los beneficiarios NO SE REALIZA INVERSIÓN A LA FECHA.

No se ha intervenido o ejecutado a la fecha ningún mv.

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías presentadas que impidan el normal desarrollo de las obras

- El MV No. 4629 Cuyo propietario Jorge Jiménez, se acuerda ajustar áreas para ingreso a realizar actividades el miércoles 15 de septiembre.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL


Durante esta semana se realizaron las siguientes validaciones:
RELACIÓN DE VALIDACIONES

Nº	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO
1	MVCB_4219		JUAN PABLO II	MAURICIO MARTIN BELTRAN
2	MVCB_4644		JUAN PABLO II	JOSÉ ALIRIO TORRES ÁVILA

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron socializaciones en ninguno de los territorios.
PQR

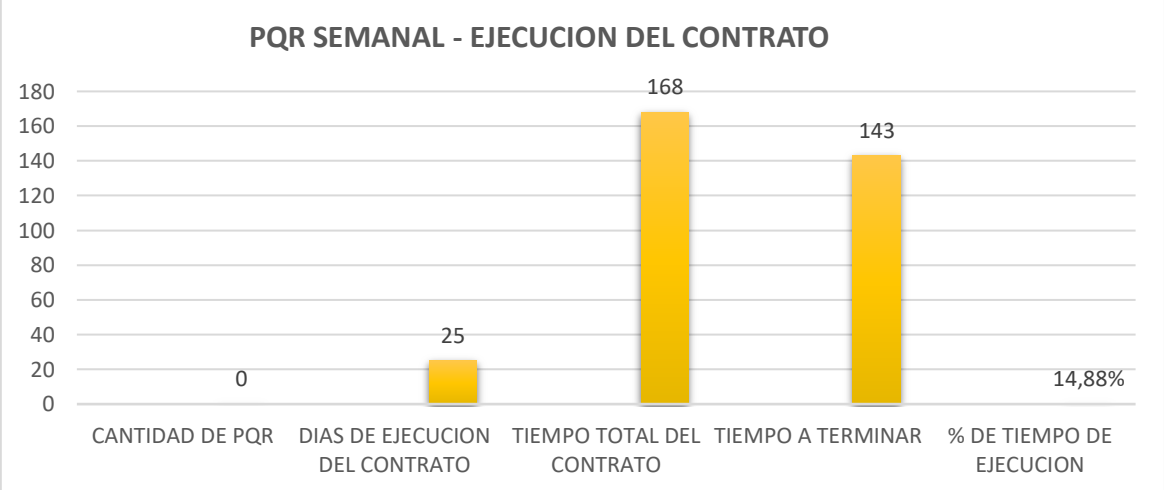

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 25 días después de la firma del acta de inicio por lo que el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	12/009/2021	**PERIODO No.**	4	DEL	**6/08/2021**	AL	**12/09/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR ll, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
VALIDACIONES REALIZADAS
08/09/2021 MVCB_4219 **MAURICIO MARTIN BELTRAN** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
09/09/2021 MVCB_4644 **JOSE ALIRIO TORRES AVILA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
07/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza apertura con carta de autorizacion a hija **SANDRA CRISTINA HUESO PINILL,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Se establecen compromisos de obra para algunas areas antes de iniciar obras de mejoramiento.
07/09/2021- **MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona quien lo autoriza por medio de llamada teléfonica, se le solicita realizar carta de autorización.
07/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
07/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
07/09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
07/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
07/09/2021 - **MVCB_2055: FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL,** se realiza apertura de vivienda, Se genera compromiso, orientado a la disposicion de la coneccion del gas natural.
07/09/2021 - **MVCB_2020: BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** se realiza apertura de vivienda sin embargo la beneficiaria solicita iniciar obra el dia jueves 9 de septiembre del año en curso.
07/09/2021 - **MVCB_2034: AMINTA SABOGAL** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.

	07/09/2021 - **MVCB_4628 JOSE ABELINO LEON** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	07/09/2021 - **MVCB_4694 HORACIO DE JESUS TORRES** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	07/09/2021 - **MVCB_4732 DORIS GALVIS PATARROYO** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	08/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	08/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza apertura con carta de autorización a Madre **LETICIA CASTRO SIERRA,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	08/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
	08/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍAZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
	08/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	08/09/2021 - **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	08/09/2021 - **MVCB_ 2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	08/09/2021 - **MVCB_4744 ALVARO ZUBIETA TUNJANO** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	08/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
	08/09/2021 - **MVCB_4629: JORGE ANDRES JIMENEZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
	09/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
	09/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	09/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO,** Apertura de viivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	09/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Apertura de vivienda realizada con el atutorizado del predio STIVEN HERREÑO ANGULO, se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
	09/09/2021**- MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN**, se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	09/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ ,**Se realiza apertura con carta de autorización a hijo **EDWIN DUBAN MARULANDA,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	10/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza apertura con carta de autorización a hijo **DUVAN BARRIOS MARTINEZ.** Se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	10/09/2021- **MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,**Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
	10/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
07/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** se realiza seguimiento, vivienda sin novedad desde el area social.
07/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** La beneficiaria se encuentra reacomodando los enseres del hogar, con el fin de facilitar la intervencion, ya que la vivenda es pequeña y el moviliario es alto
07/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** se realiza seguimiento, vivienda sin novedad desde el area social.
09/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**, seguimiento de obra. la familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio.
09/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, seguimiento de obra. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas en inquietudes. Indica que empezaron obras el día de hoy. Se le hace la recomendación de no colaborar a los maestros en las labores de obra
09/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, seguimiento de obra. La beneficiaria no se encuentra en el predio, se le hace la recomendación a la hija y en bitácora de dejar carta de autorización. Su hija manifiesta que empezaron labores constructivas el día de ayer y se observa personal de obra en el predio.
09/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA**, seguimiento de obra. La familia indica que empezaron obras constructivas el día de hoy. No indican dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio
09/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, seguimiento de obra. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances e indica que los maestros esmpezaron labores el día de hoy.
09/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA**, seguimiento de obra. No se evidencia maestros en el predio, se le indica a la beneficia que si no llegan a la 1 pm se comunique con la social.
10/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA**, seguimiento de obra. No se evidencia maestros en el predio, se le indica a la beneficia que si no llegan a la 1 pm se comunique con la social.
10/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, seguimiento de obra. La familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio, la señora Carmenza no indica dudas .
10/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, seguimiento de obra. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas en inquietudes. Se observa personal de obra en la vivienda.
10/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
10/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, seguimiento de obra. la familia indica que los trabajadores no han llegado a laborar, el contratista le indica que se encuentran afiliando a los trabajadores quienes el lunes se acercaran a la vivienda.
10/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, seguimiento de obra. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda.
10/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se reliza seguimiento sin novedades desde el area social. Se evidencia cumplimiento frente a compromiso previo

10/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza vista de seguimiento a la obra, beneficia autoriaza a Hijo **DIEGO SOTO** Y sobrino **MAURICIO SOTO** para toma de decisiones frente a la ejecución de obras. No se han iniciado obras debido a que se encuentran terminando los compromisos incialmente establecidos en la visita de validación y debido a cambios en actividades de cocina y baño, se establecen nuevo compromisos para poder dar inicio a las obras de mejoramiento, se realiza acta de reunion estableciendo dichos acuerdos y firmada por ambas partes, Autorizados, contratista e intervenoria.
10/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza visita de seguimiento a la obra, la atiende autorizada del beneficiario **SANDRA CRISTINA HUESO PINILLA (HIJA),** Se observa material y personal de obra ejecutando las activdades, autorizada no reporta novedades y/o inconformidades.
10/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita, no se toma control en bitácora ya qué está bajó llave.
10 /09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **INGRID PAOLA GARAVITO.**Refiere conformidad con los avances de obra.
10 /09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
10/09/2010 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Se realiza seguimeinto sin novedad desde el area social
10/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se realiza seguimeinto sin novedad desde el area social
10/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Se realiza seguimiento con acompañamiento social sin embargo se evidencia que aunque ya tiene materiales en la vivienda no se ha asignado maesto para la ejecucion de la obra.
10/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECION LOPEZ** Se realiza seguimiento socia, se evidencia que aún no se da inicio a la obra, la vivienda no cuenta con materiales ni maestro asignados para la ejecución de la obra el contratista refiere que se dará inicio el día lunes 13/09/2021
ENTREGAS
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
NO SE PRESENTARON ENTREGAS
RENUNCIAS

SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana

PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m. en el transcurso de la semana no se recepcionó ninguna atención. Desarrollo: Juan Pablo II
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE
El 08 de septiembre de 2021, se realizó visita técnica y social de obra e interventoría junto con la Secretaría Distrital de Hábitat, a la vivienda MVCB_2252 CAMPO ELIAS GIL PARDO: Se realiza visita al predio con el fin de realizar la validacion correspondiente. Durante el ejercicio se evidencia que la vivienda tipo bifamiliar, presuntamente se encuentra desenglobada, con dos escrituras, una a nombre de la señora Abigail Pardo de Gil; progenitora del beneficiario, identificada con cedula de ciudadania 24.015.711 y la otra presenta como titular el beneficiario en mencion. La situacion que se presenta corresponde a que el subsidio asignado al predio ubicado en la carrera 18 v bis 68 a 42 sur es propiedad de la señora Abigail. En el ejercico el beneficiario refiere que tanto el, como la progenitora solicitaron el subsidio de mejoramiento y tienen procesos diferentes, no esta dispuesto a recibir el subsidio para el predio del cual no es propietario ya que expresa perdera la oportunidad de recibirlo para su vivienda.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

SEMANA 4 DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE		
APERTURA, MVCB_4754, ALBERTO HUESO, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_4751, MARIA LIGIA SOTO, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3311, MIYO FIGUEROA ROJAS, DESARROLLO JUAN PABLO II
		
APERTURA, MVCB_3353 ,ALCIRA MONGUI OCHOA, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3327, JESIKA LORENA TELLEZ, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3329, HECTOR JOSE ZAMBRANO, DESARROLLO JUAN PABLO II
		

APERTURA, MVCB_3360, MYRIAM YACELY JIMENEZ, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3351, YAMILETH MARTINEZ, DESARROLLO JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3191, DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA, DESARROLLO JUAN PABLO II
		
SEGUIMIENTO, MVCB_4754, ALBERTO HUESO, DESARROLLO JUAN PABLO II	SEGUIMIENTO, MVCB_4751, MARIA LIGIA SOTO, DESARROLLO JUAN PABLO II	PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DESARROLLO JUAN PABLO II
		

Apertura de obra. MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO. Desarrollo Juan Pablo II	Apertura de obra. MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO. Desarrollo Juan Pablo II	Apertura de obra. MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBA. Desarrollo Juan Pablo II
		
Apertura de obra. MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO, seguimiento de obra. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNE. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA. Desarrollo Juan Pablo II.**
		

Apertura de vivienda . MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de vivienda. MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de vivienda. MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Apertura de vivienda. MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA. Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de vivienda. MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de vivienda. MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Apertura de vivienda. MVCB_ 2621 : Se realiza apertura con el atutorizado del predio STIVEN HERREÑO ANGULO, Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_ 3669 : GABRIELA MUNOZ. Autorizada INGRID PAOLA GARAVITO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		
VALIDACION MVCB-4644 JOSE ALIRIO TORRES DESARROLLO JUAN PABLO II	**VALIDACION MVCB-4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN, DESARROLLO JUAN PABLO II**	**APERTURA MVCB-4629 JOSE ABELINO LEON DESARROLLO JUAN PABLO II**
		

APERTURA MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES, DESARROLLO MARANDU	APERTURA MVCB_ 2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ DESARROLLO MARANDU	APERTURAMVCB_4744 ALVARO ZUBIETA TUNJANO DESARROLLO JUAN PABLO II
	 	
APERTURA, MVCB_4629: JORGE ANDRES JIMENEZ, DESARROLLO JUAN PABLO II	**APERTURA MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL DESARROLLO MARANDU**	**APERTURA MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DESARROLLO MARANDU**
		

APERTURA MVCB_2034 AMINTA SABOGAL DESARROLLO MARANDU	SEGUIMIENTO DE OBRAMVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL DESARROLLO MARANDU	SEGUIMIENTO DE OBRA MVCB_2034 AMINTA SABOGAL DESARROLLO MARANDU
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVUN_017	DORIS RAMOS TORRES	UNIR II																				
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II																				
MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	UNIR II																				
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II																				
MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	UNIR II																				
MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	UNIR II																				
MVUN_151	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	UNIR II																				
MVUN_160	HERNANDO ROJAS RINCON	UNIR II																				
MVUN_171	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	UNIR II																				
MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	UNIR II																				
MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	UNIR II																				
MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	UNIR II																				
MVUN_186	MARGARITA ALFONSO MORENO	UNIR II																				
MVUN_196	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	UNIR II																				
MVUN_205	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	UNIR II																				
MVUN_222	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	UNIR II																				

MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II																				
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II																				
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II																				
MVUN_332	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	UNIR II																				
MVUN_334	JULIO DIAZ TORRES	UNIR II																				
MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	UNIR II																				
MVUN_374	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	UNIR II																				
MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	UNIR II																				
MVUN_391	IMELDA RODRIGUEZ	UNIR II																				
MVUN_397	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	UNIR II																				
MVUN_398	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	UNIR II																				
MVUN_405	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	UNIR II																				

MVUN_416	RICARDO CARDENAS GARCIA	UNIR II																				
MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	UNIR II																				
MVUN_443	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	UNIR II																				
MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	UNIR II																				
MVUN_469	JUVENAL MELO PINZON	UNIR II																				
MVUN_480	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	UNIR II																				
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II																				
MVUN_486	EDUARDO MELO ESPITIA	UNIR II																				
MVUN_492	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	UNIR II																				
MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	UNIR II																				
MVUN_770	JOSE YECID LAVERDE NIETO	UNIR II																				
MVUN_187	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	UNIR II																				

MVUN_218	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	UNIR II																				
MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	UNIR II																				
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_2411	MARIA DEL CARMEN LOPEZ	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II																				

MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	JUAN PABLO II																				
MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II																				
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II																				
MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	JUAN PABLO II																				

MVCB_2053	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	MARANDU	X																			
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X				7/09/2021															
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II																				
MVCB_2252	CAMPO ELIAS GIL PARDO	JUAN PABLO II																				
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X			Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021															
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3798	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	JUAN PABLO II																				
MVCB_3809	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3863	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	JUAN PABLO II																				
MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	JUAN PABLO II																				

MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II																				
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II																				
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				

MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II																				
MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II																				
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	JUAN PABLO II																				
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															

MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	JUAN PABLO II																				
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X				8/09/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X				8/09/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X				7/09/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X				7/09/2021															
MVCB_2049	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	MARANDU	X																			
MVCB_4968	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	ACACIAS - IV																				
MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II																				
MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II																				

MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X																			
MVUN_166	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	Unir II																				
MVUN_201	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	Unir II																				
MVUN_208	ROSALBA COTRINA CAÑAS	Unir II																				
MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Unir II																				
MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II																				
MVUN_276	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	Unir II																				
MVUN_366	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	Unir II																				
MVUN_478	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	Unir II																				
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓN COMPARTIR																				
MV_42886-IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II																				

MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II																				
MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	URBANIZACION COMPARTIR																				
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACION COMPARTIR																				
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X				9/09/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X				10/09/2021															
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X				9/09/2021															
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X				10/09/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II																				

MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II																				
MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II																				
MVCB_3822	SORY INES CORTES LOPEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	JUAN PABLO II																				
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	JUAN PABLO II																				

MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II																				
MVCB_4842	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	JUAN PABLO II																				
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II																				
MVCB_4892	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	JUAN PABLO II	X																			
MVJE_009	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	POTOSI																				
MVJE_010	YOLANDA MENESES	POTOSI																				
MVJE_022	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	POTOSI																				
MVJE_030	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	POTOSI																				
MVJE_032	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	POTOSI																				
MVJE_058	DILMA MARIA DEL CARMEN RIVERA CELIS	POTOSI																				
MVJE_062	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	POTOSI																				
MVJE_066	ERNESTO CARDENAS	POTOSI																				

MVJE_077	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	POTOSI																				
MVJE_079	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	POTOSI																				
MVJE_081	ESTRELLA WILCHES	POTOSI																				
MVJE_133	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	POTOSI																				
MVJE_149	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	POTOSI																				
MVJE_164	SARA RODRIGUEZ RAMOS	POTOSI																				
MVJE_180	DAISSY GARZON TAFUR	POTOSI																				
MVJE_184	BLANCA ROCIO CASTIBLANCO	POTOSI																				
MVJE_204	MARIA BLANCA AZUCENA SAENZ MONTAÑO	POTOSI																				
MVJE_224	ALEXANDRA MOLINA RINCON	POTOSI																				
MVJE_275	DIANA BELEN HERNANDEZ	POTOSI																				
MVJE_293	ELSA MARIA MARTINEZ	POTOSI																				

MVJE_323	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	POTOSI																				
MVJE_341	OLGA PATRICIA RAMOS SUAREZ	POTOSI																				
MVJE_346	HECTOR BERNAL PINTO	POTOSI																				
MVJE_356	ANA ROSA SOSA	POTOSI																				
MVJE_359	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	POTOSI																				
MVJE_380	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	POTOSI																				
MVJE_405	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	POTOSI																				
MVJE_431	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	POTOSI																				
MVJE_457	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	POTOSI																				
MVJE_011	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	POTOSI																				
MVJE_050	HERSILIA PARRA PEÑA	POTOSI																				
MVJE_065	ROSALBA TELLEZ	POTOSI																				

MVJE_136	JAIRO CORTES PINZON	POTOSI																				
MVJE_174	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	POTOSI																				
MVJE_233	ODALINA ARDILA	POTOSI																				
MVJE_244	JAIRO BERNAL	POTOSI																				
MVJE_247	WILLIAM HUMBERTO ARIAS	POTOSI																				
MVJE_264	ALCIRA TEATINO GARCIA	POTOSI																				
MVJE_295	HENRY GIRALDO	POTOSI																				
MVJE_343	ADOLFO SABOGAL HERNANDEZ	POTOSI																				
MVJE_345	DELIO ALAPE CONDE	POTOSI																				
MVJE_360	ARTURO FLOREZ BARAJAS	POTOSI																				
MVJE_402	LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS	POTOSI																				
MVJE_434	NOHEMI MORALES ORTIZ	POTOSI																				

MVJE_435	JUVENAL ESPINOSA MUR	POTOSI																					
MVJE_441	MARIA ALCIRA ZARATE	POTOSI																					
MVJE_489	LUIS ALBERTO CASTELLANOS	POTOSI																					
MVJE_545	LADY ESPERANZA ACOSTA SANDOVAL	POTOSI																					
MVJE_573	SANDRA MILENA PRECIADO	POTOSI																					
MVJE_593	YESID VILLAMIL	POTOSI																					
MVJE_251	LUZ AMANDA BUITRAGO	POTOSI																					
MVJE_452	PEDRO JULIO UREÑA	POTOSI																					
MVJE_214	CARLOS EDUARDO VARGAS MONTES	LAS BRISAS																					
MVJE_453	MERLY BELTRAN AGUDELO	JERUSALÉN																					
MVCB_2243	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	JUAN PABLO II																					
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X			Carta de autorización hijo STIVEN HERREÑO ANGULO	9/09/2021																

MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X				7/09/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X				9/09/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X				9/09/2021															
MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II																				
MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II																				
MVCB_4689	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	JUAN PABLO II	X																			
MVJE_557	JOSE JULIAN ROJAS	JERUSALEN																				
MVJE_429	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	JERUSALEN																				
MVJE_546	RAMIRO GUZMAN BETANCOURT	JERUSALEN																				
MVJE_572	FABIOLA GARCIA DURAN	JERUSALEN																				
MVJE_162	ELIAS OSPINA FRANCO	JERUSALEN																				

MVJE_243	MARIA DE JESUS GARAVITO GARCIA	JERUSALEN																				
MVJE_254	MARIA HILDA GUAQUETA GONZALEZ	JERUSALEN																				
MVJE_319	MANUEL FONSECA ALVAREZ	JERUSALEN																				
MVJE_400	MARIA FLORALBA DAVID ERAZO	JERUSALEN																				
MVJE_574	LUÍS ARMANDO SANABRIA	JERUSALEN																				
MVJE_581	JAIME DONCEL CASILIMAS	JERUSALEN																				
MVJE_559	DORIS ROCIO GUAYACAN BERNAL	JERUSALEN																				
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II																				
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II																				
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X				8/09/2021															
MVCB_4152	BEATRIZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X																			
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II																				

MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X				10/09/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X				9/09/2021															
MVJE_179	BUENAVENTURA BECERRA FUQUENE	POTOSI																				
MVJE_241	RUBY STELLA JAIMES	POTOSI																				
MVJE_321	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	POTOSÍ																				
MVJE_440	MARIA REINA DEL CARMEN ROMERO	POTOSI																				
MVJE_561	MARIA GLORIA CASTAÑEDA	JERUSALEN																				
MVJE_110	RIGOBERTO OSMA ARMERO	POTOSÍ																				
MVJE_1006	CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEN	POTOSI																				
MVJE_1007	ANA LEONOR CELIS DE MARTINEZ	POTOSÍ																				
MVJE_1009	FELIPE DUARTE VARGAS	POTOSI																				
MVJE_1015	MARCO AURELIO GRACIA SALAZAR	POTOSÍ																				

MVJE_1016	LUZ DARY GARCÍA MORALES	POTOSÍ																				
MVJE_1017	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	POTOSI																				
MVJE_1028	ARSENIO PARDO VELANDIA	POTOSI																				
MVJE_1042	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	POTOSI																				
MVJE_1043	JOSE DE JESUS PEÑA	POTOSI																				
MVJE_1045	ALBERTO EFRAÍN CORREA HERNANDEZ	POTOSÍ																				
MVJE_1049	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	POTOSÍ																				
MVJE_1056	BLANCA CECILIA SANABRIA	POTOSI																				
MVJE_1058	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	POTOSI																				
MVJE_1063	MIGUÉL ÁNGEL GARCÍA	POTOSÍ																				
MVJE_1067	UBALDINA PALACIOS CASTRO	POTOSÍ																				
MVJE_1068	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	POTOSI																				

MVJE_222	MARIELA RODRIGUEZ BELTRAN	JERUSALEN																				
MVJE_326	LUZ MARINA SIERRA SIERRA	POTOSI																				
MVJE_881	GLORIA LUZ BLANCO BELLO	POTOSI																				
MVJE_882	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	POTOSI																				
MVJE_889	LUZ FANNY GARAY RAMOS	POTOSI																				
MVJE_892	RUTH EDITH LEAL CRUZ	POTOSI																				
MVJE_901	JORGE GERENA TORRALBA	POTOSI																				
MVJE_907	ANA ISABEL GONZALEZ	POTOSI																				
MVJE_909	JOSE GREGORIO BELTRAN	POTOSI																				
MVJE_916	AMANDA LOZANO TAPIERO	POTOSI																				
MVJE_920	BLANCA LILIA RAMIREZ	POTOSÍ																				
MVJE_923	DEICY PUERTA ARIAS	POTOSI																				

MVJE_928	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	POTOSI																				
MVJE_929	WILLIAM MARTINEZ CUBILLOS	POTOSI																				
MVJE_941	EDGAR ELI SANHEZ GOMEZ	POTOSI																				
MVJE_942	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	POTOSI																				
MVJE_950	ANA LUCIA BELTRAN	POTOSI																				
MVJE_953	HERMELINDA AGUIAR DE GUTIERREZ	POTOSI																				
MVJE_957	LUZ STELLA AGUILERA	POTOSI																				
MVJE_959	GLORIA AZUCENA DIAZ PINEDA	POTOSI																				
MVJE_962	RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ	POTOSI																				
MVJE_968	OFELIA PUERTA ARIAS	POTOSI																				
MVJE_991	BENJAMIN BALLESTROS BALLESTEROS	POTOSI																				
MVJE_992	JORGE LUIS RODRIGUEZ NIETO	POTOSI																				

MVJE_999	MARÍA JUDITH QUIÑONEZ ORTEGA	POTOSÍ																				
MVJE_1137	LUZ SILENIA PAN MALDONADO	JERUSALÉN																				
MVJE_1139	OSCAR ALIRIO GAITAN MOLINA	POTOSÍ																				
MVJE_1024	ALVARO BAEZ RODRIGUEZ	POTOSI																				
MVJE_868	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	POTOSÍ																				
MVJE_880	RAQUEL GARCIA	POTOSI																				
MVJE_989	ANA JUDITH BERMUDEZ VARGAS	POTOSI																				
MVJE_1000	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA	POTOSI																				
MVJE_1035	DIGNA MARIA ROJAS DE DIAZ	POTOSI																				
MVJE_1078	OSTILIO PABON GAMEZ	POTOSI																				
MVJE_1095	ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ	POTOSI																				
MVJE_767	MARIA GENOVEVA AMELINES OCAMPO	LAS BRISAS																				

MVJE_885	JOSE RAMIRO LEON ARISMENDY	POTOSI																				
MVJE_937	RAQUEL VARGAS MORALES	POTOSI																				
MVJE_938	NIEVES DURAN IBATA	POTOSI																				
MVJE_946	SOLANGEL AMAYA	POTOSÍ																				
MVJE_948	ERALDO PENHA	POTOSI																				
MVJE_973	MARGARITA CRUZ SANCHEZ	POTOSI																				
MVJE_984	CELMIRA BENITEZ CASTRO	POTOSI																				
MVJE_985	ANGELA SUAREZ RAMOS	POTOSI																				
MVJE_1084	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ	POTOSI																				
MVJE_1087	ALONSO OIDOR	POTOSÍ																				
MVJE_1104	MARIA ALICIA LOPEZ CASTILLO	POTOSI																				
MVJE_1118	NANCY OLIVERO	POTOSI																				

MVJE_1125	ROSA MARIA VARGAS	POTOSI																				
MVJE_1148	LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	POTOSÍ																				
MVJE_351	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	POTOSI																				
MVJE_624	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA	POTOSI																				
MVJE_778	MARIA VICTORIA GARCIA CARRILLO	POTOSÍ																				

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA	SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
											P	Q	R	S						ABIERTO	CERRADO
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CRONOGRAMA METODOLOGÍA HISTORIAS DE VIDA

MV	ID	NOMBRE DE BENEFICIARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FECHA DE INTERVENCIÓN	OBSERVACIÓN (actividades según cronigrama de obra)

7 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, teniendo en cuenta que se inician las jornadas de validación y de apertura en el sector de Habitarte.

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 4. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas de 33 viviendas las cuales iniciaran obras. En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

Para este informe el contratista presenta 35 funcionarios de los cuales 13 son administrativos y 25 operarios cumpliendo con la legislación en torno a seguridad social, por otra parte, dentro del personal de obra hay 7 migrantes con su documentación correspondiente.

A la fecha del informe No. 4 no se han realizado los ajustes del plan de calidad y no se a presentado el protocolo de trabajos en alturas.

Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	6/9/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	4
HASTA	12/9/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA:
Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades
1. Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, por parte del personal administrativo y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Inducción al personal administrativo faltante y operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y divulgación del protocolo de bioseguridad
3. También se hace entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios que hacían falta en las viviendas visitadas.
4. Se realizó el informe semanal
5. Se realiza divulgación de protocolo de bioseguridad a Beneficiario, en compañía de la interventoría.

Adicional a esto se lleva el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, y se está en la revisión de afiliaciones sal SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo proyectado para ingresar la próxima semana.

Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente.

INTERVENTORÍA:
Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 3 del contratista, tanto del área SST como Bioseguridad y Gestión ambiental. También se hizo acompañamiento a los inicios de trabajo en las casas que fueron validadas, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios.

A raíz del oficio generado se trató el tema en reunión, donde el contratista, propone realizar las cubiertas "por debajo" sin necesidad de subir al tejado, se espera que entregue procedimiento para la prueba que propuso realizar; al corte de este informe no se ha recibido, razón por la cual no es procedente la realización hasta verificar las condiciones desde la perspectiva de seguridad Industrial, se reitera que si dado el caso se llega a laborar en alturas superiores de 1.5 metros se mantiene la obligatoriedad de cumplir la legislación Nacional aplicable.

Se generó oficio informando al contratista la obligación de entregar el plan de Calidad, hasta la fecha no ha sido recibido.

Durante las visitas de seguimiento se acompaña al personal SISO del contratista en la entrega de KIT a los maestros, brindando la información de uso y reforzando con el beneficiario también sobre el uso del kit entregado a ellos; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 7 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y afiliaciones al día.

La interventoría recibió información vía WA, de cartilla recibida de la ARL positiva, "TU PROTECCIÓN NUESTRA PRIORIDAD". donde se refuerza el tema de autocuidado, uso de EPP y Bioseguridad.

CAPACITACION contratista

Inducción al personal administrativo faltante sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad y uso correcto de tapabocas	si	100%
	La charla se realizó el día 10 de septiembre de 2021	

CAPACITACION Interventoría

La interventoría recibió información vía WA, de cartilla recibida de la ARL positiva, "TU PROTECCIÓN NUESTRA PRIORIDAD". donde se refuerza el tema de autocuidado, uso de EPP y Bioseguridad	si	100%
	Difundida via W.A	

2. Gestión Ambiental

Se instala el punto ecologico del PAC de Juan Pablo II y los recursos de prevención de Covid, como el dispensador de Gel al ingresar.

Los escombros generados a la fecha de corte aún no completa viaje de la volqueta, motivo por el cual no se ha realizado disposición final, hasta completar viaje.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL				No se ha iniciado la recogida de escombros hasta determinar que ya se tienen viajes completo para la volqueta
MENSUAL				
PROYECTO				

3. Gestión en Salud Ocupacional (Seguridad e Higiene Industrial)

Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las Aperturas de Viviendas por parte del personal administrativo, asi como por los maestros que se les ha entregado el kit de Bioseguridad.

El personal que ingreso cuenta con el uniforme correspondiente, botas, casco, gafas y guantes.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad, se generó oficio recordando la obligación específica de acuerdo al anexo.

3.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Dias de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	1680	18.75	3.25	624	3	0	0	0
Total Mensual	3016	40.75	15.67	2160	3	0	0	0
Total Proyecto	3016	40.75	15.67	2160	3	0	0	0

3.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Dias de incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Dias de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Registro Fotográfico

PROTOCOLO DE INGRESO EN APERTURAS



MV 4658

ENTREGA KIT BENEFICIARIO



MV 3327

ENTREGA KIT BENEFICIARIO Y PARA TRABAJADORES



MV 4629



MV 4629

PREPARACIÓN DE KITS - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD









PAC JUAN PABLO II

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	35	1680	0.0	0.0		2.25	0.00	16.50	0.00	18.75			0	0						
				13	624				3.25	0.00	0.00	0.00	3.25			0	0						
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0						
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0						
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0						
									0.00	0.00	0.00	0.00	0			0	0						
				48	**2304**	**0**	**0**	**0.0**	**5.50**	**0.00**	**16.50**	**0.00**	**22.00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2,304
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	5,176
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	5,176
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	22.00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	56.42
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	56.42

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION PERSONAL ADMINISTRATIVO, INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO, CHARLA ADMINISTRATIVO				

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1,015,413,551	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1,068,972,008	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52,326,579	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79,511,489	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/8/2021	19/8/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1,014,195,383	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1,019,026,005	19/8/2021	19/8/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64,583,890	19/8/2021	19/8/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52,476,883	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103,238,457	19/8/2021	19/8/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1,019,004,481	28/8/2021	3/9/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1,004,232,601	7/9/2021	7/9/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79,656,535	9/9/2021	10/9/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961,936,803,121,980	11/9/2021	11/9/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773,439,426,021,978	11/9/2021	11/9/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1,033,690,704	3/9/2021	8/9/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1,124,508,730	10/9/2021	10/9/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831,775,706,081,987	11/9/2021	11/9/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WILLIAM ZABALA	916,866,813,041,981	3/9/2021	8/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80,096,384	10/9/2021	10/9/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1,047,512,742	9/9/2021	10/9/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1,066,097,223	3/9/2021	10/9/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIAM MERIÑO	1,032,510,255	3/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8,500,059	9/9/2021	10/9/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1,043,606,888	9/9/2021	9/9/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1,023,022,436	10/9/2021	10/9/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4,058,788	3/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11,511,469,840	10/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723,480,411,071,978	3/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958,208,515,031,988	4/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1,127,956,602	9/9/2021	10/9/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835,913,327,071,985	9/9/2021	10/9/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1,124,827,805	10/9/2021	10/9/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	10/9/2021	10/9/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					**13**	**22**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	

35

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1,015,413,551	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/8/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1,068,972,008	19/8/2021	12/8/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52,326,579	19/8/2021	27/4/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79,511,489	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1,014,195,383	19/8/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1,019,026,005	19/8/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64,583,890	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52,476,883	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103,238,457	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1,019,004,481	3/9/2021	1/9/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1,004,232,601	7/9/2021	8/9/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79,656,535	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961,936,803,121,980	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773,439,426,021,978	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1,033,690,704	8/9/2021	1/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1,124,508,730	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831,775,706,081,987	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WILLIAM ZABALA	916,866,813,041,981	8/9/2021	9/1/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80,096,384	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1,047,512,742	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1,066,097,223	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIAM MERIÑO	1,032,510,255	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8,500,059	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1,043,606,888	9/9/2021	30/6/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1,023,022,436	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4,058,788	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11,511,469,840	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723,480,411,071,978	10/9/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958,208,515,031,988	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1,127,956,602	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835,913,327,071,985	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1,124,827,805	10/9/2021	14/4/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	10/9/2021	20/4/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**22**	**35**	**0**	**35**	**0**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1,015,413,551	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1,022,401,358	19/8/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1,068,972,008	19/8/2021	12/8/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52,326,579	19/8/2021	27/4/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79,511,489	19/8/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22,732,637	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1,014,195,383	19/8/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1,019,026,005	19/8/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64,583,890	19/8/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52,476,883	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103,238,457	19/8/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1,019,004,481	3/9/2021	1/9/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1,004,232,601	7/9/2021	8/9/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79,656,535	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961,936,803,121,980	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773,439,426,021,978	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1,033,690,704	8/9/2021	1/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1,124,508,730	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831,775,706,081,987	11/9/2021	2/4/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WILLIAM ZABALA	916,866,813,041,981	8/9/2021	9/1/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80,096,384	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1,047,512,742	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1,066,097,223	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIAM MERIÑO	1,032,510,255	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8,500,059	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1,043,606,888	9/9/2021	30/6/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1,023,022,436	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4,058,788	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11,511,469,840	10/9/2021	9/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723,480,411,071,978	10/9/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO ESPINOZA	958,208,515,031,988	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1,127,956,602	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835,913,327,071,985	10/9/2021	8/9/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1,124,827,805	10/9/2021	14/4/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93,394,589	10/9/2021	20/4/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**22**	**35**	**0**	**35**	**0**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3669		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT POR PAREJA DE TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3669		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2413		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE EPP - EN ALISTAMIENTO SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2413		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2242		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2242		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2/9/1912		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
3425		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2621		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT BIOSEGURIDAED HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
3433		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT BIOSEGURIDAED HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2376		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRABAJADORES CON DOTACION HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2034		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRABAJADORES CON DOTACION HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2355		

	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961,936,803,121,980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773,439,426,021,978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958,208,515,031,988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916,866,813,041,981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835,913,327,071,985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831,775,706,081,987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723,480,411,071,978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
