
INFORME MENSUAL 1

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

GRUPO 1 - 2021

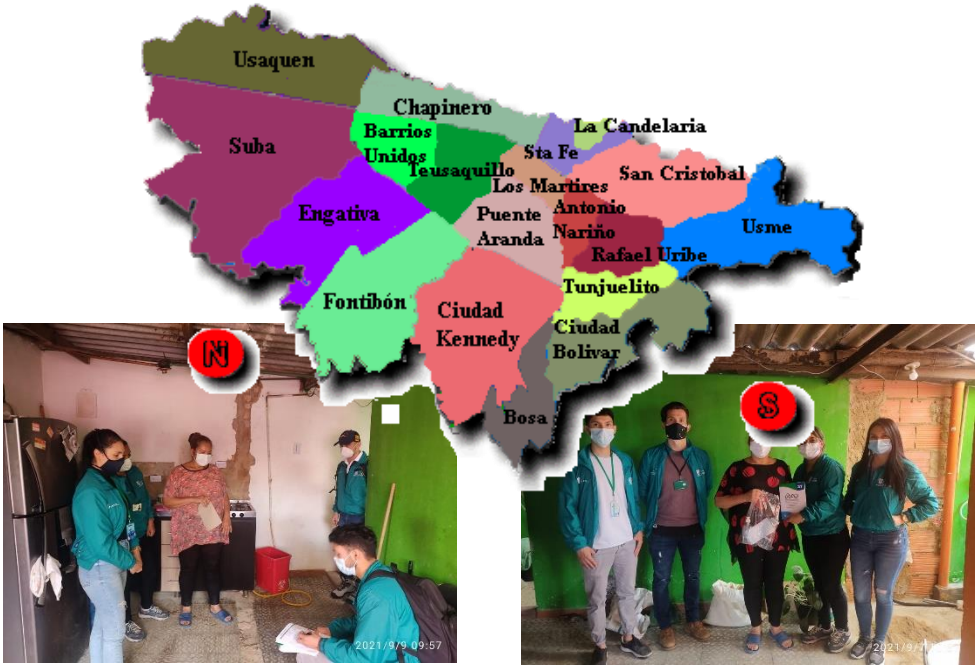

DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

Desarrollo	Camila Giraldo y Diana Mora	
Aprueba	Edgar E. Roa C.	

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

2. INTRODUCCIÓN

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.

4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES

6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

RELACIÓN DE VALOR EN EJECUCIÓN MES DE AGOSTO 18-SEPTIEMBRE 20 DEL 2021

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

7. **INFORME SISO**
8. **BIOSEGURIDAD**
9. **ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA**
10. **ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA**
11. **ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA**
12. **ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA**

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	


2. INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.


3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.


En el desarrollo de las actividades en el mes de AGOSTO-SEPTIEMBRE de 2021, se presentaron los siguientes indicadores que muestral el comportamiento en la validación y avance de obra.

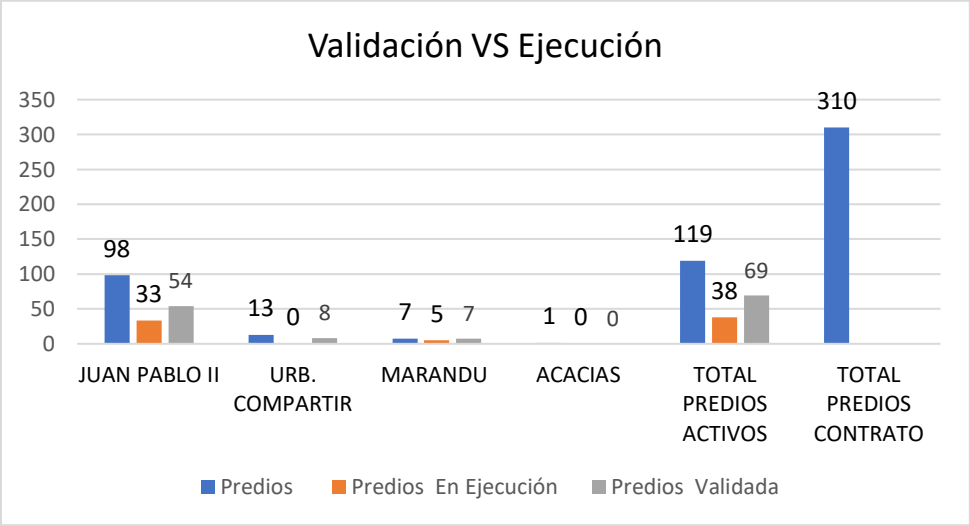



Para el informe mensual 01, el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020, se encuentra en cumplimiento** las actividades de validaciones según la programación de obra; ya que presentan 68 validaciones ejecutadas frente a 46 relacionadas en la programación de obra. Presentando 22 validaciones más.

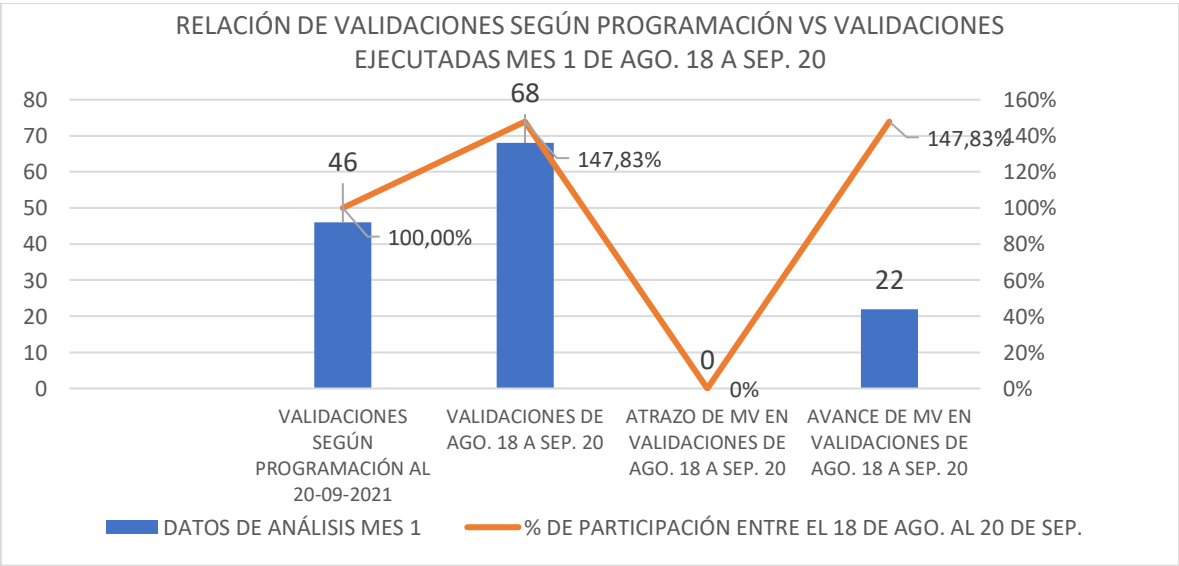


Para cada una de las viviendas, durante los meses de agosto y septiembre del presente informe se registran los siguientes indicadores, estos datos muestran el avance individual de cada vivienda.

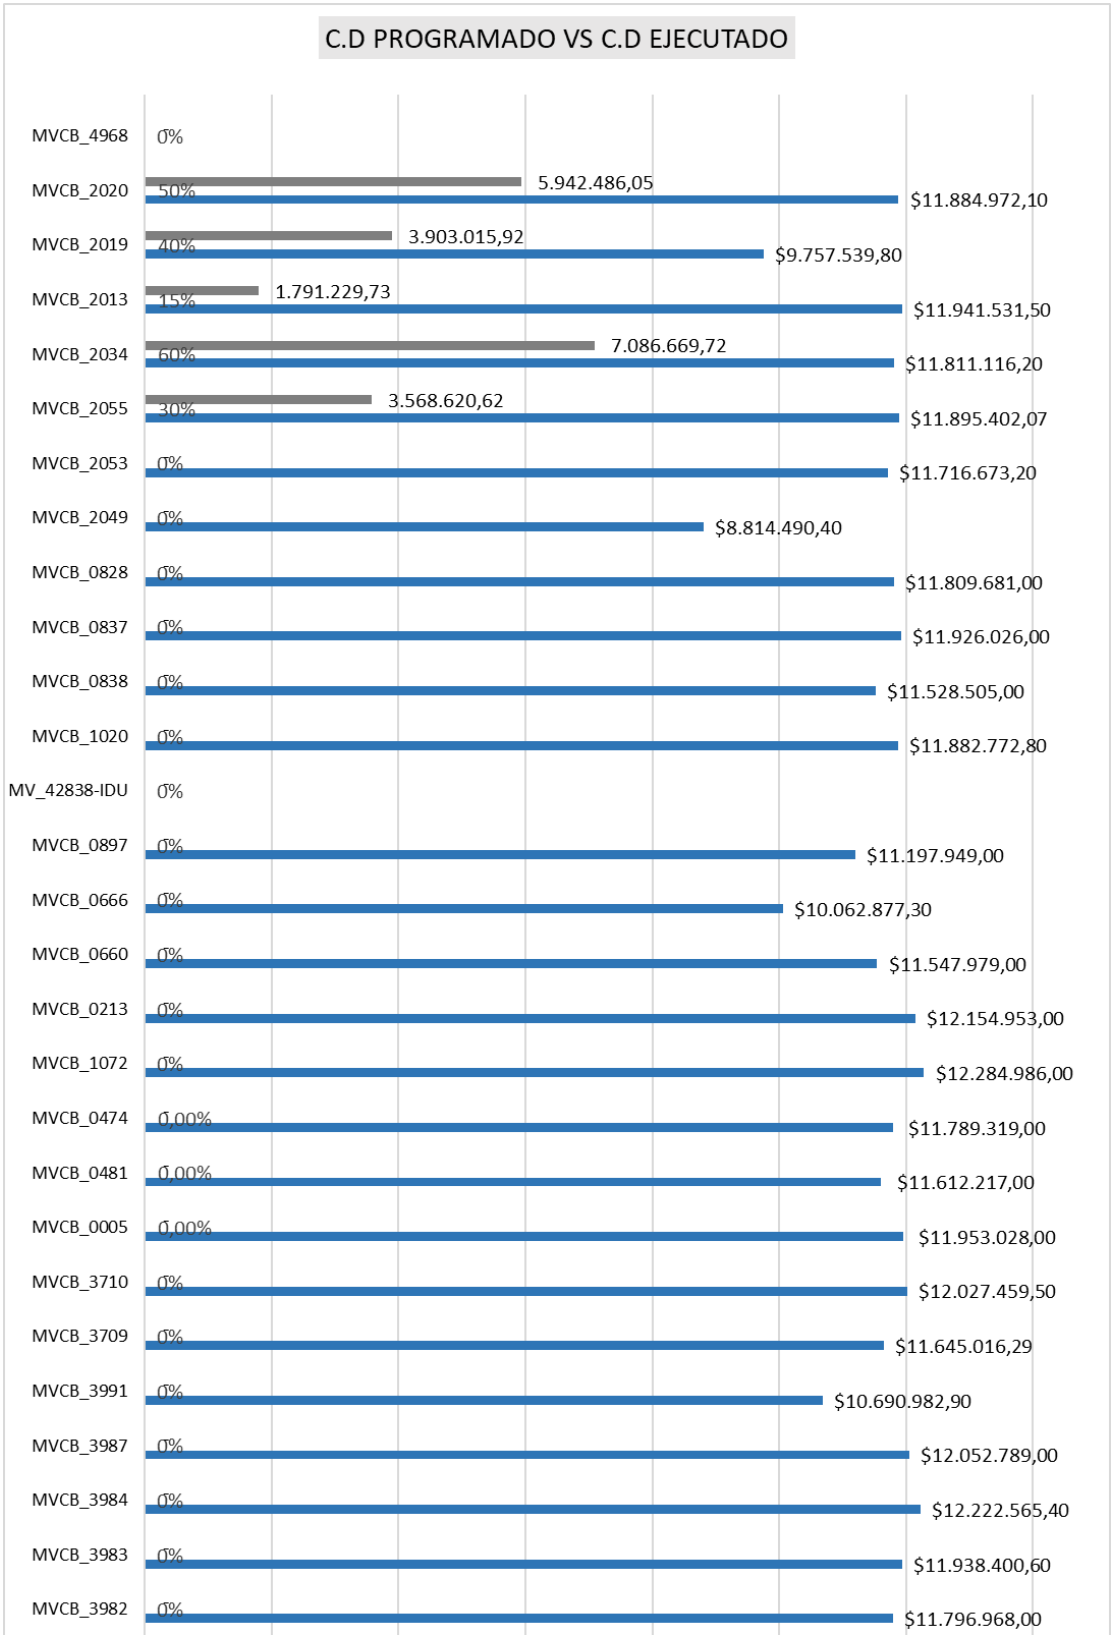

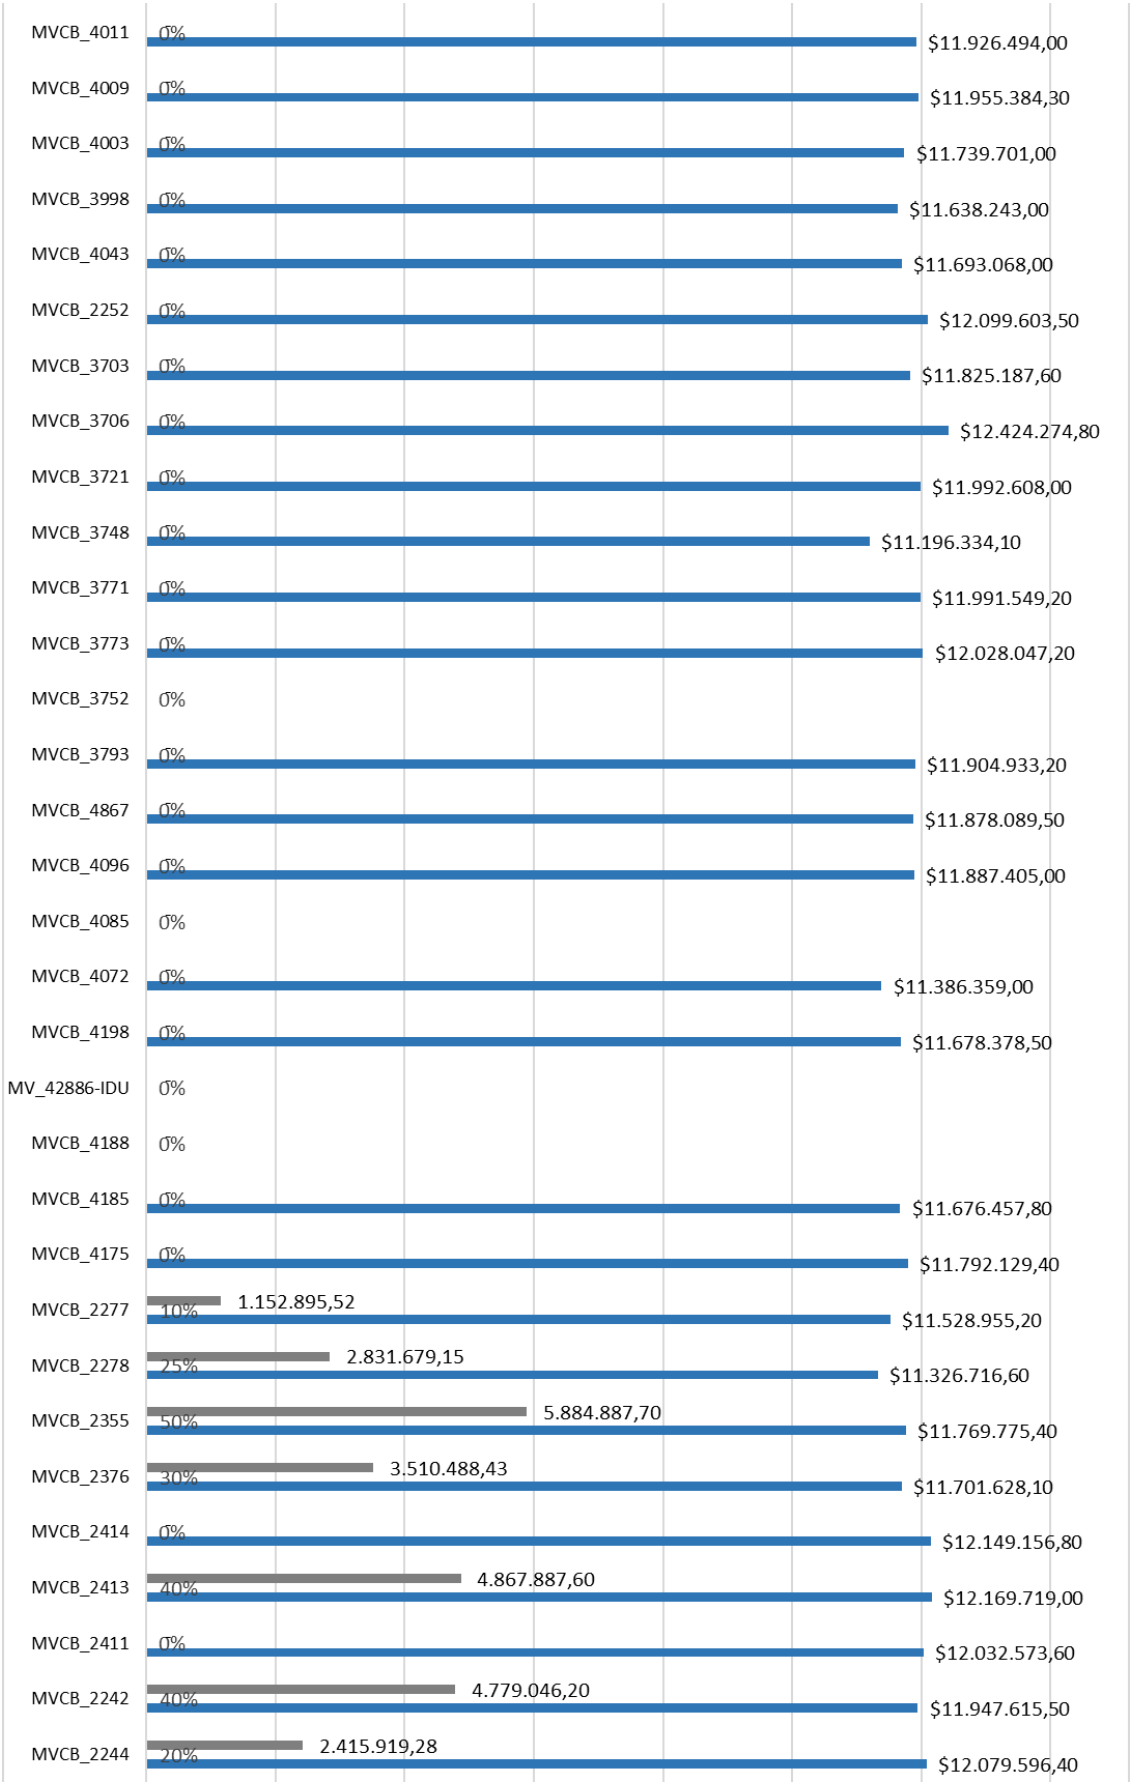
MVCB_4011 0% $11.926.494,00
MVCB_4009 0% $11.955.384,30
MVCB_4003 0% $11.739.701,00
MVCB_3998 0% $11.638.243,00
MVCB_4043 0% $11.693.068,00
MVCB_2252 0% $12.099.603,50
MVCB_3703 0% $11.825.187,60
MVCB_3706 0% $12.424.274,80
MVCB_3721 0% $11.992.608,00
MVCB_3748 0% $11.196.334,10
MVCB_3771 0% $11.991.549,20
MVCB_3773 0% $12.028.047,20
MVCB_3752 0%
MVCB_3793 0% $11.904.933,20
MVCB_4867 0% $11.878.089,50
MVCB_4096 0% $11.887.405,00
MVCB_4085 0%
MVCB_4072 0% $11.386.359,00
MVCB_4198 0% $11.678.378,50
MV_42886-IDU 0%
MVCB_4188 0%
MVCB_4185 0% $11.676.457,80
MVCB_4175 0% $11.792.129,40
MVCB_2277 10% 1.152.895,52 $11.528.955,20
MVCB_2278 25% 2.831.679,15 $11.326.716,60
MVCB_2355 50% 5.884.887,70 $11.769.775,40
MVCB_2376 30% 3.510.488,43 $11.701.628,10
MVCB_2414 0% $12.149.156,80
MVCB_2413 40% 4.867.887,60 $12.169.719,00
MVCB_2411 0% $12.032.573,60
MVCB_2242 40% 4.779.046,20 $11.947.615,50
MVCB_2244 20% 2.415.919,28 $12.079.596,40

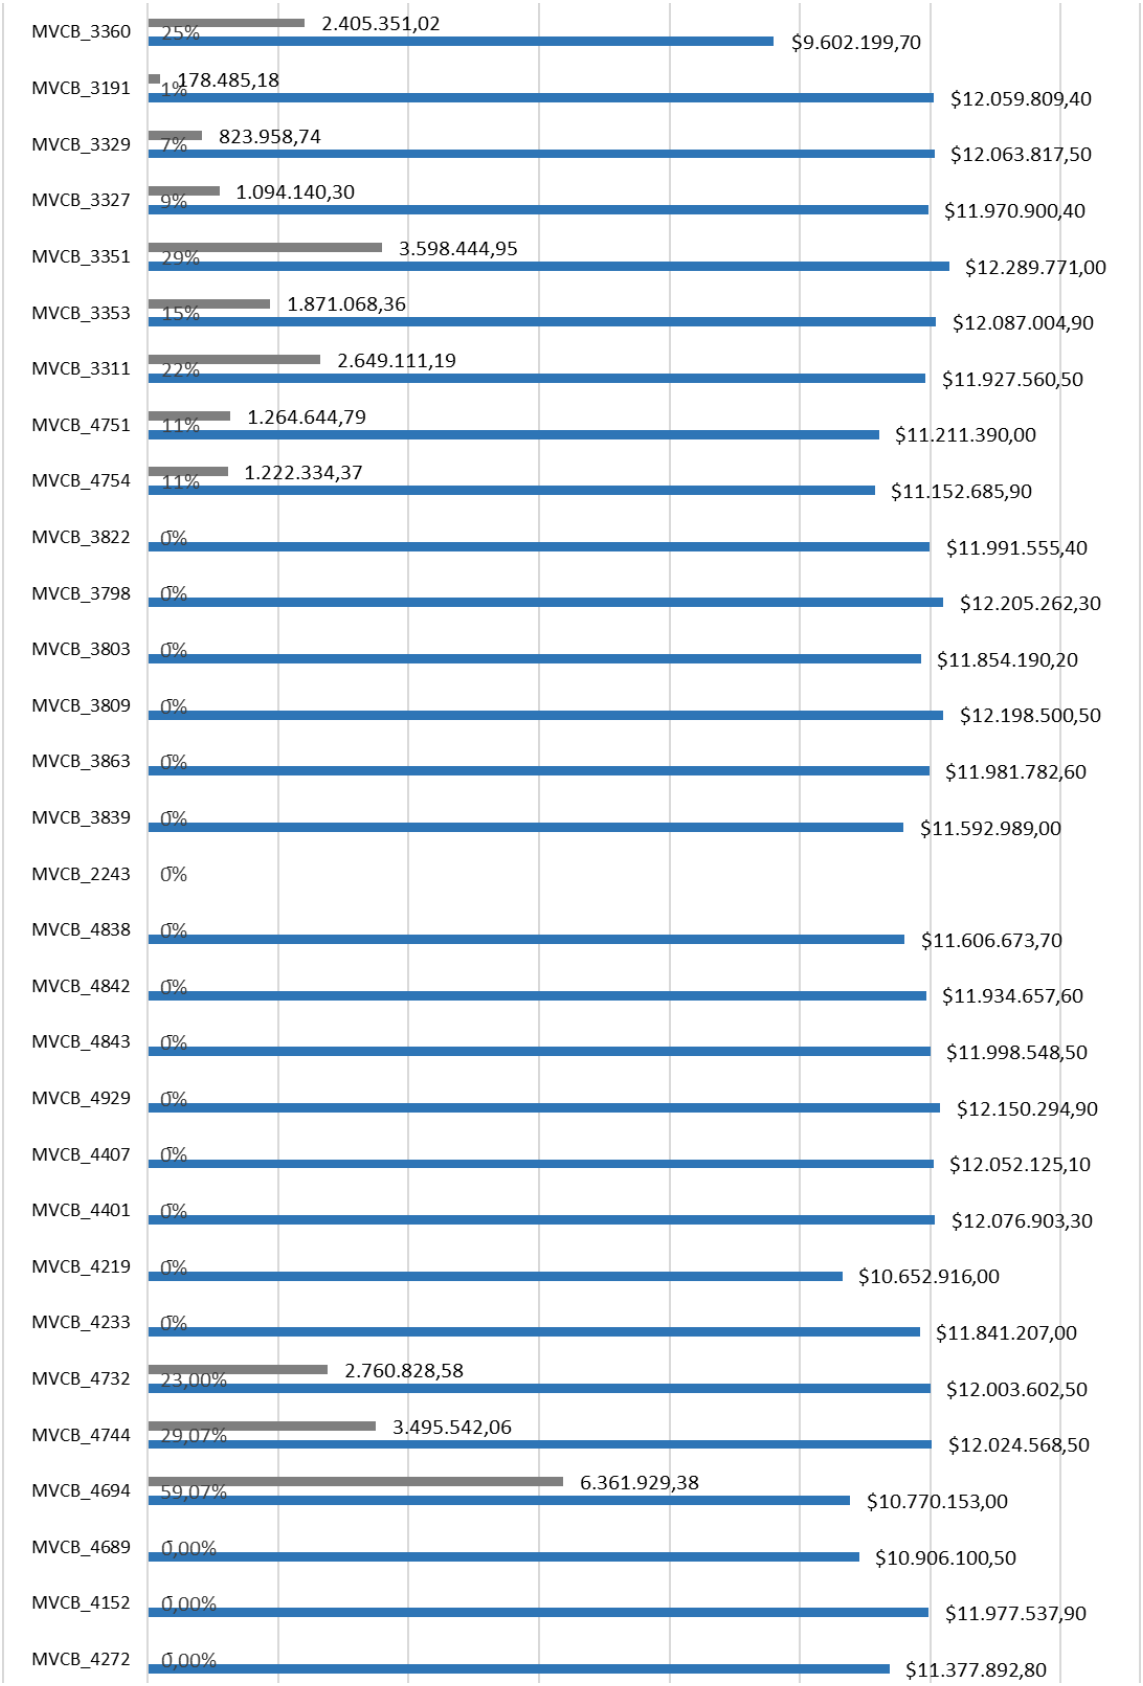
MVCB_3360 25% 2.405.351,02 $9.602.199,70
MVCB_3191 1% 178.485,18 $12.059.809,40
MVCB_3329 7% 823.958,74 $12.063.817,50
MVCB_3327 9% 1.094.140,30 $11.970.900,40
MVCB_3351 29% 3.598.444,95 $12.289.771,00
MVCB_3353 15% 1.871.068,36 $12.087.004,90
MVCB_3311 22% 2.649.111,19 $11.927.560,50
MVCB_4751 11% 1.264.644,79 $11.211.390,00
MVCB_4754 11% 1.222.334,37 $11.152.685,90
MVCB_3822 0% $11.991.555,40
MVCB_3798 0% $12.205.262,30
MVCB_3803 0% $11.854.190,20
MVCB_3809 0% $12.198.500,50
MVCB_3863 0% $11.981.782,60
MVCB_3839 0% $11.592.989,00
MVCB_2243 0%
MVCB_4838 0% $11.606.673,70
MVCB_4842 0% $11.934.657,60
MVCB_4843 0% $11.998.548,50
MVCB_4929 0% $12.150.294,90
MVCB_4407 0% $12.052.125,10
MVCB_4401 0% $12.076.903,30
MVCB_4219 0% $10.652.916,00
MVCB_4233 0% $11.841.207,00
MVCB_4732 23,00% 2.760.828,58 $12.003.602,50
MVCB_4744 29,07% 3.495.542,06 $12.024.568,50
MVCB_4694 59,07% 6.361.929,38 $10.770.153,00
MVCB_4689 0,00% $10.906.100,50
MVCB_4152 0,00% $11.977.537,90
MVCB_4272 0,00% $11.377.892,80

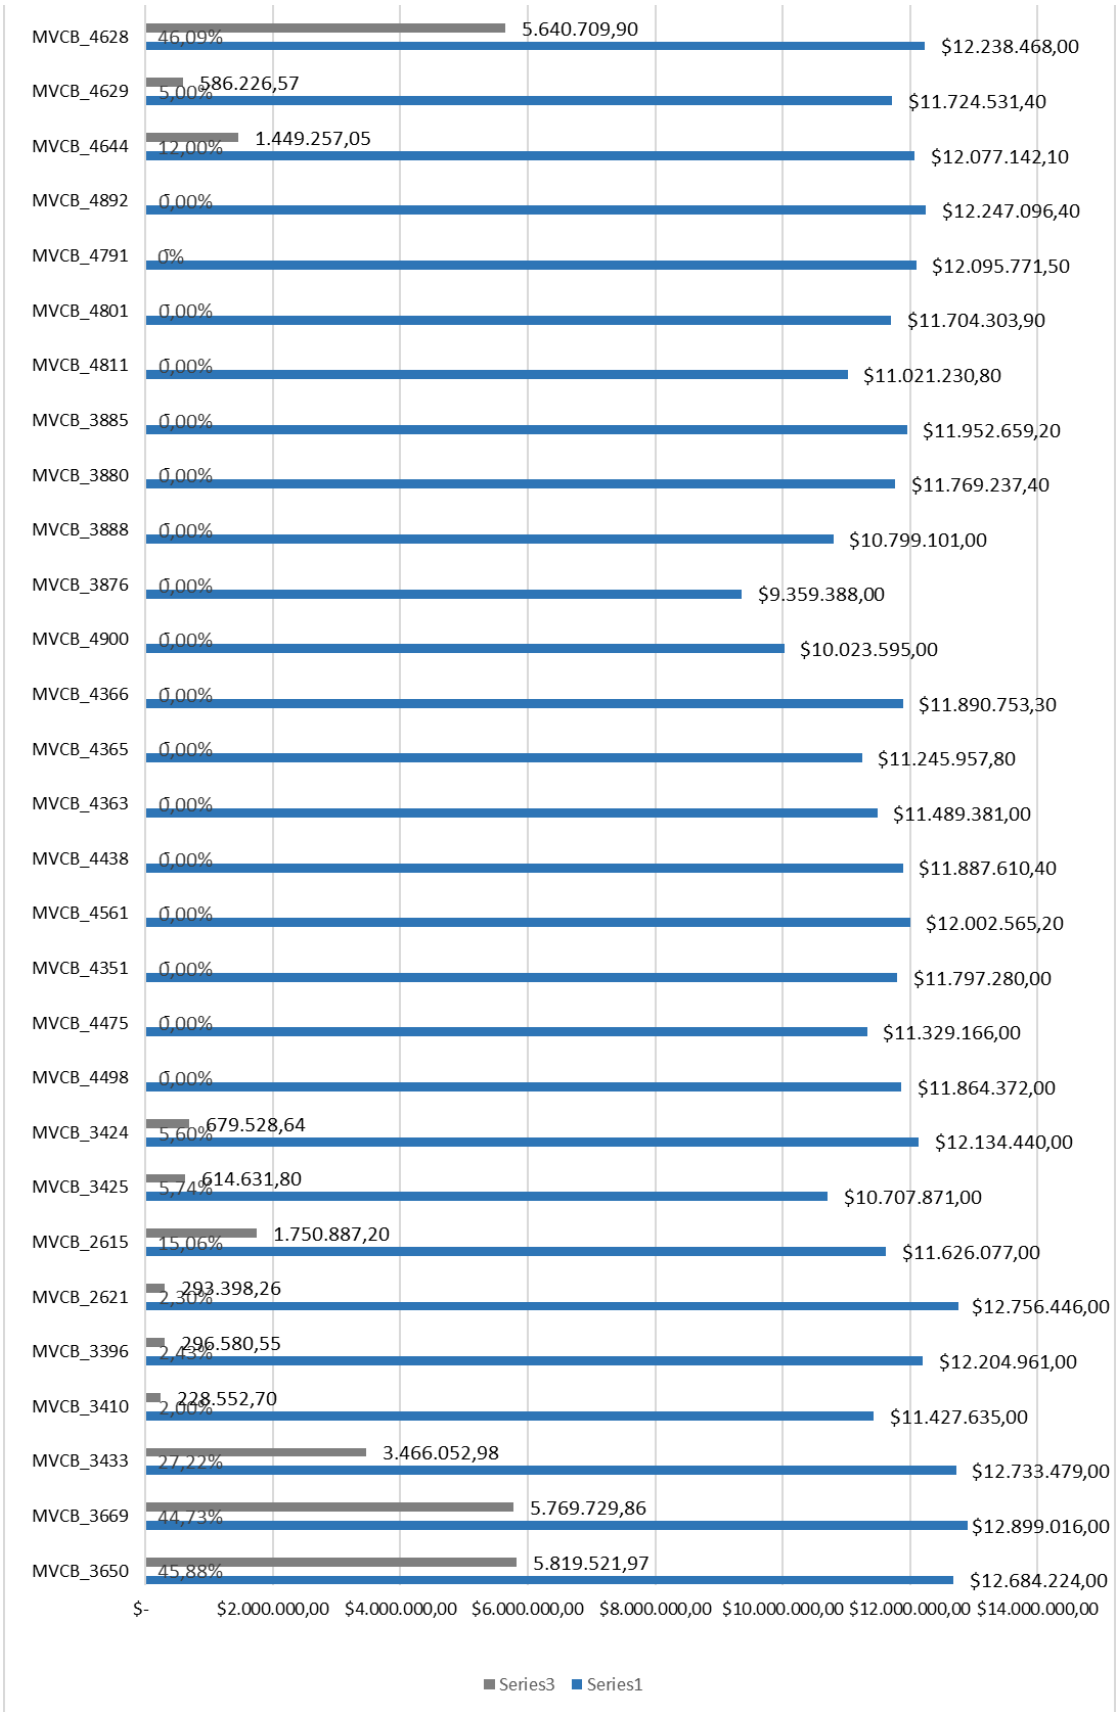
MVCB_4628
46,09%
5.640.709,90
$12.238.468,00
MVCB_4629
5,00%
586.226,57
$11.724.531,40
MVCB_4644
12,00%
1.449.257,05
$12.077.142,10
MVCB_4892
0,00%
$12.247.096,40
MVCB_4791
0%
$12.095.771,50
MVCB_4801
0,00%
$11.704.303,90
MVCB_4811
0,00%
$11.021.230,80
MVCB_3885
0,00%
$11.952.659,20
MVCB_3880
0,00%
$11.769.237,40
MVCB_3888
0,00%
$10.799.101,00
MVCB_3876
0,00%
$9.359.388,00
MVCB_4900
0,00%
$10.023.595,00
MVCB_4366
0,00%
$11.890.753,30
MVCB_4365
0,00%
$11.245.957,80
MVCB_4363
0,00%
$11.489.381,00
MVCB_4438
0,00%
$11.887.610,40
MVCB_4561
0,00%
$12.002.565,20
MVCB_4351
0,00%
$11.797.280,00
MVCB_4475
0,00%
$11.329.166,00
MVCB_4498
0,00%
$11.864.372,00
MVCB_3424
5,60%
679.528,64
$12.134.440,00
MVCB_3425
5,74%
614.631,80
$10.707.871,00
MVCB_2615
15,06%
1.750.887,20
$11.626.077,00
MVCB_2621
2,30%
293.398,26
$12.756.446,00
MVCB_3396
2,43%
296.580,55
$12.204.961,00
MVCB_3410
2,00%
228.552,70
$11.427.635,00
MVCB_3433
27,22%
3.466.052,98
$12.733.479,00
MVCB_3669
44,73%
5.769.729,86
$12.899.016,00
MVCB_3650
45,88%
5.819.521,97
$12.684.224,00
$-
$2.000.000,00
$4.000.000,00
$6.000.000,00
$8.000.000,00
$10.000.000,00
$12.000.000,00
$14.000.000,00
Series3
Series1

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

(En este caso, el interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo).

Durante este periodo se se expone por parte de la interventoría el cumplimiento de las normas distritales y nacionales en relación con los trabajos en altura, este tema fue tratado en el comité del día 9 de septiembre y se acordó con el contratista la realización de una prueba para la instalación de las cubiertas, para este ejercicio el contratista presentara a la interventoría la propuesta, el día y el procedimiento a seguir. La actividad se desarrollará en la semana del 20 al 25 de septiembre.

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL - 1

Fecha **20-sep-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Edgar Roa	JUAN PABLO II	98	119	54	44	5	33	0	65	6,86%	0
		URB. COMPARTIR	13		8	5	0	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		MARANDU	7		7	0	0	5	0	2	27,86%	0
		ACACIAS	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**119**	**119**	**69**	**50**	0	**38**	**0**	**81**	**8,68%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL										**% DE EJECUCION MENSUAL N° 1**	**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 18 AL 22	SEMANA DEL 23 AL 29	SEMANA DEL 30 AL 5	SEMANA DEL 6 AL 12	SEMANA DEL 13 AL 19
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**
BARRIO JUAN PABLO II															
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.684.224,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	**45,88%**	0,00%	0,00%	0,00%	11,17%	45,88%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.016,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	**44,73%**	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	44,73%
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.733.479,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	**27,22%**	0,00%	0,00%	0,00%	5,33%	27,22%
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO		$ 11.427.635,0	14/09/2021	29/09/2021	EN EJECUCION	**2,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO		$ 12.204.961,0	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	**2,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,43%

6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO	$ 12.756.446,0	$ 11.186.603,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	**2,30%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO		$ 11.626.077,0	13/09/2021	28/09/2021	EN EJECUCION	**15,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,06%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO		$ 10.707.871,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	**5,74%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,74%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO	$ 12.134.440,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	**5,60%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,60%
10	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI NO		$ 12.077.142,10	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	**12,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%
28	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	**5,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
29	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI NO		$ 12.238.468,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**46,09%**	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	46,09%
30	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI NO		$ 11.377.892,80			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI NO		$ 10.770.153,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**59,07%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	59,07%
34	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO		$ 12.024.568,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	**29,07%**	0,00%	0,00%	0,00%	4,01%	29,07%
35	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**23,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,00%
36	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO		$ 11.841.207,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO		$ 10.652.916,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO		$ 12.076.903,30			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO		$ 12.052.125,10			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

40	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI		$ 12.150.294,90			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
41	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI		$ 11.998.548,50			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
42	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI		$ 11.934.657,60			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
43	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI		$ 11.606.673,70			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
44	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI					SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
45	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI		$ 11.592.989,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
46	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI		$ 11.981.782,60			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
47	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI		$ 12.198.500,50			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
48	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI		$ 11.854.190,20			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
49	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI		$ 12.205.262,30			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
50	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI		$ 11.991.555,40			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
51	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI		$ 11.152.685,90	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	**10,96%**	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,96%
				NO												
52	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI		$ 11.211.390,00	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	**11,28%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,28%
				NO												
53	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI		$ 11.927.560,50	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	**22,21%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,21%
				NO												
54	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI		$ 12.087.004,90	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	**15,48%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,48%
				NO												
55	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI		$ 12.289.771,00	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	**29,28%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,28%
				NO												
56	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI		$ 11.970.900,40	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	**9,14%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,14%
				NO												
57	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI		$ 12.063.817,50	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	**6,83%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,83%
				NO												
58	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI		$ 12.059.809,40	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	**1,48%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,48%
				NO												
59	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI		$ 9.602.199,70	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	**25,05%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,05%
				NO												
60	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI		$ 12.079.596,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	**20,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
				NO												
61	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI		$ 11.947.615,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	**40,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	40,00%
				NO												
62	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI		$ 12.032.573,60			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
63	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI		$ 12.169.719,00	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	**40,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%
				NO												
64	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI		$ 12.149.156,80			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
65	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI		$ 11.701.628,10	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	**30,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
				NO												
66	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI		$ 11.769.775,40	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**50,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%
				NO												
67	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI		$ 11.326.716,60	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**25,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	25,00%
				NO												
68	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI		$ 11.528.955,20	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	**10,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%
				NO												
69	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI		$ 11.792.129,40			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
70	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI		$ 11.676.457,80			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
71	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI					SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												
72	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI					SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				NO												

73	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI NO		$ 11.678.378,50			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
74	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI NO		$ 11.386.359,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI NO					SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI NO		$ 11.887.405,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
77	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI NO		$ 11.878.089,50	20/09/2021	20/10/2021	EN EJECUCION	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
78	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO		$ 11.904.933,20	20/09/2021	20/10/2021	EN EJECUCION	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
79	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO					VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		$ 12.028.047,20			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.991.549,20			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
82	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		$ 11.196.334,10			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
86	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
88	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
93	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
95	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
96	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
97	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
98	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50			SIN VALIDAR	**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

URBANIZACION COMPARTIR															
1	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI / NO		$ 11.953.028,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI / NO		$ 11.612.217,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI / NO		$ 11.789.319,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI / NO		$ 12.284.986,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI / NO		$ 12.154.953,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI / NO		$ 11.547.979,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI / NO		$ 10.062.877,30			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI / NO		$ 11.197.949,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI / NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI / NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI / NO		$ 11.528.505,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI / NO		$ 11.926.026,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI / NO		$ 11.809.681,00			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MARANDU															
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI / NO		$ 11.811.116,20	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI / NO		$ 11.941.531,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 9.757.539,80	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI / NO		$ 11.884.972,10	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
ACACIAS IV ETAPA 2															
1	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI / NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DEL HABITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	1	DEL	18/08/2021	AL	20/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

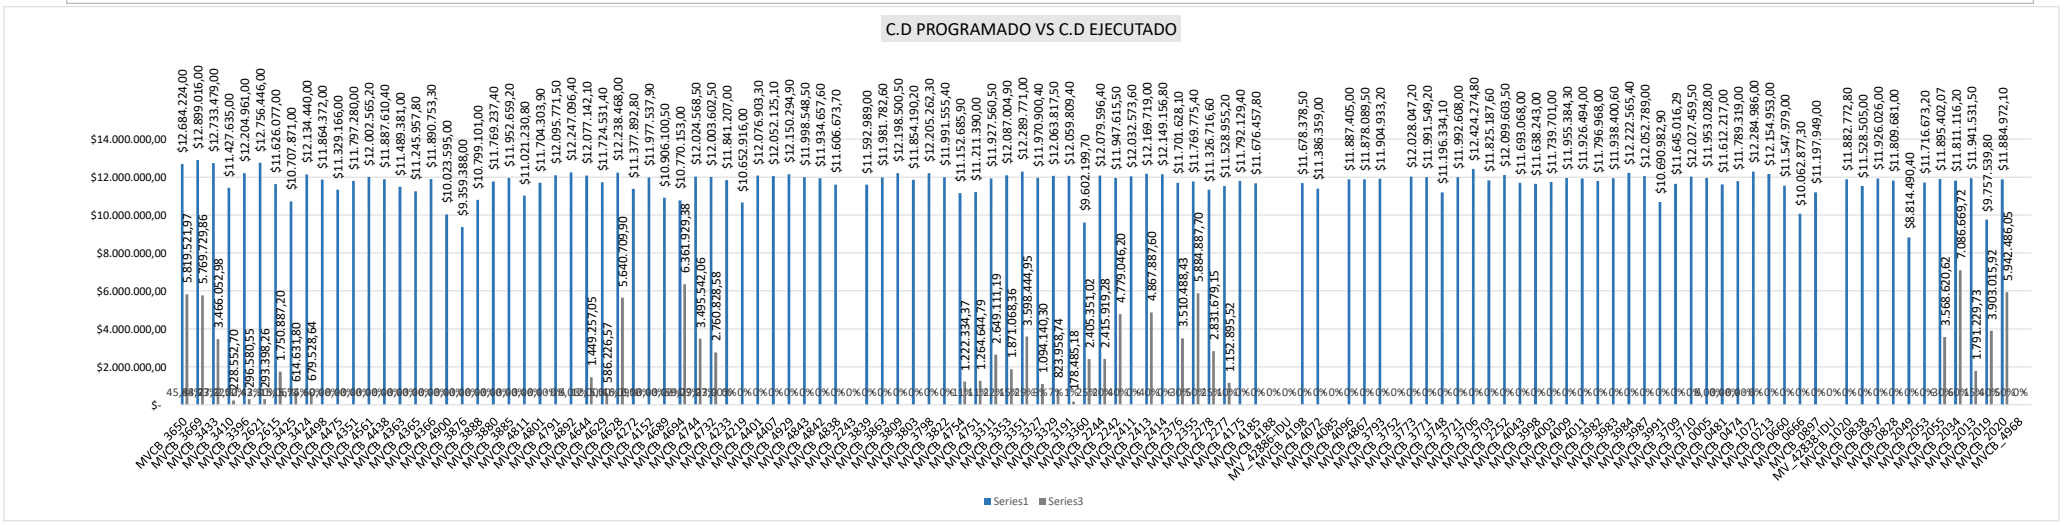

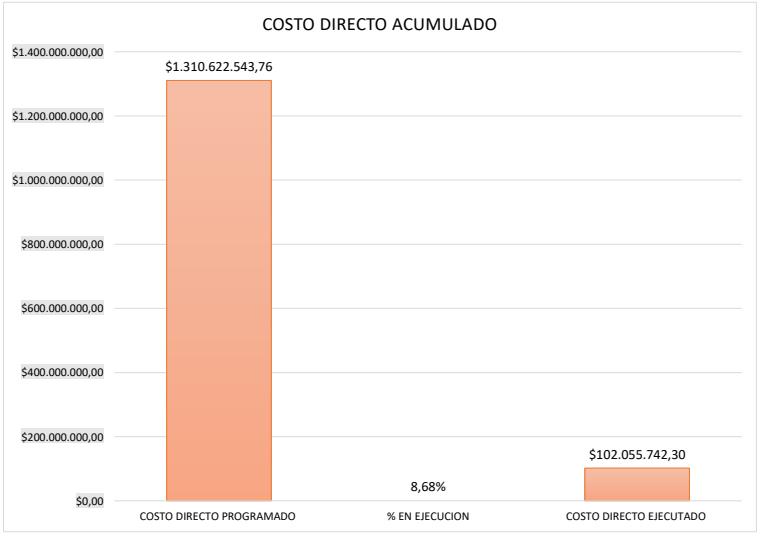

Componente Técnico: Registre aquí el consolidado del avance de la validación y verificación del alcance inicial de cada vivienda por proyecto.			
4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES N° 1 - ESTADO DE AVANCE MENSUAL POR VIVIENDA			
1	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se ejecutaron actividades de alistado de pisos de alcobas 2 y 3, y del baño 2, punto sanitario de lavadero 2, demolición de mesón de cocina 2. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
2	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se avanza en actividades de demolición de enchapes de pared y piso del baño y preparación de superficie para fundir alistado de pisos en las alcobas posteriores. Se acopia material arena de peña, cemento y enchape de piso. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
3	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	Se iniciaron actividades el 16 de septiembre de 2021. Se avanza en primera mano de estuco en muros de la alcoba 1 y sala. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
4	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. En el área de cocina se terminó la demolición de enchapes de muros; se levantaron mochetas de mesón de cocina, se fundieron el mesón superior y el entrepaño y se enchaparon los muros y parte de mesón. En la zona del baño se demolió el enchape existente y se enchaparon los muros. Se terminó el pañete de las áreas del patio y de la alcoba 2. Se alistaron con mortero los pisos proyectados. Se avanza en la instalación de cerámica de piso en cocina, patio y alcoba 2. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra con
5	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se terminaron los pañetes de muros en las áreas de sala, alcobas y cocina. Se alistaron con mortero los pisos de sala, cocina y alcobas. Se aplicó estuco acrílico en muros de sala y alcobas. Se demolió y fundió el mesón de cocina y se avanzó en enchape de paredes. Se avanza en instalación de cerámica de piso en área de la sala. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
6	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	Se realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. En el área de cocina se termina demolición de parte de mesón y enchape de pared y mesón existente. Se demolieron los enchapes de piso existentes en áreas de sala, alcobas y pasillos. Se alistaron pisos en sala, alcobas 1, 2, 3, 4, pasillos y cocina. Se demolió pañete de muros hasta una altura de 1.20 m en alcobas 2 y 4 que presentaban humedad y se aplicó nuevo pañete impermeabilizado. Se aplicó estuco acrílico en muros de alcobas 2 y 4. La interventoría dejó advertencia en bitácora requiriendo la preparación adecuada de la superficie de los pisos donde se iba a instalar el alistado, para evitar desprendimientos del mismo en un futuro y afectación del enchape. Se tomaron fotografías para evidenciar el avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
7	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	El día 14 de septiembre de 2021 se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se dio inicio a actividades el 16 de septiembre de 2021. Se detectó que el alistado de piso existente no garantiza el soporte adecuado para la nueva cerámica de piso que se va a instalar. La interventoría junto con el contratista determinaron la demolición del alistado existente e instalar alistado nuevo en las áreas de alcoba 1 y sala comedor. Este imprevisto generó la modificación del presupuesto inicialmente aprobado.
8	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	Se iniciaron actividades de obra el 15 de septiembre de 2015. Se avanza en demolición de enchapes de pared y mesón en área de cocina, demolición de enchape cerámico en pisos de comedor y baño. Se prepara superficie para aplicar alistado en sala y comedor. Al encontrarse desocupadas las áreas a intervenir se detectan nuevas actividades necesarias para dar mejor terminación; se ajustará el presupuesto proyectado. Se efectúa registro fotográfico del avance de obra y se deja constancia en bitácora. Se ajustó el presupuesto de obra.
9	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se dio inicio a obras esta semana. Se evidencia avance en demolición de enchape cerámico de pisos y pared de cocina y baño. Se pañetaron muros de zona de escalera, baño y alcoba 2. Se advirtió en bitácora al contratista, sobre el deber de usar maestras para la aplicación de pañete.
10	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
11	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
12	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

13	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
14	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
15	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
16	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
17	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	La beneficiaria firmo una prorroga hasta el dia 22 de septiembre ya que esta realizando unas mejoras y en estas areas es que se van a realizar las mejoras
18	MVCB 4628	Jose Ebelio León	El día 13 de septiembre se reporta alistado de sala y alcoba terminado y estucado de muros de las mismas zonas terminados. Se realiza estucado con material "SUESTUCO DE SUPEGAFULL" y se inicia actividad de enchape con pegacord "PEGAHEX ensayado con NYC6050" y enchape de piso alfa tipo 1 de 60*60cm. El día 14 de septiembre se termina actividad de enchape de alcoba y sala, se realiza actividad de pañete muros en hall costado alcobas. El día 15 de septiembre se instala guardaescoba en sala y alcoba se continua con pañete muros hall costado de la cocina y baño; no se puede realizar el traslado del sanitario ya que se encuentra una "Y" que recibe las aguas de la cocina con la del baño y nos se podría dar garantía de lo que se realizara. El día 16 de septiembre, el predio no conto con maestro de obra ni ayudante. El día 17 de septiembre, Se inicia actividad de enchape muros y piso en baño
19	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
20	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 13 de septiembre se reporta actividad de estucado en 2 alcobas, sala, hall y escaleras. El día 14 de septiembre se inicia actividad de estructura de cielo raso en alcoba y enchape de muros en cocina. El día 15 de septiembre se continua con la instalación de estructura de cielo raso, teniendo instalado el de dos alcobas, sala, baño, hall. y se termina actividad de enchape muros de cocina. El día 16 de septiembre inicia actividad de enchape piso cocina El día 17 se septiembre llega el cielo raso en PVC y se inicia la instalación y boquilla en muros y mesón cocina
21	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
22	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 13 de septiembre se reporta alistado de sala y alcoba terminado. Se inicia actividad de enchape piso con pegacord "PEGAHEX ensayado con NYC6050" y enchape de piso alfa tipo 1 de 60*60cm, además llega al predio enchape de pared y combo sanitario El día 14 de septiembre se termina actividad de enchape piso en alcoba del beneficiario y sala.. El día 15 de septiembre se instala guarda escoba en sala y alcoba del beneficiario y se inicia actividad de alistado de baño El día 16 y 17 de septiembre enchape de piso y pared de baño
23	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	Se Inicia actividad de pañete muros en alcoba 1, el día 13 de septiembre. El día 14 de septiembre se continua con actividad de pañete muros en alcoba 1 El día 15 de septiembre se continua con actividad de pañetes muros en alcobas 2 El día 16 y 17 de septiembre continua pañete muros alcoba 2 y cocina
24	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	Se realiza visita el día 13 de septiembre para iniciar actividades y el beneficiario solicita plazo hasta el día miércoles 14 de septiembre del 2021. El día 15 de septiembre fuimos al predio pero el señor no estaba. El día 16 de septiembre no le llego material para iniciar actividades. El constructor manifiesta que la camioneta se daño. El día 17 de septiembre se inician actividades con niveles para alistado
25	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	Se realiza acta de inicio el día 14 de septiembre, presentando al maestro y entregando kit de bioseguridad al maestro y al beneficiario. El día 15 de septiembre empieza actividad de pañete muros en alcoba 2 El día 16 de septiembre, se realiza cambio de puntos hidráulicos y sanitarios de baño y llega material para pañete y enchape de baño hasta por la tarde. El día 17 de septiembre continua con actividad de pañete muros en alcoba 2 y enchape muros en baño
26	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 8 de septiembre se realiza validación del predio, el beneficiario solicita que no se le intervenga el predio con cielo raso sino mejor las escaleras; esto se notificara a la entidad.
27	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.

28	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.
29	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
30	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
31	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
32	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 17 de septiembre se realiza validación del predio.
33	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se ejecutaron actividades de alistado de pisos de alcobas 2 y 3, y del baño 2, punto sanitario de lavadero 2, demolición de mesón de cocina 2. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
34	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	Se iniciaron actividades de obra el 13 de septiembre de 2021. Se avanza en actividades de demolición de enchapes de pared y piso del baño y preparación de superficie para fundir alistado de pisos en las alcobas posteriores. Se acopia material arena de peña, cemento y enchape de piso. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
35	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	Se iniciaron actividades el 16 de septiembre de 2021. Se avanza en primera mano de estuco en muros de la alcoba 1 y sala. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
36	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. En el área de cocina se terminó la demolición de enchapes de muros; se levantaron mochetas de mesón de cocina, se fundieron el mesón superior y el entrepaño y se enchaparon los muros y parte de mesón. En la zona del baño se demolió el enchape existente y se enchaparon los muros. Se terminó el pañete de las áreas del patio y de la alcoba 2. Se alistaron con mortero los pisos proyectados. Se avanza en la instalación de cerámica de piso en cocina, patio y alcoba 2. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra
37	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se terminaron los pañetes de muros en las áreas de sala, alcobas y cocina. Se alistaron con mortero los pisos de sala, cocina y alcobas. Se aplicó estuco acrílico en muros de sala y alcobas. Se demolió y fundió el mesón de cocina y se avanzó en enchape de paredes. Se avanza en instalación de cerámica de piso en área de la sala. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
38	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	Se realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. En el área de cocina se termina demolición de parte de mesón y enchape de pared y mesón existente. Se demolieron los enchapes de piso existentes en áreas de sala, alcobas y pasillos. Se alistaron pisos en sala, alcobas 1, 2, 3, 4, pasillos y cocina. Se demolió pañete de muros hasta una altura de 1.20 m en alcobas 2 y 4 que presentaban humedad y se aplicó nuevo pañete impermeabilizado. Se aplicó estuco acrílico en muros de alcobas 2 y 4. La interventoría dejó advertencia en bitácora requiriendo la preparación adecuada de la superficie de los pisos donde se iba a instalar el alistado, para evitar desprendimientos del mismo en un futuro y afectación del enchape. Se tomaron fotografías para evidenciar el avance de obra. Se ajustó el presupuesto de obra.
39	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	El día 14 de septiembre de 2021 se hicieron presentes el personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se dio inicio a actividades el 16 de septiembre de 2021. Se detectó que el alistado de piso existente no garantiza el soporte adecuado para la nueva cerámica de piso que se va a instalar. La interventoría junto con el contratista determinaron la demolición del alistado existente e instalar alistado nuevo en las áreas de alcoba 1 y sala comedor. Este imprevisto generó la modificación del presupuesto inicialmente aprobado.
40	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	Se iniciaron actividades de obra el 15 de septiembre de 2015. Se avanza en demolición de enchapes de pared y mesón en área de cocina, demolición de enchape cerámico en pisos de comedor y baño. Se prepara superficie para aplicar alistado en sala y comedor. Al encontrarse desocupadas las áreas a intervenir se detectan nuevas actividades necesarias para dar mejor terminación; se ajustará el presupuesto proyectado. Se efectúa registro fotográfico del avance de obra y se deja constancia en bitácora. Se ajustó el presupuesto de obra.
41	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se dio inicio a obras esta semana. Se evidencia avance en demolición de enchape cerámico de pisos y pared de cocina y baño. Se pañetaron muros de zona de escalera, baño y alcoba 2. Se advirtió en bitácora al contratista, sobre el deber de usar maestras para la aplicación de pañete.
42	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

43	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 16 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
44	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
45	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
46	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
47	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 17 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
48	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero,Enchape pared en ceramica para baños y Cocina formato 0,30*0,60 cms,instalacion de estructura Cielo raso PVC,Estuco sobre pañete muros,Base contrapiso area baño.
49	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero
50	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Pañete sobre mamposteria Area Baño,Sala-comedor y Habitaciones,Puntos Hidraulicos Lavaplatos y en baño Salida de Ducha.
51	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Alistado de piso en mortero,Enchape pared en ceramica para Cocina formato 0,30*0,60 cms,Muro en Bloque No. 5,Instalacion Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar
52	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Muro en Bloque No. 5, Pañete sobre mamposteria,
53	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Picado de Pisos esmaltados area Sala-Comedor,Alistado de pisos,Demolicion Enchape Ceramico Baño Existente,Pañete sobre mamposteria.
54	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de:Pañete sobre mamposteria, Desmonte de Aparatos Sanitarios Y Puerta baño,Puntos Hidraulicos y Sanitarios.
55	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de:Demolicion Enchape Ceramico Cocina en muro y meson existente,
56	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Pañete sobre mamposteria, Alistado de Pisos,
57	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchape de piso, alistado de piso para enchape. La propietaria realizó reparaciones eléctricas durante la ejecución de obras. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
58	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra:Alistados de piso para enchape, modificación de redes hidrosanitarias de cocina y patio de ropas, instalación de enchape de muros de cocina, aplicación de estuco en muros de habitación, sala y hall. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
59	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	No se ha realizado apertura.
60	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	No se ha realizado apertura.

61	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: en el patio de ropas se ha realizado pañete de muros, instalación de enchapes de piso y muros y pintura de los mismos. En la cocina se inició con enchapes de muro. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
62	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Se inician obras el lunes 13 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: demolición de enchapes de ducha, desmonte de aparatos sanitarios, alistado e instalación de enchapes de baño, preparación para pisos de patio y hall, desmote de lavadero. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
63	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Fundición de mesón de cocina (solo parte superior), instalación de enchapes de muro de cocina y baño, instalación de enchapes de piso de cocina, baño, sala y alcoba, aplicación de estuco acrílico en sala y alcoba. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
64	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Pañetes de muros en patio de ropas, sala, alcoba y hall. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
65	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Pañetes de muros en todo el área de la vivienda, demolición de mesón y fundición de uno nuevo, alistado de piso para enchape de alcoba y estuco en muros de alcobas. El contratista ajustó actividades de presupuesto para la óptima ejecución de la obra.
66	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Se realiza visita de validación el día viernes 17 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto. Se deja acordado con la beneficiaria modificaciones a la cubierta de cocina previas a la ejecución de obras debido a filtraciones de humedad en el espacio, se deja acta de lo anterior.
67	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Se realiza visita de validación el día viernes 17 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
68	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Se realiza visita de validación el día jueves 16 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
69	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Se realiza visita de validación el día jueves 16 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
70	MVCB_4043	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta
71	MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado, baño y cocina.
72	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado, baño y cocina.
73	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza validacion de la vivienda el dia 14/09/2021. En la cual se evidencia el baño en buen estado, se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado y habitaciones.
74	MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	Se realiza validacion de la vivienda el dia 17/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta, posible intervencion en baño, cocina y zona de lavado según ajuste de presupuesto.
75	MVCB_1020	ALIX MAYORGA CAGUA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se evidencia como prioridad el cambio de la cubierta, posible intervencion en baño, cocina y pisos según ajuste de presupuesto.
76	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.
77	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza validacion de la vivienda el dia 16/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.
78	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza validacion de la vivienda el dia 17/09/2021. En la cual se prioriza intervencion en baño, cocina, habitaciones y sala.

79	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en pañete de cocina y zona de lavado; aplicación de estuco en muro lateral de sala y habitacion.
80	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en instalacion de enchape de pared en baño, se finaliza actividad de pañete y estuco. Se funde meson de cocina con su respectivo entrepaño.
81	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en aplicación de pañete y estuco de la habitacion y alistado e instalacion de enchape de piso.
82	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en alistado de pisos en sala, hall, cocina y habitacion 2 y aplicación de estuco en hall.
83	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en aplicación de estuco e instalacion de enchape de piso en habitacion, instalacion de estuctura para cielo raso en habitacion y baño, se funde entrepaño de cocina y se finaliza actividad de pañete.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

REGISTRO FOTOGRAFICO

APERTURAS DE VIVIENDAS BENEFICIADAS



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3650: MARTHA NUBIA POSADA. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	martes, 7 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3433: ELENA MOJICA DE GUTIERREZ. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	miércoles, 8 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3669: GABRIELA MUÑOZ. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3424: GIANNI GIOVANNA REYES. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	jueves, 9 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3425: PABLO ANTONIO CUERVO. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
APERTURA DE VIVIENDA MVCB_3396: ÁNGEL ESTELA MENDOZA. Desarrollo Juan Pablo II. Se realiza apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3650 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de obra en área de cocina: Se demolieron enchapes deteriorados, se pañetan muros	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se observa avance de pañete de muros en el patio	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de pañete de muros en alcoba 3	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muro exterior de la alcoba 3	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Se levanta y pañeta mocheta en bloque en área de baño	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Demolición de enchape antiguo en área de la ducha	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3669 JUAN PABLO II - AVANCE DE OBRA



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Avance de pañete de muros en área de la sala comedor	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Vista del avance de pañete en muros de cocina	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete de muros en alcoba 2	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Pañete en muro izquierdo de la sala	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Preparación de mortero para pañete	



FECHA	viernes, 10 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Inicio de actividades de pañete de muros en alcoba 1	

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

A la fecha del presente informe no se presentan por parte del contratista acciones que conlleven a presentar incumplimiento en la ejecución del contrato de obra

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.
(cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).


- VER ANEXO PARAFISCALES OBRA (1)
- VER ANEXO PARAFISCALES INTERVENTORÍA (2)

4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)
- VER ANEXO OFICIOS INTERVENTORÍA (4)

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

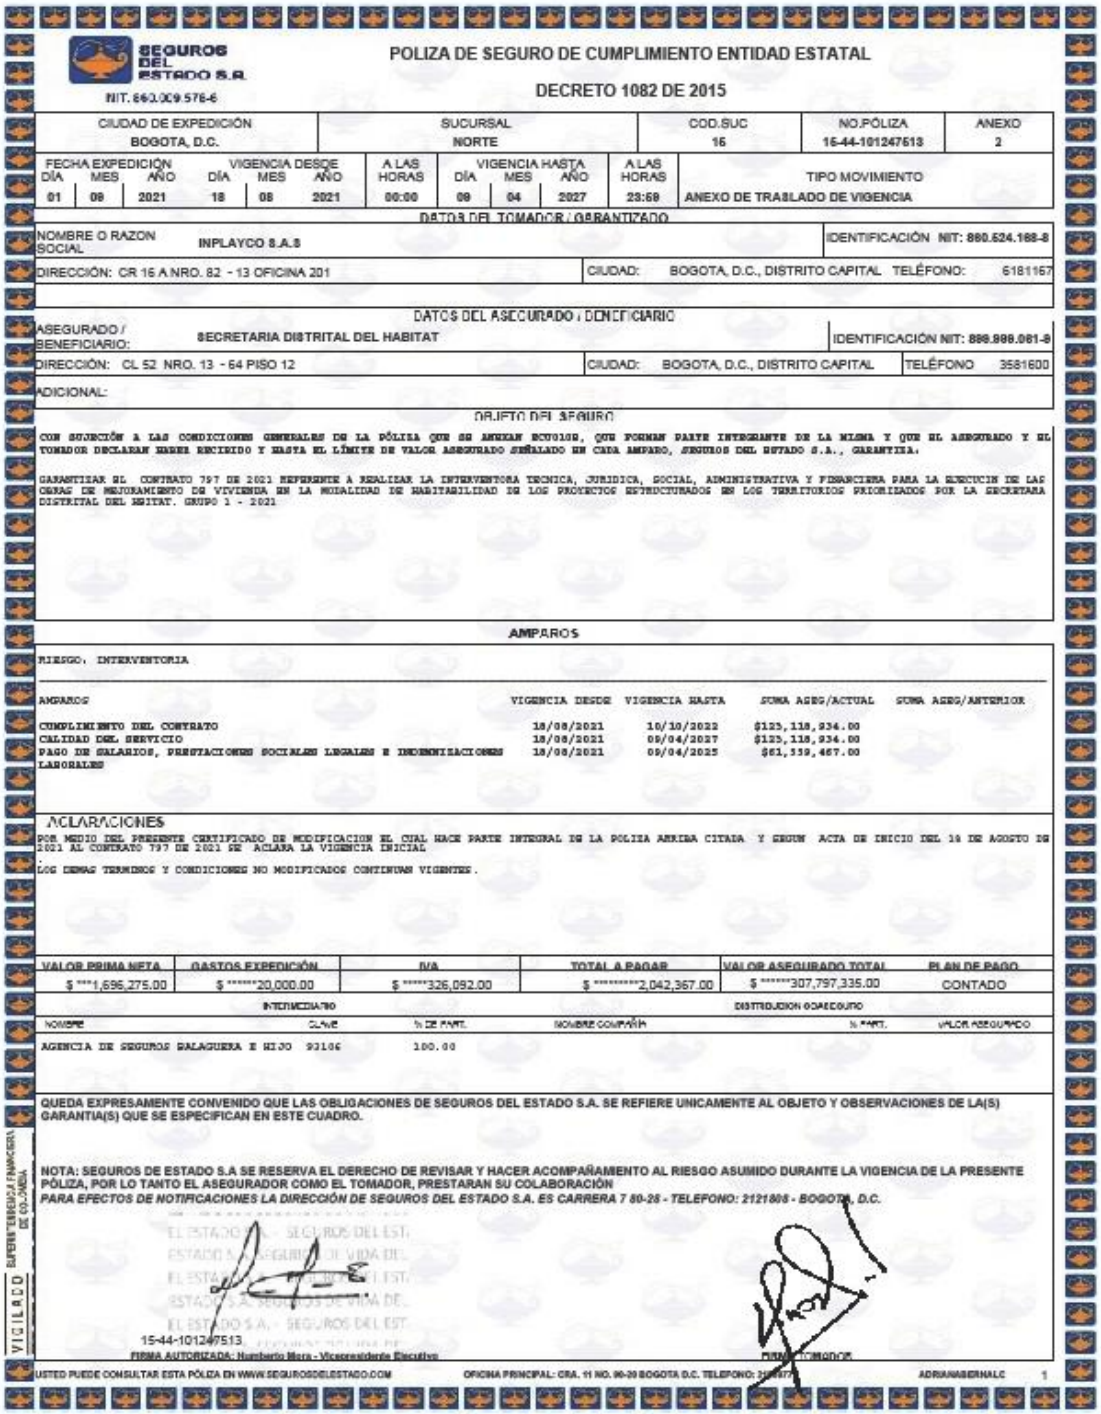

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	16	16-44-101247513	2

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	09	2021	18	08	2021	00:00	09	04	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INPLAYCO S.A.S		NIT: 860.524.168-8
DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3581600
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO 797 DE 2021 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS PROYECTOS SEÑEDICTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPO 1 - 2021

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2021	10/10/2022	$125,118,934.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2021	09/04/2027	$125,118,934.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2021	09/04/2025	$61,559,467.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 AL CONTRATO 797 DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,696,275.00	$ ******20,000.00	$ *****326,092.00	$ *********2,042,367.00	$ ******307,797,335.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-25 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101247513

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: [illegible] ADRIANABERNALC 1

AMPAROS ASEG/ACTUAL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2021	10/10/2022	$123,118,934.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2021	09/04/2027	$123,118,934.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2021	09/04/2025	$61,559,467.00

Aseguradora Seguros del estado S. A
No. De póliza: 15-44-101247513
Fecha de Expedición: 01/09/2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

seguros mundial
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CSC-100014084	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	280032534	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	18/08/2021	24:00 Horas del	06/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	No. DOC. IDENTIDAD	901.506.599-0
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 21 BIS N 59-57	TELÉFONO	3112887795
ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 60 NO.63A-52	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 60 NO.63A-52	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 794 DE 2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 2021

TOMADOR//AFIANZADO: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020
SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848 4 (PART 50%)
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. NIT. 822.006.084 8 (PART 50%)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $	VALOR PRIMA $
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,026,081,996.20	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/02/2025	513,040,998.10	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/12/2022	1,026,081,996.20	1,028,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 02/02/2022	24:00 Horas del 02/02/2024	1,026,081,996.20	0.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,539,122,994.30	0.00
		TOTAL A SEGURADO	5,130,409,981.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DIANA ALFONSO DUARTE	AGENTES	100.00

PRIMA BRUTA	$	1,028,893.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1,028,893.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	195,490.00
TOTAL A PAGAR	$	1,224,383.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recibiendo responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATENDIDOS ALACRÁN MARCA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AIF

HOJA No. 1

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,026,081,996.20	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/02/2025	513,040,998.10	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/12/2022	1,026,081,996.20	1,028,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 02/02/2022	24:00 Horas del 02/02/2024	1,026,081,996.20	0.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,539,122,994.30	0.00
		TOTAL ASEGURADO	5,130,409,981.00	

Aseguradora Compañía Mundial de seguros S. A
No. De póliza: CSC-1000014084
No. De Certificado: 280032534
Fecha de Expedición: 08/09/2021

Con relación a este punto se indica que la interventoría como el contratista se encuentran con las garantías (Pólizas) actualizadas, firmadas y vigentes.

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

Para el periodo de este informe no se registran PQR

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA	23/09/2021	**PERIODO No.**	**1**	DEL	**18/08/2021**	AL	**20/09/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	18/08/2021	2/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
SOCIALIZACIONES (REUNION DE INICIO)
Durante el periodo transcurrido del 17 de agosto al 21 de agosto el contratista ORIP SAFRICON 2020 realizo convocatoria a la reunión de socialización que se llevaria a cabo el día 25 de agosto de 2021se realizo a la convocatoria a los 119 beneficiarios del territorio habitarte, de la siguiente manera.. • Correero certificado se envió correo certificado a 14 beneficiarios con los cuales no se logró comunicación telefónica. • Vía telefónica se convocaron 105 beneficiarios.
En la fecha 25 de agosto de 2021, se llevaron a cabo tres reuniones de socialización en los horarios 8:00AM, 10:00 am y 12:00 pm, reunión que tubo por objetico Desarrollar la reunión de socialización con la comunidad del territorio Transición Habitarte 2019, esto, con el fin de informar el alcance, equipos profesionales generalidades del proyecto en la intervención y solucionar las dudas que existan en relación al proceso. En esta reunión se evidencio un gran interés y asistencia por parte de los beneficiarios a los cuales se les realizo firma de asistencia, diligenciamiento de una encuesta de prevención covid -19.
VALIDACIONES REALIZADAS
30/08/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, Se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
30/08/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO,** Se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social
30/08/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales.
30/08/2021 **- MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO,** Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales
30/08/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
30/08/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Validación con carta de autorizacion a hija **SANDRA CRISTINA HUESO PINILLA.**
30/08/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
30/08/2021- **MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS**, Se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
30/08/2021- **MVCB_4892: JOSE VICTORIANO MORENO**, Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales
30/08/2021- **MVCB_4628: JOSE AVELINO LEON**, se realiza validación social y tecnica.
30/08/2021- **MVCB_2055: FELIX ALBERTO ZAMUDIO**, Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales
30/08/2021- **MVCB_2019: CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ**, Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales
30/08/2021- **MVCB_2020: BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
31/08/2021 - **MVCB_4152: BEATRIZ RODRIGUEZ**, validacion social y tecnica
31/08/2021 - **MVCB_4694: HORACIO DE JESUS TORRES,** validación. El beneficiario autoriza a su hija JESSICA TORRES a recibir visita de validación y caracterización de obra.
31/08/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ**,** validación fallida. Se llevará a comité el caso porque se debe prioriza cubierta
31/08/2021 - **MVCB_2411: MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ,** Se realiza visita de validación, donde se levanta el formato con el benficiario de la caracterización social para la actualización de las matrices sociales
31/08/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA,** se realiza validacion y se ñevanta formato de caracterizacion.
31/08/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA,** se realiza validacion y se ñevanta formato de caracterizacion.

31/08/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
31/08/2021 - **MVCB_ 4689 GLADYS ARIELA MUÑOZ UMAÑA**,se realiza validación social y tecnica
31/08/2021 - **MVCB_ 4744 ALVARO ZUBIETA TUNJANO**,se realiza validacion y se diligencia el respectivo formato de caracterizacion social
31/08/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,**Validación con carta de autorización arrendataria **INGRID PAOLA GARAVITO**
31/08/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica y social.
31/08/2021 **- MVCB_ 3410 : OCTAVIO VALENCIA LLANO,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
31/08/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Validación con carta de autorizacion a hijo **DUVAN BARRIOS MARTINEZ.**
31/08/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Validación con carta de autorizacion a Abuela **ANA MARIA SIERRA RINCON.**
31/08/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn.
01/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn.
01/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica y social.
01/09/2021- **MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,** no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica y social.
01/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO,** no se presenta inconvenientes de ningun tipo, se realiza validaciòn del area tecnica y social.
01/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO,** validación.
01/08/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO,** Validación con carta de autorización hijo **STIVEN HERREÑO ANGULO**
01/08/2021 - **MVCB_ 2615 : CARMEN CECILIA BLANCO,** se realiza validacion y se ñevanta formato de caracterizacion.
01/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ,** se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
01/09/2021 - **MVCB_4629: JORGE ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ**, se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
01/09/2021 - **MVCB_4732: DORIS GALVIS PATARROLLO**, se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
01/09/2021 - **MVCB_2053: EDWIN ARAMANDO VANEGAS ESCOBAR**, se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social, se prioriza cubierta
01/09/2021 - **MVCB_2049: MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO**,se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social, se prioriza cubierta
01/09/2021 - **MVCB_2013: RENE MIGUEL FISCAL TORRES**, e realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
01/09/2021 - **MVCB_2034: AMINTA SABOGAL**, se realiza la respectiva caracterizaciòn y validaciòn, no se presenta novedades por parte social.
03/08/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ**, fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ, validación.
08/09/2021 MVCB_4219 **MAURICIO MARTIN BELTRAN** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
09/09/2021 MVCB_4644 **JOSE ALIRIO TORRES AVILA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.

14/09/2021 - **MVCB_4043 SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
14/09/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
15/09/2021 - **MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA NIÑO**, Desarrollo COMPARTIR Se realiza proceso de validación y caracterización social.
15/09/2021 **- MVCB_ 4407 : GLORIA STELLA BAUTISTA,**Validación -LA SEÑORA GLORIA RECOMIENDA AVISAR CONANTERIORIDAD PARA EL INICIO DE LA OBRA POR SU MADRE QUIEN ES ADULTO MAYOR CON DIFICULTAD DE MOVILIDAD,
16/09/2021 - **MVCB_ 4929 : PEDRO PABLO SALAMANCA,** validación , el beneficiario muestra su preocupación al momento de inicar con las obras por la tenencia de perros pitbull
16/09/2021 - **MVCB_ 4401: GUSTAVO MARTINEZ PRIETO, VALIDACION Se realiza proceso de validación y caracterización social.**
16/09/2021 - **MVCB_ 0213 : JOSE LEONARDO SERRANO**, VALIDACION , POSIBLE HISTORIA DE VIDA
16/09/2021 **- MVCB_ 4498 : ELCI RUTH ORTIZ MORENO,** Validación sin novedad
16/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
16/09/2021 **MVCB_1020 ALIX MAYORGA CAGUA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
16/09/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** la beneficiaria se encuentra en condición de discapacidad física, razon por la cual la visita es atendida por su hija, es importante aclarar que la vivienda se encuentra dividida en dos partes, la caja de vivienda popular dio prioridad al area donde no habita la propietaria, sin embargo revisando las condiciones se dara prioridad a la vivienda en que habita la señora ligia teniendo en cuenta su condicion actual.
16/09/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** el beneficiario fallecio, atiende la visita la señora DIOSELINA RAMIREZ (viuda), Se realiza proceso de validación y caracterización social.
16/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
16/09/2021 **- MVCB_ 4475 : MARIA SUSANA PIRAGAUTA** Validación sin novedad
17/09/2021 **- MVCB_ 4351 : JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ,** Validación con carta de autorización de la sra.**MARIA AGRIPINA MUÑOZ,** posibre postulacion historia de vida.
17/09/2021 **- MVCB_ 4561 :ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO,** Validación sin novedad
17/09/2021 **- MVCB_ 4438: FLOR ALICIA SALCEDO CANO,** Validación sin novedad
17/09/2021 **- MVCB_ 4363 :LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA ,**Validación sin novedad
17/09/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
17/09/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.Se levanta acta de compromiso, la familia hará arreglos en la cubierta y correrá el punto de gas, se deja tiempo de 20 días para el cumplimiento dicho compromiso
17/09/2021 - **MVCB_ 4233**. **BEATRIZ CORREDOR RUSIQUE, VALIDACION ,** LA BENEFICIARIA NO SE ENCUENTRA EN LA CUIDAD DEJA CARTA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA CON COPIA DE CEDULA

17/09/2021 **MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA GUALDRON** La beneficiaria da autorización a la hija para el proceso, Se realiza proceso de validación y caracterización social.
17/09/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
20/09/2021 **MVCB_3752 JESUS ANTONIO LOPEZ** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
20/09/2021 **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
07/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza apertura con carta de autorizacion a hija **SANDRA CRISTINA HUESO PINILL,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Se establecen compromisos de obra para algunas areas antes de iniciar obras de mejoramiento.
07/09/2021- **MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona quien lo autoriza por medio de llamada teléfonica, se le solicita realizar carta de autorización.
07/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
07/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
07/09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
07/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
07/09/2021 - **MVCB_2055: FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL,** se realiza apertura de vivienda, Se genera compromiso, orientado a la disposicion de la coneccion del gas natural.
07/09/2021 - **MVCB_2020: BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** se realiza apertura de vivienda sin embargo la beneficiaria solicita iniciar obra el dia jueves 9 de septiembre del año en curso.
07/09/2021 - **MVCB_2034: AMINTA SABOGAL** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021 - **MVCB_4628 JOSE ABELINO LEON** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021 - **MVCB_4694 HORACIO DE JESUS TORRES** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
07/09/2021 - **MVCB_4732 DORIS GALVIS PATARROYO** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
08/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
08/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza apertura con carta de autorización a Madre **LETICIA CASTRO SIERRA,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
08/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
08/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍAZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
08/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
08/09/2021 - **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
08/09/2021 - **MVCB_ 2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.

08/09/2021 - **MVCB_4744 ALVARO ZUBIETA TUNJANO** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
08/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
08/09/2021 - **MVCB_4629: JORGE ANDRES JIMENEZ**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
09/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**, apertura de obra. Se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia.
09/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
09/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO,** Apertura de viivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
09/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Apertura de vivienda realizada con el atutorizado del predio STIVEN HERREÑO ANGULO, se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
09/09/2021**- MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN**, se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
09/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ ,**Se realiza apertura con carta de autorización a hijo **EDWIN DUBAN MARULANDA,** se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
10/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza apertura con carta de autorización a hijo **DUVAN BARRIOS MARTINEZ.** Se socilaiza actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
10/09/2021- **MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,**Se realiza apertura la vivienda socializando actividades de obra con presupuesto inicial, protocolo de bioseguridad con entrega de kit y recomendaciones sociales. Sin novedades.
10/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicaciónes de bioseguridad y recomendaciones sociales.
13/09/2021 **- MVCB_ 2615 :CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/09/2021 **MVCB_4644 JOSE ALIRIO TORRES AVILA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
16/09/2021 - **MVCB_ 3410: OCTAVIO VALENCIA LLANO,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
20/09/2021 - **MVCB_ MVCB_3793 WILSON REINEL MORA CAICEDO,** Se realiza apertura ,se socializan actividades de obra, se recuerda información de bioseguridad y social, se firma documentos correspondientes
20/09/2021 - **MVCB_4867LUZ MARINA MEJIA CARMONA** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
07/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** se realiza seguimiento, vivienda sin novedad desde el area social.
07/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** La beneficiaria se encuentra reacomodando los enseres del hogar, con el fin de facilitar la intervencion, ya que la vivenda es pequeña y el moviliario es alto
07/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** se realiza seguimiento, vivienda sin novedad desde el area social.
09/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**, seguimiento de obra. la familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio.
09/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, seguimiento de obra. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas en inquietudes. Indica que empezaron obras el día de hoy. Se le hace la recomendación de no colaborar a los maestros en las labores de obra
09/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, seguimiento de obra. La beneficiaria no se encuentra en el predio, se le hace la recomendación a la hija y en bitácora de dejar carta de autorización. Su hija manifiesta que empezaron labores constructivas el día de ayer y se observa personal de obra en el predio.
09/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA**, seguimiento de obra. La familia indica que empezaron obras constructivas el día de hoy. No indican dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio
09/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, seguimiento de obra. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances e indica que los maestros esmpezaron labores el día de hoy.
09/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA**, seguimiento de obra. No se evidencia maestros en el predio, se le indica a la beneficia que si no llegan a la 1 pm se comunique con la social.
10/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA**, seguimiento de obra. No se evidencia maestros en el predio, se le indica a la beneficia que si no llegan a la 1 pm se comunique con la social.
10/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, seguimiento de obra. La familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio, la señora Carmenza no indica dudas .
10/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO**, seguimiento de obra. Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas en inquietudes. Se observa personal de obra en la vivienda.
10/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO**, seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
10/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**, seguimiento de obra. la familia indica que los trabajadores no han llegado a laborar, el contratista le indica que se encuentran afiliando a los trabajadores quienes el lunes se acercaran a la vivienda.
10/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**, seguimiento de obra. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda.
10/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se reliza seguimiento sin novedades desde el area social. Se evidencia cumplimiento frente a compromiso previo
10/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza vista de seguimiento a la obra, beneficia autoriaza a Hijo **DIEGO SOTO** Y sobrino **MAURICIO SOTO** para toma de decisiones frente a la ejecución de obras. No se han iniciado obras debido a que se encuentran terminando los compromisos incialmente establecidos en la visita de validación y debido a cambios en actividades de cocina y baño, se establecen nuevo compromisos para poder dar inicio a las obras de mejoramiento, se realiza acta de reunion estableciendo dichos acuerdos y firmada por ambas partes, Autorizados, contratista e intervenoria.
10/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza visita de seguimiento a la obra, la atiende autorizada del beneficiario **SANDRA CRISTINA HUESO PINILLA (HIJA),** Se observa material y personal de obra ejecutando las activdades, autorizada no reporta novedades y/o inconformidades.
10/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita, no se toma control en bitácora ya qué está bajó llave.
10 /09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **INGRID PAOLA GARAVITO.**Refiere conformidad con los avances de obra.

10 /09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
10/09/2010 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Se realiza seguimeinto sin novedad desde el area social
10/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se realiza seguimeinto sin novedad desde el area social
10/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Se realiza seguimiento con acompañamiento social sin embargo se evidencia que aunque ya tiene materiales en la vivienda no se ha asignado maesto para la ejecucion de la obra.
10/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECION LOPEZ** Se realiza seguimiento socia, se evidencia que aún no se da inicio a la obra, la vivienda no cuenta con materiales ni maestro asignados para la ejecución de la obra el contratista refiere que se dará inicio el día lunes 13/09/2021
13/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se socializa presupuesto ajustado, de acuerdo al cambio de actividades realizado por el beneficiario en la vivienda; muestra conformidad para dar inicio a las obras.
13/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza visita de seguimiento a la obra en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, atiende autorizada del beneficiario **SANDRA CRISTINA HUESO PINILLA (HIJA),** Beneficiario no expresa dudas/inquietudes
13/09/2021**- MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia material y maestro asignado para dar inicio a las obras. Beneficiario no expresa dudas y/o inquietudes.
13/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia material y maestro de obra ejecutando actividades. Beneficiaria expresa conformidad con los avances, se resuelven dudas al respecto con algunas actividades.
13/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, Atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta que los trabajadores no laboraron el fin de semana y el día de hoy no han llegado, no refiere dudas en inquietudes. Se le indica, si el personal de obra no se acerca se comunique con la social.
13/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento de obra, la familia manifiesta conformidad con los avances de construcción, se observa personal de obra en el predio, la señora Carmenza no indica dudas
13/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
13/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Sin novedad desde el área social
13/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranuiodad con los avances de la obra. No indican dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio
13/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda y buenas relación con la familia
13/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.

13/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **INGRID PAOLA GARAVITO**.Refiere conformidad con los avances de obra.
13/09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
13/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.No se evidencia material ni maestro asignado a la vivienda. Contratista se compromete asignar maestro en las horas de la tarde para dar inicio a las obras. Se resuelven dudas al respecto con autorizada de la vivienda.
14/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia cumplimiento de compromiso asignando personal de obra para iniciar actividades, se reitera recomendaciones frente a la permanencia deun mayor de edad (beneficiario/autorizado) en la vivienda durante la ejecución de obras.
14/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende hijo autorizado **EDWIN MARULANDA**. Se reitera frente a la disponibilidad en la vivienda para poder dar ingreso a personal y material de obra, ya que el día anterior no se encontraba nadie en la vivienda y dificulto el ingreso del material.
14/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria no se encuentra en la vivienda, se realiza contacto telefónico para reiterar compromisos y disponibilidad para dar ingreso a material y maestros de obra.
14/09/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra descargando material para la ejecución.
14/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta inquietud por las demoraste constructivas, se le sugiere al contratista prontitud en la obra, se observa personal de obra en el predio .
14/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra. La familia manifiesta conformidad ya que los trabajadores retomaron labores, no refiere dudas en inquietudes
14/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio.
14/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su hijo autorizado Andrés Gallego. Manifiesta que los trabajadores empezaron a laborar el día de hoy, no refiere dudas en inquietudes. Se le indica, si el personal de obra no se acerca se comunique con la social. Por otro lado se le recuerda no hacer actividades paralelas con las del mejoramiento de vivienda.
14/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere conformidad con los avances; se observan maestros en la vivienda y buenas relación con la familia.
14/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica que empezaron labores el día de hoy. Se le indica a la beneficia, si no llegan a laborar se comunique con la social.
14/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
14/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
14/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Se realiza seguimiento de obra, encargado del predio atiende la visita .**STIVEN HERREÑO ANGULO**, se resuelven dudas e inquietudes tecnicas de obra.
14/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende hijo autorizado **DUVAN BARRIOS**. Se realiza recomendación respecto a la permanencia para el ingreso del personal y material de obra, ya que el día anterior no se encontraban en la vivienda.
15/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Atiende visita hijo autorizado, se evidencia maestros ejecutando actividades de desmolición. Autorizado no expresa dudas y/o inquietudes.
15/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se levanta acta de compromisos debido a situación de consumo al interiror de la vivienda por parte del hijo de la beneficiara . Se presentan maestro de obra y se realiza compromiso de desalojar habitaciones.
15/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra ejecutando actividades de pañete en cocina. Se realiza claridad a la beneficiara en zonas priorizadas para ejecutar en primer piso.
15/09/2021 - **MVCB_ 2615 : CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.

15/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Feliz Gaona autorizado. Manifiesta inquietud técnica, si el cielo raso puede ser cambiado de área a lo cual el contratista indica que ni hay problema. Se observan trabajadores laborarondo.
15/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio
15/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos, sin embargo indica inquietudes sobre el presupuesto, el contratista se lo explica nuevamente. Se observa personal de obra en el predio
15/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio.
15/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
15/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros no han llegado el día de hoy ya que no hay material. Se le sugiere si no llega en el trascurso del día se comunique con la social.
15/09/2021- **MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades, de resuelven dudas al beneficiario.
15/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **NGRID PAOLA GARAVITO.**Refiere conformidad con los avances de obra.
15 /09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
15/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde donde se resuelven dudas e inquietudes tecnicas de obra.
15/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
15/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria expresa conformidad con los avances, no reportan dudas/inquietudes
16/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se realiza concertación con la beneficiaria, contratista e interventoría, frente actividades en 1 y 2 piso. Se realizará ajustes en actividades y se socializará de nuevo el presupuesto. se reiteren alcances del proyecto.
16/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Se realiza seguimiento de obra, encargado del predio atiende la visita .**STIVEN HERREÑO ANGULO**, Refiere conformidad con los avances de obra.
16/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
16 /09/2021 - **MVCB_ 3410:OCTAVIO VALENCIA LLANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
16/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita, se deja control en bitácora.
16/09/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros de obra ejecutando actividades. Beneficiario no expresa dudas y/o inquietudes.
16/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita abuela Autorizada **ANA MARÍA** Se evidencia personal de obra ejecutando actividades.No reportan dudas y/o inquietudes frente a las actividades.
16/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
16/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros reanudaron labores el día de hoy. Se observan maestros en la vivienda
16/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad ya que están avanzando en la ejecución del baño.
16/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
16/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes

16/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio
16/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, la familia manifiesta tranquilidad con los trabajos adelantados. Se evidencia maestros adelantando los trabajos constructivos
16/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se resuelven dudas a la Beneficiaria frente activdades. Manifiesta conformidad con los avances.
17/09/2021**- MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de SDTH, profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se socializa nuevo presupuesto contemplandoas actividades concertadas el día anterior. Beneficiaria expresa inconformidad con el enchape de piso, menciona ser muy "rústico" para una habitación, se le realiza aclaración frente a las condiciones del material y los alcances del proyecto. Aprueba presupuesto y material para la ejecución. Se realiza acta de visita social dejando claridad frente a lo concertado durante la visita.
17/09/2021**- MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita hijo **JULIAN RAMÍREZ**, quien no refiere dudas al respecto. se observa personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria se encuentra en la vivienda después de las 10am por temas de salud (oxígeno).
17/09/2021**- MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Atiende visita hijo autorizado, quien no refiere dudas e inquietudes, maestros ejecutando actividades de pañete en sala/comedor. Se reitera la importancia de cumplir con el protocolo de bioseguridad.
17/09/2021- **MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestroS de obra ejecutando actividades de enchapé en cocina. Beneficiaria conforme con los avances, no reporta duda e inquietudes,
17/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio
17/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Felix Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra en la casa.
17/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes
17/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio
17/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente.
17/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predi
17/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se realiza seguimiento de obra, atiende visita el beneficiario quien refiere conformidad con los avances constructivos, el beneficiario realizo el compromiso de mover el punto del gas para poder realizar enchape en el area de la cocina.
17/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** Sin novedad desde el área social, refiere conformidad en cuanto a los maestros y los trabajos contructivos realizados al momento.
17/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social, la beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos, no refiere dudas ni presenta inquietudes relacionadas a la ejecucion
17/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** la beneficiaria refiere conformidad en cuanto la ejecuicion de la obra, sin embargo solicita al contratista que de prioridad al area de la cocina.
17/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** El día 17 los beneficiarios solicitan se indique a los maestros el hecho de no poder fumar dentro del predio.
20/09/2021 **MVCB_2621 ALIX ANGULO AMADO** Sin avance de obra los maestros trabajaron hasta el sábado. El residente solicito nuevos maestros para continuar la ejecución.
20/09/2021 **MVCB_3410 OCTAVIO VALENCIA LLANO** Se evidencia avance de obra, se hace la recomendación a los beneficiarios que si van hacer modificaciones o arreglos extras deben avisar a los profesionales encargados
20/09/2021 **MVCB_2242 AURA NELLY FIGUEROA** Se realizó pre entrega zona de ropas 100%. A satisfacción de la beneficiaria.
20/09/2021 **MVCB_2413 MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ** Se realizó pre entrega de 2 espacios en 100% sala y habitación a satisfacción de la beneficiaria.
20/09/2021 **MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ** Ejecución de obras de forma normal, beneficiarios no presentaron inquietudes

ENTREGAS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
NO SE PRESENTARON ENTREGAS
RENUNCIAS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
VALIDACIONES REALIZADAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana

RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m. en el transcurso de la semana no se recepcionó ninguna atención. Desarrollo: Juan Pablo II
HISTORIAS DE VIDA
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
BARRIO O TERRITORIO
JUAN PABLO ll
HISTORIAS DE VIDA
MVCB_3793: WILSON MORACAICEDO: Postulada historia de vida.
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
INFORME MENSUAL DEL 18 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2021
MVCB_2414 LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ en la cual se estableció: realizar cubierta, cocina y área zona de lavado, dejando claro presupuesto y actividades detalladas.
MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMENEZ bajo acta se acuerda con beneficiario las siguientes actividades: enchape de pisos en todas las zonas de la vivienda, cambio de combo sanitario y puerta de baño, con respectivo enchape en paredes, construcción de mesón nuevo enchapado y enchape de paredes de esta, adecuación de puntos hidráulicos y enchape de salpicadero en zona de lavado, actividad de pintura en zona de cocina, baño, patio y alcohoba #4, dejando
MVCB_2411 MARIA DEL CARMEN LOPEZ se realiza visita a la vivienda estableciendo que realizara cubierta.
El 08 de septiembre de 2021, se realizó visita técnica y social de obra e interventoría junto con la Secretaría Distrital de Hábitat, a la vivienda MVCB_2252 CAMPO ELIAS GIL PARDO: Se realiza visita al predio con el fin de realizar la validacion correspondiente. Durante el ejercicio se evidencia que la vivienda tipo bifamiliar, presuntamente se encuentra desenglobada, con dos escrituras, una a nombre de la señora Abigail Pardo de Gil; progenitora del beneficiario, identificada con cedula de ciudadania 24.015.711 y la otra presenta como titular el beneficiario en mencion. La situacion que se presenta corresponde a que el subsidio asignado al predio ubicado en la carrera 18 v bis 68 a 42 sur es propiedad de la señora Abigail. En el ejercico el beneficiario refiere que tanto el, como la progenitora solicitaron el subsidio de mejoramiento y tienen procesos diferentes, no esta dispuesto a recibir el subsidio para el predio del cual no es propietario ya que expresa perdera la oportunidad de recibirlo para su vivienda.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

SOCIALIZACION DE INICIO		
ACTIVIDAD: ingreso de beneficiarios a la reunión de socialización llevada a cabo el 25 de agosto de 2021	**ACTIVIDAD: socialización llevada a cabo el 25 de agosto de 2021**	**ACTIVIDAD: Entrega de refrigerios**
		
SEMANA 1 DEL 30 de agosto AL 04 de septiembre		
Validaciòn. MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. Desarrollo Juan Pablo II	**Validaciòn. MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validaciòn fallida. MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Validaciòn. MVCB_2411: MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ. Desarrollo Juan Pablo II	Validaciòn. MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA. Desarrollo Juan Pablo II	Validaciòn. MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA. Desarrollo Juan Pablo II
		
Validaciòn. MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Validaciòn. MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validaciòn. MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Validación. MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Validación. MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_ 3669 : GABRIELA MUNOZ, carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021															

MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021															
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/09/2021															
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															

MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/09/2021																
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021																
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021																
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021																
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																

MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															


6. ASPECTOS PRESUPUESTALES

6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutando actividades de validación, de socialización, y de actividades de obra; Lo anterior, al ser el inicio de las obras en cada una de las viviendas, no se ha presentado cortes para cobro por parte del contratista CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 ni de la interventoría INPLAYCO S.A.S.

RELACIÓN DE VALOR EN EJECUCIÓN MES DE AGOSTO 18-SEPTIEMBRE 20 DEL 2021


Para el informe mensual No. 1 entre el 18 de agosto y el 20 de septiembre, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020,** se encuentra en la ejecución de obras en algunos Mv que a la fecha del informe presenta un valor de acuerdo con la programación de obra de:

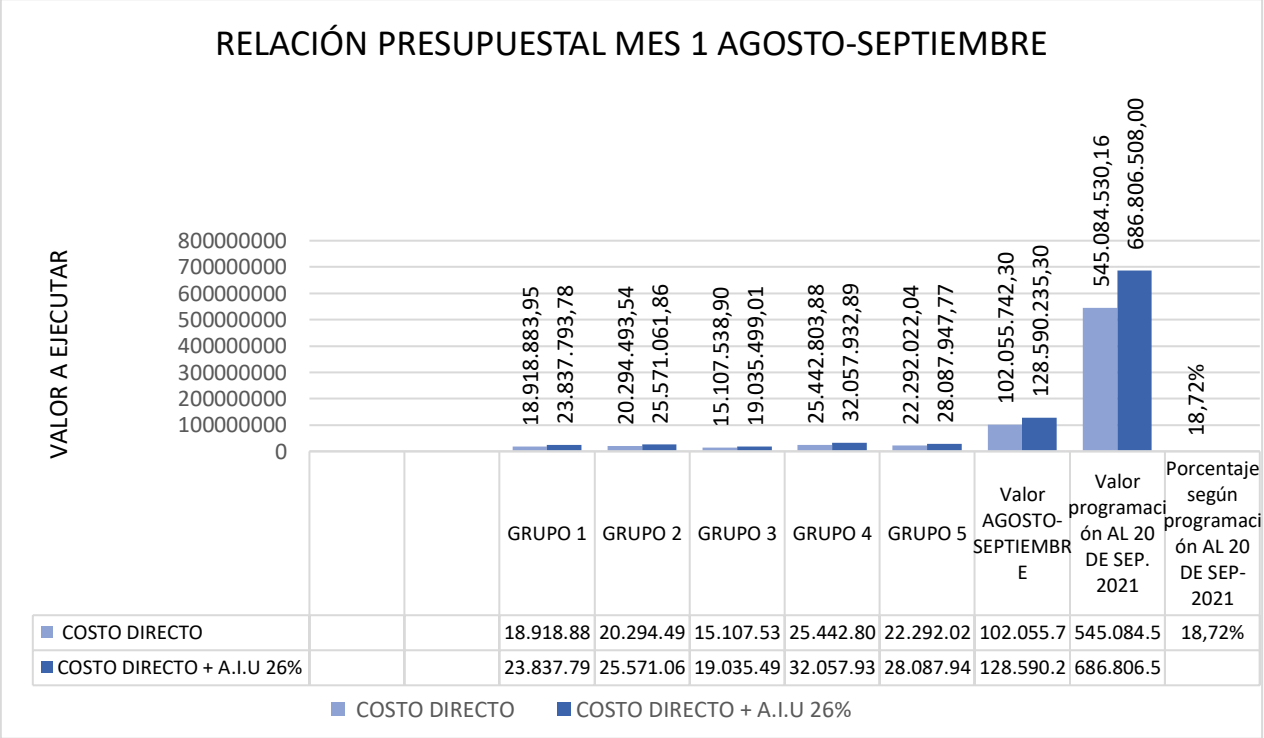

RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 1

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT					Validación			Ejecución				Fase 2: Ejecución de obras
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Edgar Roa	JUAN PABLO II	98	119	54	44	5	33	0	65	6,86%	0
		URB. COMPARTIR	13		7	6	0	0	0	13	0,00%	0
Técnico Responsable		MARANDU	7		7	0	0	5	0	2	27,86%	0
		ACACIAS	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**119**	**119**	**68**	**51**	0	**38**	**0**	**81**	**8,68%**	**0**

Para el informe mensual No. 1 entre el 18 de agosto y el 20 de septiembre, y según la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2021,** se encuentra en **cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que la fecha de entrega de las primeras 46 viviendas es para el 21 de octubre de 2021.

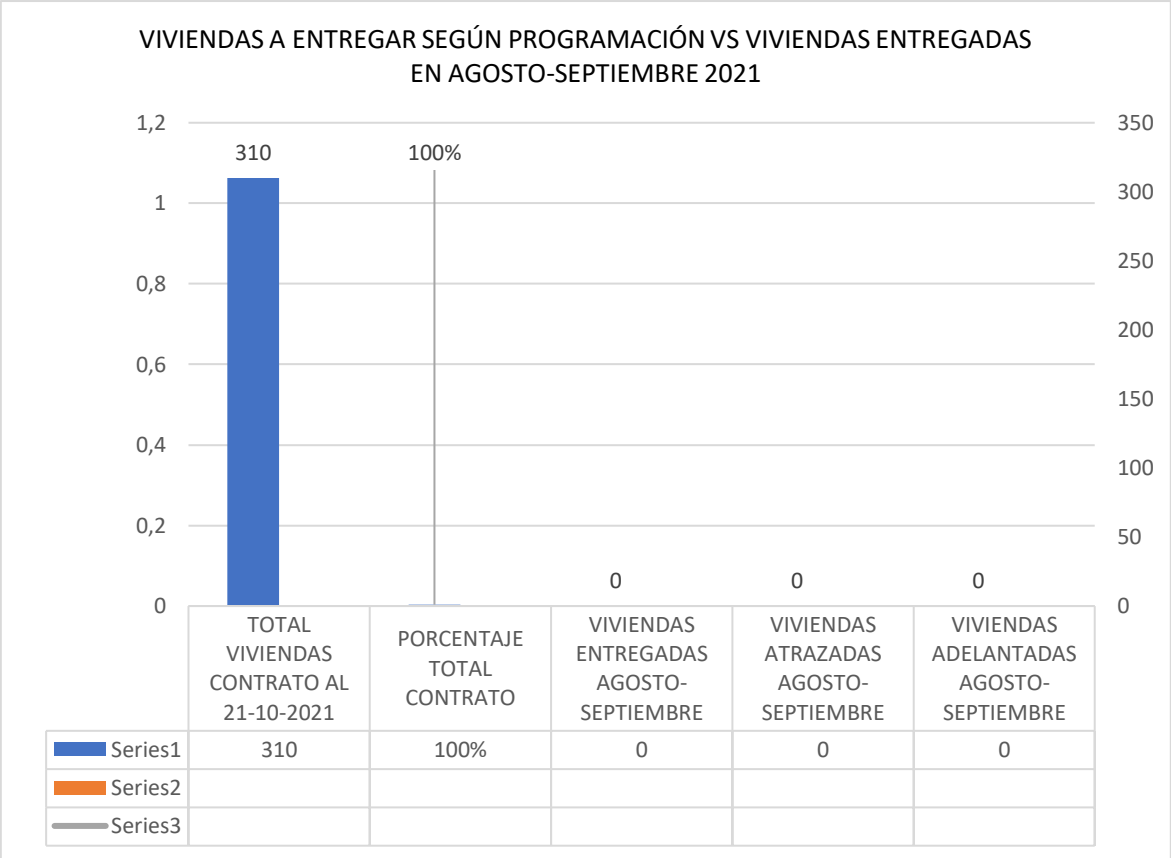

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe solo se ha gestionado el anticipo del contrato, en lo referente a cortes, no se registran pagos ni saldos pendientes.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ANTICIPO		
DIA	MES	AÑO
19	8	2021

TIPOS DE ANTICIPO	
■ ANTICIPO INICIAL	☐ ANTICIPO ADICIÓN

IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL COTRATO	CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021				
CONTRATISTA	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	NIT/C.C.	901 506 599-0	CONTRATO No.	794 DE 2021
INTERVENTOR	INPLAYCO S.A.S	NIT/C.C.	860 524 168-8	CONTRATO No.	797 DE 2021

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	$ 150.000.000,00	10%
2	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.209.122.994,00	79%
3	TRANSPORTES	$ 180.000.000,00	12%
TOTAL ANTICIPO LEGALIZADO		$ 1.539.122.994,00	100%

NOTAS: LOS PORCENTAJES SE TOMAN SOBRE EL 100% DEL VALOR DEL ANTICIPO Y ESTE ES EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUE ES $1.539.122.994

NOMBRE: MIGUEL ALEXANDER CERÓN
CARGO: CONTRATISTA OBRA

NOMBRE: GONZALO LIEVANO HOYOS
CARGO: CONTRATISTA INTERVENTOR

Primera copia - Contratista interventor
Segunda copia - Contratista de Obra

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

A la fecha del presente informe solo se ha gestionado el anticipo del contrato.

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

Al momento del presente informe solo se ha gestionado el valor del anticipo

BOGOTA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

ASUNTO: CONTRATO FIDUCIARIO No. 14299-P.A. ANTICIPO CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Como responsable designado/contratado para el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista/fideicomitente del contrato fiduciario en asunto, estoy aprobando el pago de la orden de operación 001-2021, la cual afecta el **ITEM: No. 2 COMPRA DE MATERIALES** por un valor equivalente A ($744.356.302), a nombre de **AHME CONSTRUCCIONES** ,identificado con nit 900.540.320-3 a la cuenta corriente No No. 083233593 del banco AV VILLAS.

Así mismo certificó que estos pagos corresponden a los rubros previstos en el plan de utilización/inversión del anticipo.

Atentamente



_____
GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962
INPLAYCO SAS
EMAIL: inplaycocontrato797g1@gmail.com
TLF: 3118584510

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 64

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006749527 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2021-10-31

AHME CONSTRUCCIONES S A S

Nit 900540320 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901506599 0		VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TV 21 BIS 59 57	Bogota D.C.	3112887795	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/09/2021	10/09/2021	ANGEL HUMBERTO MORENO ESPINEL	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	CEMENTO	9.809	Und.	21.470	19%	4.079	210.599.230
2	2	ARENA DE RIO	1.860	m²	122.000	19%	23.180	226.920.000
3	3	ARENA DE PEÑA	1.240	m³	90.000	19%	17.100	111.600.000
4	4	COMBO DE BAÑO CORONA	310	Und.	302.000	19%	57.380	93.620.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**642.739.230**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.120.454**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**764.859.684**
RETEFUENTE	**16.068.481**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**4.434.901**
RETEGARANTÍA	**0**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**744.356.302**

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0	0,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2021 15:19:45

Medios de Pago: Consignación bancaria

CRA 22 A No. 67-33 SUR Teléfono 9307130

Correo Electrónico ahmeconstruccionessas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 8bdf81207b351b592e0b52948610c7cdc3dcd359c6bb275ea37444dc2ac9e92e1fcc8d8e4304b566542ba371c7979918 --Fecha y Hora de Expedición : 14/09/2021 12:46:31 p. m.

7.INFORME SISO

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME MENSUAL SST** **Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO G1 - CONTRATO 797 DE 2021

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME MENSUAL
DESDE	18/08/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	1
HASTA	20/09/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

1.1 CONTRATISTA

A continuación, se realiza el resumen de las actividades planteadas y ejecutadas en el corte del primer mes de actividad que comprende del 18 de agosto de 2021 al 20 de a septiembre de 2021.

• Se Elaboran protocolos de Bioseguridad para Socializaciones para a las actividades de validación y protocolo de Bioseguridad general el cual va a ser desarrollado en el proyecto, los cuales fueron aprobados por interventoría.
• Se asistió a reunión de inicio con secretaria del Hábitat y la reunión para entrega de formatos guía de Bioseguridad
• Revisión de Seguridad Social al personal administrativo y exámenes Médicos. El personal de obra viene ingresando gradualmente y se verifica que las afiliaciones sean correctas y que cuenten con el certificado médico de aptitud, se ha realizado la inducción de manera casi personalizada, por el manejo de reuniones.
• Se programa inducción y divulgación de Protocolo de Bioseguridad al personal administrativo día 25 de agosto 2021., se diligenciaron las estadísticas de salud y se dictó la inducción.
• Elaboración del plan de manejo Ambiental
• Elaboración de Informes semanal
• Implementación de protocolo de bioseguridad en las visitas de seguimiento, por parte del personal administrativo., contratista e interventoría y operativo
• Actualización de protocolo de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.
• Entrega de chaquetas distintivas en material antifluido y carnetización al personal administrativo.
• Acompañamiento en visitas de la secretaria del Hábitat en seguimiento en el sector de Juan Pablo II
• Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, por parte del personal administrativo y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
• Inducción al personal operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y divulgación del protocolo de bioseguridad se está en la revisión de afiliaciones sal SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo proyectado para ingresar la próxima semana.
• Se hace entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios cubriendo las casas que están aperturadas al momento.
• Se realiza divulgación de protocolo de bioseguridad a Beneficiario, en compañía de la interventoría.

Adicional a esto se lleva el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, también se hace el alistamiento e instalación en cuanto a señalización para la Oficina del PAC, envasado y distribución de los Kit para beneficiario y Kit para pareja de trabajadores, estos kits son ubicados en cada una de las casas. Se ha dado respuesta a los requerimientos que la interventoría realiza a través de oficios.

En relación a los aspectos ambientales se instaló punto ecológico en el PAC, y se inicia la recolección de se hace recolección de escombros para la disposición en la Escombrera Cemex, que está autorizada por la SDA..

1.2 INTERVENTORIA

La fecha de firma del acta de inicio fue 18 de agosto de 202, día en el que se inicia la gestión de la interventoría la cual se viene adelantando en diferentes aspectos, acompañamiento y seguimientos y orientación en temas alusivos a SST, Trabajo en alturas y otros afines al área.
Se asistió a reunión de inicio con secretaria del Hábitat. (13 de agosto)

Se inician las actividades elaborando el protocolo de Bioseguridad ajustado a la resolución 777 de junio de 2021, vigente a la fecha, el cual fue radicado ante la entidad con el oficio INP-SDHT-G1-021-002 del 18 de agosto de 2021. De igual manera se revisan documentos radicados por el contratista en el oficio 003.

A nivel de oficina se socializaron los protocolos de interventoría, al personal administrativo y operativo, así mismo se inicia el diligenciamiento de las encuestas y se toman datos para elaboración de las chaquetas de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de bioseguridad. Se revisó y envió a la secretaría los protocolos del contratista y el plan de gestión ambiental presentado por el contratista con el oficio INP-SDHT-G1-021-018 del 02 de septiembre de 2021.

Seguimiento al plan de trabajo presentado por el consorcio se hace semanalmente y hasta la fecha se ha cumplido en un 100% durante las actividades de las semanas que han pasado, de las actividades totales planteadas se hace control en el informe mensual y al corte de este informe lleva un avance de 14.65% del total de actividades planteadas para el proyecto.

Se asiste a la jornada de Socialización programada para el día 25 de agosto en el salón comunal del Barrio San Pablo II, se verificó el cumplimiento de lo planteado en el protocolo de socialización. Se verificó el distanciamiento social, la limpieza de áreas, señalización, información para el correcto lavado de manos.

Se hizo entrega de los kits de bioseguridad inicial al personal de interventoría, frasco de alcohol, frasco de gel antibacterial y 04 tapabocas KN95, En septiembre también se hace entrega de tapabocas de reposición y se llenan nuevamente los recipientes, se divulgó el protocolo de Bioseguridad al personal de la oficina y se dicta charla sobre el Sistema Globalmente Armonizado al encargado del Aseo.

Se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Se generó Oficio INP-SDHT-G1-021-014 del 01 de septiembre de 2021, informando al contratista de la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución 1409 de 2012 como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional; esto a raíz que en las visitas se han detectado casos de posibles trabajos en alturas superiores a 1.50 metros. metros.

Durante la visita de seguimiento realizada por personal del Hábitat se hace acompañamiento y se dispone de los Kits de cada persona para aplicación en manos antes del ingreso y al salir de la vivienda, todas las partes utilizaron los EPP correspondientes y aplicables a estos casos.

Las charlas a interventoría han sido vía WA y generando el reporte correspondiente en físico los temas han sido variados y se describen en el cuerpo del informe.

También se hizo acompañamiento a los inicios de trabajo en las casas que fueron validadas, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios.

A raíz del oficio generado para el trabajo en alturas se trató el tema en reunión, donde el contratista, propone realizar las cubiertas "por debajo" sin necesidad de subir al tejado, se espera que entregue procedimiento para la prueba que propuso realizar; al corte de este informe no se ha recibido, razón por la cual no es procedente la realización hasta verificar las condiciones desde la perspectiva de seguridad Industrial, se reitera que si dado el caso se llega a laborar en alturas superiores de 1.5 metros se mantiene la obligatoriedad de cumplir la legislación Nacional aplicable.

Durante las visitas de seguimiento se acompaña al personal SISO del contratista en la entrega de KIT a los maestros, brindando la información de uso y reforzando con el beneficiario también sobre el uso del kit entregado a ellos; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas.

La entrega de los kits fue verificada las casas que tienen obra activa, encontrando que se hace uso y se cumplió cabalmente con las entregas y cantidades propuestas, así mismo se aprovecha para verificar el cumplimiento de trabajos seguros, uso de EPP, y aplicación de protocolos. Se encontraron condiciones inseguras en el uso de pulidoras sin guarda de seguridad por lo que se generó oficio INP-SDHT-G1-021-027 del 20 de septiembre de 2021, informando al contratista al respecto para que tome las medidas correspondientes dejando registro de las acciones tomadas.

Se asiste a reunión de socialización oficial de la “Caja de Herramientas” para manejo de formatos de Bioseguridad por parte de la Secretaría del Hábitat.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 8 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y afiliaciones al día.

2 CAPACITACION	
2 .1 CAPACITACION CONTRATISTA	
Inducción al personal administrativo sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad Divulgación de Protocolos de bioseguridad y uso correcto de tapabocas Divulgación de Protocolos de bioseguridad, charla sobre uso de epp, y orden y aseo en el lugar de trabajo Divulgación de Protocolos de bioseguridad, importancia de la vacunación	La charlas se realizaron de acuerdo al plan de trabajo
2.2 CAPACITACION INTERVENTORIA	
Divulgación de Protocolos de bioseguridad al personal de Interventoría y administrativo de oficina Inplayco SAS. Charla informativa sobre Sistema Globalmente Armonizado personal que realiza Aseo en Oficina. Uso correcto de Mascarilla, divulgación de Video OMS a través de WA Evitar las 3 C, Lugares cerrados con poca ventilación, lugares concurridos, Contacto cercano cara a cara La forma de detener la propagación. (información de la OPS). La interventoría recibió información vía WA, de cartilla recibida de la ARL positiva, "TU PROTECCIÓN NUESTRA PRIORIDAD". donde se refuerza el tema de autocuidado, uso de EPP y Bioseguridad La interventoría recibió información del uso de tapabocas durante la jornada de entrega de estos elementos (Reposición).	Charlas realizadas de manera presencial y virtual con apoyo de videos por W.A

3 Gestión Ambiental
Se recibe y se validan las actividades que están plasmadas en el documento de plan de manejo ambiental, ya que son aplicables al contrato en ejecución. se recibió impreso y foliado para entrega a la entidad. Se verifica la instalación del punto ecológico del PAC de Juan Pablo II y los recursos de prevención de COVID, como el dispensador de Gel al ingresar. Los escombros generados a la fecha de corte, se han Retirado gradualmente, se anexa recibo de la escombrera. Esta pendiente la entrega de otros soportes que no ha entregado el conductor de la volqueta, cuando se reciban se ingresan al reporte. Se solicitó al contratista agilizar en la entrega de los mismos, para ingresar en el reporte de la siguiente semana.

3.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
MENSUAL	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	6	CEMEX	Se recibe copia de vale de disposición
PROYECTO	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	6	CEMEX	Se recibe copia de vale de disposición

4. Gestión en SST (Seguridad Y Salud en el trabajo)
4.1 CONTRATISTA
Se implementaron protocolos de Bioseguridad en la Socialización en salón Comunal de Juan pablo II diligenciando los formatos establecidos. Se adquieren los elementos para dotación del PAC en cuanto a mobiliario y lo correspondiente a Bioseguridad. Implementaron protocolos de Bioseguridad en las visitas de validación por parte del personal administrativo. Se adquieren los elementos para dotación del PAC en cuanto a equipos de computo. Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las Aperturas de Viviendas por parte del personal administrativo, así como por los maestros que se les ha entregado el kit de Bioseguridad. El personal que ingreso cuenta con el uniforme correspondiente, botas, casco, gafas y guantes.

Se verifica la implementación de protocolos de Bioseguridad durante los seguimientos a las Viviendas, se viene cumpliendo por parte del personal administrativo, así como por los maestros que se les ha entregado el kit de Bioseguridad.

El personal que ingreso cuenta con el uniforme correspondiente, botas, casco, gafas y guantes.

4.2 INTERVENTORIA

Revisión de protocolos de Bioseguridad enviados por el contratista y elaboración del protocolo de interventoría.

Revisión y solicitud de ajustes a documentos como el plan de trabajo, algunos formatos y en espera de la entrega del plan de calidad.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad.

Entrega de Kit Bioseguridad a Profesionales de Interventoría en Oficina Inplayco

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad, se generó oficio recordando la obligación específica de acuerdo al anexo.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista, se continua a la espera de la entrega del plan de calidad.

Se generó oficio debido a condiciones inseguras generadas por no uso de guarda de protección en las pulidoras.

4.3. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Mensual	**5668**	**45,11**	**19,17**	**2944**	**3**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**5688**	**45,11**	**19,17**	**2944**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.3.1.Incidendentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4. Condiciones y Acciones Substandar

4.4.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Disposición de escombros para recolección	Se informa al contratista para su prota recolección	NO
2	Se evidencia el uso de pulidoras sin la guarda de seguridad	Teniendo en referencia que esta situación ya se había informado al personal y se sigue presentando, se genera oficio al contratista, para que tome las acciones necesarias.	SI

5. Registro Fotográfico

DIVULGACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA Y ENTREGA DE Kits






Divulgación Protocolo seguridad al persona de interventoría

Socialización




JUAN PABLO II

TEMA DE LA FOTO	
	
LIMPIEZA DE AREAS	TOMA DE TEMPERATURA
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
APLICACIÓN DE ALCOHOL EN MANOS	

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD









SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN LA SOCIALIZACIÓN

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 2021.	48	5688	0,0	0,0		25,58	0,00	19,53	0,00	**45,11**			0	0						
				14	2944				19,17	0,00	0,00	0,00	**19,17**			0	0						
									0	0,00	0,00	0,00	**0,00**			0	0					
									0	0,00	0,00	0,00	**0,00**			0	0					
									0	0,00	0,00	0,00	**0,00**			0	0					
									0	0,00	0,00	0,00	**0,00**			0	0					
				62	**8632**	**0**	**0**	**0,0**	**44,75**	**0,00**	**19,53**	**0,00**	**64,28**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No.797 - 2021	
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO %	14,65%
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO EN EL MES %	100,00%
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	**8.632**
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	**8.632**
No. INCIDENTES REGISTRABLES	**0**
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	**3**
No. CASOS COVID	**0**
No. DÍAS DE INCAPACIDAD POR COVID	**0**
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	**3,00**
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	**64,28**
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	**64,28**

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	**6**
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proyecto)	**0**
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	**0**
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas proyecto)	**0**
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	**0**
CONSUMO DE AGUA (m3), Proyecto	**0**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Inducción al personal administrativo sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad			
Inducción al personal de oficina sobre protocolo de Bioseguridad Charla informativa sobre Sistema Globalmente Armonizado personal que realiza Aseo en Oficina.			

INFORME SISO

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	AMBIENTAL	Escombro sin recoger, dispuesto a la entrada del MV 3433	1	1	10/09/2021	11/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 

2	AMBIENTAL	Escombro sin recoger, dispuesto a la entrada del MV 3351	1	1	15/09/2021	15/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 
3	SST	Uso de pulidora sin guarda de seguridad en los MV 3353 y mv 3191	1	0P8:P10	10/09/2021	11/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	**3,00**
TOTAL ACCIONES CERRADAS	**2,00**

INFORME SISO

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
#####												
#####												
#####												

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
#####												
RESULTADOS:					13	35	0	0	0	48	1	

INFORME SISO

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
RESULTADOS:					**13**	**35**	**49**	**0**	**48**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
RESULTADOS:					**0**	**0**	**49**	**0**	**48**	**1**	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**20 septiembre de 2021**	**PERIODO**	**MES 1**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E																	
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E																	
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E																	
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Verificacion diaria de los elementos de bioseguiridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E																	
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E																			
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E																	
Entrega de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E																	
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E																	
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS						FECHA		20 septiembre de 2021										PERIODO		MES 1			
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
Inspección botiquin	Contratista								P				P				P				P				P
Inspeción camilla	Contratista								p				p				p				p				p
Inspección Extintores	Contratista								P				P				P				P				P
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	p	p	p	p	p	p	p	p	p	P	P	P	P	P	P	P	P
diligenciamiento del formato recogida de escoombro(final entrega de vivivenda)	Contratista						E	E	p				p				p				p				p
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista																								
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista					P																			
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista					E																			
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									

P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	11	19	12	12	12	19	12	12	12	19	12	12	12	19	11	11	11	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		36,67%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				62,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	14,65%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SILLAS DEMARCADAS SOCIALIZACIÓN MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE SILLAS SOCIALIZACIÓN MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTTREGA DE REFRIGERIOS SOCIALIZACIÓN MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TOMA DE TEMPERATURA SOCIALIZACIÓN MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSTALACION DE AVISOS INFORMATIVOS COVID 19 MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TOMA DE CONDICIONES DE SALUD MES AGOSTO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TOMA DE TEMPERATURA MES AGOSTO

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO KIT BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3650		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3433		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD BENEFICIARIO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4751		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO - AREA SOCIAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2244		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REGISTRO DE CHARLAS - TRABAJADORES SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4694		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2049		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV -2411	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS ADMINISTRATIVOS HABITAT SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV - 2414	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV -2414	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV -2411	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV -3353	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL ADMINISTRATIVO SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	LAVADO DE MANOS ADMINISTRATIVOS - PAC SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TOMA DE TEMPERATURA ADMINISTRATIVOS - PAC SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TOMA DE TEMPERATURA ADMINISTRATIVOS PAC SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS EN ACTIVIDAD DE VALIDACIONES SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
2615		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS EN ACTIVIDAD DE VALIDACIONES SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
2615		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCAS SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3360		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCAS SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3360		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCAS BENEFICIARIO - DESINFECCION DE MANOS SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3396		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL PREVIO AL INGRESO SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3396		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL PREVIO AL INGRESO SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3248		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCION DE MANOS PERSONAL PREVIO AL INGRESO SEMANA 30 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2021
3248		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO KIT BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3650		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3433		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD BENEFICIARIO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4751		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DESINFECCIÓN MANOS PREVIO AL INGRESO, USO TAPABOCAS Y CHAQUETA ANTIFLUIDO - AREA SOCIAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2244		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REGISTRO DE CHARLAS - TRABAJADORES SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
4694		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT PA BENEFICIARIOS SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2049		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3669		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT POR PAREJA DE TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3669		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2277		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2413		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE EPP - EN ALISTAMIENTO SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2413		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2242		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL RECIBIENDO LA CHARLA SST SEMANA DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021
2242		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2/09/1912		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
3425		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIRDAD HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2621		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAED HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
3433		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT BIOSEGURIDAED HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2376		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRABAJADORES CON DOTACION HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2034		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRABAJADORES CON DOTACION HABITAT SEMANA 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021
2355		

	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

8. BIOSEGURIDAD

1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD

1.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

El CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 entrega protocolo de Bioseguridad general y de socializaciones para revisión por parte de la interventoría, se evidencia que cumple con lo solicitado dentro de la resolución 777 de junio de 2021 la cual está vigente.

En la reunión de socialización realizada el 25 de agosto, se aplica el protocolo y se verifica que se cumpla lo establecido dentro de la documentación enviada, así mismo se evidencia que aplican las siguientes actividades

- Encuesta de condiciones salud para los beneficiarios asistentes a la reunión (Se anexan Registro).
- Aun cuando no es solicitado dentro de la resolución 777 optaron por hacer toma de Temperatura a Beneficiario, teniendo en cuenta que muchos de los participantes en la reunión son de edad avanzada (Se anexa registro fotográfico).
- Desinfección de Sillas al inicio e intermedios de Reuniones.
- Marcado de Silletería y Piso.
- Aplicación de alcohol para los beneficiarios a la entrada a la reunión.
- Distanciamiento social.
- Elementos de Bioseguridad.
- Entrega de Refrigerios empacados.
- Instalación de afiches de prevención.

Adicional a esto también realizan:

- Divulgación de Protocolo de Bioseguridad al Personal Administrativo y operativo.
- Entrega de Kit Bioseguridad a Personal Administrativo.

Realizan el proceso de Adecuación del PAC en cuanto a Bioseguridad y SST se refiere, instalando, área de desinfección dispensador de pedal para Gel antibacterial, afiches alusivos a distanciamiento, lavado de manos, instalación de botiquín Primeros auxilios básico, jabón, toallas de papel, punto ecológico.

El contratista registra los elementos utilizados y los kits entregados a beneficiarios y obreros, en los formatos que fueron entregados por el hábitat, de igual manera lo hace la interventoría, en los formatos pertinentes a su alcance.

1.2 POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La empresa Inplayco SAS, dentro de sus obligaciones contractuales y su compromiso con la seguridad del personal y los temas relacionados con Bioseguridad, hizo entrega a la Secretaría del Hábitat del protocolo de Bioseguridad que va a ser aplicado en el periodo del contrato 797 de 2021.Radicado oficio INP-SDHT-G1-021-002 del 18 de agosto de 2021.

Dentro del documento se describen las actividades a realizar además del seguimiento de la aplicación del protocolo del contratista de las cuales se ha diligenciado el respectivo registro


para el control de las partes interesadas.

Las siguientes son las actividades realizadas en el periodo comprendido del 18 de agosto de 2021 al 20 de septiembre de 2021.

- Elaboración del Protocolo de Bioseguridad aplicable al contrato y radicación ante la secretaria del Hábitat.
- Divulgación del protocolo al personal de la Interventoría y en general al personal de la empresa.
- Charla sobre el Sistema Globalmente Armonizado para el personal que maneja el tema referente al Aseo de las oficinas
- Entrega de Kits al personal de la interventoría que estará en el proyecto.
- Charlas informativas semanales. Las cuales por tema de evitar reuniones se realizan ocasionalmente presencial y otras son referidas a través de medios electrónicos recogiendo las firmas entre los compañeros durante la semana.
- Seguimiento a las entregas de Kits a beneficiario, obreros, personal administrativo por parte del contratista y cumplimento al plan de trabajo presentado.
- Suministro y reposición de elementos del Kit para los profesionales de interventoría.


1.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO

Del total de las actividades programadas para el proyecto se han ejecutado 40 lo que equivale al 14.65%.

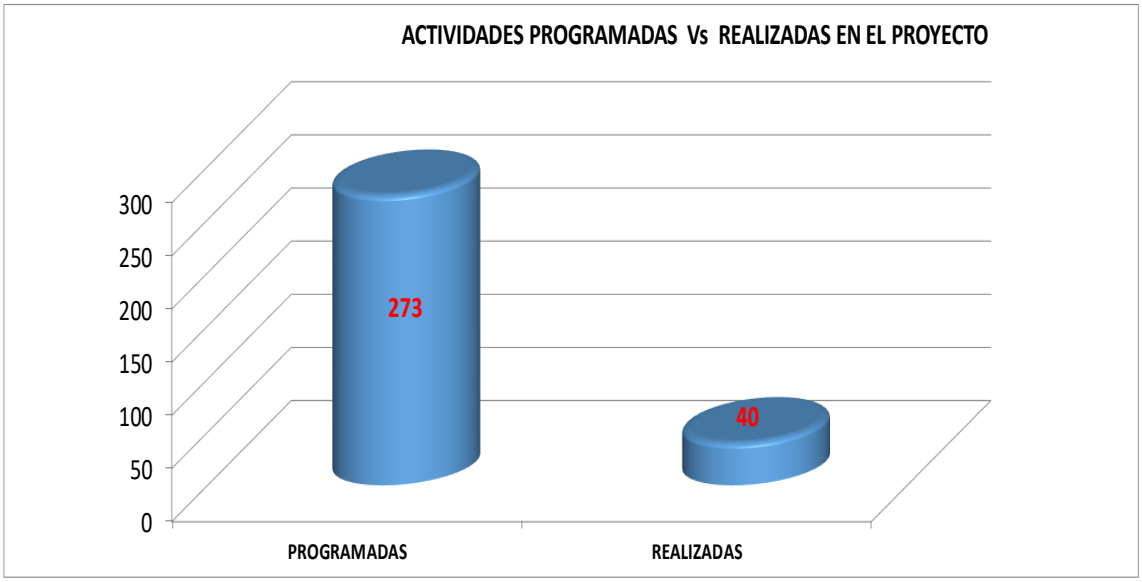


Fuente: SST

La distribución de estas actividades por semana se muestra a continuación:
El periodo inicia en la semana 3 del mes de agosto, cumplidas las actividades al 100%

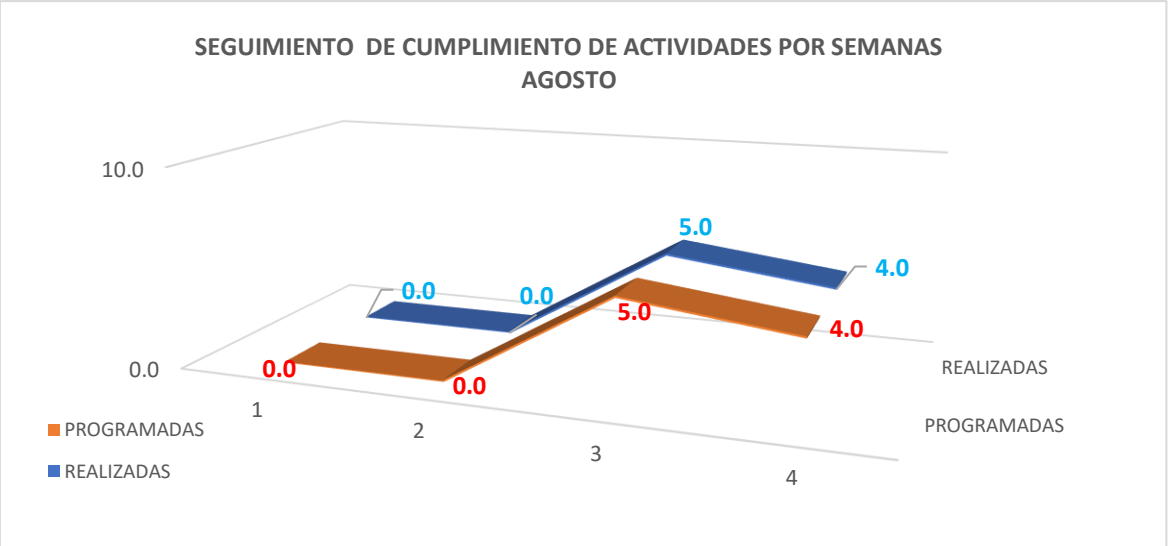


Fuente: SST

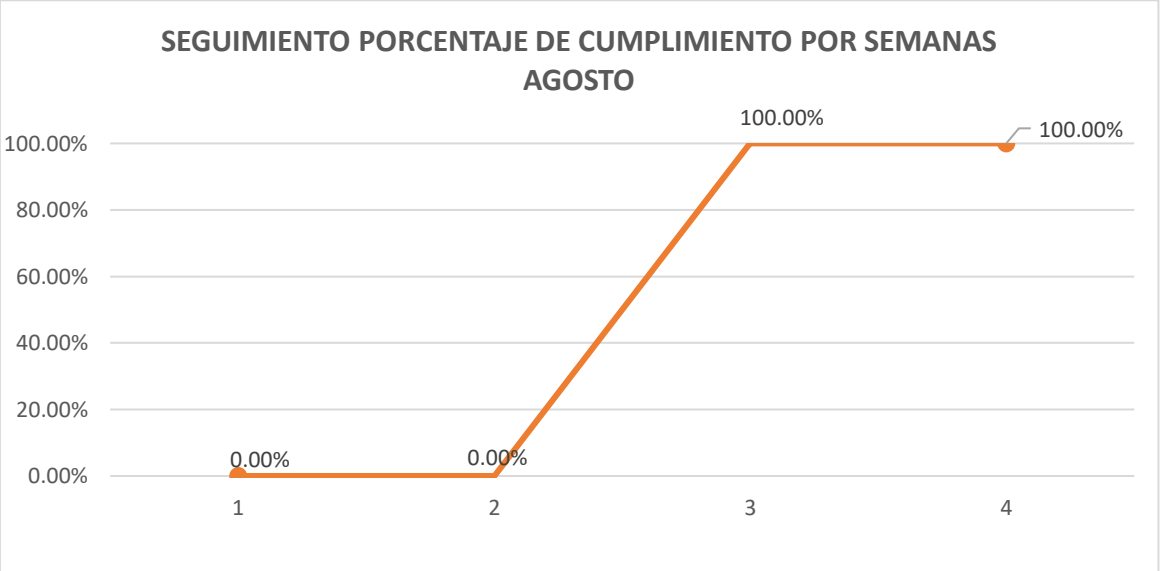


Fuente: SST

Para este corte corresponde las semanas 1, 2, 3 del mes de septiembre, la semana 4 corresponderá al siguiente corte, esto debido a la fecha de firma del acta de inicio que fue el 18 de agosto.

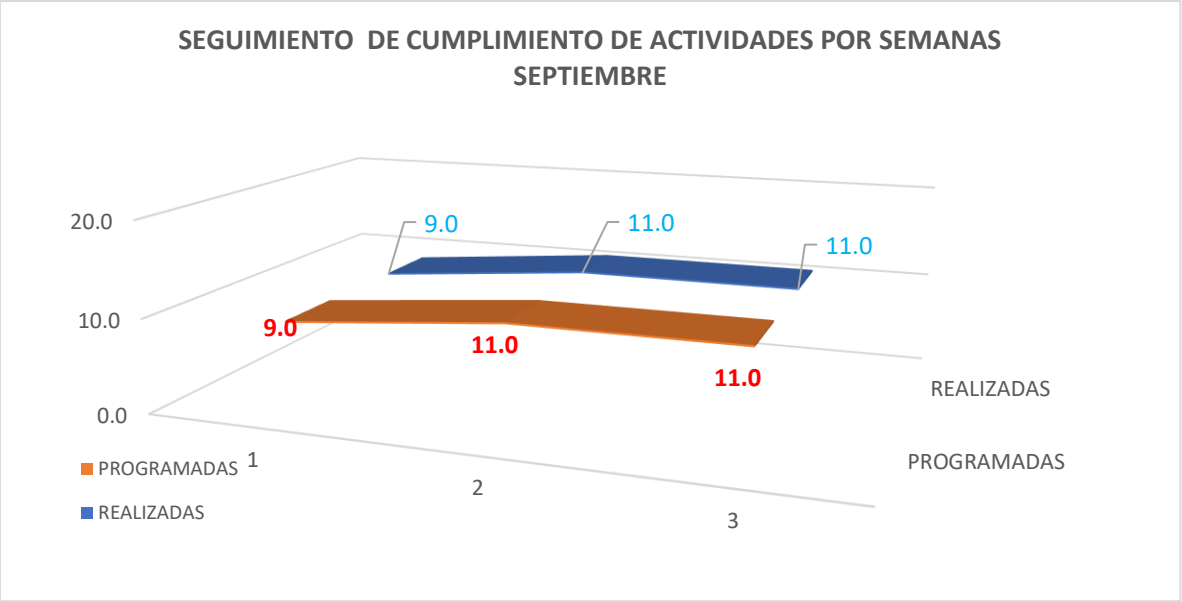

Fuente: SST

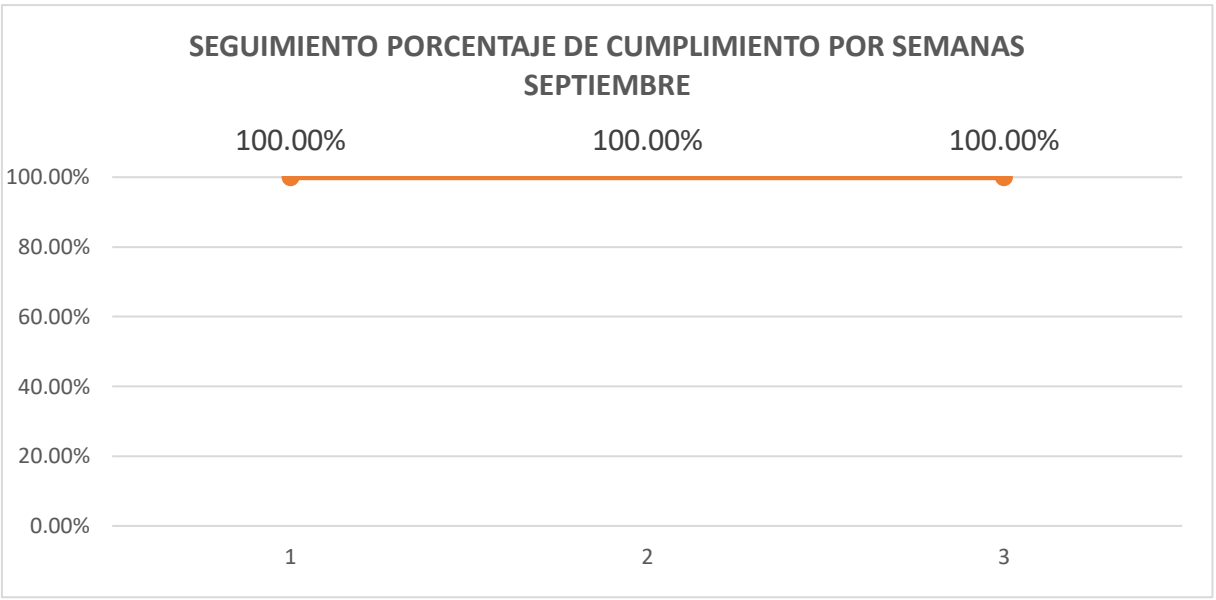

Fuente: SST

ROBERT ROJAS TORRES
Profesional SST
Residente interventor SISO

9. ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA

10. ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA

11. ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA

12. ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA
