BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20216100363103

Bogotá D.C. 2021-09-24

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES**

ASUNTO: Envío corte 6 del contrato de obra 2940 de 2020 expediente 2021800701600088E .

Por la presente se envía corte 6 del contrato de Obra 2940 de 2020 suscrito con la empresa MAQUINAS Y GRAMAS LTDA.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Subdirector Técnico de Parques.

Anexos: 394 folios
Copia: N/A

Elaboró: Jose a. Varela -. Contratista subparques
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

Fecha de firmado: 2021.09.24 17:13:12 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS

ASSERING
Diseño, Desarrollo e Ingeniería

NIT: 900.101.463-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta los documentos presentados por el contratista MAQUINAS Y GRAMAS LTDA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, y una vez realizada la revisión del Acta de recibo parcial No 6 presentado por el Contratista correspondiente al periodo 01 de Julio de 2021 al 30 de Julio de 2021, se autoriza el pago correspondiente al periodo 01 de julio de 2021 al 30 de julio de 2021, según las estipulaciones contractuales numeral 4 del contrato, correspondiente a Pagos.

Contrato:	No. 2940 de 2020
Tipo de Contrato:	Contrato de obra
Contratista:	MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
Cédula o NIT	No. 800.0236.455-3
Objeto:	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2021.09.27 11:28:32 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Plazo Inicial del contrato: CUATRO (04) MESES
Prorroga 1: 61 DIAS
Plazo Final del contrato: SEIS (06) MESES

Fecha Iniciación: 01 DE FEBRERO DE 2021
Fecha de Terminación: 30 DE JULIO DE 2021

Valor inicial del contrato: $ 500.000.000.oo
Adición 1 : $92.000.000.oo
Valor total del contrato: $ 592.000.000.oo

Valor a Pagar Discriminado así:

ACTA GRUPO 2		
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$	34.221.801,oo
AIU 29 %	$	9.924.322,oo
TOTAL OBRA +AIU EJECUTADO	$	44.146.123,oo
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	0,oo
SALDO A LIQUIDACION PRESENTE ACTA 10 %	$	4.414.612,oo
VALOR NETO A PAGAR	**$**	**39.731.511.oo**

Valor total neto pagar: $39.731.511

(CORTE 6).

VALOR CORTE 6: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MCTE

En constancia se firma a los dos (02) días del mes de Agosto de dos mil veintiuno (2021).

GILDARDO LLANO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
ASSERING SAS

MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA

NIT: 800236455-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 3 63 34 TO 2 AP 301 UR PUENTE BLANCO IV, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3205425109

Email. magramas.facturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764001604551 válida desde 2020-08-03 hasta 2021-08-03 rango desde NFEV1 hasta NFEV500.

Diseño - Recuperación - Construcción - Mantenimiento de Campos de Golf y Escenarios deportivos - Alquiler de Maquinaria

Cliente:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT:	860061099
Dirección:	CL 63 59 A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6605400
Email:	contabilidad@idrd.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	12/08/2021
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NFEV83**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:32:30**
FECHA FIRMADO:	**02/08/2021 12:32:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	08	2021	12	08	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	40	ACTA PARCIAL 6to CORTE CONTRATO DE OBRA No. 2940 GRUPO 2 CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, EL MTTO, ADECUACIÓN, Y MEJORAMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEP. EN GRAMA NATURAL Y SINTETICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C	WSD	1,00	$34.221.801,00		0,00	$34.221.801,00
2	37	A.I.U	WSD	1,00	$9.924.322,00		0,00	$9.924.322,00

DESCUENTOS Y CARGOS G

No.	TIPO	CÓDIGO		%	MONTO
1	Descuento	02 - Descuentos contractuales	RETEGARANTIA	10,00	$4.414.612,00

Notas:

SON: (treinta y nueve millones setecientos treinta y un mil quinientos once pesos)

CUFE: d8aa3f3dd2d556f105dad096ea61a5f4fe3b0c954f701d657332412ee1e9b4842b1176c48adfc465e9c253e1e4b9e217

Subtotal:	$44.146.123,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$44.146.123,00
Descuentos globales:	$4.414.612,00
Total:	$39.731.511,00

Firma Digital:

OqOASoetbqhbWvrDkPrayTSySWfP7Xtnki/HPuOXuPY1tONPBZjhqkz5xMOGxPZ8FRvuV9WUG4yyrJcoIrXl6NChRM8/Djd5PQ1OmBHK+rZ8SWU3O27wo+4dpmaK6cCoAKOaAeniX6ZCThsP/vS5/8SSTQPNeJgcCVW83nlpRQexDQC
S3XYdPkSNplamCAhqdJmaUCA8RmGmtNv1QhWscYWB+cB0ZXqGgdi1iTqRR0KFPmG/sSZ/ys8CcfRi7jsYnGn8vVScYWpUOtEI+hb1vvgcyveVHPr1SNbZeKJ0ztCr81XuqJlV/oaBICMYl41m50QB9ATJg2KUDbIk4lo+A==

Calle 3 # 63 - 34 Int 2 Apto 301 Urb Puente Blanco IV
Cali - Valle
Celulares : 315 731 30 95 - 315 723 38 47 - 316 269 93 37

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

ACTA DE RECIBO PARCIAL 6 (Nº Acta)

CONTRATO No 2940 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

FECHA			
02	AGOSTO		2021
dd	mm		aaaa
Página	1	de	2

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica mantenimiento,consultoria Convenio)

SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(Sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL CUATRO (4) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO - PRORROGA 1 DOS (2) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO - PRORROGA 2 DOS (2) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO OCHO (8) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 500.000.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

VALOR ADICION 1 CONTRATO $ 92.000.000,00

VALOR ADICION 2 CONTRATO $ 92.000.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 684.000.000,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S

(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN Arq. JOSE ALBERTO VARELA

(Nombre de la persona designada por el supervisor para coordinar actividades)

SUPERVISOR (CONVENIO) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONZO

(Escriba el nombre del supervisor designado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los DOS (Día en letras) 02 (día en #) . días del mes de AGOSTO (mes en letras) de 2021 (año) se reunieron:

SALVADOR PINZON GALVIS (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

GILDARDO LLANO BERNAL (Nombre representante legal de LA INTERVENTORÍA) actuando como representante Legal de la INTERVENTORIA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE RECIBO PARCIAL

6
(Nº Acta)

CONTRATO No 2940 **DE** 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

FECHA			
02	AGOSTO		2021
dd	mm		aaaa
Página	2	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No. [redacted] 6 [redacted] **PERIODO** [redacted] del [redacted] 1/07/21 [redacted] al [redacted] 30/07/21 [redacted]

(En este lugar se consigna cómo usan financiera del contrato. Cuando el contrato comprende intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, rubros cambios, pagos y valores por pagar), anexando todos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$ 500.000.000,00
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$ 150.000.000,00
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 92.000.000,00
Valor actual del contrato	$ 592.000.000,00
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ 0,00
Total anticipo pagado	$ 150.000.000,00
Consultoría ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 0,00
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$ 547.852.960,00
Pagos efectuados por concepto de consultoría ejecutada hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$ 0,00
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al ____80%)	$ 493.067.664,00
Saldo de contrato pendiente por pagar	$98.932.336,00
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$150.000.000,00
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$0,00
Saldo a liquidación según 10%	$54.785.296,00
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$44.146.123,00
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$0,00
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$4.414.612
IVA (Sobre consultoría)	$0,00
Total a pagar presente acta	39.731.511

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y generalidades de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1	
2	

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener relación de actividades o trabajos realizados (no todos, de ellos, se anexa, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados, en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	(Presentación física de los trabajos realizados, como soporte de la acta parcial: estudios, diseños, memorias, etc. Para el caso de elaboración de consultoría)
Cuadro de cantidades de obra	X	(Cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(Deben venir acompañadas de planos debidamente con indicación clara de las obras pagadas \Saldos a pagar en presente acta \Saldos iniciales previstos \Saldos faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

DOS (día en letras) **02** (día en números) días del mes de **AGOSTO** (mes en letras) de **2021** (Año)

(Firma)
(Nombre) SALVADOR PINZON GARVIS - C.TO 2940 DE 2020
Contratista
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) Ing. GILDARDO LLANO - CONTRATO No. 2944 DE 2020
Interventor
Representante Legal

(No firma)
(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONZO
Supervisor

(Firma)
(Nombre) Arq. JOSE ALBERTO VARELA
Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

RUT

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701795171

(415)7707212489984(8020) 000001470179517 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 6 4 5 5	3	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA

36. Nombre comercial
MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 3 63 34 TO 2 AP 301 UR PUENTE BLANCO IV

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
magramas.colombia@gmail.com		6 8 0 2 8 0 5	3 1 5 7 2 3 3 8 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	1 9 9 4 0 7 2 5	0 1 6 1	2 0 1 2 0 9 2 5	4 2 9 0	7 7 3 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 19 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
Informante de exogena
Productor de bienes y/o servicios exen

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 05 / 09 : 32: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, ATLANTICO, 09/02/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA** con NIT **800.236.455-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 476369999901

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

7

y Gramas Ltda

Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural

www.maquinasygramas.com

Diseño – Recuperación – Construcción – Mantenimiento de Campos de Golf y Escenarios deportivos
Alquiler de Maquinaria

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de ***MAQUINAS Y GRAMAS LTDA,***, identificada con Nit ***800 236 455 – 3*** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ***CALI*** me permito certificar que de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en ***CALI***. a los (29) trece días del mes de ***JULIO*** del ***2021.***

Cordialmente,


Salvador Pinzo Galvis
Representante legal Maquinas y Gramas Ltda

Maquinas y Gramas Ltda

Salvador Pinzón G.
Gerente General
Cel: 315 731 30 95
gerencia@maquinasy gramas com

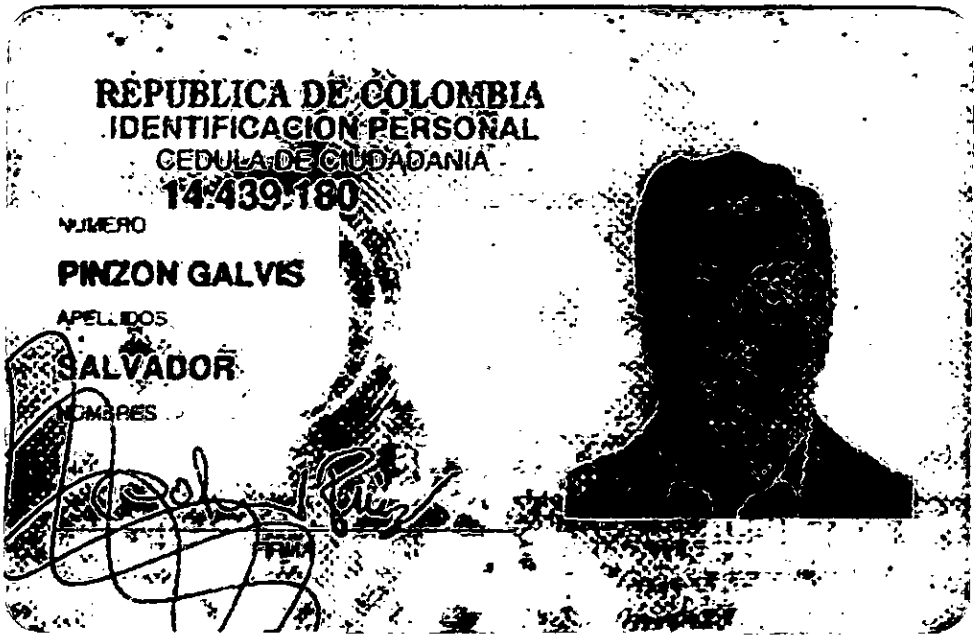

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.439.180
NUMERO
PINZON GALVIS
APELLIDOS
SALVADOR
NOMBRES

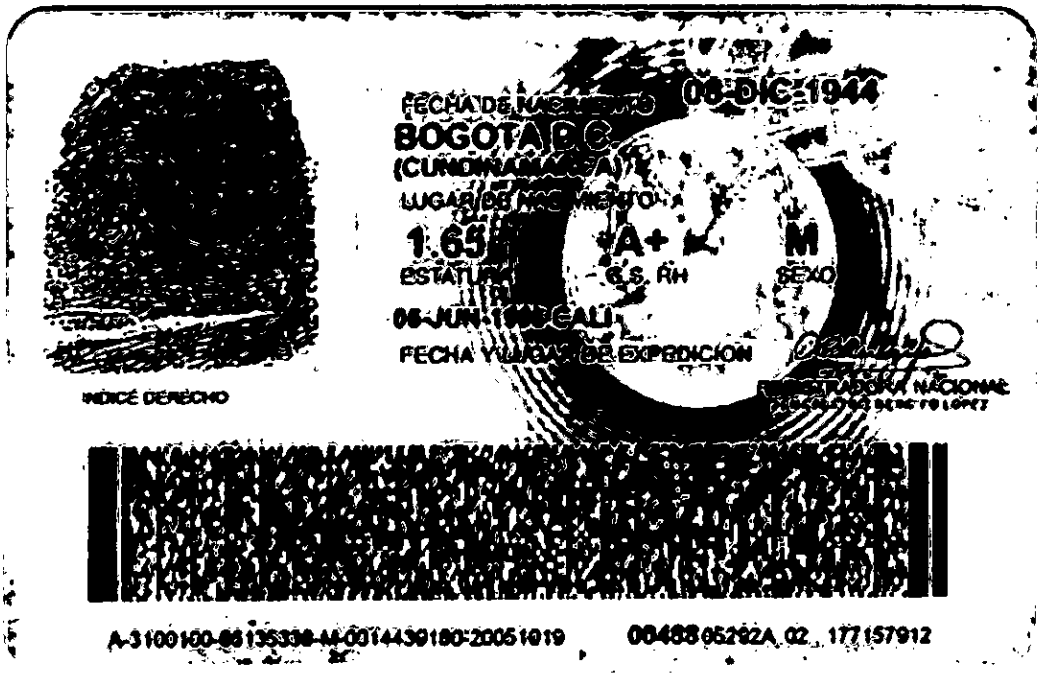

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1944
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
06-JUN-1963 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

A-3100100-08135338-M-0014439180-20051019 00468 05292A 02 177157912

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800236455
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA30#3A-52VILLACAMP.T3-	TELÉFONO:	3864384
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de paisajismo y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7802973006**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1049533474

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 4.204.900
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 607.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 4.812.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	3	$ 2.327.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 214.400
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2	$ 1.552.500
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 41.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 106.500
		SUBTOTAL:	13	**$ 4.242.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 800.000
890102002	CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	10	$ 1.062.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.862.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 486.600
		SUBTOTAL:	13	**$ 486.600**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 560.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 840.000
		SUBTOTAL:		**$ 1.400.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 12.803.500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLI IDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	CALLE 140 A No. 103B-09	7026556	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-07	2021-06	E	12/07/2021	51745616	$2.226.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	168.000	0	0	0	0	0	0		168.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	305.400	0	0	0	0	0	0		305.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	520.000	0	0	0	0	0	0		520.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	448.200				448.200	0	0	448.200			4.482	448.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	296.400	0	0	296.400	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	296.400	296.400
Pensión	4	1.185.400	1.185.400
Riesgos Laborales	1	448.200	448.200
CCF	1	296.400	296.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.226.400	2.226.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL' IDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087132-6	INGENIERIA CMC SAS		CALLE 140 A No. 103B-09	7026556	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	12/07/2021	51745616	$2.226.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015398839	SABOGAL CUERVO EVA YURANY	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	1	5.500	CCF24	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	1023914800	VARGAS LEON DIEGO FERNANDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1233890527	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	5855002	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	1	0			S											I						231001	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS002	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	87.000	CCF24	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
CC	80757973	SABOGAL CUERVO JUAN MANUEL	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	80763102	LASSO CORTES DAWSON	1	0			S											I						25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GRUPO 2 CORTE 6

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (+) y menos(-) CANT [d]	DIFERENCIAS (+) y menos(-) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		RESUMEN																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mt2)				739.914												
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND	-	-	74.655	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	18	7.920	141.572	129	18.202.788	147	20.811.084	21	2.973.012	147	20.811.084	100,00%	3,5000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND	-	-	344.195	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UND	-	-	14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	478	13.609	6.477.884	50	680.450	528	5.797.434	87	1.183.993	428	5.797.434	100,00%	0,9800%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	454	204.841	93.461.814	81	9.231.301	515	77.693.115	107	16.136.567	515	77.693.115	100,00%	13,1200%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL				13.712.882												
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	-	-	26.614	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	-	35.693	35.693	1	27.464	1	27.464	-	-	1	27.464	100,00%	0,0037%	-	$ -
017	12468	Vareuitter + ayudante **	M2	252.357	411	107.832.871	7.505,91	3.083.393	259.864	110.926.381	-	-	259.864	110.926.381	100,00%	10,7403%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	10.843	134	1.452.933	58.908,80	7.940.805	69.401	9.259.708	11.259	1.513.905	69.401	9.259.708	100,00%	1,2700%	-	$ -
020	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	-	2.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL				478.577												
001	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UND	-	-	48.630	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UND	-	-	14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	46	13.609	625.814	3	40.827	49	666.641	9	122.481	49	666.641	100,00%	0,1100%	-	$ -
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	45	120.077	5.523.542	3	360.231	48	5.883.773	9	1.080.693	48	5.883.773	100,00%	0,9500%	-	$ -
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	-	141.572	-	23	3.256.156	23	3.256.156	5	707.860	23	3.256.156	100,00%	0,5300%	-	$ -
006	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UND	-	139.877	-	2	279.754	2	279.754	2	279.754	2	279.754	100,00%	0,0500%	-	$ -
11		MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY				812.487												
001	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	-	13.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UND	60	784.066	47.043.960	12	9.408.792	72	56.452.752	13	10.197.808	72	56.452.752	100,00%	9,5400%	-	$ -
003	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UND	-	14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
12		MTO. PISTA DE LANZAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO UDS (AREA AP				288.375												
001	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UND	-	139.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UND	-	14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.000	2	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,0300%	-	$ -
004	12514	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UND	-	120.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -

9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)	COCTO=	$ 243.347.257		$ 56.033.859		$ 302.349.076		$ 34.221.801		$ 302.349.076	100%	51,07%		$ -
		A.I.U	29,00%	$ 70.570.707		$ 17.110.235		$ 87.680.942		$ 9.924.322		$ 87.680.942				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)		$ 313.917.974		$ 76.111.044		$ 390.029.018		$ 44.146.123		$ 390.029.018				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -		
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -		
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)		$ 313.917.974		$ 76.111.044		$ 390.029.018		$ 44.146.123		$ 390.029.018	100%	66%		$ -		

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
del	mes	anno
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 508.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 382.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y (-) CANT	DIFERENCIAS (+) y (-) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c] = [a] x [b]	[d]	[e] = [c] x [d]	[f] [a]+[d]	[g] = [f] x [b]			[h]	[i] = [g]	[j] = [h] / [f]	[k] = [h] / [CTO]	[l] = [a] - [h]	[m] = [l] x [b]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122123	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2	-	780	-	200.725,57	156.565.945	200.725	156.565.945	-	-	200.725	156.565.945	100,00%	28,4503%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-	-	-			-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		156.565.945,0		156.565.945,0		-		156.565.945,0	100%	28,45%		-
		AIU	29,00%			-		45.404.124,0		45.404.124,0		-		45.404.124,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (ítems adicionales)				-		201.970.069,0		201.970.069,0		-		201.970.069,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		201.970.069		201.970.069		-		201.970.069	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+B)				343.347.257		215.566.754		458.914.071		34.221.631		458.914.071				-
		AIU	29,00%			70.570.707,0		62.514.358,0		133.085.065,0		9.934.322,0		133.085.065,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				313.917.974		278.081.113		591.999.083		44.148.123		591.999.083				-
		VR APROBADO DEL CONTRATO																
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	30%			94.175.392		55.834.608		150.000.000				150.000.000				
		RETEGARANTIA	10%			31.391.797		27.808.111		59.199.908		4.414.812		59.199.908				
		IVA																
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				188.350.785		194.448.394		382.799.178		39.731.311		382.799.178				
(C)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 917,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY ESPERATO GONZALEZ
Director de Obra
Contrato 29[illegible] de 2020

15

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
del	mes	anno
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000 No. Inicial parques por intervenir: 45 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% obra del ítem	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		SAN CRISTOBAL ESTADIO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mts2)			739,814													
001	12517	Demarcacion con tatco cancha fútbol **	UND		74,885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND	9	141,572	1.132.576	2,00	283.144	10	1.415.720		-	10	1.415.720	100,00%	0,2400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344,195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.alt. UDS)*	UND		14,512	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	18	13,609	217,744	2,00	27,218	14	193,526	2	27,218	14	193,526	100,00%	0,0033%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150,841	2.413.456	2,00	301.682	14	2.111.774	2	301.682	14	2.111.774	100,00%	0,3600%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13,712,882													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-8m3-S.Blando	M3		26,514	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
015	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrata)	M2		6,013	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.084	411	2.738.904		-	6.084	2.738.904		-	6.084	2.738.904	100,00%	0,4600%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
048	106087	Vale Excavación RCD- Tierra (V.8m3)	M3		5,229	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			COSTO=	$ 6.532.680		-$ 45.759		$ 6.486.924		$ 338.033		$ 6.486.924	100%	1,0%		$ -
		A.I.U			25,00%	$ 1.665.777		-$ 13.209		$ 1.672.568		$ 86.381		$ 1.672.568				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				$ 8.388.457		-$ 59.025		$ 8.329.432		$ 424.281		$ 8.329.432				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 8.388.457		-$ 59.025		$ 8.329.432		$ 424.281		$ 8.329.432	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+negativos (+) y sobrantes(-)) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	127125	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-		-		-		-		-	0,00%	0,000000%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,000000%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		A.I.U			29,00%	-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítems + AIU PARQUE 1 (ítems adicionales)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=H)				8.522.000		-45.750		8.476.934		308.500		8.476.934				-
		AIU			29,00%	1.865.777,0		-13.268,0		1.872.509,0		95.381,0		1.872.509,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				8.388.457		-59.025		8.329.432		424.281		8.329.432				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 563.678.568,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Arq. [illegible]
Director [illegible]
Contrato 29[illegible] de 2020



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN CRISTOBAL ESTADIO	16/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato original)

VR. INIC. CONTRATO: $ 530.000.000 VR. ADICIONES $ 52.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Parcial Directo (c=)	DIFERENCIAS (negativo (-) y aumento(+)) CANT (d)	DIFERENCIAS V/r Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS V/r Parcial Directo (g)	ACTA No. 9 CANT (h)	ACTA No. 9 V/r Parcial Directo (i)	ACUMULADO CANT (j) (h)	ACUMULADO V/r Parcial Directo (k)	% ejec del ítem (j / f)	% ejec del CTO (j / a)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR V/r Parcial Directo (m)
		PARQUE NACIONAL																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNO		74.685	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNO		141.572	-	6,00	848.432	6	848.432	1	141.572	6	848.432	100,00%	0,140%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNO		344.105	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación óvoto -trozos cesped- (est.sil. UOS)**	UNO		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,003%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	2,00	301.682	12	1.810.092	2	301.682	12	1.810.092	100,00%	0,310%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Ítems originales)			COCTO=	$ 1.644.500		$ 1.178.332		$ 2.822.832		$ 470.472		$ 2.822.832	100%	0,48%		$ -
		A.I.U			29,07%	$ 476.605		$ 341.716		$ 818.321		$ 136.437		$ 818.321				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Ítems originales)				$ 2.121.105		$ 1.520.048		$ 3.641.453		$ 606.909		$ 3.641.453				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Ítems originales)				$ 2.121.105		$ 1.520.048		$ 3.641.453		$ 606.909		$ 3.641.453	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y (-) CANT	DIFERENCIAS (+) y (-) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122122	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	5.851	4.563.780	5.851	4.563.780		-	5.851	4.563.780	100,00%	0,770%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
(C)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		4.563.780,0		4.563.780,0		-		4.563.780,0	100%	0,77%		-
		AIU			29%	-		1.323.495,0		1.323.495,0		-		1.323.495,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base adjudicación)				-		5.887.276,0		5.887.276,0		-		5.887.276,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		5.887.276		5.887.276		-		5.887.276	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				1.844.000		5.742.117		7.386.612		470.472		7.386.612				-
		AIU			29%	478.920,0		1.663.312,0		2.142.117,0		136.437,0		2.142.117,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado + por ejecutar)				2.121.485		7.407.324		9.528.729		606.909		9.528.729				-
(D)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 692.471.271,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FELIPE DEL CASTILLO
Director
Contrato 2940 de 2020

END

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PARQUE NACIONAL	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 294D DE 2020 SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIDB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Diseño (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Diseño (c=)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Diseño (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Diseño (g)	ACTA No. 6 CANT (h)	ACTA No. 6 Vr Parcial Diseño (i)	ACUMULADO CANT (j)	ACUMULADO Vr Parcial Diseño (k)	% ejec del item (k/g)	% ejec del CTO (k/c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Diseño (m)
		CIUDAD MONTES FUTBOL																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con tatco cancha fútbol **	UND		74.685	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	848.432	6	848.432	1	141.572	6	848.432	100,00%	0,146%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UND		344.195	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.sti, UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	4,00	54.436	14	190.526	2	27.218	14	190.526	100,00%	0,033%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	4,00	603.364	14	2.111.774	2	301.887	14	2.111.774	100,00%	0,363%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-4m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
017	12458	Verticutter + ayudante **	M2	5.200	411	2.141.200		-	5.200	2.141.200		-	5.200	2.141.200	100,00%	0,370%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
5		RED DE RIEGO MANUAL			1.503.776													
001	12463	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	ML		13.648	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12462	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	ML		10.167	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
003	12461	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	ML		7.282	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12460	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	ML	100	6.733	673.300		-	100	673.300		-	100	673.300	100,00%	0,116%	-	$ -
005	12459	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML		4.943	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			COCTO=	$ 4.479.000		$ 1.537.232		$ 5.906.892		$ 470.472		$ 5.906.892	100%	1,01%		$ -
		AIU			29,07%	$ 1.299.101		$ 437.027		$ 1.736.159		$ 136.437		$ 1.736.159				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				$ 5.778.761		$ 1.944.329		$ 7.723.091		$ 606.909		$ 7.723.091				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 5.778.761		$ 1.944.329		$ 7.723.091		$ 606.909		$ 7.723.091	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:


ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]=[a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]=[h]/[a]	[k]=[h]/[a]*[b]	[l]	[m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ADOCRETA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	5.260	4.102.800	5.260	4.102.800		-	5.260	4.102.800	100,00%	0,0000%	-	$ -
															0,00%	0,0000%	-	$ -
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		4.102.800,0		4.102.800,0		-		4.102.800,0	100%	0,59%		-
		A.I.U			29,0%	-		1.189.812,0		1.189.812,0		-		1.189.812,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS (costo + AIU PARQUE 1 (Base adquisición)				-		5.292.612,0		5.292.612,0		-		5.292.612,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		5.292.612		5.292.612		-		5.292.612	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				4.478.053		5.810.032		10.288.085		470.472		10.288.085				-
		AIU			29,0%	1.298.101,0		1.826.938,0		3.125.039,0		136.437,0		3.125.039,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				5.778.781		7.236.941		13.015.703		606.909		13.015.703				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 573.984.297,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoría

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDAD MONTES / FUTBOL	9/07/2021 / 23/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (Negativos (-) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j] = [h]/[a]	[k] = [h]/[f]	[l] = [a]-[h]	[m]
		CIUDAD MONTES SOFTBAL																
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.882													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
008	100000	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR		113.472	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	8	54.269	434.152		-	8	434.152		-	8	434.152	100,00%	0,0492%	-	$ -
010	101784	VIBROCOMP. BENTIN 1,5TON(Oper+Comb)**	HR		28.339	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Vertquitter + ayudante **	M2	3.908,44	411	1.831.440		-	3.908	1.831.440		-	3.908	1.831.440	100,00%	0,2080%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressang + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1.400	134	187.600	8.400	1.125.600	9.800	1.313.200	2.800	375.200	9.800	1.313.200	100,00%	0,2237%	-	$ -
020	12154	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG		2.183	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
021	15259	Estructura marco futbol (aumel e inata) [DRD	JGO		3.845.473	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL			478.577													
001	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UND		48.630	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.sti. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	10	13.609	136.090	4,00	54.436	14	190.526	2	27.218	14	190.526	100,00%	0,0000%	-	$ -
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	10	120.077	1.200.770	4,00	480.308	14	1.681.078	2	240.154	14	1.681.078	100,00%	0,2906%	-	$ -
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,1440%	-	$ -
006	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UND		139.877	-	1,00	139.877	1	139.877	1	139.877	1	139.877	100,00%	0,0237%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)		COSTO=		$ 3.501.052		$ 2.848.853		$ 6.230.705		$ 924.021		$ 6.230.705	100%	1,05%		$ -
		A.I.U		29,00%		$ 1.041.115		$ 769.309		$ 1.810.514		$ 267.955		$ 1.810.514				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 4.831.167		$ 3.418.052		$ 8.049.219		$ 1.191.987		$ 8.049.219				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 4.831.167		$ 3.418.052		$ 8.049.219		$ 1.191.987		$ 8.049.219	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

No. Inicial parques por Intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques Intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (Incrementos (+) y decrementos(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g] = [b]x[f]	[h]	[i] = [b]x[h]	[j] = [f]+[h]	[k] = [b]x[j]	[l] = [k]/[g]	[m] = [k]/C70	[n] = [a]-[j]	[o] = [b]x[n]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	3.908,44	3.035.163	3.908	3.035.163		-	3.908	3.035.163	100,00%	0,309%	-	-
								-		-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	-
(E)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		3.035.163,0		3.035.163,0		-		3.035.163,0	100%	0,31%		-
		A.I.U		29,17%		-		887.887,0		887.887,0		-		887.887,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (Base retención)				-		3.924.050,0		3.924.050,0		-		3.924.050,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		3.884.859		3.884.859		-		3.884.859	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (A+B)				3.500.037		3.745.816		6.335.808		924.021		6.335.808				-
		AIU		29,17%		1.041.113,0		1.666.387,0		2.707.422,0		257.165,0		2.707.422,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				4.831.167		7.412.103		12.043.270		1.181.987		12.043.270				-
(G)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 979.729.730,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de Interventoria

Arq. KAROLAYDA HERRERA
Director de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

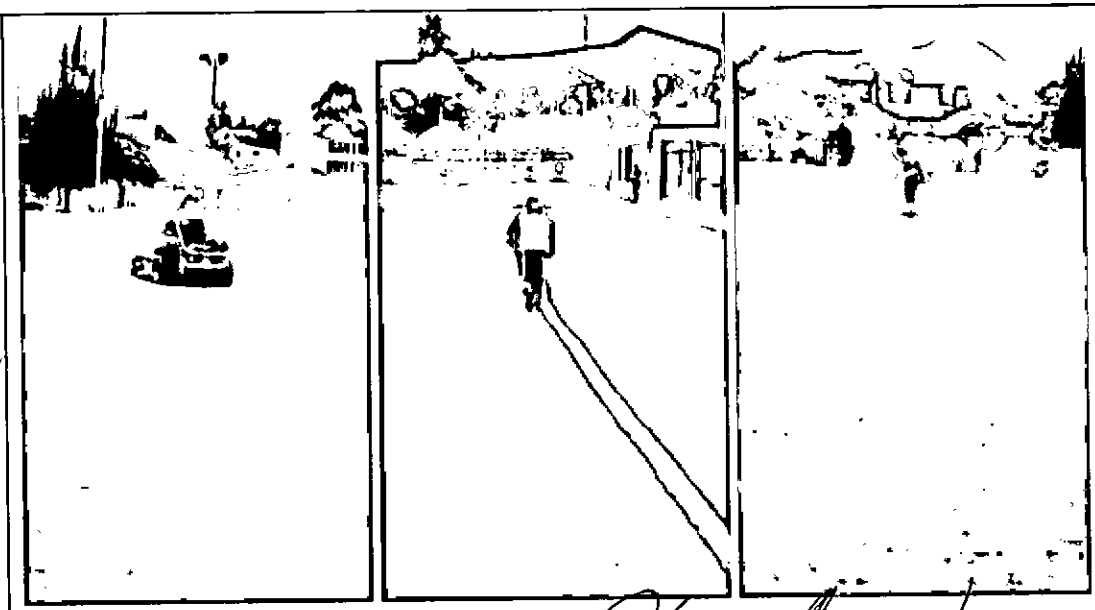CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDAD MONTES SOFTBAL	9/07/2021 23/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	


Visto Bueno Director de obra:_____. Visto Bueno Interventoría:_____

ALCALDIA MAYOR	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021

CAPITULO:	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL	CONTRATO DE OBRA No:	2940-2020


Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	CIUDAD MONTES SOFTBOL	16-112

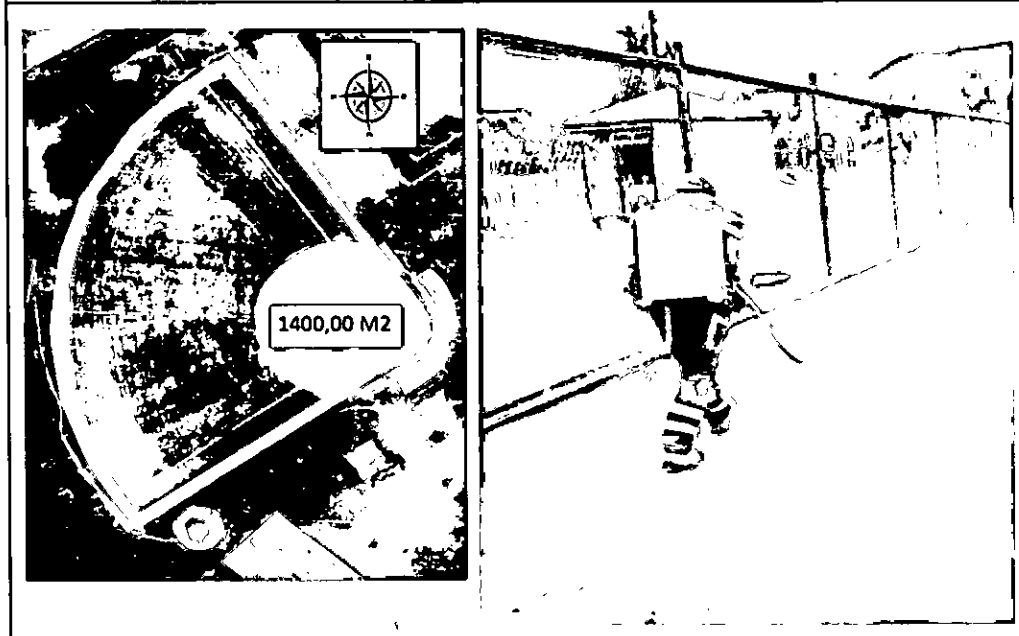

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
CANCHA	1400,00			2,00	2.800,00
				SUBTOTAL	2.800,00
		Pasan		M2	2.800,00
		Total		M2	2.800,00

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021

CAPITULO:	REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL	CONTRATO DE OBRA No:		2940-2020
Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
10-006	UND	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	6	CIUDAD MONTES SOFTBOL	16-112





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
				1,00	1,00
				SUBTOTAL	1,00
			Pasan	UND	1,00
			Total	UND	1,00

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) CANT [d]	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a+/-d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i / c]	% ejec del CTO [i / a]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [f]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [eg]
		ESTADIO ALQUERIA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNO		74.855	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNO		141.572	-	12,00	1.698.864	12	1.698.864	1	141.572	12	1.698.864	100,00%	0,2433%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNO		344.105	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.all. UOS)**	UNO		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNO	16	13.609	217.744	4,00	54.436	20	272.180	5	68.045	20	272.180	100,00%	0,0500%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNO	16	150.841	2.413.456	4,00	603.364	20	3.016.820	5	754.205	20	3.016.820	100,00%	0,5100%	-	$ -
2		MANT. CAMPOS MINIFUTBOL (TIPO 1 Y 2 (Area aprox.7.500 mts)			281.499													
003	101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UNO		216.584	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
014	10723	Relleno en arena de no suelta**	M3		84.663	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
015	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrmta)	M2		6.013	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	8.200	411	3.370.200		-	8.200	3.370.200		-	8.200	3.370.200	100,00%	0,5700%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-	7.140	956.760	7.140	956.760		-	7.140	956.760	100,00%	0,1600%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 6.031.400		$ 3.313.424		$ 9.344.824		$ 953.822		$ 9.344.824	100%	1,57%		$ -
		A.I.U			29,0%	$ 1.740.435		$ 960.893		$ 2.701.258		$ 279.538		$ 2.701.258				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 7.741.806		$ 4.274.317		$ 12.016.123		$ 1.243.330		$ 12.016.123				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 7.741.806		$ 4.274.317		$ 12.016.123		$ 1.243.330		$ 12.016.123	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. total parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 992.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS CANT [d]	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i / g]	% ejec del CTO [i / g]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [f]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122129	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	8.000	7.020.000	8.000	7.020.000		-	8.000	7.020.000	100,00%	1,19%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		7.020.000,0		7.020.000,0		-		7.020.000,0	100%	1,19%		-
		A.I.U			29,00%	-		2.035.800,0		2.035.800,0		-		2.035.800,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Valor antes de IVA)				-		9.055.800,0		9.055.800,0		-		9.055.800,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		9.055.800		9.055.800		-		9.055.800	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				8.031.400		16.333.434		16.334.834		903.827		16.334.834				-
		AIU			29,00%	1.743.405,0		3.925.883,0		4.737.060,0		278.508,0		4.737.060,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado + por ejecutar)				7.741.808		13.330.117		21.071.923		1.243.330		21.071.923				-
III)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 678.928.077,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARCELA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. TEODO[illegible]
Director de Obra
Contrato 29[illegible] de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO ALQUERIA	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5 BORDEO 5 DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. totales parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (Negativos (-) y sobrantes (+)) CANT [d]	DIFERENCIAS (Negativos (-) y sobrantes (+)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i] / [g]	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [j]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		MILENTA TEJAR																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNO		74.885	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNO		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	16,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNO		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.sd. 005)*	UNO		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNO	10	13.609	136.093	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,0000%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNO	10	150.841	1.508.410	2,00	301.682	12	1.810.092	2	301.682	12	1.810.092	100,00%	0,3100%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.683													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		28.614	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.500	411	2.671.500		-	6.500	2.671.500		-	6.500	2.671.500	100,00%	0,4500%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO->	$ 4.316.000		$ 1.178.332		$ 5.494.332		$ 470.472		$ 5.494.332	100%	0,93%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.251.640		$ 341.716		$ 1.593.356		$ 135.437		$ 1.593.356				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 5.567.640		$ 1.520.048		$ 7.087.688		$ 605.909		$ 7.087.688				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 5.567.640		$ 1.520.048		$ 7.087.688		$ 606.909		$ 7.087.688	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (Año de suscripción) **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 48

VR. INIC. CONTRATO: $ 908.003.000 VR. ADICIONES $ 92.808.808,08 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos.

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) = (a) + (d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g) = (c) + (e)	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (j) = (h) / (f)	% ejec del CTO (k) = (i) / (g)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m) = (b) x (l)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	RECERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-	6500	5.070.000	6.500	5.070.000		-	6.500	5.070.000	100,00%	0,00057%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00000%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.070.000		5.070.000		-		5.070.000	100%	0,57%		-
		AIU	29,00%			-		1.470.000		1.470.000		-		1.470.000				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítems + AIU PARQUE 1 (ítems originales				-		6.540.000		6.540.000		-		6.540.000				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.540.000		6.540.000		-		6.540.000	1	0		-

TOTALES DEL CONTRATO


		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=B)			4.316.000		6.248.332		10.564.332		470.472		10.564.332					-
		AIU	29,00%		1.251.840,0		1.812.016,0		3.063.856,0		136.437,0		3.063.856,0					-
		DISEÑOS			-		-		-		-		-					-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			-		-		-		-		-					-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			-		-		-		-		-					-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)			5.567.840		8.060.349		13.627.888		606.909		13.627.888					-
* (C)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 879.172.012,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Ing. KATHERINE RETTELEA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DEL CRISTO GOMEZ DA
Director de
Contrato 2



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
MILENTA TEJAR	6/07/2021 22/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (+) y (-) CANT [d]	DIFERENCIAS (+) y (-) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a+d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j] [i/g]	% ejec del CTO [k] [i/c]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		BOCHECA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 m2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%		$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	5,00	707.860	5	707.860	1	141.572	5	707.860	100,00%	0,1200%		$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%		$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.ati. UOS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%		$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	1,03	13.839	11	148.650	2	27.218	11	148.650	100,00%	0,0130%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	1,02	150.841	11	1.659.251	2	301.682	11	1.659.251	100,00%	0,2100%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S Blando	M3		28.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
013	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrta)	M2		6.013	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticuttar + ayudante **	M2	3.700	411	1.520.700		-	3.700	1.520.700		-	3.700	1.520.700	100,00%	0,2000%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			COSTO=	$ 3.165.200		$ 672.310		$ 4.037.510		$ 470.472		$ 4.037.510	100%	0,08%		$ -
		AIU			29,27%	$ 917.908		$ 252.870		$ 1.170.878		$ 135.437		$ 1.170.878				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 4.083.108		$ 1.125.280		$ 5.208.388		$ 605.909		$ 5.208.388				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 4.083.108		$ 1.125.280		$ 5.208.388		$ 605.909		$ 5.208.388	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.008.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y (-) CANT	DIFERENCIAS (+) y (-) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12712	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	3200	2.886.000	3.700	2.886.000		-	3.700	2.886.000	100,00%	0,40000%	-	$ -
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		2.886.000,0		2.886.000,0		-		2.886.000,0	100%	0,40%		-
		A.I.U.			29,07%	-		836.940,0		836.940,0		-		836.940,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Items adicionales)				-		3.722.940,0		3.722.940,0		-		3.722.940,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		3.722.940		3.722.940		-		3.722.940	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				3.165.200		3.758.390		6.923.590		470.472		6.923.590				-
		AIU			29,07%	917.908,0		1.059.940,0		2.037.848,0		136.437,0		2.037.848,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				4.083.109		4.848.220		8.931.328		606.909		8.931.328				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 50.671.672,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de interventoria

Ana MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDY [illegible] GONTAN
Director de obra
Contrato 2940 de [illegible]

37

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

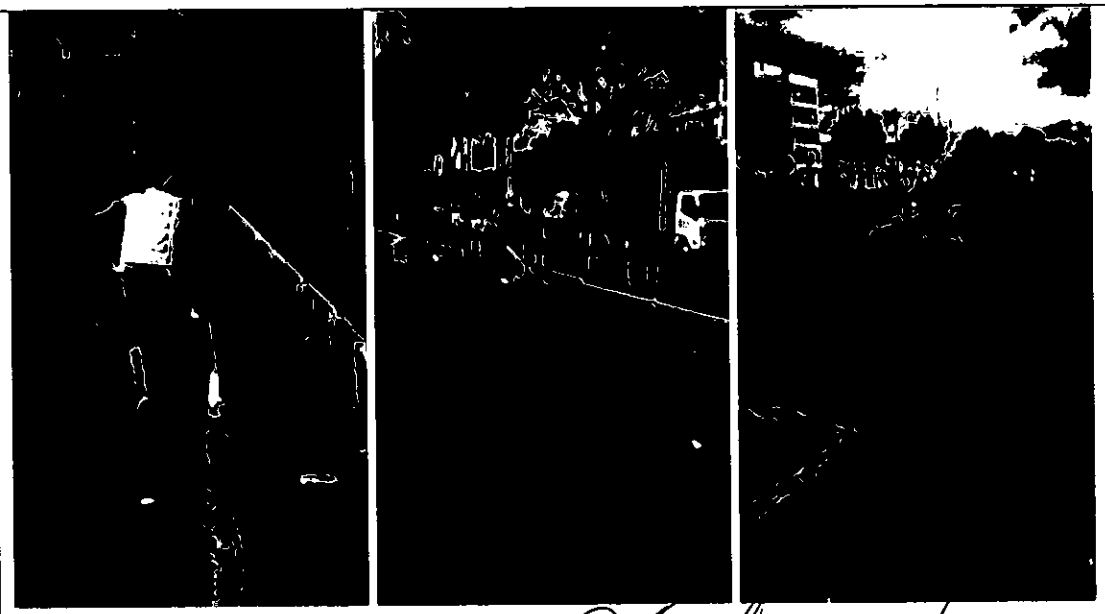CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
BOCHICA	6/07/2021 22/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
del	ene	enero
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]	[o]
		TUNAL ESTADIO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mtr2)			739,914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74,885	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141,572	-	6,00	849,432	6	849,432	1	141,572	6	849,432	100,00%	0,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344,195	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozas cesped- (est.a/l. UDS)**	UND		14,817	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13,509	217,744	5,00	68,045	11	148,809	2	27,216	11	148,809	100,00%	0,0150%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150,841	2,413,456	9,00	905,048	16	1,508,410	2	301,682	16	1,508,410	100,00%	0,2500%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13,712,882													
001	10350	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-8m3-S.Blando	M3		26,614	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0031%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-	252,39	33,820	252	33,820		-	227	33,820	100,00%	0,0190%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)		CDCTO=>		$ 2,631,203		-$ 88,838		$ 2,541,361		$ 470,472		$ 2,541,361	100%	0,43%		$ -
		A.I.U		29,0%		$ 763,048		-$ 26,053		$ 736,995		$ 135,437		$ 736,995				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 3,394,348		-$ 115,892		$ 3,278,356		$ 605,909		$ 3,278,356				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 3,394,248		-$ 115,892		$ 3,278,356		$ 606,909		$ 3,278,356	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021 — Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Dinero (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Dinero (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Dinero (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Dinero (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Dinero	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Dinero (i)	% ejec del ítem (i) / (c)	% ejec del CTO (i) / (c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (k)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Dinero (m)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE I																
NP-001	122123	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE "	M2		780	-	9.500	7.410.000	9.500	7.410.000		-	9.500	7.410.000	100,00%	1,25%	-	-
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		7.410.000,0		7.410.000,0		-		7.410.000,0	100%	1,25%		-
		A.I.U.			29,53%	-		2.188.900,0		2.188.900,0		-		2.188.900,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítems + AIU PARQUE I (Costo directo)				-		9.598.900,0		9.598.900,0		-		9.598.900,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		9.598.900		9.598.900		-		9.598.900	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+B)				2.631.300		7.320.181		9.951.301		470.472		9.951.301				-
		AIU			29,53%	783.048,0		2.122.947,0		2.905.995,0		135.437,0		2.905.995,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				3.394.248		9.443.008		12.837.256		606.909		12.837.256				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 276.743.744,00


Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoría

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020


Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

40



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

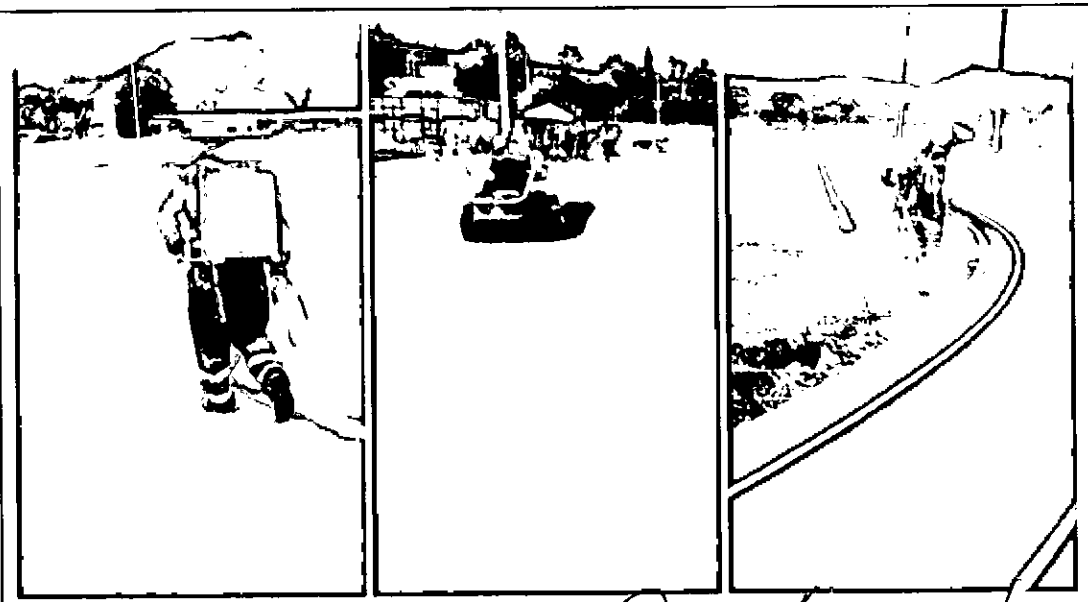CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TUNAL ESTADIO	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZA CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. ORIG. CONTRATO: $ 800.000.000 **VR. ADICIONES** $ 82.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% cpo del ítem	% cpo del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit. Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		TUNAL SOFTBAL																
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	4	54.269	217.076		-	4	217.076		-	4	217.076	100,00%	0,0403%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	4.174,10	411	1.715.555		-	4.174	1.715.555		-	4.174	1.715.555	100,00%	0,2603%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1.351,00	134	181.155	5.407,80	724.618	6.760	905.773	1.352	181.155	6.760	905.773	100,00%	0,1500%	-	$ -
020	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG		2.183	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL			478.577													
001	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UND		48.030	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UOS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	16	13.609	217.744	5,00	68.045	11	148.699	3	40.827	11	148.699	100,00%	0,0300%	-	$ -
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	16	120.077	1.921.232	5,00	600.385	11	1.320.847	3	360.231	11	1.320.847	100,00%	0,2200%	-	$ -
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	5,00	707.860	5	707.860	2	283.144	5	707.860	100,00%	0,1300%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)				CDCTO=	$ 4.252.762	$ 764.048		$ 5.016.810		$ 805.357		$ 5.016.810	100%	0,87%		$ -
		A.I.U				29,00%	$ 1.233.301	$ 221.574		$ 1.454.875		$ 250.954		$ 1.454.875				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U PARQUE 1 (items originales)					$ 5.486.063	$ 985.622		$ 6.471.685		$ 1.116.311		$ 6.471.685				$ -
		DINEROS																
		VALOR DEL IVA sobre el DINERO					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DINEROS (Incluido IVA)					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)					$ 5.486.063	$ 985.622		$ 6.471.685		$ 1.116.311		$ 6.471.685	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	anno
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del presente contrato)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. BASE, CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (negativo (-) y positivo (+)) CANT (d)	DIFERENCIAS V/r Parcial Directo (e=d*b)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f=a+d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS V/r Parcial Directo (g=f*b)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 V/r Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO V/r Parcial Directo (i)	% ejec del item (j=h/f)	% ejec del CTO (k=i/g)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l=f-h)	CANTIDADES POR EJECUTAR V/r Parcial Directo (m=l*b)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		A.I.U.			29,00%	-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + NO PARQUE 1 (Costo directo)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=B)				4.252.762		764.048		5.016.810		000.357		5.016.810				-
		AIU			29,00%	1.233.301,0		221.574,0		1.454.875,0		250.954,0		1.454.875,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				5.488.063		985.622		6.471.685		1.118.311		6.471.685				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 800.528.315,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HEYDEL
Director de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY ALEJANDRO CUBILLOS GO
Director de C
Contrato 29

43



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TUNAL SOFTBAL	12/07/2021 19/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 3, BORDEO 3, DEMARCACIÓN 2	

Visto Bueno Director de obra: _____.


Visto Bueno Interventoría: _____



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021
CAPITULO: **REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**	CONTRATO DE OBRA No:	2940-2020

Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	TUNAL SOFTBOL	16-112

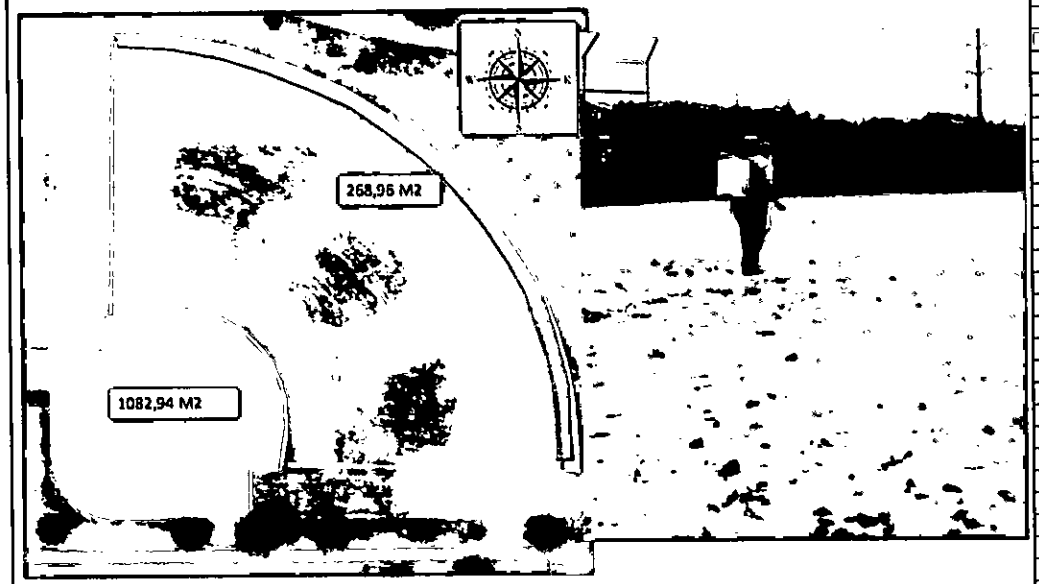

Localización	Dimensiones AREA	Dimensiones ANCHO	Dimensiones ALTO	CANT	Medida Total
	1082,94			1,00	1.082,94
	268,96			1,00	268,96
				SUBTOTAL	1.351,90
			Pasan	M2	1.351,90
			Total	M2	1.351,90

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 **VR. ADICIONES** $ 82.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIDB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=)	DIFERENCIAS CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a+/-d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=)	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i=)	% ejec del item (i / f)	% ejec del CTO (h / a)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (f)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m=)
		NUEVO MUZU																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	5,00	707.860	5	707.860	1	141.572	5	707.860	100,00%	0,120%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -bronze cesped- (est.ati. UIOS)**	UND		14.612	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	2,00	27.218	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,033%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	2,00	301.682	8	1.210.728	2	301.682	8	1.210.728	100,00%	0,200%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			COSTO->	$ 1.644.500		$ 378.000		$ 2.022.460		$ 470.472		$ 2.022.460	100%	0,34%		$ -
		AIU			29,0%->	$ 476.935		$ 109.658		$ 586.603		$ 136.437		$ 586.603				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 2.121.405		$ 488.658		$ 2.610.263		$ 606.909		$ 2.610.263				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluidos IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 2.121.405		$ 488.658		$ 2.610.263		$ 606.909		$ 2.610.263	100%	0%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES: $ 982.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (negativos (-) y numeros(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (negativos (-) y numeros(-)) Vr Parcial Directo (e=c-d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a+/-d=f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=e)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i=g+h)	% ejec del item (i/g)	% ejec del CTO (i/c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (f-h)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (f-i)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	1.722,54	1.343.581	1723	1.343.581		-	1723	1.343.581	100,00%	0,23%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		1.343.581,0		1.343.581,0		-		1.343.581,0	100%	0,23%		-
		A.I.U			29,07%	-		389.838,0		389.838,0		-		389.838,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS (sobre + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				-		1.733.219,0		1.733.219,0		-		1.733.219,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		1.733.219		1.733.219		-		1.733.219	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				1.644.500		1.722.541		3.367.041		470.472		3.367.041				-
		AIU			29,07%	476.905,0		400.537,0		876.442,0		130.437,0		876.442,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				2.121.405		2.222.078		4.343.483		606.909		4.343.483				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 887.616.517,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA PEREIRA
Directora de Interventoria
Contrato 2940 DE 2020

Ing. FEL... ...ON ORTIZ DIAZ
Director de Obra
Contrato ...2020

47

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

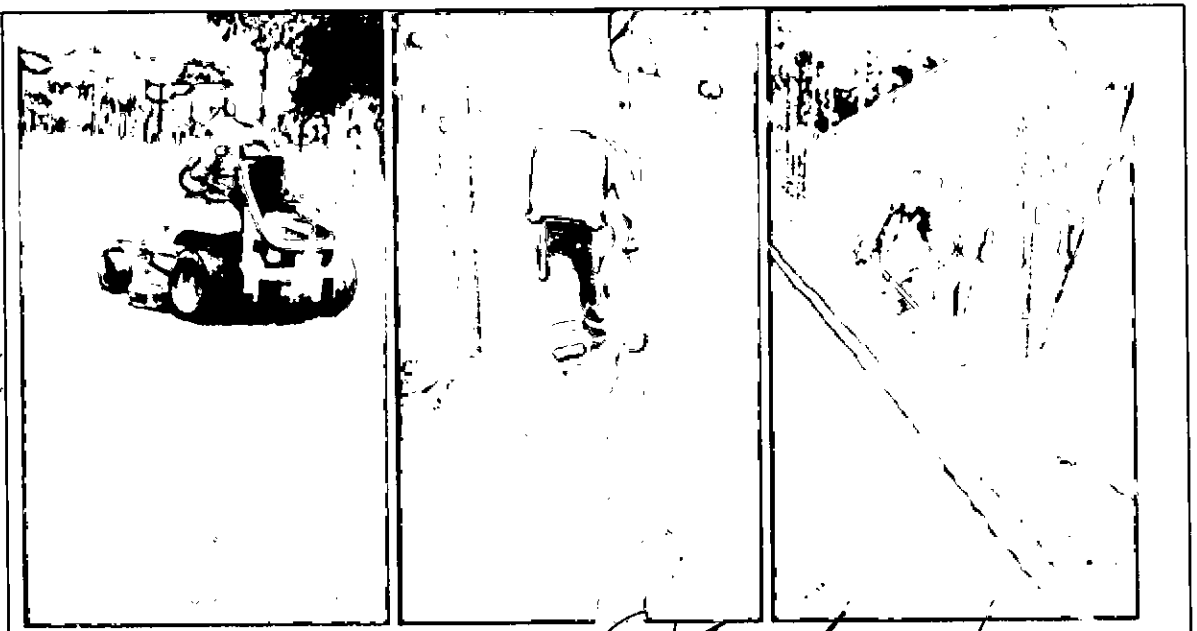CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
NUEVO MUZÚ	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 992.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (negativos (-)) y mayores (+) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e=c*d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (f=a+d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=f*b)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i=h*b)	% ejec del item (j=h/f)	% ejec del CTO (k=i/c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m=l*b)
		TIMIZA ESTADIO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UNID		74.885	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UNID	6	141.572	1.132.576	13,00	1.840.436	21	2.973.012	1	141.572	21	2.973.012	100,00%	0,3000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UNID		344.195	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -arrizos cesped- (est.std. UOS)**	UNID		14.612	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	18	13.609	217.744	8,00	81.864	22	299.308	5	68.045	22	299.308	100,00%	0,0302%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	48	150.841	2.413.456	8,00	1.206.728	24	3.620.184	5	754.205	24	3.620.184	100,00%	0,3650%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 8.032.428		$ 3.952.711		$ 11.755.139		$ 963.822		$ 11.755.139	100%	1,19%		$ -
		A.I.U			29,0%	$ 2.340.804		$ 1.032.186		$ 3.408.933		$ 278.548		$ 3.408.933				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 10.438.232		$ 4.724.897		$ 15.164.129		$ 1.243.330		$ 15.164.129				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 10.438.232		$ 4.724.897		$ 15.164.129		$ 1.243.330		$ 15.164.129	100%	3%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 809.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j] = [h]+[i]	[k]	[l] = [k]/[a]	[m] = [k]/[CTO]	[n] = [a]-[j]	[o] = [n]*[b]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12712	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-	2.300	1.748.000	2.300	1.748.000		-	2.300	1.748.000	100,00%	0,25000%	-	$ -
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		1.748.000,0		1.748.000,0		-		1.748.000,0	100%	0,25%		-
		A.I.U	29,00%			-		487.840,0		487.840,0		-		487.840,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (Costo asignado)				-		2.213.840,0		2.213.840,0		-		2.213.840,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUB TOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		2.213.840		2.213.840		-		2.213.840	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=B)				8.002.428		5.378.711		13.471.139		653.822		13.471.139				-
		AIU	29,00%			2.320.804,0		1.559.826,0		3.880.630,0		279.308,0		3.880.630,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				10.439.232		6.938.537		17.377.769		1.243.330		17.377.769				-
I. D)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 574.622.231,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY ALEXIS GOMEZ C.
Director de [illegible]
Contrato 2940 de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TIMIZA ESTADIO	2/07/2021 9/07/2021 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
del	==>	====
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (+ mayores / - menores)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g] = [c]+[e]	[h]	[i] = [b]*[h]	[j] = [f]-[h]	[k] = [g]-[i]	[l] = [h]/[f]	[m] = [i]/[g]	[n] = [f]-[j]	[o] = [g]-[k]
		GAITANA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozos cesped- (est.alt. UDS)*	UND		14.512	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	9,00	122.481	19	258.571	4	54.436	19	258.571	100,00%	0,0400%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	9,00	1.357.599	19	2.865.979	4	603.364	19	2.865.979	100,00%	0,4600%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)				CDCTO>	$ 4.738.453	$ 3.095.535		$ 7.832.389		$ 799.372		$ 7.832.389	100%	1,37%		$ -
		A.I.U				29,0%	$ 1.373.571	$ 897.821		$ 2.271.393		$ 231.818		$ 2.271.393				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)					$ 6.110.024	$ 3.993.757		$ 10.103.782		$ 1.031.190		$ 10.103.782				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)					$ 6.110.024	$ 3.993.757		$ 10.103.782		$ 1.031.190		$ 10.103.782	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique N° adición del acta anterior)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y (-) CANT	DIFERENCIAS (+) y (-) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% obra del ítem	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]	[o]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NF-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	7.523	5.857.940	7.523	5.857.940		-	7.523	5.857.940	100,00%	0,66%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.857.940,0		5.857.940,0		-		5.857.940,0	100%	0,66%		-
		A.I.U			29,07%	-		1.701.703,0		1.701.703,0		-		1.701.703,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Costo directo + AIU)				-		7.559.643,0		7.559.643,0		-		7.559.643,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.559.643		7.559.643		-		7.559.643	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+8)				4.736.453		8.813.876		13.700.329		769.372		13.700.329				-
		AIU			29,07%	1.373.574,0		2.500.304,0		3.873.065,0		231.818,0		3.873.065,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.110.024		11.583.400		17.673.424		1.031.190		17.673.424				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 74.326.576,00


Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2944 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible] GOMEZ [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 [illegible] 2020

53



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
GAITANA	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

54

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	V/r Unit Directo	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo			CANT	V/r Parcial Directo
				[a]	[b]	[c=]	[d]	[e=]	[f] = [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]			[l]	[m]
		SERENA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.185	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación dvots -hoyos cesped- (est.sti. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12464	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	12,00	163.308	22	299.398	4	54.436	22	299.398	100,00%	0,0500%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	12,00	1.810.092	22	3.318.502	4	603.364	22	3.318.502	100,00%	0,5500%	-	$ -
008	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **			13.712.882													
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL			26.614	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.500	411	2.671.500		-	6.500	2.671.500		-	6.500	2.671.500	100,00%	0,4500%	-	$ -

8	SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	COCTO=	$ 4.316.000		$ 2.627.832		$ 7.138.832		$ 749.372		$ 7.138.832	100%	1,21%		$ -	
	A.I.U	29,0%	$ 1.251.840		$ 616.621		$ 2.070.251		$ 231.818		$ 2.070.251				$ -	
	SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)		$ 5.567.840		$ 3.841.453		$ 9.209.083		$ 1.011.190		$ 9.209.083				$ -	
	DISEÑOS																	
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
	SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)		$ 5.567.840		$ 3.841.453		$ 9.209.083		$ 1.011.190		$ 9.209.083	100%	2%		$ -	

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (Núm. Consecut. / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JUIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato resumido)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. Inic. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 62.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 562.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [d] - [a]	[g] = [e] - [c]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n] = [l] / [a]	[o] = [m] / [i]	[p] = [a] - [l]	[q] = [i] - [m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	127127	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	6500	5.070.000	6.500	5.070.000		-	6.500	5.070.000	100,00%	0,90%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.070.000,0		5.070.000,0		-		5.070.000,0	100%	0,90%		-
		AIU			29,00%	-		1.470.300,0		1.470.300,0		-		1.470.300,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + NO PARQUE 1 (Base impto iva)				-		6.540.300,0		6.540.300,0		-		6.540.300,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluidos IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.540.300		6.540.300		-		6.540.300	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+2)				4.318.000		7.882.832		12.200.832		700.372		12.200.832				-
		AIU			29,00%	1.251.640,0		2.288.971,0		3.540.591,0		231.618,0		3.540.591,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluidos IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				5.567.640		10.181.753		15.749.393		1.031.190		15.749.393				-
(3)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 576.250.607,00


Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

A.A. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020


Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

96



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

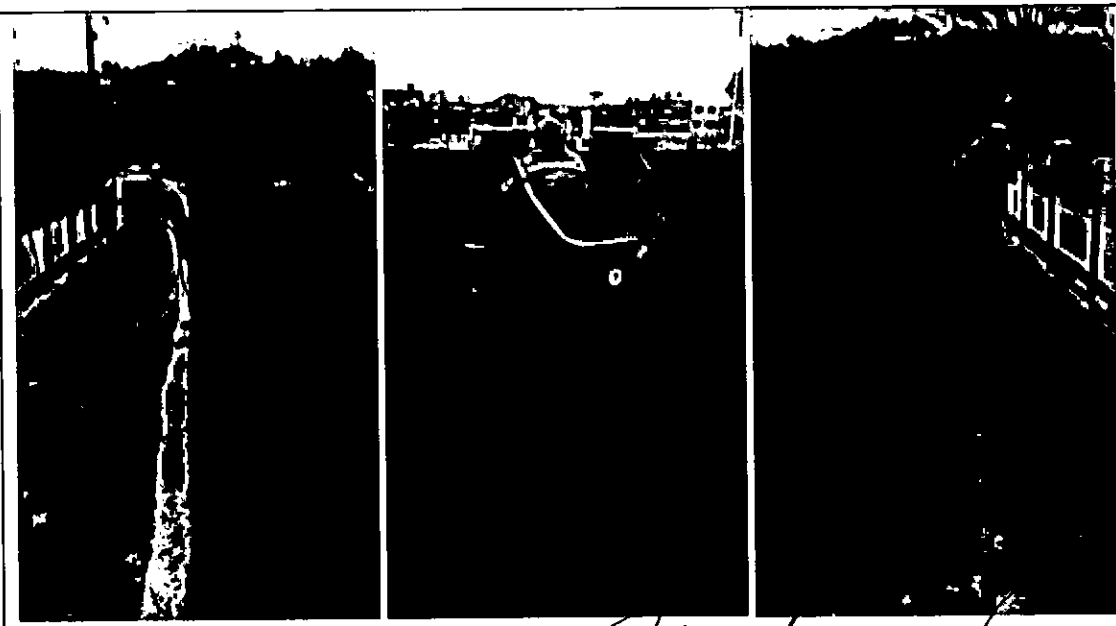CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SERENA	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, , DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		PRO ESTADIO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.866 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	5,00	707.860	5	707.860	1	141.572	5	707.860	100,00%	0,1200%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.185	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozas cesped- (est.ait. UOS)**	UND		14.812	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	18	13.609	217.744	3,00	40.827	13	176.817	2	27.218	13	176.817	100,00%	0,0300%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	18	150.841	2.713.458	3,00	452.523	13	1.900.933	1	150.841	13	1.900.933	100,00%	0,3300%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MENIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-8m3-S.Blando	M3		28.814	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	8.138	411	3.344.718		-	8.138	3.344.718		-	8.138	3.344.718	100,00%	0,5600%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)	CDCTO>>			$ 5.975.918		$ 214.510		$ 6.190.428		$ 319.631		$ 6.190.428	100%	1,05%		$ -
		AIU	29,00%>			$ 1.733.016		$ 62.208		$ 1.795.224		$ 92.693		$ 1.795.224				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				$ 7.708.934		$ 276.718		$ 7.985.652		$ 412.324		$ 7.985.652				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				$ 7.708.934		$ 276.718		$ 7.985.652		$ 412.324		$ 7.985.652	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 (No. Contrato) DE 2020 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato resumido)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VRL INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VRL ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit. Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c=]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d=]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) Vr Parcial Directo [e=]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f=]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g=]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h=]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i=]	% obra del item [i]	% obra del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l=]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m=]
		ITEM'S NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122127	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%		$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00,00%		$ -
[1]		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		A.I.U.	29,07%			-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base antigüedad				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO [1+2]				5.875.918		214.510		6.150.428		319.831		6.150.428				
		AIU	29,07%			1.733.016,0		62.809,0		1.795.224,0		92.693,0		1.795.224,0				
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				7.708.934		276.718		7.985.652		412.524		7.985.652				-
[3]		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 584.814.348,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

ANA MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible]
Director de [illegible]
Contrato 2940 de 2020



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRD ESTADIO	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 1 (19/07/2021), BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
del	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativos (-) y sombreado)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	V Unit Directo	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo			CANT	V Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]	[h]		[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]
		PRD ALTERNA 3																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	4,00	566.288	4	566.288		-	4	566.288	100,00%	0,1000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozas cesped- (est.sti. UDS)*	UND		14.817	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	18	13.609	217.744	5,00	68.045	11	149.699	1	13.609	11	149.699	100,00%	0,0263%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	18	150.841	2.413.456	5,00	754.205	11	1.659.251	1	150.841	11	1.659.251	100,00%	0,2850%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	4719	411	1.938.509		-	4719	1.938.509		-	4719	1.938.509	100,00%	0,3300%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
6		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)				COCTO->	$ 4.520.709	-$ 255.142	$ 4.314.747	$ 164.452			$ 4.314.747	100%	0,77%		$ -	
		A.I.U.				29,07%	$ 1.325.535	-$ 74.209	$ 1.251.277	$ 47.881			$ 1.251.277				$ -	
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)					$ 5.846.215	-$ 330.191	$ 5.566.024	$ 212.141			$ 5.566.024				$ -	
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)					$ 5.846.215	-$ 330.191	$ 5.566.024	$ 212.141			$ 5.566.024	100%	1%		$ -	

9

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativas (+) y positivas(-)) CANT	DIFERENCIAS (negativas (+) y positivas(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]		[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESALOJO DE LOTE **	M2	780		-	4.719	3.650.820	4.719	3.650.820		-	4.719	3.650.820	100,00%	0,62%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
01		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		3.650.820,0		3.650.820,0		-		3.650.820,0	100%	0,62%		-
		AIU		29,00%		-		1.057.438,0		1.057.438,0		-		1.057.438,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 ítems originales				-		4.748.258,0		4.748.258,0		-		4.748.258,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		4.748.258		4.748.258		-		4.748.258	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				4.570.708		3.424.858		7.995.567		184.450		7.995.567				-
		AIU		29,00%		1.325.504,0		993.310,0		2.318.714,0		47.691,0		2.318.714,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				5.896.215		4.418.087		10.314.281		212.141		10.314.281				-
10		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 581.685.719,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA HITTELA
Directora de Interventoría
Contrato 2944 DE 2020

Ing. TEODY D[illegible]
Director de Ob[illegible]
Contrato 2940 de 2[illegible]

62



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

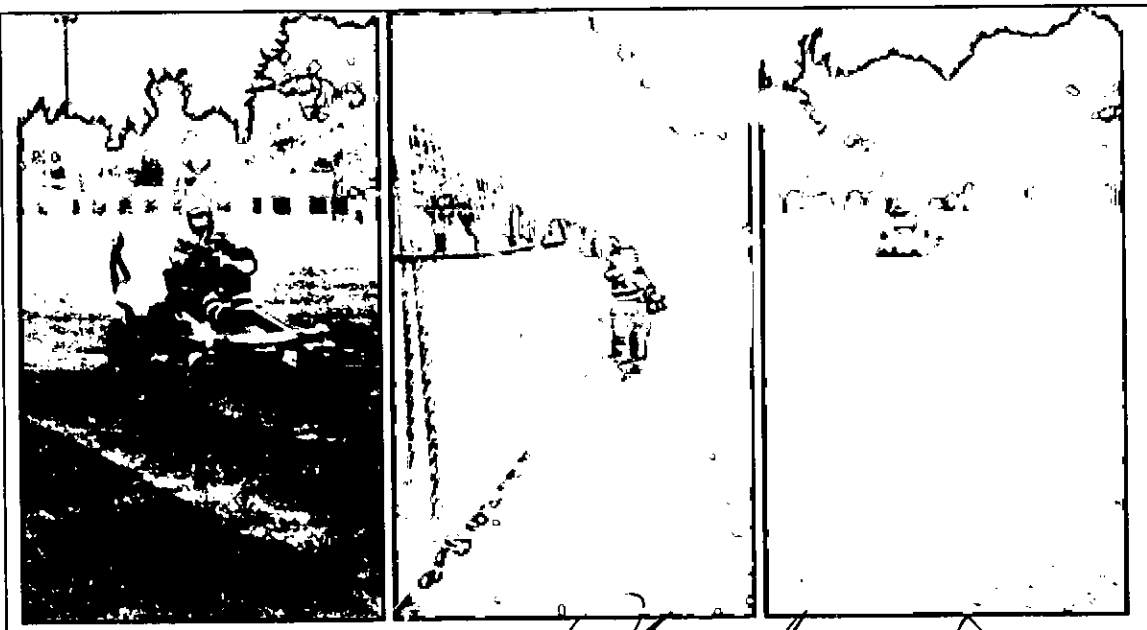CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRD ALTERNA 3	19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 1, BORDEO 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 29-40 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000

No. totales parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODE	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c=]	DIFERENCIAS (negativo (+) y mortamal (-)) CANT [d=]	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo [e=]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f=]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g=]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h=]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i=]	% ejec del item [j=]	% ejec del CTO [k=]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l=]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m=]
		PRO PLAYA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.686 m2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -zonas cesped- (estatil, UDS)**	UND		14.812	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	6	13.609	81.654	6,00	81.654		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND		150.841	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL			13.713.683													
001	10380	Excavación mecanic-retiro(250m3/dia)V-6m3-6,Blando	M3		26.614	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER-COMB)	HR	8	54.269	434.152		-	8	434.152		-	8	434.152	100,00%	0,049%	-	$ -
010	101784	VIBROCOMP. BENTIN 1,5TON(Oper+Comb)**	HR		29.539	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
016	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1.440,29	134	192.939	480,80	64.451	1.816	256.446	480,80	64.451	1.816,10	256.446	100,00%	0,043%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL			478.577													
001	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UND		48.630	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
006	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L, EST. ATL. UDS**	UND		139.877	-	1,00	139.877	1	139.877	1	139.877	1	139.877	100,00%	0,023%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	COSTO=		$ 708.839			$ 134.674		$ 833.478		$ 203.328		$ 833.478	100%	0,14%		$ -
		A.I.U	29,09%		$ 206.063			$ 39.156		$ 241.709		$ 58.935		$ 241.709				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)			$ 914.358			$ 160.829		$ 1.075.187		$ 262.163		$ 1.075.187				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)			$ 914.358			$ 160.829		$ 1.075.187		$ 262.163		$ 1.075.187	100%	0%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA NP 6

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

CONTRATO No 2940 (Nro. Contrato) DE 2020 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit. Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativos (-) y sombreado) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	[g]	[h]								
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%		$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%		$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		AIU			29,00%	-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base antes del IVA)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+I)				705.000		134.674		839.674		208.326		839.674				-
		AIU			29,00%	205.353,0		39.135,0		241.702,0		58.835,0		241.702,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				914.358		160.829		1.075.187		266.163		1.075.187				-
J)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 580.824.813,00

V° B° INTERVENTORIA

Ana MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

No Contrato de Interventoría


Ing. FREDDY DAVID CEBALLOS GÓMEZ DIAZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

65

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021

CAPITULO:	**REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**	CONTRATO DE OBRA No:		2940-2020
Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	PRD PLAYA	

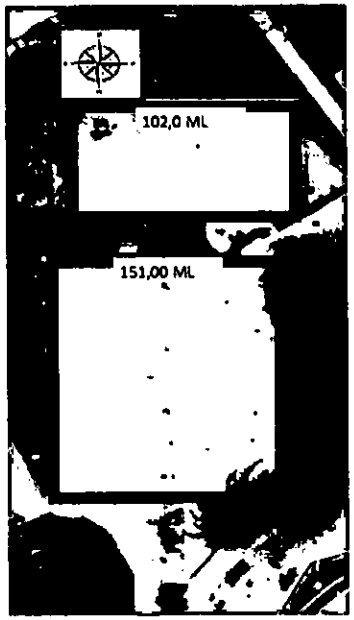




Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
	151,00	1,96		1,00	295,97
	102,00	1,96		1,00	199,93
				SUBTOTAL	495,90
			Pasan	M2	495,90
			Total	M2	495,90

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ALCALDIA MAYOR	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021

CAPITULO:		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL	CONTRATO DE OBRA No:		2940-2020
Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
10-006	UND	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	6	PRD PLAYA	




Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
				1,00	1,00
				SUBTOTAL	1,00
		Pasan		UND	1,00
		Total		UND	1,00

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 **VR. ADICIONES** $ 92.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% cpo del ítem	% cpo del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c=a*b]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e=d*b]	CANT [f] [f=a+d]	Vr Parcial Directo [g=f*b]	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i=h*b]	CANT [j]	Vr Parcial Directo [k=j*b]	[l=j/a]	[m=k/CTO]	CANT [n]	Vr Parcial Directo [o=n*b]
		ESTADIO TABORA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.577	6	849.432	100,00%	0,143%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brazos cesped- (est.atl, UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	18	13.609	217.744	4,00	54.436	20	272.180	3	40.827	20	272.180	100,00%	0,050%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	18	150.841	2.413.456	4,00	603.364	20	3.016.820	3	452.523	20	3.016.820	100,00%	0,510%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-4m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		582	-	7.175	4.663.200	7.175	4.663.200		-	7.175	4.663.200	100,00%	0,810%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	7.175	411	2.948.925		-	7.175	2.948.925		-	7.175	2.948.925	100,00%	0,510%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente)**	M2		134	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
020	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG		2.183	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 5.593.125		$ 6.400.567		$ 11.993.707		$ 634.927		$ 11.993.707	100%	2,07%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.616.230		$ 1.855.169		$ 3.474.435		$ 184.127		$ 3.474.435				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 7.198.361		$ 8.255.751		$ 15.455.112		$ 819.049		$ 15.455.112				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 7.198.361		$ 8.255.751		$ 15.455.112		$ 819.049		$ 15.455.112	100%	3%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÍTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato resumido)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIEM	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i / g]	% ejec del CTO [i / b]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [f]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	7.175	5.595.500	7.175	5.595.500	-	-	7.175	5.595.500	100,00%	0,95027%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00000%	-	$ -
[D]		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.595.500,0		5.595.500,0		-		5.595.500,0	100%	0,95%		-
		A.I.U.	29,00%			-		1.622.695,0		1.622.695,0		-		1.622.695,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS COSTO + AIU PARQUE 1 (Valores antes de IVA)				-		7.218.485,0		7.218.485,0		-		7.218.485,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.219.485		7.219.485		-		7.219.485	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+D)				5.580.125		11.697.082		17.577.207		634.922		17.577.207				-
		AIU	29,00%			1.618.236,0		3.478.154,0		5.097.390,0		184.127,0		5.097.390,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				7.198.361		15.476.238		22.674.597		819.049		22.674.597				-
[E]		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 959.325.402,99

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DE [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020


3

69



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

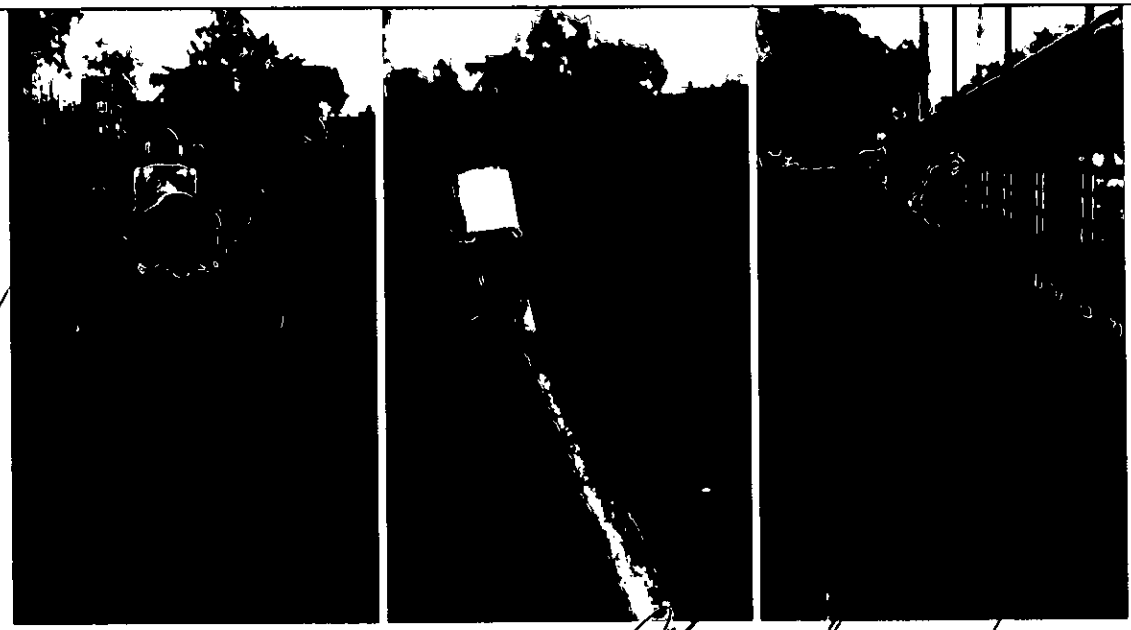CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO TABORA	1/07/2021 8/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 3, BORDEO 3, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. total parques por intervenir: 45

VR. ORIG. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CÓD	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit. Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (negativo (-) y aumentos (+)) CANT (d)	DIFERENCIAS (negativo (-) y aumentos (+)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del ítem (i / b)	% ejec del CTO (i / c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		COUNTRY																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UNO		74.885	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UNO	2	141.572	283.144			2	283.144			2	283.144	100,00%	0,0500%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UNO		344.195	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozos cesped- (est.atl. UOS)**	UNO		14.812	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNO		13.609	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
006	12513	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNO		150.841	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	arreacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutiar + ayudante **	M2	48.302	411	20.253.122			48.302	20.253.122			48.302	20.253.122	100,00%	3,4200%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
11		MTO. CAMPO DE POLO EL COUNTRY			812.487													
001	12484	DESYIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UNO		13.609	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UNO	60	784.066	47.043.960	12,00	9.408.792	72	56.452.752	13	10.192.808	72	56.452.752	100,00%	9,5400%	-	$ -
003	12512	Reparación divots -brozos cesped- (est.atl. UOS)**	UNO		14.812	-				-				-	0,00%	0,0000%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 67.304.229		$ 9.408.792		$ 76.909.018		$ 10.192.808		$ 76.909.018	100%	13,01%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 19.601.165		$ 2.728.550		$ 22.329.715		$ 2.955.929		$ 22.329.715				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 87.191.392		$ 12.137.342		$ 99.328.733		$ 13.148.787		$ 99.328.733				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 87.191.392		$ 12.137.342		$ 99.328.733		$ 13.148.787		$ 99.328.733	100%	17%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 503.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES V Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES V Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (adiciones (+) y economías(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS V Parcial Directo (e=d*b)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f=a+d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS V Parcial Directo (g=f*b)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 V Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO V Parcial Directo (i=h*b)	% ejec del item (j=h/f)	% ejec del CTO (k=i/g)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l=f-h)	CANTIDADES POR EJECUTAR V Parcial Directo (m=l*b)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-021	12217	BICICLETA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
															0,00%	0,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		AIU	29,00%			-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Para originales)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+5)				87.300.235		9.408.792		76.108.818		10.192.826		76.108.818				-
		AIU	29,00%			19.001.905,0		2.728.920,0		22.329.715,0		2.805.829,0		22.329.715,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				87.191.392		12.137.342		99.328.733		13.148.787		99.328.733				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 492.671.267,00


Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DEL CASTILLO
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

72



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

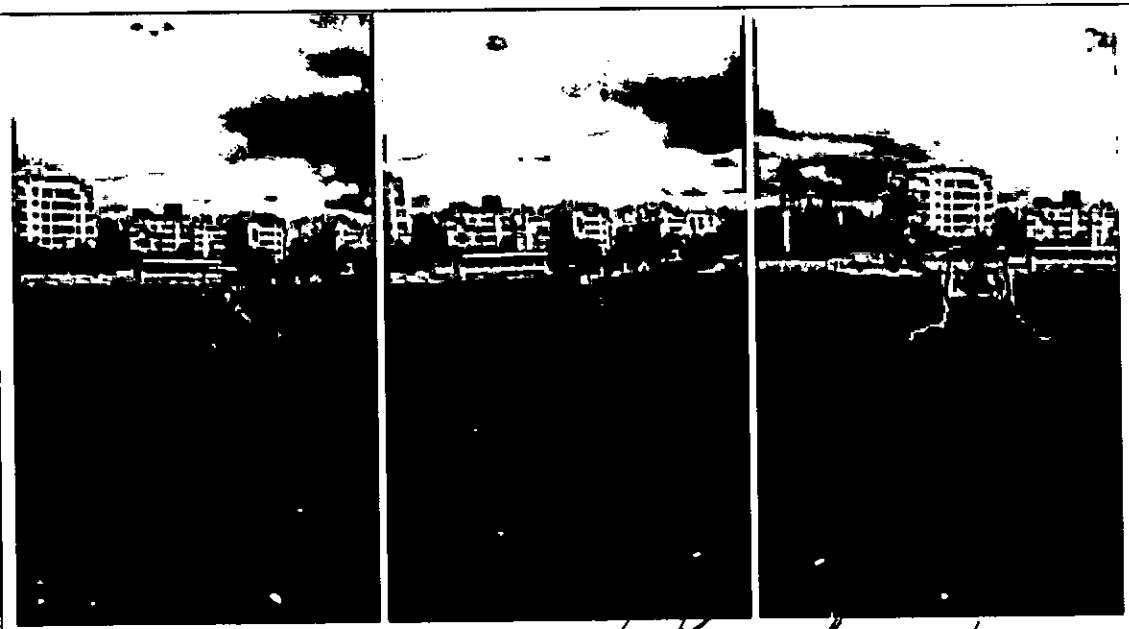CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
COUNTRY	02/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 13	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES: $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]	[h]		[i]	[j]	[j] / [f]	[j] / [k]	[l]	[m]
		ESTADIO ATAHUALPA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNID		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNID		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNID		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.stil. UDS)**	UNID		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	18	13.609	217.744	7,00	95.263	23	313.007	5	68.045	23	313.007	100,00%	0,0516%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	18	150.641	2.413.456	7,00	1.055.887	23	3.469.343	5	754.205	23	3.469.343	100,00%	0,5719%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10360	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13105	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
014	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3		84.663	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
015	12453	Empradización (Cesped,sacapanias, M.O. Hermta)	M2		6.013	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	10.250	411	4.212.750		-	10.250	4.212.750		-	10.250	4.212.750	100,00%	0,7100%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	-	560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	-	134	-	2.638,19	353.717	2.638	353.717		-	2.638	353.717	100,00%	0,0500%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)				CDCTO=	$ 6.843.950	$ 2.304.259	$ 9.230.349	$ 920.822			$ 9.230.349	100%	1,50%		$ -
		AIU				29,0 P.	$ 1.994.748	$ 694.347	$ 2.679.095	$ 278.508			$ 2.679.095				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)					$ 8.838.698	$ 3.088.646	$ 11.917.341	$ 1.243.330			$ 11.917.341				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)					$ 8.838.698	$ 3.088.648	$ 11.917.341	$ 1.243.330			$ 11.917.341	100%	2%		$ -	

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=)	DIFERENCIAS (adiciones (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e=)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=)	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (h)	% ejec del ítem (i.)	% ejec del CTO (i.)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (f)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (g=)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12717	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%		$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%		$ -
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		AIU				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base Adjudicación)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (A+B)				6.843.950		2.304.250		9.230.248		613.822		9.230.248				-
		AIU				1.984.745,0		884.347,0		2.879.092,0		278.308,0		2.879.092,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				8.828.696		3.088.646		11.917.341		1.243.330		11.917.341				-
X)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 580.082.659,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoría

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible] CRISTO
Director de [illegible]
Contrato 2940 de 2020

35

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO ATAHUALPA	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIDS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			OFERENCIAS (+ o -)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l] = [j] / [a]	[m] = [j] / CTO	[n]	[o] = [n] * [b]
		UDS SOFTBAL																
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MENIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00317%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	5	54.269	271.345		-	5	271.345		-	5	271.345	100,00%	0,03007%	-	$ -
010	101784	VIBROCOMP. BENTIN 1,5TON(Oper+Comb)**	HR		28.339	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	7.182,80	411	2.952.131		-	7.183	2.952.131		-	7.183	2.952.131	100,00%	0,32000%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1.567,30	134	212.086	7.956,00	1.064.424	9.523	1.276.509	1.567	212.086	9.523	1.276.509	100,00%	0,13837%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL			478.577													
001	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UND		48.630	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots +trazos cesped- (est.atl. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	10	13.809	135.030	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,00021%	-	$ -
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	10	120.077	1.200.770	2,00	240.154	12	1.440.924	2	240.154	12	1.440.924	100,00%	0,09237%	-	$ -
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,14007%	-	$ -
006	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UND		139.877	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
II		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)				COCTO=	$ 4.773.021	$ 2.163.228		$ 6.953.249		$ 821.029		$ 6.953.249	100%	1,17%		II $ -
		A.I.U				29,01%	$ 1.384.178	$ 632.205		$ 2.016.442		$ 180.272		$ 2.016.442				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)					$ 6.157.197	$ 2.812.494		$ 8.969.691		$ 801.901		$ 8.969.691				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -	$ -		$ -		$ -		$ -				II $ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)					$ 6.157.197	$ 2.812.494		$ 8.969.691		$ 801.901		$ 8.969.691	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
del	mes	anno
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el valor del contrato original)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 300.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l] = [k] / [g]	[m] = [k] / [f]	[n] [a] - [h]	[o] [e] - [i]
		KEM 8 NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ENCHAPE Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	8.900,00	8.900.237	8.901	8.900.237		-	8.901	8.900.237	100,00%	1,183%	-	-
						-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	-
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		8.900.237,0		8.900.237,0		-		8.900.237,0	100%	1,18%		-
		AIU	29%			-		2.020.878,0		2.020.878,0		-		2.020.878,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS COSTO + AIU PARQUE 1 (Valor antes del IVA)				-		8.916.116,0		8.916.116,0		-		8.916.116,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		8.916.116		8.916.116		-		8.916.116	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (A+B)				4.773.021		9.168.455		13.942.400		621.629		13.942.400				-
		AIU	29%			1.384.176,0		2.659.145,0		4.043.321,0		180.272,0		4.043.321,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.157.197		11.828.610		17.985.807		801.901		17.985.807				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 574.014.193,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FLEDDY [illegible] DIAZ
Director de [illegible]
Contrato 294[illegible]

98

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		


CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS SOFTBAL	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021
CAPITULO: REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL	CONTRATO DE OBRA No:	2940-2020

Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	UDS SOFTBOL	10-290

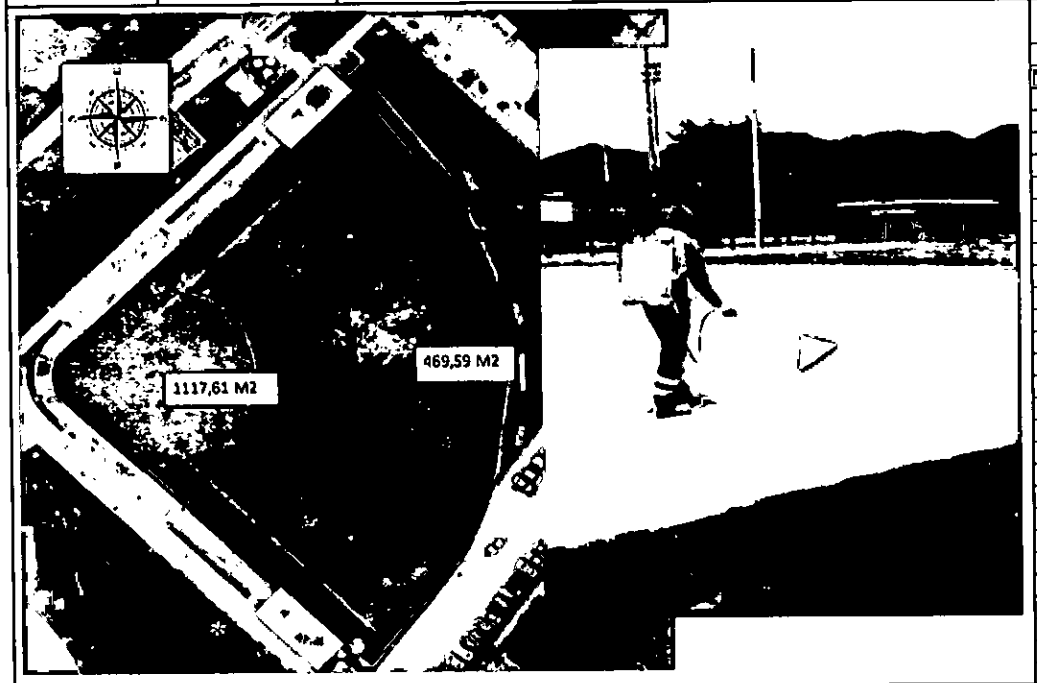

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
	1117,61			1,00	1.117,61
	469,59			1,00	469,59
				SUBTOTAL	1.587,20
		Pasan		M2	1.587,20
		Total		M2	1.587,20

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

$$\frac{1}{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 **VR. ADICIONES** $ 82.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% obra del ítem	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]	[h]		[i]	[j]	[j] / [a]		[k]	[l]
		UDS BEISBOL																
4		REPARACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.882													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Bando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
007	101046	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UND		216.584	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
008	100000	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR		113.472	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	8	54.269	434.152		-	8	434.152		-	8	434.152	100,00%	0,0500%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Vertiquiter + ayudante **	M2	10.346,16	411	4.252.272		-	10.346	4.252.272		-	10.346	4.252.272	100,00%	0,7200%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	3.206,84	134	429.717	16.034,20	2.148.583	19.241	2.578.299	3.207	429.717	19.241	2.578.299	100,00%	0,4400%	-	$ -
10		MTO. CAMPOS DE SOFTBOL Y BEISBOL			478.577													
001	12518	Demarcacion con tatco cancha mini-fútbol **	UND		48.630	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -rozas cesped- (est.atl. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	DESHIERBE/BORDEO CON GUADAÑA *	UND	10	13.609	136.090	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,0300%	-	$ -
004	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UND	10	120.077	1.200.770	2,00	240.154	12	1.440.924	2	240.154	12	1.440.924	100,00%	0,2400%	-	$ -
005	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	6,00	848.432	6	848.432	1	141.572	6	848.432	100,00%	0,1400%	-	$ -
006	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L, EST. ATL, UDS**	UND		139.877	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 6.453.001		$ 3.295.387		$ 9.748.387		$ 835.001		$ 9.748.387	100%	1,84%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.871.370		$ 946.962		$ 2.818.332		$ 243.212		$ 2.818.332				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 8.324.371		$ 4.212.349		$ 12.536.719		$ 1.081.873		$ 12.536.719				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 8.324.371		$ 4.212.349		$ 12.536.719		$ 1.081.873		$ 12.536.719	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 920.000.000 VR. ADICIONES $ 962.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit. Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c=]	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)] CANT [d]	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo [e=]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a+/-d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g=]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i=]	% ejec del item [i / g]	% ejec del CTO [i /]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [f]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [g=]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	172121	RODERIA Y DESMALEZADO DE LOTE "	M2		780	-	11.022,16	8.581.695	11.022	8.581.695		-	11.022	8.581.695	100,00%	1,45%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		8.581.695,0		8.581.695,0		-		8.581.695,0	100%	1,45%		-
		AIU	29,00%			-		2.488.688,0		2.488.688,0		-		2.488.688,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + NO PARQUE 1 (Base impto IVA)				-		11.070.374,0		11.070.374,0		-		11.070.374,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		11.070.374		11.070.374		-		11.070.374	-	1	0	-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=B)				6.453.001		11.847.072		18.300.072		838.001		18.300.072				-
		AIU	29,00%			1.871.370,0		3.435.651,0		5.307.021,0		243.212,0		5.307.021,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				8.324.371		15.282.723		23.607.093		1.081.873		23.607.093				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 958.392.907,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARCANNA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

82

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2**
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS BEISBOL	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	


Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoria : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021

CAPITULO:	**REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**	CONTRATO DE OBRA No:		2940-2020
Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	UDS BEISBOL	10-290

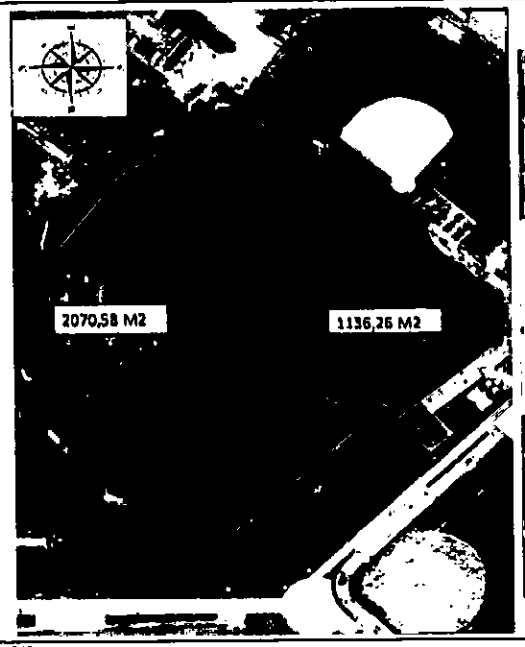



Localización	Dimensiones AREA	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
	1136,26			1,00	1.136,26
	2070,58			1,00	2.070,58
				SUBTOTAL	3.206,84
		Pasan		M2	3.206,84
		Total		M2	3.206,84

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES: $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	V/r Unit Directo	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo	CANT	V/r Parcial Directo			CANT	V/r Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a+-d]	[g] [a+-d]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]	[o]
		UDS ATLETISMO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mts2)			739.814													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNID		74.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNID		141.572	-	2,00	283.144	2	283.144	1	141.572	2	283.144	100,00%	0,0500%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNID		344.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozas cesped- (est.atl. UDS)**	UNID		14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID		13.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	10	150.541	1.505.410	2,00	301.082	12	1.810.082	2	301.082	12	1.810.082	100,00%	0,3100%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	8.346	411	3.430.206	-	-	8.346	3.430.206	-	-	8.346	3.430.206	100,00%	0,5900%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
12		MTO. PISTA DE LANZAMIENTO ESTADIO DE ATLETISMO UDS (AREA AP			288.375													
001	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L, EST. ATL. UDS**	UNID		139.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12512	Reparación divots -brozas cesped- (est.atl. UDS)**	UNID		14.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	10	13.609	136.090	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,0300%	-	$ -
004	12514	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UNID		120.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 5.074.701		$ 812.044		$ 5.886.750		$ 470.472		$ 5.886.750	100%	0,80%		$ -
		A.I.U			25,00%	$ 1.471.805		$ 177.493		$ 1.649.158		$ 136.437		$ 1.649.158				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.546.371		$ 789.537		$ 7.335.908		$ 606.909		$ 7.335.908				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.546.371		$ 789.537		$ 7.335.908		$ 606.909		$ 7.335.908	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Consecutivo / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato vigente)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (i / g)	% ejec del CTO (i / a)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (j)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (j*b)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-01	12217	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		750	-	8.346	6.703.950	8.346	6.703.950		-	8.346	6.703.950	100,00%	1,434%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		6.703.950,0		6.703.950,0		-		6.703.950,0	100%	1,15%		-
		A.I.U			29,00%	-		1.867.995,0		1.867.995,0		-		1.867.995,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (Valor original)				-		8.387.745,0		8.387.745,0		-		8.387.745,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		8.387.745		8.387.745		-		8.387.745	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=0)				3.074.700		7.121.924		12.196.624		470.472		12.196.624				-
		AIU			29,00%	1.471.025,0		2.065.358,0		3.537.023,0		136.437,0		3.537.023,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				8.546.371		9.187.282		15.733.653		606.909		15.733.653				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 576.266.347,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

98

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

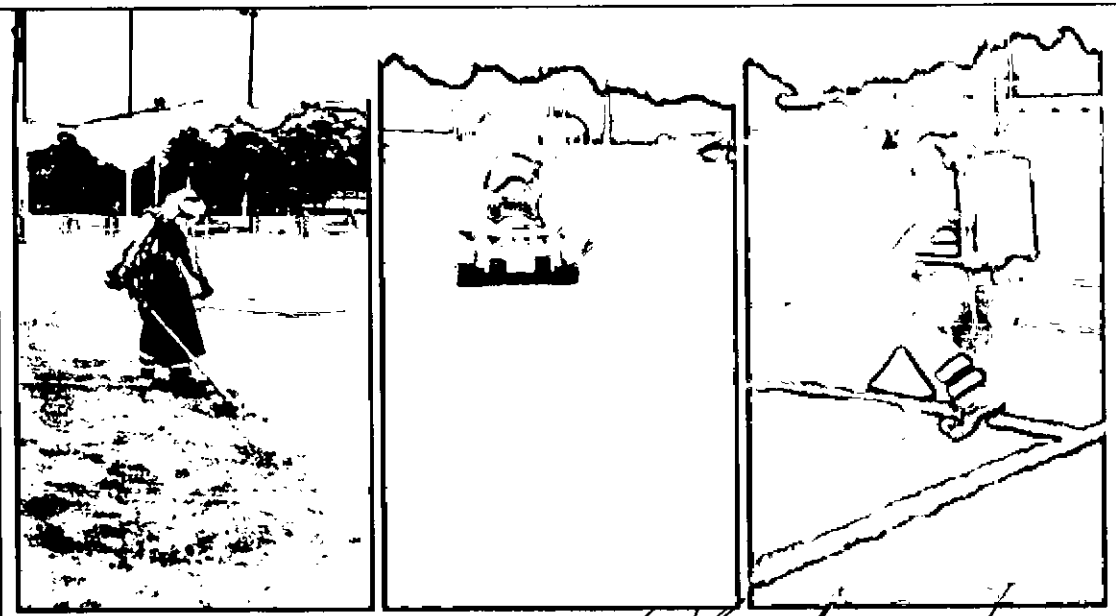CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS ATLETISMO	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 32.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRATUALES			DIFERENCIAS (menos (-) y mas (+))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f] [a]+[d]	Vr Parcial Directo [g]	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		UDS COMPLEJO PLAYA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.685	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación óvota -brazos cesped- (est.est. UDSF*	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	1,00	13.609	11	149.699	7	27.218	11	149.699	100,00%	0,0018%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND		150.841	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
008	100000	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR		113.472	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB)	HR	8	54.269	434.152		-	8	434.152		-	8	434.152	100,00%	0,0753%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	1.225	134	164.284	5.130	821.420	7.355	985.704	1.225	164.284	7.355	985.704	100,00%	0,1709%	-	$ -
020	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG		2.183	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
021	15239	Estructura marco futbol (sumsi e insta) IDRD	JGO		3.045.473	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)		CDCTO=		$ 734.520		$ 835.059		$ 1.569.555		$ 191.502		$ 1.569.555	100%	0,27%		$ -
		A.I.U		29,00%		$ 213.013		$ 242.108		$ 455.171		$ 55.536		$ 455.171				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 947.539		$ 1.077.167		$ 2.024.726		$ 247.038		$ 2.024.726				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 947.539		$ 1.077.167		$ 2.024.726		$ 247.038		$ 2.024.726	100%	0%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-		-		-		-		-	0,00%	0,00000%		$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00000%		$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		AIU				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS (costo + aiu) PARQUE 1 (costo ampliacion)				-		-		-		-		-				-
		diseños				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-	-	-		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+2)				734.526		835.029		1.569.555		191.532		1.569.555				-
		AIU				213.013,0		242.158,0		455.171,0		55.530,0		455.171,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				947.539		1.077.187		2.024.726		247.038		2.024.726				-
(3)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 399.873.274,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Director de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DE JESUS [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		


CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS COMPLEJO PLAYA	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. Visto Bueno Interventoría:_____

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021
CAPITULO: **REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**	CONTRATO DE OBRA No:	2940-2020

Item	Unidad	Descripción	Corte Número	Cancha	Código Parque
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	6	UDS PLAYA	10-290

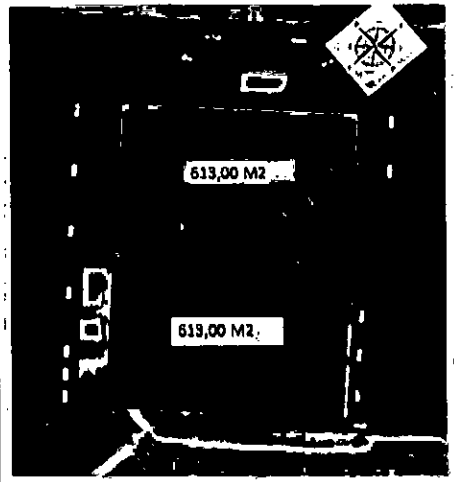



Localización	Dimensiones AREA	ANCHO	ALTO	CANT	Medida Total
[redacted]	613,00			1,00	613,00
[redacted]	613,00			1,00	613,00
				SUBTOTAL	1.226,00
		Pasan		M2	1.226,00
		Total		M2	[redacted]1.226,00

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por Intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (negativo (-) y mayores(+)) CANT [d]	DIFERENCIAS (negativo (-) y mayores(+)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		COMPLEJO ACUATICO PLAYA																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.195	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación diveta -trozos cesped- (est.alt. UDS)*	UND		14.812	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	6	13.609	81.654	4,00	54.436	10	136.090	1	13.609	10	136.090	100,00%	0,0200%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND		150.841	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.514	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
008	100000	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR		113.472	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
009	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	4	54.269	217.078		-	4	217.078		-	4	217.078	100,00%	0,0410%	-	$ -
010	101784	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR		26.335	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	63133	134	84.404	3.151,85	422.321	3.787	506.785	63133	84.404	3.787	506.785	100,00%	0,0570%	-	$ -
020	12164	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG		2.185	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
021	15239	Estructura marco futbol (surmat o insta) IDRD	JGO		3.945.473	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO->	$ 383.194		$ 476.757		$ 859.951		$ 58.073		$ 859.951	100%	0,13%		$ -
		AIU			29,0%->	$ 111.126		$ 138.260		$ 249.386		$ 28.441		$ 249.386				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 494.320		$ 615.017		$ 1.109.337		$ 126.514		$ 1.109.337				$ -
		DISEÑO																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 494.320		$ 615.017		$ 1.109.337		$ 126.514		$ 1.109.337	100%	0%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Consecutivo / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el número del contrato suscrito)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+aumentos (+) y economías(-)) CANT	DIFERENCIAS (+aumentos (+) y economías(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(d)	(g)			(h)	(i)	(j)=(h)/(a)	(k)=(h)/(f)	(l)=(a)-(h)	(m)=(l)*(b)
		ITEM'S NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122129	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780										0,00%	0,0000%		$ -
															0,00%	0,0000%		$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1													0%	0,00%		
		A.I.U	29,00%															
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Obra adicional)																
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO																
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)																
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1																
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+2)				383.194		476.757		859.951		68.073		859.951				
		AIU	29,00%			111.126,0		138.200,0		249.326,0		39.441,0		249.326,0				
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				494.320		615.017		1.109.337		126.514		1.109.337				-
(3)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 582.000.663,00


Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FELIPE [illegible] GOMEZ DIAZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

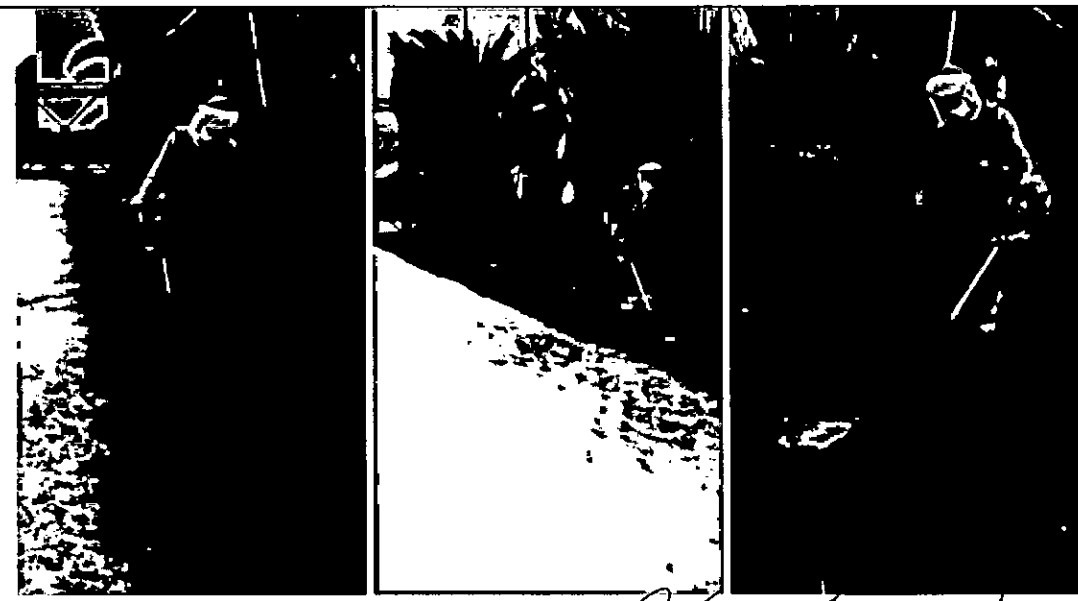
CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
COMPLEJO ACUATICO PLAYA	19/07/2021	SE REALIZAN BORDEO 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

94

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO:
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2	Contratista: MAQUINAS Y GRAMAS LTDA	Hoja No. 1 de 1
	Interventoría : ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S	FECHA: 30 JULIO 2021
CAPITULO:	**REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBOL**	CONTRATO DE OBRA No: 2940-2020

Item	Unidad	Descripción
4-019	M2	Fumigación (Fungicida+Adherente) **

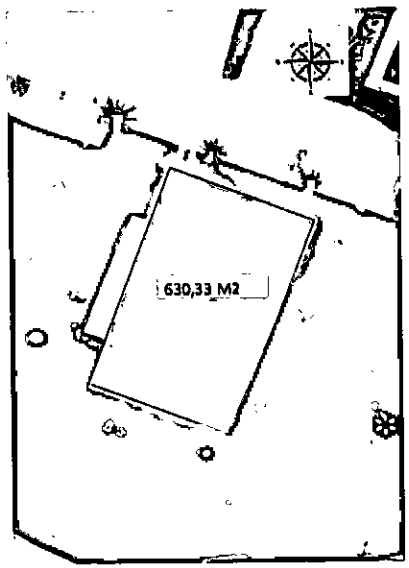



Corte Número	Cancha	Código Parque
6	COMPLEJO ACUATICO PLAYA	12-1000

Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
	630,33			1,00	630,33
				SUBTOTAL	630,33
				M2	630,33
				M2	630,33

Pasan

Total

NOTA:

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

95

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 909.000.000 VR. ADICION $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativa (+) y positiva(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% obra del ítem	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j] = [a]+[h]	[k]	[l] = [j]/[a]	[m] = [j]/CTO	[n]	[o]
		FLORIDA MARACANA 1																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mb2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)*	UND		14.612	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0100%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,1100%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.653	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora moca cada 7 cm **	M2	6.000	682	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	1.663,47	819.316	4.007	1.645.684	-	-	4.007	1.645.684	100,00%	0,2803%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)				CDCTO->	$ 5.007.200	$ 777.347	$ 4.319.853	$ 630.562			$ 4.319.853	100%	0,73%		$ -
		A.I.U				28,01%	$ 1.478.188	$ 225.431	$ 1.252.757	$ 182.889			$ 1.252.757				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)					$ 6.575.388	$ 1.002.778	$ 5.572.610	$ 813.451			$ 5.572.610				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)					$ 6.575.388	-$ 1.002.778	$ 5.572.610	$ 813.451			$ 5.572.610	100%	1%		$ -	

96

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. Final parques Intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) CANT	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]		[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	127123	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	4.004,53	3.125.093	4.007	3.125.093		-	4.007	3.125.093	100,072%	0,537%	-	$ -
															0,072%	0,0000%	-	$ -
01		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		3.125.093,0		3.125.093,0		-		3.125.093,0	100%	0,537%		-
		AIU	29,0%			-		906.277,0		906.277,0		-		906.277,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (Base adquisición)				-		4.031.370,0		4.031.370,0		-		4.031.370,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		4.031.370		4.031.370		-		4.031.370	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+I)				5.037.200		2.547.740		7.444.940		830.592		7.444.940				-
		AIU	29,0%			1.478.180,0		660.840,0		2.139.034,0		182.008,0		2.139.034,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		3.028.592		9.603.980		813.451		9.603.980				-
10		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 582.396.020,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoría


Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2944 de 2020

Ing. FREDDY DU[illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

47

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

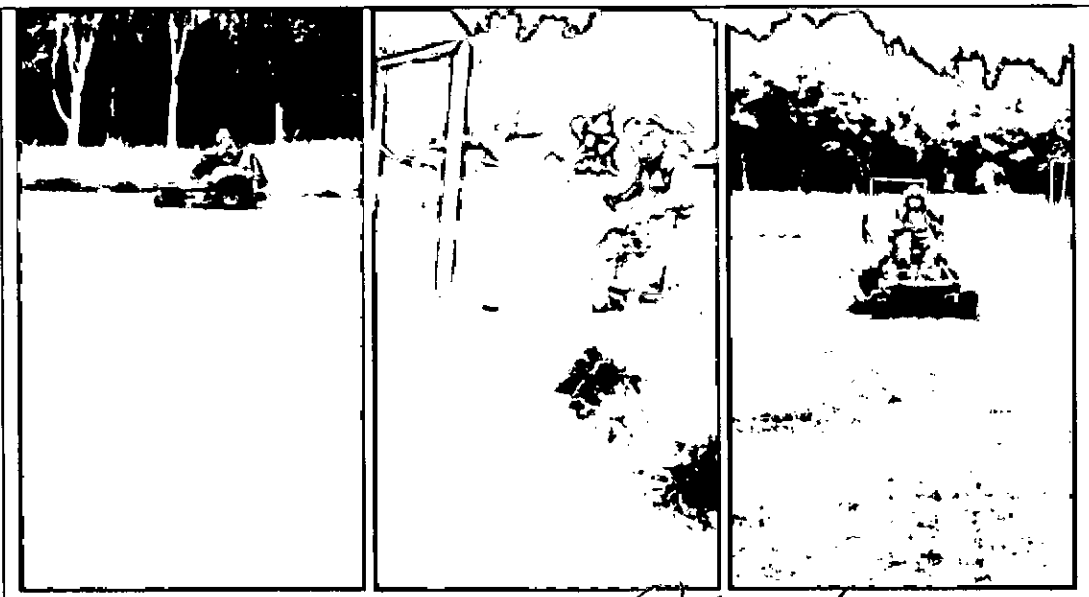CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA MARACANA 1	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. Visto Bueno Interventoría:_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
día	mes	anno
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. total parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIDS	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] (a)+(d)	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]			[l]	[m]
		FLORIDA MARACANA 2																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mt2)			739,914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74,685	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141,572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344,195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación dnots -brozas cesped- (estLati. UDS)**	UND		14,812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13,609	217,744	8,00	108,872	8	108,872	2	27,718	8	108,872	100,00%	0,020%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150,841	2,413,456	1,00	150,841	17	2,564,297	4	633,364	17	2,564,297	100,00%	0,43,0%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BE/SBO			13,712,682													
001	10380	Excavación mecanic+ retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26,614	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,00,00%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35,693	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,000%	-	$ -
017	12458	Verticutter + ayudante **	M2	6,000	411	2,466,00	1,853,38	815,189	4,017	1,850,831		-	4,017	1,850,831	100,00%	0,20,0%	-	$ -
018	12459	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,07%	0,00,00%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	CDCTO=>			$ 3,067,203		-$ 773,203		$ 4,334,000		$ 813,567		$ 4,334,000	100%	0,73%		$ -
		A.I.U	29,0%			$ 1,478,188		-$ 224,226		$ 1,253,963		$ 182,909		$ 1,253,963				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 6,575,388		-$ 997,428		$ 5,577,963		$ 813,451		$ 5,577,963				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6,575,388		-$ 997,428		$ 5,577,960		$ 813,451		$ 5,577,960	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. totale parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:


ITEM	CODI	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativo (-) y positivo (+)) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a] + [d]	[g] = [b] x [f]	[h]	[i] = [b] x [h]	[j]	[k] = [b] x [j]	[l]	[m] = [b] x [l]	[n] = [l] / [f]	[o] = [l] / [h]	[p] = [f] - [l]	[q] = [b] x [p]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	127-12	ROCERIA Y EMPRADIZADO DE LOTE **	M2		780	-	4.016,80	3.132.504	4.017	3.132.504		-	4.017	3.132.504	100,00%	0,53%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		3.132.504,0		3.132.504,0		-		3.132.504,0	100%	0,53%		-
		AIU			29,0%	-		908.500,0		908.500,0		-		908.500,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + NO PARQUE 1 (costo directo+AIU)				-		4.041.524,0		4.041.524,0		-		4.041.524,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUB TOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		4.041.524		4.041.524		-		4.041.524	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+I)				5.087.200		2.308.784		7.405.984		830.282		7.405.984				-
		AIU			29,0%	1.478.188,0		984.332,0		2.462.520,0		182.968,0		2.462.520,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		3.044.098		9.619.484		813.451		9.619.484				-
K)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 582.380.516,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DEL CASTILLO GIRALDO
Director de Obra
Contrato 2940 DE 2020



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA MARACANA 2	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____.

Visto Bueno Interventoría:_____

$$-\frac{1}{2}\omega R$$

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.001,00 VR. FINAL CONTRATO $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y menores (-) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]=[a]+[d]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]=[j]/[f]	[m]=[j]/CTO	[n]=[f]-[j]	[o]=[n]*[b]
		FLORIDA 1																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mts2)			738.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.865	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación dvots -brotes cesped- (est.sti. UOS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.606	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0200%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,4400%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.603	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticuttar + ayudante **	M2	8.000	411	2.466.000	1.408,56	578.926	7.409	3.044.926		-	7.409	3.044.926	100,00%	0,5100%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	CDCTO=			$ 5.027.203		$ 833.885		$ 5.718.035		$ 603.582		$ 5.718.035	100%	0,97%		$ -
		A.I.U	29,0%			$ 1.478.188		$ 183.000		$ 1.658.348		$ 182.869		$ 1.658.348				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 800.955		$ 7.376.343		$ 813.451		$ 7.376.343				$ -
		DIBUJOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DIBUJO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DIBUJOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 800.955		$ 7.376.343		$ 813.451		$ 7.376.343	100%	1%		$ -

102

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

FECHA: 30 JULIO 2021 (día / mes / año) — Página de

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. BSIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 992.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Parcial Directo	DIFERENCIAS (aumentos (+) y economías(-)) CANT	DIFERENCIAS V/r Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS V/r Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 V/r Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO V/r Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR V/r Parcial Directo
		ITEM'S NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-021	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	7.408,58	5.778.692	7.408	5.778.692		-	7.408	5.778.692	100,00%	0,583%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
II)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.778.692,0		5.778.692,0		-		5.778.692,0	100%	0,58%		-
		AIU	29,00%			-		1.675.821,0		1.675.821,0		-		1.675.821,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS PARQUE 1 (costo directo + AIU)				-		7.454.513,0		7.454.513,0		-		7.454.513,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.454.513		7.454.513		-		7.454.513	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+II)				5.097.200		9.360.787		11.457.787		633.582		11.460.787				-
		AIU	29,00%			1.478.188,0		1.855.893,0		3.334.068,0		182.868,0		3.334.068,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		8.255.487		14.630.855		813.451		14.830.855				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 577.188.448,00


V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DEL CRISTO ORTEGA DIAZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

103



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

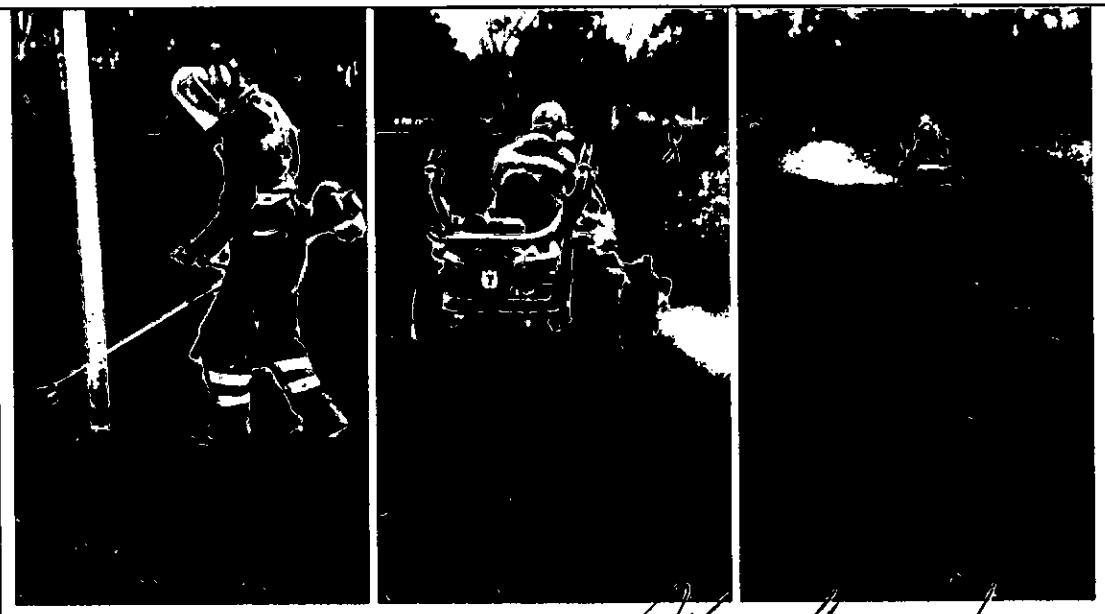CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA I	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA O.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES: $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (+adiciones (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]			[h]	[i]	[i]	[k]	[l]	[m]
		FLORIDA 2																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UNID		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UNID		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UNID		344.185	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.all. UDS)**	UNID		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	16	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0200%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,4400%	-	$ -
4		REPARACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL, MENIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10360	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12458	Verticutter + ayudante **	M2	8.000	411	3.400.000	1.148,77	472.144	7.148	2.939.144		-	7.148	2.939.144	100,00%	0,5000%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
1		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)		COCTO=		$ 5.037.200		$ 514.113		$ 5.811.313		$ 603.592		$ 5.811.313	100%	0,99%		$ -
		AIU		29,0%		$ 1.479.188		$ 148.093		$ 1.627.281		$ 182.859		$ 1.627.281				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 663.205		$ 7.238.594		$ 813.451		$ 7.238.594				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 663.205		$ 7.238.594		$ 813.451		$ 7.238.594	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (e)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE "	M2		780	-	7.148,77	5.578.041	7.149	5.578.041		-	7.149	5.578.041	100,00%	6,940%	-	-
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	-
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.578.041,0		5.578.041,0		-		5.578.041,0	100%	0,94%		-
		A.I.U			29,00%	-		1.617.052,0		1.617.052,0		-		1.617.052,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (costo ampliación)				-		7.193.093,0		7.193.093,0		-		7.193.093,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.193.093		7.193.093		-		7.193.093	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+8)				5.097.200		6.000.154		11.187.354		610.562		11.187.354				-
		AIU			29,00%	1.478.188,0		1.708.145,0		3.344.333,0		182.808,0		3.344.333,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		7.858.299		14.431.687		813.451		14.431.687				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 577.568.313,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Ing. MARIANA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DEL CASTILLO
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

901

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 2	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIDB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (menores (+) y mayores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]=[a]*[b]	[d]	[e]=[c]*[d]	[f]=[a]+[d]	[g]=[f]*[b]	[h]	[i]=[h]*[b]	[j]	[k]=[j]*[b]	[l]=[j]/[a]	[m]=[k]/$ CTO	[n]=[a]-[j]	[o]=[n]*[b]
		FLORIDA 3																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	3,00	424.716	3	424.716	1	141.572	3	424.716	100,00%	0,057%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND		344.105	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación orvots -brozos cesped- (esl.ati. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,015%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,430%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	505,59	345.198	6.587	2.711.198		-	6.587	2.711.198	100,00%	0,460%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			COCTO=	$ 5.027.200		$ 711.883		$ 5.639.083		$ 772.154		$ 5.639.083	100%	0,96%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.478.188		$ 205.446		$ 1.694.634		$ 223.925		$ 1.694.634				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 918.329		$ 7.493.717		$ 996.079		$ 7.493.717				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 918.329		$ 7.493.717		$ 996.079		$ 7.493.717	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato suscrito)

No. total parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (Mayores (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (Mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g] [a]+[d]*[b]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NPAQ01	122121	ROCERIA Y DESMEZADO DE LOTE **	M2	780		-	6.507,39	5.145.340	6.507	5.145.340		-	6.507	5.145.340	100,00%	0,8700%	-	$ -
														-	0,00%	0,0000%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.145.340,0		5.145.340,0		-		5.145.340,0	100%	0,87%		-
		A.I.U		29,00%		-		1.492.148,0		1.492.148,0		-		1.492.148,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS (ítem + ítem PARQUE 1 (ítem anterior))				-		6.637.488,0		6.637.488,0		-		6.637.488,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.637.488		6.637.488		-		6.637.488	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				5.027.210		5.857.223		10.954.423		772.154		10.954.423				-
		A.I.U		29,00%		1.478.180,0		1.698.595,0		3.176.783,0		223.925,0		3.176.783,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		7.555.818		14.131.206		996.079		14.131.206				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 577.868.794,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de Interventoria

Ana MARGARITA PEREZ
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. TEDDY DEL CIELO CO
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

109

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

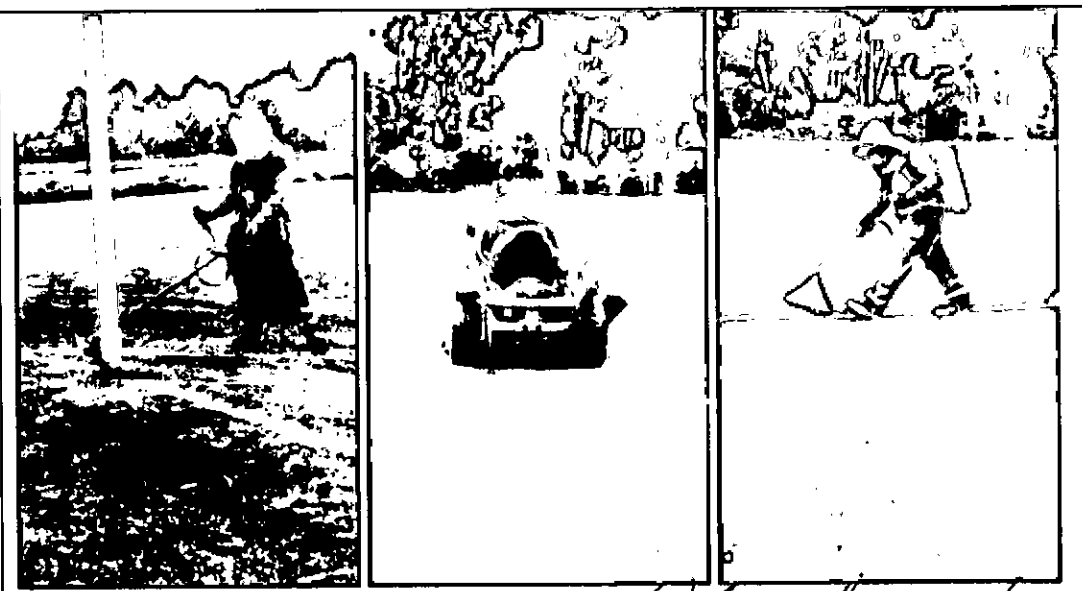CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 3	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2, DEMARCACIÓN I (07/07/2021)	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 **VR. ADICIONES** $ 62.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 562.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 5		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	V Unit Directo	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo			CANT	V Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]			[h]	[i]			[f]-[h]	[j]
		FLORIDA 4																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.865	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	3,00	424.716	3	424.716	1	141.572	3	424.716	100,00%	0,00%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.std. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	18	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,00%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	18	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	633.304	17	2.564.297	100,00%	0,43%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
017	12468	Vertcutter + ayudante **	M2	8.000	411	2.466.000	43,91	18.047	8.044	2.484.047		-	8.044	2.484.047	100,00%	0,43%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressang + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente)**	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)	COSTO=			$ 5.027.200		$ 484.737		$ 5.511.937		$ 772.154		$ 5.511.937	100%	0,94%		$ -
		A.I.U	29,0%			$ 1.478.188		$ 140.572		$ 1.618.760		$ 223.925		$ 1.618.760				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 625.304		$ 7.200.692		$ 996.079		$ 7.200.692				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR UDL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 6.575.388		$ 625.304		$ 7.200.692		$ 996.079		$ 7.200.692	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+) y menores(-) CANT	DIFERENCIAS (+) y menores(-) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]=[e]+[f]					[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP.001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		760	-	6.043,91	4.714.250	6.044	4.714.250		-	6.044	4.714.250	100,07%	0,80%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
E)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		4.714.250,0		4.714.250,0		-		4.714.250,0	100%	0,80%		-
		A.I.U			29,0%	-		1.367.133,0		1.367.133,0		-		1.367.133,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Costos asignados)				-		6.081.383,0		6.081.383,0		-		6.081.383,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.081.383		6.081.383		-		6.081.383	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=E)				5.007.303		5.155.052		10.234.182		772.154		10.234.182				-
		AIU			29,0%	1.478.185,0		1.507.705,0		2.985.890,0		223.925,0		2.985.890,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		6.706.687		13.282.075		998.079		13.282.075				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 579.717.925,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. [illegible]
Director de Interventoria
Contrato 2940 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 3000 de 2020

112

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 4	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1 (07/07/2021)	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit. Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g] = [c]+[e]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l] = [j] / [a]	[m] = [k] / [g]	[n] = [a] - [j]	[o] = [g] - [k]
		FLORIDA 5																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozos cesped- (est.ed. UOS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.509	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,00%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	623.304	17	2.564.297	100,00%	0,43%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	1.630,29	672.515	4.364	1.793.485		-	4.364	1.793.485	100,07%	0,30%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	CDCTO=			$ 5.097.200		$ 930.346		$ 4.466.854		$ 830.582		$ 4.466.854	100%	0,79%		$ -
		A.I.U	29,17%			$ 1.478.188		$ 182.858		$ 1.295.330		$ 182.869		$ 1.295.330				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 813.404		$ 5.761.984		$ 813.451		$ 5.761.984				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		-$ 813.404		$ 5.761.984		$ 813.451		$ 5.761.984	100%	1%		$ -

h1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(d)	(g) = (c)+(e)			(h)	(i)	(j) = (i) / (g)	(k) = (i) / (Total CTO)	(l) = (a) - (h)	(m) = (l) * (b)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE I																
NP-021	122121	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	4.353,71	3.403.604	4.354	3.403.604		-	4.354	3.403.604	100,03%	0,50%	-	$ -
															0,03%	0,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE I				-		3.403.604,0		3.403.604,0		-		3.403.604,0	100%	0,37%		-
		AIU				-	29,17%	993.071,0		993.071,0		-		993.071,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE I (Otros adicionales)				-		4.300.765,0		4.300.765,0		-		4.300.765,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE I				-		4.300.765		4.300.765		-		4.300.765	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				5.097.203		2.773.148		7.870.348		630.582		7.870.348				-
		AIU				1.478.188,0	29,17%	804.213,0		2.282.401,0		182.508,0		2.282.401,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		3.577.361		10.152.749		813.451		10.152.749				-
(3)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 381.847.251,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020


15

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 5	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____



ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÍTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por Intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques Intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit. Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del Item (j)	% ejec del CTO (k)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		FLORIDA 6																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.sti. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0000%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.304	17	2.564.297	100,00%	0,4300%	-	$ -
4		REPARACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		582	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	743,38	305.521	6.743	2.771.521		-	6.743	2.771.521	100,00%	0,4700%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			COSTO=	$ 5.007.200		$ 347.403		$ 5.444.603		$ 630.502		$ 5.444.603	100%	0,92%		$ -
		A.I.U			29,0%=	$ 1.478.185		$ 100.772		$ 1.578.900		$ 182.808		$ 1.578.900				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 448.262		$ 7.023.650		$ 813.451		$ 7.023.650				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 448.262		$ 7.023.650		$ 813.451		$ 7.023.650	100%	1%		$ -

11

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021 / del ... ... / Página ... de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES: $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (+adiciones (+) y menores(-)) CANT	DIFERENCIAS (+adiciones (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEM'S NO PREVISTOS PARQUE 1																
INF-031	12212	ROCERIA Y DESALOJO DE LOTE **	M2		780	-	6.743,30	5.259.821	6.743	5.259.821		-	6.743	5.259.821	100,000%	0,904%	-	$ -
								-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.259.821,0		5.259.821,0		-		5.259.821,0	100%	0,90%		-
		A.I.U.			29,00%	-		1.525.348,0		1.525.348,0		-		1.525.348,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS (costo + AIU) PARQUE 1 (Favor diligenciar)				-		6.785.169,0		6.785.169,0		-		6.785.169,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.785.169		6.785.169		-		6.785.169	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+B)				5.027.203		5.027.311		10.704.511		633.582		10.704.511				-
		AIU			29,00%	1.478.186,0		1.826.123,0		3.304.308,0		182.058,0		3.304.308,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		7.233.431		13.808.819		813.451		13.808.819				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 578.191.181,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Dirección de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. TEDDY DEL C... RAZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

118

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 6	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 43

VR. INIC. CONTRATO: $ 900.000.000 **VR. ADICIONES** $ 92.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 992.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (menos (-) y sobrantes +)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del Item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l] = [j] / [f]	[m] = [j] / [CTO]	[n]	[o]
		FLORIDA 7																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.685	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -erozos cesped- (est.alt. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0033%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,4300%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBÓL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retro(250m3/dia)V-8m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	438,48	180.219	6.438	2.646.219		-	6.438	2.646.219	100,00%	0,4500%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressang + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)				COCTO>>	$ 5.027.203	$ 222.108	$ 5.319.388	$ 630.582			$ 5.319.388	100%	0,47%		$ -	
		AIU				29,00%	$ 1.478.185	$ 64.435	$ 1.542.623	$ 182.868			$ 1.542.623				$ -	
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)					$ 6.575.388	$ 286.623	$ 6.862.011	$ 813.451			$ 6.862.011				$ -	
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -	$ -	$ -	$ -			$ -				$ -	
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)					$ 6.575.388	$ 286.623	$ 6.862.011	$ 813.451			$ 6.862.011	100%	1%		$ -	

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativo (-) o positivo (+)) CANT	DIFERENCIAS (negativo (-) o positivo (+)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	122121	ROCERIA Y DESALAMBRADO DE LOTE**	M2		750	-	6.436,48	5.022.022	6.436	5.022.022		-	6.436	5.022.022	100,00%	0,85,00%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.022.022,0		5.022.022,0		-		5.022.022,0	100%	0,85%		-
		A.I.U	29,00%			-		1.456.386,0		1.456.386,0		-		1.456.386,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (base gravable)				-		6.478.408,0		6.478.408,0		-		6.478.408,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.478.408		6.478.408		-		6.478.408	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (1+3)				5.087.200		5.344.210		10.341.410		643.587		10.341.410				-
		AIU	29,00%			1.476.188,0		1.500.821,0		2.900.038,0		182.038,0		2.900.038,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		6.765.031		13.340.419		813.451		13.340.419				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 576.809.581,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FELIPE [illegible]
Director de O[illegible]
Contrato 2940 [illegible]

121

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

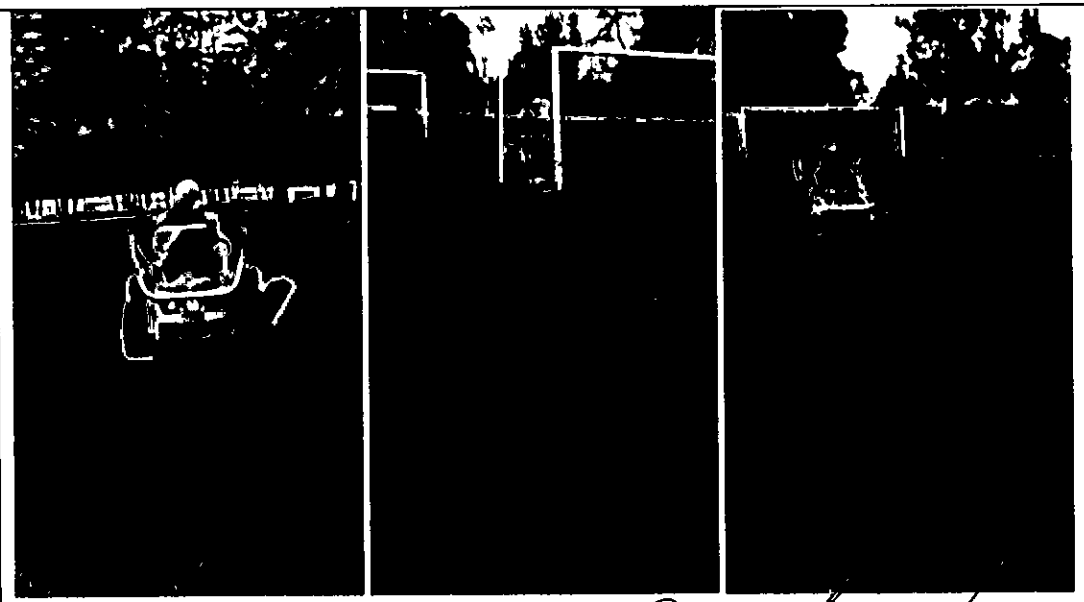CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 7	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INC. CONTRATO: $ 500,000,000 VR. ADICIONES $ 82,000,000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582,000,000 No. Final parques intervenidos: ___

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes(+))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 9		ACUMULADO		% obra del tramo	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(d)	(g)			(h)	(i)			(j)	(k)
		FLORIDA 6																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox., 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UNID		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UNID		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UNID		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.sti. UDS)**	UNID		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	14	13.609	217.744	8,00	108.872	8	108.872	2	27.218	8	108.872	100,00%	0,0000%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.394	17	2.564.297	100,00%	0,4400%		
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	1.103,11	452.145	7.103	2.918.145		-	7.103	2.918.145	100,00%	0,4400%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida +Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
6		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	CDCTO=			$ 5.097.200		$ 404.114		$ 5.581.314		$ 630.562		$ 5.581.314	100%	0,94%		$ -
		A.I.U	29,00%			$ 1.478.188		$ 143.293		$ 1.621.481		$ 182.889		$ 1.621.481				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 637.407		$ 7.212.795		$ 813.451		$ 7.212.795				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.575.388		$ 637.407		$ 7.212.795		$ 813.451		$ 7.212.795	100%	15%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el número total de parques suscritos)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 5.000.000.000 VR. ADICIONES: $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES V/r Parcial Directo [c=a*b]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) V/r Parcial Directo [e=b*d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f=(a+d)]	CONDICIONES ACTUALIZADAS V/r Parcial Directo [g=b*f]	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 V/r Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO V/r Parcial Directo [i=b*h]	% ejec del item [i / g]	% ejec del CTO [i / c]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [f-h]	CANTIDADES POR EJECUTAR V/r Parcial Directo [f-i]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2	780		-	7.100,11	5.538.085	7.100	5.538.085		-	7.100	5.538.085	100,00%	0,94%	-	$ -
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.538.085,0		5.538.085,0		-		5.538.085,0	100%	0,94%		-
		AIU			29,04%	-		1.606.045,0		1.606.045,0				1.606.045,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS ítem + AIU PARQUE 1 (Base weight d ind				-		7.144.131,0		7.144.131,0		-		7.144.131,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUB TOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.144.131		7.144.131		-		7.144.131	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=B)				5.087.200		6.032.200		11.129.400		630.562		11.129.400				-
		AIU			29,04%	1.478.188,0		1.749.338,0		3.227.520,0		182.009,0		3.227.520,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		7.781.538		14.356.928		813.451		14.356.928				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 577.643.072,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

421

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

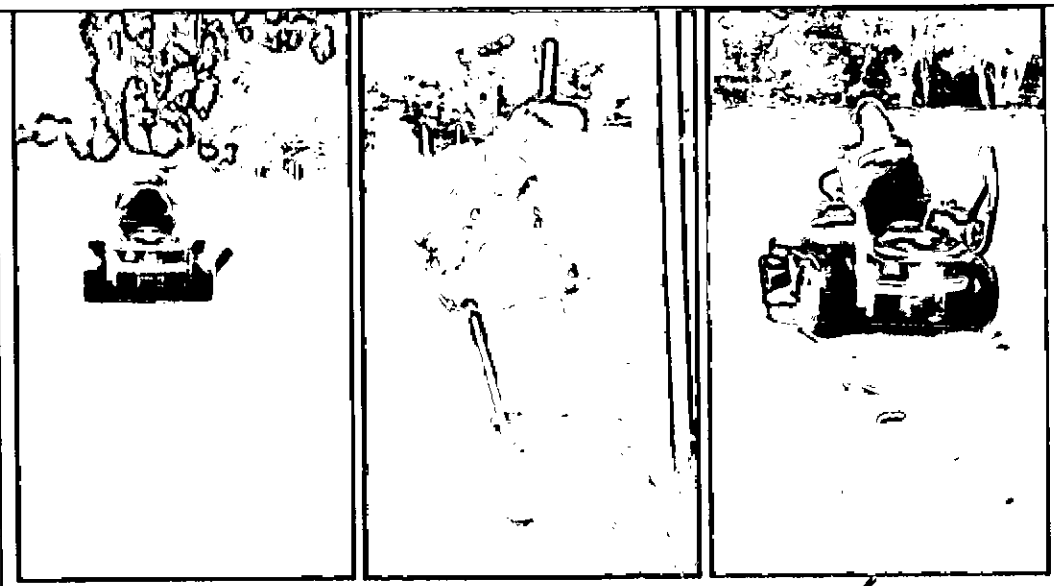CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 8	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VRL ADICIONES $ 82.000.000,00 VRL FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g] = [b]x[f]	[h]	[i] = [b]x[h]	[j] = [f]+[h]	[k] = [i]+[g]	[l] = [h]/[f]	[m] = [k]/$ CTO	[n] = [a]-[j]	[o] = [n]x[b]
		FLORIDA 9																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mts2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.alt. UOSF*	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	16	13.609	217.744	6,00	109.872	8	109.872	2	27.218	8	109.872	100,00%	0,0200%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	16	150.841	2.413.456	1,00	150.841	17	2.564.297	4	603.364	17	2.564.297	100,00%	0,4403%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.814	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13105	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		33.693	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.000	411	2.466.000	1.475,34	606.304	7.475	3.072.304		-	7.475	3.072.304	100,00%	0,5400%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressang + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (ítems originales)			COCTO= >	$ 5.027.200		$ 866.253		$ 5.745.453		$ 830.562		$ 5.745.453	100%	0,87%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.478.188		$ 165.035		$ 1.665.193		$ 182.889		$ 1.665.193				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (ítems originales)				$ 6.573.388		$ 830.298		$ 7.411.686		$ 813.451		$ 7.411.686				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (ítems originales)				$ 6.575.388		$ 830.298		$ 7.411.686		$ 813.451		$ 7.411.686	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
día	mes	año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el número de contrato inicial)

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.800.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (j)	% ejec del CTO (k)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	NIVELACION Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	7.475,34	5.830.687	7.475	5.830.687		-	7.475	5.830.687	100,00%	0,95%	-	$ -
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
(D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		5.830.687,0		5.830.687,0		-		5.830.687,0	100%	0,78%		-
		A.I.U			29,0%	-		1.690.899,0		1.690.899,0		-		1.690.899,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS obra + AIU PARQUE 1 (Costo adaptado)				-		7.521.586,0		7.521.586,0		-		7.521.586,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7.521.586		7.521.586		-		7.521.586	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+B)				5.007.200		6.478.980		11.576.180		630.582		11.576.180				-
		AIU			29,0%	1.478.188,0		1.878.934,0		3.357.082,0		182.008,0		3.357.082,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.575.388		8.357.884		14.933.272		813.451		14.933.272				-
(K)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 577.668.728,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoría

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

124

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 9	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indique el número de acta que sigue)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativos (+) y sobrantes (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	V Unit Directo	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo	CANT	V Parcial Directo			CANT	V Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] = [a]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j] = [h]/[f]	[k] = [h]/[a]	[l]	[m]
		FONTANAR																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mt2)			739,914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	3,00	424.716	3	424.716	1	141.572	3	424.716	100,00%	0,0729%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brotes cesped- (est.atl. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	1,00	13.609	11	149.699	2	27.218	11	149.699	100,00%	0,0257%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	1,00	150.841	11	1.659.251	2	301.682	11	1.659.251	100,00%	0,2851%	-	$ -
8		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 1.644.300		$ 598.140		$ 2.233.009		$ 476.472		$ 2.233.009	100%	0,38%		$ -
		A.I.U			29,0 %	$ 476.505		$ 170.858		$ 647.763		$ 138.437		$ 647.763				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 2.121.405		$ 769.024		$ 2.881.429		$ 614.909		$ 2.881.429				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 2.121.405		$ 760.024		$ 2.881.429		$ 606.909		$ 2.881.429	100%	0%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 935.000.000 VR. ADICIONES: $ 912.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CEDI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% obra del item	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-021	UZ12	ROCALLA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
															0,00%	0,033%		
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		-		-		-		-	0%	0,00%		-
		AIU		29,00%		-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Valor antes de IVA)				-		-		-		-		-				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		-		-		-		-				-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (N9)				1.944.300		528.105		2.233.000		470.472		2.233.000				-
		AIU		29,00%		476.925,0		170.658,0		647.763,0		136.437,0		647.763,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				2.121.405		760.024		2.881.429		606.909		2.881.429				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 388.118.571,00


V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria


Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

130



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

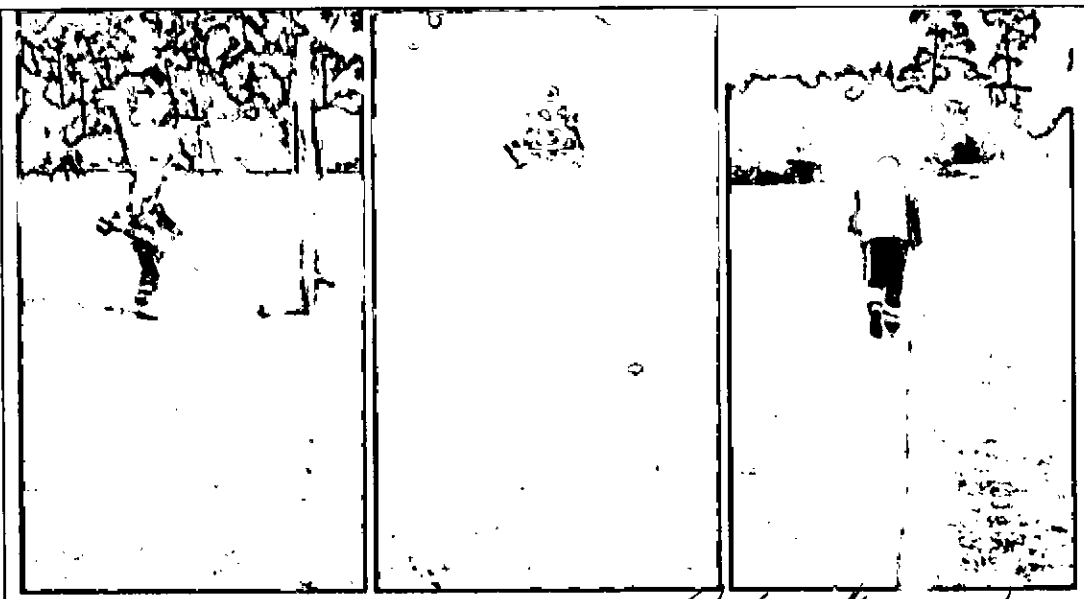CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FONTANAR	13/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. **Visto Bueno Interventoría:** _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

(Indicar # parq. del parque contrat.)

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) = (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del ítem (j) = (h)/(f)	% ejec del CTO (k) = (i)/(c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		CIUDADELA COLSUBSIDIO				-		-		-				-				$ -
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914	-		-		-				-				$ -
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UNID		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UNID		141.572	-	6,00	848.432	6	848.432	1	141.572	6	848.432	100,00%	0,1400%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UNID		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -brozos cesped- (est.aU. UDS)**	UNID		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UNID	10	13.609	136.090	8,00	122.481	18	258.571	4	54.436	18	258.571	100,00%	0,0400%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UNID	10	150.841	1.508.410	8,00	1.357.569	18	2.865.979	4	603.364	18	2.865.979	100,00%	0,4600%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.882													
001	10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-8m3-S.Blando	M3		26.614	-		-		-		-		-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3		35.693	-	0,77	27.484	1	27.484		-	1	27.484	100,00%	0,0000%	-	$ -
003	746	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2		2.829	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
5		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			CDCTO=	$ 4.800.453		$ 4.073.201		$ 8.939.729		$ 769.372		$ 8.939.729	100%	1,51%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 1.417.076		$ 1.181.346		$ 2.598.321		$ 231.818		$ 2.598.321				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.303.544		$ 5.254.547		$ 11.558.050		$ 1.031.190		$ 11.558.050				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 6.303.544		$ 5.254.507		$ 11.558.050		$ 1.031.190		$ 11.558.050	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES **AREA** ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 3

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. Final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=)	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (i / f)	% ejec del CTO (i / b)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (f)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (a-g)
		ITEM # NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE **	M2		780	-	7 808	6 152 640	7 808	6 152 640		-	7 808	6 152 640	100,00%	1,06%	-	$ -
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		6 152 640,0		6 152 640,0		-		6 152 640,0	100%	1,06%		-
		AIU		29,00%		-		1 784 265,6		1 784 265,6		-		1 784 265,6				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS DISEÑO + AIU PARQUE 1 (Base imponible)				-		7 936 905,6		7 936 905,6		-		7 936 905,6				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		7 936 905,6		7 936 905,6		-		7 936 905,6	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (=D)				4 888 456		10 225 141		15 112 308		768 372		15 112 308				-
		AIU		29,00%		1 417 076,0		2 965 511,0		4 382 587,0		231 818,0		4 382 587,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.303.544		13.191.412		19.494.956		1.031.190		19.494.956				-
1 (g)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 572.505.044,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HELLER
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DI[illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDADELA COLSUBSIDIO	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

134

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021 (dd / mm / aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 — VR. ADICIONES: $ 82.000.000,00 — VR. FINAL CONTRATO: $ 582.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45 — No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e=d*b)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (f=a+d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=f*b)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (j=h/f)	% ejec del CTO (k=i/Vr Inic. Contrato)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m=l*b)
		EL CAJON																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.814													
001	12517	Demarcacion con talco cancha futbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha futbol **	UND		141.572	-	5,00	707.900	5	707.900	1	141.572	5	707.900	100,00%	0,12000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha futbol**	UND	-	344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	9,00	122.481	19	258.571	5	68.045	19	258.571	100,00%	0,04400%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	9,00	1.357.508	19	2.865.918	5	754.835	19	2.865.918	100,00%	0,48400%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	6.200	411	2.548.200		-	6.200	2.548.200		-	6.200	2.548.200	100,00%	0,43000%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	$ -
1		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)	COSTO=			$ 4.192.700		$ 2.187.910		$ 6.380.610		$ 1.013.622		$ 6.380.610	100%	1,09%		$ -
		A.I.U	29,00%=			$ 1.215.883		$ 634.404		$ 1.850.287		$ 279.508		$ 1.850.287				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 5.408.583		$ 2.822.404		$ 8.230.987		$ 1.243.330		$ 8.230.987				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 5.408.583		$ 2.822.404		$ 8.230.987		$ 1.243.330		$ 8.230.987	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021 (día / mes / año) — Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 382.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos: ___

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f=)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del item (i / g)	% ejec del CTO (i / a)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (j)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE**	M2		760	-	6200	4.836.000	6.200	4.836.000	-	-	6.200	4.836.000	100,00%	0,82%	-	$ -
						-		-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
(1)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		4.836.000,0		4.836.000,0		-		4.836.000,0	100%	0,82%		-
		A.I.U			29,07%	-		1.402.440,0		1.402.440,0		-		1.402.440,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base imponible iva)				-		6.238.440,0		6.238.440,0		-		6.238.440,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		6.238.440		6.238.440		-		6.238.440	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				4.192.700		7.023.910		11.216.610		143.827		11.216.610				-
		AIU			29,07%	1.215.883,0		2.036.934,0		3.252.817,0		276.508,0		3.252.817,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				5.408.583		9.060.844		14.469.427		1.243.330		14.469.427				-
(2)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 377.530.573,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoría

Arq. MARGARITA HETTERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 DE 2020

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**

PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
EL CAJON	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 6 CANT [h]	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo [i]	ACUMULADO CANT [j]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [k]	% ejec del item [l]	% ejec del CTO [m]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [n]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [o]
		SAN JOSE MARYLAND																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mt2)			739.814													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.685	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	5,00	707.860	5	707.860	1	141.572	5	707.860	100,00%	0,120%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol **	UND		344.195	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.alt. UDS)**	UND		14.812	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BOREO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	135.090	3,00	40.827	7	95.263	2	27.218	7	95.263	100,00%	0,020%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	3,00	452.523	7	1.055.887	2	301.682	7	1.055.887	100,00%	0,180%	-	$ -
4		REPARACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+rebro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
014	10723	Relleno en arena de no suelta**	M3		84.663	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
015	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrta)	M2		6.013	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	2.634	411	1.082.574		-	2.634	1.082.574		-	2.634	1.082.574	100,00%	0,180%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-		-		-		-	0,00%	0,000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO>	$ 2.727.074		$ 214.510		$ 2.941.584		$ 470.472		$ 2.941.584	100%	0,50%		$ -
		A.I.U			29,0%	$ 790.851		$ 62.208		$ 853.059		$ 135.437		$ 853.059				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (items originales)				$ 3.517.925		$ 276.718		$ 3.794.643		$ 605.909		$ 3.794.643				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 3.517.925		$ 276.718		$ 3.794.643		$ 606.909		$ 3.794.643	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 **SUBDIRECCION** SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 550.000.000 VR. ADICIONES $ 42.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 592.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOR	DESCRIPCION	UMD	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT (d)	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) Vr Parcial Directo (e)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a)+(d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% ejec del Item (i / g)	% ejec del CTO (i / g)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (j)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m)
		ITEM S NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	2.634	2.054.520	2.634	2.054.520		-	2.634	2.054.520	100,00%	0,350%	-	$ -
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
III)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		2.054.520,0		2.054.520,0		-		2.054.520,0	100%	0,35%		-
		A.I.U			29,00%	-		595.811,0		595.811,0		-		595.811,0				-
		SUBTOTAL NO Previstos ítem 1 más PARQUE 1 (Item anterior)				-		2.650.331,0		2.650.331,0		-		2.650.331,0				-
		diseños																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		2.650.331		2.650.331		-		2.650.331	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II)				2.727.074		2.208.010		4.935.104		470.472		4.935.104				-
		AIU			29,00%	741.851,0		458.019,0		1.449.870,0		136.437,0		1.449.870,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				3.517.925		2.927.049		6.444.974		606.909		6.444.974				-
IV)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 592.555.026,00

Vº Bº INTERVENTORIA

Arq. MARIANA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY EL[illegible]
Director de obra
Contrato 2940 DE 2020

139



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN JOSE DE MARYLAND	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 982.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CODI	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo [g]	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [i / c]	% ejec del CTO [i / a]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [j]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		PAVCO																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	6,00	849.432	6	849.432	1	141.572	6	849.432	100,00%	0,140%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
004	12512	Reparación diveis -trazos cesped- (est.sti. UOS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090		-	10	136.090	2	27.218	10	136.090	100,00%	0,023%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410		-	10	1.508.410	2	301.682	10	1.508.410	100,00%	0,250%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			COCTO=	$ 1.644.500		$ 849.432		$ 2.493.932		$ 470.472		$ 2.493.932	100%	0,47%		$ -
		A.I.U.			29,0%=	$ 476.905		$ 246.356		$ 723.260		$ 138.437		$ 723.260				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U. PARQUE 1 (items originales)				$ 2.121.405		$ 1.095.787		$ 3.217.172		$ 608.909		$ 3.217.172				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 2.121.405		$ 1.095.787		$ 3.217.172		$ 608.909		$ 3.217.172	100%	1%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA N° 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por Intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. Final parques intervenidos:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativo (+) y positivo (-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% obra del item	% obra del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]			[h]	[i]	[i / b]	[i / CTO]	[f]	[g]
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-001	12212	ADECUA Y DESMALEZADO DE LOTE	M2		780	-	3.508,50	2.784.210	3.570	2.784.210		-	3.570	2.784.210	100,00%	0,47%	-	-
						-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		2.784.210,0		2.784.210,0		-		2.784.210,0	100%	0,47%		-
		AIU			29,00%	-		807.421,0		807.421,0		-		807.421,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS obra + AIU PARQUE 1 (costo negativo)				-		3.591.631,0		3.591.631,0		-		3.591.631,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		3.591.631		3.591.631		-		3.591.631	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+B)				1.844.000		3.633.842		5.278.142		470.472		5.278.142				-
		AIU			29,00%	476.005,0		1.053.774,0		1.530.091,0		136.437,0		1.530.091,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				2.121.405		4.687.395		6.808.803		606.909		6.808.803				-
10)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 883.191.197,00

V° B° INTERVENTORIA

No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY [illegible]
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

142



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2
	01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021

PROYECTO	IDRD	UBICACIÓN	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PAVCO	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	

Visto Bueno Director de obra: _____. Visto Bueno Interventoría: _____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA		
30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 **VR. ADICIONES** $ 92.000.000,00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 892.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 6		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]=[a]*[b]	[d]	[e]=[d]*[b]	[f]	[g]=[a]+[d]		[h]=[f]*[b]		[i]=[f]+[h]	[j]=[f]/[a]	[k]=[f]/[a]	[l]	[m]=[l]*[b]
		ANGELES																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.800 mtr2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.885	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
004	12512	Reparación olvota -trozos cesped- (est.sil. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	5,00	68.045	5	68.045	2	27.218	3	68.045	100,00%	0,0100%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	5,00	754.205	5	754.205	2	301.682	5	754.205	100,00%	0,1300%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	3.117,00	411	1.281.305		-	3.118	1.281.305		-	3.118	1.281.305	100,00%	0,2200%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
019	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2		134	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,0000%	-	$ -
9		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (Items originales)			COSTO>	$ 2.825.705		-$ 822.250		$ 2.103.616		$ 338.033		$ 2.103.616	100%	0,36%		$ -
		A.I.U			29,00%	$ 948.501		-$ 236.453		$ 610.049		$ 95.381		$ 610.049				$ -
		SUBTOTAL OBRA + AIU PARQUE 1 (Items originales)				$ 3.774.207		-$ 1.058.703		$ 2.713.665		$ 424.281		$ 2.713.665				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (Items originales)				$ 3.774.367		-$ 1.060.703		$ 2.713.665		$ 424.281		$ 2.713.665	100%	0%		$ -

4 h1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020 SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

No. Inicial parques por intervenir: 45

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 82.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 882.000.000 No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOS	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT (a)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo (b)	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo (c=a*b)	DIFERENCIAS (negativo (-) y positivo (+)) CANT (d)	DIFERENCIAS (negativo (-) y positivo (+)) Vr Parcial Directo (e=d*b)	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (f) (a+d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo (g=f*b)	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT (h)	ACUMULADO Vr Parcial Directo (i)	% que del Item (j=i/g)	% que del CTO (k=i/c)	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT (l)	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo (m=l*b)
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-2211	122121	ROCERIA Y DESALOJO DE LOTE **	M2	780		-	3117,88	2.431.700	3.118	2.431.700		-	3.118	2.431.700	100,00%	0,41007%	-	-
						-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00000%	-	-
B)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		2.431.700,0		2.431.700,0		-		2.431.700,0	100%	0,41%		-
		AIU			29,00%	-		705.219,0		705.219,0		-		705.219,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU PARQUE 1 (Base imponible)				-		3.137.019,0		3.137.019,0		-		3.137.019,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		3.137.019		3.137.019		-		3.137.019	1	0		-
		TOTALES DEL CONTRATO																
		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (H+B)				2.825.000		1.009.540		4.535.400		328.400		4.535.400				-
		AIU			29,00%	846.500,0		405.767,0		1.315.208,0		95.351,0		1.315.208,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				3.774.387		2.076.307		5.850.674		424.281		5.850.674				-
K)		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 896.149.326,00

Vº Bº INTERVENTORIA

No Contrato de interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoría
Contrato 2934 de 2020

Ing. FREDDY DEL CRISTO GOMEZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

145



MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	**BITÁCORA DE OBRA** **GRUPO 2** **01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021**		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANGELES	13/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	

Visto Bueno Director de obra:_____. **Visto Bueno Interventoría:**_____

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA: 30 JULIO 2021

Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 800.000.000 VR. ADICIONES $ 92.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 892.000.000

No. inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (negativos (+) y positivos(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] Fa]+[d]	[g]			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		MARSELLA F11																
1		MTO. CAMPOS DE FUTBOL TIPO 1 Y 2 (Area aprox. 7.600 m2)			739.914													
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UND		74.865	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UND		141.572	-	2,00	283.144	2	283.144		-	2	283.144	100,00%	0,25%	-	$ -
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UND		344.195	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
004	12512	Reparación direcs -brozas cesped- (est.atl. UDS)**	UND		14.812	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
005	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UND	10	13.609	136.090	2,00	27.218	12	163.308	2	27.218	12	163.308	100,00%	0,01%	-	$ -
006	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UND	10	150.841	1.508.410	2,00	301.682	12	1.810.092	2	301.682	12	1.810.092	100,00%	0,20%	-	$ -
4		REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL, MINIFUTBOL, SOFBOL, BEISBO			13.712.682													
001	10380	Excavación mecanic+retro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3		26.614	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
016	10734	aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2		682	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
017	12468	Verticutter + ayudante **	M2	8.045,78	411	3.308.848	6.185,00	2.542.035	14.231	5.848.851		-	14.231	5.848.851	100,00%	0,66%	-	$ -
018	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2		560	-		-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	$ -
0		SUBTOTAL COSTO DIRECTO PARQUE 1 (items originales)			CDCTO=>	$ 4.851.348		$ 3.154.078		$ 8.105.305		$ 328.000		$ 8.105.305	100%	1,37%		$ -
		A.I.U.			29,00%	$ 1.435.852		$ 914.683		$ 2.350.535		$ 95.381		$ 2.350.535				$ -
		SUBTOTAL OBRA + A.I.U. PARQUE 1 (items originales)			CDCTO=>	$ 6.287.198		$ 4.068.762		$ 10.455.960		$ 424.281		$ 10.455.960				$ -
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL NO PREVISTO PARQUE 1 (items originales)				$ 6.287.198		$ 4.068.762		$ 10.455.960		$ 424.281		$ 10.455.960	100%	2%		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 6

CONTRATO No 2940 DE 2020

SUBDIRECCION SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECHA

30	JULIO	2021
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

VR. INIC. CONTRATO: $ 500.000.000 VR. ADICIONES $ 182.000.000,00 VR. FINAL CONTRATO: $ 682.000.000

No. Inicial parques por intervenir: 45

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIOB	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) CANT	DIFERENCIAS (negativos (-) y sobrantes (+)) Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
		ITEMS NO PREVISTOS PARQUE 1																
NP-071	122124	ROCERIA Y DESMALEZADO DE LOTE**	M2		780	-	8.045,76	6.275.708	8.045	6.275.708		-	8.045	6.275.708	100,057%	1,000%	-	$ -
															0,057%	0,000%	-	$ -
D)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO PARQUE 1				-		6.275.708,0		6.275.708,0		-		6.275.708,0	100%	1,00%		-
		AIU			29,00%	-		1.819.955,0		1.819.955,0		-		1.819.955,0				-
		SUBTOTAL NO PREVISTOS Costo + AIU PARQUE 1 (Costo antes de IVA)				-		8.095.663,0		8.095.663,0		-		8.095.663,0				-
		DISEÑOS																
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS PARQUE 1				-		8.095.663		8.095.663		-		8.095.663	1	0		-

TOTALES DEL CONTRATO

		TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (+B)				4.951.316		9.429.787		14.381.103		328.500		14.381.103				-
		AIU			29,00%	1.435.882,0		2.734.638,0		4.170.520,0		95.381,0		4.170.520,0				-
		DISEÑOS				-		-		-		-		-				-
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				-		-		-		-		-				-
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)				-		-		-		-		-				-
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				6.387.198		12.164.425		18.551.623		424.281		18.551.623				-
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																$ 573.448.377,00

Vº Bº INTERVENTORIA


No Contrato de Interventoria

Arq. MARGARITA HERRERA
Directora de Interventoria
Contrato 2946 DE 2020

Ing. FREDDY DE JESUS GOMEZ DIAZ
Director de Obra
Contrato 2940 de 2020

148

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA No. 2940 DE 2020	BITÁCORA DE OBRA GRUPO 2 01 JULIO 2021 – 30 JULIO 2021		
PROYECTO	IDRD	**UBICACIÓN**	BOGOTÁ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTA D.C. GRUPO 2		

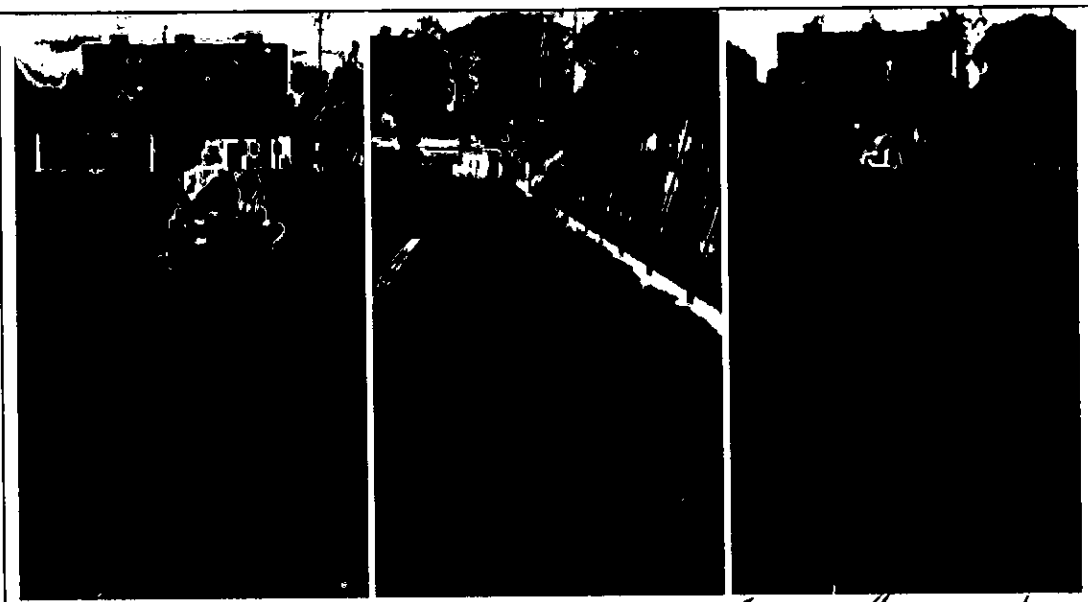CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
MARSELLA F11	7/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	

6h1

Visto Bueno Director de obra: _____.

Visto Bueno Interventoría: _____

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

CONTRATO IDRD 2940 DE 2020

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 2"

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST N° 6

Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. COMPONENTE E SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4
1.1. Aspectos básicos legales 4
1.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 4
1.1.2. Afiliaciones/Pagos al Sistema General de Seguridad Social 4
1.1.2.1. Personal Antiguo 5
1.1.2.2. Personal nuevo 5
1.1.2.3. Personal visitante 6
1.1.2.4. Personal Retirado 6
1.1.2.5. Relación total de personal 6
1.1.3. Relación programa de formación 6
1.2. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 6
1.2.1. Exámenes médicos ocupacionales 6
1.2.2. Morbilidad y ausentismo 7
1.2.3. Indicadores SST 7
1.2.4. Incidentes y accidentes 8
1.2.5. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST 8
1.2.6. Comité de Convivencia Laboral 8
1.2.7. Capacitación y entrenamiento 9
1.3. Subprograma de higiene industrial 9
1.3.1. Manejo de sustancias químicas 9
1.4. Subprograma de seguridad industrial 10
1.4.1. Entrega de EPI y Dotación 10
1.4.2. Inspecciones de seguridad 11
1.4.3. Maquinaria, equipos y vehículos 11
1.4.3.1. Maquinaria 11
1.4.3.2. Vehículos 12

1.5. Plan de atención y respuesta ante emergencias 13
1.5.1. Brigadas de emergencia 13
1.5.2. Camillas, extintores y botiquines 13
2. CONCLUSIONES 15
3. ANEXOS 16
3.1. Anexo 1. Documentación Ingreso de personal. 16
3.2. Anexo 2. Reporte de personal. 16
3.3. Anexo 3. Acta reunión No 3 COPASST. 16
3.4. Anexo 4. Registro de capacitaciones 16
3.5. Anexo 5. Inventario de sustancias químicas y hojas de seguridad. 16
3.6. Anexo 6. Entrega de EPI. 16
3.7. Anexo 7. Registro de Inspecciones 16
3.8. Anexo 8. Acta reunión No 4 de la brigada de emergencia. 16

1. COMPONENTE E SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.1. Aspectos básicos legales

1.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adjudicó a MAQUINAS Y GRAMAS LTDA el contrato de obra IDRD No. 2940 de 2020, cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 2". Mediante el presente informe se informa las actividades desarrolladas durante en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2021:

- Se verifica el cumplimiento de pagos de seguridad social del personal vinculado al proyecto del mes de julio de 2021.
- Se garantiza las condiciones de seguridad en los frentes de obras intervenidos (Parque Nacional , Country, Marsella natural, Pavco, Tunal Sofbol, Nuevo Muzu, Serena, Gaitana, Fontanar, Ciudadela Colsubsidio, Tabora, Estadio Atahualpa, Estadio Alqueria, El Cajon, PRD Estadio, San Cristobal Estadio, Timiza Estadio, Ciudad Montes, Ciudad Montes Sofbol, Ciudad Montes voley playa, Bochica, Milenta Tejar, PRD PLAYA, PRD Alterna 3, UDS Beisbol, UDS Complejo Playa, Complejo Acuatico – Playa, UDS Sofbol, UDS Atletismo).
- Se lleva a cabo la implementación de los protocolos de bioseguridad para el control del COVID 19 en los frentes de obra intervenidos.
- Se realiza programa de formación (inducciones, capacitaciones conforme el plan de trabajo del SG SST y el programa de Bioseguridad Covid 19).
- Se realiza registro y adecuación de sustancias químicas en el proyecto.
- Se realiza reunión de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Se realiza reunión de brigada de emergencias.
- Se realiza reunión comité de convivencia laboral
- Se hace entrega al personal nuevo los elementos de protección individual correspondientes a sus actividades contractuales.
- Se realiza inspecciones de seguridad conforme lo establecido en el plan de trabajo del SG SST.

1.1.2. Afiliaciones/Pagos al Sistema General de Seguridad Social

Los trabajadores que participan con MAQUINAS Y GRAMAS LTDA en la ejecución del contrato IDRD No. 2940 de 2020 deberán estar afiliados al sistema general de seguridad social, la información correspondiente a estas afiliaciones y al pago mensual de los mismas,

será registrada y actualizada mensualmente en el Formato de relación de personal los soportes estarán archivados de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante IDRD.

En cuanto al sistema general de seguridad social se debe tener en cuenta que la ARL es escogida por el empleador, la EPS es seleccionada por cada trabajador, al igual que la AFP. Para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y legales exigidos por el contrato, MAQUINAS Y GRAMAS LTDA llevó a cabo las actividades de Vinculación del personal contractual, practica de los exámenes ocupacionales de ingreso, las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social integral, al igual que la correspondiente inducción al personal que ingresa en el periodo.

1.1.2.1. Personal Antiguo

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) se con el siguiente personal en el proyecto:

Tabla No 1. Listado de personal Maquinas y Gramas LTDA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	9092278	DIRECTOR DE OBRA
2	ROBERTO MARIN ROJAS	7470258	RESIDENTE DE OBRA
3	RENE MANRIQUE SAVEEDRA	7691649	RESIDENTE AGRONOMO
4	JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ	1018451468	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL
5	EDWIN ROJAS	7178039	INSPECTOR
6	KIMBERLY DAYANA ORTEGA	1045781092	SECRETARIA
7	DAWSON LASSO CORTES	80763102	CONDUCTOR
8	DIEGO FERNANDO VARGAS LEON	1023914800	AYUDANTE
9	WILBER DIOMEDES JIMENEZ LASSO	5855002	CONDUCTOR
10	BRANDON SEBASTIAN LOPEZ AYALA	1233890527	INSPECTOR

Fuente. Autor

Las planillas de pago del mes de mayo se presentan en el anexo 1 del presente documento.

1.1.2.2. Personal nuevo

Durante el mes de reporte (1 al 31 de julio de 2021) no se presentaron ingresos de personal al proyecto.

1.1.2.3. Personal visitante

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio de 2021) no se presentó ingreso de personal visitante.

1.1.2.4. Personal Retirado

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio de 2021) no se presentaron retiros de personal en el proyecto

1.1.2.5. Relación total de personal

Tabla No 2. Listado de personal MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

CRITERIO	TOTAL PERSONAL	
Personal Antiguo Maquinas y Gramas	10	10
Personal Nuevo Maquinas y Gramas	0	
Personal visitante integrado en el mes	0	0
Personal retirado Maquinas y Gramas	0	0

Fuente. Autor

NOTA: El listado de personal del periodo de reporte (1 al 31 de julio de 2021) se presenta en el formato "Relación de Personal", ver anexo 2.

1.1.3. Relación programa de formación

Durante el mes de reporte 1 al 31 de julio de 2021 se no se realizaron inducciones, debido a que no se presentaron ingresos al proyecto.

1.2. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

1.2.1. Exámenes médicos ocupacionales

Todo trabajador nuevo se les practica el correspondiente examen de ingreso ocupacional, el cual tiene como fin saber en qué condiciones de salud ingresan al proyecto, dando cumplimiento así a la resolución 1016/89 y 2346 de 2007.

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) no se presentaron exámenes de ingreso.

1.2.2. Morbilidad y ausentismo

Tabla No 3. Control de ausentismo

Nombre	Causa	Días ausentismo	Medidas correctivas
Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021), no se presentó ausentismo en los trabajadores directos e indirectos del contrato, por consecuencia de enfermedades y accidentes comunes y laborales,			

Fuente. Autor

1.2.3. Indicadores SST

Tabla No 4. Indicadores SST Febrero – Julio 2021

Proceso	Objetivo del proceso	Indicador	Meta	Frecuencia de Medición	Feb-21	Mar-21	Abr-21	May-21	Jun-21	Jul-21
Gestión SSTA	Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus Colaboradores y al Medio Ambiente, dando cumplimiento a los requisitos legales en SSTA	((Número de días perdidos + número de días cargados en el periodo)/ Número de trabajadores mes)*100	< = a 6 días perdidos por AT al mes, Por cada 100 trabajadores.	Mensual	0	0	0	0	0	0
		(Número de accidentes de trabajo presentados en el mes / Número de trabajadores mes)*100	< = a 1,2 accidentes al mes, Por cada 100 trabajadores.	Mensual	0	0	0	0	0	0
		(Número de accidentes de trabajo mortales presentados/ Total de accidentes presentados)*100	Mantener el índice de mortalidad en accidentes de trabajo en 0 casos	Anual	0	0	0	0	0	0
		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/ promedio total de trabajadores)*100.000	Mantener el índice de prevalencia en enfermedades laborales en 0 casos	Anual	0	0	0	0	0	0
		(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral/ promedio total de trabajadores)*100.000	Mantener el índice de incidencia enfermedades laborales en 0 casos	Anual	0	0	0	0	0	0
		(Número de días ausencia por incapacidad laboral o común/ número de días de trabajo programados*100	Menor a 2,4% de pérdida de días programados de trabajo por incapacidad médica.	Mensual	0	0	0	0	0	0
		Numero de requisitos cumplidos /Numero de requisitos aplicables*100	Cumplir con la normatividad SST vigente.	Anual	100	100	100	100	100	100

Fuente. Autor

1.2.4. Incidentes y accidentes

Para el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) no se reportan accidentes ni incidentes laborales.

1.2.5. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST

De acuerdo con lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y Decreto 1295 de 1994, Art. 63 sé debe conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta que MAQUINAS Y GRAMAS LTDA, el día 1 de julio de 2021 se reconformó el COMITÉ PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, por consecuencia al retiro del personal perteneciente al Comité, este quedo de la siguiente manera:

Tabla No 5. Conformación COPASST

Integrantes COPASST	
Joan Sebastián Díaz González	Principal por la empresa
Dawson Lasso Cortes	Suplente por la empresa
Diego Fernando Vargas Leon	Principal por los trabajadores
Brandon Sebastian Lopez Ayala	Suplente por los trabajadores

Fuente. Autor.

En el anexo 3 se presenta el acta de reunión No 3 del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) la cual se realizó el 22 de julio del 2021.

1.2.6. Comité de Convivencia Laboral

Dando cumplimiento legal en lo referente a la Resolución 1356 de 2012, artículos 1 y 2 y a las exigencias de la Resolución número 00000652. MAQUINAS Y GRAMAS LTDA el día 2 de febrero de 2021, conformo el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, integrado de la siguiente manera:

Tabla No 6. Conformación COCOLA

Integrantes COCOLA	
Wilber Diomedes Jimenez Lasso	Principal por la empresa
Kimberly Dayana Ortega	Suplente por la empresa
Brandon Sebastian Lopez Ayala	Principal por los trabajadores
Joan Sebastian Diaz Gonzalez	Suplente por los trabajadores

Fuente. Autor.

S informa que la reunión No 3 del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) se tiene programada para el mes de agosto de 2021

1.2.7. Capacitación y entrenamiento

La relación de capacitaciones realizadas durante el mes el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) fue el siguiente:

Tabla No 7. Relación de capacitaciones

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	N° de Asistentes	
			Horas	Prog.	Cobe.
13/07/2021	Medidas de prevención para el riesgo psicosocial	1	1	4	4

Fuente. Autor

Imagen 1. Registro de capacitación



Fuente. Autor

En el anexo 4 se presenta los registros de las capacitaciones realizadas.

1.3. Subprograma de higiene industrial

1.3.1. Manejo de sustancias químicas

Se realiza la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias químicas del SG SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Para ello se realizó el registro de los productos químicos a través del "inventario de sustancias químicas" y sus respectivas hojas de seguridad, el cual se presenta en el anexo 5 del presente documento.

El etiquetado y almacenamiento se presenta de la siguiente manera:

Imagen 2. Almacenamiento sustancias químicas



Fuente. Autor

1.4. Subprograma de seguridad industrial

1.4.1. Entrega de EPI y Dotación

Durante el periodo de reporte se realizó la reposición de elementos de protección individual requeridos para desarrollar las actividades de obra correspondientes, en el anexo 6 se presentan los registros de entrega de EPI.

Imagen 3. Entrega de EPI



Fuente. Autor

1.4.2. Inspecciones de seguridad

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021), conforme a lo establecido en el plan de trabajo del SG SST, se desarrollaron las siguientes inspecciones de seguridad en el proyecto:

Tabla No 8. Relación de inspecciones

INSPECCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
	Se realizó (SI/NO)	Fecha de realización	
Inspecciones de botiquín	SI	22/07/2021	Camion VCW058
Inspecciones de botiquín	SI	22/07/2021	Camion EXZ737
Inspecciones de botiquín	SI	22/07/2021	Camion EYX154
Inspección Extintor	SI	22/07/2021	Camion VCW058
Inspección Extintor	SI	22/07/2021	Camion EXZ737
Inspección Extintor	SI	22/07/2021	Camion EYX154
Inspección general de obra	SI	22/07/2021	Frentes intervenidos
Inspección de Herramientas	SI	22/07/2021	Ninguna
Preoperacional maquinaria	SI	1/07/2021 al 31/07/2021	Giro Zero Tractor

Fuente. Autor

En el anexo 7 se presenta los registros de inspección realizadas por el MAQUINAS Y GRAMAS LTDA.

1.4.3. Maquinaria, equipos y vehículos

1.4.3.1. Maquinaria

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) en la ejecución del proyecto de MAQUINAS Y GRAMAS LTDA., se contó con la siguiente maquinaria:

Tabla No 9. Relación de maquinaria

NOMBRE DEL EQUIPO	REGISTRO FOTOGRAFICO	MARCA	MOTOR	SERIE
GIRO ZERO MZ52		HUSQVAR NA	KOLER 25HP	060614B001262

NOMBRE DEL EQUIPO	REGISTRO FOTOGRAFICO	MARCA	MOTOR	SERIE
GIRO ZERO MZ54		HUSQVAR NA	KOLER 24HP 725 CC	4510509494
MAQUINA HELICOIDAL REEL MASTER 5200D DE 5 CUERPOS		TORO	KOLLER DT-1105-1	989335
GIRO CERO TRACTOR PZT60		HUSQVAR NA	KOLER 25HP	96613502
MAQUINA HELICOIDALREEL MASTER 216 DE 3 CUERPOS		TORO	KOLLER GX6108	2254MN845021
SACAPANTA		RYAN	HONDA 9 HP	111274RY
GUADAÑADORA		SHINDAIW A	SHINDAIWA B45 2,5 HP	TT05920108642
GUADAÑADORA		SHINDAIW A	SHINDAIWA B45 2,5 HP	T24225023275

Fuente, Autor

1.4.3.2. Vehículos

Durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021) en la ejecución del proyecto de MAQUINAS Y GRAMAS LTDA., se contó con los siguientes vehículos:

Tabla No 9. Relación de vehículos

No.	TIPO	PLACA	MARCA	TECNO MECÁNICA	SOAT	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
1	Camión	VCW058	NISSAN	09/11/2021	29/10/2021	Conductor: Pedro Aranda	1/02/2021
2	Camión	EXZ737	FOTON	09/12/2021	26/11/2021	Conductor: Wilber Jiménez	1/02/2021
3	Camión	EYX154	FOTON	06/11/2021	23/12/2021	Conductor: Dawson Lasso	1/02/2021

Fuente. Autor

1.5. Plan de atención y respuesta ante emergencias

1.5.1. Brigadas de emergencia

En las instalaciones del proyecto MAQUINAS Y GRAMAS LTDA se reunieron los Representantes de la empresa y de los trabajadores para designar la Brigada de Emergencias y Primeros Auxilios en cumplimiento con los estándares legales.

La conformación de la brigada es la siguiente:

Tabla No 10. Conformación Brigada de emergencias

Nombre	Cargo
Joan Sebastián Díaz González	Jefe Brigada
Diego Fernando Vargas Leon	Brigadista
Wilber Diomedes Jiménez Lasso	Brigadista

Fuente. Autor.

La reunión de la brigada de emergencia se realizó el 19 de julio de 2021, se adjunta soporte de reunión en el anexo 8.

1.5.2. Camillas, extintores y botiquines


En las instalaciones de las oficinas y frentes de obra del proyecto MAQUINAS Y GRAMAS LTDA, se cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias tales como camilla, extintores y botiquines los cuales se encuentran en condiciones adecuadas, para el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021), se contó con los siguientes elementos de emergencia:

Imagen 4. Elementos de emergencias



Fuente. Autor

Imagen 5. Elementos de emergencias

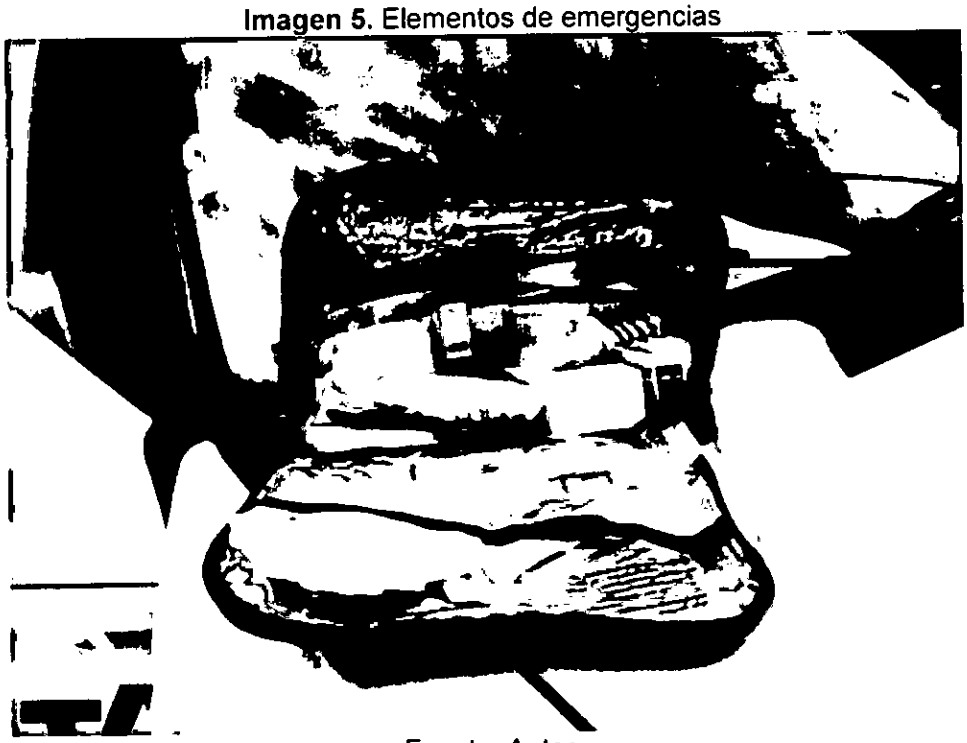

Fuente. Autor

Imagen 6. Elementos de emergencias



Fuente. Autor

2. CONCLUSIONES

- Se verifico planillas de pago de seguridad social (ARL, EPS, AFP, CCP) del personal antiguo que conforma el proyecto con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos contractuales del proyecto.
- Se verifica de la documentación ingreso de personal que se incorporó al proyecto granizando los documentos mínimos establecidos en los pliegos de condición del proyecto.
- Se forma (capacitaciones conforme el plan de trabajo del SG SST y el programa de Bioseguridad Covid 19) al personal que conformo el proyecto durante el periodo de reporte (1 al 31 de julio 2021).
- Se garantiza la adecuación de sustancias químicas en el proyecto.
- Se hace reposición de los elementos de protección individual del personal del proyecto
- Se realiza inspecciones de seguridad conforme lo establecido en el plan de trabajo del SG SST.
- No se presentaron conflictos laborales durante el periodo de reporte.
- Se realiza segunda reunión de COPASST.
- Se realiza segunda reunión de Brigada de emergencia.

3. ANEXOS

3.1. Anexo 1. Planillas de seguridad social personal antiguo.
3.2. Anexo 2. Reporte de personal.
3.3. Anexo 3. Acta reunión No 3 COPASST.
3.4. Anexo 4. Registro de capacitaciones.
3.5. Anexo 5. Inventario de sustancias químicas y hojas de seguridad.
3.6. Anexo 6. Entrega de EPI.
3.7. Anexo 7. Registro de Inspecciones.
3.8. Anexo 8. Acta reunión No 4 de la brigada de emergencia.

Anexo 1.

Planillas de seguridda social personal.

SuAporte | REPOR NDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-07-12, 10:07:16 AM Tipo Planilla E Número Planilla 50427920

Periodo Cotización 202106 Periodo Servicio 202107

Cliente:

PAGADA 2021-07-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TEMPO SAS				
Documento	NI 890104739	Dirección	CALLE 77 NO 67-37 P 2 L37		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3686000		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	5233
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal	DE CASTROCASTAÑEDA MARCELA BEATRIZ	Identificación	CC 32730981		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1045761092						S				
Tipo Cotizante	01	00					TRUYOL ORTEGA KIMBERLY DAYANNA	8001000 - 8	000000896	ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo cotiz.	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	28	28	28	28			F	$ 928.550	25-14		16 %	$ 866.647	$ 138.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 866.647	$ 34.700	$ 0	14-4	3	2,436 %	$ 866.647	$ 21.200	CCF07	4 %	$ 866.647	$ 34.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
										X				0	2	2	2	2			F	$ 928.550	25-14		16 %	$ 80.569	$ 0.700	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 80.569	$ 2.500	$ 0	14-4		0,000 %	$ 80.569	$ 0	CCF07	0 %	$ 80.569	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 37.200	$ 21.200	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

191

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9092278	0	FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	I	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 49 76 25		3013631789		FREDYDELCRISTO56@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-06	2021-06	20995904	I	2021-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	118.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	20995904	2021-07-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exentos de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CPST	APPT	AFP	ENS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FMSOL	FMSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.				
1	CC 9092278	GOMEZ DIAZ FREDY DEL CRISTO	908.526		X														0		0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	908.526	113.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	908.526	4.800	0.00522	0	0	0	0	0	57	2	118.400	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9092278	0	FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	I	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 49 76 25		3013631789		FREDYDELCRISTO56@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-06	2021-06	20995904	I	2021-07-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	118.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	20995904	2021-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	908.526	908.526	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	113.600	0	0	0	113.600
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	113.600	0	0	0	113.600
ARP(Administradoras: 1)				1	4.800	0	0	0	4.800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	1	4.800	0	0	0	4.800
Gran Total					118.400	0	0	0	118.400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901341314-9	CONSORCIO PRAYMET	CL 24 51 40 OF 905	3399140	admipraymet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51873925	$16.562.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	40.700	0		0		0	0	0	0	40.700	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	399.600	0		0		0	0	0	0	399.600	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	269.600	0		0		0	0	0	0	269.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	210.700	0		0		0	0	0	0	210.700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	241.800	0		0		0	0	0	0	241.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	287.200	0		0		0	0	0	0	287.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	247.000	0		0		0	0	0	0	247.000	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	39.000	0		0		0	0	0	0	39.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	142.800	0		0		0	0	0	0	142.800	4
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.736.400	0	0	0	0	0	0		1.736.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.835.400	0	0	46.000	46.000	0	0		4.927.400	24
231001	Colfondos	800227940-6	32.200	0	0	0	0	0	0		32.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.773.200	0	0	0	0	0	0		1.773.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.752.400				3.752.400	0	0	3.752.400			37.524	3.752.400	45

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.170.400	0	0	2.170.400	45

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901341314-9	CONSORCIO PRAYMET	CL 24 51 40 OF 905	3399140	admipraymet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51873925	$16.562.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	2.170.400	2.170.400
Pensión	4	8.469.200	8.469.200
Riesgos Laborales	1	3.752.400	3.752.400
CCF	1	2.170.400	2.170.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	16.562.400	16.562.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

17

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901341314-9	CONSORCIO PRAYMET		CL 24 51 40 OF 905	3399140	admipraymet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51873925	$16.562.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla/e	Número	Extranjero	Clase de cotizante	Departamento	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Aportante	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000217664	MENESES CASTILLO JOHAN STEVEN	1	0			5		X															231001	90 853	14 600	0	0	0	0	EPS005	90 853	3 700	14-11	90 853	5	6 400	CCF24	90 853	3 700	0	0	0	0	0
2	CC	1001183465	UNIVIO CRISTANCHO ANDRES FABIAN	1	0			5								X									230301	1 025 120	164 100	0	0	0	0	EPS017	1 025 120	41 100	14-11	1 025 120	5	71 400	CCF24	1 025 120	41 100	0	0	0	0	0
3	CC	1006773888	ROJAS PARRA PABLO SANTIAGO	1	0			5								X									230301	960 577	153 700	0	0	0	0	EPSC34	960 577	38 500	14-11	960 577	5	66 900	CCF24	960 577	38 500	0	0	0	0	0
4	CC	1007499041	SEPULVEDA ANDRADE CRISTIAN ALEXANDER	1	0			5								X									230301	1 017 360	162 800	0	0	0	0	CCFC24	1 017 360	40 700	14-11	1 017 360	5	70 900	CCF24	1 017 360	40 700	0	0	0	0	0
5	CC	1007659824	SEPULVEDA ANDRADE FABIO NELSON	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
6	CC	1010232371	BLANCO ARDILA OSCAR IVAN	1	0			5								X									25-14	1 003 164	160 600	0	0	0	0	EPS017	1 003 164	40 200	14-11	1 003 164	5	69 900	CCF24	1 003 164	40 200	0	0	0	0	0
7	CC	6004222	MONROY RUIZ ALVARO	1	0			5								X									25-14	1 371 780	219 500	0	0	0	0	EPS008	1 371 780	54 900	14-11	1 371 780	5	95 500	CCF24	1 371 780	54 800	0	0	0	0	0
8	CC	65556177	MORALES PINTO BETTY	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
9	CC	79129207	CAPERA MONTOYA HERMES	1	0			5								X									25-14	2 343 750	375 000	0	0	0	0	EPS010	2 343 750	93 800	14-11	2 343 750	5	163 200	CCF24	2 343 750	93 800	0	0	0	0	0
10	CC	4056716	FIGUEROA CIRO EDUARDO	1	0			5	X																25-14	787 300	126 000	0	0	0	0	EPSC34	787 300	31 500	14-11	787 300	5	54 900	CCF24	787 300	31 500	0	0	0	0	0
11	CC	52003857	CUBILLOS CELIS MARIA DEL PILAR	1	0			5	X																230301	110 000	17 600	0	0	0	0	EPS002	110 000	4 400	14-11	110 000	5	7 700	CCF24	110 000	4 400	0	0	0	0	0
12	CC	52126024	GONZALEZ COGOLLO JENNY	1	0			5																	25-14	1 500 000	240 000	0	0	0	0	EPS017	1 500 000	60 000	14-11	1 500 000	5	104 400	CCF24	1 500 000	60 000	0	0	0	0	0
13	CC	83231536	MUÑOZ OMES LUIS ALBERTO	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS037	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
14	CC	8736054	ORTIZ MONTERROSA JAIRO	1	0			5																	25-14	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS017	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
15	PE	829072401041 980	BARRIOS CRESPO JOSE GREGORIO	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
16	CC	12282221	FERNANDEZ MUÑOZ JAIME	1	0			5																	230301	1 400 000	224 000	0	0	0	0	EPS005	1 400 000	56 000	14-11	1 400 000	5	97 500	CCF24	1 400 000	56 000	0	0	0	0	0
17	CC	1233497044	RIOS DIAZ ROBERTO CARLOS	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPSC34	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
18	CC	16202012	ALZATE MARIN ANTONIO JESUS	1	5			5																		0	0	0	0	0	0	EPS037	908 526	36 400	14-11	908 526	4	39 600	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
19	CC	79706327	GARAVITO FERNANDEZ ANDRES RICARDO	1	0			5																	230201	2 000 000	320 000	0	0	0	0	EPS005	2 000 000	80 000	14-11	2 000 000	5	130 200	CCF24	2 000 000	80 000	0	0	0	0	0
20	CC	80074292	GONDORA BARRIOS JULIAN MAURICIO	1	0			5																	230301	5 500 000	880 000	0	0	27 500	27 500	EPS001	5 500 000	220 000	14-11	5 500 000	5	362 800	CCF24	5 500 000	220 000	0	0	0	0	0
21	CC	80248015	ALVAREZ CARDONA YAMID	1	0			5								X									230201	1 455 729	233 000	0	0	0	0	EPS002	1 455 729	58 300	14-11	1 455 729	5	101 400	CCF24	1 455 729	58 300	0	0	0	0	0
22	CC	1044826501	MEDINA MENDOZA DAVID JOSUE	1	0			5	X																230301	90 853	14 600	0	0	0	0	EPS037	90 853	3 700	14-11	90 853	5	6 400	CCF24	90 853	3 700	0	0	0	0	0
23	CC	1058058561	QUEVEDO CARO ANDREA LILIANA	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
24	CC	1058058563	CAMARGO LEON HECTOR DANIEL	1	0			5																	230301	2 000 000	320 000	0	0	0	0	EPS002	2 000 000	80 000	14-11	2 000 000	5	139 200	CCF24	2 000 000	80 000	0	0	0	0	0
25	CC	52467808	PACHON DURAN JENNY MILENA	1	0			5																	230201	3 500 000	560 000	0	0	0	0	EPS008	3 500 000	140 000	14-11	3 500 000	5	243 800	CCF24	3 500 000	140 000	0	0	0	0	0
26	CC	52878059	USECHE CALVO FRANCY YUDELI	1	0			5																	25-14	908 526	145 400	0	0	0	0	EPSC34	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
27	CC	5977765	DIAZ ENRIQUE	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
28	CC	1018451468	DIAZ GONZALEZ JOAN SEBASTIAN	1	0			5																	230301	3 700 000	592 000	0	0	18 500	18 500	EPS010	3 700 000	148 000	14-11	3 700 000	5	257 800	CCF24	3 700 000	148 000	0	0	0	0	0
29	CC	1018503527	MONTENEGRO RIOS JOHN FREDY	1	0			5																	230301	1 800 000	288 000	0	0	0	0	ESSC33	1 800 000	72 000	14-11	1 800 000	5	125 300	CCF24	1 800 000	72 000	0	0	0	0	0
30	CC	1022906326	PINILLA VARGAS LUIS ARMANDO	1	0			5																	230201	1 800 000	288 000	0	0	0	0	EPS017	1 800 000	72 000	14-11	1 800 000	5	125 300	CCF24	1 800 000	72 000	0	0	0	0	0
31	CC	19147125	GONZALEZ JOSE DANIEL	1	0			5	X																25-14	90 853	14 600	0	0	0	0	EPS008	90 853	3 700	14-11	90 853	5	6 400	CCF24	90 853	3 700	0	0	0	0	0
32	CC	19402427	BERNAL RINCON HECTOR	1	4			5								X										0	0	0	0	0	0	EPS002	960 577	38 500	14-11	960 577	5	66 900	CCF24	960 577	38 500	0	0	0	0	0
33	CC	19440831	HENAO VALENCIA JAVIER	1	0			5								X									25-14	2 166 667	346 700	0	0	0	0	EPS005	2 166 667	86 700	14-11	2 166 667	5	150 900	CCF24	2 166 667	86 700	0	0	0	0	0
34	CC	1012232160	ROMERO BELTRAN SANDRA PAOLA	1	0			5								X									230201	936 917	150 000	0	0	0	0	EPS017	936 917	37 500	14-11	936 917	5	65 300	CCF24	936 917	37 500	0	0	0	0	0
35	CC	1012423368	VARGAS DUARTE WILLIAM	1	0			5								X									230301	936 917	150 000	0	0	0	0	EPS037	936 917	37 500	14-11	936 917	5	65 300	CCF24	936 917	37 500	0	0	0	0	0
36	CC	1012426069	SEPULVEDA ANDRADE JOSE ARVEY	1	0			5																	230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS002	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
37	CC	1053723386	LUNA CARVAJAL ALBEIRO	1	0			5								X									230301	998 432	159 800	0	0	0	0	EPS037	998 432	40 000	14-11	998 432	5	69 500	CCF24	998 432	40 000	0	0	0	0	0
38	CC	1073080815	VELASQUEZ UBAQUE FREDY ALEXANDER	1	0			5								X									230301	1 413 894	226 300	0	0	0	0	EPS037	1 413 894	56 600	14-11	1 413 894	5	98 500	CCF24	1 413 894	56 600	0	0	0	0	0
39	CC	12191300	RAMIREZ SUAREZ ISMAEL	1	0			5								X									230301	974 773	156 000	0	0	0	0	EPS044	974 773	39 000	14-11	974 773	5	67 900	CCF24	974 773	39 000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

172

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901341314-9	CONSORCIO PRAYMET		CL 24 51 40 OF 905	3399140	admipraymet@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					45	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E		51873925	$16.562.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero en Colombia	Estudiante	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1012435076	JAIMES VARGAS KATTERYN ALEJANDRA	1	0			5	X															230201	150 000	24 000	0	0	0	0	EPS005	150 000	6 000	14-11	150 000	5	10 500	CCF24	150 000	6 000	0	0	0	0	0
41	CC	1012400882	ARISTIZABAL COLORADO MARIA PAULA	1	0			5	X															230301	90 853	14 800	0	0	0	0	EPS008	90 853	3 700	14-11	90 853	5	6 400	CCF24	90 853	3 700	0	0	0	0	0
42	CC	1014308243	MORENO ESPITIA JUAN SEBASTIAN	1	0			5	X															230201	100 000	16 000	0	0	0	0	EPS008	100 000	4 000	14-11	100 000	5	7 000	CCF24	100 000	4 000	0	0	0	0	0
43	CC	1024507907	ARRIETA BONILLA KEVIS JOSE	1	0			5																230201	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS037	908 526	36 400	14-11	908 526	5	63 300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
44	CC	1030650374	NIETO CAMELO ANGIE VANESSA	1	0			5	X															231001	110 000	17 600	0	0	0	0	EPS008	110 000	4 400	14-11	110 000	5	7 700	CCF24	110 000	4 400	0	0	0	0	0
45	CC	1040379385	MENDOZA BORJA MARIA ISABEL	1	0			5								X								230301	929 347	148 700	0	0	0	0	EPS005	929 347	37 200	14-11	929 347	5	64 700	CCF24	929 347	37 200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087132-6	INGENIERIA CMC SAS	CALLE 140 A No. 103B-09	7026556	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	12/07/2021	51745616	$2.226.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	4
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	168.000	0	0						168.000	1
230301	Porvenir	800224808-6	305.400	0	0						305.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	520.000	0							520.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0							192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	448.200				448.200	0	0	448.200			4.482	448.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	296.400	0	0	296.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	296.400	296.400
Pensión	4	1.185.400	1.185.400
Riesgos Laborales	1	448.200	448.200
CCF	1	296.400	296.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.226.400	2.226.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087132-6	INGENIERIA CMC SAS		CALLE 140 A No. 103B-09	7026556	cmcingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	12/07/2021	51745616	$2.226.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Cesantías	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SLE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015306839	SABOGAL CUERVO EVA YURANY	1	0			5																230201	1 050 000	168 000	0	0	0	0	EPS017	1 050 000	42 000	14-11	1.050 000	I	5.500	CCF24	1 050 000	42 000	0	0	0	0	0
2	CC	1023914800	VARGAS LEON DIEGO FERNANDO	1	0			5																230301	908 526	145 400	0	0	0	0	EPS044	908 526	36 400	14-11	908.526	5	83.300	CCF24	908 526	36 400	0	0	0	0	0
3	CC	1233890527	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1	0			5																230001	1 000 000	160 000	0	0	0	0	EPS017	1.000 000	40 000	14-11	1.000 000	5	69 600	CCF24	1 000 000	40 000	0	0	0	0	0
4	CC	5655002	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	1	0			5																231001	1 250 000	200 000	0	0	0	0	EPS002	1.250 000	50 000	14-11	1.250 000	5	87.000	CCF24	1.250 000	50 000	0	0	0	0	0
5	CC	80757973	SABOGAL CUERVO JUAN MANUEL	1	0			5																231001	2 000 000	320 000	0	0	0	0	EPS017	2 000 000	80 000	14-11	2.000.000	5	139 200	CCF24	2.000.000	80 000	0	0	0	0	0
6	CC	80783102	LASSO CORTES DAWSON	1	0			5																25-14	1 200 000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1 200.000	5	83 600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Anexo 2.

Reporte de personal.

Maquinas y Ventas Ltda. Mantenimiento de Juegos Deportivos en gramá natural	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	Versión 0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/07/2021
REALIZADO POR: ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERSONAL ANTIGUO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	EXAMEN INGRESO	EDAD	INGRESO	RETIROS
1	FREDY DEL CRISTO GOMEZ DIAZ	9092278	DIRECTOR DE OBRA	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	COOMEVA	N/A	NA	63	1/02/2021	
2	ROBERTO MARIN ROJAS	7470258	RESIDENTE DE OBRA	POSITIVA	SANITAS	N/A	NA	67	2/02/2021	
3	RENE MANRIQUE SAVEEDRA	7691649	RESIDENTE AGRONOMO	COLMENA	SANITAS	COLPENSIONES	SI	48	1/02/2021	
4	JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ	1018451468	ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL	SURA	SURA	PORVENIR	SI	28	1/02/2021	
5	EDWIN ROJAS	7178039	INSPECTOR	POSITIVA	COMPENSAR EPS	PORVENIR	NA	40	1/02/2021	
6	KIMBERLY DAYANA ORTEGA	1045781092	SECRETARIA	COLPATRIA	SALUD TOTAL EPS	COLPENSIONES	SI	21	1/02/2021	
7	DAWSON LASSO CORTES	80763102	CONDUCTOR	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	6/01/2021	37	1/02/2021	
8	DIEGO FERNANDO VARGAS LEON	1023914800	AYUDANTE	SURA	MEDIMAS	PORVENIR	6/01/2021	28	1/02/2021	
9	WILBER DIOMEDES JIMENEZ LASSO	5855002	CONDUCTOR	SURA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	6/01/2021	39	1/02/2021	
10	BRANDON SEBASTIAN LOPEZ AYALA	1233890527	INSPECTOR	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	12/01/2021	23	1/02/2021	

PERSONAL RETIRADO

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	AFP	EXAMEN INGRESO	EDAD	INGRESO	RETIROS
0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

PERSONAL	CANTIDAD	TOTAL
ANTIGUO	10	10
NUEVO	0	
RETIRADO	0	0

FIRMA

ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Anexo 3.

Acta de Reunión COPASST.

Maquinas y Gramas Ltda	Acta 5	Versión: 0

Fecha: 22/07/2021	Proyecto o área: COPASST
Hora de Inicio : 8:00 a.m.	Hora fin: 12:00 p.m.

1. Temas a tratar:

1.1. Se revisa cumplimiento de los compromisos del acta No 4

2. Revisión de las actividades ejecutadas en el proyecto Maquinas y Gramas LTDA en el mes de julio 2021

3. Revisión de la accidentalidad y enfermedades laborales del proyecto Maquinas y Gramas LTDA en el mes de julio 2021

4. Resultados de las inspecciones realizadas en el proyecto Maquinas y Gramas LTDA en el mes de julio 2021

5. Reporte de acoso laboral en el proyecto Maquinas y Gramas LTDA en el mes de julio 2021

6. Presentación de conflictos en el proyecto Maquinas y Gramas LTDA en el mes de julio 2021

7.Temas varios.

2. Participantes:

Nombres	Firmas
Sebastian Diaz	
Victor Pinilla	Victor Pinilla

3. Desarrollo de la Reunión:

1. Se verifica el cumplimiento del 100 % de los compromisos establecidos en el acta No. 4

2. Durante el mes se realizo:

- Se realizo inducciones de ingreso,
- Se capacito al personal en temas de seguridad y covid 19

3. En el mes de julio de 2021 no se presentaron accidentes de trabajo

4. En el mes de julio se realizaron inspecciones de seguridad donde se evaluo (condiciones de seguridad de obra, maquinaria, vehiculos, equipos, herramienta,botiquines, extintores, preoperacionales), no se presento ninguna observación.

5. En el mes de julio de 2021 no se presento en las areas de trabajo casos de acoso laboral.

6. En el mes de julio de 2021 no se presento en las areas de trabajo casos de conflictos laborales.

7. Se adecua cartelera SST en los frentes de trabajo

4. Compromisos

Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso
Realizar seguimiento a las actividades del SG-SST que se plantearon en el plan de trabajo	Sebastian Diaz	21/08/2021
Realizar inspecciones de seguridad en los difrentes frentes de obra	Sebastian Diaz	27/08/2021
Realizar revision y evaluacion de los diferentes elementos de emergencias del proyecto	Sebastian Diaz	21/08/2021

Anexo 4.

Capacitaciones.

Maquinas y Gramas Ltda	LISTA DE ASISTENCIA	Versión: 0

INDUCCIÒN: [ ] CAPACITACIÒN [x] OTRO: [ ]

REINDUCCIÒN: [ ] CHARLA: [ ]

HORA INICIO: 9:00 am HORA FIN: 9:00 am

LUGAR: M Y G LTDA

FECHA: 13/07/2021

TEMAS TRATADOS

Medidas de prevención para el riesgo psicosocial

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	BRANDON SEBASTIAN LOPEZ AYALA	INSPECTOR	1.233.890 527	
2	DAWSON LASSO CORTES	CONDUCTOR	80.763.102	
3	DIEGO VARGAS	OPERARIO	1 023.914 660	
4	WILBER DIOMEDES JIMENEZ LASSO	CONDUCTOR	5 855 002	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

CAPACITADOR : Sebastian Diaz

Anexo 5.

Inventario de sustancias quimicas.

Maquinas y Cargas Ltda. Mantenimiento de cargas Especiales en gran altura	INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	VERSIÓN 0

Realizo: Sebastian Diaz/ Residente SSTMA
Fecha de actualización: 22/07/2021

SUSTANCIA	EFECTO	MEDIADA DE ATENCIÓN	EPP'S
JABON LIQUIDO	-H335 Exposición unica, categoría 3 irritación vías respiratorias. - H317 Sensibilización cutanea categoría 1. - H319 irritación ocular categoría 2.	- En caso de tener contacto con la piel, enjuagar con un jabón suave y agua. - En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua. Tomar 2-3 vasos grandes de agua. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua hasta que retire en su totalidad el producto, manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al médico.	Guantes de caucho
ROUNDUP® FULL II	H312 Toxicidad aguda cutanea, H332 Toxicidad aguda inhalación, H315 irritación cutánea	Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo, Mantener el producto lejos de fuentes de ignición - no fumar, Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en unsitio fresco y bien ventilado, Aislar de las fuentes de ignición, No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos, En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico, En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico, Úsese únicamente en lugares bien ventilados.	En Caso de ventilación insuficiente usar mascarilla de protección para vapores Guantes de plastico Gafas protectoras herméticamente cerradas Ropa Protectora
Hipoclorito	- H335 Exposición unica, categoría 3 irritación vías respiratorias. - H317 Sensibilización cutanea categoría 1. - H319 irritación ocular categoría 2.	- En caso de tener contacto con la piel, enjuagar con un jabón suave y agua. - En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua. Tomar 2-3 vasos grandes de agua. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua hasta que retire en su totalidad el producto, manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al médico.	Guantes de caucho
Alcohol antiseptico	H226 Liquidos inflamables categoría 3, Toxicidad aguda categoría 3. - H301 oral. - H311 cutanea, H331 inhalación	- En caso de tener contacto con la piel, enjuagar con un jabón suave y agua. - En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua. Tomar 2-3 vasos grandes de agua. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua hasta que retire en su totalidad el producto, manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25ºC). -Disponga de las medidas generales para las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables. Almacene los contenedores vacíos separados de los llenos.	Gafas de seguridad
Gel Antibacterial	H226 Liquidos inflamables categoría 3, Toxicidad aguda categoría 3. - H301 oral. - H311 cutanea, H331 inhalación	- En caso de tener contacto con la piel, enjuagar con un jabón suave y agua. - En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca con agua. Tomar 2-3 vasos grandes de agua. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua hasta que retire en su totalidad el producto, manteniendo los párpados abiertos. Si presenta irritación persistente, acuda al médico. - Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25ºC). -Disponga de las medidas generales para las áreas de almacenamiento de líquidos inflamables. Almacene los contenedores vacíos separados de los llenos.	Gafas de seguridad
Gasolina	H226 Líquido inflamable H351 Posibles efectos cancerígenos, H304 Toxicidad por aspiración H302 Toxicidad aguda Oral nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H411 Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático,	Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico	Tapabocas Guantes de latex Gafas de seguridad Ropa de trabajo

Maquinas y Obras Ltda.	INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	VERSIÓN 0

Realizo: Sebastian Diaz/ Residente SSTMA
Fecha de actualización: 18/03/2021

SUSTANCIA	EFECTO	MEDIADA DE ATENCIÓN	EPP'S
ACPM	H226 Liquido inflamable H351 Posibles efectos cancerígenos, H304 Toxicidad por aspiración H302 Toxicidad aguda Oral nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H411 Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.	Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico	Tapabocas Guantes de latex Gafas de seguridad Ropa de trabajo


CORPONOR

HOJA DE SEGURIDAD

MPA-02-F-17-8 – Versión 2 – 25/02/2015

JABON LIQUIDO PARA MANOS

SIMBOLO **NFPA** (NIVEL DE RIESGO)



Escala de Calificación de Riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4= Severo

PROPIEDADES: Gel para el lavado de manos de acción suave. En su composición entran a formar parte tensioactivos y acondicionadores, para obtener una correcta limpieza y cuidado de la piel.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO GENERAL**

- **NOMBRE DEL PRODUCTO:** JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
- **USOS DEL PRODUCTO**: Limpiador Para Manos.
- **APLICACIONES:** Aplicado básicamente por medio de dosificaciones una pequeña cantidad en las manos, podrá obtener una abundante espuma y una limpieza a fondo.
- **SEGURIDAD Y MANEJO:** No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de intoxicación o accidente, suministrar primeros auxilios.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS:

Línea Única de Emergencias	123
Cruz Roja Colombiana	132
Cuerpo Oficial de Bomberos	119

- **ALMACENAMIENTO:** En su envase original bien tapado, temperaturas superiores a 5°C, apartado de los rayos solares.

2. **INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES**

- **COMPOSICIÓN:**
  - ✓ AGUA
  - ✓ TENSOACTIVOS ANIONICOS
  - ✓ TENSOACTIVOS NO IONICOS
  - ✓ GLICERINA, PERFUME - CONSERVANTES

185

- **INGREDIENTES ACTIVOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMITIDOS (ppm).** Extractos de ácidos orgánicos. Ninguno establecido

- **INGREDIENTES INERTES LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMITIDOS (ppm)**

  Agua desionizada. Ninguno establecido
  Colorante natural blanco FD&C No. 8 Ninguno establecido.

3. IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS

Ninguno de los ingredientes del Jabón Líquido para Manos está considerado o registrado como agente potencialmente carcinógeno por OSHA, Norma NTC 4435 y el Decreto 1609/2002.

4. PRIMEROS AUXILIOS

SINTOMAS POR SOBRE EXPOSICIÓN

- **Contacto con los ojos:** Enjuáguese con agua hasta que el material se haya eliminado. Si usa lentes de contacto retírelos inmediatamente. Debe levantar ambos párpados para facilitar el enjuague completo, en caso de una reacción desfavorable consulte a su médico.

- **Ingestión:** No tóxico, en caso de malestar estomacal consulte a su médico.

5. MEDIDA EN CASO DE INCENDIOS

Jabón Líquido para Manos es estable, no flamable y no arde.

- **Punto de flama/Autoignición**: No flamable.
- **Limite de flamabilidad:** No flamable.
- **Medios de extinción:** No flamable, No explosivo.
- **Procedimientos especiales de extinción:** No requiere.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Recupere el material utilizable con un medio conveniente. Los residuos pueden eliminarse limpiando o restregando el piso y retirándolo con agua.

7. ALMACENAMIENTO, MANEJO E INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

No requiere precauciones especiales. No es peligroso su almacenamiento y transporte. No requiere portar etiqueta o rótulos especiales. Almacenar a temperatura ambiente.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN

- **Limite de exposición:** La fórmula del Jabón Líquido para Manos no presenta riesgos para la salud cuando se use según las indicaciones impresas en la etiqueta. En caso de que ocurra alguna reacción alérgica en la piel o en caso de contacto con los ojos por favor ver la sección 4.

- **Ventilación**: No se requiere ventilación especial durante su uso.

- **Efectos sobre la salud humana**: Basándose en los datos de toxicidad disponibles, no se anticipan efectos adversos sobre la salud debido al uso del Jabón Líquido para Manos.

9. PROTECCIÓN PERSONAL

- **Medidas de precaución:** No hay requerimientos especiales bajo condiciones normales de uso.
- **Protección ocular:** No hay requerimientos especiales bajo condiciones normales de uso.
- **Protección de la piel:** No requiere precauciones especiales.
- **Protección respiratoria:** No requiere precauciones especiales.

10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- **Apariencia:** Líquido viscoso, blanco nacarado (puede contener colorantes).
- **Biodegradable:** En un 99% dentro de 7 días.
- **Punto de ebullición:** 100° C / 212° F
- **Solubilidad en el agua:** 100%
- **Acidez:** 0.1 % (m/v)
- **Alcalinidad Libre y Total:** máx. 0.03%
- **Densidad:** 1.082 gr/ml.
- **Microbiológico:** Recuento de Mesófilos, Mohos y Levaduras < 10 UFC/g

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No es reactivo. Es estable, incluso en condiciones de incendio. No reacciona con ácidos o agentes oxidantes.

12. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

- **General:** El carácter neutro del preparado, supone un índice de seguridad al contacto con la piel y mucosas. Algunas personas sensibles a los jabones, pueden experimentar reacciones alérgicas sobre la piel al utilizar formulaciones de esta naturaleza química, que desaparecen al suprimir el uso del mismo.

  La ingestión de este preparado no es probable, solo en acciones voluntarias o de tipo accidental. Se producirán irritaciones en tubo digestivo con diarreas y vómitos sin provocar lesiones importantes.

- **No es tóxico para el humano**:
  Oral LD50 (rata): >5.0 g/Kg peso del cuerpo.

- **Carcinogenicidad:** Jabón Líquido para Manos, no contiene ningún compuesto cancerígeno como los define la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

13. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHOS

Jabón Líquido para Manos es completamente soluble en agua y es biodegradable. Se desecha al alcantarillado o al drenaje, no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo a las disposiciones legales. Enjuague con agua el envase y deséchelo como residuo o preferiblemente recíclelo.

- **INFORMACION ECOLOGICA:** Producto biodegradable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No sujeto a regulación específica de transporte

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- **R22**. Nocivo por ingestión
- **S2.** Manténgase fuera del alcance de los niños.

16. OTRAS INFORMACIONES

Es un jabón líquido para la limpieza y cuidado de las manos. Los datos contenidos en esta ficha son una guía para el usuario y están basados en diferentes bibliografías y experiencia. La información suministrada en esta ficha técnica no pretende garantizar las propiedades o características del producto, simplemente describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.

Fecha Elaboración / Revisión: Marzo de 2015.

187

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN



Ficha de datos de seguridad del 27/4/2020, Revisión 13

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial:	HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN
Nombre químico:	HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN 12-15 % CLORO ACTIVO
Número CAS:	7681-52-9
Número EC:	231-668-3
Número REACH:	01-2119488154-34-0056

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado:

USO INDUSTRIAL

USO PROFESIONAL

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor:

ALTAIR CHIMICA S.p.a.

Via Moie Vecchie 13

56048 Saline di Volterra (PI)

Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: sds@altairchimica.com

1.4. Teléfono de emergencia

ALTAIR CHIMICA S.p.a. Phone n. +39-0588-9811

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, Etiquetado y Empacado):

- Atención, Met. Corr. 1, Puede ser corrosivo para los metales.
- Peligro, Skin Corr. 1B, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Peligro, Eye Dam. 1, Provoca lesiones oculares graves.
- Atención, Aquatic Chronic 1, Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Atención, Aquatic Acute 1, Muy tóxico para los organismos acuáticos.

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Efectos físico-químicos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente:

Ningún otro riesgo

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Peligro

Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un médico.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Disposiciones especiales:

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:

Ninguna.

2.3. Otros peligros

Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.

Otros riesgos:

Ningún otro riesgo

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Nombre comercial:	HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN
Nombre químico:	HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN 12-15 % CLORO ACTIVO
Número CAS:	7681-52-9
Número EC:	231-668-3
Número REACH:	01-2119488154-34-0056

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

Cantidad	Nombre	Número de identif.		Clasificación
>= 90%	Hipoclorito de sodio, solución con 12-15 % de Cl activo	Número Index:	017-011-00-1	◈2.16/1 Met. Corr. 1 H290 ◈3.2/1B Skin Corr. 1B H314 ◈3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ◈4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 ◈4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. EUH031
		CAS:	7681-52-9	
		EC:	231-668-3	

3.2. Mezclas

N.A.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el producto, incluso si fuera sólo una sospecha.
CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MEDICO.
En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, enjugarlos con agua durante un tiempo adecuado y manteniendo los párpados abiertos, luego consultar de inmediato con un oftalmólogo.
Proteger el ojo ileso.

En caso de ingestión:

No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

En caso de inhalación:

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN

Problemas gastrointestinales
Perforación gástrica

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico (si es posible mostrarle las instrucciones de uso o la ficha de seguridad)
Tratamiento:
Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:
Agua.
Dióxido de carbono (CO2).
Medios de extinción que no se deben utilizar por motivos de seguridad:
Ninguno en particular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar equipos respiratorios apropiados.
Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.
Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar los dispositivos de protección individual.
Llevar las personas a un lugar seguro.
Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.
Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.
En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.
Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Después de recoger el producto, lave con agua la zona y los materiales implicados.
Lavar con abundante agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.
No utilizar contenedores vacíos que no hayan sido previamente limpiados.
Antes de realizar las operaciones de transferencia, asegurarse de que en los contenedores no haya materiales residuos incompatibles.
Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:
La indumentaria contaminada debe ser sustituida antes de acceder a las áreas de almuerzo.
No comer ni beber durante el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese en ambientes siempre bien aireados.
Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos.

Materias incompatibles:
Manténgase alejado de los ácidos.
Indicaciones para los locales:
Frescos y adecuadamente aireados.

7.3. Usos específicos finales
Ningún uso particular

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9
UE - STEL: 0.5 mg/m3, 1.5 ppm - Notas: Ref. to Cl2

Valores límites de exposición DNEL
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9
Trabajador industrial: 1.55 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales
Trabajador industrial: 1.55 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Trabajador industrial: 3.1 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales
Trabajador industrial: 3.1 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 1.55 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos locales
Consumidor: 0.26 mg/kg - Exposición: Oral humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 1.55 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A largo plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 3.1 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos locales
Consumidor: 3.1 mg/m3 - Exposición: Por inhalación humana - Frecuencia: A corto plazo, efectos sistémicos

Valores límites de exposición PNEC
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9
Objetivo: agua dulce - Valor: 0.00021 mg/l
Objetivo: Agua marina - Valor: 0.000042 mg/l
Objetivo: STP - Valor: 4.69 mg/l

8.2. Controles de la exposición
Medidas de protección individual
La selección del equipo de protección personal varía según las condiciones de exposición potencial y las condiciones de trabajo.
La elección final del dispositivo de protección depende de la evaluación del riesgo individual.
El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas.
Comprobar con los proveedores de equipo de protección personal.
Para obtener información sobre el equipo de protección de emergencia (incendio o liberación accidental), consulte las secciones 5 y 6.

Protección de los ojos:
Gafas con protección lateral.

Protección de la piel:
Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón, caucho, PVC o viton.

Protección de las manos:
La elección de guantes adecuados depende no solo del material sino también de otras características de calidad que varían de un fabricante a otro.
La idoneidad de los guantes y el tiempo de ruptura variarán dependiendo de las condiciones específicas de uso. Contactar con el fabricante de guantes para advertencias específicas en

cuanto a la seleción de guantes y tiempos de ruptura para sus condiciones de uso.
Material apropiado:
Caucho butilo.
NBR (caucho nitrilo-butadieno).
PVC (polivinilcloruro)
UNI EN 420/UNI EN 374
Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total.

Protección respiratoria:
Dependiendo del potencial de exposición, seleccione un equipo de protección respiratoria adecuado a las condiciones específicas de uso y en cumplimiento de la legislación vigente.
Dispositivo de filtrado de los gases (DIN EN 141).

Riesgos térmicos:
Ninguno

Controles de la exposición ambiental:
Ninguno

Controles técnicos apropiados:
Ninguno

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto y color:	Líquido
Olor:	Característica
Umbral de olor:	N.A.
pH:	>11
Punto de fusión/congelamiento:	N.A.
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:	N.A.
Inflamabilidad sólidos/gases:	N.A.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosión:	N.A.
Densidad de los vapores:	N.A.
Punto de ignición (flash point, fp):	N.A.
Velocidad de evaporación:	N.A.
Presión de vapor:	N.A.
Densidad relativa:	1.26 g/cm3
Hidrosolubilidad:	100%
Solubilidad en aceite:	N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):	N.A.
Temperatura de autoencendido:	N.A.
Temperatura de descomposición:	N.A.
Viscosidad:	N.A.
Propiedades explosivas:	N.A.
Propiedades comburentes:	N.A.

9.2. Otros datos

Miscibilidad:	N.A.
Liposolubilidad:	N.A.
Conductibilidad:	N.A.
Propiedades características de los grupos de sustancias	N.A.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
En contacto con ácidos libera cloro, gas tóxico.

10.2. Estabilidad química
La estabilidad de la solución disminuye con la acción del calor, la luz y en presencia de algunos rastros de impurezas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
En contacto con ácidos libera cloro, gas tóxico. Reacciona con amoníaco en solución y aminas formando compuestos explosivos. Puede reaccionar violentamente en contacto con muchos

metales, en particular: cobre, níquel, hierro.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado del calor y la luz solar directa.

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos (descomposición violenta con liberación de cloro), metales (descomposición con liberación de oxígeno), materiales combustibles.

Ninguna en particular.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Cloro, ácido hipocloroso, clorato de sodio.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Informaciones toxicológicas relativas a la sustancia:

HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9

a) toxicidad aguda

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Test: LD50 - Vía: Oral - Especies: Rata > 1100 mg/kg - Notas: Ref. to Cl

Test: LC50 - Vía: Inhalación - Especies: Rata > 10.5 mg/l - Notas: Ref. to Cl

Test: LD50 - Vía: Piel - Especies: Conejo > 20000 mg/kg - Notas: Ref. to Cl

b) corrosión o irritación cutáneas

El producto está clasificado: Skin Corr. 1B H314

Test: Corrosivo para la piel - Vía: Piel Positivo

c) lesiones o irritación ocular graves

El producto está clasificado: Eye Dam. 1 H318

Test: Corrosivo para los ojos - Vía: Piel Positivo

d) sensibilización respiratoria o cutánea

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

e) mutagenicidad en células germinales

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

f) carcinogenicidad

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

g) toxicidad para la reproducción

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

j) peligro de aspiración

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.

HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9

El producto está clasificado: Aquatic Chronic 1 - H410; Aquatic Acute 1 - H400

a) Toxicidad acuática aguda:

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 0.06 mg/l - Duración h.: 96

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN

Parámetro: LC50 - Especies: Peces = 0.032 mg/l - Duración h.: 96
Parámetro: EC50 - Especies: Daphnia = 0.141 mg/l - Duración h.: 48
Parámetro: EC50 - Especies: ALB10 = 0.026 mg/l - Duración h.: 48

12.2. Persistencia y degradabilidad
N.A.
12.3. Potencial de bioacumulación
N.A.
12.4. Movilidad en el suelo
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN - CAS: 7681-52-9
Movilidad en el suelo: Móvil
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna.
12.6. Otros efectos adversos
Ninguno

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recuperar si es posible. Enviar a centros de eliminación autorizados o a incineración en condiciones controladas. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte



14.1. Número ONU

ADR-UN Number:	1791
IATA-UN Number:	1791
IMDG-UN Number:	1791

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR-Shipping Name:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN
IATA-Shipping Name:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN
IMDG-Shipping Name:	HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR-Class:	8
ADR - Número de identificación del peligro:	80
IATA-Class:	8
IATA-Label:	8
IMDG-Class:	8

14.4. Grupo de embalaje

ADR-Packing Group:	II
IATA-Packing group:	II
IMDG-Packing group:	II

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR-Contaminante ambiental:	Sí
IMDG-Marine pollutant:	Marine Pollutant

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

ADR-Subsidiary hazards:	-
ADR-S.P.:	521
ADR-Categoria de transporte (Código de restricción en túneles):	(E)
IATA-Passenger Aircraft:	851
IATA-Subsidiary hazards:	-
IATA-Cargo Aircraft:	855
IATA-S.P.:	A3 A803
IATA-ERG:	8L

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN

IMDG-EmS: F-A , S-B
IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: "Away from" acids.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
N.A.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Dir. 98/24/CE (Riesgos relacionados con los agentes quí?micos durante el trabajo)
Dir. 2000/39/CE (Valores límite de exposición profesional)
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013
Reglamento (UE) 2015/830
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Reglamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Reglamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Reglamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Reglamento (UE) n. 2018/699 (ATP 11 CLP)
Reglamento (UE) N. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas, de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH) y las modificaciones posteriores:

Restricciones relacionadas con el producto:
Restricción 3
Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas:
Ninguna restricción.

Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas:

Directiva 2012/18/EU (Seveso III)
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).
1999/13/CE (directiva COV)
Dir. 2004/42/CE (directiva COV)

Disposiciones sobre la directiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoría Seveso III de acuerdo con el anexo 1, parte 1
el producto pertenece a la categoría: E1

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la sustancia

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las frases utilizadas en el párrafo 3:

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN

Clase y categoría de peligro	Código	Descripción
Met. Corr. 1	2.16/1	Corrosivos para los metales, Categoría 1
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Corrosión cutánea, Categoría 1B
Eye Dam. 1	3.3/1	Lesiones oculares graves, Categoría 1
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Peligro agudo para el medio ambiente acuático, Categoría 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Peligro crónico (a largo plazo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1

Parágrafos modificados respecto la revisión anterior

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
SECCIÓN 12. Información ecológica
SECCIÓN 16. Otra información

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

ADR:	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
CAS:	Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).
CLP:	Clasificación, etiquetado, embalaje.
DNEL:	Nivel sin efecto derivado.
EINECS:	Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.
ETA:	Estimación de la toxicidad aguda
ETAmix:	Estimación de Toxicidad Aguda (Mezclas)
GefStoffVO:	Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS:	Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
IATA:	Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
IATA-DGR:	Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).
ICAO:	Organización de la Aviación Civil Internacional.
ICAO-TI:	Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil Internacional" (OACI).
IMDG:	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
INCI:	Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.
KSt:	Coeficiente de explosión.
LC50:	Concentración letal para el 50% de la población expuesta.

Ficha de datos de seguridad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN

LD50:	Dosis letal para el 50% de la población expuesta.
N.A.:	Not Available
PNEC:	Concentración prevista sin efecto.
RID:	Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
STEL:	Nivel de exposición de corta duración.
STOT:	Toxicidad específica en determinados órganos.
TLV:	Valor límite del umbral.
TWA:	Promedio ponderado en el tiempo
WGK:	Clase de peligro para las aguas (Alemania).

Hoja de Datos de Seguridad

Copyright,2021,3M Company.Todos los derechos reservados. Se permite copiar y / o descargar esta información con el fin de utilizar adecuadamente los productos de 3M, siempre y cuando que: (1) la información se copie por completo sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de 3M, y (2) ni la copia ni el original se revende o se distribuye con la intención de obtener una ganancia al respecto.

Número de Documento:	26-6011-6	**Número de versión:**	8.00
Fecha de publicación	17/02/2021	**Sustituye a:**	19/01/2018

Esta Hoja de Seguridad ha sido preparada de acuerdo al Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre de bienes peligrosos por carretera

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación del producto
SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Números de Identificación de Productos

70-2007-8764-9	70-2007-8809-2	70-2007-8810-0	70-2007-8811-8	70-2007-8813-4
70-2007-8814-2	70-2007-8815-9	70-2007-8997-5	70-2007-8999-1	70-2007-9000-7
70-2007-9001-5	70-2007-9020-5	70-2007-9022-1	70-2007-9023-9	70-2007-9025-4
70-2007-9026-2	CH-0000-1559-4	CH-0000-1560-2	CH-0000-1562-8	CH-0000-1563-6
CH-0000-1565-1	CH-0000-1568-5	CH-0000-1585-9	CH-0000-1586-7	CH-0000-1588-3
CH-0000-1589-1	CH-0000-1590-9	CH-0000-1610-5	CH-0000-1611-3	CH-0000-1612-1
CH-0000-1647-7	CH-0000-1650-1	CH-0000-1652-7	CH-0000-1653-5	CH-0000-1699-8
CH-0000-1963-8	CH-0000-1964-6	CH-0000-2138-6	UU-0015-7055-3	UU-0016-0094-7
UU-0016-3535-6	UU-0092-4110-8	UU-0101-4402-8	UU-0112-0190-0	XH-0000-1946-9
XH-0000-1963-4				

1.2. Usos recomendados y restricciones sobre el uso

Recomendaciones de uso
Sanitizante

Para Uso Profesional Unicamente

1.3. Detalles del proveedor

Dirección:	3M Colombia, Avenida El Dorado No 75-93, Bogotá
Teléfono:	57+1+4161666
E Mail:	EHSColombia@mmm.com
Página web:	www.3M.com.co

1.4. Teléfono de emergencia.
57+1+4161666 Ext 7777

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
Líquido Inflamable: Categoría 2.

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2A.
Toxicidad a Organos Diana Específicos (Exposición única): Categoría 3
Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 2
Peligroso para el medio ambiente acuático: Toxicidad crónica, categoría 3.

2.2. Elementos de la etiqueta.

Este producto no es peligroso para el transporte

Palabra de señal
PELIGRO]

Símbolos
Llama ISigno de exclamación I

Pictogramas



INDICACIONES DE PELIGRO:

H225	Liquido y vapor altamente inflamable
H319	Causa seria irritación a los ojos
H336	Puede causar somnolencia o mareo
H401	toxico para la vida acuática
H412	Nocivo para la vida acúatica con efectos terminales

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención:

P210A	Mantener alejado de fuentes de calor, llama abierta, superficies calientes o chispas. No fumar.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol.

Respuesta:

P305 + P351 + P338	CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Proseguir con el lavado.
P370 + P378G	En caso de fuego: Use un agente extintor adecuado para líquidos inflamables como polvo químico y dióxido de carbono para su extinción.

Almacenamiento:

P405	Almacenar en sitios cerrados

Eliminación:

P501	Desecho de contenido/ contenedor de acuerdo con regulaciones locales/ regionales/ nacionales e internacionales

2.3. Otros peligros.
Exposición repetida puede causar sequedad o formación de grietas

SECCIÓN 3: composición/ información de ingredientes

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Liquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Este material es una mezcla

Ingrediente	N° CAS	% en peso
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	40 - 70
AGUA DESIONIZADA	7732-18-5	30 - 60
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	0.5 - 1.5

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:
Llevar a la persona a tomar aire fresco. Si usted no se siente bien, conseguir atención médica

Contacto con la piel:
Inmediatamente lave con jabón y agua. Remover ropa contaminada y lavar antes de reusar. Si signos/sintomas persisten , consiga atención mpedica

Contacto con los ojos:
Inmediatamente enuague los ojos con abundante agua por al menos 15 minuto. Remover lentes de contacto si es facil hacerlo . Continue enjuagando.Consiga atención médica

En caso de ingestión:
Enjuagar boca. Si no se siente bien,Conseguir atención médica

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.
Sin síntomas ni efectos criticos. Consulte la Sección 11.1, información sobre efectos toxicológicos.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinsión adecuadi
En caso de fuego: Use un agente extintor adecuado para líquidos inflamables como polvo químico y dióxido de carbono para su extinción.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden adquirir presión y explotar.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

Sustancia	Condiciones
Monóxido de carbono	Durante la Combustión
Dióxido de carbono	Durante la Combustión

5.3. Acciones de protección especial para blas personas que combaten el incendio.
El agua puede no apagar el fuego eficazmente; sin embargo, debe utilizarse para mantener las superficies frías, mantener refrigerados los envases expuestos al fuego y evitar roturas explosivas. Use ropa protectora completa, incluyendo casco, presión autónoma, positiva o aparatos de respiración a presión, chaqueta y pantalón bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial y cubierta protectora para las áreas expuestas de la cabeza.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.
Evacuar la zona. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes-No fumar. Utilizar

únicamente herramientas que no produzcan chispas. Ventilar la zona con aire fresco. En caso de grandes derrames, o derrames en espacios confinados, proporcionar ventilación mecánica para dispersar los vapores, según una buena práctica de higiene industrial. Advertencia! Un motor puede ser una fuente de ignición y podría causar que los gases o vapores inflamables en el area de un derrame se quemén o exploten. Consulte otras secciones de esta FDS para información relativa a peligros físicos y para la salud, protección respiratoria, ventilación y equipos de protección personal.

6.2. Precauciones medioambientales.
Evitar su liberación al medio ambiente. Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en el sistema de alcantarillas.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.
Contener derrame. Cubra el área del derrame con una espuma de extinción de incendios que sea resistente a los solventes polares. Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material absorvente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoja toda la cantidad de material derramado, usando un utensilio anti-chispas. Colocar en contenedor metálico aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar los residuos con agua. Selle el envase. Deshacerse del material recolectado lo antes posible de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales aplicables.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Sólo para uso industrial o profesional. No para la venta o uso del consumidor. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes-No fumar. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloruro, ácido crómico, etc.) No introducir en los ojos. Use zapatos estáticos o con conexión a tierra de baja. Para minimizar el riesgo de ignición, determinar las clasificaciones eléctricas aplicables al proceso de utilizar este producto y seleccionar equipos específicos con tubos de ventilación para evitar la acumulación de vapores inflamables. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción si hay posibilidad de electricidad estática.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de fuentes de calor. Almacenar alejado de ácidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental
Si un componente esta mencionado en la sección 3 pero no aparece en la tabla de abajo, no hay un límite de exposición ocupacional disponible para ese componente.

Ingrediente	Nº CAS	INSHT	Tipo de Límite	Comentarios adicionales.
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	A4: No clasificado, como carcinogeno humano.

ACGIH : Conferencia Americana de Higienistas Industriales gubernamentales
CMRG : Lineamientos recomendados fabricante de productos químicos
VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria
VLA-EC: Valor límite Ambiental de Exposición de Corta Duración
CEIL: Umbral superior

8.2. Controles de exposición.

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

8.2.1. Controles de ingeniería.
Utilizar equipo de ventilación antideflagrante. Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminantes en el aire esté por debajo de los límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es adecuada utilizar protección respiratoria.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección para los ojos/la cara.

Seleccione y use protección para prevenir el contacto con los ojos / la cara en base a los resultados de una evaluación de la exposición. Las siguientes protecciones para los ojos / la cara son recomendadas:
Gafas panorámicas ventiladas.

Protección de la piel/las manos
Elegir y usar guantes y/o ropa de protección para evitar el contacto con la piel basándose en los resultados de un asesoramiento de exposición. Consultar con el proveedor habitual de guantes y/o ropa de protección para la selección de materiales compatibles adecuados.
Se recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales: Caucho de butilo
Fluoroelastómero
Caucho de nitrilo

Protección respiratoria.

Se puede necesitar una evaluación de la exposición para decidir si se requiere un respirador. Si se necesita un respirador, utilice respiradores como parte de un programa completo de protección respiratoria. En base a los resultados de la evaluación de la exposición, seleccione un respirador de los siguientes tipo (s) para reducir la exposición de inhalación:
Respirador de media máscara o máscara completa purificadora de aire adecuada para vapores orgánicos

Para cuestiones acerca si un producto es apropiado para una aplicación específica, consulte con su proveedor de proteción respiratoria.

SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas

9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.

Forma física	Líquido
Forma física específica:	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Alcohol
Umbral de olor	*No hay datos disponibles*
pH	5 - 8 Unidades no disponibles o no aplicables. [*Detalles:*a 25°C]
Punto de fusión/Punto de congelamiento	*No hay datos disponibles*
Punto de ebullición/punto inicial de ebulliciónj/ Intervalo de ebullición	80 °C - 100 °C
Punto de inflamación	22 °C [*Método de ensayo:*Copa cerrada]
Rango de evaporación	*No hay datos disponibles*
Inflamabilidad (sólido, gas)	No aplicable
Límites de inflamación (LEL)	2 % volumen
Límites de inflamación (UEL)	12 % volumen
Presión de vapor	*No hay datos disponibles*
Densidad de Vapor y/o Densidad de Vapor Relativa	*No hay datos disponibles*
Densidad	0,872 g/ml - 0,887 g/ml
Densidad relativa	0,872 N/A - 0,887 N/A [*Ref Std:*AGUA=1]
Solubilidad en agua	100 %

202

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Solubilidad-no-agua	*No hay datos disponibles*
Coeficiente de partición: n-octanol/agua	*No hay datos disponibles*
Temperatura de autoignición	*No hay datos disponibles*
Temperatura de descomposición	*No hay datos disponibles*
Viscosidad / Viscosidad Cinemática	*No hay datos disponibles*
Compuestos Orgánicos Volátiles	*No hay datos disponibles*
Porcentaje de volátiles	*No hay datos disponibles*
COV menor que H2O y disolventes exentos	*No hay datos disponibles*

Nanopartículas
Este Material no contiene Nanopartículas

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.
Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes títulos en esta sección

10.2 Estabilidad química.
Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar.
Calor
Luz.
Chispas y/o llamas
Luz.

10.5 Materiales incompatibles.
Ácidos fuertes
Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Sustancia	Condiciones
Ninguno conocido.	

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material y/o las señales y síntomas de exposición, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar disponible para la exposición o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Información sobre efectos toxicológicos.

Signos y Síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Irritación del tracto respiratorio: los síntomas pueden incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y dolor de garganta y nariz. Puede ocasionar efectos a la salud adicionales (ver abajo)

Contacto con la piel:
No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritación significativa.
La exposición prolongada/repetida puede provocar:

Pérdida de grasa cutánea: Los síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, picor, sequedad y formación de grietas en la piel.

Reacción alérgica en la piel (no foto-inducida) en personas sensibilizadas: Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, comezón y picor.

Contacto con los ojos:
Irritación grave de los ojos: los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, lagrimeo, aspecto nebuloso de la córnea y dificultades en la visión.

Ingestión:
Irritación gastrointestinal: señales/síntomas pueden incluir dolor abdominal, estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. Puede ocasionar efectos a la salud adicionales (ver abajo)

Efectos a la Salud Adicionales:

Exposición única puede causar efectos a órganos blanco:
Depresión del sistema nervioso central: los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, descoordinación, náuseas, aumento del tiempo de reacción, dificultades en el habla e inconsciencia.

Datos toxicológicos
Si un componente está descrito en la sección 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificación.

Toxicidad aguda

Nombre	Ruta	Especies	Valor
Producto completo	Inhalación-Vapor(4 hr)		No hay datos disponibles; calculado ATE >50 mg/l
Producto completo	Ingestión:		No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000 mg/kg
ALCOHOL ISOPROPILICO	Dérmico	Conejo	LD50 12.870 mg/kg
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación-Vapor (4 horas)	Rata	LC50 72,6 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILICO	Ingestión:	Rata	LD50 4.710 mg/kg
Digluconato de clorhexidina	Dérmico	Conejo	LD50 > 5.000 mg/kg
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	Rata	LD50 2.000 mg/kg

ATE= toxicidad aguda estimada

Irritación o corrosión cutáneas

Nombre	Especies	Valor
ALCOHOL ISOPROPILICO	Varias especies animales	Irritación no significativa
Digluconato de clorhexidina	Conejo	Irritación no significativa

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nombre	Especies	Valor
ALCOHOL ISOPROPILICO	Conejo	Irritante severo
Digluconato de clorhexidina	Conejo	Corrosivo

Sensibilización:

204

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Sensibilización cutánea

Nombre	Especies	Valor
ALCOHOL ISOPROPILICO	Cobaya	No clasificado
Digluconato de clorhexidina	Humanos y animales	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación

Sensiblización de las vías respiratorias

Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Mutagenicidad en células germinales.

Nombre	Ruta	Valor
ALCOHOL ISOPROPILICO	In Vitro	No mutagénico
ALCOHOL ISOPROPILICO	In vivo	No mutagénico
Digluconato de clorhexidina	In Vitro	No mutagénico
Digluconato de clorhexidina	In vivo	No mutagénico

Carcinogenicidad

Nombre	Ruta	Especies	Valor
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	Rata	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	Varias especies animales	No carcinogénico

Toxicidad para la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

Nombre	Ruta	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
ALCOHOL ISOPROPILICO	Ingestión:	No clasificado para desarrollo	Rata	NOAEL 400 mg/kg/day	durante la organogénesis
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	No clasificado para desarrollo	Rata	LOAEL 9 mg/l	durante la gestación
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	No clasificado para desarrollo	Rata	NOAEL 30 mg/kg/day	durante la gestación

Órgano(s) específico(s)

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única

Nombre	Ruta	Órgano(s) específico(s)	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	depresión del sistema nervioso central.	Puede provocar somnolencia o vértigo.	Humano	NOAEL No disponible	
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	Irritación del sistema respiratorio	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	Humano	NOAEL No disponible	
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	sistema auditivo	No clasificado	Cobaya	NOAEL 13,4 mg/l	24 horas
ALCOHOL ISOPROPILICO	Ingestión:	depresión del sistema nervioso central.	Puede provocar somnolencia o vértigo.	Humano	NOAEL No disponible	envenamiento y/o intoxicación
Digluconato de clorhexidina	Inhalación	Irritación del sistema respiratorio	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	riesgos similares para la salud	NOAEL No disponible	

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposiciones repetidas

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Nombre	Ruta	Órgano(s) específico(s)	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 12,3 mg/l	24 meses
ALCOHOL ISOPROPILICO	Inhalación	sistema nervioso	No clasificado	Rata	NOAEL 12 mg/l	13 semanas
ALCOHOL ISOPROPILICO	Ingestión:	riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 400 mg/kg/day	12 semanas
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	hígado	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	Perro	NOAEL 0,89 mg/kg/day	1 años
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	sistema inmune	No clasificado	Conejo	NOAEL 71 mg/kg/day	2 años
Digluconato de clorhexidina	Ingestión:	sistema hematopoyético | riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 71 mg/kg/day	2 años

Peligro por aspiración
Para el componente / los componentes, no hay información disponible, o la información no es suficiente para su clasificación

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la HDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCIÓN 12: Información ecológica

La información a continuación puede no ser consistente con la clasificación del material en la Sección 2 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Está disponible, bajo petición, la información adicional que lleva a la clasificación del material en la Sección 2. Adicionalmente, los datos sobre destino y efectos medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta sección porque un ingrediente está presente por debajo del umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposición, o los datos no se consideran relevantes para el material como un todo.

12.2. Toxicidad.

Peligro acuático agudo:
GHS: Agudo categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro acuático crónico:
GHS: Peligro crónico categoría 3: Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

Material	Nº CAS	Organismo	Tipo	Exposición	Punto final de ensayo	Resultado de ensayo
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Bacteria	Experimental	16 horas	LOEC	1.050 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Crustáceos	Experimental	24 horas	LC50	>10.000 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Green Algae	Experimental	72 horas	EC50	>1.000 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Medaka	Experimental	96 horas	LC50	>100 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILIC	67-63-0	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	>1.000 mg/l

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

O						
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	1.000 mg/l
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	100 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Lodo activado	Experimental	3 horas	EC50	25 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	0,081 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	0,087 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Pez cebra	Experimental	96 horas	LC50	2,08 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,007 mg/l
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	0,021 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad.

Material	Nº CAS	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Experimental Biodegradación	14 días	Demanda biológica de oxígeno	86 % BOD/ThBOD	OECD 301C - MITI (I)
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Experimental Biodegradación	28 días	Disol. agotamiento del carbono orgánico	71 % En peso	OECD 301A - DOC Die Away Test

12.3. Potencial de bioacumulación.

Material	Nº CAS	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
ALCOHOL ISOPROPILICO	67-63-0	Experimental Bioconcentración		Log coeficiente partición octanol/agua	0.05	Método no estándar
Digluconato de clorhexidina	18472-51-0	Experimental Bioconcentración		Log coeficiente partición octanol/agua	-1.81	Método no estándar

12.4 Movilidad en suelo.
Por favor contácte con el fabricante para más detalles

12.5 Otros efectos adversos
No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

13.1. Métodos de disposición
Ver la sección 11.1 Información sobre efectos toxicológicos

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Incinerar en una incineradora autorizada. La destrucción adecuada puede precisar carburante adicional durante los procesos de incineración. Como alternativa de eliminación, utilizar una instalación de tratamiento de residuos autorizada. Los envases/bidones/contenedores vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas (preparados/mezclas/sustancias químicas clasificadas como peligrosas por las normativas aplicables) deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos a menos que así sea determinado por las normativas de residuos aplicables. Consulte con las respectivas autoridades competentes para determinar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desecharlos.

SECCIÓN 14: Información de Transporte

Transporte Terrestre (ADR) y Transporte Marítimo (IMDG)

Número UN:UN1219
Nombre Apropiado del Embarque: Isopropanol
Nombre técnico: No Asignado
Clase de Riesgo/División:3
Riesgo Secundario: No Asignado
Grupo de Empaque No Asignado
Cantidad limitada: No Asignado
Contaminante Marino: No Asignado
Nombre técnico de contaminatne marino No Asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No restringido, de acuerdo a la Provision Especial 216

Transporte Aéreo (IATA)

Número UN:UN1219
Nombre Apropiado del Embarque: Isopropanol
Nombre técnico: No Asignado
Clase de Riesgo/División:3
Riesgo Secundario: No Asignado
Grupo de Empaque No Asignado
Cantidad limitada: No Asignado
Contaminante Marino: No Asignado
Nombre técnico de contaminatne marino No Asignado
Otras descripciones de productos peligrosos:
No restringido, de acuerdo a la Provision Especial A46

Las clasificaciones de transporte se proporcionan como un servicio al cliente. Para envío, USTED es responsable de cumplir con todas las leyes y regulaciones correspondientes, que incluyen la clasificación y empaque para transporte adecuado. Las clasificaciones de transporte de 3M se basan en la fórmula del producto, empaque, políticas de 3M y el entendimiento de 3M de las regulaciones actuales aplicables. 3M no garantiza la exactitud de esta información de clasificación. Esta información sólo aplica a los requisitos de clasificiación de transporte y no a los de empaque, etiquetado o marcaje. La información anterior sólo es para referencia. Si el envío es aéreo o marítimo,se le recomienda revisar y cumplir los requisitos regulatorios aplicables.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Regulaciones aplicables
Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Ley 55 de 1993. Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990

SoluPrep (0.5% - 2% CHG, 70% IPA) (Transparente-Líquido) (100.26, 101.02, 101.06, 101.07, 102.02, 102.03, 102.08, 103.14, 103.15)

Estatus de Inventario Global
Todos los ingredientes químicos de este material están listados en el Inventario Europeo de Químicos Para información adicional, contácte con 3M. Los componentes de este material estan en cumplimiento con los lineamientos de Korea Chemical Control Act. Algunas restricciones pueden aplicar. Contacte a la division de ventas para información adicional. Los componentes de este material cumplen lo especificado en "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para información adicional consulte con la división de ventas. Los componentes de este producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificación de sustancias de "CEPA". Este producto cumple con las medidas sobre la gestión medioambiental de nuevas sustancias químicas.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Clasificación de Riesgos NFPA
Salud: 2 **Inflamabilidad** 3 **Inestabilidad:** 0 **Peligros Especiales:** Ninguno

Agencia de Protección Nacional de Fuego (NFPA) Los rangos de peligro NFPA son diseñados para uso de personal de respuesta a emergencias para tratar los peligros que se presentan por la exposición a corto plazo, exposición aguda a un material bajo condiciones de fuego, derramame, o emergencias similares. Los rangos de peligro se basan principalmente en las características físicas y tóxicas inherentes del material pero también incluyen las características tóxicas de los productos de la combustión o de la descomposición que se conocen para ser generados en cantidades significativas.

La infomación contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta Hoja o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

Las Hojas de Seguridad de 3M Colombia estan disponibles en 3M.com.co

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS/MSDS)

GEL ANTIBACTERIAL

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

1.1 Identificación del producto

Nombre: Gel antibacterial.
Marca: PQP Profesional.

1.2 Usos pertinentes Identificados y usos desaconsejados

Recomendaciones de uso: Según la hoja técnica del producto

1.3 Datos del proveedor de la HS/FDS

Productos Químicos Panamericanos S.A

1.4 Teléfonos de emergencia

PQP Girardota	**Girardota**. Auto norte Km 22.	**Teléfono 57+4 444 97 77**
PQP Sevillana	**Bogotá**. Carrera 61 N° 45A-94 sur.	**Teléfono 57+1 747 03 77**
PQP Barranquilla	**Barranquilla**.Carrera67 (Carretera a Eternit) N° Vía 40-437 Zona Industrial La Loma No. 3.	**Teléfono 57+5 385 97 17**
PQP Jamundí	**Jamundí.** Km 28 vía Cali - Popayán.	**Teléfono 57+2 695 45 71**
PQP Neiva	**Neiva**. Km8 vía Tello, Neiva.	**Teléfono 57+8 868 6731**
PQP Muña	**Bogotá,** km 22 vía al salto.	**Teléfono 57+1 747 03 77**
Cisproquim	**Bogotá** 01-8000-916012. Atención las 24 horas	**Teléfono 57+1 288 60 12**
Correo Electrónico	PQP-DEPARTAMENTOTECNICO@pqp.com.co	

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLASIFICACIÓN según el sistema globalmente armonizado

Este producto no cumple los criterios para clasificarse en una clase de peligro con arreglo al Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de Productos Químicos. Sin embargo, se facilitará una ficha de datos de seguridad a pedido.

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia: Peligro para la salud humana, líquido inflamable.

Indicaciones de peligro:

H332 Nocivo en caso de inhalación
H319 Provoca irritación ocular grave
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H226 Líquidos y vapores inflamables
H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento

	Elaboro/Modifico	Reviso	Aprobó
FIRMA			
CARGO	Equipo Interdisciplinario	Coordinador SGC	Director Técnico

Consejos de prudencia:

P103 Leer la etiqueta antes del uso
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar

2.3 Otros peligros
Ninguno.

3. COMPOSICION /INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia
No Aplica.
3.2 Mezcla

COMPONENTES	No. CAS	OBSERVACIONES/TLV
Alcohol etílico 96%	64-17-5	
Trietanolamina	102-71-6	

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Medidas Generales:	Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Consulte al médico, llevando la hoja de seguridad
Inhalación:	Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Mantenga la calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria. Llame al médico.
Contacto con la piel:	N/D
Contacto con los ojos:	Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 20 minutos, y mantenga abiertos los parpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del parpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico.
Ingestión:	NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca con agua. Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalación:	Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratorias.
Contacto con la piel:	El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel
Contacto con los ojos:	Irritante para los ojos.
Ingestión:	Puede provocar irritación, e inducir el vómito.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que se deban dispensarse inmediatamente.

Nota al médico: Tratamiento sintomático. Para más información, consulte a un Centro de Intoxicaciones.

211

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO2. Utilizar el producto acorde a los materiales de los alrededores.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

El producto y sus embalajes que arden en espacios cerrados por períodos largos pueden producir cantidades de dióxido de carbono.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para Extinción de incendio:

Rocíe con agua los embalajes para evitar la ignición si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los embalajes si aún no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo.

Enfrié los contenedores con chorros de agua hasta mucho después que el fuego se haya extinguido, removiendo los restos hasta eliminar los rescoldos.

Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilución ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales.

5.3.2 Protección durante la extinción de incendios:

Utilice equipo autónomo de respiración. La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada en situaciones de incendio ÚNICAMENTE.

5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como dióxidos de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada.

6.1.2 Para el personal de emergencias

Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Usar equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Ventilar inmediatamente, especialmente en zonas bajas donde puedan acumularse los vapores. No permitir la reutilización del producto derramado.

Tener en cuenta la información y recomendaciones de las secciones 5 y 7. Utilizar el equipo de protección recomendado en el punto 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenga que el producto llegue a cursos de agua.

6.3 Método y material de contención y de limpieza

Para fugas del producto, detenga la fuga en caso de poder hacerlo. Formar una barrera con material

absorbente evitando contaminación de fuentes hídricas. Limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos. En manejo a nivel industrial lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Temperatura entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Materiales de envasado:	El suministrado por el fabricante
Productos incompatibles:	Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.

8. CONTROLES DE EXPOSICION FISICAS Y QUIMICAS

8.1 Parámetros de control

CMP (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):	N/D
CMP-C (Res. MTESS 295/03):	N/D
TLV-TWA (ACGIH):	N/D
TLV-STEL (ACGIH):	N/D
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000):	N/D
IDLH (NIOSH):	N/D
PNEC (agua):	N/D
PNEC (mar):	N/D
PNEC-STP:	N/D

8.2 Controles de exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilación normal para operaciones habituales de manufacturas es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o liberen grandes cantidades de producto. En áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica.

Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de protección personal

Protección de los ojos y la cara:	Se deben usar gafas de seguridad con protección lateral
Protección de la piel:	Se deben usar guantes de nitrilo
Protección respiratoria:	En los casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores. Filtro P o Filtro A. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo (SCBA).

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Gel con partículas en suspensión
Color:	Traslúcido
Olor:	Característico según estándar
Umbral olfativo:	N/D
pH:	6.0 – 8.0
Viscosidad (25°C)	2000-4000 cps
Punto de fusión / de congelación:	N/D
Punto / intervalo de ebullición:	N/D
Tasa de evaporación:	N/D
Inflamabilidad:	Ligeramente inflamable
Punto de inflamación:	N/D
Límites de inflamabilidad:	N/D

Presión de vapor (20°C):	N/D
Densidad de vapor (aire=1):	N/D
Densidad aparente al empacar g/mL:	0.95-1.05
Solubilidad (20°C):	Completamente soluble
Coef. de reparto ($logK_{o/w}$):	N/D
Temperatura de autoignición:	N/D
Temperatura de descomposición:	N/D
Viscosidad cinemática (cSt a 25°C):	N/D
Constante de Henry (20°C):	N/D

Log Koc:	N/D
Propiedades explosivas:	N/D
Propiedades comburentes:	El producto no es comburente

9.2 Información adicional
Otras propiedades: N/D

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad
No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento, temperatura de 5°C a 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

10.2 Estabilidad química
El producto es químicamente estable y no requiere estabilizantes bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se espera polimerización peligrosa. Reacciones fuertes con: Metales alcalinos, Metal alcalinotérreo, Anhídrido acético, Peróxidos, Óxido de fósforo, Ácido nítrico, Nitrato, Percloratos.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Evitar altas temperaturas. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

10.5 Materiales incompatibles
Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
El monóxido de carbono, humos y gases irritantes y tóxicos, el dióxido de carbono.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:	No se dispone de información
Irritación o corrosión cutáneas:	No se dispone de información
Lesiones o irritación ocular graves:	No se dispone de información
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No se dispone de información

Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción:

No se dispone de información sobre ningún componente de este producto, que presente niveles mayores o iguales que 0,1%, como carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos).

Efectos agudos y retardados:

Vías de exposición:	Inhalatoria, contacto dérmico y ocular
Inhalación: Contacto con la piel: Contacto con los ojos: Ingestión:	Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza. El contacto frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel. Irritante para los ojos. Puede provocar irritación y vomito.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad
No se dispone de información de toxicidad presentada.

12.2 Persistencia y degradabilidad
BIODEGRADABILIDAD (estimado): >60% según método OECD 301D Botella cerrada.

12.3 Potencial de bioacumulacion
Log $K_{o/w}$: N/D
BIOACUMULACIÓN EN PECES – BCF (OCDE 305): N/D.

12.4 Movilidad en el suelo
Log $K_{o/w}$: N/D
CONSTANTE DE HENRRY (20°C): N/D.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
N/D

12.6 Otros efectos adversos
AOX y contenido de metales: No contiene ningún metal ni compuestos halogenados

13. CONSIDERACIONES PARA DESECHO
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente y en particular de residuos peligrosos (Ley 1252 de 2008; Decreto 1076 de 2015; resolución 1362 de 2007; Resolución 0053 de 2007; resolución 222 de 2011) Deberá clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada. Procedimiento de disposición: Tratamiento de aguas residuales, o disposición en relleno sanitario.

14. INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

14.1 Transporte terrestre

Nombre Apropiado para el Transporte:	Gel antibacterial
N° UN/ID:	1170
Clase de Peligro:	3

Grupo de Embalaje:	II
Código de Riesgo:	N/A
Cantidad limitada y exceptuada:	N/A

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII
No contiene sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Recomendaciones del CESIO: Los surfactantes empleados en esta preparación son catalogados como biodegradables de acuerdo con la reglamentación (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los datos que corroboran esta afirmación están a la disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y serán puestos a su disposición si así lo solicitan o a petición de un productor de detergentes.

Otras instrucciones, restricciones y disposiciones legales: Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]. Reglamento (CE) n.° 648/2004 de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006. Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos. Directiva 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas.

16. OTRAS INFORMACIONES

16.1 Abreviaturas y acrónimos

N/A: no aplicable.
N/D: sin información disponible.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral
TWA: Media Ponderada en el tiempo
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración
REL: Límite de Exposición Recomendada. PEL: Límite de Exposición Permitido.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ETA: estimación de la toxicidad aguda.
DL_{50}: Dosis Letal Media.
CL_{50}: Concentración Letal Media.
CE_{50}: Concentración Efectiva Media.
CI_{50}: Concentración Inhibitoria Media.

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Colombia: NTC 4435, 22 de Julio de 1998 TRANSPORTE PARA MERCANCIAS. MSDS PARA MATERIALES.
Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificatorias.
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.
Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015). Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015). Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.

COPIA NO CONTROLADA

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, Dec 1496/2018
International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinan la clasificación de la mezcla.

Procedimientos de acuerdo con el SGA/GHS La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto. SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto. SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos. SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda.

16.4 Exención de responsabilidad.

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento.

Fin de la FDS

COPIA NO CONTROLADA

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas
Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente

ARP | sura — Sistema

HOJA DE SEGURIDAD

GASOLINA SIN PLOMO



1203

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Espíritu de motor. Gasolina automotor libre de plomo.
Líquido incoloro o amarillo con olor característico a petróleo.

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido y vapor inflamables. Peligro de incendio o explosión por calor, chispa o llamas.
El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, inconsciencia y muerte. Irritante leve o medio para piel y ojos.

SECCION 3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla de hidrocarburos volátiles de C4 a C12 y aditivos especiales. Puede contener marcadores y trazas de benceno.
Números CAS: [8006-61-9] otros: [68425-31-0] [68514-15-8] [68606-11-1]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Tome precauciones para su propia seguridad (utilice equipo de protección adecuado, retire la fuente de contaminación o mueva la víctima al aire fresco). Personal capacitado debe suministrar respiración artificial si la víctima no respira, o aplicar resucitación cardiopulmonar si hay paro cardíaco y respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del gasolina. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y un jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta que el producto sea removido. Debajo de la corriente de agua retire la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero contaminados. Si persiste la irritación repita el lavado. Obtenga atención médica de inmediato. La ropa debe descontaminarse antes de su reutilización.
Ingestión: Si la víctima está consciente, dele a beber dos o tres vasos de agua lentamente. NO INDUZCA AL VÓMITO; si éste ocurre naturalmente, mantenga la víctima inclinada para reducir riesgo de aspiración. Repita la administración de agua. Obtenga ayuda médica.
Contacto con los ojos: Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato en una estación lavaojos con abundante agua tibia a baja presión, durante por lo menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido, manteniendo los párpados separados. Evite que el agua contaminada caiga sobre la cara o el ojo no contaminado. Obtenga atención médica de inmediato.

SECCION 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido extremadamente inflamable. Puede entrar en ignición fácilmente a temperatura ambiente. Puede formar mezclas explosivas con el aire a concentraciones bajas. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden arder por descargas estáticas. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar distancias considerables hasta una fuente de ignición y devolverse hasta el lugar de una fuga o un contenedor abierto. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. Durante incendios puede producir gases tóxicos e irritantes. Los contenedores pueden estallar con calor o fuego.
Procedimiento: Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacúe el área en 800 metros. De lo contrario, evacúe como mínimo 50 metros. Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el fuego se extinga por sí solo. Si las llamas son extinguidas sin detener la fuga, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que vuelvan a arder. El agua puede ser inefectiva debido al bajo punto de inflamación y la baja solubilidad de la gasolina. Utilíce el agua en forma de niebla únicamente par enfirar los contenedores, nunca para apagar el fuego. Debe utilizarse traje especial y equipo de respiración autocontenido. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Enfríe con agua en forma de rocío los contenedores expuestos y retírelos si puede hacerlo sin peligro. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: Espuma regular. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **3**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial de la NFPA)

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento con protección adecuada. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición incluyendo baterías y motores, chispas o llamas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle en 25 a 50 metros. Contenga el derrame con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para solventes, chemizorb o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN.
Introduzca en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Avise a organismos de socorro.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie.
Absorbentes Recomendados: Almohadillas, calcetines, espagueti (boom).

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores, estanterías y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. NUNCA use este producto para lavarse las manos o los brazos. Lávese completamente las manos después de su manipulación. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y fuentes de ignición. A temperatura ambiente (de 15 a 25 ℃).

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 300 ppm (890 mg/m3). **STEL (TECHO):** 500 ppm (1480 mg/m3). **Carcinogenicidad A3** (Cancerígeno en animales). (ACGIH).

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Nitrilo, Viton.
>4hr: PVA. 4H®


>4hr: Caucho nitrilo.


Contacto prolongado o repetido: Trajes de Viton® o Responder®.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tyvek® QC, Tychem®
Riesgo alto de salpicadura: Tyvek®-Saranex laminado, CPF® 3 o 4, Responder®, Viton®.


Ducha


Lavaojos


Hasta 500 ppm: respirador purificador de aire con pieza facial completa y cartucho para vapores orgánicos.
Mayor que 500 ppm o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: Varía entre 50 y 200 °C
Densidad del vapor: 2,5-3,7 (aire=1).
Gravedad específica: 0,72 a 0,76 a 20°C (agua=1).
Temperatura de autoignición: Corriente: Aprox. 399°C. Extra: Aprox. 454°C
Velocidad de evaporación: Variable. Mayor que 10 (Acetato de butilo=1)
Temperatura de inflamación: gasolina extra:-40°C (copa cerrada)
Valor de pH: No aplicable
Límites de explosividad: Inferior: entre 0,6% y 1;4%. Superior: entre 7,6% y 8,0%
Umbral de olor: 0,3 ppm. Buen signo de advertencia.
Solubilidad: Prácticamente insoluble en agua (0,1 - 1%). Completamente soluble en éter, cloroformo, etanol y otros solventes del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio, agua oxigenada, etc). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Evitar descargas estáticas, chispas, llamas abiertas, calor y otras fuentes de ignición.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos, aldehídos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Vapores o nieblas pueden causar irritación de la nariz y garganta, depresión del sistema nervioso central manifestada en mareos leves, vértigo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, falta de coordinación, desorientación, vómito. En áreas mal ventiladas o espacios confinados puede ocurrir pérdida de la conciencia y asfixia.
Contacto con la piel: Contacto prolongado (durante 30 minutos o más) causa irritación severa (enrojecimiento y dolor), quemaduras serias y caída de epidermis. Puede ocurrir absorción, pero no en grado significativo. Por exposición prolongada pueden absorberse candidades peligrosas. Por contacto frecuente o prolongado puede causar resecamiento, efecto desengrasante, resquebrajamiento, irritación y dermatitis. También se han reportado reacciones alérgicas.
Contacto con los ojos: Los vapores producen irritación. El líquido puede causar dolor y enrojecimiento temporales, pero no daño permanente.
Ingestión: Moderadamente tóxico por ingestión. Puede causar quemaduras en los labios, garganta y pecho, irritación del estómago, náusea, vómito y cianosis (coloración azulosa de la piel). Síntomas de depresión del sistema nervioso central como los mencionados en inhalación. Puede producirse aspiración durante la ingestión o el vómito, la cual puede ocasionar neumonitis (inflamación de los pulmones), edema pulmonar e incluso la muerte.
Efectos crónicos:
Sistema neurológico: La inhalación intensa crónica puede ocasionar temblor, desvanecimientos, alucinaciones visuales y auditivas, pérdida de memoria. **Carcinogenicidad:** La IARC la clasifica como posible carcinógeno humano. Puede contener sustancias conocidas como carcinógenas como benceno y dibromuro de etileno. **Otros efectos:** No se han reportado efectos mutagénicos ni genotóxicos.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Los derrames de gasolina son tóxicos para peces y flora acuática. No es fácilmente biodegradable. Potencialmente bioacumulable. Volatilización rápida. Evite su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Puede flotar e impedir la oxigenación en cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Desecho tóxico EPA **D002.** Disponga en relleno de seguridad especialmente diseñado o incinere en equipo apropiado, según las leyes.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases tóxicos (2.3), sustancias oxidantes (5.1), peróxidos (5.2), sustancias tóxicas (6.1).
Apague el motor cuando cargue y descargue. No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto o desde el contenedor. Asegure todos los contenedores en el vehículo contra movimiento. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sistema Globalmente Armonizado:




Peligro	**Atención**
Líquido y vapor muy inflamables	Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Altamente inflamable. Puede causar cáncer. Nocivo si se ingiere puede causar daño pulmonar.
Evite exposición. Obtenga instrucción especial antes de su uso. En caso de accidente o malestar obtenga ayuda médica.
Altamente inflamable. Puede ser encendido por chispas, llamas o calor intenso. Puede acumular cargas estáticas por agitación o movimiento.
El vapor puede causar dolor de cabeza, náuseas, vértigo, somnolencia, pérdida de conciencia y muerte. Irritante leve o medio para piel y ojos.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire Protection Guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Threshold Limit Values (TLVs) for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices (BEI's), USA. 2010.
3. CCOHS. Base de datos CHEMINFO ONLINE. Canadian Centre for Occupational Health and Safety.
4. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002 Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. MinTransporte. Bogotá. 2002.
5. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 16 Edición. USA. 2009.

GASOLINA

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se le dé a esta información.

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para ...idios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
... e equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa. Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 °C). El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCION PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:

>8hr: Caucho de nitrilo, viton. **>8hr:** Caucho de nitrilo

Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas

De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.

Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.

Ducha Lavaojos

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 °C dependiendo del fabricante.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15°C (agua=1) Menos pesado que el agua. **Temperatura de autoignición:** 230 °C.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 °C. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38°C). Concentraciones altas del vapor producen irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCION 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCION 14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo

Sistema Globalmente Armonizado:

Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instrucciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL

BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

ACPM

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico	: Roundup® Full II
Usos recomendados	: Herbicida
Nombre del proveedor	: Arysta LifeScience Chile S.A.
Dirección del proveedor	: Calle el Rosal 4610 - Huechuraba - Santiago - Chile
Número de teléfono del proveedor	: +56 2 2560 4500
Dirección electrónica del proveedor	: info@arysta.com
Número de teléfono de emergencia en Chile	: +56 2 2560 4500 +56 2 2777 1994 (RITA-CHILE)
Número de teléfono de información toxicológica en Chile	: +56 2 2635 3800 (CITUC) +56 2 2777 1994 (RITA-CHILE)
Información del fabricante	: Monsanto Argentina S.A.I.C. Maipú 1210, Piso 10 – Cap. Fed. Argentina Tel: 0810-MONSANTO (6667268)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según NCh382	: No clasificado.
Distintivo según NCh2190	: No aplica.
Clasificación específica	: IV (Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero)
Distintivo específico	: CUIDADO. Franja verde.
Descripción de peligros	: Puede causar irritación ocular temporal leve. Puede causar irritación en la piel. Puede ser dañino si se ingiere.
Descripción de peligros específicos	: No aplica.
Otros peligros	: No hay información disponible.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla de componentes no peligrosos según NCh382 y cuya información es confidencial.

	Componente 1
Denominación química sistemática	Sal de potasio de N-fosfonometil glicina
Nombre común o genérico	Sal de potasio de glifosato
Rango de concentración	66,2% p/v
Número CAS	70901-12-1
Número CE	924-295-9

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	: Retirarse a un ambiente ventilado y fresco.
Contacto con la piel	: Lavar con agua y jabón.
Contacto con los ojos	: En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con agua limpia.
Ingestión	: No inducir al vómito, dar de beber grandes cantidades de agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o con convulsiones. Probable daño a las mucosas puede contraindicar lavado gástrico. Si persisten los síntomas, LLAME A UN MÉDICO.
Efectos agudos previstos	: No hay información disponible.
Efectos retardados previstos	: No hay información disponible.
Notas especiales para un médico tratante	: Aplicar tratamiento sintomático. Tratamientos con atropinas y oximas no están indicados. Este producto no es un inhibidor de la colinesterasa.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	: Agua, polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2), espuma.
Agentes de extinción inapropiados	: No hay información disponible.
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica	: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de fósforo.
Peligros específicos asociados	: No hay información disponible.
Métodos específicos de extinción	: No hay información disponible.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	: Los bomberos que puedan estar expuestos a vapores, nieblas o productos de combustión deben utilizar equipos autónomos de respiración.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales	: No inhalar.
Equipo de protección	: Use gafas protectoras, guantes, botas y delantal.
Procedimientos de emergencia	: Recoja el material derramado, colóquelo en una bolsa plástica y luego en un tambor de metal, y finalmente proceda a la disposición de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en la sección 13. Si el derrame es sobre la tierra, remover 2 cm. de profundidad de ese suelo y colocarlo en envases apropiados para su eliminación.
Precauciones medioambientales	: No manguerear hacia los desagües. No contaminar flujos de agua.
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento	: Contenga el derrame de líquidos sobre suelo u otras superficies impermeables, utilizando tierra, arena, bentonita, atapulguita u otros materiales absorbentes.
Métodos y materiales de limpieza	: Lave el suelo con detergente industrial y enjuague con agua.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura	: Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar los vapores.
Medidas operacionales y técnicas	: Lávese las manos y la piel contaminada con abundante agua luego de haber manipulado este producto. No contaminar los cursos de agua al limpiar los equipos.
Otras precauciones	: No vierta efluentes que contienen este producto directamente en drenajes, alcantarillado y cursos de agua.
Precauciones específicas	: No hay información disponible.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	: Mantenga lejos de comidas, bebidas y alimentos para animales. Mantenga únicamente en el envase original. Puede producirse una cristalización parcial si se almacenara en forma prolongada por debajo de la temperatura mínima de almacenamiento. En caso de congelamiento, coloque el producto en una habitación tibia y agite con frecuencia para mezclar nuevamente la solución. Duración mínima de almacenado: 5 años.
Medidas técnicas	: No hay información disponible.
Sustancias y mezclas incompatibles	: Acero galvanizado, acero blando sin revestimiento.
Material de envase y/o embalaje	: Acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio, plástico, revestimientos de vidrio.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

	Límite Permisible Ponderado	Límite Permisible Temporal	Fuente
Sal de potasio de glifosato	No hay información disponible	No hay información disponible	---

Elementos de protección personal

Protección respiratoria	: No existe requisito especial cuando se lo utiliza según se recomienda.
Protección de manos	: Use guantes apropiados para manipular productos químicos.
Protección de ojos	: Si existe posibilidad de contacto, use antiparras para productos químicos.
Protección de la piel y el cuerpo	: En caso de posible contacto, use protección facial. Use ropa y calzado apropiados para manipular productos químicos.
Medidas de ingeniería	: Reducir la inhalación de este producto restringiendo el área de trabajo y manipulando en lugar ventilado e instalando extractores en los lugares donde se manipula el producto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido
Forma en que se presenta	: No aplica
Color	: Marrón oscuro
Olor	: Característico leve
pH	: 4,8
Punto de fusión/punto de congelamiento	: 200 °C
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición	: No hay información disponible

Punto de inflamación	: > 93,3 °C
Límites de explosividad	: No hay información disponible
Presión de vapor	: No hay información disponible
Densidad relativa del vapor (aire = 1)	: No hay información disponible
Densidad relativa	: 1,357 g/ml (20 °C)
Solubilidad(es)	: 11,6 g/L (agua) Insoluble en acetona, benceno y etanol
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: Glifosato: log Pow = 3,2 (25 °C)
Temperatura de autoignición	: No hay información disponible.
Temperatura de descomposición	: 200 °C

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
Reacciones peligrosas	: Puede reaccionar con material cáustico (básico).
Condiciones que se deben evitar	: No hay información disponible.
Materiales incompatibles	: Reacciona ante el acero galvanizado o el acero blando sin revestimiento, y produce hidrógeno, un gas muy inflamable que puede explotar.
Productos de descomposición peligrosos	: Monóxido de carbono, óxidos de fósforo, óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

Por ingestión LD50	: > 3000 mg/kg, rata
Por vía cutánea LD50	: > 4000 mg/kg, conejo
Por inhalación LC50	: > 22,8 mg/L (4 h), rata

Irritación/corrosión cutánea	: Moderadamente irritante.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Moderadamente irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No sensibilizante cutáneo, cobayos.
Mutagenicidad de células reproductoras /*in vitro*	: No es mutagénico.
Carcinogenicidad	: No se considera cancerígeno.
Toxicidad reproductiva	: No hay información disponible.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única	: No hay información disponible.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas	: No hay información disponible.
Peligro de inhalación	: No hay información disponible.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)

Peces	: Producto	LD50: 5,62 mg/L (96 h), *Poecilia reticulata*
Invertebrados	: Producto	LC50: 780 mg/L (48 h), *Daphnia magna*
Algas	: Producto	EC50: 7,8 mg/L, *Selenastrum capricornutum*
Aves	: Glifosato	LC50: > 2000 mg/kg, *Coturnix coturnix japónica*
Abejas	: Producto	LD50: > 100 µg/abeja (48 h), *Apis mellifera*

Persistencia y degradabilidad : La vida media es de 2 – 174 días. El KOC es 884 – 60000 L/kg, se absorbe fuertemente en el suelo. En el agua la vida media es menor a 7 días.

Potencial bioacumulativo : *Lepomis machochirus*, Pez entero: BCF < 1. No se espera bioacumulación significativa.

Movilidad en suelo : No hay información disponible.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Residuos : El producto excedente debe disponerse de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la etiqueta. Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud.

Envase y embalajes contaminados : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud.

Material contaminado : Eliminar conforme a Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Número NU	No aplica	No aplica	No aplica
Designación oficial de transporte	No aplica	No aplica	No aplica
Clasificación de peligro primario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Clasificación de peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	No aplica	No aplica	No aplica
Peligros ambientales	No aplica	No aplica	No aplica
Precauciones especiales	No aplica	No aplica	No aplica

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales : Decreto N° 148 del 2004 del Ministerio de Salud.
Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero.
Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero.

Regulaciones internacionales : No hay información disponible.

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Control de cambios	:	Se adecua toda la información según requisitos de NCh2245:2015 y se modifica clasificación según NCh382 en sección 2 y en sección 14 por ser un producto no peligroso bajo ese criterio.
Abreviaturas y acrónimos	:	BCF, en inglés: Factor de bioconcentración EC50, en inglés: Concentración efectiva 50 EPA, en inglés: Agencia de Protección Ambiental KOC, en inglés: Coeficiente de partición agua-carbono orgánico LC50, en inglés: Concentración letal 50 LD50, en inglés: Dosis letal 50
Referencias	:	HDS de Roundup® Full II, HDS3470V-003 HDS del fabricante

Este producto debe almacenarse y manipularse de acuerdo con las prácticas habituales de higiene industrial para productos químicos y en conformidad con los reglamentos vigentes. La información aquí contenida incluye los conocimientos más recientes desde el punto de vista de la seguridad. Por ello no debe suponerse que garantizan ciertas propiedades.
Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en éste es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera de control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Anexo 6.

Entrega de EPI

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

AREA	CONTRATO 2940 DE 2020	No. 007
CARGO	CONDUCTOR	MYG
NOMBRE	DAWSON LASSO	C.C. 80.763.102

En el cumplimiento de la legislación sobre salud ocupacional y de acuerdo con la ley 9 de 1979, elemento de protección personal, artículos 122, 123, 124, resolución 2400 de 1979, del Ministerio de trabajo capitulo II, de los equipos y elementos de protección artículo 176, 177, 178 y en concordancia con los factores de riesgo ocupacionales identificados en el cargo, se hace entrega de la dotación de los implementos de protección personal.

DESCRIPCIÓN	CANT	COLOR	AÑO DEL UNIF	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
OVEROL DE DOS PIEZAS T	2	INSTITUCIONAL	2021	01/07/2021	
GUANTES DE VAQUETA	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	
TAPABOCAS	CAJA	BLANCOS	2021	01/07/2021	
TAPAOIDOS INSERCION	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	

P: Perdido N: Nueva D: deterioro

CAMISA: N PANTALON: N BOTAS: N

Certifico haber leído, comprendido este documento y recibido los elementos de protección personal garantizando un buen uso y cuidado.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

AREA	CONTRATO 2940 DE 2020	No. 007
CARGO	CONDUCTOR	MYG
NOMBRE	DIOMEDES JIMENEZ LASSO	C.C. 5.855.002

En el cumplimiento de la legislación sobre salud ocupacional y de acuerdo con la ley 9 de 1979, elemento de protección personal, artículos 122, 123, 124, resolución 2400 de 1979, del Ministerio de trabajo capitulo II, de los equipos y elementos de protección artículo 176, 177, 178 y en concordancia con los factores de riesgo ocupacionales identificados en el cargo, se hace entrega de la dotación de los implementos de protección personal.

DESCRIPCIÓN	CANT	COLOR	AÑO DEL UNIF	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
OVEROL DE DOS PIEZAS T	2	INSTITUCIONAL	2021	01/07/2021	Wilber Diomedes Jimenez
GUANTES DE VAQUETA	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	Wilber Diomedes Jimenez
TAPABOCAS	CAJA	BLANCOS	2021	01/07/2021	Wilber Diomedes Jimenez
TAPAOIDOS INSERCION	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	Wilber Diomedes Jimenez

P: Perdido N: Nueva D: deterioro

CAMISA: N PANTALON: N BOTAS: N

Certifico haber leído, comprendido este documento y recibido los elementos de protección personal garantizando un buen uso y cuidado.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

AREA	CONTRATO 2940 DE 2020	No. 007
CARGO	CONDUCTOR	MYG
NOMBRE	DIEGO FERNANDO VARGAS	C.C. 1.023.914.800

En el cumplimiento de la legislación sobre salud ocupacional y de acuerdo con la ley 9 de 1979, elemento de protección personal, artículos 122, 123, 124, resolución 2400 de 1979, del Ministerio de trabajo capitulo II, de los equipos y elementos de protección artículo 176, 177, 178 y en concordancia con los factores de riesgo ocupacionales identificados en el cargo, se hace entrega de la dotación de los implementos de protección personal.

DESCRIPCIÓN	CANT	COLOR	AÑO DEL UNIF	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
OVEROL DE DOS PIEZAS T	2	INSTITUCIONAL	2021	01/07/2021	DIEGO F. VARGAS
GUANTES DE VAQUETA	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	DIEGO F. VARGAS
TAPABOCAS	CAJA	BLANCOS	2021	01/07/2021	DIEGO F. VARGAS
TAPAOIDOS INSERCION	1	AMARILLOS	2021	01/07/2021	DIEGO F. VARGAS

P: Perdido N: Nueva D: deterioro

CAMISA: N PANTALON: N BOTAS: N

Certifico haber leído, comprendido este documento y recibido los elementos de protección personal garantizando un buen uso y cuidado.

Anexo 7.

Inspecciones SST.

Máquinas y Gramas Ltda. Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Versión 0

LUGAR: Cancha EYX 154 — FECHA: 22/07/2021

RESPONSABLE DEL BOTIQUIN: David Lajso

	ELEMENTO	Contenido	Cantidad Existente	ESTADO			OBSERVACIÓN
				B	R	ESTADO	
1	GASA precortada (sobres sellados)	5	3	✓		B	
2	APOSITOS OCULARES	3	2	✓		B	
3	APLICADORES (para antisépticos)	5					
4	ESPARADRAPO MICROPORE (24mm x 5m)	1	1	✓		B	
5	ESPARADRAPO DE TELA 4"	1					
6	AGUA DESTILADA / SOLUCION SALINA	2	1	✓		B	
7	ALCOHOL YODADO O ISODINE	1					
8	ALCOHOL	1					
9	ALGODÓN	1 Paquete					
10	BAJALENGUAS	5					
11	GUANTES MEDICOS DESECHABLES	3 pares	3	✓		B	
12	TERMOMETRO ORAL	1	3	✓		B	
13	TIJERAS	1					
14	VENDA ELASTICA (2 x 5 Yardas)	1	1	✓		B	
15	VENDA ELASTICA (3 x 5 Yardas)	1	1	✓		B	
16	VENDA ELASTICA (5 x 5 Yardas)	1					
17	VENDA DE ALGODON (3 x 5 Yardas)	1					
18	CURAS	10	3	✓		B	
19	KIT DE INMOVILIZADORES (Pierna, brazo, cuello y tobillo - Solo Aplica Proyectos)	1					
20							
21							
22							
23							

Nota: Estado B-Bueno R-Regular M-Malo V-Vencido NV-No vencido (Puede combinar las letras B, R, M con V y NV)

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres:	Cargos:	Firmas:
Sebastian Diaz	Rol SSTMA	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda. Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Versión 0

LUGAR: Camion VCW 058 | FECHA: 22/07/2021

RESPONSABLE DEL BOTIQUIN: Pablo Emilio Arango

	ELEMENTO	Contenido	Cantidad Existente	ESTADO			OBSERVACIÓN
				SI	NO	ESTADO	
1	GASA precortada (sobres sellados)	5	5				
2	APOSITOS OCULARES	3	3				
3	APLICADORES (para antisépticos)	5					
4	ESPARADRAPO MICROPORE (24m/m x 5m)	1	1				
5	ESPARADRAPO DE TELA 4"	1					
6	AGUA DESTILADA / SOLUCION SALINA	2	1				
7	ALCOHOL YODADO O ISODINE	1	1				
8	ALCOHOL	1	1				
9	ALGODÓN	1 Paquete	1				
10	BAJALENGUAS	5	3				
11	GUANTES MEDICOS DESECHABLES	3 pares	5				
12	TERMOMETRO ORAL	1					
13	TIJERAS	1	1				
14	VENDA ELASTICA (2 x 5 Yardas)	1	1				
15	VENDA ELASTICA (3 x 5 Yardas)	1					
16	VENDA ELASTICA (5 x 5 Yardas)	1					
17	VENDA DE ALGODON (3 x 5 Yardas)	1					
18	CURAS	10	5				
19	KIT DE INMOVILIZADORES (Pierna, brazo, cuello y tobillo - Solo Aplica Proyectos)	1					
20							
21							
22							
23							

Nota: Estado B-Bueno R-Regular M-Malo V-Vencido NV-No vencido (Puede combinar las letras B, R, M con V y NV)

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres :	Cargos:	Firmas:
Sebastian Diaz	Res SSST	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	Versión 0

LUGAR: Cenion Ext 7371 — FECHA: 22/05/2024

RESPONSABLE DEL BOTIQUIN: Diomedes Jimenez

	ELEMENTO	Contenido	Cantidad Existente	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	GASA precortada (sobres sellados)	5	5	✓		B	
2	APOSITOS OCULARES	3	3	✓		B	
3	APLICADORES (para antisépticos)	5					
4	ESPARADRAPO MICROPORE (24mm x 5m)	1	1	✓		B	
5	ESPARADRAPO DE TELA 4"	1	1	✓		B	
6	AGUA DESTILADA / SOLUCION SALINA	2	2	✓		B	
7	ALCOHOL YODADO O ISODINE	1	1	✓		B	
8	ALCOHOL	1	1	✓		B	
9	ALGODÓN	1 Paquete	1	✓		B	
10	BAJALENGUAS	5					
11	GUANTES MEDICOS DESECHABLES	3 pares	5	✓		B	
12	TERMOMETRO ORAL	1					
13	TIJERAS	1					
14	VENDA ELASTICA (2 x 5 Yardas)	1					
15	VENDA ELASTICA (3 x 5 Yardas)	1					
16	VENDA ELASTICA (5 x 5 Yardas)	1					
17	VENDA DE ALGODON (3 x 5 Yardas)	1					
18	CURAS	10	10	✓		B	
19	KIT DE INMOVILIZADORES (Pierna, brazo, cuello y tobillo - Solo Aplica Proyectos)	1					
20							
21							
22							
23							

Nota: Estado B-Bueno R-Regular M-Malo V-Vencido NV-No vencido (Puede combinar las letras B, R, M con V y NV)

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:		
Nombres :	Cargos:	Firmas:
Sebastian Diaz	Rel SST	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Versión 0

LUGAR: Sabaneta MyG LTDA FECHA: 22/07/2021

EXTINTORES

NUMERO DEL EXTINTOR:		Extintor No. 1	Extintor No. 2	Extintor No. 3	OBSERVACIONES
UBICACIÓN DEL EXTINTOR.		Camion VCW058	Camion EXZ737	Camion EYX154	
FECHA DE VENCIMIENTO:		Feb/22	Feb/22	12/5/22	
Clases de fuego que se pueden presentar	A FUEGO SECO (material sólido, papel, madera o la ropa)	X	X	X	
	B INCENDIOS DE LÍQUIDOS, grasa (materiales inflamables similares.)	X	X	X	
	C FUEGO DE EQUIPOS Electrónicos con energía.	X	X	X	
	D INCENDIOS de metales combustibles				
Tipo de agente extintor que se utiliza	Agua a presión				
	Polvo Químico seco				
	Dióxido de Carbono				
	Solkaflam	X	X	X	
	Otro				

ESTADO		Extintor No. 1				Extintor No. 2				Extintor No. 3				OBSERVACIONES
		BUEN ESTADO	CAMBIO	MANTENIMIENTO	NO FUNCIONA	BUEN ESTADO	CAMBIO	MANTENIMIENTO	NO FUNCIONA	BUEN ESTADO	CAMBIO	MANTENIMIENTO	NO FUNCIONA	
Estado Físico del extintor	En posición vertical	X				X				X				
	Tiene pasador	X				X				X				
	Asegurado el pasador	X				X				X				
	Palanca transporte buena	X				X				X				
	Palanca Operación buena	X				X				X				
	Manómetro bueno	X				X				X				
	Manómetro indica buena presión	X				X				X				
	Boquilla buena	X				X				X				
	Manguera buena													
	Etiquetas legibles	X				X				X				
	Cilindro bueno	X				X				X				
	Señalizado	X				X				X				
	Señalización es visible	X				X				X				
	Extintor protegido del medio ambiente	X				X				X				

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres:	Cargos:	Firmas:
Sebastian Diaz	Rol SST/MA	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda	INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA	Versión 0

LUGAR: Frente de obra MyG LTDA FECHA: 22/07/2021

	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GESTION DE OBRA					
1	Se permite el ingreso de personal externo a la obra?	X			
2	Los conductores de las volquetas al ingresar a la obra hacen uso de los E.P.P	X			
3	Los trabajadores utilizan de forma segura la escalera dentro de la excavación.	X			
4	Los trabajadores utilizan elementos diferentes a los E.P.P como por ejemplo (cachuchas, gorras etc	X			
5	los trabajadores utilizan el tapabocas especialmente en laboros tales como manejo de cemento y extendida de asfalto?	X			
6	Los trabajadores utilizan audifonos para escuchar música dentro de la ejecución de sus labores.			X	
7	Los operadores realizan limpieza de maquinaria en movimiento.	X			
8	Se evidencio juegos o bromas entre los mismos trabajadores durante la ejecución de sus actividades?		X		
SEÑALIZACION DE OBRA					
9	Existe señalización de entrada a la obra.	X			
10	Existe señalización de obligatorio uso del casco.	X			
11	Existe señalización de obligatorio uso de botas de seguridad.	X			
12	Existe señalización de obligatorio el uso de guantes.	X			
13	Existe señalización de prohibido fumar.	X			
14	Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.	X			
15	Existe señalización de los equipos contra incendios.	X			
16	En caso de presencia de Líneas de Alta Tensión, existe señalización.			X	
17	Existe señalización de advertencia por presencia de volquetas, maquinaria pesada ..etc	X			
18	Se encuentran señalizadas con cintas las líneas de servicios encontradas durante las excavaciones (agua, gas, teléfono etc.)	X			
19	Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.	X			
20	La señalización es apropiada a las caracteristicas del tipo de producción y esta localizada en sitios de facil visualización?	X			
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
21	Existen suficientes extintores en la obra.	X			
22	Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.	X			
23	los extintores se encuentran libres de obstáculos y se encuentran colocados en los sitios de mayores riesgos?	X			
24	Existe botiquín en la obra.	X			
25	El botiquín está equipado de forma adecuada.	X			
26	Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.	X			
ACOPIOS					
27	Los acopios de materiales y escombros se encuentran señalizados y cubiertos con plásticos negros y con estructuras de confinamiento bolsas de lonas rellenas de arena?	X			

Escaneado con CamScanner

	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ACOPIOS					
28	Se encuentra debidamente señalizado e identificado los sitio de acopio de los materiales (cemento, hierro, madera, materiales granulares, materiales prefabricados?	X			
29	Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamien.	X			
30	Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.	X			
31	las alturas de los acopios de los prefabricados (ladrillos, tubos. Rejillas no superan los 1,5 metros?	X			
32	Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.	X			
TRABAJO EN ALTURAS (MAS 1.50 MTS)					
33	Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura.			X	
34	Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.			X	
35	Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar.			X	
36	Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.			X	
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONAL DE OBRA					
37	Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.			X	
38	El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.			X	
39	Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.			X	
40	Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro.			X	
41	La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.			X	
EQUIPOS EN GENERAL					
42	La maquinaria, equipos vehiculares y volquetas que retiran escombros y fresado del frente de obra se encuentran debidamente identificadas con stiker y su funcionamiento en cuanto a (luces, pito de reserva', espejos, llanta) son buenas.	X			
43	La maquinaria cuentan con extintor multipropósito de 10 lb de capacidad, como mínimo, debidamente cargado y vigente.	X			
44	Las palas de las maquinaria deben mantenersen siempre abajo durante su movilización.	X			
45	La maquinaria y las volquetas se encuentran identificadas con su correspondiente estiquer que indica el numero de contrato y datos de la obra	X			
46	se mantienen encendidas las luces en posición baja mientras se circula por el corredor de obra.	X			
47	Herramientas manuales en buen estado.	X			
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					
48	El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.	X			
49	En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad	X			
50	El personal emplea calzado de seguridad.	X			
51	El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.	X			
52	El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.	X			
53	El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones de seguridad.	X			
54	Los equipos de protección personal son adecuados al riesgo y se suministran oportunamente?	X			

Escaneado con CamScanner

	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
PARA ESCAVACIONES					
55	La herramienta y equipo a utilizar se encuentra en buenas condiciones?	X			
56	El área de excavación se encuentra señalizada antes de iniciar actividades y cuando terminan las mismas?	X			
PARA EXCAVACIONES					
57	Las actividades de excavación es inspeccionada, verificada y controlada por el inspector?	X			
58	La excavación se encuentra señalizada a 0,5 metros del borde de la excavación y tiene avisos de advertencia?	X			
59	Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavacione?	X			
60	No se permite que personal ajeno al área se acerque a las excavaciones?	X			
61	Las excavaciones mayores de 1,2 metros de profundidad están entibadas?	X			
62	Se utiliza escaleras de madera para que bajen los trabajadores a las excavaciones de profundidad mayores de 1,0 metro?			X	
63	Los trabajadores que laboran con herramientas manuales en el interior de las excavaciones están separados por una distancia no menor de 2	X			
64	Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.	X			
65	Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos.	X			
66	Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.	X			
ORDEN Y LIMPIEZA					
67	Ausencia de puntales en tablones de encofrado o similares.	X			
68	Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.	X			
69	Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.	X			
70	Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.	X			
71	Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.	X			
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
72	Se cuenta con un espacio suficiente para el almacenamiento, movilización de personas, objetos y materiales?	X			
73	Existen guardas en los puntos de operación y los sistemas de transmision de fuerza en las maquinas y equipos?	X			
74	Se tiene dispositivos de seguridad para alimentar o retirar piezas procesadas en las maquinas con riesgo de atrapamiento?	X			
75	El lugar de trabajo (vias de circulación, zonas de almacenamiento) estan demarcadas, limpios y ordenados (sin regeros en el piso, objetos y	X			
76	Se efectuan labores de matenimiento tales como limpieza, lubricación ajuste operación de los equipos apagados y haciendo uso de las tarjetas o candados?	X			
77	Los trabajadores realizan unicamente las labores para lo que fueron contratados?	X			
78	Las herramientas de trabajo son comodas, seguras y se utilizan para la tarea apropiada?	X			
CONDICIONES QUIMICAS					
79	Los envases con productos quimicos poseen etiquetas de advertencia de los peligros, la información de la etiqueta es coherente con la hoja de seguridad?	X			
80	Se cuenta con hojas de seguridad de los productos químicos utilizados y son de facil acceso.	X			
81	Existen sistemas de extracción de polvos, vapores, gases o nieblinas?	X			
82	Los recipientes de sustancias químicas se encuentran tapados?	X			
83	El área de almacenamiento de sustancias quimicas cuenta con extintor de acuerdo con las hojas de seguridad y Kit de derrames.	X			
CONDICIONES FISICAS					
84	La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para realizar la tarea?	X			

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES ERGONOMICAS					
	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
85	La altura de los planos de trabajo, controles, palancas, permiten posturas comodas para el operario?	X			
86	Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentado durante el trabajo, cuando se realizan tareas livianas?	X			
87	La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura?	X			
88	Se cuenta con ayudas para manipular objetos pesados?	X			
CONDICIONES BIOLOGICAS					
89	Los servicios sanitarios estan en buenas condiciones de orden y aseo?	X			
CONDICIONES PSICOSOCIALES					
90	Las jornadas de trabajo de la empresa son generalmente de 8 horas?	X			
91	Las tareas que realizan las personas son variadas y pueden tomar decisiones?	X			
92	Las relaciones de compañeros son de colaboración?	X			
93	Las personas se pueden comunicar facilmente entre si?	X			
94	La retroalimentación que suministran los jefes a los colaboradores es positiva y respetuosa?	X			
95	Existe un programa claro de inducción y entrenamiento?	X			
96	Las capacitaciones son coherentes con las necesidades de la empresa y los colaboradores	X			
97	Existen extrategias para promover la participación activa del personal?	X			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
98	Los materiales se encuentran apilados adecuadamente, no se evdiencia posibles caida de materiales.	X			
99	Los materiales almacenados se encuentran señalizados y demarcados	X			
100	Los materiales almacenados se identifican facilmente	X			
101	Los materiales se encuentran clasificados por material (No hay del mismo material en varios lugares)	X			
102	Los materiales apilados no superan la altura de 2 metros	X			
103	Los materiales se encuentran protegidos de la interperie	X			
104	Los elementos no apto para uso se encuentran identificados y separados de los que se encuentran en buen estado.	X			
105	La estanteria se encuetra anclada a la pared	X			
106	Se evdiencia orden y aseo en el almacen	X			
107	El almacenamiento de sustancias quimicas se encuentra de acuerdo a las hojas de seguridad.	X			

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:

Nombres :	Cargos:	Firmas:
Sebastian Ruiz	Rq SSTMA	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Cargas Ltda.	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Versión: 0

LUGAR: Frente de obra PAV 6 UPA FECHA: 2/10/2021

	TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIÓN
		OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	N/A	
HERRAMIENTAS FIJAS						
1	Esmeril					
2	Taladro					
3	Prensa					
4	Compresor					
5	Maquina de soldar					
6	Equipo de oxicorte					
HERRAMIENTAS MANUALES						
1	Taladro percutor doble manija					
2	Escariador					
3	Taladro sencillo (A)					
4	Lijadora					
5	Pulidora pequeña (A)					
6	Pulidora grande (B)					
7	Segueta pequeña					
8	Segueta grande					
9	Martillos grandes (Monas)					
10	Martillos					
11	Cuchillos					
12	Escalera de extensión					
13	Escalera fija.					
14	Raches					
15	Extensiones eléctricas					
16	Tijeras grandes					
17	Tijeras Pequeñas					
18	Motortool					
19	Extensiones con lámparas					
20	Pelacable (A)					
21	Cortafrío					
22	Pinzas universales					
23	Destornillador de estría					
24	Destornillador perillero pala					
25	Destornillador perillero estría					
26	Cautín					
27	Llaves de tubo					
28	Llave expansiva					
29	Hombre solo					
30	Vibro para Concreto					
31	Sierra circular					
32	Tranzadora					
33	Planta electrica					
34	Pala					
35	Pica					
36	Carretilla					
37	Bomba regadora					
38	Cortadora de concreto					
39	Kit de acabados de concreto					
40	Guara andora	✓				1 und
41	Capilla	✓				1 und
42	Desinfección Herramental	✓				

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres:	Cargos:	Firmas:
Sebastián Duran	Residente	

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS

Versión:

LUGAR: Fonte de Oro — FECHA DE INSPECCIÓN: DE 01/07/21 HASTA 04/07/21 — IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:

TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO Año 2018 — OPERARIO/CONDUCTOR:

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO												X			X			X				
ALARMA DE RETROCESO										X			X			X						
CINTURO DE SEGURIDAD										X		X			X			X				
ILUMINACION CABINA										X			X			X						
PALANCA DE MANDO										X			X			X						
ASIENTOS												X			X			X				
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES												X			X			X				
ESPEJO CENTRAL CONVEXO												X			X			X				
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)												X			X			X				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS										X			X			X						
INDICADORES (aceite, motor, refrigerante, velocimetro, RPM, corriente y luces.												X			X			X				
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO												X			X			X				
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO												X			X			X				
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS												X			X			X				
PUERTAS												X			X			X				
VIDRIO Y VENTANAS												X			X			X				
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)										X			X			X						
ESTADO DE PASADORES(bastidor, desgarrador y cuchilla)										X			X			X						
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS												X			X			X				
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO												X			X			X				
MECANISMO GIRO TORNAMESA												X			X			X				
FRENO DE SERVICIO										X			X			X						
BATERIA Y CABLE										X			X			X						
ESTADO GENERAL DEL BALDE										X			X			X						
CARDAN Y CRUCETAS												X			X			X				
GATO												X			X			X				
TUBO DE ESCAPE												X			X			X				
DIRECCION Y TERMINALES										X			X			X						
MANDOS DE AVANCE										X			X			X						
ORUGAS TENSIONADAS												X			X			X				
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA												X			X			X				
TANQUE DE COMBUSTIBLE												X			X			X				
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA										X			X			X						
FRONTALES DE TRABAJO												X			X			X				
TRASERAS DE TRABAJO												X			X			X				
DE SEÑALIZACION TRASERA												X			X			X				
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO												X			X			X				
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO												X			X			X				
LLANTAS EN BUEN ESTADO										X			X			X						
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm										X			X			X						
DESINFECCIÓN EQUIPO																						

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres: Sebastian Diaz — Cargo: Op — Firma:

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión:

LUGAR: Frente de obra Giro Cero | FECHA DE INSPECCIÓN: DE 05/07/21 HASTA 11/07/21 | IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:

TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO | OPERARIO/CONDUCTOR:

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO						X			X			X			X			X				
ALARMA DE RETROCESO				X			X			X			X			X						
CINTURO DE SEGURIDAD				X					X			X			X			X				
ILUMINACION CABINA						X			X			X										
PALANCA DE MANDO				X			X			X			X			X						
ASIENTOS																						
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES						X			X			X			X			X				
ESPEJO CENTRAL CONVEXO						X			X			X			X			X				
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)						X			X			X			X			X				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS						X			X			X			X			X				
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.				X			X			X			X			X						
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO						X			X			X			X			X				
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO						X			X			X			X			X				
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS						X			X			X			X			X				
PUERTAS						X			X			X			X			X				
VIDRIO Y VENTANAS				X			X			X			X			X						
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)				X			X			X			X			X						
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador y cuchilla)						X			X			X			X			X				
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS						X			X			X			X			X				
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO						X			X			X			X			X				
MECANISMO GIRO TORNAMESA				X			X			X			X			X						
FRENO DE SERVICIO				X			X			X			X			X						
BATERIA Y CABLE				X			X			X			X			X						
ESTADO GENERAL DEL BALDE						X			X			X			X			X				
CARDAN Y CRUCETAS						X			X			X			X			X				
GATO						X			X			X			X			X				
TUBO DE ESCAPE				X			X			X			X			X						
DIRECCION Y TERMINALES				X			X			X			X			X						
MANDOS DE AVANCE						X			X			X			X			X				
ORUGAS TENSIONADAS						X			X			X			X			X				
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA						X			X			X			X			X				
TANQUE DE COMBUSTIBLE				X			X			X			X			X						
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA						X			X			X			X			X				
FRONTALES DE TRABAJO						X			X			X			X			X				
TRASERAS DE TRABAJO						X			X			X			X			X				
DE SEÑALIZACION TRASERA						X			X			X			X			X				
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO						X			X			X			X			X				
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO						X			X			X			X			X				
LLANTAS EN BUEN ESTADO				X			X			X			X			X						
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm				X			X			X			X			X						
DESINFECCIÓN EQUIPO																						

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres: Sebastian Dom | Cargos: Rol SST/SA | Firmas: [signature] 7/7/21

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión:

LUGAR: Frente de obra Bin Zero — FECHA DE INSPECCIÓN: DE 13/10/21 HASTA 19/10/21 — IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:

TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO — OPERARIO/CONDUCTOR:

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO			X			X			X			X			X			X				
ALARMA DE RETROCESO	X			X			X			X			X			X						
CINTURO DE SEGURIDAD	X			X			X			X			X			X						
ILUMINACION CABINA			X			X			X			X		-	X			X				
PALANCA DE MANDO	X			X			X			X			X			X						
ASIENTOS	X			X			X			X			X			X						
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES			X			X			X			X			X			X				
ESPEJO CENTRAL CONVEXO			X			X			X			X			X			X				
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)			X			X			X			X			X			X				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			X			X			X			X			X			X				
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.	X			X			X			X			X			X						
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			X			X			X			X			X			X				
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO			X			X			X			X			X			X				
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS			X			X			X			X			X			X				
PUERTAS			X			X			X			X			X			X				
VIDRIO Y VENTANAS			X			X			X			X			X			X				
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)			X			X			X			X			X			X				
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador y cuchilla)	X			X			X			X			X			X						
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS	X			X			X			X			X			X						
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO			X			X			X			X			X			X				
MECANISMO GIRO TORNAMESA			X			X			X			X			X			X				
FRENO DE SERVICIO			X			X			X			X			X			X				
BATERIA Y CABLE	X			X			X			X			X			X						
ESTADO GENERAL DEL BALDE	X			X			X			X			X			X						
CARDAN Y CRUCETAS			X			X			X			X			X			X				
GATO			X			X			X			X			X			X				
TUBO DE ESCAPE			X			X			X			X			X			X				
DIRECCION Y TERMINALES	X			X			X			X			X			X						
MANDOS DE AVANCE	X			X			X			X			X			X						
ORUGAS TENSIONADAS			X			X			X			X			X			X				
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA			X			X			X			X			X			X				
TANQUE DE COMBUSTIBLE			X			X			X			X			X			X				
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	X			X			X			X			X			X						
FRONTALES DE TRABAJO			X			X			X			X			X			X				
TRASERAS DE TRABAJO			X			X			X			X			X			X				
DE SEÑALIZACION TRASERA			X			X			X			X			X			X				
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO			X			X			X			X			X			X				
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO			X			X			X			X			X			X				
LLANTAS EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X			X						
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm	X			X			X			X			X			X						
DESINFECCIÓN EQUIPO	X																					

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:		
Nombres : Sebastian Diaz	Cargos: Res SST	Firmas:

Escaneado con CamScanner

Maquinas y Gramas Ltda — Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS

Versión:

LUGAR: Frente de obra — FECHA DE INSPECCIÓN: DE 14/07/17 HASTA 25/07/17 — IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:

TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO — OPERARIO/CONDUCTOR:

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO			X						X			X			X			X				
ALARMA DE RETROCESO	X						X			X			X			X						
CINTURO DE SEGURIDAD	X								X			X			X			X				
ILUMINACION CABINA			X																			
PALANCA DE MANDO	X						X			X			X			X						
ASIENTOS	X						X			X			X			X						
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES			X						X			X			X			X				
ESPEJO CENTRAL CONVEXO			X						X			X			X			X				
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)			X						X			X			X			X				
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS																						
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.	X						X			X			X			X						
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO			X						X			X			X			X				
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO			X						X			X			X			X				
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS			X						X			X			X			X				
PUERTAS			X						X			X			X			X				
VIDRIO Y VENTANAS			X						X			X			X			X				
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)			X						X			X			X			X				
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador y cuchilla)	X						X			X			X			X						
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS	X																					
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO			X						X			X			X			X				
MECANISMO GIRO TORNAMESA			X						X			X			X			X				
FRENO DE SERVICIO							X			X			X			X						
BATERIA Y CABLE	X						X			X			X			X						
ESTADO GENERAL DEL BALDE	X						X			X			X			X						
CARDAN Y CRUCETAS																						
GATO			X						X			X			X			X				
TUBO DE ESCAPE			X						X			X			X			X				
DIRECCION Y TERMINALES																						
MANDOS DE AVANCE	X						X			X			X			X						
ORUGAS TENSIONADAS																						
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA			X						X			X			X			X				
TANQUE DE COMBUSTIBLE			X						X			X			X			X				
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	X						X			X			X			X						
FRONTALES DE TRABAJO			X						X			X			X			X				
TRASERAS DE TRABAJO			X						X			X			X			X				
DE SEÑALIZACION TRASERA			X						X			X			X			X				
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO			X						X			X			X			X				
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO			X						X			X			X			X				
LLANTAS EN BUEN ESTADO	X						X			X			X			X						
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm	X						X			X			X			X						
DESINFECCIÓN EQUIPO	X																					

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres: DJ Cargos: RO Firmas:

246

Escaneado con CamScanner

Anexo 8.

Acta Reunión Brigada de Emergancias.

Maquinas y Gramas Ltda Mantenimiento de campos Deportivos en grama natural	**Acta 4**	Versión: 0

Fecha: 19/07/2021	Proyecto o área: BRIGADA DE EMERGENCIAS
Hora de Inicio : 11 00 AM	Hora fin: 12 00 AM

1. Temas a tratar:

1. Verificación cumplimiento Acta No 3
2. Revisión de elementos de emergencia frentes de obra
3. Revisión de puntos de encuentro frentes de obra
4. Revisión programas de formación brigada de emergencias
5. Temas Varios

2. Participantes:

Nombres	Firmas
SEBASTIAN DIAZ	
DIEGO FERNANDO VARGAS LEON	
WILBER DIOMEDES JIMENEZ LASSO	

3. Desarrollo de la Reunión:

1. Se verifica un desarrollo del 100 % de los compromisos establecidos en el acta No 2
2. Se adecuo los elementos de emergencia provicionales de los parques intervenidos por el proyecto de Maquinas y Gramas LTDA
3. Se adecuo la señalización de los puntos de encuentro provicionales de los parques intervenidos por el proyecto de Maquinas y Gramas LTDA
4. Se realiza charla para el manajo de una emergencia por derrame de sustancias quimicas
5. Se establece programación para simulacro de evacuación en el proyecto

4. Compromisos

Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso
Realizar Simulacro control de derrames	SEBASTIAN DIAZ	10/08/2021
verificar elementos de emergencia en los frentes de obra	SEBASTIAN DIAZ	Mensual

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA

CONTRATO IDRD 2940 DE 2020

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 2"

INFORME MENSUAL DE CALIDAD N° 6

Periodo del 1 al 31 de julio de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. ALCANCE 3
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 3
2.1. PROCESO DE MANTENIMIENTO 3
2.2. PARQUES INTERVENIDOS 5
2.3. MATERIALES UTILIZADOS 48
3. ANEXOS 48
3.1. Anexo 1. Certificado de material 48

1. ALCANCE

El presente Informe Técnico Mensual de control de Calidad contiene las particularidades de la ejecución en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021 del contrato de obra IDRD No. 2940 de 2020, cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL Y GRAMA SINTÉTICA Y SUS ZONAS ALEDAÑAS UBICADOS EN LOS DIFERENTES PARQUES QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 2".

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

2.1. Proceso de mantenimiento

En el periodo del presente informe se adelantan actividades de mantenimiento:

- Fumigación de áreas por rocío manual:

Imagen 1. Proceso de fumigación



Fuente. Autor

- Corte de césped con podadora

Imagen 2. Proceso de Poda manual con podadora



Fuente. Autor

- Corte de césped con maquinaria

Imagen 3. Proceso de Poda con maquinaria



Fuente. Autor

- Demarcación y señalización:

Imagen 4. Demarcación y señalización



Fuente. Autor.

2.2. Parques Intervenidos

Se informa que durante el mes de febrero se intervinieron los siguientes parques:

Tabla1. Parques intervenidos

ITEM	CAMPO
1	Parque Nacional
2	Country
3	Marsella natural
16	Pavco
17	Tunal Sofbol
18	Nuevo Muzu
19	Serena
20	Gaitana
21	Fontanar
22	Ciudadela Colsubsidio

ITEM	CAMPO
23	Tabora
24	Estadio Atahualpa
25	Estadio Alqueria
26	El Cajon
27	PRD Estadio
28	San Cristobal Estadio
29	Timiza Estadio
30	Tunal Estadio
31	Ciudad Montes
32	Ciudad Montes Sofbol
33	Ciudad Montes voley playa
34	Bochica
36	Milenta Tejar
37	PRD PLAYA
38	PRD Alterna 3
39	UDS Beisbol
40	UDS Complejo Playa
41	Complejo Acuatico - Playa
42	UDS Sofbol
43	UDS Atletismo

Fuente. Autor

A continuación se especifica la intervención realizada en cada parque mención:

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN CRISTOBAL ESTADIO	16/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PARQUE NACIONAL	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDAD MONTES FUTBOL	9/07/2021 23/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

254

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDAD MONTES SOFTBAL	9/07/2021 23/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO ALQUERIA	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5 BORDEO 5 DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
MILENTA TEJAR	6/07/2021 22/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
BOCHICA	6/07/2021 22/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TUNAL ESTADIO	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZA CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

262

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TUNAL SOFTBAL	12/07/2021 19/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 3, BORDEO 3, DEMARCACIÓN 2	  

263

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
NUEVO MUZU	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

264

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
TIMIZA ESTADIO	2/07/2021 9/07/2021 16/07/2021 23/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
GAITANA	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SERENA	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, , DEMARCACIÓN 1	  

267

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRD ESTADIO	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 1 (19/07/2021), BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRD ALTERNA 3	19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 1, BORDEO 1	

269

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO TABORA	1/07/2021 8/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 3, BORDEO 3, DEMARCACIÓN 1	

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
COUNTRY	02/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 21/07/2021 23/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 30/07/2021	SE REALIZAN CORTE 13	  

271

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ESTADIO ATAHUALPA	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	  

272

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS SOFTBAL	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

273

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS BEISBOL	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS ATLETISMO	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
UDS COMPLEJO PLAYA	6/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN BORDEO 2	  

296

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA MARACANA 1	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

234

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA MARACANA 2	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 1	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	  

279

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 2	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	  

280

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 3	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1 (07/07/2021)	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 4	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1 (07/07/2021)	  

282

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 5	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	  

283

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 6	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

284

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 7	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	  

285

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 8	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

286

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FLORIDA 9	7/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 2	

284

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
FONTANAR	13/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  


CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
CIUDADELA COLSUBSIDIO	6/07/2021 13/07/2021 21/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 4, BORDEO 4, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
EL CAJON	1/07/2021 8/07/2021 15/07/2021 22/07/2021 29/07/2021	SE REALIZAN CORTE 5, BORDEO 5, DEMARCACIÓN 1	  

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
SAN JOSE DE MARYLAND	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

291

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PAVCO	12/07/2021 26/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2, DEMARCACIÓN 1	  

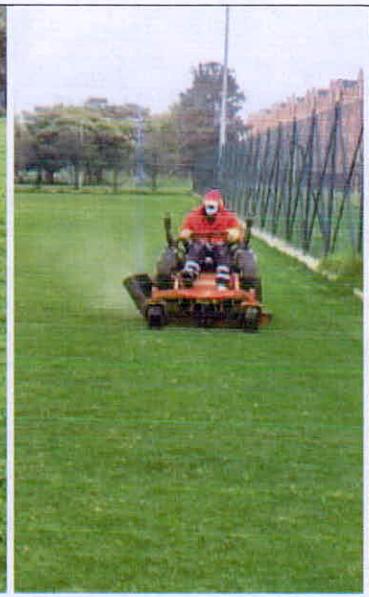CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANGELES	13/07/2021 27/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	  

293

CANCHA	FECHA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
MARSELLA F11	7/07/2021 19/07/2021	SE REALIZAN CORTE 2, BORDEO 2	

294

2.3. Materiales utilizados

Durante el periodo de reporte se utilizó el siguiente material en los procesos de mantenimiento del proyecto:

Tabla 2. Materiales utilizados

No.	MATERIAL	NOMBRE	PROVEDOR	UTILIDAD
1	Herbicida	Roundup Full II	ARYSTA Lifescience	Actividades de fumigación
2	Pinrura	VINILO Tipo II Corriente	Tito Pabon	Actividades demarcación y señalización

Fuente. Autor

En el anexo 1 se presenta el certificado de Calidad del material.

3. ANEXOS

3.1. Anexo 1. Certificado de material

Anexo 1.

Certificado de material.

www.arysta.cl

Arysta LifeScience

HERBICIDA



Roundup FULL II



Directo a la raíz de su problema

- *Máxima potencia.*
- *Alta eficiencia.*
- *Mayor flexibilidad.*
- *Envase ergonómico con tecnología "No Glug" que evita salpicaduras y derrames.*
- *Mayor seguridad para aplicador.*
- *Menor desperdicio del producto.*



HERBICIDA

www.arysta.cl | Arysta LifeScience

Roundup FULL II

ROUNDUP® FULL II, la nueva generación de herbicidas sistémicos no selectivos, que elimina malezas hasta en las condiciones climáticas más extremas. Su formulación y tecnología Transorb II®, lo hacen líder en su tipo.

PARA QUE ROUNDUP® FULL II MANIFIESTE TODO SU POTENCIAL, ES NECESARIO CONSIDERAR:	
Volumen de agua	60 - 80 L/ha (limpia)
Cobertura	20 - 30 impactos por cm2
Presión de trabajo	40 psi
Boquilla	Abanico plano
Evitar la deriva	la velocidad del viento debe ser inferior a 15 Km/ha. Gotas uniformes de entre 200 y 400 micrones
Dosis sugerida	2 - 4 L/ha

ROUNDUP® FULL II ALTA TECNOLOGÍA EN EL CONTROL DE MALEZAS



Gracias a la tecnología **Transorb II®**, penetra mucho más rápido que otro glifosato genéri· Con **Transorb II®**, absorve hasta 3 veces más rápido.

TRANSORB II TECHNOLOGY



Aplicación con Roundup® Full II

Aplicación con un glifosato genérico

MÁS EFICIENCIA

Funciona en condiciones climáticas de mayor adversidad y en condiciones límites: sequía, poca luminosidad, rocío, aguas duras y riego de lavado por lluvias.



MÁS POTENCIA

Mayor velocidad de penetración de la dosis letal en malezas complicadas: malezas grandes, rustificadas, con pilosidad foliar y con superficie foliar cerosa.



15 Minutos después de la aplicación.

30 Minutos después de la aplicación.

60 Minutos después de la aplicación.

MÁS FLEXIBILIDAD

- Más horas de trabajo efectivo debido a la disminución del impacto en el lavado por lluvias.
- Menor período libre de precipitaciones.
- Menos agua por hectárea.
- Menos tiempo muerto por recarga de agua.

Afipa® Empresa Asociada

TRIPLE LAVADO

Lo expresado en este folleto no constituye una recomendación. **Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.**

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.


Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® marcas registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.arysta.cl

Marzo 2017 V-004

278

PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.
D-DES-014 (V_03)
FICHA TÉCNICA
VINILO TIPO 2 CORRIENTE



Identificación Rombo NFPA 704:

Color Azul: Peligro para la salud, **Calificación :** 1
Color Rojo: Peligro de Inflamabildad, **Calificación:** 0
Color Amarillo: Peligro de Inestabilidad, **Calificación:** 0
Peligros especiales: N/A

---

1. DESCRIPCIÓN

El Vinilo Tipo 2 Corriente es un producto fabricado a base de dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero vinil acrílico con acabado mate, especialmente diseñado para aplicaciones sobre Drywall. Se caracteriza por su rápido secado, excelente cubrimiento, rendimiento y uniformidad en la aplicación. Este producto es para uso solo interior. Se encuentra únicamente en color blanco.

Pintura al agua, tipo emulsión, Tipo 2.
Cumple con la NTC-1335
Contenido de VOC ≤ 90 g /L. *Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA24*
Viscosidad (≤124 KU)

---

2. PROPIEDADES

- ✓ Diluible Con Agua.
- ✓ Proporciona acabado súper mate.
- ✓ Alto poder de cubrimiento.
- ✓ Buen secado y adherencia.
- ✓ Producto económico.
- ✓ Acabado Terso.
- ✓ Contenido de VOC ≤ 90 g /L
- ✓ Buen contenido de sólidos.
- ✓ Bajo Salpique.

PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.
D-DES-014 (V_03)
FICHA TÉCNICA
VINILO TIPO 2 CORRIENTE

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas tito Pabón, El vinilo tipo 2 corriente cumple con los siguientes parámetros de calidad

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60°	< 10	NTC 592
Viscosidad	*≤124* KU	NTC 559
Opacidad	Mínimo 97%	NTC 4974
Contenido de Sólido en volumen	≥ 35%	NTC 1786
pH	8.5 – 9.5	N/A
Entizamiento	No Debe Presentar	NTC 1457-6
Lavabilidad	Mínimo 50%	NTC 799
Abrasión	Mínimo 50 Ciclos	NTC 966
Finura de dispersión	3 +	NTC 557
Densidad	5.2 - 5.6 kg/galón	N/A
Resistencia al agua	≥ 4 Horas	NTC 1114
Resistencia al álcalis	≥ 4 Horas	NTC 1114
Estabilidad al almacenamiento	24 meses posterior a la fecha de fabricación	NTC 845-2
Solvente	Agua	N/A

4. USOS

Vinilo Tipo 2 Corriente especialmente diseñado para techos en drywall, marmolina y estuco. Uso en ambientes interiores.

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
