	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/9/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	5/8/2021	**AL:**	5/9/2021
CONTRATO Nº	CONTRATO DE CONSULTORIA No.121-00-ACOFAC-DIFRA-2021	**CONTRATISTA**	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA NIT. 9 0 0 1 7 1 0 0 0 8 R/L. EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS C.C. No. 80.740.197		
OBJETO	EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA EMAVI				
FECHA DE INICIO	22/7/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/10/2021		
VALOR INICIAL	$ 175,053,760.00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 175,053,760.00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Contrato culminado a plazo contractual.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						TOTAL	0				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	3.00%	**25.00%**	**47.00%**	**-22.00%**
Semana 2	3.00%			
Semana 3	3.00%			
Semana 4	3.00%			
Semana 5	3.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA












AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**47.00%**
EJECUTADO		**25.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
Recopilación de la información existente de la edificación	PROGRAMADO		**20.00%**
	EJECUTADO		**20.00%**
Levantamiento Arquitectonico	PROGRAMADO		**10.00%**
	EJECUTADO		**10.00%**
Levantamiento Estructural	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
Estudio patologico	PROGRAMADO		**50.00%**
	EJECUTADO		**20.00%**
Estudio Geotécnico	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
Estudio de Vulnerabilidad Sismica	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
Analisis de alternativas de reforzamiento Estructural	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
Diseño de reforzamiento	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**
Diseños y propuesta arquitectónica para obtener autorización por arte de la secretaria de cultura de santiago de cali para adelantar el proyecto de reforzamiento estructural	PROGRAMADO		**0.00%**
	EJECUTADO		**0.00%**

Presupuesto de obra para Reforzamiento Estructural	PROGRAMADO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	85	45	40
Proyección	104	45	59

6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

SE ANEXA AL FINAL DEL INFORME

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
45	-19	3/11/2021

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A la fecha el contratista adelanta labores de recoleccion de informacion en coordinacion con la supervision.

Se da inicio al levantamiento topografico y arquitectonico desplazando a la edificacion personal profesional idoneo en el area para la ejecucion de las actividades.

Se da inicio a la toma de muestras para ensayos de suelos

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: Se prevee solicitud del contratista de ampliacion en el plazo de ejecucion toda vez que se presentan novedades de procedimiento en la consecucion de permisos ante la secretaria de cultura de Cali asi mismo del departamento de Cultura.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 175,053,760.00	$ 175,053,760.00	$ 43,763,440.00	25.00%	$ 131,290,320.00	75.00%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 175,053,760.00	$ 175,053,760.00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 175,053,760.00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 175,053,760.00	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE DE 2020	$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE AJUSTA CRONOGRAMA Y ACTA DE INICIO A FECHA PLAZO EJECUCION 15 DE OCTUBRE DE 2021 ALINEADO CON DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se prevee en la ultima semana del mes de septiembre la motivacion del modificatorio por ampliacion del plazo de ejecucion.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Predomina tiempo seco con fuertes lluvias aisladas.

CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON
SUPERVISOR


REVISO:

Director de Interventoria
Firma y Posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO



DETALLE REFUERZOS

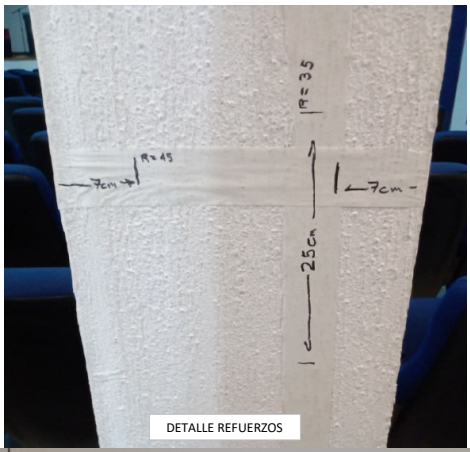

DETALLE REFUERZOS












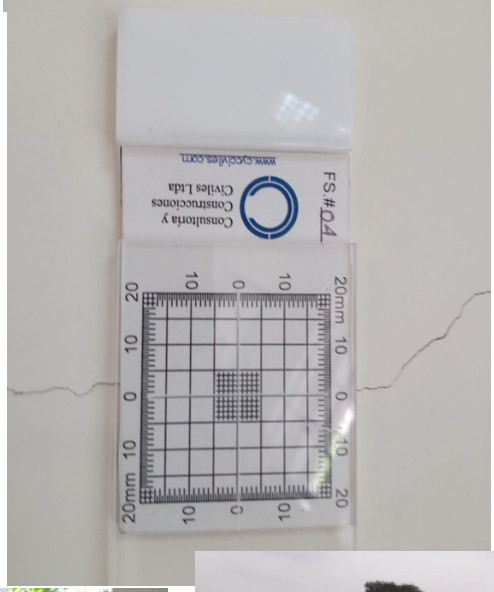


FS #04
Consultoría y Construcciones Civiles Ltda
www.ccciviles.com
20mm
20mm


BOSCH









CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 4:48 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: Re: PY860-VUL REF EMAVI / CRONOGRAMA
Datos adjuntos: PROGRAMACION V1.pdf

-- Buenos días Capitan Henao,

Se envia cronograma con firma del representante legal.

El 2/08/2021 a las 4:34 p. m., CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA escribió:

> **REF: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO ACADEMICO DE LA EMAVI**
>
> -- Buenos días Capitan Henao,
>
> Por medio del presente, se envía cronograma de actividades para la ejecución del contrato partiendo de la fecha de Acta de inicio (22julio 2021) y dando finalidad a las labores el dia 22 diciembre 2021.
>
> --
>
> Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

--

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADOR
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: martes, 3 de agosto de 2021 10:25 a. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI /INFORME PLAN DE CALIDAD
Datos adjuntos: PY860- OF_02- PLAN DE CALIDAD.pdf; PLAN DE CALIDAD EMAVI.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenos días Capitan Henao,

Por medio del presente, se anexa documento Plan de calidad para la exploración, ensayos de laboratorio y análisis.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: viernes, 6 de agosto de 2021 3:03 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL SUELOS
Datos adjuntos: Formato Consentimiento previo.pdf; Formato Estudio seguridad personal.pdf; Soportes HV Ing Jhon Lozano.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la E MAVI".*

Buenas tardes Capitan Henao,

Adjunto enviamos documentos para ingreso personal de suelos el dia martes 10 de agosto a las instalaciones para inspección del area.

Agradecemos su colaboración con la aprobacion del ingreso.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 7:46 a. m.
Para: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Asunto: RE: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL SUELOS - NOTIFICACION NO INGRESO DE PERSONAL

SEÑORES
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
COORDINADORA

En relacion al correo de la referencia me permito confirmar que no se autoriza el ingreso del mismo teniendo en cuenta las directrices emanadas a nivel central de la FAC. Se recuerda que ningún personal extranjero esta autorizado a ingresar a desarrollar actividades en las instalaciones de la FAC; de ser necesario se deberá emitir requerimiento al Comandante de la FAC mediante solicitud elevada en este caso por el ordenador del Gasto.

Comedidamente;

Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON
Elemento Mantenimiento – Escuadrón Instalaciones Aéreas - ESINS
Grupo de Apoyo Logistico - GRUAL
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” - EMAVI
Cll 61 #7v Bis-59 – Tel.(2) 4881000

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: viernes, 6 de agosto de 2021 3:03 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO <JHON.HENAO@FAC.MIL.CO>
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL SUELOS

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: “el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la E MAVI”.*

Buenas tardes Capitan Henao,

Adjunto enviamos documentos para ingreso personal de suelos el dia martes 10 de agosto a las instalaciones para inspección del area.

Agradecemos su colaboración con la aprobacion del ingreso.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y
Construcciones
Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 9:38 a. m.
Para: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Asunto: Confirmación no disponibilidad información preliminar CONTRATO DE CONSULTORIA No.121-00-ACOFAC-DIFRA-2021
Datos adjuntos: PY860-OF-01-SOLICITUD DE INFORMACION..pdf; solicitud informacion difra.pdf; correo solicitud apoyo concepto poder.pdf

SEÑORES
COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

REFERENCIA:
1 . Oficio PY860-OF-01 trata de Solicitud de información existente y gestión de Poder Archivo departamento administrativo de planeación municipal o ente encargado

A la fecha se ha remitido solicitud via Hermes (institucional) a nivel central DIFRA, sin encontrar respuesta sobre la existencia de información sobre el edificio en estudio; igualmente esta supervisión ha revisado la planoteca existente en la EMAVI sin encontrar planos impresos ni documentación solicitada. Es de anotar que se ha verificado en archivo magnético de anteriores vigencias sin encontrar igualmente alguna referencia del mismo.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la consideración inicial del anexo especificaciones técnicas que menciona:

> ***1. INFORMACIÓN PRELIMINAR (Verificación del alcance, recopilación de información existente y estado del sistema estructural)***
>
> *1.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EXISTENTE*
> *Este ítem hace referencia a la búsqueda de información preliminar disponible, relacionada con datos de diseño geotécnico y estructural, construcción y modificaciones de la estructura original, etc. En caso de no encontrar información disponible, el contratista deberá generar la información necesaria para el análisis de la Vulnerabilidad Sísmica. (El costo de este trabajo debe ser tenido en cuenta dentro del valor total de la propuesta del oferente)*

Se solicita dar inicio a la generación de la informacion necesaria para realizar el análisis por parte de ustedes.

En relacion con el poder, a la fecha se esta a la espera de respuesta del concepto por parte de la asesora jurídica una vez se tenga la referencia será transmitida a ustedes para dar continuación al tramite.

Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON
Elemento Mantenimiento – Escuadrón Instalaciones Aéreas - ESINS
Grupo de Apoyo Logistico - GRUAL
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” - EMAVI
Cll 61 #7v Bis-59 – Tel.(2) 4881000

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 1:24 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL 10AGOSTO
Datos adjuntos: Cedula Daniel Alejandro Bastidas.pdf; Formato Consentimiento Daniel.pdf; Formato Estudio Seguridad Daniel.pdf; HV_COORDINADOR_DE_LICITACIONES.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenas tardes Capitan Henao,

Adjunto enviamos documentos para ingreso personal de suelos el dia martes 10 de agosto a las instalaciones para inspección del area.

Agradecemos su colaboración con la aprobacion del ingreso.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Enviado el: miércoles, 11 de agosto de 2021 9:15 a. m.
Para: 'CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA'
Asunto: oficio autorizacion tramites cto 121-00-acofac-difra-2021

SEÑORES
COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

REFERENCIA:
1 . Oficio PY860-OF-01 trata de Solicitud de información existente y gestión de Poder Archivo departamento administrativo de planeación municipal o ente encargado

Me permito confirmar que a la fecha se encuentra en revisión y aprobación del departamento jurídico de la Unidad previa firma del ordenaor del gasto como se muestra a continuación:

FAC-S-2021-151957-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-151957-CI del 10 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANEACION ALCALDIA DE CALI
Ciudad

Asunto: Autorización consulta de documentos específicos- Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

En atención a la suscripción del Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI"; con plazo de ejecución 30-diciembre-2021, el suscrito Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.489.271 de Medellín, en calidad de segundo comandante y ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación, solicito comedidamente a su dependencia se brinde la información que repose en esa entidad frente al inmueble denominado Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez".

Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la eficiente ejecución del contrato, para cual se autoriza al personal descrito a solicitar lo requerido:

SUPERVISOR:
Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON identificado con CM.1.110.464.112 SUPERVISOR PRINCIPAL Correo JHON.HENAO@FAC.MIL.CO cel.:3102363958

CONTRATISTA:
EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ identificado con C.C. 80.740.197 y representante legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
COORDINADOR CONTRATISTA: MONICA LILIANA PINEDA MONJE identificada con C.C. No. 40.217.542 Correo ESTUDIOS@CYCCIVILES.COM tel.:(+57) (1) 926 17 76 - (+57) (8) 667 47 94

Cordialmente,

Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI

Anexo: N/A

Copia: CT HENAO / ESINS

Elaboró CT. HENAO / ESINS Aprobó

FAC-S-2021-021511-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-021511-CE del 10 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM

Señores
SECRETARIA DE CULTURA ALCALDIA DE CALI

Contraseña:b9TRZpUAUc

Asunto: Autorización consulta de documentos específicos- Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

En atención a la suscripción del Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI"; con plazo de ejecución 30-diciembre-2021, el suscrito Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.489.271 de Medellín, en calidad de segundo comandante y ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación, solicito comedidamente a su dependencia se brinde la información que repose en esa entidad frente al inmueble denominado Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez".

Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la eficiente ejecución del contrato, para cual se autoriza al personal descrito a solicitar lo requerido:

SUPERVISOR:
Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON identificado con CM.1.110.464.112 SUPERVISOR PRINCIPAL Correo JHON.HENAO@FAC.MIL.CO cel.:3102363958

CONTRATISTA:
EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ identificado con C.C. 80.740.197 y representante legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
COORDINADOR CONTRATISTA: MONICA LILIANA PINEDA MONJE identificada con C.C. No. 40.217.542 Correo ESTUDIOS@CYCCIVILES.COM tel.:(+57) (1) 926 17 76 - (+57) (8) 667 47 94

Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI

Anexo: N/A
Copia: CT HENAO / ESINS

Elaboró: CT. HENAO / ESINS Aprobó:

Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON
Elemento Mantenimiento – Escuadrón Instalaciones Aéreas - ESINS
Grupo de Apoyo Logistico - GRUAL
Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" - EMAVI
Cll 61 #7v Bis-59 – Tel.(2) 4881000

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: miércoles, 18 de agosto de 2021 1:53 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS PERSONAL
Datos adjuntos: DOCUMENTOS PERSONAL DE EXPLORACION GEOTECNICA.rar

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenos días,

Adjunto enviamos los documentos para ingreso del personal.
La fecha para la ejecución de los trabajos de campo es el día sabado 21-08-2021 y posiblemente el día domingo 22-08-2021.

Datos del personal:

LISTADO DE PERSONAL		
NOMBRE Y APELLIDO	**No. CÉDULA**	**CARGO**
ROLANDO NAZARIT	76.337.014	SUPERVISOR
ISRAEL URQUIJO CARABALI,	94.490.845,	AYUDANTE
YEFRY ANDRES OLAYA ANDRADE	1062283149	AYUDANTE
ALBEIRO RESTREPO	16668649	CONDUCTOR

Datos del vehículo: camioneta Pick up - Chevrolet Luv, PLACA: SMW458 - color blanca

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y
Construcciones
Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: jueves, 19 de agosto de 2021 9:22 a. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / PROGRAMACION
Datos adjuntos: CYC 860 CRONOG-.mpp

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenos días,
Se envía programacion del proyecto en Project de acuerdo a su solicitud.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Enviado el: jueves, 19 de agosto de 2021 12:02 p. m.
Para: ingenieria@cycciviles.com
CC: fortiz@cycciviles.com; CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA; CT. ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO
Asunto: Autorización para tramites ante secretaria de cultura y departamento de planeación CALI - CTO.121-00-ACOFAC-DIFRA-2021
Datos adjuntos: AUTORIZACION TRAMITES SEC CULTURA Y PLANEACION.docx

Señora
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
Coordinadora CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

Referencia:

1. Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".
2. Correo electrónico de asunto "PY860-VUL REF EMAVI / FORMATO SOLICITUD INFORMACION EXISTENTE/PODER" fecha 28-07-2021 remitido del contratista a supervisor

En relacion a la solicitud elevada a esta supervisión de acuerdo a la referencia 2, me permito enviar los oficios con las respectivas autorizaciones tramitados en la EMAVI; previo visto bueno del asesor legal de la Unidad así:

a. Oficio No FAC-S-2021-021511-CE del 19 de agosto de 2021 a la secretaria de cultura alcaldía de cali con asunto Autorización consulta de documentos específicos- Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"
b. Oficio No FAC-S-2021-022020-CE del 19 de agosto de 2021 al departamento administrativo de planeación de cali con asunto Autorización consulta de documentos específicos- Edificio académico de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Comedidamente;

Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON
Elemento Mantenimiento – Escuadrón Instalaciones Aéreas - ESINS
Grupo de Apoyo Logistico - GRUAL
Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" - EMAVI
Cll 61 #7v Bis-59 – Tel.(2) 4881000

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: viernes, 20 de agosto de 2021 11:44 a. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / PLAN DE CALIDAD
Datos adjuntos: PLAN DE CALIDAD EMAVI v2.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenos días Capitan Henao,

Por medio del presente, se anexa documento Plan de calidad actualizado para la exploración, ensayos de laboratorio y análisis.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: miércoles, 25 de agosto de 2021 3:30 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL
Datos adjuntos: OA_JEINA_FR_131_FORMATO_No_1_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_PERSONAL_1_JULIAN.pdf; OA_JEINA_FR_131_FORMATO_No_1_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_PERSONAL_1_MILTON.pdf; OA_JEINA_FR_131_FORMATO_No_1_ESTUDIO_DE_SEGURIDAD_PERSONAL_CESAR.pdf; OA-JEI_CONSENTIMIENTO INFORMADO CESAR CARVAJAL.pdf; OA-JEI_CONSENTIMIENTO INFORMADO JULIAN PRADA.pdf; OA-JEI_CONSENTIMIENTO INFORMADO MILTON MENDEZ.pdf; 1. CC. César Alberto Carvajal Acosta.pdf; CarlosJulianPrada_.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenas tardes capitan Henao,

Adjunto envio documentos para ingreso de personal topografia para laborar desde el dia jueves 26 hasta el dia sabado 28 de agosto.

--

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta

CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO

De: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA <coordinadorestudios@cycciviles.com>
Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 4:16 p. m.
Para: CT. JHON EDISON HENAO GUERRERO
Asunto: PY860-VUL REF EMAVI / DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL LEV ARQ-EST
Datos adjuntos: CC FROILAN.jpeg; FORMATOS EMAVI - DIANA CHALA.pdf; FORMATOS EMAVI-CAROLINA.pdf; FORMATOS EMAVI-FROILAN.pdf; CC. CHALA BELTRAN DIANA PAULIN.pdf

Referencia: *Contrato No. 121-00-ACOFAC-DIFRA-2021 con objeto: "el estudio de vulnerabilidad sísmica, reforzamiento estructura y patrimonio arquitectónico del edificio académico de la EMAVI".*

Buenas tardes,
Adjunto se envia documentos para ingreso personal para labores de levantamiento arquitectonico y estructural desde el día lunes 06 de septiembre.

Atentos a cualquier comentario.

Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.

COORDINADORA
ARQ. MARIA JOSE SUAREZ
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA
Telefax: (57)(8) 667 4794
Celular: (57) 322 365 3181
e-mail: ingenieria@cycciviles.com
Web: www.cycciviles.com
Calle 16 # 37i-15 (Barrio Guatiquia)
Villavicencio - Meta
