030153

3. INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	30 de agosto de 2018	PERIODO No	12	DEL	23/05/2018	AL	28/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEVEMTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 056
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN		**FECHA DE SUSPENSIÓ	
**FECHA DE REINICIACIÓN		**FECHA DE REINICIACIÓ	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓ	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	132 DUVALE AL 61,97%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132 DUVALE AL 72,53%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL:	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIÓN (ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	6,45%	V2
8	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	6,45%	V2
9	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	12,84%	V2
10	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	12,84%	V2
11	3	16	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	23,15%	V1
12	3	19	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	33,13%	V1
14	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	86,96%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador
Aprobados		

V0
V1
V2
V3

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
Acum		54

Programados Semana	%
Avance Semanal	2,90%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	30,43%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	30 de agosto de 2018	PERIODO No.	19	DEL	23/08/2018	AL	29/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

•De los diseños establecidos contractualmente, el Contratista ha presentado 8 diseños más durante esta semana, arrojando un porcentaje de entrega de diseños de 88,96%, correspondiente a la entrega de 60 diseños en Versión (0),el 75,36% de los diseños se encuentran en versión 1 con las correcciones pertinentes, sugeridas por la Interventoría y la Entidad. El 18,84% de los diseños ya han sido presentados en Versión (2) y se espera que no sea necesarias más modificaciones para su aprobación.


•En el componente de obra, el Contratista realizó trabajos en los ID de emergencia 2_15 y 2_16, ubicados en la localidad de Chapinero, el cual consistió en la ejecución de 3unidades de barreras de contención metálica para cada uno de los ID.En el ID 16_2, ubicado en la localidad de Puente Aranda, sobre la Calle 3 desde las Carrera 50 hasta la Carrera 53D. Igualmente se ejecutó la instalación de barreras de contención vehicular sobre el separador central de la Vía. De un total de 90 unidades, esta semana se realizó la instalación de 40, correspondientes a 152,4 m lineales de defensas metálicas y la instalación de 3 polos de paz temporales. El faltante de este ID se ejecutará la próxima semana y las terminales serán reemplazadas cuando el inventario del Contratista lo permita.


• Se realiza comité de seguimiento de obra # 19.

• El contratista envía informe semanal.


•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana






ID 2_15 (Av. Circunvalar con Transversal Primera Este)





ID 2_16 (Av. Circunvalar con Calle 83)





ID 16_2 (Calle 3 entre Carreras 50 y 53D)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: ING ERICK JOSE CASTILLO DUMOUR

*Visto bueno (opcional)

SUPERVISOR: Ing [illegible]

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	06 de septiembre de 2018	PERIODO No.	20	DEL	30/08/2018	AL	5/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No :	2018363	CONTRATO No :	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 055
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de abril de 2018
* FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	* FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	139 DIA/VALE AL 65,26%	PLAZO TRANSCURRIDO:	139 DIA/VALE AL 76,37%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.803,00	VALOR INICIAL :	$ 4.568.441.199,00
VALOR ADICIONALES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.803,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.568.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.803,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.568.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Básico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	86,96%	V0
20	2	62	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en augmética)

	Semana	Acumulado	
			V0
			V1
			V2
			V3
Acorde a			Acordada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
Acum	-	15

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	32,61%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	06 de septiembre de 2018	PERIODO No.	20	DEL	30/08/2018	AL	5/09/2018

6. Actividades Administrativas

En la séptima semana de ejecución del contrato 2017-1803 realizaron las siguientes actividades:

• De 89 diseños establecidos , esta semana se entregaron 14 más, para un total de 62 diseños entregados en versión (0), de los cuales 38 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas y 13 en versión (2).

•Del total de diseños establecidos, el contratista presentó 2 más esta semana, para un acumulado a la fecha de 62 diseños en versión (0), correspondientes al 69.66% del total establecido, de estos el 78,38% han sido presentados en versión(1), equivalentes a 52 diseños y las entregas en versión(2), se cuentanen en 13 diseños, correspondientes al 18.84% del total. Además de presentar las observaciones puntuales que se le realizan a algunos diseños.

• En el componente de obra se trabajó los ID 18_2, 1_2 y 1_4.
El ID 18_2 inició sus obras la semana pasada y para esta corte presentaba un pendiente de 50 unidades de defensa metálica y una terminal temporal estaba por las cuales fueron ejecutadas en esta periodo y el ID fue culminado, presentando un total de 90 unidades de defensa metálica, correspondiente a 342,0m lineales, 91 unidades de poste, 91 unidades de separador, 90 unidades de captafaros y 4 terminales temporales acta de paz cientras se da la instalación definitiva de las terminales X-lite.
Los ID 1_2 y 1_4 debido a su ubicación se han trabajado en simultaneo y para esta semana se han realizado trabajos de excavación en 74 pozos e inicio el proceso de colocación de armadura de micropilotes y la posterior fundida de 25 unidades del mismo. La próxima semana continuará las labores en este punto de la ciudad.
El avance en obra se actualiza a un valor de 32,61%, equivalente a 15 IDs ejecutados.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 20.


• El contratista envía informe semanal.


•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realiza la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



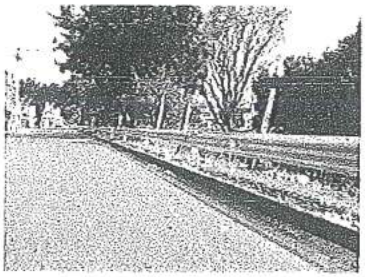



ID 18_2 (Calle 3 entre Carreras 50 y 53D)





ID 1_2 y 1_4 (Autopista Norte con Calle 187)

FIRMA INTERVENTOR DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O COORDINADOR INTERVENTOR)
NOMBRE: ALFREDO JOSE CASTILLO CURELA

FIRMA SUPERVISOR
SUPERVISOR: by EDGAR ALBERTO CALLEJAS GONZALEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá refrendar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	13 de septiembre de 2018	PERIODO No.	21	DEL	6/09/2018	AL	12/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No :	2018A43	CONTRATO No :	20171633
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 666
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE EJECUCIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE EJECUCIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	143 DUVALE AL | 63.54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146 DUVALE AL | 80.22%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.189,00
VALOR ADICIÓN ES):	$ -	VALOR ADICIÓN ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.189,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.189,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Realizar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Edco)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	23,18%	V1
12	3	19	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	86,96%	V1
20	2	62	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	89,86%	V0
21	0	62	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Obra y gestión predial en ingeniería)

Semana	Acumulado

V0
V1
V2
V3
Aprobado

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	6	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	2	0
Acum		15

Programados Semanal	%
Avance Semanal	0,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	32,61%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	13 de septiembre de 2018	PERIODO No.	21	DEL	6/09/2018	AL	12/09/2018

6. Actividades Administrativas

En la vigésimo primer semana de ejecución del contrato 2017-1633 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños establecidos, esta semana no se presenta avances en la entrega de diseños correspondientes al componente de consultoría y los porcentajes de mantienen de la siguiente manera:
92 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 69,66%.
80 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 63,95%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

•En el componente de obra se trabajó en los ID 1_2 y 1_4, presentando avances significativos en obra.
El proceso de excavación presenta un avance de 100%.
El proceso de fundida de pilotes se presenta en 100%.
El proceso de instalación de mallas se presenta en 87,5%.
El avance permanece igual con un reporte de 15 IO's ejecutados, correspondientes a un valor de 32,61%.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 21.

• El contratista envía informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realiza la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana





ID 1_2 y 1_4 (Autopista Norte con Calle 187)



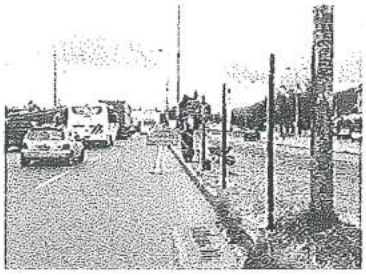

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: ING. ERICK JOSE CASTILLO TICONA

*VISTO BUENO (FIRMA) 1
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aprobado este informe, el supervisor deberá estampar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	13 de septiembre de 2019	PERIODO No.	22	DEL	9/09/2019	AL	13/09/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTEO VEHICULAR, ELEMENTOS DE CAMBIO DE SENTIDO VIAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	20190063	CONTRATO No.	IDU-1511-2019
INTERVENTORÍA	INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍAS S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZACIÓN 2019
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	13 de abril de 2019	FECHA DE INICIACIÓN	13 de abril de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	-	FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-	FECHA DE REINICIACIÓN	-
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de octubre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN	13 de abril de 2020
PLAZO ACTUALIZADO	213	PLAZO ACTUAL CASO	183
PLAZO TRANSCURRIDO	153 DÍAS A LA FECHA	71.83%	PLAZO TRANSCURRIDO	153 DÍAS A LA FECHA	84.02%
VALOR INICIAL	$ 433.276.670,00	VALOR INICIAL	$ 4.592.611.110,00
VALOR ADICIONES	$ -	VALOR ADICIONES	$ -
VALOR ACTUALIZADO	$ 433.276.670,00	VALOR ACTUALIZADO	$ 4.592.611.110,00
VALOR PAGADO	$ -	VALOR PAGADO	$ -
VALOR POR PAGAR	$ 433.276.670,00	VALOR POR PAGAR	$ 4.592.611.110,00
INTERVENTOR	INGENIERÍA CIVIL Y ASESORÍAS S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO SEÑALES 2019

** Incluye las Actas de Suspensión y Reinicio de suspensiones y prórrogas

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	34,31%
4	10	57	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	41,61%
5	0	57	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	41,61%
6	5	62	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	45,26%
7	7	69	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	50,36%
8	52	121	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	88,32%
9	14	135	Indicador= # Visitas Acumuladas / # Visitas Total a Realizar	98,54%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Fase)

	Semana	Acumulado			
1	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,43%	V2
2	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,43%	V2
3	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,56%	V2
4	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,56%	V2
5	2	15	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	21,43%	V1
6	5	20	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	28,56%	V1
7	7	27	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	38,53%	V1
8	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	50,00%	V1
9	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	54,27%	V1
10	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	54,27%	V1
11	14	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	74,26%	V1
12	0	52	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	74,26%	V1
13	6	58	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	82,85%	V1
20	2	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	85,68%	V2
21	0	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	85,68%	V2
22	0	60	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	85,68%	V2

4. Diseños Entregados (Diseño y permisos/gestión en trámites)

	Semana	Acumulado	
			V2
			V1
			V2
			V3
			No Aplica

5. Ejecución de Obra

	Intervenidos en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
Acum	34	18

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,43%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	#####

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	12 de septiembre de 2013	PERIODO No.	22	DEL	15/08/2013	AL	11/09/2013

6. Actividades Administrativas

En la séptima semana de ejecución del contrato 2011-1338 realizamos las siguientes actividades

- Comité de Obra No. 4: Comité que se reporta en esta semana y los pormenores se encuentran en el acta.
- 93 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 33,6%
- 60 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 65,5%
- 19 diseños presentados en versión (3) equivalentes al 11,6%

- En el componente de obra se trabajó en la finalización de los ID 1_2 y 1_4, presentando un porcentaje de avance de 100% para estos dos componentes. Adicional se inició con el ID 10_2 donde se instalaron 38 unidades de bolardo metálico, 33 postes, 33 luminarias, 33 cajetines y 4 unidades de barrera rígida de piso importado. Esto de acuerdo a lo programado al 15 y 17 de septiembre y cabe aclarar que el acta como tal se realizó para el día 18 debido a la entrega de los terminados de los postes por parte del Contratista.

- Se realizó comité de seguimiento de obra # 22


- Se entregó acta semanal

- Revisión y Aprobación de Cronogramas para todas las actividades

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizó la revisión y aprobación de todas las actividades

7. Registro fotográfico del avance de la obra

SISTEMAS DE CANALIZACION PEATONAL





Autopista Norte con Cl 187

Localidad Usaquén

ID 1_2 y 1_4 (Autopista Norte con Calle 187)

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN PEATONAL





Localidad Ciudad Bolívar

ID 10_2 (Calle 75B sur entre Trv 71 y Trv 73B)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq ERICK JOSE CASTILLA [illegible]

SUPERVISOR: [illegible]

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá adelantar la aceptación con su firma

0000162

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27 de septiembre de 2018	PERIODO No.	23	DEL	20/09/2018	AL	26/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACION PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRANSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2018363			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEH CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO:	213			PLAZO ACTUALIZADO:	182		
PLAZO TRANSCURRIDO:	160	EQUIVALE AL	75,12%	PLAZO TRANSCURRIDO:	160	EQUIVALE AL	87,91%
VALOR INICIAL :	$		433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$		4.558.441.199,00
VALOR ADICIONES:	$		-	VALOR ADICIONES:	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$		4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez			INTERVENTOR:	JASEH CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

Semana		Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador =	34,81%
4	10	57	Indicador =	42,22%
5	0	57	Indicador =	42,22%
6	5	62	Indicador =	45,93%
7	7	69	Indicador =	51,11%
8	52	121	Indicador =	89,63%
9	14	135	Indicador =	100,01%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Taller)

Semana		Acumulado			
7	1	1	Indicador =	1,45%	V2
8	1	1	Indicador =	1,45%	V2
9	12	13	Indicador =	18,81%	V2
10	0	13	Indicador =	18,81%	V2
11	3	16	Indicador =	23,19%	V1
12	3	19	Indicador =	27,54%	V1
13	8	27	Indicador =	39,13%	V1
14	8	35	Indicador =	50,72%	V1
15	3	38	Indicador =	55,07%	V1
16	0	38	Indicador =	55,07%	V1
17	14	52	Indicador =	75,36%	V1
18	0	52	Indicador =	75,36%	V1
19	8	60	Indicador =	86,96%	V1
20	2	62	Indicador =	89,86%	V0
21	0	62	Indicador =	89,86%	V0
22	0	62	Indicador =	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Obtuvo y georreferenciación en magnética)

Semana	Acumulado	
		V1
		V1
		V2
		V1
		Arrollava

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	27 de septiembre de 2018	PERIODO No.	23	DEL	20/09/2018	AL	26/09/2018

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
Acum	-	19

Programados Semana	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	43,16%

6. Actividades Administrativas

En la Vigésimo tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 69,66%
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 66,66%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%


- En el componente de obra se trabajó en los ID 11_4 y Emergencia Calle 72
ID 11_4: Durante esta semana, el Contratista ejecutó 60 unidades de defensa metálica sobre el corredor de la Carrera 51, correspondientes a 228,6m lineales de defensas.
Emergencia Calle 72: Se realizó el retiro de 10 unidades de defensa metálica impactada correspondientes a 38,1m lineales y el posterior reemplazo de la misma cantidad de defensas por unidades nuevas.
- Se realiza comité de seguimiento de obra # 23.


- El contratista envía informe semanal.

- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La Interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana

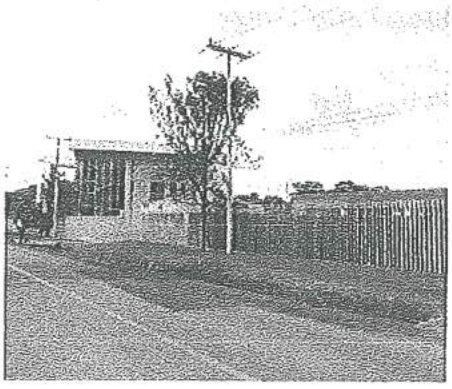

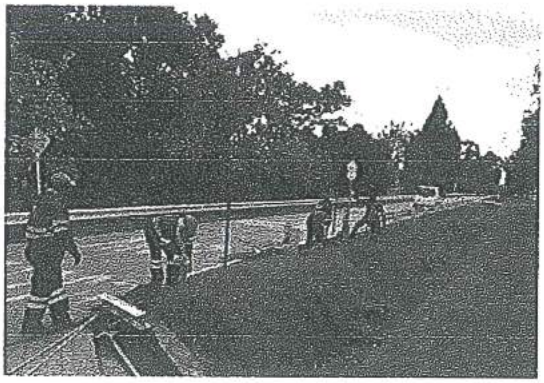

ID 11_4 Carrera 51 entre Calles 212 y 215

FIRMA INTERVENTOR (INGENIERO RESIDENTE O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

V°B° SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0164

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	04 de octubre de 2018	PERIODO No.	24	DEL	27/09/2018	AL	3/10/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACION PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRANSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018353	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,72%	PLAZO TRANSCURRIDO:	167 EQUIVALE AL 68,72%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.553.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.553.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.553.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte los días que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	34,81%
4	10	57	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	42,22%
5	0	57	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	42,22%
6	5	62	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	45,93%
7	7	69	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	51,11%
8	52	121	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	89,63%
9	14	135	Indicador = (Visitas acumuladas / Visitas Total a Cumplir)	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Edico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	1,85%	V2
8	1	1	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	1,85%	V2
9	12	13	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	18,84%	V2
10	0	13	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	18,84%	V2
11	3	16	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	23,19%	V1
12	3	19	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	27,54%	V1
13	8	27	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	38,67%	V1
14	8	35	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	50,72%	V1
15	3	38	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	55,07%	V1
16	0	38	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	55,07%	V1
17	14	52	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	75,35%	V1
18	0	52	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	75,36%	V1
19	8	60	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	86,96%	V1
20	2	62	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	89,86%	V0
21	0	62	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	89,86%	V0
22	0	62	Indicador = (Diseños entregados / Total de Diseños)	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georeferenciación en magnética)

Semana	Acumulado	
		V0
		V1
		V2
		V3
		Aprobada

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	11 de octubre de 2018	PERIODO No.	25	DEL	4/10/2018	AL	10/10/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEVENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRANSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEI CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	174 | EQUIVALE AL | 71,60%	PLAZO TRANSCURRIDO:	174 | EQUIVALE AL | 71,60%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEI CONSULTORES S.A.S.

** Insertar las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado	
1	0	0	
2	0	0	
3	47	47	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 33,81%
4	10	57	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 42,22%
5	0	57	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 42,22%
6	5	62	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 45,93%
7	7	69	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 51,11%
8	52	121	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 89,63%
9	14	135	Indicador = Visitas Acumuladas / Visitas Total a Ejecutar = 100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	0,45%	V2
8	1	1	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	0,45%	V2
9	12	13	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	10,81%	V2
10	0	13	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	10,81%	V2
11	3	16	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	23,15%	V1
12	3	19	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	38,13%	V1
14	8	35	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	51,72%	V1
15	3	38	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	86,96%	V1
20	2	62	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	89,86%	V0
21	0	62	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	89,86%	V0
22	0	62	Indicador = Diseños entregados / Total de Diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georeferenciación en magnética)

	Semana	Acumulado	
			V1
			V1
			V2
			V1
			Anteriores

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	11 de octubre de 2018	PERIODO No.	25	DEL	4/10/2018	AL	10/10/2018

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
Acum		19

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	43,16%

6. Actividades ejecutadas obra

En la vigésimo quinta semana de ejecución del contrato 2017-1633 realizaron las siguientes actividades:

- Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 49,65%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 65,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

- En el componente de obra se trabajó en los ID 11_4, 9_2 y 19_2.

ID 2_7 : Durante esta semana, el Contratista ejecutó 22 unidades de defensa metálica sobre el corredor de la Carrera 51, correspondientes a 83,82m lineales de defensas.

ID 9_2: Se realizó la excavación de 22 pntos, donde se colocarán los micropilotes y los postes para el anclaje de las mallas

ID 16_2: instalación de terminales de impacto (2).

ID 19_5: Este ID ya había sido trabajado el corte anterior y se retiró la instalación de defensas metálicas segun el diseño aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Para el presente corte se ejecutó la tarea de instalación de terminales Impacto X-Ita (1 unidad) y se presenta un porcentaje de avance de FO de 100%. Cabe aclarar que los ID que presenan instalación de terminales de impacto no generan avance en la tabla de ejecución de obras debido a que ya habían sido tenidos en cuenta en cortes anteriores


- Se realiza comité de seguimiento de obra # 25.

- El contratista envía informe semanal


- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La Interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana

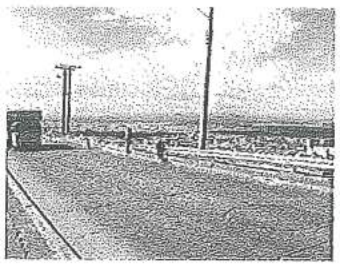

ID 19_6 (Carrera 20 con Calle 70D sur)

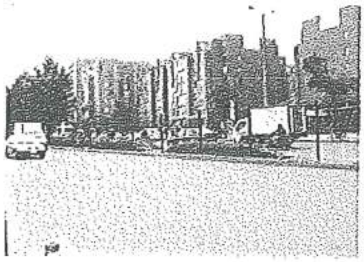

ID 9_2 Av. Ciudad de Cali entre Calles 18 y 20



ID 16_2 (Calle 3 entre Carreras 50 y 53D)

FIRMA INTERVENTOR (REP. LEGAL O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing Jhon Harold Alape Orozco

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	18 de octubre de 2018	PERIODO No.	26	DEL	11/10/2018	AL	17/10/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VERCULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACION PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRANSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 74,49%	PLAZO TRANSCURRIDO:	181 EQUIVALE AL 74,46%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN/ES:	$ -	VALOR ADICIÓN/ES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	23,18%	V1
12	3	19	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	86,96%	V1
20	2	62	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	89,86%	V0
21	0	62	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	89,86%	V0
22	0	62	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georeferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
			V0
			V1
			V2
			V3
			Aprobados

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	18 de octubre de 2018	PERIODO No.	26	DEL	11/10/2018	AL	17/10/2018

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	7	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
Acum		21

Programados Semana	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	47,73%

6. Actividades Administrativas

En la vigésimo sexta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 89,86%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 86,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

- En el componente de obra se trabajó en los ID 11_4, 9_2 y 19_2.


ID 2_7 : Posterior a la instalación de las defensas metálicas, instaladas la semana pasada, el Contratista ejecutó la instalación de la terminal de impacto diseñada y aprobada en esta contrata. Con esta intervención este ID reporta 100% de avance.


ID 9_2: Se realizó la instalación de 14 unidades de malla de canalización peatonal sobre el corredor de la Av. Ciudad de Cali. Con esta intervención este ID reporta avances en su ejecución pero quedan pendientes la instalación de la fase II de este ID.

ID 11_4: En este ID se instalan durante esta semana las 3 terminales de impacto faltantes y se reporta un avance de obra del 100%. ID culminado.

- Se realiza comité de seguimiento de obra # 26.


7. Registro fotográfico del avance durante la semana





ID 9_2 Av. Ciudad de Cali entre Calles 18 y 20





ID 11_4 Carrera 51 entre Calles 212 y 215

FIRMA INTERVENTOR (INGENIERO RESIDENTE O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: ING. JHON HAROLD ALAPE OROZCO

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

030170

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	26 DE ABRIL 2018	PERIODO No.	1	DEL	19/04/2018	AL	25/04/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	162
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 2,82%	PLAZO TRANSCURRIDO:	6 EQUIVALE AL 3,30%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

Semana		Acumulado
1		0
2		0
3		0
4		0

Indicador	=	# visitas acumuladas/# visitas total a visitar

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

Semana		Acumulador				
1			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V0
2			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V1
3			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V2
4			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana		Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobado

5. Ejecución de Obra

Trabajados en la semana		Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la primera semana de ejecución del contrato 20171833 celebrado entre UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065 y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista.
- Revisión del plan de trabajo presentado por el contratista.
- Revisión del cronograma presentado por el contratista.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

0:0171

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	26 DE ABRIL 2018	PERIODO No.	1	DEL	19/04/2018	AL	25/04/2018

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

1.	2.
3.	4.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* Vobo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0172

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	1	DEL	26/04/2018	AL	02/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 6,10%	PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 7,14%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR.	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
1		0
2		0
3		0
4		0

Indicador	=	# visitas acumuladas/# visitas total a visitar

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador				
1			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V0
2			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V1
3			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V2
4			Indicadores	=	# Diseños Recibidos/ # Total sitios a visitar	V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la segunda semana de ejecución del contrato 2017-1833 celebrado entre UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065 y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD realizaron las siguientes actividades:

- Aprobación y remisión de las hojas de vida al supervisor del contrato.
- Aprobación y remisión del plan de trabajo al supervisor del contrato.
- Aprobación y remisión del cronograma al supervisor del contrato.
- Realizan el segundo Comite de Obra, definiendo puntos donde realizaran visitas la siguiente semana.
- Actualizacion de polizas tanto del contratistista como de la interventoria.
- Revison y aprobacion de los APUs presentados por el contratista.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La Interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

IDIGER	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	1	DEL	26/04/2018	AL	02/05/2018

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

1.	2.
3.	4.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	3	DEL	03/05/2018	AL	03/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEVENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No :	2018363	CONTRATO No :	20171833
INTERVENTORÍA:	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL DAD 025
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 9,39%	PLAZO TRANSCURRIDO:	20 EQUIVALE AL 10,99%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzalez Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
1	1	47
2		
3		
4		

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador
1		
2		
3		
4		

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador
1		
2		
3		
4		

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

$$\text{Indicador} = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar} \quad 37,01\% \quad V0$$

$$\text{Indicador} = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V1$$

$$\text{Indicador} = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V2$$

$$\text{Indicador} = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V3$$

V0
V1
V2
V3
Aprobada

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades

- Actualización de pólizas tanto del contratista como de la interventoría.
- Se programaron visitas a los sitios propuestos por la entidad SMD.
- Revisión y aprobación de los APUs presentados por el contratista.
- Se realizó comité de obra.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	03 DE MAYO DE 2018	PERIODO No.	3	DEL	03/05/2018	AL	09/05/2018

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

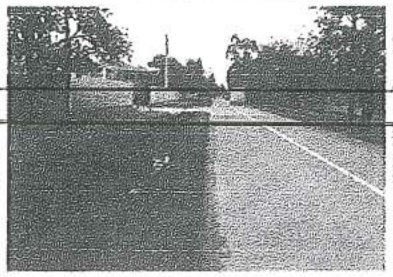


Foto 1 Algunos de los sitios críticos visitados KR 51 entre CL 212 y CL




Foto 2 Algunos de los sitios críticos visitados Diagonal 73B sur con

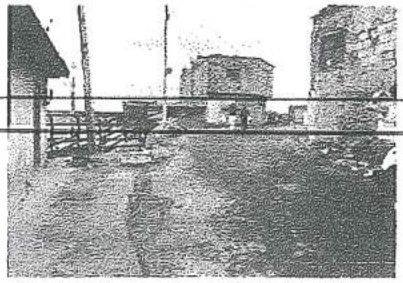


Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados Diagonal 73B sur con



Foto 4 Algunos sitios visitados. Carrera 27 con Calle 14 sur

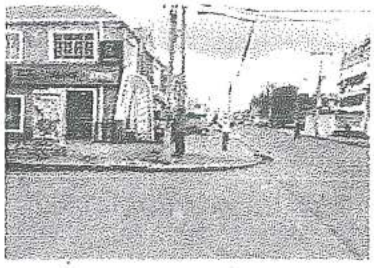


Foto 5 Algunos sitios visitados CL 73 x KR 20 a KR 20 A (Costado sur)



Foto 6 Algunos sitios visitados CL 73 x KR 20 a KR 20 A (Costado sur).

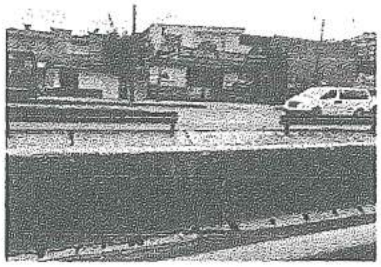


Foto 7 Algunos sitios visitados Avenida Boyacá por calle 63 - canal

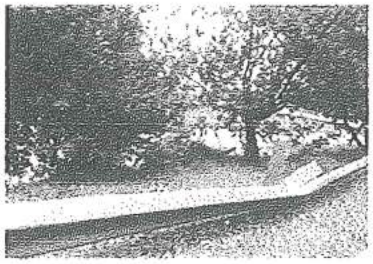


Foto 8 Algunos sitios visitados Avenida Calle 127 en tre autopista norte y Avenida Córdoba

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* Vo.Bo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0176

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	10 de mayo de 2018	PERIODO No.	4	DEL	10/05/2018	AL	16/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2018383			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA:	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO:	213			PLAZO ACTUALIZADO:	182		
PLAZO TRANSCURRIDO:	27	EQUIVALE AL	12,68%	PLAZO TRANSCURRIDO:	27	EQUIVALE AL	14,84%
VALOR INICIAL :	$	433.207.600,00		VALOR INICIAL :	$	4.558.441.199,00	
VALOR ADICIÓN(ES):	$	-		VALOR ADICIÓN(ES):	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	433.207.600,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	4.558.441.199,00	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR PAGAR:	$	433.207.600,00		VALOR POR PAGAR:	$	4.558.441.199,00	
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodriguez			INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
1	47	47
2	10	57
3		
4		

$$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$$ 37,01%

$$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$$ 44,68%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

		Acumulador
1		
2		
3		
4		

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$$ V0

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$$ V1

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$$ V2

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$$ V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

0:0177

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	10 de mayo de 2018	PERIODO No.	4	DEL	10/05/2018	AL	16/05/2018

6. Actividades Administrativas

En la Cuarta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Se programaron Nuevas visitas a los sitios propuestos por la entidad SMD.
- Aprobación de los APUs presentados por el contratista.
- Se realizó comité de obra.
- Realizan Capacitacion de Sistemas de Contecion Vial.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios Autopista Sur con Calle 59 sur, costado norte

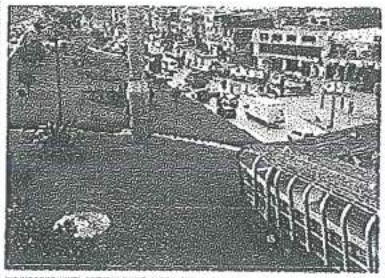


Foto 2. Algunos de los sitios Av. Boyacá x Diagonal 61a Sur Meissen

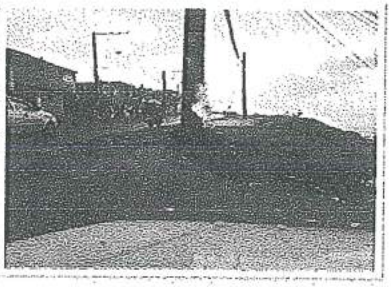


Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Carrera 20 por Calle 70D Sur




Foto 4.Algunos sitios visitados.Diagonal 73B sur con Transversal 27B

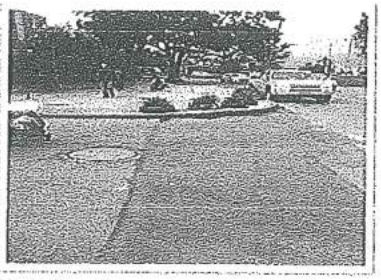


Foto 5.Algunos sitios visitados.Carrera 27 con Calle 14 sur




Foto 6.Algunos sitios visitados.Carrera 68 sobre el rio fucha en los dos costados



Foto 7.Algunos sitios visitados.Av. Carrera 30 por Av de las Américas



Foto 8.Algunos sitios visitados.Calle 3 con Carrera 68 costado sur

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO DURIEUX

* Vo.Bo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0178

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	17 de mayo de 2018	PERIODO No.	5	DEL	17/05/2018	AL	23/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	34 EQUIVALE AL 15,96%	PLAZO TRANSCURRIDO:	34 EQUIVALE AL 18,68%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzalez Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	37,01%
2	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
3	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
4				

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

		Acumulador			
1	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,75%	V0
2			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V1
3			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V2
4			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	17 de mayo de 2018	PERIODO No.	5	DEL	17/05/2018	AL	23/05/2018

6. Actividades Administrativas

En la Quinta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Continuan realizando visitas y revisiones en campo de los puntos restantes priorizados.
- Continuan con la actividades de elaboracion de los esquemas de soluciones y diseños preliminares por parte del contratista.
- Continuan con la elaboracion y esquemas tipicos para barreras tipo New Jersey Laterales y Terminales.
- Mesa de trabajo para revision de fichas tecnicas y esquemas tipicos (Trabajo con los diseñadores).
- Realizan el comite de seguimiento tecnico de Obra
- Revision y definicion de Coompromisos acordadeos en el acta de comite.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realiza la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. Calle calera.



Foto 2. Algunos de los sitios Av. Circunvalar por calle 44 - Ambos




Foto 3. Algunos de los sitios criticos visitados AK 45 entre 134 A y 137




Foto 4.Algunos sitios visitados.Carrera 13 por calle 80 costado occidental




Foto 5.Algunos sitios visitados.Av. Boyacá x Diagonal 61 a Sur Malla sen Sentido Sur - Norte

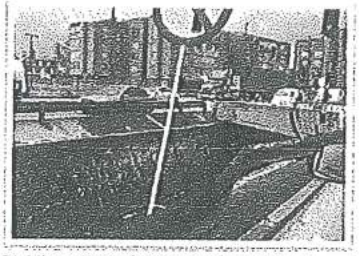


Foto 6.Algunos sitios visitados Avenida Boyacá por calle 63 - canal



Foto 7.Algunos sitios visitados.Avenida Boyacá por calle 53 - canal



Foto 8.Algunos sitios visitados AC 127 entre AK 19 y Kr 20 (Costado norte)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO GURGEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0180

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	24 de mayo de 2018	PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2018363			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO:	213			PLAZO ACTUALIZADO:	182		
PLAZO TRANSCURRIDO:	41	EQUIVALE AL	19,25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	41	EQUIVALE AL	22,53%
VALOR INICIAL :	$		433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$		4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$		-	VALOR ADICIÓN(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$		4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodriguez			INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
1	0	0
2	0	0
3	47	47
4	10	57
5	0	57
6	5	62

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 37,01%

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 44,88%

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 44,88%

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 48,82%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en fisico)

	Semana	Acumulador
1	1	1
2		
3		
4		

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ 0,79% V0

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V1

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V2

Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		

Programados Semanal	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	24 de mayo de 2018	PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

2		
3		
4		

Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	24 de mayo de 2018	PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

6. Actividades Administrativas

En la Sexta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Realizan nuevas visitas a puntos priorizados por la entidad.
- Realiza comite de Seguimiento de Obra.
- Realiza Reunion con el equipo de Consultoria de la SDM (Reunion con la Diseñadora de la Entidad)
- Continuan con las Mesas de trabajo para revision de fichas tecnicas y esquemas tipicos (Trabajo con los diseñadores).
- Entrega de PMT General.
- Revision y definicion de Coompromisos acordadeos en el acta de comite.
- Reunion de Espacio publico.
- Entrega de informe Semanal y Mensual.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. CAll la calera.

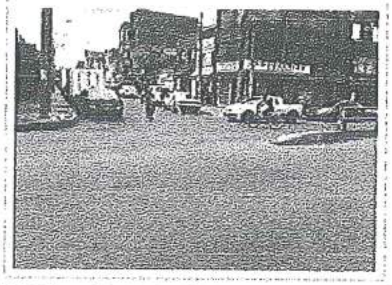


Foto 2. Algunos de los sitios Av. Calle 72 con Carrera 51



Foto 3. Algunos de los sitios criticos visitados.Carrera 30 por calle 23




Foto 4.Algunos sitios visitados.CL 3 Sur entre KR 4 Este y TV 1 Este

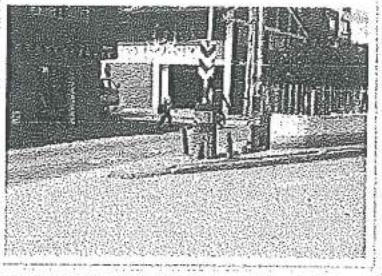


Foto 5.Algunos sitios visitados.TV 80B entre CL 65D Sur y CL 65F Sur

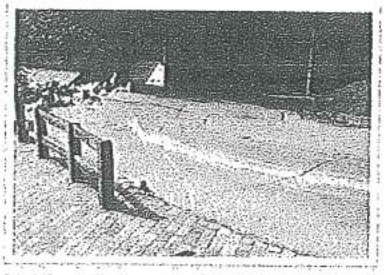


Foto 6.Algunos sitios Carrera 46 con diagonal 68D sur

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

HOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0::0183

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	24 de mayo de 2018	PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	2018363			CONTRATO No.:	20171833		
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.			CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065		
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018		
PLAZO ACTUALIZADO:	213			PLAZO ACTUALIZADO:	182		
PLAZO TRANSCURRIDO:	41	EQUIVALE AL	19,25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	41	EQUIVALE AL	22,53%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00			VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -			VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00			VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00		
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodriguez			INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	37,01%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	48,82%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en fisico)

	Semana	Acumulador			
1	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,79%	V0
2			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V1
3			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V2
4			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		

Programados Semanal	%

0::n184

IDIGER	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	24 de mayo de 2018		PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

2		
3		
4		

Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	24 de mayo de 2018	PERIODO No.	6	DEL	24/05/2018	AL	30/05/2018

6. Actividades Administrativas

En la Sexta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Realizan nuevas visitas a puntos priorizados por la entidad.
- Realiza comite de Seguimiento de Obra.
- Realiza Reunion con el equipo de Consultoria de la SDM (Reunion con la Diseñadora de la Entidad)
- Continuan con las Mesas de trabajo para revision de fichas tecnicas y esquemas tipicos (Trabajo con los diseñadores).
- Entrega de PMT General.
- Revision y definicion de Coompromisos acordadeos en el acta de comite.
- Reunion de Espacio publico.
- Entrega de informe Semanal y Mensual.

- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. CAI la calera.



Foto 2. Algunos de los sitios Av. Calle 72 con Carrera 51



Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Carrera 30 por calle 23

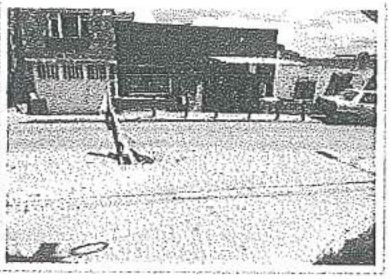


Foto 4.Algunos sitios visitados.CL 3 Sur entre KR 4 Este y TV 1 Este




Foto 5.Algunos sitios visitados.TV 80B entre CL 65D Sur y CL 65F Sur

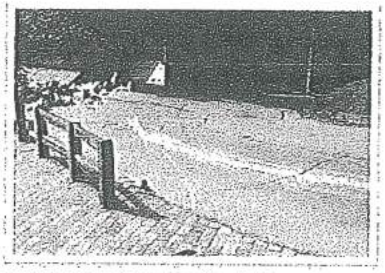


Foto 6.Algunos sitios Carrera 46 con diagonal 68G sur

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0000186

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	21 de junio de 2018	PERIODO No.	9	DEL	14/06/2018	AL	20/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 29,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	62 EQUIVALE AL 34,07%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.668.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.668.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.668.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	1,45%	V0
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	1,45%	V0
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	18,84%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulado	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	21 de junio de 2018	PERIODO No.	9	DEL	14/06/2018	AL	20/06/2018

6. Actividades Administrativas

En la Novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Terminan de realizar las visitas a puntos suministrados por la entidad, en total se visitaron 135 puntos.
- Entrega por parte del contratista de 10 diseños y 3 fichas de mantenimiento.
- Remisión por parte de esta interventoría a la entidad de 10 diseños y 3 fichas de mantenimiento.
- Continúan realizando Mesas de trabajo para revisión de fichas técnicas y esquemas típicos (Trabajo con los diseñadores).
- Realiza comité de Seguimiento de Obra.
- Aprobación de PMT General.
- Presentación de esquema de Diseño de Muros.
- Aprobación de PMT General.
- Se recomienda a la SDM aprobar el 100 % del presupuesto de obra referido el presupuesto contractual.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
- Entrega de informe Semanal y Remisión del informe Mensual.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaría distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

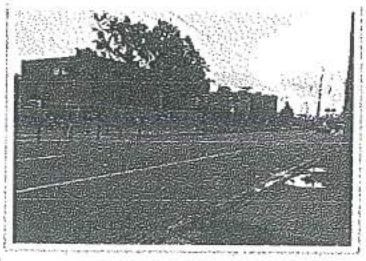


Foto 1.Algunos de los sitios visitados. Carrera 30 entre Av. Primero de



Foto 2. Algunos de los sitios .Carrera 30 entre Av. Primero de Mayo y




Foto 3. Algunos de los sitios críticos visitados.Autonorte calle 116




Foto 4.Algunos sitios visitados Autonorte con calle 94



Foto 5.Algunos sitios visitados.Carrera 49 entre Calle 124C y 129 (Ambos Costados)



Foto 6.Algunos sitios Visitados.Calle 13 entre Carrera 36 y Semáforo peatonal carrera 37-35 - Sede SDM

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0188

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	14 de junio de 2018	PERIODO No.	8	DEL	07/06/2018	AL	13/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	55 EQUIVALE AL 25,82%	PLAZO TRANSCURRIDO:	55 EQUIVALE AL 30,22%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	37,01%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	44,88%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	48,82%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	54,33%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	95,28%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,79%	V0
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,79%	V1
9			$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$		V2

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	14 de junio de 2018	PERIODO No.	8	DEL	07/06/2018	AL	13/06/2018

6. Actividades Administrativas

En la Octava semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Continúan con las Mesas de trabajo para revisión de fichas técnicas y esquemas típicos (Trabajo con los diseñadores).
- Continúan realizan visitas a puntos suministrados por la entidad.
- Realiza comité de Seguimiento de Obra.
- Aprobación de PMT General.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
- Entrega de informe Semanal y corrección del informe Mensual.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Foto 1.Algunos de los sitios visitados. Calle 17 con carrera 96 A - Paso



Foto 2. Algunos de los sitios .Av. Carrera 19 entre Calle 127B y calle



Foto 3. Algunos de los sitios criticos visitados.Carrera 62 entre Av. Americas



Foto 4.Algunos sitios visitados.Calle 10 entre carreras 60 y 62 (costado norte)



Foto 5.Algunos sitios visitados.CL 74B Bis Sur x KR 3C



Foto 6.Algunos sitios Visitados.CL 32B Sur x KR 8Este

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	28 de junio de 2018	PERIODO No.	10	DEL	21/06/2018	AL	27/06/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	69 | EQUIVALE AL | 32,39%	PLAZO TRANSCURRIDO:	69 | EQUIVALE AL | 37,91%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzales Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,74%	V0
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	0,74%	V0
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	9,63%	V0
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$	9,63%	V1

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	28 de junio de 2018	PERIODO No.	10	DEL	21/06/2018	AL	27/06/2018

6. Actividades Administrativas

En la Décima semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Entrega por parte del contratista de 10 diseños y 3 fichas de mantenimiento corregidas con base a las observaciones realizada por la interventoria y la ingeniera de diseño de la SDM.
- Continúan realizando Mesas de trabajo para revisión de fichas técnicas y esquemas típicos (Trabajo con los diseñadores).
- Realiza comité de Seguimiento de Obra.
- Aprobación de PMT General.
- Se recomienda a la SDM aprobar el 100 % del presupuesto de obra referido al presupuesto contractual.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
- Entrega de informe Semanal y Remisión del informe Mensual.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

0:0192

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	05 Julio de 2018	PERIODO No.	11	DEL	28/06/2018	AL	4/07/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	2018363		CONTRATO No.:	20171833	
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.		CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065	
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES		PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:			**FECHA DE SUSPENSIÓN:		
**FECHA DE REINICIACIÓN:			**FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018	
PLAZO ACTUALIZADO:	213		PLAZO ACTUALIZADO:	182	
PLAZO TRANSCURRIDO:	76 EQUIVALE AL 35,68%		PLAZO TRANSCURRIDO:	76 EQUIVALE AL 41,76%	
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00		VALOR INICIAL :	$ 4.658.441.199,00	
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.658.441.199,00	
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	$ -	
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00		VALOR POR PAGAR:	$ 4.658.441.199,00	
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez		INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V0
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V0
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V0
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V0
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	05 Julio de 2018	PERIODO No.	11	DEL	28/06/2018	AL	4/07/2018

6. Actividades Administrativas

En la Onceava semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- Entrega por parte del contratista de 3 diseños de los cuales fueron 2 aprobados por la interventoría y la ingeniera de diseño de la SDM.
- Se realiza una reunión donde el contratista realiza una propuesta de cambio para las mallas eslabonadas por mallas electrosoldadas de 3 pulgadas con 5 apoyos.
- Realiza comité de Seguimiento de Obra #11.
- El contratista envía PMT específicos para ID 11_5,2_4,1_1,2_12,10_2,10_3 y 17_2.
- El contratista envía informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.
- Se realiza balance de obra con base a los puntos aprobados.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CUSICUA

*VOBO SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0194

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	13 Julio de 2018	PERIODO No.	12	DEL	5/07/2018	AL	11/07/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEVENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.:	2018363		CONTRATO No.:	20171633	
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S		CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 055	
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES		PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018		FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	
**FECHA DE REINICIACIÓN:	-		**FECHA DE REINICIACIÓN:	-	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018		FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018	
PLAZO ACTUALIZADO:	213		PLAZO ACTUALIZADO:	182	
PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 38,97%		PLAZO TRANSCURRIDO:	83 EQUIVALE AL 45,60%	
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00		VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00	
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00	
VALOR PAGADO:	$ -		VALOR PAGADO:	$ -	
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00		VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00	
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez		INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
11	3	16	$Indicador = \frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V0
12	3	19	$Indicador = \frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	27,54%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana	Acumulado	
		V0
		V1
		V2
		V3
		Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12		
14		
15		
Acum	-	1

Programados Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	1,45%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	13 Julio de 2018	PERIODO No.	12	DEL	5/07/2018	AL	11/07/2018

6. Actividades Administrativas


En la duodécima semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:
•Esta semana inicia la ejecucióndel componente de obra, el 7 de Julio empezó la ejecución del ID 2_12(Av. Circunvalar con Cl 44 ambos costados), y en el transcurso de la semana continuó el ID11_5, este punto no fue terminado esta semana.
• Hasta el momento, el contratista tiene un totoal de 69 diseños, de los cuales 19 han sido entregados en versión (0) y los 13 primeros ya se encuentran en versión (1).
• Se realiza una reunión donde el contratista realiza una propuesta de solución integral para el ID de la Calle 127con Autopista norte,aunque su precio asciende de manera considerable es visto con buenos ojos por la interventoría y el supervisor.
• Se realiza comité de seguimiento de obra # 12.
• La interventoría entrega el listado de los ID's cuyos diseños han sido aprobados,estos son: ID's , 2_4, 2_5, 10_2, 10_3.
• El contratista envía informe semanal.
•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 2_12 (Av. Circunvalar con Cl 44) ambos costados



ID 11_5 (Av. Cl 127 entre Autonorte y Av. Córdoba)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURREO

Vobo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	19 Julio de 2018	PERIODO No.	13	DEL	12/07/2018	AL	18/07/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 42,25%	PLAZO TRANSCURRIDO:	90 EQUIVALE AL 49,45%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado	
1	0	0	
2	0	0	
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 34,81%
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 42,22%
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 42,22%
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 45,93%
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 51,11%
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 89,63%
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en fisico)

	Semana	Acumulador		
7	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45% V1
8	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45% V1
9	12	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84% V1
10	0	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84% V1
11	3	16	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19% V0
12	3	19	Indicador= $\frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	27,54% V0
13	8	27	Indicador = $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13% V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana	Acumulador	
		V0
		V1
		V2
		V3
		Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	2
14		
15		
Acum		3

Programados Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	4,35%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	19 Julio de 2018	PERIODO No.	13	DEL	12/07/2018	AL	18/07/2018

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	19 Julio de 2018	PERIODO No.	13	DEL	12/07/2018	AL	18/07/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 8 más, para un total de 27 diseños entregados en versión (0), de los cuales 13 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas.
- En el componente de obra se trabajaron 5 ID,s: 11_5,17_2,10_3,10_2 y 1_7. De los cuales 2 fueron culminados: 17_2 y 1_7. Estos puntos ejecutados corresponden al 4,35% del total de ID's.
- Se realiza una reunión con el Jardín Botánico José Clestino Mutis para evaluar aspectos de las barreras vivas.
- Se realiza comité de seguimineto de obra # 13.
- Los 19 diseños entregados por el contratista equivalen al 28% de los establecidos y los aprobados por la interventoria y la especialista en diseños de la entidad corresponden al 10% del total de los diseños .
- El contratista envia informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 17_2 (Av. Circunvalar entre Cl 28 y 22), ambos sentidos.



ID 10_2 (Av Boyacá con Cl 53), canal.



ID 11_5 (Av.Cl 127 entre Autonorte y Av. Córdoba).

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. LUIS MARIA PEÑA PACHECO

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	26 Julio de 2018	PERIODO No.	14	DEL	19/07/2018	AL	25/07/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171633
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVALIDAD 055
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	97 EQUIVALE AL 45,54%	PLAZO TRANSCURRIDO:	97 EQUIVALE AL 53,30%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIONES):	$ -	VALOR ADICIONES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.558.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Básico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
8	0	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V1
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V0
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V0
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V0
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	69,72%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

Semana	Acumulador		
		V0	
		V1	11,59%
		V2	
		V3	
		Aprobado	

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15		
Acum		5

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	7,25%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	29 Julio de 2018	PERIODO No.	14	DEL	18/07/2018	AL	25/07/2018


6. Actividades Administrativas

En la decima cuarta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 8 más, para un total de 35 diseños entregados en versión (0), de los cuales 13 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas.
- En el componente de obra se inició trabajos en los ID 11_1 y 1_1 debido a la longitud de la intervención del ID 11_1intervención será necesario realizar su ejecución por tramos, por tanto esta No se completa. El ID 1_1, de instalación de mallas de canalización peatonal se inicia esta semana y se culmina en el mismo periodo de trabajo.
- Se realiza comité de seguimiento de obra # 14.
- ~~Los 35 diseños entregados por el contratista equivalen al 50,72% de los establecidos, los diseños presentados esta semana equivalen al 11,59 sobre el total de los diseños.~~
- El contratista envía informe semanal
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La Interventoria JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)





ID 1_1 (Av. Carrera 7 ente Calles 153 y 156)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

* VISTO SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
* Una vez asegurado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0n201

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	02 de agosto de 2018	PERIODO No.	15	DEL	26/07/2018	AL	1/08/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018360	CONTRATO No:	20171633
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	104 EQUIVALE AL 48,83%	PLAZO TRANSCURRIDO:	104 EQUIVALE AL 57,14%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.553.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.553.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.553.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzalez Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V1
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V0
15	3	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georeferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador

V0 18,84%
V1
V2
V3
Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
Acum		5

Programado Semanal	%
Avance Semanal	0,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	7,25%

0:0202

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	02 de agosto de 2018	PERIODO No.	15	DEL	26/07/2018	AL	1/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la decimo quinta semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 3 más, para un total de 38 diseños entregados en versión (0), de los cuales 27 ya han sido presentados en versión (1) y 13 en versión (2) con las correcciones pertinentes realizadas .

• En el componente de obra se continuó el trabajo en varios tramos del ID 11_1 5 y se trabajó simultaneamente en la instalación de mallas de contención vehicular en el ID 12_4, el cual quedó casi culminado esta semana, ninguno de los dos ID fue culminado y no se reporta avance porcentual en obra para el presente periodo.

• Se realiza comité de seguimiento de obra # 15.


• ~~Los 38 diseños entregados por el contratista equivalen al 55,07% de los establecidos, esta semana se reporta un avance porcentual de 4,35%, los diseños en Versión (1) se encuentran en 39,13%~~ y en versión (2) se tiene un porcentaje de 18,84%, esto sobre el total de los diseños establecidos (69).


• El contratista envía informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La Interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana






ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)

ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)







ID 11_1 (Av. Cl 145 entre Kr 103 y 111)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	09 de agosto de 2018	PERIODO No.	18	DEL	2/08/2018	AL	8/08/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	20180363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA:	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 066
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	111 [EQUIVALE AL] 52,11%	PLAZO TRANSCURRIDO:	115 [EQUIVALE AL] 63,19%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL:	$ 4.568.441.199,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.568.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.600,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.568.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Insertar las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Edición)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,85%	V2
8	1	1	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	1,85%	V2
9	12	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,81%	V2
10	0	13	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	18,81%	V1
11	5	18	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	38,13%	V1
14	8	35	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	50,72%	V0
15	3	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V0
16	0	38	Indicador= # Diseños recibidos / # Total de diseños	55,07%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciadas en magnética)

	Semana	Acumulador	
			V0
			V1
			V2
			V3
			Aprobado

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	8	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
Acum		8

Programado Semanal	%
Avance Semanal	4,35%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	11,59%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GERENCIA DE PROYECTOS	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	09 de agosto de 2018	PERIODO No.	16	DEL	2/08/2018	AL	8/08/2018

6. Actividades Administrativas

En la decima sexta semana de ejecución del contrato 2017-1533 realizaron las siguientes actividades:



- De 69 diseños establecidos , esta semana no se reportó avances en el componente de consultoría, teniendo así 33 diseños hasta el momento, que equivalen al 65,07% del total establecido para este componente, de esta entrega se encuentran 27 diseños en revisión (1)

- En el componente de obra se trabajaron 3 ID,s: 11_1 en su parte final, 1_8 y 12_4, todos fueron culminados para el corte de esta semana. Hasta el momento el avance de obra se encuentra en 11,59% con respecto a 15's ejecutados.



- Se realiza comité de seguimiento de obra # 16.
- El contratista envía informe semanal
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y aprobación de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana


ID 11_1 (AV. Suba entre Carreras 103 y 111)

ID 1_8 (AV. Carrera 7 entre Calles 181ª y 182)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURELOS

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
SUPERVISOR: [illegible]
* Una vez sea firmado y aceptado este informe, el supervisor deberá entregarlo la aceptación con su firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	16 de agosto de 2019	PERIODO No.	17	DEL	9/08/2019	AL	15/08/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	20161353	CONTRATO No.:	20171533
INTERVENTOR(A	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 045
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	
*FECHA DE REINICIACIÓN:		*FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de octubre de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	183
PLAZO TRANSCURRIDO:	118 | EQUIVALE AL | 55,42%	PLAZO TRANSCURRIDO:	118 | EQUIVALE AL | 64,54%
VALOR INICIAL:	$ 433.207.830,00	VALOR INICIAL *	$ 4.958.441.199,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.830,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.958.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.207.830,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.958.441.199,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto Gonzalez Rodriguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	34,81%
4	10	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
5	0	57	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	42,22%
6	5	62	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	45,93%
7	7	69	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	51,11%
8	52	121	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	89,63%
9	14	135	Indicador= #Visitas Acumuladas / #Visitas Total a Visitar	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseño en Sitio)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,85%	V2
8	1	1	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	1,85%	V2
9	12	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	18,84%	V2
11	3	15	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	23,15%	V1
12	3	19	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	27,64%	V1
13	8	27	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	53,72%	V1
15	3	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	58,67%	V1
16	0	38	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	58,67%	V1
17	14	52	Indicador= #Diseños recibidos / #Total de diseños	75,36%	V3

4. Diseños Entregados (Diseño y presentación en magnífico)

	Semana	Acumulado	
			V2
			V1
			V2
			V3
			Aprobado

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
Acum		11

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,65%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	13,54%

0:0206

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	16 de agosto de 2018	PERIODO No.	17	DEL	6/08/2018	AL	12/08/2018

6. Actividades Administrativas


En la decimo tercera semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

- De 69 diseños establecidos , esta semana se entregaron 14 más, para un total de 52 diseños entregados en versión (0), de los cuales 39 ya han sido presentados en versión (1) con las correcciones pertinentes realizadas y 13 en versión (2).
- En el componente de obra se trabajaron 5 ID's: 2_4, 10_2 y 10_3 De los cuales 2 fueron culminados todos. Estos puntos ejecutados corresponden al 15.84% del total de ID's.
- Se realiza una reunión con el Jardín Botánico José Celestino Mutis para evaluar aspectos de las barreras Verdes.
- Se realiza comité de seguimiento de obra # 17.
- El contratista envía informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.


La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.


7. Registro fotográfico del proceso durante la semana






ID 2_4 (Av. Circunvalar con Calle 73)





ID 10_2 (Av. Boyacá con Calle 53, canal)





ID 13_3 (Av. Boyacá con Calle 63, canal)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CARPIO CORTES

* Visto Bueno (FIRMA)
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ PEREZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

0:0207

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	23 de agosto de 2018	PERIODO No.	19	DEL	16/8/2018	AL	22/8/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	2018353	CONTRATO No.:	2017 683
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 063
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	
*FECHA DE REINICIACIÓN:		*FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	213	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 58,69%	PLAZO TRANSCURRIDO:	175 EQUIVALE AL 96,16%
VALOR INICIAL:	$ 433.297.609,63	VALOR INICIAL:	$ 4.553.441.193,00
VALOR ADICIÓN ESTE:	$ -	VALOR ADICIÓN ESTE:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.297.609,63	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.553.441.193,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 433.297.609,63	VALOR POR PAGAR:	$ 4.553.441.193,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

*Incluir las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado		
1	0	0		
2	0	0		
3	47	47	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%
4	10	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
5	0	57	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%
6	5	62	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%
7	7	69	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%
8	52	121	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%
9	14	135	$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en Físico)

	Semana	Acumulado			
7	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
11	3	16	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	50,72%	V1
15	3	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
16	0	38	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
17	14	52	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	75,36%	V0
18	0	52	$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	75,36%	V0

4. Diseños Entregados (Diseños y reconfiguración en magnética)

Semana	Acumulado	
		V0
		V1
		V2
		V3
		Aprobado

5. Ejecución de Obra

	Trabajos en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
13	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
Acum		52

Programado Semanal	%
Avance Semanal	1,45%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	29,09%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	23 de agosto de 2019	PERIODO No.	15	DEL	16/08/2019	AL	22/08/2019


6. Actividades Administrativas


En la decima octava semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizamos las siguientes actividades:

- De los diseños establecidos, esta semana el Contratista no presentó diseños para su aprobación, debido a que se encuentra en fase de corrección a algunas observaciones que se han presentado en los comités semanales a lo largo del contrato. Los porcentajes de avances se presentan igual, con una total de 80's presentados de 75,35% correspondientes a 52 diseños ntregados, de los cuales su totalidad de encuentra en Versión 0, 38 diseños correspondientes al 55,07% del total de diseños y ya cuentan el porcentaje de 18,84% correspondientes a la entrega de 13 diseños
- En el componente de obra se trabajó el ID 19_5 (Carrera 20 con Calle 70D Sur), el cual consistió en la ejecución de 21 unidades de barrera de contención vehicular con sus respectivos elementos complementarios como postes, separadores y espigueros. La intervención tuvo una longitud total de 80,0 ml lineales y la instalación de 4 terminales esta de pez temporales, mientras se tienen los terminales de barrera que se dejarán de forma definitiva.
- Se realiza comité de seguimiento de obra # 16.
- El contratista envía informe semanal.
- Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La Interventoría *JASEN CONSULTORES S.A.S.* realiza la revisión y supervisión de todas las actividades


7. Registro fotográfico del avance durante la semana







ID 19_5 (Carrera 20 con Calle 70D sur)







FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: ARL ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

FIRMA SUPERVISOR

SUPERVISOR: Ing. FULVIO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ

* Una vez sea revisada y aceptada esta informe, el supervisor deberá evidenciarlo aceptación con su firma
