INFORME DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA

La Jagua de Ibirico, 7 de Octubre de 2021.

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
Nit: 800108533-8
11 OCT 2021
EL PUEBLO PRIMERO
CONTRATACIÓN
2:32 PM

Señor
OSMAN RAFAEL MARTÌNEZ MURCIA
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO No. 244-2021

Respetuosamente presento el informe de interventoría del contrato de obra 244-2021 con el OBJETO "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Atentamente,

MIGUEL ANGEL CASTILLA CALVO
Representante Legal
CONSORCIO INTER CIS
INTERVENTOR

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

La Jagua de Ibirico, 7 de Octubre de 2021.

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
Nit: 800108683-8
11 OCT 2021
EL PUEBLO PRIMERO
CONTRATACIÓN
2:32 PM

Doctor
CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO No. 244-2021

Respetuosamente presento el informe de interventoría del contrato de obra 244-2021 con el OBJETO "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-DEPARTAMENTO DEL CESAR".

Atentamente,

OSMAN RAFAEL MARTINEZ MURCIA
Secretario de Tránsito y Transporte Municipal
Supervisor contrato 244-2021

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Alcaldía municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
Interventor:	CONSORCIO INTER CIS.
Supervisión:	Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.
Objeto del Contrato:	**OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-**
CONTRATO DE OBRA	**No. 244-2021**
Contratista de la obra:	Ingeniería, software & computadores SAS.
Representante Legal:	Jesús María García Cure.
Valor del Contrato:	**NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).**
Valor del Anticipo:	N/A
Fecha de terminación inicial:	13 de diciembre de 2021.
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	Ninguna.
Valor del Contrato + Adicional:	Ninguna.
Adición valor del anticipo:	Ninguna.
Plazo de ejecución inicial:	Tres (3) meses.
Fecha de inicio:	14 de septiembre de 2021.
Fecha de suspensión:	NA.
Fecha de reinicio:	NA.
Total días transcurridos de suspensión	NA.

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Fecha de Prorroga:	NA.
Adición plazo :	NA.
Plazo de ejecución modificado:	NA.
Fecha de terminación actualizada:	NA.
Fecha de Corte del Informe:	7 de octubre de 2021
Días Transcurridos:	23 días.
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$0
Acta parcial 2	$0
Acumulado	$0
Anticipo	$0
Anticipo desembolsado 1:	$0
Anticipo desembolsado 2:	$0
Amortización Acta parcial 1	$0
Amortización Acta parcial 2	$0
Pendiente por amortizar	$0

1.1.1.2 GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**Aseguradora solidaria**	**326 47 994000006606**	29/07/2021	01/03/2022	$96,397,925.10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	**Aseguradora solidaria**	**326 47 994000006606**	29/07/2021	29/10/2024	48,198,962.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**Aseguradora solidaria**	**326 47 994000006606**	30/11/2021	5 AÑOS	96,397,925.10
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	**Aseguradora solidaria**	**326 74 994000002841**	29/07/2021	01/03/2022	181,705,200.00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

DESCRIPCION DEL OBJETO

La alcaldía de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, adelantó un proceso a través de la modalidad de Licitación Pública No. 012 de 2021, el cual se adjudicó el pasado 18 de Julio de 2021 al oferente INGENIERÍA, SOFTWARE Y COMPUTADORES S.A.S., representado legalmente por Jesús María García Cure y que tiene por objeto la "OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO" con un plazo de ejecución de tres (3) meses y un valor de ejecución equivalente a NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($963.979.251.oo).
Consecuente con ello y de manera simultánea, dio trámite a la contratación de la interventoría externa que tiene como objeto: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO", adjudicado el pasado 12 de agosto de 2021 al CONSORCIO INTER CIS, representado legalmente por el ingeniero MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO, y conformado por GENIALTIC S.A.S y ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, con un plazo de ejecución de tres (3) meses y un valor de ejecución equivalente a SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($67.485.843,00).

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.2 ALCANCE

En el cuadro anexo se muestran las especificaciones técnicas con los entregables del contrato.

OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.
1,00	**SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO**		
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADA. TROQUEL -VER ANEXO	UND	92,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DIMENSIONES 2.1M DE ALTO CON EXTRACTOR, PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA Y REGLETA -VER ANEXO	UND	2,00
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6 A incluye SOFTWARE ADMINISTRADOR CABLEADO - VER ANEXO TECNICO	UND	10,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU -VER ANEXO	UND	8,00
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A -VER ANEXO	ML	8.280,26
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 3M. WA -VER ANEXO	UND	150,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 2M. TR -VER ANEXO	UND	184,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA METALICA -VER ANEXO	ML	30,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CM / TUBO EMT 2" -VER ANEXO	UND	256,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1,10	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T- -VER ANEXO	UND	34,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS -VER ANEXO	ML	130,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS -VER ANEXO	ML	90,00
1,13	SUMINISTRO BACKBONE FIBRA ÓPTICA -VER ANEXO	UND	1,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 2" -VER ANEXO	UND	120,00

2,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNID**	**CANT.**
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE CON TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR, TOTALIZADOR DE I/O -VER ANEXO	UND	2,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 5X#8 -VER ANEXO	ML	12,00

3,00	**INSTALACIÓN DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD**	**UNID**	**CANT.**
3,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L3 24 PTS VER ANEXO TECNICO	UN	4,00
3,02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE ACCESS POINT-VER ANEXO TECNICO	UN	7,00
3,03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SWITCH L2 24 POE 1 GB -VER ANEXO TECNICO	UN	2,00

4,00	**INSTALACIÓN DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA**	**UNID**	**CANT.**
4,01	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR -VER ANEXO	UN	2,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

5,00	INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	UNID	CANT.
5,01	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA -VER ANEXO	UN	2,00
5,02	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,00
5,03	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,00
5,04	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,00

6,00	INSTALACIÓN DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL	UNID	CANT.
6,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA - VER ANEXO TECNICO	UN	1,00

7,00	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO	UNID	CANT.
7,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES - VER ANEXO TECNICO	UN	1,00

8,00	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO	UNID	CANT.
8,01	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE NVR32CH - VER ANEXO TECNICO	UN	2,00
8,02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO	UN	25,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

8,03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE CÁMARA IP BALA - VER ANEXO TECNICO	UN	18,00
8,04	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO	UN	3,00
8,05	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE PC AIO I5 3,6 GHZ - VER ANEXO TECNICO	UN	2,00

9,00	**ACABADOS**	**UNID**	**CANT.**
9,01	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	UN	30,80
9,02	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS A TRES MANOS	UN	115,50

10,00	**CARPINTERIA**	**UNID**	**CANT.**
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	250,36
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO	UN	14,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO DE LOS VIDRIOS DISEÑO MODERNO X 1,50 PLATEADA CON ADHESIVO	M2	80,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	60,00

11,00	**OBRAS VARIAS**	**UNID**	**CANT.**
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4"	ML	80,00
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2"	ML	35,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÚE AIRES	ML	50,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

11,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS	UND	12,00
11,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R ENCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	ML	410,00
11,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	140,00
11,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	115,00
11,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	112,00
11,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	165,00
11,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410	KG	30,00

SUMINISTROS

SUM 3	SUMINISTRO DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS DE REDES CON ALTA DISPONIBILIDAD	UNID	CANT.
SUM 3 -1,01	SUMINISTRO DE SWITCH L3 24 PTS VER ANEXO TECNICO	UN	4,00
SUM 3 -1,02	SUMINISTRO DE ACCESS POINT-VER ANEXO TECNICO	UN	7,00
SUM 3 -1,03	SUMINISTRO DE SWITCH L2 24 POE 1 GB -VER ANEXO TECNICO	UN	2,00

SUM 4 -1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA RESPALDO POTENCIA	UNID	CANT.
SUM 4 -1,01	SUMINISTRO DE UPS TRIFASICA 10 KVA TR -VER ANEXO	UN	2,00

SUM 5 -1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	UNID	CANT.
SUM 5 -1,01	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18.000 BTU OFICINA -VER ANEXO	UN	2,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

SUM 5 -1,02	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,00
SUM 5 -1,03	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,00
SUM 5 -1,04	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,00

SUM 6 -1,01	**SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRAL**	**UNID**	**CANT.**
SUM 6 -1,01	SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA- VER ANEXO TECNICO	UN	1,00

SUM 7 -1,01	**SUMINISTRO DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION POR AGENTE LIMPIO**	**UNID**	**CANT.**
SUM 7 -1,01	SUMINISTRO DE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES - VER ANEXO TECNICO	UN	1,00

SUM 8 -1,01	**SUMINISTRO DE SISTEMA DE CCTV - CONTROL DE ACCESO - SONIDO**	**UNID**	**CANT.**
SUM 8 -1,01	SUMINISTRO DE NVR32CH - VER ANEXO TECNICO	UN	2,00
SUM 8 -1,02	SUMINISTRO DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO	UN	25,00
SUM 8 -1,03	SUMINISTRO DE CÁMARA IP BALA - VER ANEXO TECNICO	UN	18,00
SUM 8 -1,04	SUMINISTRO DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO	UN	3,00
SUM 8 -1,05	SUMINISTRO DE PC AIO I5 3,2 GHZ - VER ANEXO TECNICO	UN	2,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Plano 1. Localización general del municipio de La Jagua de Ibirico, Centro Integran de Servicios del municipio de La Jagua de Ibirico.



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23



INFORME TECNICO


1.1.4 CRONOGRAMA

Se adjunta cuadro resumen de avance de obra y curva de avance del mismo.

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO	%
56,53%	53,58%	-2,94%

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

Curva de Avance (%Avance Vs Semana)

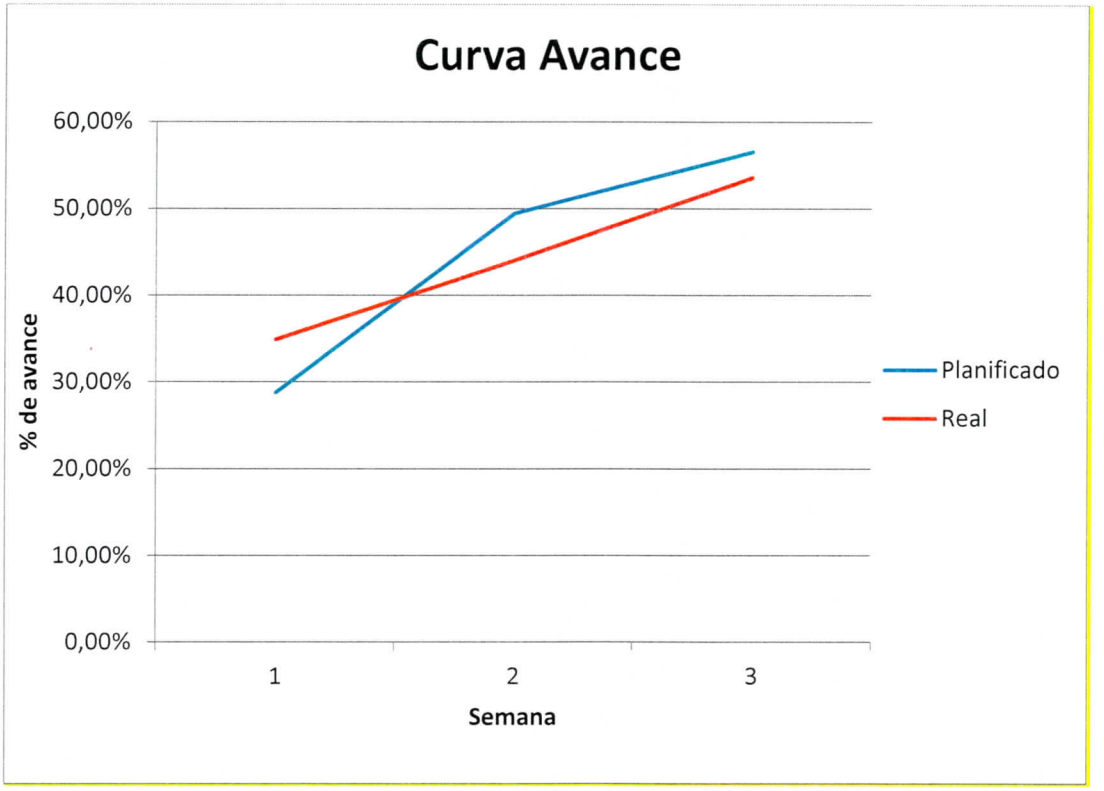

Cronograma de ejecución y avance de ejecución de presupuesto semanal.


EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS


Se desarrollaron las siguientes actividades de la programación:

- **ACTIVIDAD 2- ELÉCTRICAS**: se culminaron las sub actividades de: suministro e instalación doce (12) metros de acometida eléctrica 5x#8 y suministro e instalación de dos (2) cofres con transferencia manual tetra polar, totalizador de i/o

Registros fotográficos:

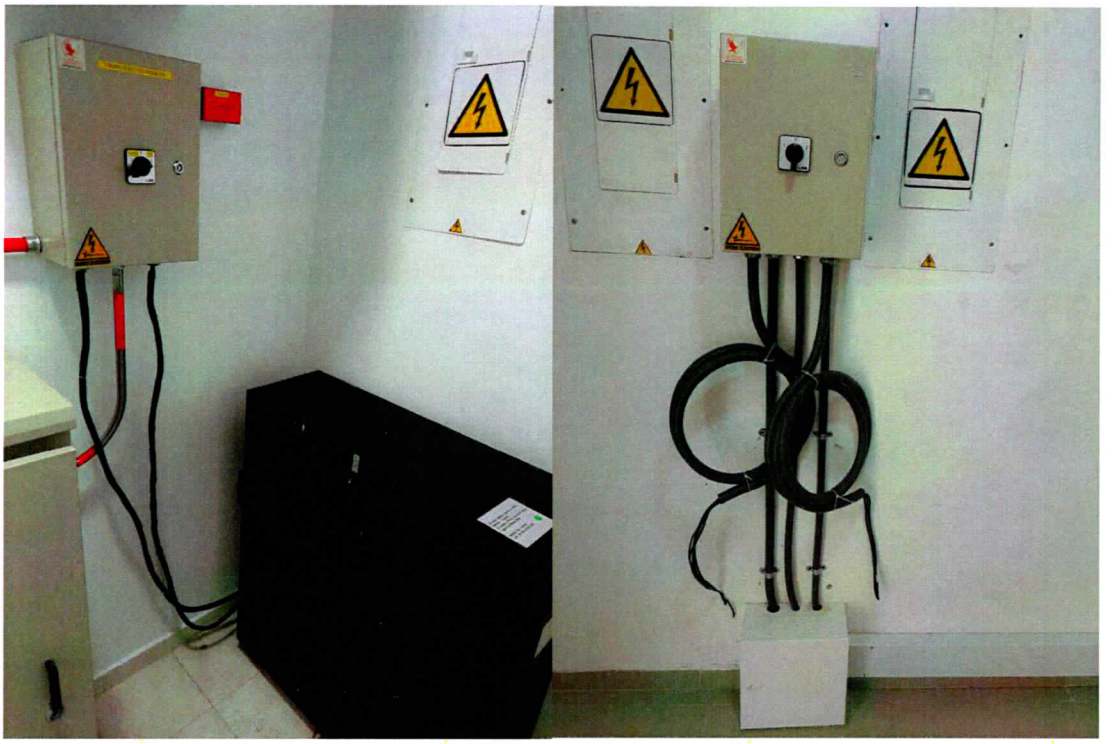

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

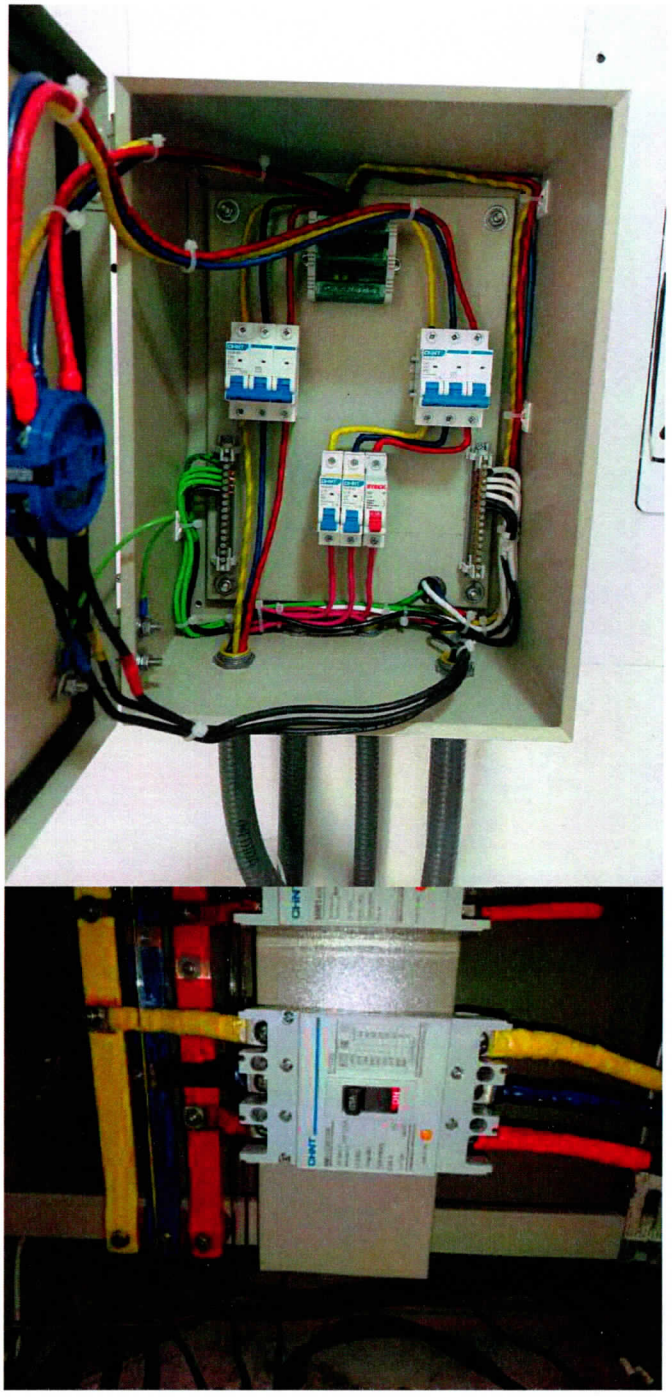

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

- **ACTIVIDAD 3- POTENCIA**: Se suministran dos (2) UPS TRIFASICAS DE 10 KVA y se realiza la instalación y puesta en marcha de una de ellas, la ubicada en la Secretará de Tránsito.

Registros fotográficos:







EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

- **ACTIVIDAD 4 – BACKBONE**: se suministra e instalan ciento veinte (120) metros tubería conduit EMT de 2" para conducción de F.O y se tiende FO, con sus respectivas terminaciones en conectores LC y bandejas de fibra óptica con sus respectivos acopladores LC-LC.

Registros fotográficos:

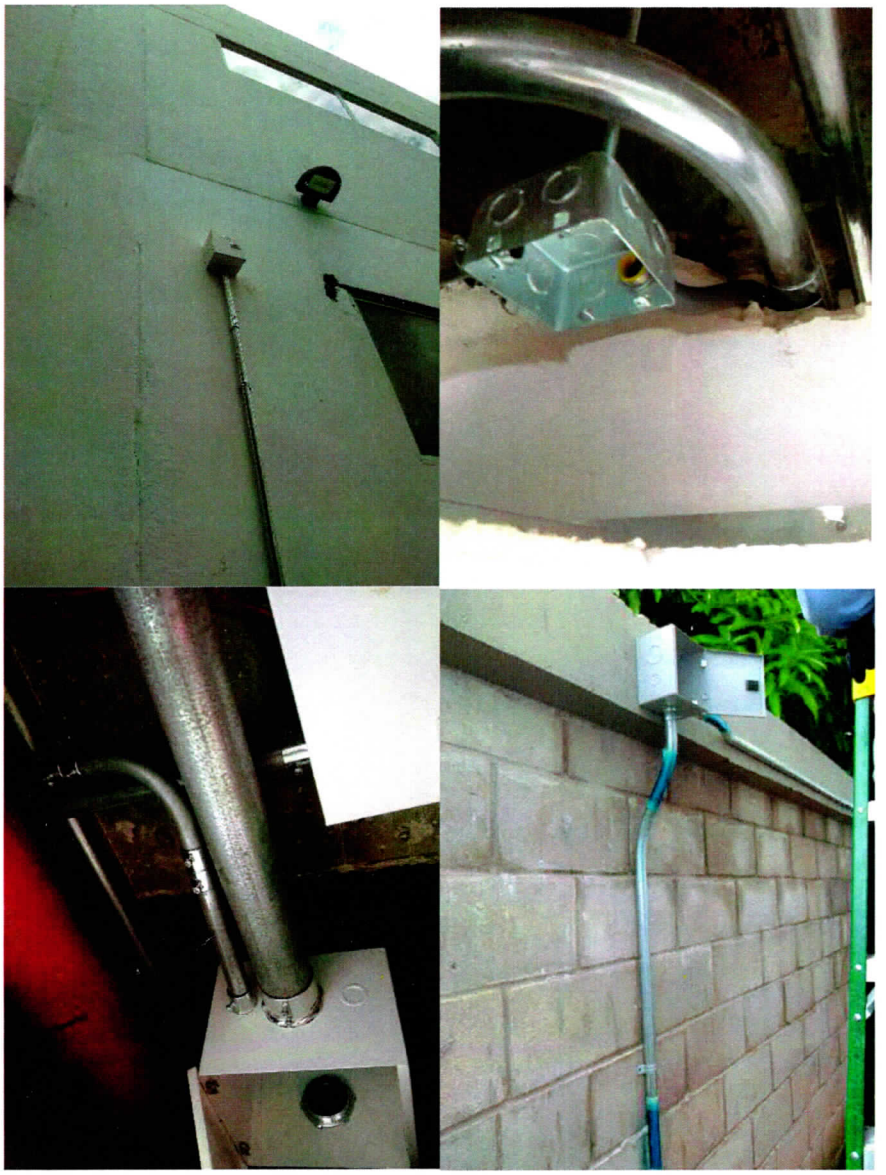

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

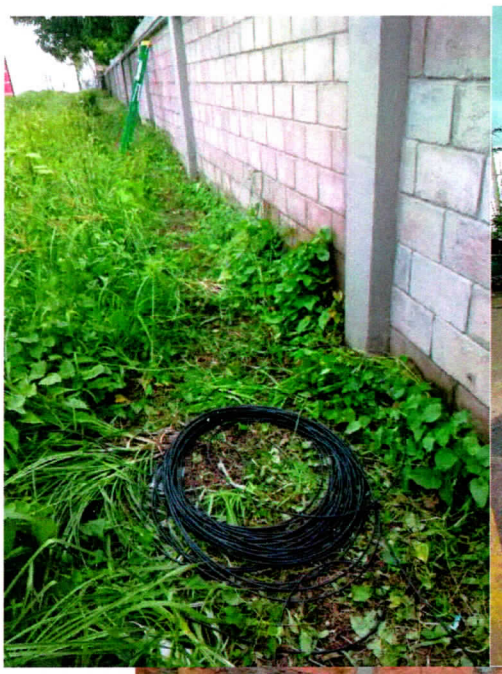






EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

- **ACTIVIDAD 5- CANALIZACIÖN:** se realizó en tu totalidad, se suministró e instaló : 30 metros de bandeja metálica, 256 metros de canaleta 12x5 cm , 130 metros de tubería conduit EMT de 3/4" con accesorios ,90 metros de tubería conduit EMT de 1" y 2", gabinetes de piso para administración de cableado estructurado dimensiones 2.1 metros de alto con extractor, puerta de vidrio y cerradura y regleta

Registros fotográficos:

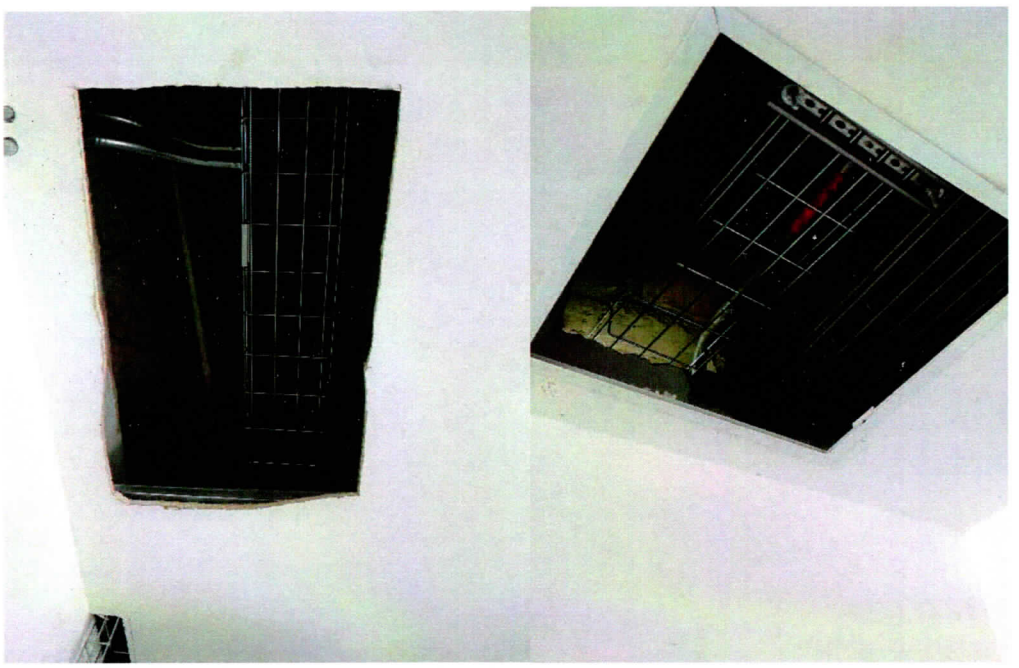


EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23






EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

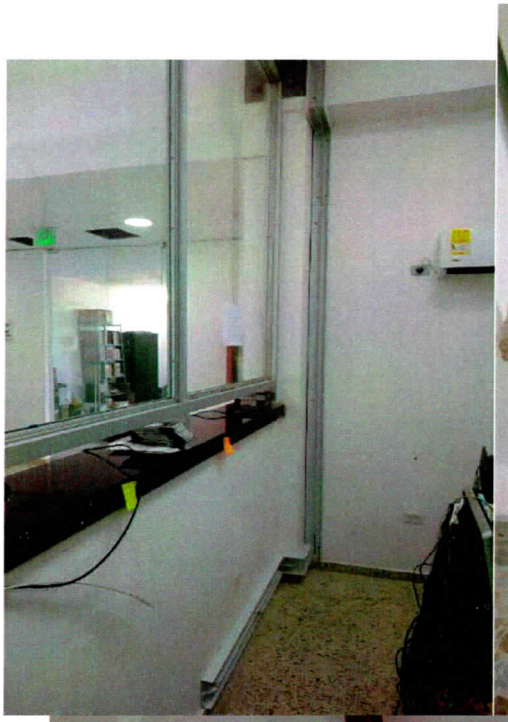





EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

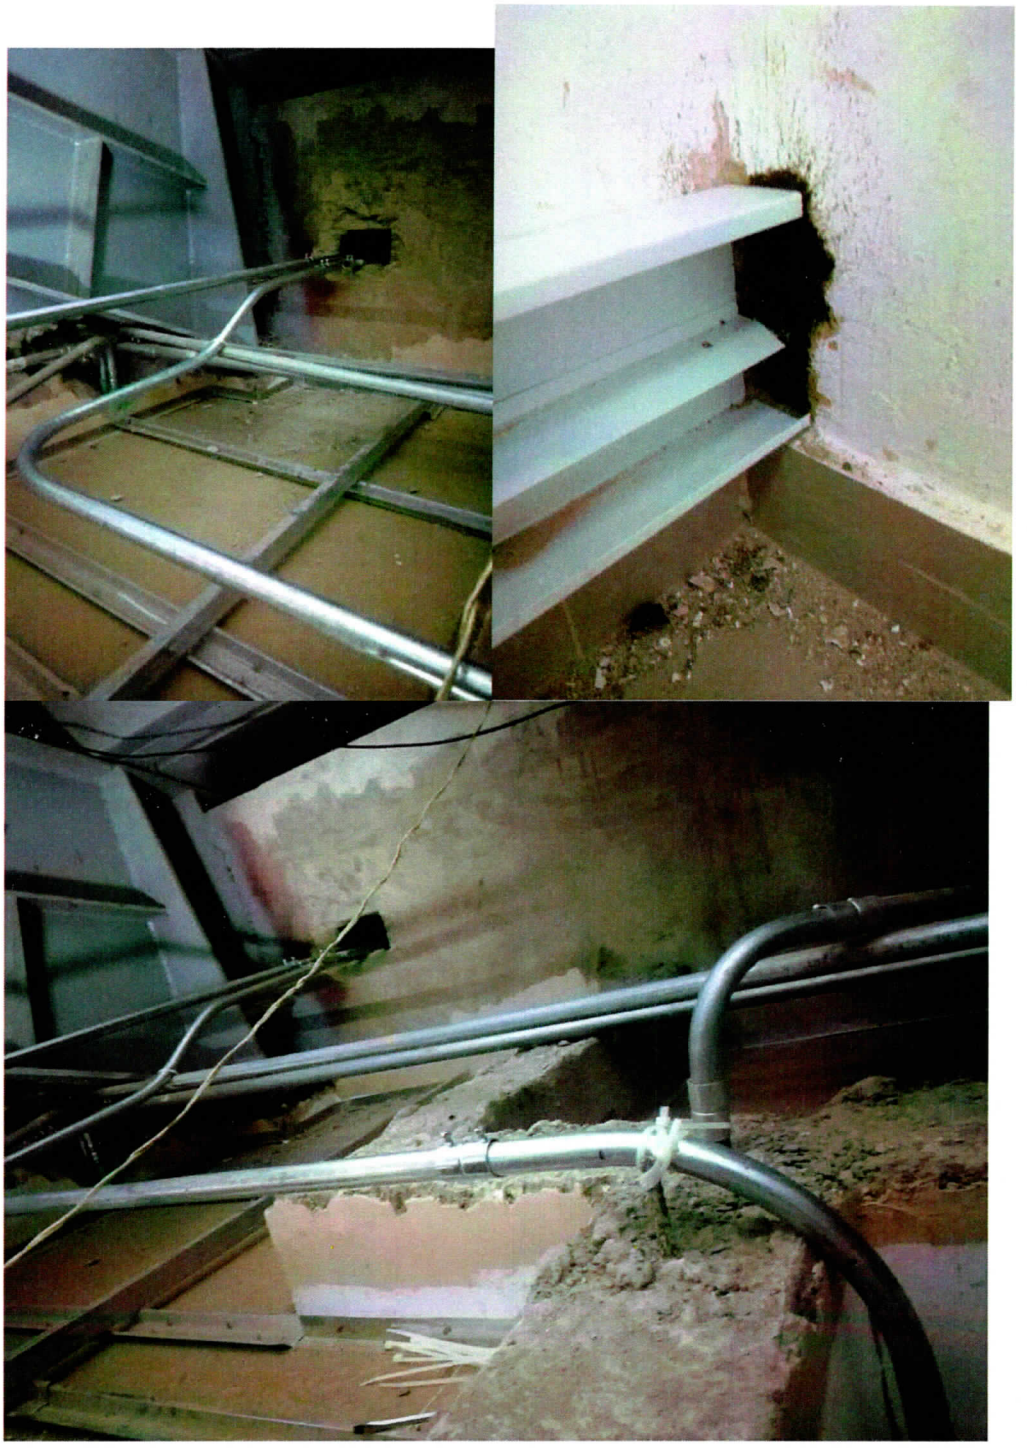

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23





EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23





EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23





- **ACTIVIDAD 6- AIRES ACONDICIONADOS:** se realizaron todas las sub actividades de aires acondicionados, excepto el suministro e instalación de un aire de 18.000BTU. En el siguiente cuadro se detalla el avance de esta actividad:


SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4"	ML	80,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2"	ML	35,00

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÚE AIRES	ML	50,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS	UND	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R ENCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	ML	410,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	140,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	115,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	112,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	165,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410	KG	30,00
SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA -VER ANEXO	UN	1,00
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA -VER ANEXO	UN	1,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	5,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	3,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,00
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER	UN	4,00

Registros fotográficos:

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

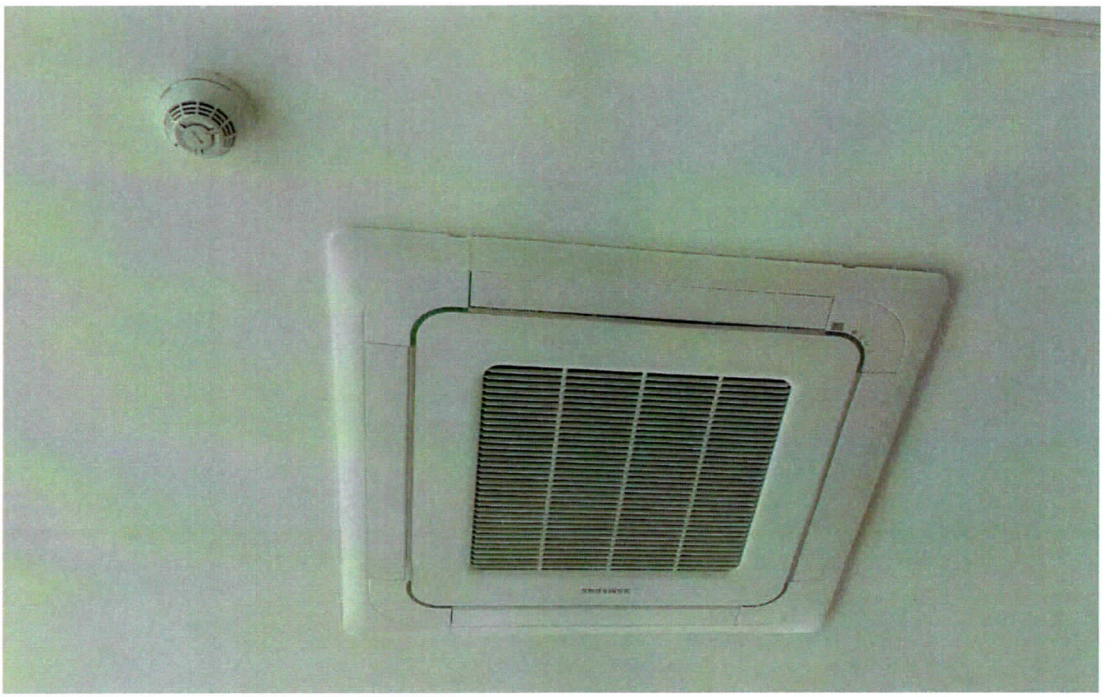



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

- **ACIVIDAD 7- CARPINTERIA:** se desarrollaron todas las sub actividades incluidas en este Ítem, se observa que la instalación de las divisiones en aluminio y vidrio se realizaron en las oficinas de Secretaría de Tránsito piso 2, CORRESPONDIENTE A 162 M2, instaladas 10 puertas. En las oficinas del piso 1 (SERTTI). El ítem presenta un retraso de 7 días.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	162
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO	UN	10,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO DE LOS VIDRIOS DISEÑO MODERNO X 1,50 PLATEADA CON ADHESIVO	M2	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ML	

Registros fotográficos:



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23






EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23


- **ACTIVIDAD 9- DETECCIÓN DE INCENDIOS**: se desarrolló en su totalidad (1) suministro de sistema detección incendios en la sede de sec. tránsito y terminal de transportes. Por otra parte la instalación y configuración de sistema detección lleva un avance de 80%.


Registros fotográficos:

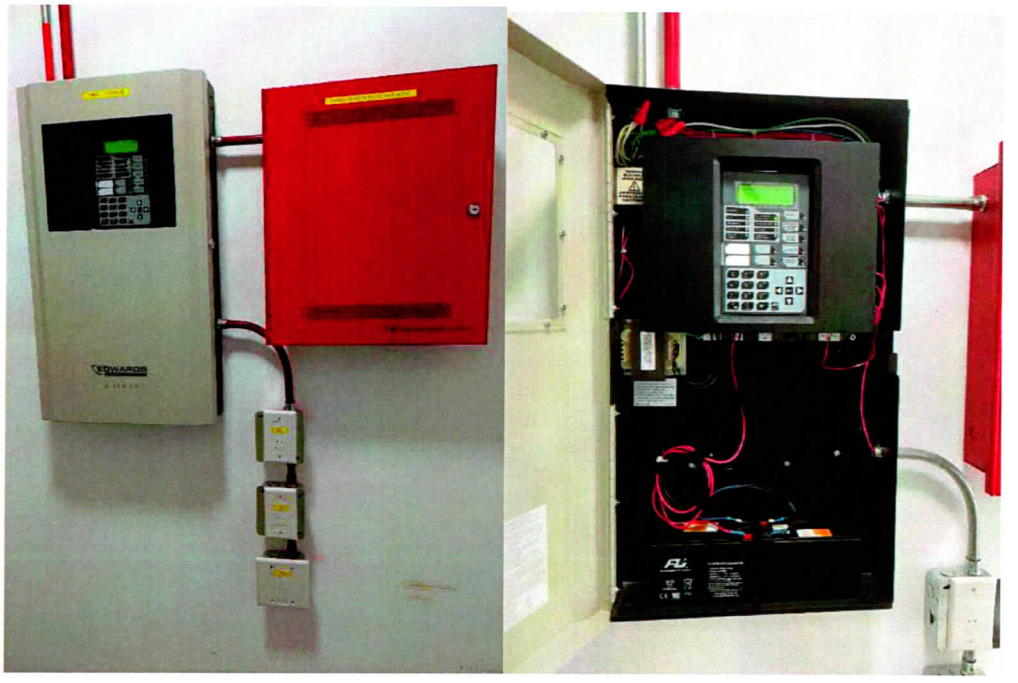




EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

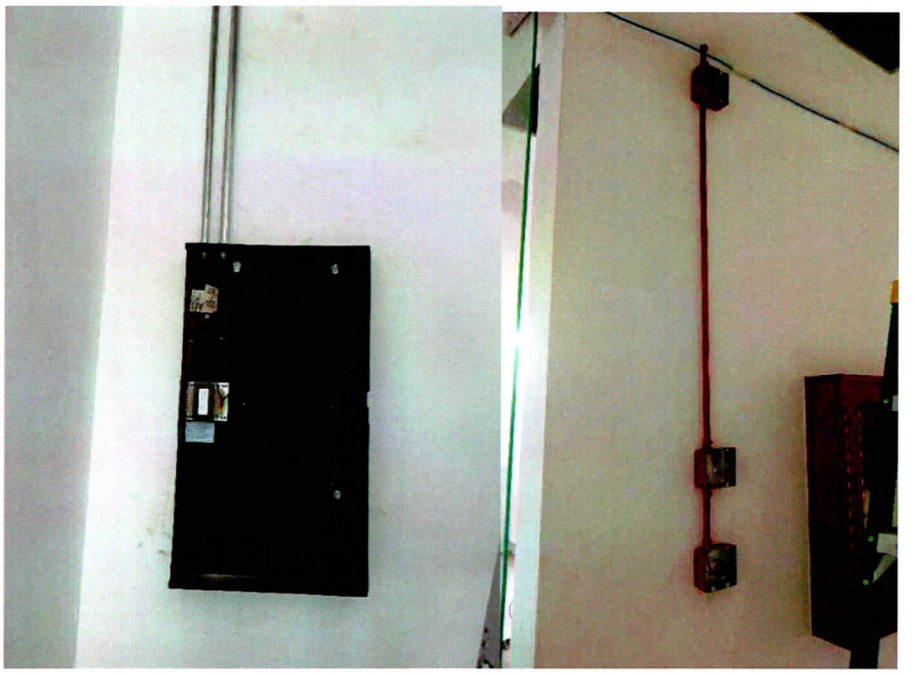

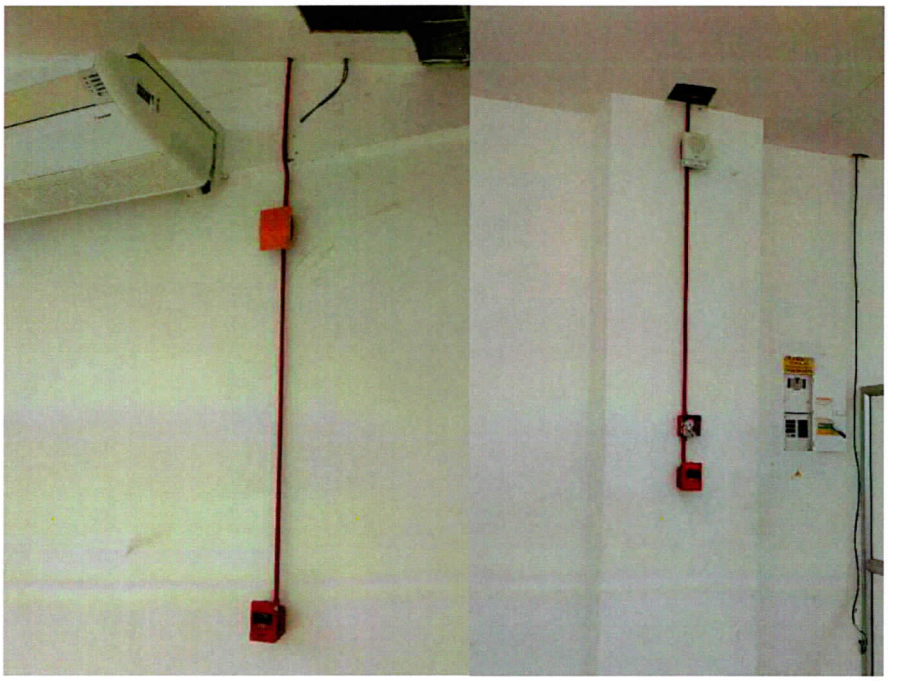



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

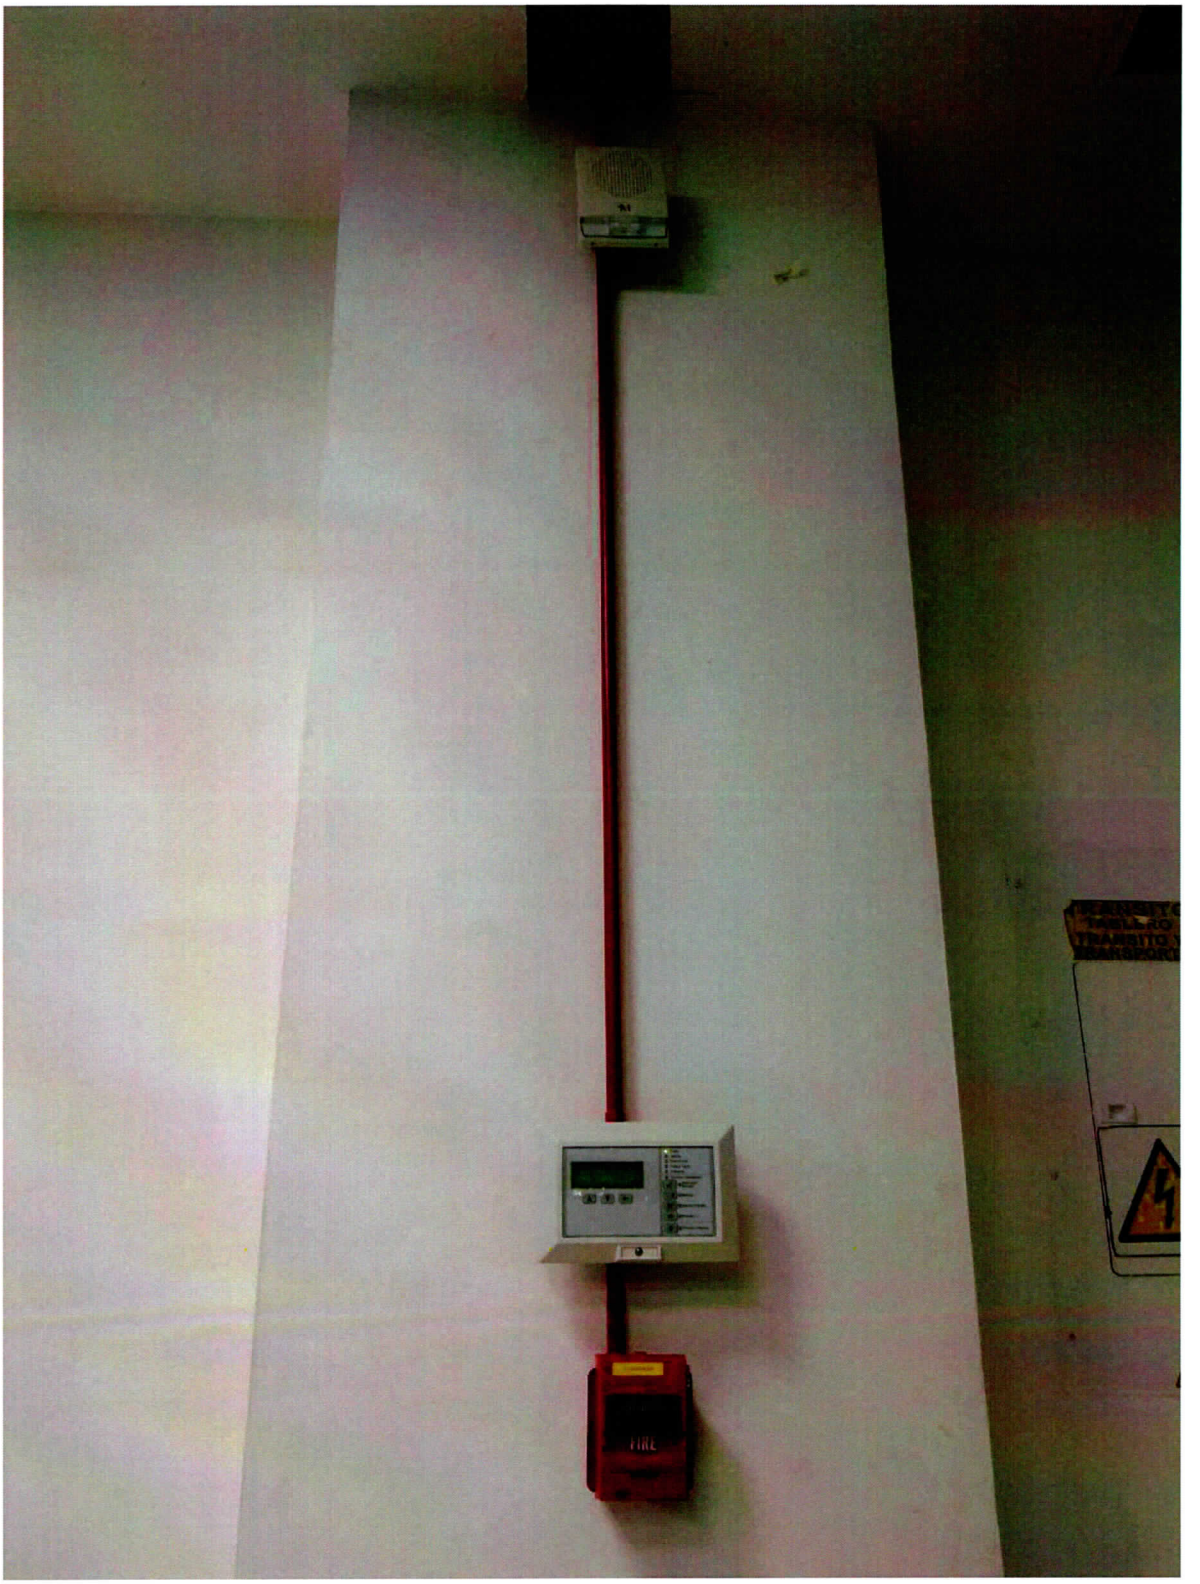
FIRE


- **ACTIVIDAD 10-TENDIDO DE CABLE: se efectuó en su totalidad el sub ítem de** SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T, el sub ítem SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A tiene un avance de 15.94%

Registros fotográficos:

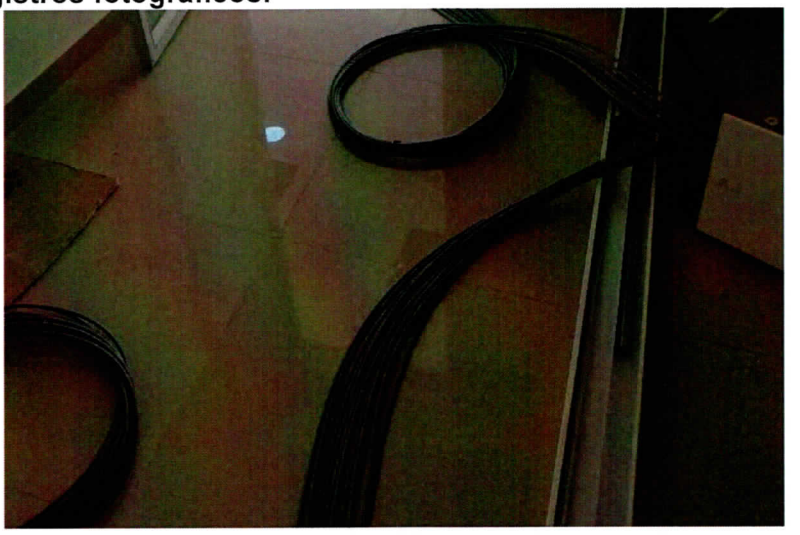

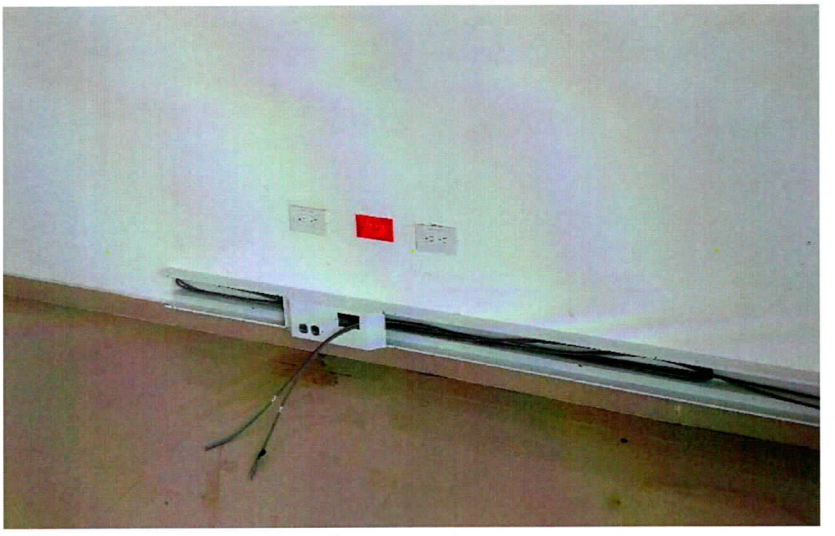

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

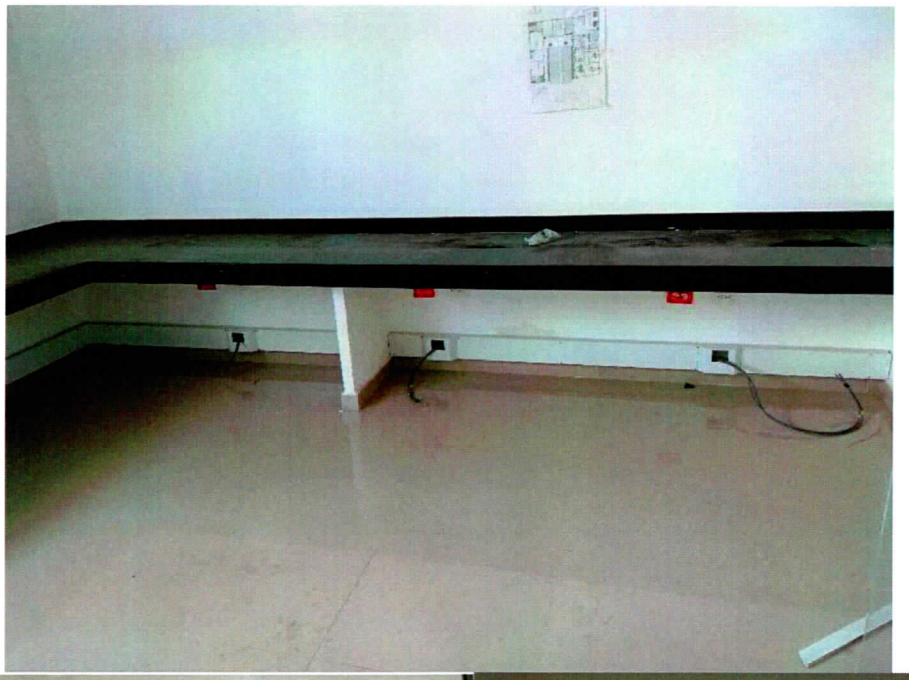






EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

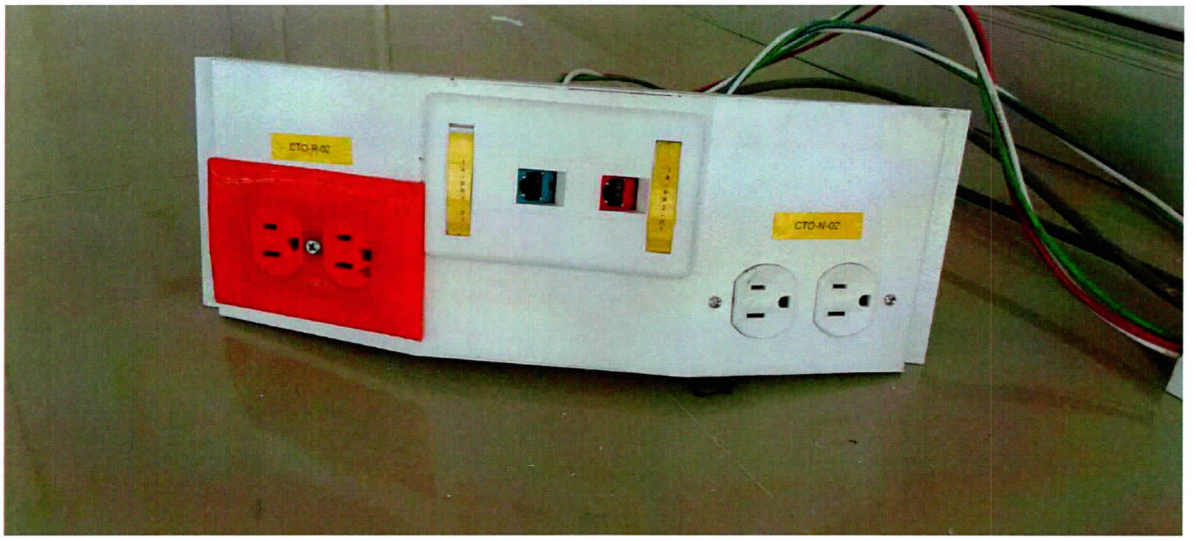



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.2.3 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (N/A)

1.2.4 **TOPOGRAFIA (N/A)**

1.2.5 **CLIMATOLOGIA (N/A)**

1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

ACTUALIZACION DE DATOS CONTRATISTA

Dirección oficina central	**Calle 13C No. 18-100**
Correo electrónico oficial	**gerencia@iscltda.com.co**
Teléfonos	**3126606052**

ACTUALIZACION DE DATOS INTERVENTORIA

Dirección oficina central	**Diag 20 D # 4 F - 65**
Correo electrónico oficial	**genialtic@gmail.com**
Teléfonos	**3185217217**

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	2ª Quincena		
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		
El contratista ha entregado a la interventoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.			
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.			
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.			
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de	X		

compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.			

1.3.1 LABORAL

- Se anexa impreso el formato de generación de empleo (Formato F-GISP-014).

1.3.1.1 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL (conforme al contrato)

No se adjunta debido a que aún no ha transcurrido el periodo de pago (1 mes)

RELACION DE LIQUIDACIONES DE ACUERDO CON EL PERSONAL LIQUIDADO.

(N/A) aún se está en elección

1.3.1.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (conforme a la ley laboral)

RELACION DE EPP ENTREGADOS, DE ACUERDO AL CUADRO DE PERSONAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)

SEÑALIZACION
CONFORMACION DE BRIGADAS.
RELACION DE ELEMENTOS EN OBRA:

No.	ELEMENTO	TIPO	UBICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION
S	EXTINGUIDOR	abc	almacén	mar 2022	Mar 2021
S	RUTA DE EVACUACION	La existente en sitio			
	CARTELERA INFORMATIVA	Protocolo bioseguridad			
	BRIGADAS TELEFONOS	3013785803	LIDER Cezly Pacheco		

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

	PORTA CARNETS	Si	Hombro		
	Otros (anexar casillas)				

(CUADRO EJEMPLO)

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa	SI			
Buen estado	NUEVO			
Uso según zona de trabajo	SI			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa	SI			
Buen estado	SI			
Fácil acceso y operación	SI			
Uso según zona de trabajo	SI			
Existencia de elementos primeroa auxilios	SI			
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	SI			
Regularidad del mantenimiento	SI			
Vibraciones /Ruidos	NO			
Protecciones / Guardas / Frenos	SI			
Idoneidad operarios	SI			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN				
Uso permanente	SI			
Uso según zona de trabajo	SI			
VIGILANCIA				
Personal suficiente	SI			
Diurna	SI			
Nocturna	NO			
CENTRO DE ATENCION INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia	NOI			
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	SI			

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total de HHTT Mes:	148	Total HHTT acumuladas:	148

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO)			

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.1.1 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental)

No requirió de Licencias Ambientales.

Si no requiere, diligenciar fichas ambientales sobre: suelo, agua, aire, gestión social, manejo de maquinaria y equipo, escombros, actividades silviculturales, campamento, almacenamiento de materiales y combustibles, de acuerdo a lo que aplique según el proyecto, con registro mensual del mismo:

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	1	Capacitación Personal			X				
	2	Demarcación del perímetro			X				
	3	Zonificación de la obra			X				
	4	Lona de Cerramiento			X				
	5	Cinta de Reflectiva			X				
	6	Señales Informativas y preventivas			X				
	7	Uso de Paleteros			X				
	8	Iluminación Nocturna			X				
Calificación:		Buena: 8 - 10 Aceptable: 5 – 7		Deficiente: 0 – 4			PROMEDIO		
							VALOR FINAL		
						NUMERO		FECHA	
No. REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD									

- Anexo: informe ambiental y/o Plan de manejo ambiental

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación Personal	X			10			
	2	Dotación de elementos de protección personal	X			10			
	3	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X			10			
	4	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X				0	
	5	Programa de información a la comunidad			X				
	6	Socializaciones			X				
Calificación:		Buena: 8 - 10 Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4			PROMEDIO		7.5
							VALOR FINAL		7.5

- Anexo informe de gestión social

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	No.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del Personal	X			10			10
	2	Mantenimiento Preventivo	X			10			10
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			10			10
	4	Ficha de control de actividades	X			10			10
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados			X				
	6	Elementos de protección personal	X			10			10
	7	Extintores	X			10			10
	8	Medidas de Contingencia	X				6		6
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		9.4
							VALOR FINAL		9.4

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	No.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	1	Capacitación del Personal			X				
	2	Mantenimiento Preventivo			X				
	3	Definición de Horarios de trabajo			X				
	4	Ficha de control de actividades			X				
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados			X				
	6	Elementos de protección personal			X				
	7	Extintores			X				
	8	Medidas de Contingencia			X				
	9	Volumen de material (m3)							
	10	Volumen de excavación (m3)							
	11	Volumen de demolición (m3)							
	12	Volumen de tierra (m3)							
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		
							VALOR FINAL		

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	No.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
	1	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X			8			8
	2	Almacenamiento adecuado de combustibles			X				

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

CUIDADOS AMBIENTALES	3	Localización y señalización en el Campamento							
	4	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X			10			10
	5	Obras de contención			X				
	6	Capacitación del Personal	X			10			10
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 – 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		9.3
							VALOR FINAL		9.3

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	1	Capacitación Personal			X				
	2	Dotación de elementos de protección personal			X				
	3	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional			X				
	4	Espacio para peticiones, quejas y reclamos			X				
	5	Programa de información a la comunidad			X				
	6	Socializaciones			X				
	7	árboles talados							
	8	arboles podados							
	9	arboles bloqueados							
	10	arboles sembrados							
Calificación:		Buena: 5 -6	Aceptable: 4-5		Deficiente: 0 - - 3		PROMEDIO		
							VALOR FINAL		

SUELO

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	1	Capacitación Personal			X				
	2	Separación y clasificación			X				
	3	Disposición Final			X				
	4	Programación de retiro			X				
	5	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas			X				
	6	Limpieza interna y externa de la obra			X				
	7	Almacenamiento de materiales y combustibles			X				
	8	Campamento			X				
	9	Manejo de Vegetacion			X				
	10	Estabilidad de Taludes			X				

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7	Deficiente: 0 - 4	PROMEDIO
					VALOR FINAL

AIRE

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	1	Capacitación Personal	X			10			10
	2	Humedecimiento de áreas de trabajo			X				
	3	Cubrimiento de acopios de materiales			X				
	4	Uso de mallas protectoras			X				
	5	Volquetas carpadas			X				
	6	No exceder volúmenes del volco de los camiones			X				
	7	Olores desagradables			X				
	8	Aseo Interno y externo de la obra	X			8			8
	9	Uso de equipos en buen estado	X			10			10
	10	Apantallamiento sonoro del área			X				
	11	Planificación de horarios de trabajo			X				
	12	Medidas de Contingencia			X				
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		9.3
							VALOR FINAL		9.3

AGUA

COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE VERTIMIENTOS	1	Capacitación Personal			X				
	2	Manejo Escorrentía			X				
	3	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.			X				
	4	Medidas de contingencia			X				
	5	Zonas de trabajo secas			X				
	6	Manejo nivel freático			X				
	7	Separación y clasificación de vertimientos			X				
	8	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			X				
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		
							VALOR FINAL		

	NUMERO	FECHA
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS		
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.1 ADMINISTRACION

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

1.1.1.1 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO(QUE SE UTILIZO EN LA OBRA)

DÍA / MÁQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TALADRO PERCUTOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
TALADRO PERCUTOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
TALADRO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
TALADRO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
PULIDORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
PULIDORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							

A: ACTIVO
R: REPARACION
I: INACTIVO

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.1.1.2 OFICINA DEL CONTRATO RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

FECHA: 26 | 10 | 21

CONTROL DIARIO DÉL PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

MES _____ CONTRATO: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA:

DÍA _____ NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JESÚS GARCÍA CURE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
[illegible]LY PACHECO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

1.3.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

2 RELACION DE ACTAS			
	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	ACTA DE INICIO	14/09/2021	
2	COMITÉ TÉCNICO	14/09/2021	

2.3.1.2 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES (copias)

2.3.1.3 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO (enviada y recibida)

2.3.1.4 COPIA DE LA BITACORA *(Con el informe final se debe entregar la bitácora original, la cual deberá estar firmada por el residente de obra y de interventoría diariamente)*

2.4 INFORME FINANCIERO

2.4.1 MANEJO DEL ANTICIPO (N/A)

2.4.2 PAGOS REALIZADOS (N/A)

3 Cuadro lo Programado VS Ejecutado en porcentaje %

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO	%
56,53%	53,58%	-2,94%

3.3.1 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO	ADELANTO / ATRASO
544.930.439	**516.542.288**	**(28.388.151)**

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

3.3.2 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO (N/A)

ACTA No.	% EJECUCION	EGRESO No.	FECHA	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FUENTE
TOTALES							

3.4 INFORME LEGAL

3.4.1 DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

3.4.2

El contratista avanza en la ejecución del contrato, acorde a lo establecido en la programación, presentó actualización de pólizas y pagos salariales y seguridad social (conforme al contrato)

Se anexa informe de Avance de Obra del Contratista.

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

El presente informe se encuentra actualizado según la programación de obra presentado por el contratista, existe un atraso en la obra del 2.94% . el atraso se presenta en la ACTIVIDAD 7- CARPINTERIA, no obstante presentarse el atraso, este no es significativo debido a que esta actividad no pertenece a la ruta crítica, y presenta una holgura de 25 días.

Se muestra avance de actividades:
ACTIVIDAD 2- ELÉCTRICAS 100%
ACTIVIDAD 3- POTENCIA 100%
ACTIVIDAD 4 – BACKBONE 100%
ACTIVIDAD 5- CANALIZACIÖN 100%
ACTIVIDAD 6- AIRES ACONDICIONADOS 99%
ACIVIDAD 7- CARPINTERIA 64.71%

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

ACTIVIDAD 9- DETECCIÓN DE INCENDIOS 100$
ACTIVIDAD 10-TENDIDO DE CABLE 15.94%

Aprobación del Informe:

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
Residente y/o Director de la Interventoría

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
Representante Legal de la Interventoría

Proyectó: ANA ISABEL LOPEZ RUBIO
Secretaria de Interventoría

Revisó: MIGUEL ANGEL CASTILLA CALVO
Residente de Interventoría

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23
