CONSORCIO INTER CIS

NIT. 901514642-3

INFORME DE INTERVENTORÍA-ACTA NUMERO N° 001

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

La Jagua de Ibírico, 07 de octubre de 2021.

Doctor
OSMAN RAFAEL MARTINEZ MURCIA
Secretario de Tránsito y transporte Municipal
Alcaldía la Jagua de Ibirico.

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA


Esta interventoría aprueba un avance acumulado de la obra del **56,53%,** del proyecto **OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR,** a la fecha de la presente certificación en actividades SUMINISTRO E INSTALACION D COFRE CON TRANSFERENCIA MANUAL TETRAPOLAR, TOTALIZADOR DE I/O, SUMINISTRO E INSTALACION D ACOMETIDA ELÉCTRICA 5X#8, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS TRIFASICA 10 KVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 1" INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CM / TUBO EMT 2, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO PARA ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DIMENSIONES 2.1M DE ALTO CON EXTRACTOR, PUERTA DE VIDRIO Y CERRADURA Y REGLETA, SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PARA ENERGÍA REGULADA TIPO LEVINTON EN ALAMBRE DE COBRE EN 2NO 10 + 1NO 12T, SUMINISTRO BACKBONE FIBRA ÓPTICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EMT DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGÚE AIRES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A 220 PARA AIRE ACONDICIONADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4X14 AWG THHN/THWN-2 TC USE/R ENCAUCHETADOS PARA CONTROL Y MANDO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 1/2 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 3/4 MAS RUBATEX PARA AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE AISLADA DE 5/8 PARA AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFIFRERANTE R410, SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER MINISPLIT 18000 BTU OFICINA, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU,

COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER, INSTALACION DE **AIRES ACONDICIONADO** TIPO CASETTE DE 36.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 24.000 BTU, COLOR: BLANCO, GARANTÍA: 1 AÑO, GAS REFRIGERANTE R410, TECNOLOGÍA DE ENFRIAMIENTO: INVERTER, SUMINISTRO DE SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO.

A continuación se anexa cuadro de porcentaje programado y ejecutado para la obra en ejecución.


COMPARACIÓNDE COSTOS ACUMULADOS EN % INCLUYE AIU E IVA				
periodo en ejecución	**programado financiero**	**% programado**	**ejecutado financiero**	**% ejecutado**
sep 14 a sep 21	277425461,5	28,78%	336.557.935,87	34,91%
sep 22 a sep 28	476458501,5	49,43%	424.268.624,77	44,01%
sep 29 a oct 6	544.930.439,10	56,53%	516.542.288,27	53,58%

PORCENTAJE PROGRAMADO VS PORCENTAJE EJECUTADO

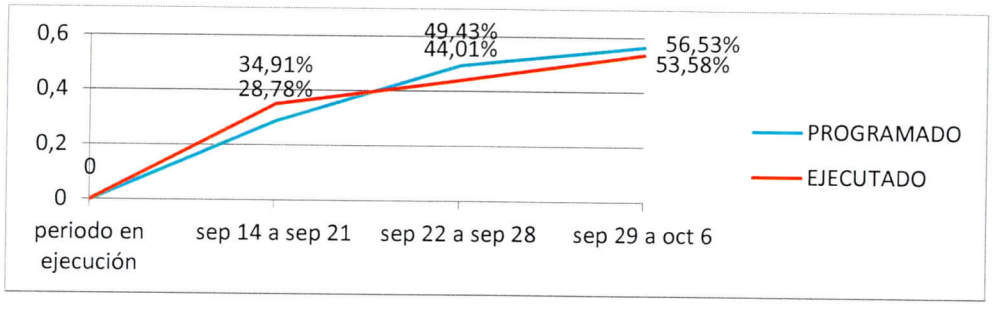

Gráficamente se observa el avance de ejecución que ha tenido la obra en el tiempo transcurrido a la fecha.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ACTA No. 001

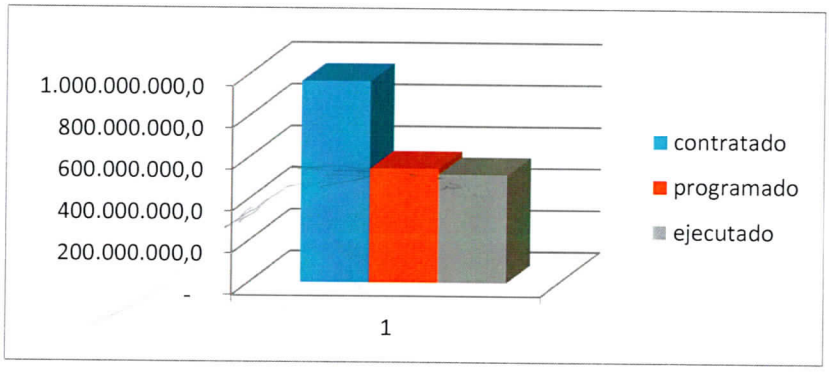

Dado en La Jagua de Ibirico, a los 7 día del mes de octubre de 2021.

Para efectos del cobro del Acta de Avance parcial 001, el contratista emite dos (2) facturas; Una correspondiente a Obra por valor de 204.192.249 Pesos y otra correspondiente a Suministro por valor de 312.350.040 Pesos.

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
Interventor
Representante legal CONSORCO INTER CIS
