	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	5/10/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	17/09/2021	**AL:**	1/10/2021
CONTRATO Nº	047-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021	**CONTRATISTA**	INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
OBJETO	MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4				
FECHA DE INICIO	17/09/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	19/11/2021		
VALOR INICIAL	$ 999.949.501,89	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**		**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	**VALOR TOTAL** $ 999.949.501,89

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se inician labores constructivas el dia 17/09/2021 con el frente de Gimnasio, posteriormente se abren los frentes Casa 36, baños escuela y Antiguo colegio.

En analisis inicial de las condiciones iniciales del contrato, en cuanto a cantidades de obra, surge la necesidad de realizar balance de obra, el cual se ha venido realizando y la interventoria a realizado acompañamiento constante, sin embargo, se esta a la espera de solicitud, acta de balance de cantidades, informe de balance, reprogramacion de obra y pland e contingencia; aclarando que la interventoria en multiples ocaciones ha realizado esta solicitud tanto via correo electronico por oficio, como personalmente en obra.

El contratista de obra no ha solicitado proceso para desembolso de anticipo.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
Concretos	N/A	Polisombra	167 m	Herramienta menc	Gbl	Residente de Obra	1	**100**	**100**	SI	
Electica	N/A	Arena	3 viajes	Taladro Percutor	1	Inspector sisoma	1	**100**	**100**	SI	
Hidraulica	N/A	Mixto	1 viajes			Inspector tecnico de obra	2	**100**	**100**	SI	
		Cemento	40 bultos			Asesor electricista	1	**20**	**14**	SI	**Consultas virtuales y documentales en verificacion del estado actual del proyecto, y proyeccion de balance de cantidades.**
		Tuberia	3 tubos 4" 3 tubos 2"			Asesor hidrosanitario	1	**20**	**13**	SI	**Consultas virtuales y documentales en verificacion del estado actual del proyecto, y proyeccion de balance de cantidades.**
		Accesorios	Gbl			Maestro	3	**100**	**100**	SI	
		Maderra	Gbl			Oficial	3	**100**	**100**	SI	
		Alambre	Gbl			Ayudantes	15	**100**	**100**	SI	
						TOTAL	27				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	0,97%	**2,41%**	**12,22%**	**-9,81%**
Semana 2	1,44%			
Semana 3				
Semana 4				
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA










AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**12,22%**
EJECUTADO		**2,41%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. HANGAR ABASTECIMIENTO	PROGRAMADO		**22,50%**
	EJECUTADO		**0,00%**
2.HANGARES CLAMSHELL	PROGRAMADO		**2,04%**
	EJECUTADO		**0,00%**
3. EHFAA	PROGRAMADO		**5,92%**
	EJECUTADO		**9,59%**
4. HANGAR 2	PROGRAMADO		**55,14%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. POLVORINES	PROGRAMADO		**34,34%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6. RED ELÉCTRICA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
8. GIMNASIO	PROGRAMADO		**3,55%**
	EJECUTADO		**7,59%**
9. ALOJAMIENTO SOLDADOS	PROGRAMADO		**14,01%**
	EJECUTADO		**0,00%**
10. CFS N°3	PROGRAMADO		**9,87%**
	EJECUTADO		**10,22%**
11. BARRACA 6	PROGRAMADO		**3,15%**
	EJECUTADO		**0,11%**
12. ANTIGUO COLEGIO	PROGRAMADO		**13,04%**
	EJECUTADO		**0,91%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	64	15	49
Proyección	70	15	55

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
15	-7	26/11/2021

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

EHFAA "Baños Escuela"
•Escarificación y picado de superficie.☐
•Se da inicio al desmponte de aparatos sanitarios del segundo piso.
•Se Finaliza regata de tubería en baños 2do y 1er piso.☐
•Se Finaliza pañete en paredes.☐
•Se finaliza el picado de toda la pintura en parte superior.

GIMNASIO
•Se realiza excavación manual en parte externa para tubería sanitaria.
•Se realiza excavación parte interna del los baños para tubería.
•Se realiza el desmonte de puertas en baños.☐
•Se realiza excavación para caja de inspección.☐
•Se realiza el desmonte de mesón en concreto en baños.
•Se finaliza el picado de toda la pintura en parte superior.
•Se realiza el retiro de escombros.

CFS N°3 (Casa 36)
•Se realiza excavación manual en parte interna de la casa.
•Se realiza el desmonte de ventanas en vidrio con marco en aluminio.
•Se realiza el desmonte de ventanas con marco en aluminio habitaciones.
•Se realiza filos de puertas habitaciones.☐
•Se Finaliza excavación manual en parte interna para tubería sanitaria.
•Se realiza excavacín en parte externa para caja de inspección.

ANTIGUO COLEGIO
•Demolición de cocinas.☐

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
1. HANGAR ABASTECIMIENTO: PRELIMINARES - ESTRUCTURA	SI	X	NO	
2.HANGARES CLAMSHELL: ESTRUCTURA	SI	X	NO	
3. HANGAR 2: PRELIMINARES – ESTRUCTURA - INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	X	NO	
4. POLVORINES: INSTALACIONES ELECTRICAS – PINTURA - ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES – CARPINTERIA – METALICA - CUBIERTAS	SI	X	NO	
5. GIMNASIO: CIMENTACIÓN	SI		NO	X
6. ALOJAMIENTO SOLDADOS: DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO - DESMONTE DE ESPEJOS - DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. - DESMONTE DE CIELORRASO - MAMPOSTERIA - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	SI	X	NO	
7. ANTIGUO COLEGIO: MAMPOSTERIA	SI	X	NO	

OBSERVACIONES:

1. HANGAR ABASTECIMIENTO: Es atribuibre el retraso por parte del contratista de obra en este Frente, toda vez que a pesar de las multiples solicitudes de ampliar personal, y frentes en simultaneo, la obra hace caso omiso.

2. HANGARES CLAMSHELL: Es atribuibre el retraso por parte del contratista de obra en este Frente, toda vez que a pesar de las multiples solicitudes de ampliar personal, y frentes en simultaneo, la obra hace caso omiso.

3. EHFAA: El contratista de obra no conto con material en campo.

4. HANGAR 2: Es atribuibre el retraso por parte del contratista de obra en este Frente, toda vez que a pesar de las multiples solicitudes de ampliar personal, y frentes en simultaneo, la obra hace caso omiso.

5. POLVORINES: Es atribuibre el retraso por parte del contratista de obra en este Frente, toda vez que a pesar de las multiples solicitudes de ampliar personal, y frentes en simultaneo, la obra hace caso omiso.

6. GIMNASIO: No es atribuible al contratista de obra, toda vez que a la fecha no se contaba con un diseño y una especificacion clara acerca de la cimentacion para este frente.

7. ALOJAMIENTO SOLDADOS: Es atribuibre el retraso por parte del contratista de obra en este Frente, toda vez que a pesar de las multiples solicitudes de ampliar personal, y frentes en simultaneo, la obra hace caso omiso.

8. ANTIGUO COLEGIO: El contratista de obra no conto con material en campo.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 999.949.501,89	$ 999.949.501,89	$ 24.098.783,00	2,41%	$ 975.850.718,89	98%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 999.949.501,89	$ 999.949.501,89				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 999.949.501,89	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 999.949.501,89	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En verificacion de cantidades contractuales y cantidades en campo hay diferencias, por lo que se hace necesario proyectar acta de balance de cantidades de obra, el cual se ha venido solicitando al contratista de obra, sin obtener respuesta alguna; estas solicitudes se han realizado mediante oficios, comites y personalmente a residente y directora de obra.

En relacion a los sistemas de seguridad, se ha solicitado al contratista en multiples ocaciones a traves de oficios y de manera verbal, la ,implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, Pma, Plan de emergencias y RSD.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

A la fecha solo se presento clima soleado.

ELABORO:

KEVIN LEONARDO BAQUERO VEGA
Residente de Interventoria
C.c. 1.118.531.109

REVISO:

ING. ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal Interventoria
C.c. 1.019.039.382

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**ALOJAMIENTO FLANDES**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Demolición enchape paredes.



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Cerramiento con polisombra.



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Desmonte de lavamanos.



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Demolición enchape piso.



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Demolición enchape paredes.



FECHA FOTO: 09/10/2021
DESCRIPCION: Desmonte aparatos sanitarios.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL 1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**CFS N°3 (Casa 36)**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4-**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**083-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Pañete en muros de cocina a media altura.



FECHA FOTO:07/10/2021
DESCRIPCION: Escarificación y picado de superficie.



FECHA FOTO: 08/10/2021
DESCRIPCION: Varilla para dindeles de marcos en ventanas.



FECHA FOTO: 08/10/2021
DESCRIPCION: Dindeles y filos en marco ventanas.



FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Filos de marcos para puertas.



FECHA FOTO: 08/10/2021
DESCRIPCION: Picado de fachada.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**GIMNASIO**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Sacada de escombros y retiro a lugar de acopio.



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Demolición de enchaoe baño.



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Demolicion de enchape de piso.



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Desmonte y retiro de closet.



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Desmonte de cielo raso.



FECHA FOTO: 04/10/2021
DESCRIPCION: Cerramiento en polisombra, para acopio de material.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**ANTIGUO COLEGIO**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**




FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Cerramiento en polisombra para acopio de material.



FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Demolicion de enchape piso y paredes.



FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Demolición de pollo para inferior de mesones.

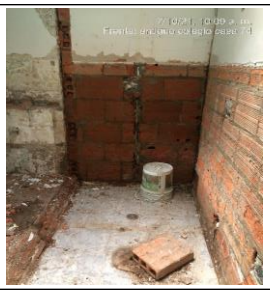

FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Demolición de msones cocina.



FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Pañete en paredes y alistado.



FECHA FOTO: 07/10/2021
DESCRIPCION: Demolición de acabados en pisos y paredes.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**GIMNASIO**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 20/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza cerramiento del area a intervenir.



FECHA FOTO: 20/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza cerramiento en parte externa, zona de acopio.



FECHA FOTO: 22/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza la demolición y retiro de enchape instalado en piso y paredes.



FECHA FOTO: 22/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza demolición de enchape en zona de baños.



FECHA FOTO: 23/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de puertas con sus marcos y demolición de enchape.



FECHA FOTO: 24/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavación en tuberiá desague con el fin de evidenciar dirección de la misma.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL 1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**CFS N°3 (Casa 36)**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4-**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**083-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 20/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el cerramiento con polisombra en parte externa.



FECHA FOTO:21/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de puertas con su respectivo marco en parte externa.



FECHA FOTO: 22/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte y retiro de armarios.



FECHA FOTO: 23/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el acopio de carpintería metalica en parte externa.



FECHA FOTO: 23/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza la demolición y retiro de enchape del piso en zona interna.



FECHA FOTO: 23/09/2021
DESCRIPCION: Demolición de mesón de cocina y sobre piso (poyo)

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**
LUGAR	**EHFAA**

CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4-GR**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GR**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO:30/09/2021
DESCRIPCION: Escarificación y picado de superficie.



FECHA FOTO:30/09/2021
DESCRIPCION: Finaliza regata de tubería en baños 2do y 1er piso.



FECHA FOTO: 30/09/2021
DESCRIPCION: Finaliza pañete en paredes.



FECHA FOTO: 01/10/2021
DESCRIPCION: Finaliza alistado en pisos de los cuatro baños intervenidos.



FECHA FOTO: 01/10/2021
DESCRIPCION: Se finaliza el picado de toda la pintura en parte superior.



FECHA FOTO: 02/10/2021
DESCRIPCION: Finaliza pañete y alistado.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL **1**

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**
LUGAR	**GIMNASIO**

CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 01/10/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavación manual en parte externa para tubería sanitaria.



FECHA FOTO: 01/10/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavación parte interna del los baños para tubería.



FECHA FOTO: 29/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de puertas baños.



FECHA FOTO: 01/10/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavación para caja de inspección.



FECHA FOTO: 27/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de mesón en concreto en baños.



FECHA FOTO: 27/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el retiro de escombros.

	PROCESO: PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS MANUAL INTERVENTORIA DE OBRAS INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA (REGISTRO FOTOGRAFICO)	CODIGO No.	INT-CAL-SEM
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	diciembre-17
		PÁGINA:	1 de 1

No. INFORME MENSUAL 1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	**MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4**		
LUGAR	**CFS N°3 (Casa 36)**		
CONTRATO OBRA No:	**047-00-G-CACOM-4-**	**CONTRATISTA**	**INARCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
CONTRATO INTERVENTORIA No:	**083-00-G-CACOM-4-GRUAL-2021**	**INTERVENTORIA**	**ANZA INGENIERIA S.A.S.**



FECHA FOTO: 28/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavación manual en parte interna de la casa.



FECHA FOTO:28/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de ventanas en vidrio con marco en aluminio.



FECHA FOTO: 28/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza el desmonte de ventanas con marco en aluminio habitaciones.



FECHA FOTO: 30/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza filos de puertas habitaciones.



FECHA FOTO: 30/09/2021
DESCRIPCION: Se Finaliza excavación manual en parte interna para tubería sanitaria.



FECHA FOTO: 30/09/2021
DESCRIPCION: Se realiza excavacín en parte externa para caja de inspección.
