Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No.:	1 Y F	FECHA DEL INFORME:	martes, 19 de octubre de 2021

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-32-1171-21	Objeto:	ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO MESA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Contratista:	AMAURY ANDRÉS URUETA MORA		
NIT:	1.102.816.606-7		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 3.555.400	Plazo Inicial:	30	días	Fecha suscripción:	13-09-21
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:			ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 3.555.400		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	30	días		
Fecha de iniciación:	lunes, 13 de septiembre de 2021		Fecha de vencimiento:	miércoles, 13 de octubre de 2021			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
NO APLICA						

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	**0,00%**
Durante el periodo	100,00%	100,00%	**0,00%**
Acumulad Actual	100,00%	100,00%	**0,00%**

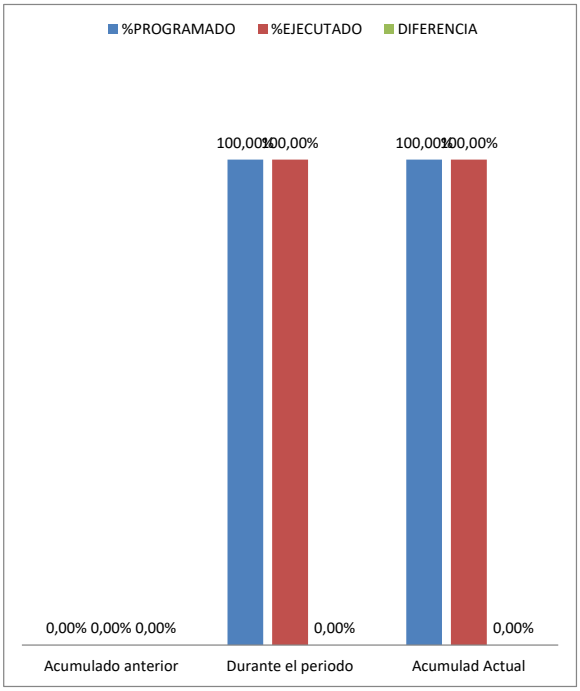

PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra	$ 3.555.400	$ 3.555.400

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra	$ 3.555.400	$ 3.555.400

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 3.555.400
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 3.555.400
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 0
Vr. ANTICIPO:	$ 0
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1 Y FINAL	$ 3.555.400	$ 0	$ 3.555.400	100,00%	19-10-21
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
			$ 0	0,00%	
TOTALES	$ 3.555.400	$ -	$ 3.555.400	100,00%	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
OCTUBRE DE 2021	$ 3.555.400	ACTA 1 Y FINAL						

Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
		Pagina: 2 de 3

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								
Responder si se cuenta con la documentación al día:						Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?		SI
Estudios y diseños:	SI					Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?		N.A.
Planos de obra:	N.A.					La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?		N.A.
Especificaciones técnicas	N.A.					Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?		N.A.
Permisos y Licencias:	N.A.					Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?		N.A.
Bitacora:	N.A.					El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?		SI
Empleos Directos:	1	Hombres:	1	Mujeres:	0	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	36	días


SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Ninguno
PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:
Ninguno
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
Ninguno
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
Se realiza visita de campo entre la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, Secretaría de Medio Ambiente y el contratista al sitio objeto de este contrato.
Por parte de la Secretaría de Obras Públicas se entregan los diseños de la estructura de la cancha cubierta.
Se hace entrega de los cálculos del análisis estructural por parte del contratista.
OBSERVACIONES GENERALES: **Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros**
Una vez realizada la evaluación se logra evidenciar que la estructura no tendría inconvenientes en recibir la instalación de los paneles solares que no pueden exceder los 20 kg/m2, sin embargo, esta sujeta a la verificación sísmica que pueda recomendar el perfil de suelo.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El conttato se ejecutó sin inconvenientes y con el valor y plazo estipulados incialmente.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID HENAO OSORIO	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	


REGISTRO FOTOGRAFICO




DESCRIPCIÓN: Localización del estudio.

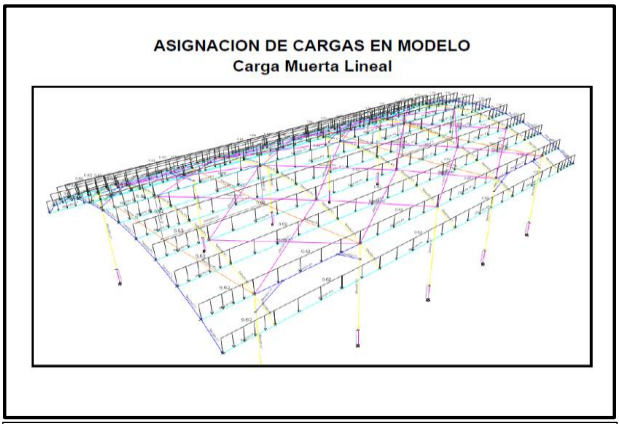


DESCRIPCIÓN: Asignación de cargas en modelo.

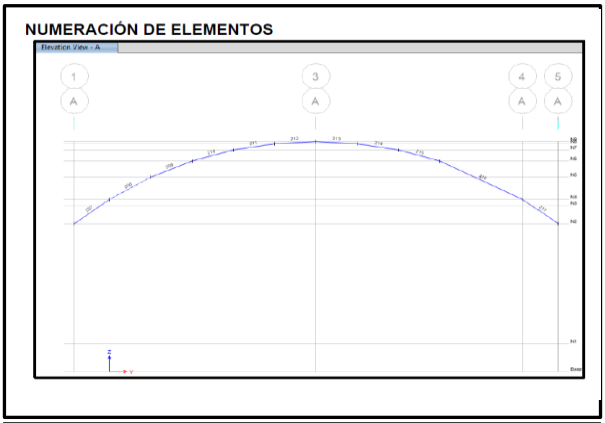


DESCRIPCIÓN: Númeración de elementos de la cubierta.

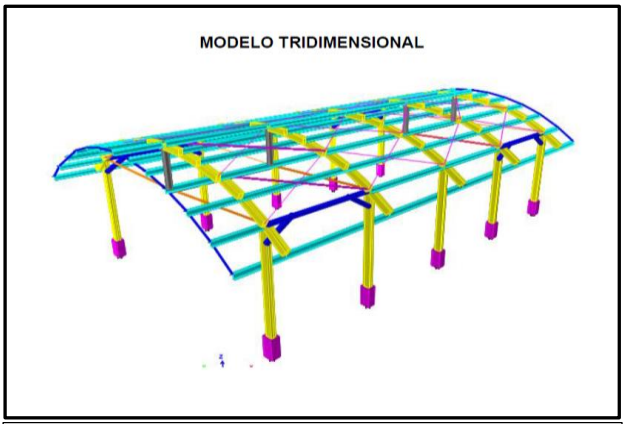

DESCRIPCIÓN: Modelo tridimensional

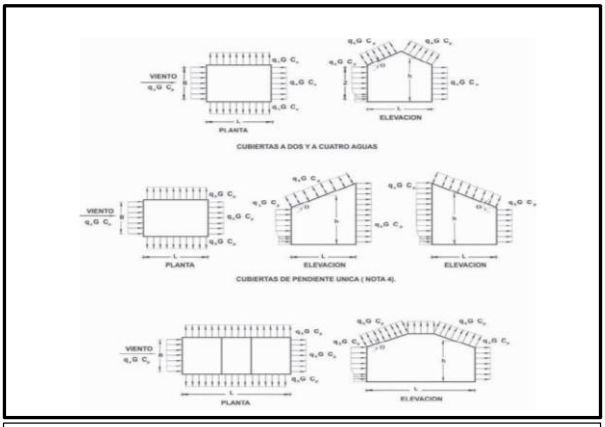

DESCRIPCIÓN: Cálculo de cargas de viento

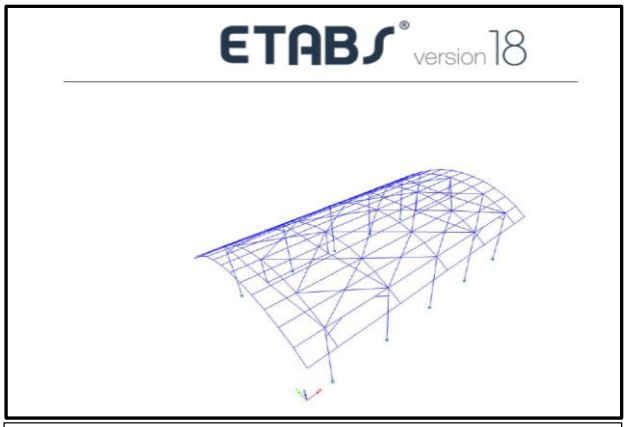

DESCRIPCIÓN: Modelación en ETABS versión 18.
