I DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN

Proceso/entidad Convocante	CONTRATO DE OBRA Nº 174-GINRED1-2021	**Fecha de reunión**	14/10/2021
Lugar de reunión	INTENDENCIA REGIONAL "GINRED1"		

Proceso(s) / Entidad(es) que participan

PROCESO: Contrato de obra Nº 174-GINRED1-2021
ENTIDADES QUE PARTICIPAN:
Servicios Integrales de Ingeniería y Construcciones sas (Contratista)
LAURA JOHANA CRICIEN (Residente de Obra)

Dirección General Marítima
CPS. EDINSON VANEGAS RIASCOS (Supervisor contrato 174-Ginred1-2021)

Objetivo de la reunión

Designación de lugar de acopio contrato No. 174 – Ginred1 – 2021,
.

Líder de la reunión	EDINSON VANEGAS RIASCOS	**Proceso / Entidad**	CONTRATO DE OBRA Nº 174-GINRED1-2021

Nota: Los asistentes a la reunión se relacionan en el formato G3-00-FOR-021 Listado de Asistencia

II AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento al cronograma de obra.
2. Verificación de novedades presentadas en la ejecución.
3. Acuerdos y compromisos.

III DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 15:00R del día 14 de octubre de 2021, se da inicio a la reunión de seguimiento al cronograma de obra.
El supervisor del contrato manifiesta que de acuerdo al cronograma aportado por el contratista este presentaría un atraso con relación a los trabajos del apartamento 1501, pero se evidencia un adelanto en los trabajos del apartamento 1502, lo cual es justificado teniendo en cuenta que el usuario solicito el inicio de los trabajos en este baño ya que el mismo presenta un mayor deterioro, estos trabajos se pueden homologar con respecto a los trabajos requeridos en el baño del apartamento 1501, ya que son las mismas actividades y cantidades debido que los baños intervenidos

son tipos y las actividades contempladas corresponden. De acuerdo con esto el contratista está cumpliendo con lo programado en cuanto a cantidades ejecutadas.

En la ejecución de los trabajos realizados en el baño del apartamento 1502 se puso en evidencia un trabajo ejecutado con anterioridad en estado defectuoso, el cual ha generado de manera constante filtración en la tubería hidráulica, siendo además la situación que motiva a tener el baño fuera de servicio, al realizar esta intervención se ocasiono afectación en el baño del apartamento 1402, en el cual se presentó deterioro del cielo falso en panel yeso y tres de sus luminarias. Esta afectación ocasiona la necesidad de incluir actividades no previstas en el contrato inicial.
Debido a la situación presentada en el apartamento 1402, se deberá esperar que el piso termine su fraguado y deje de mostrar la humedad para realizar trabajos de aplicación de mortero impermeabilizado y el posterior enchape del piso de baño en el apartamento 1502.
El contratista cumplió con la entrega de la documentación requerida de acuerdo a las observaciones y requerimientos del supervisor para el inicio de los trabajos, el contratista aporto hoja de vida de la nueva residente siso del proyecto, así como el cronograma con la inclusión de la ruta crítica y holguras de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato el día sábado 09 de octubre de 2021.
De acuerdo a las novedades presentadas y teniendo en cuenta que el contratista entrega balance del contrato, se solicita al contratista que realice la entrega de los análisis de precios unitarios para la revisión por parte del supervisor del contrato y que estas puedan ser incluida en el presupuesto como actividades no previstas, a la fecha se deben entregar análisis de precios unitarios de reparación de puntos eléctricos, suministro e instalación de tres luminarias tipo bala, suministro e instalación de cielo falso en pvc.
El contratista iniciara ejecución con un segundo frente de trabajo para atender las correcciones de humedad presentadas en el apartamento 1501 a partir del día martes 19 de octubre de 2021 para mejorar los rendimientos en la ejecución del contrato.

IV CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- ✓ El contrato presenta un avance acorde al cronograma de obra.
- ✓ El contratista presentara análisis de precios unitarios de actividades no previstas.
- ✓ Se recomienda al contratista generar estrategias que permitan avanzar con los trabajos de acuerdo a los frentes de obra habilitados.

Siendo las 16:15 R se da por terminada la reunión.

V PLAN DE ACCIÓN

Compromiso	Responsable	Fecha
Entrega de análisis de precios unitarios actividades no previstas	Siinco sas	19-10-2021
Apertura segundo frente de trabajo corrección de humedades apartamento 1501	Siinco sas	19-10-2021


VI PRÓXIMA REUNIÓN

¿Se evidencia la necesidad de agendar una nueva reunión?	**Si** X **No**		
Objetivo de la próxima reunión	Reunión de seguimiento	**Fecha acordada**	21/10/2021
Responsable de agendar próxima reunión	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

VII APROBACIÓN

ELABORADA POR: (Nombre, cargo y firma)	Cps **Edinson Vanegas** Supervisor Contrato 174 – GINRED1 - 2021	**APROBADA POR:** (Nombre, cargo y firma)	CC **JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON.** Coordinador Grupo Intendencia Regional
Vo. Bo.: (Nombre, cargo y firma)	S1. **Carlos Augusto Barrios.** Jefe área de Infraestructura – Ginred1	**Vo. Bo.:** (Nombre, cargo y firma)	S1. **Albeiro Carmona Manjarrez.** Jefe área Logística – Ginred1

1	1	ADECUACION DE BAÑOS APARTAMENTO 1501	0%	30 días	8/10/2021	3/11/2021	$ 26.771.637	$ 0			
2	1.1	PRELIMINARES	0%	1 día	8/10/2021	8/10/2021	$ 0	$ 0			
3	1.1.1	LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA AND TOPOGRAFICA	0%	1 día	8/10/2021	8/10/2021	$ 5.877	$ 0			1,5,300C+6 días
4	1.1.2	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Ancho: =20cms	0%	1 día	7/10/2021	7/10/2021	$ 321.755	$ 0	3	300	
5	1.1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	0%	1 día	7/10/2021	7/10/2021	$ 146.206	$ 0	4CC	5	
6	1.1.4	DEMOLICION ENCHAPES MUROS	0%	2 días	8/10/2021	8/10/2021	$ 428.056	$ 0	5	7FC-1 día	
7	1.1.5	DEMOLICION ENCHAPES PISO	0%	2 días	8/10/2021	11/10/2021	$ 453.330	$ 0	6FC-1 día	8FC-1 día	
8	1.1.6	RASQUETEADA DE MUROS	0%	2 días	11/10/2021	13/10/2021	$ 205.722	$ 0	7FC-1 día	11	
9	1.1.7	DESMONTE DIVISION DE BAÑOS	0%	1 día	7/10/2021	7/10/2021	$ 114.516	$ 0	3	11	
10	1.2	MUROS	0%	4 días	11/10/2021	14/10/2021	$ 1.467.132	$ 0			
11	1.2.1	REVELLO DE MUROS PARA APLICACION DE ENCHAPE CERAMICO	0%	2 días	11/10/2021	14/10/2021	$ 1.467.132	$ 0	8,9	12	
12	1.2.2	ENCHAPE CERAMICO DE MUROS	0%	3 días	13/10/2021	15/10/2021	$ 3.319.533	$ 0	11	14CC+1 día	
13	1.3	DIVISIONES	0%	3 días	15/10/2021	18/10/2021	$ 3.677.645	$ 0			
14	1.3.1	MONTEO DE MAMPOSTERIA DE PISO PARA SUS POSTERIOR INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO	0%	3 días	15/10/2021	18/10/2021	$ 773.909	$ 0	12CC+1 día	15	
15	1.3.2	ENCHAPE CERAMICO DE PISOS 20 x 20 CM 1 CALIDAD	0%	4 días	20/10/2021	23/10/2021	$ 3.319.386	$ 0	14	18	
16	1.3.3	CONSTRUCCION POLO DUCHA (INCLUYE ENCHAPE, IMPERMEABILIZANTE, PASADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	0%	2 días	22/10/2021	25/10/2021	$ 1.098.339	$ 0	15	15	
17	1.4	APARATOS Y ACCESORIOS	0%	9 días	21/10/2021	4/11/2021	$ 11.784.004	$ 0			
18	1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	0%	3 días	21/10/2021	25/10/2021	$ 1.334.434	$ 0	16	19FC-1 día	
19	1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	0%	3 días	29/10/2021	1/11/2021	$ 483.434	$ 0	18FC-1 día	20CC+1 día	
20	1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN MADERA O PVC BAJO MUEBLES LAVAMANOS	0%	3 días	30/10/2021	2/11/2021	$ 2.970.691	$ 0	19CC+1 día	21FC+1 día;22	
21	1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	0%	2 días	4/11/2021	5/11/2021	$ 1.468.348	$ 0	20FC+1 día	23	
22	1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	0%	2 días	3/11/2021	4/11/2021	$ 334.890	$ 0	20	23;25CC	
23	1.4.6	ASEO GENERAL (INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES) CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN	0%	2 días	5/11/2021	8/11/2021	$ 1.332.863	$ 0	21;22	24CC+1 día	
24	1.4.7	MANTENIMIENTO PUNTOS HIDRAULICOS (INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, LLAVES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	0%	2 días	8/11/2021	9/11/2021	$ 333.540	$ 0	23CC+1 día		
25	1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS PVC DE 1/2"	0%	2 días	3/11/2021	4/11/2021	$ 221.376	$ 0	20CC	26	
26	1.4.9	MANTENIMIENTO PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	0%	2 días	5/11/2021	6/11/2021	$ 807.584	$ 0	25	27	
27	1.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA DUCHA EN ALUMINIO Y ACRILICO O FLEJADO	0%	2 días	8/11/2021	9/11/2021	$ 7.848.343	$ 0	26	27	
28	2	ADECUACION DE BAÑOS APARTAMENTO 1502	0%	44 días	10/10/2021	3/12/2021	$ 44.744.583	$ 0			
29	2.1	PRELIMINARES	0%	1 día	13/10/2021	13/10/2021	$ 0	$ 0			
30	2.1.1	LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0%	1 día	13/10/2021	13/10/2021	$ 77.454	$ 0	28CC+5 días	31;36	
31	2.1.2	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Ancho: =20cms	0%	1 día	14/10/2021	14/10/2021	$ 321.755	$ 0	30	32CC	
32	2.1.3	DESCARTE APARATOS SANITARIOS	0%	1 día	14/10/2021	14/10/2021	$ 146.206	$ 0	31CC	33	
33	2.1.4	DEMOLICION ENCHAPES MUROS	0%	2 días	13/10/2021	15/10/2021	$ 428.056	$ 0	32	34CC+1 día	
34	2.1.5	DEMOLICION ENCHAPE PISO	0%	2 días	15/10/2021	18/10/2021	$ 453.330	$ 0	33CC+1 día	35CC+1 día	
35	2.1.6	RASQUETEADA DE MUROS	0%	2 días	18/10/2021	19/10/2021	$ 205.722	$ 0	34CC+1 día	36	
36	2.1.7	DESMONTE DIVISION DE BAÑOS	0%	1 día	14/10/2021	14/10/2021	$ 114.516	$ 0	30	38	
37	2.2	MUROS	0%	4 días	19/10/2021	22/10/2021	$ 1.467.132	$ 0			
38	2.2.1	REVELLO DE MUROS PARA APLICACION DE ENCHAPE CERAMICO	0%	2 días	20/10/2021	21/10/2021	$ 1.467.132	$ 0	35	39;50CC	
39	2.2.2	ENCHAPE CERAMICO DE MUROS	0%	3 días	22/10/2021	25/10/2021	$ 3.319.533	$ 0	38;39	41CC+1 día	
40	2.3	DIVISIONES	0%	3 días	25/10/2021	28/10/2021	$ 3.677.645	$ 0			
41	2.3.1	MONTEO DE MAMPOSTERIA DE PISO PARA SUS POSTERIOR INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO	0%	3 días	25/10/2021	28/10/2021	$ 773.909	$ 0	39CC+1 día	42	
42	2.3.2	ENCHAPE CERAMICO DE PISOS 20 x 20 CM 1 CALIDAD	0%	4 días	27/10/2021	30/10/2021	$ 3.319.386	$ 0	41	43	
43	2.3.3	CONSTRUCCION POLO DUCHA (INCLUYE ENCHAPE, IMPERMEABILIZANTE, PASADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	0%	2 días	1/11/2021	2/11/2021	$ 1.098.339	$ 0	42	45	
44	2.4	APARATOS Y ACCESORIOS	0%	9 días	26/10/2021	5/11/2021	$ 11.784.004	$ 0			
45	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	0%	3 días	26/10/2021	28/10/2021	$ 1.334.434	$ 0	43	46FC-1 día	
46	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	0%	3 días	5/11/2021	8/11/2021	$ 483.434	$ 0	45FC-1 día	47CC+1 día	
47	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN MADERA O PVC BAJO MUEBLES LAVAMANOS	0%	3 días	5/11/2021	9/11/2021	$ 2.970.691	$ 0	46CC+1 día	48FC+1 día;49	
48	2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA HIDRAULICA Y SANITARIA	0%	2 días	11/11/2021	12/11/2021	$ 1.468.348	$ 0	47FC+1 día	50	
49	2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	0%	2 días	10/11/2021	11/11/2021	$ 334.890	$ 0	47	50;55CC	
50	2.4.6	ASEO GENERAL (INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES)	0%	2 días	13/11/2021	15/11/2021	$ 1.332.863	$ 0	48;49	51CC+1 día	
51	2.4.7	MANTENIMIENTO PUNTOS HIDRAULICOS (INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, LLAVES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	0%	2 días	15/11/2021	16/11/2021	$ 333.540	$ 0	50CC+1 día		
52	2.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS PVC DE 1/2" MONALACOS PVC DE 1/2"	0%	2 días	10/11/2021	11/11/2021	$ 221.376	$ 0	46CC	53	
53	2.4.9	MANTENIMIENTO PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	0%	2 días	12/11/2021	13/11/2021	$ 807.584	$ 0	52	54	
54	2.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PARA DUCHA EN ALUMINIO Y ACRILICO O FLEJADO	0%	2 días	15/11/2021	16/11/2021	$ 7.848.343	$ 0	53	57;67	
55	2.5	CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS	0%	4 días	29/11/2021	2/12/2021	$ 13.758.464	$ 0			
56	2.5.1	MANTENIMIENTO VIVIENDA DE APARTAMENTOS 1501 Y 1502 (INCLUYE RESANE, LIMPIEZA, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS O EN MAL ESTADO, LEVANTEMIENTO Y RESANTE INTERIOR CON CORDON ANILLO DE MADERA O SIMILAR EN TODO EL PERIMETRO , PELLADOS APLANADO EN MORAS SUPERIOR	0%	4 días	29/11/2021	2/12/2021	$ 13.758.464	$ 0	37FC-2 días	57	
57	2.5.2	ARMADURA DE PELDAÑOS Y ALAMEDA APARTAMENTO 1501 (INCLUYE RESANE, ESTUCO, IMPERMEABILIZACION DE MURO Y CIELO RASO, PINTURA, MEDIA CAÑA, CAMBIO DE TUBERIA Y DE NECESARIO, ESTA BACON MUMO EN ESPESARIO, VIVAS DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO	0%	12 días	17/11/2021	30/11/2021	$ 4.137.303	$ 0	54	58FC-2 días	
58	3	MANTENIMIENTO BAÑOS ALOJAMIENTOS SUBORDALES	0%	32 días	20/10/2021	2/12/2021	$ 29.338.788	$ 0			
59	3.1	PRELIMINARES	0%	1 día	20/10/2021	20/10/2021	$ 0	$ 0			
60	3.1.1	LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	0%	1 día	20/10/2021	20/10/2021	$ 78.454	$ 0	55CC	61	
61	3.1.2	CINTA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Ancho: =20cms	0%	1 día	21/10/2021	21/10/2021	$ 321.755	$ 0	60	62FC+1 día;63	
62	3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A CAMAROTES SUBORDALES EN PVC ENTAMBORADO	0%	1 día	22/10/2021	23/10/2021	$ 1.198.170	$ 0	61FC+1 día		
63	3.1.4	RESANE, ESTUCO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE MUROS INTERIOR CAMAROTES DE SUBORDALES	0%	4 días	22/10/2021	26/10/2021	$ 8.233.432	$ 0	61	64FC+4 días	
64	3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA 0= 1,20 X 2,10 (DISEÑO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO)	0%	2 días	1/11/2021	2/11/2021	$ 5.280.283	$ 0	63FC+4 días	66FF	
65	3.2	ENTREGA FINAL	0%	1 día	2/12/2021	2/12/2021	$ 0	$ 0			
66	3.2.1	ESPARCIDO DE ESCOMBROS EN MUELLE DISPUESTO A DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA (INCLUYE RESANE, ESTUCO, IMPERMEABILIZACION, CAMBIO DE MATERIAL E ELEMENTOS MAL	0%	5 días	27/10/2021	2/11/2021	$ 11.472.240	$ 0	64FF	67	
67	3.3	FIN OBRAS	0%	0 días	2/12/2021	2/12/2021	$ 0	$ 0	66;64;57;66		

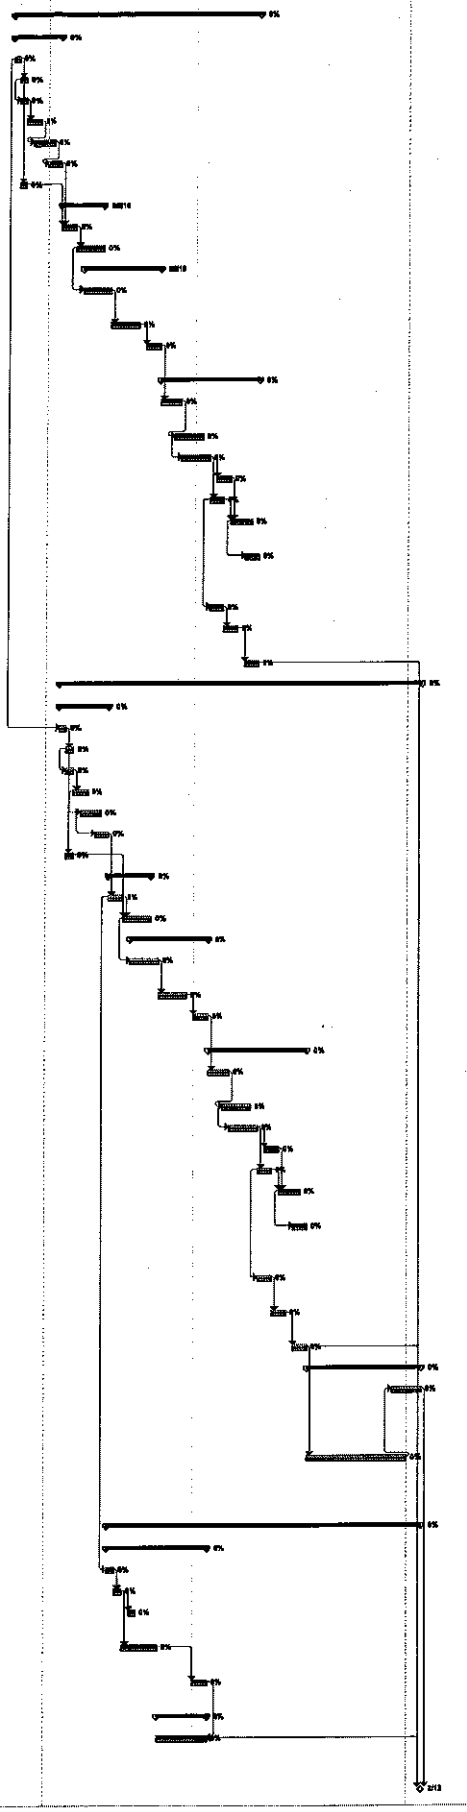

ANEXO- INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

INFORMACION GENERAL DE COSTOS

INFORMACION GENERAL COSTOS

6/10/2021 - 2/12/2021

COSTO
$ 100.912.396


COSTO RESTANTE
$ 100.912.396

% COMPLETADO
0%


ESTADO DEL COSTO
Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
ADECUACION DE BAÑOS APARTAMENTO 1501	$ 0	$ 26.771.037	$ 0	$ 26.771.037	$ 26.771.037
ADECUACION DE BAÑOS APARTAMENTO 1502	$ 0	$ 74.141.359	$ 0	$ 74.141.359	$ 74.141.359

PROGRESO FRENTE A COSTO
Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.

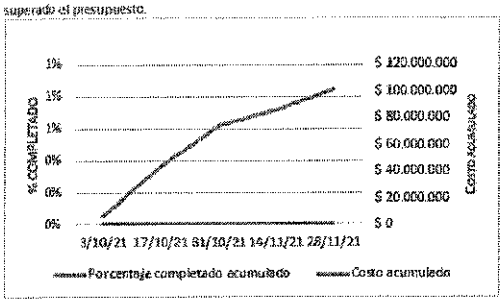



ESTADO DE COSTO
Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?
Intente establecer una línea base

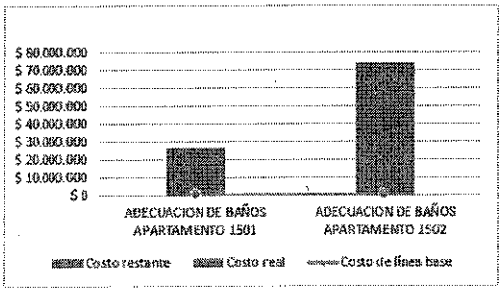


INFORMACION GENERAL DEL HH


INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

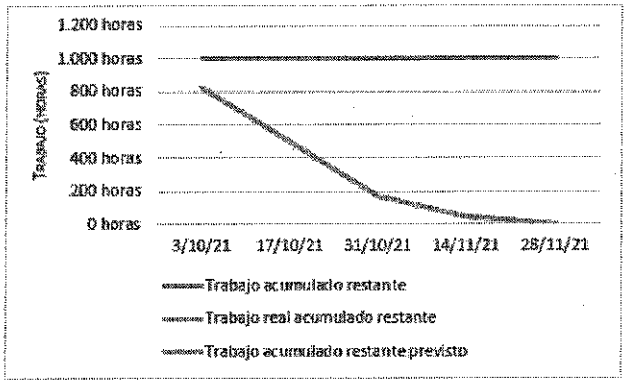

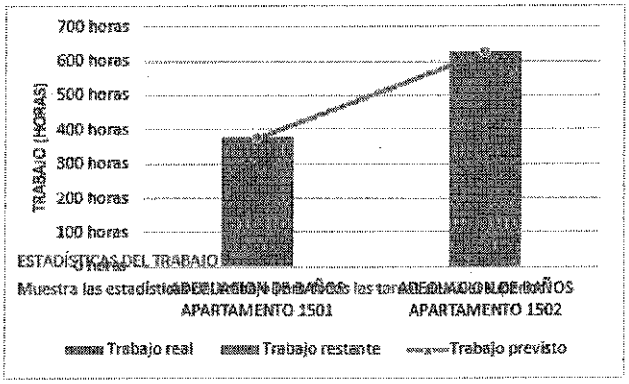

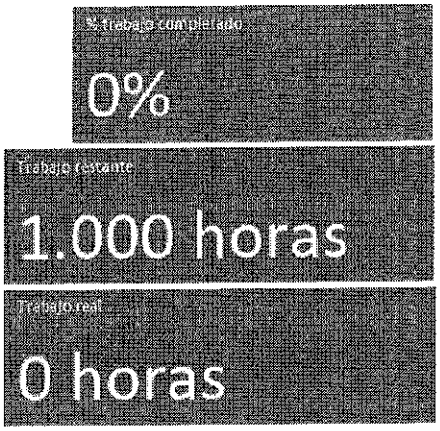


JORNADA LABORAL

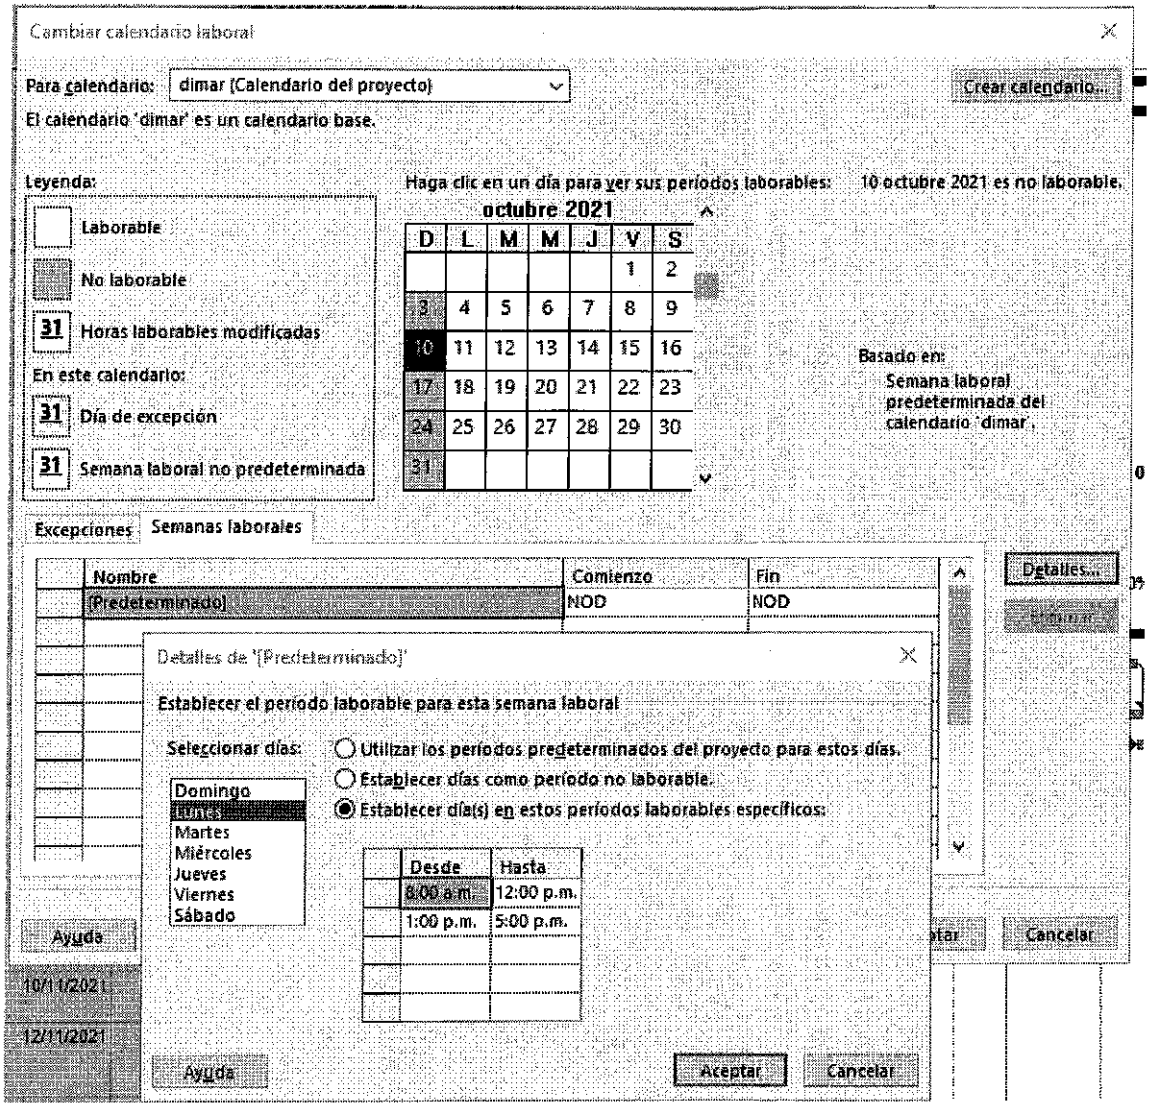

RUTA CRITUCA

0	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A LAS VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA, UBICADAS EN EL PACIFICO COLOMBIANO, ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	50 días	6/9/2021	2/12/2021	$ 100.972.456	0%	$ 0		
1		20 días	6/9/2021	9/10/2021	$ 26.771.037	0%	$ 0		
1.1		6 días	6/9/2021	12/10/2021	$ 1.788.264	0%	$ 0		
1.1.1		1 día	6/9/2021	6/9/2021	$ 4.697	0%	$ 4.697		4,9,36CC+6 días
2		50 días	6/9/2021	2/12/2021	$ 97.134.899	0%	$ 0		
2.1		6 días	13/10/2021	19/10/2021	$ 1.021.140	0%	$ 0		
2.1.1		1 día	13/10/2021	13/10/2021	$ 77.414	0%	$ 77.414	30CC+6 días	31,39
2.1.2		1 día	14/10/2021	14/10/2021	$ 321.735	0%	$ 321.735	30	32CC
2.1.3		1 día	14/10/2021	14/10/2021	$ 146.205	0%	$ 146.205	31CC	33
2.1.4		2 días	15/10/2021	18/10/2021	$ 426.886	0%	$ 426.886	32	34CC+1 día
2.1.5		2 días	18/10/2021	19/10/2021	$ 453.350	0%	$ 453.350	33CC+1 día	35CC+1 día
2.1.6		2 días	18/10/2021	19/10/2021	$ 201.722	0%	$ 201.722	34CC+1 día	36
2.2		5 días	20/10/2021	25/10/2021	$ 4.726.715	0%	$ 0		
2.2.1		2 días	20/10/2021	21/10/2021	$ 1.467.192	0%	$ 1.467.192	35	39,99CC
2.2.2		3 días	22/10/2021	25/10/2021	$ 3.319.523	0%	$ 3.319.523	38,39	41CC+1 día
2.3		9 días	23/10/2021	2/11/2021	$ 3.977.307	0%	$ 0		
2.3.1		3 días	23/10/2021	26/10/2021	$ 771.368	0%	$ 771.368	38CC+1 día	42
2.3.2		4 días	27/10/2021	30/10/2021	$ 1.575.586	0%	$ 1.575.586	41	43
2.3.3		2 días	1/11/2021	2/11/2021	$ 1.630.339	0%	$ 1.630.339	42	45
2.4		12 días	3/11/2021	15/11/2021	$ 16.844.372	0%	$ 0		
2.4.1		3 días	3/11/2021	5/11/2021	$ 1.134.436	0%	$ 1.134.436	43	46FC-1 día
2.4.2		3 días	5/11/2021	8/11/2021	$ 462.434	0%	$ 462.434	45FC-1 día	47CC+1 día
2.4.3		3 días	8/11/2021	9/11/2021	$ 2.974.856	0%	$ 2.974.856	46CC+1 día	48FC+1 día,49
2.4.5		2 días	10/11/2021	11/11/2021	$ 254.839	0%	$ 254.839	47	50,52CC
2.4.6		2 días	10/11/2021	11/11/2021	$ 221.376	0%	$ 221.376	49CC	53
2.4.8		2 días	12/11/2021	13/11/2021	$ 597.564	0%	$ 597.564	52	54
2.4.10		2 días	15/11/2021	15/11/2021	$ 7.649.365	0%	$ 7.649.365	53	57,67
2.5		14 días	17/11/2021	2/12/2021	$ 67.894.799	0%	$ 0		
2.5.1		4 días	29/11/2021	2/12/2021	$ 13.758.494	0%	$ 13.758.494	57FC-2 días	67
2.5.2		12 días	17/11/2021	30/11/2021	$ 4.137.300	0%	$ 4.137.300	54	56FC-2 días
2.9	FIN OBRAS	0 días	2/12/2021	2/12/2021	$ 0	0%	$ 0	66,54,27,58	

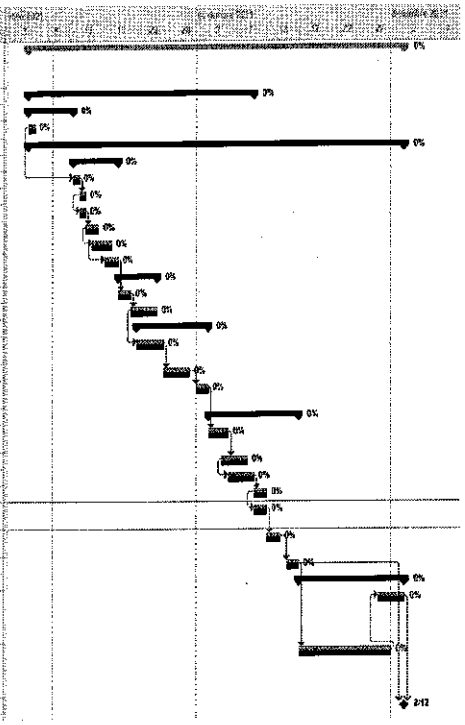

FORMATO HOJA DE VIDA PROFESIONAL

FECHA DE PRESENTACION OFERTA 09/10/2021

PROPONENTE : SIINCO SAS

CARGO: RESIDENTE SISO

FECHA EXP TP 09/10/2019
EXP GENERAL AÑOS 2,03

DATOS PERSONALES PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIRRE
DOMICILIO:	BUENAVENTURA
DIRECCIÓN:	CRA 80 DIAG 2B CASA 01
No. TELEFONO:	3107231288
No. CEDULA (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO):	1.111.810.274

ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO)

TITULO	INSTITUCIÓN	LUGAR	FECHA DE GRADO MES	FECHA DE GRADO AÑO	DURACIÓN ESTUDIOS (AÑOS)
ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	UNIMINUTO	BUENAVENTURA	OCTUBRE	2019	5

OTROS ESTUDIOS

TITULO	INSTITUCIÓN	LUGAR	FECHA DE GRADO MES	FECHA DE GRADO AÑO	DURACIÓN ESTUDIOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ENTIDAD	CARGO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO EXP (AÑOS)
						0,00
						0,00
SIINCO SAS	RESIDENTE SST	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	$ 747.993.862	03/01/2020	17/04/2021	1,31
SIINCO SAS	RESIDENTE SST	MANTENIMIENTO REGISTRADURIA DE AGUADAS	$ 83.239.864	17/10/2019	20/12/2019	0,18
						0,00
		SUMATORIA EXP APORTADA EN PESOS ($)	$ 851.233.726			1,48
		SUMATORIA EXP APORTADA EN SALARIOS AÑO 2020 (SMMLV)	969,73			

TARJETA PROFESIONAL
No.

COMPROMISO PROFESIONAL PROPUESTO

En caso de que sea adjudicado el contrato al proponente SIINCO SAS, me comprometo a ejercer el cargo de RESIDENTE SISO para el cual fui propuesto con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones de este proceso de selección.

FIRMA: Claudia Patricia Noreña

TIEMPO DE DEDICACION PROFESIONAL EN OBRA: 100%

Firma del Proponente:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.111.810.274
NORENA AGUIRRE
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1996
BUENAVENTURA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-OCT-2014 BUENAVENTURA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-1110274-00184001-1-M-19960822-2014052[illegible] 0080486867A 1 2973972745

Escaneado con CamScanner

Anexos

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Claudia Patricia Noreña Aguirre

CC No. 1.111.810.274

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Administradora en Salud Ocupacional

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector General

Rector UVD

Secretario General

SECRETARIA GENERAL


Documento Auténtico otorgado por resolución 10535 del 1 de agosto de 1996, Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Documento protegido con Marca de Agua Digital, verifique con Secretaría

Folio 454 del Libro de Registro No. 827 Bucaramanga, 28 de octubre de 1996 No. 16798

Claudia Patricia Noreña Aguirre
C.C. No. 1.111.810.274 de B/ventura

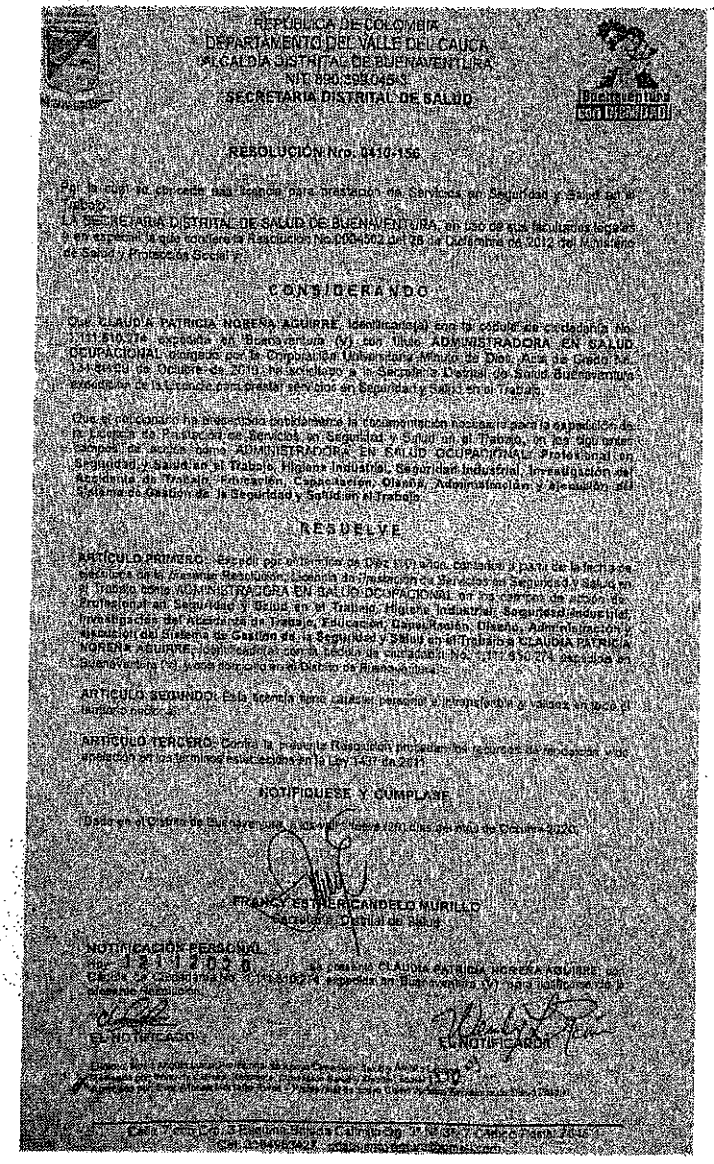

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
NIT 890399045-5
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

RESOLUCIÓN Nro. 0410-156

Por la cual se concede una licencia para prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BUENAVENTURA, en uso de sus facultades legales y en especial la que confiere la Resolución No.1024-002 del 28 de Diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y

CONSIDERANDO

Que CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIRRE identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.111.810.274 expedida en Buenaventura (V), con título ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL otorgado por la Corporación Universitaria Antonio de Dios Aca de Cartago del 12 Enero de Octubre de 2010, ha acudido a la Secretaría Distrital de Salud Buenaventura solicitando la Licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que el recurrente ha presentado cumplidamente la documentación necesaria para la expedición de la Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, en los que tiene campos de acción tales ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Industrial, Investigación de Accidentes de Trabajo, Formación, Capacitación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Expedir por el término de Dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente Resolución, Licencia de Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL en los campos de acción de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Industrial, Investigación de Accidentes de Trabajo, Educación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.111.810.274 residente en Buenaventura, con domicilio en el Distrito de Buenaventura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta licencia tiene carácter personal e intransferible a cualquier título o persona natural o jurídica.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procederán los recursos de reposición y apelación en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Buenaventura, a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2013.

FRANCY ESTHER CANDELO MURILLO
Secretaria Distrital de Salud

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
No. 1 8 1 1 2 0 1 3
En la ciudad de CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIRRE se identificó con C.C. No. 1.111.810.274 expedida en Buenaventura (V) para notificarse de la anterior Resolución.

EL NOTIFICADO

EL NOTIFICADOR

Calle Primera (1) Palmira Salida Cartago Tel. [illegible] Cel. [illegible]

Claudia Patricia Noreña Aguirre
C.C. No. 1.111.810.274 de Buenaventura

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

La Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
Certifica que:

Claudia Patricia Norena Aguirre

C.C. 1.111.810.274

Asistió y aprobó el Diplomado en

Nueva Reglamentación de Seguridad y Salud en el Trabajo

Del 3 de mayo al 6 de julio de 2019
con una intensidad total de 120 horas

Santiago de Cali, julio de 2019

Libro N° 01- 2019 - 1152

Ernesto Lozano García
Coordinador Académico Centro Regional Buenaventura

Martha Lucía Figueredo Chica
Secretaria de sede

SIINCO SAS

Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S – SIINCO S.A.S

NIT 900.264.026-9

CERTIFICA QUE

La Señorita **CLAUDIA PATRICIA NOREÑA AGUIERRE** identificada con CC No 1.111.810.274 de Buenaventura laboro para la compañía desempeñando el cargo de RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para contratos de Mantenimiento preventivo y correctivo, Adecuaciones, Reparaciones Locativas y Obra civil menor entre los que se encuentran:

CONTRATANTE:	***SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA***
CONTRATISTA:	***SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.264.026-9***
OBJETO:	***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA***
VALOR DEL CONTRATO:	***$ 767.993.862 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOSM/CTE)***
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO:	1- Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, 2- Mantenimiento de iluminación existente, 3- cambio de luminarias, 4- Aires acondicionados, 5- Sistemas electrónicos de puertas, 6- Tableros de distribución de energía 7- Pañetes,pinturas y resanes 8- Actividades de Mantenimiento locativo, demarcación de parqueaderos
PLAZO DE EJECUCION:	***45 Meses***
FECHA DE INICIACION:	***03 de enero de 2020***
FECHA DE TERMINACION:	***17 de abril de2021***

SIINCO SAS

Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción

CONTRATANTE:	***FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL***
CONTRATISTA:	***SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.264.026-9***
OBJETO:	***MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE AGUADAS***
VALOR DEL CONTRATO:	***$ 83.239.864 (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)***
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO:	***1- Preliminares y demoliciones,*** ***2- Suministro e instalacion de aparatos sanitarios*** ***3- Cielos rasos en drywall*** ***4- Pinturas pañetes,*** ***5- Instalaciones hidraulicas y sanitarias,*** ***6- Instalaciones eléctricas,*** ***7- Desmonte e instalaciones de divisiones de baterias sanitarias,*** ***8- Mantenimiento y cambio de cubiertas, suministro y mantenimiento de flanches.*** ***9- Suministro e instalación de puestos y muebles de oficina abierta.***
PLAZO DE EJECUCION:	***2 meses***
FECHA DE INICIACION:	***17 de octubre de 2019***
FECHA DE TERMINACION:	***20 de diciembre de 2019***

Las principales funciones o actividades del profesional fueron:

1- Capacitacion de todos los frentes de trabajo y cada una de sus sedes
2- Revisión de afiliaciones y estado de seguridad social
3- Realización y verificación de ATS
4- Asistencia a reuniones
5- Atención al cliente

La presente se expide a solicitud del interesado a 10 días del mes de junio de 2021.

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO
C.C. No 52.787.631 de Bogotá
Representante Legal
