INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	**INTERVENTORÍA** **INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ
	Informe – 12 **ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**	**Página 1 de 34**	
INTERVENTORÍA MALLA VIAL **INFORME MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 320 DE 2019**			**PERIODO** 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021

Bogotá D.C 13 Abril de 2021.

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.
ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E) Ciudad
Bogotá


Asunto. Informe ejecutivo No.12
Ref.: Contrato de Interventoría No. 320 DE 2019

Después de la revisión y ejecución de actividades en las vías priorizadas por la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, la Interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, hace entrega del Informe ejecutivo de Interventoría al contrato de obra No. 321 de 2019, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."** bajo la ejecución del contratista **CONSORCIO RU 2020**.

La Interventoría certifica que el contratista cumple con los Aportes parafiscales, a su vez certifica que los profesionales y personal de obra que intervienen en el proyecto se encuentran cobijados por pagos de seguridad social integral (E.P.S, A.F.P, Y A.R.P) y parafiscales (SENA, I.C.B.F Y caja de compensación familiar.) toda esta información se encuentra ampliamente soportada en el informe entregado por el contratista.

Cordialmente.

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal
Interventoría y Construciviles S.A.S

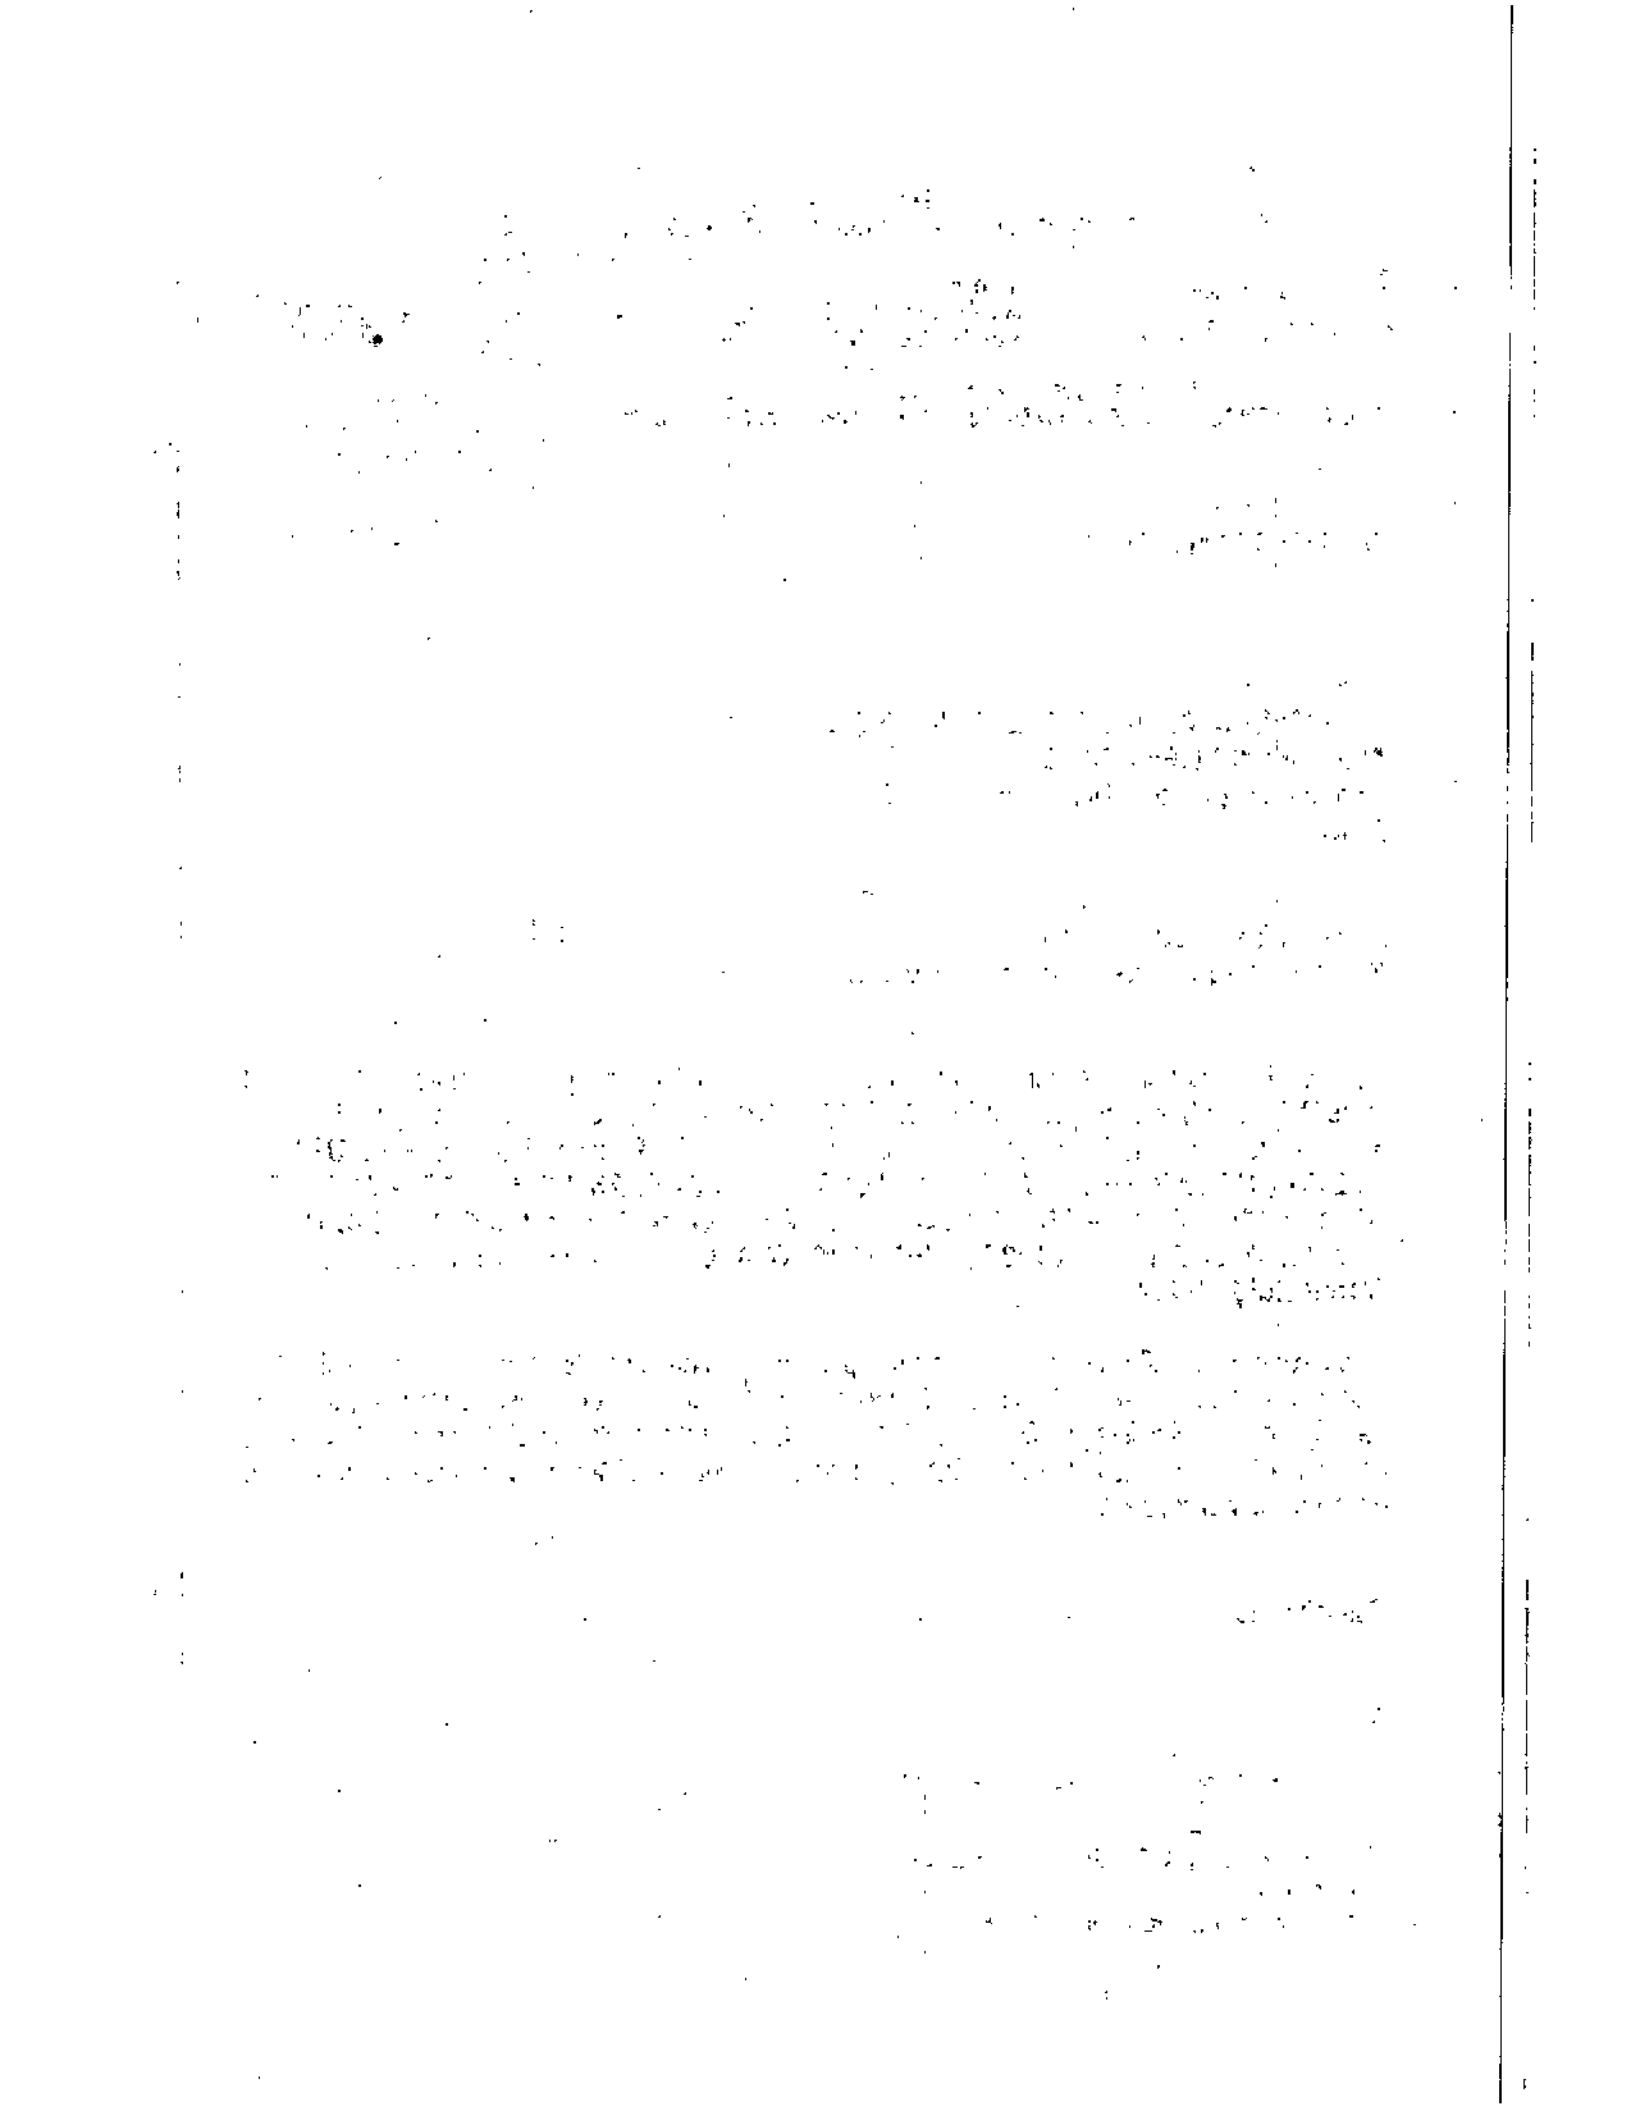


CONTRATO No. 320 DE 2019

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 12 PERIODO DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021

BOGOTÁ D. C. MARZO DE 2021

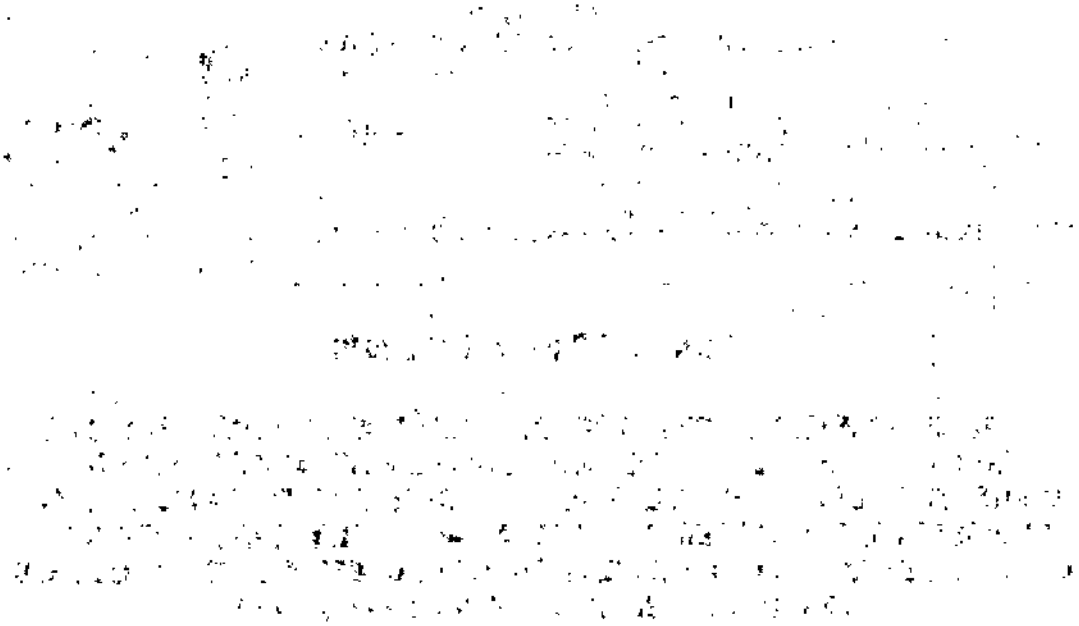

Contenido

Introducción

2. Generalidades 7

2.1 Introducción 7

3. Especificaciones del contrato 9

4. Roles del proyecto 10

5. Información técnica 11

5.1 Programación de obra: 11

5.2 Estado de la obra durante el periodo de preliminares 11

5.3 Control de avances 12

6. Plan De Acción De Interventoría Durante El Periodo Comprendido Entre el 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. 12

6.2 Objetivos De La Calidad 34

6.3 Responsabilidades Y Obligaciones Del Interventor 34


6.4 Reuniones De Control 35

6.5 Ejecución Del Proyecto 36

6.6 Diseño Y Desarrollo 36

6.7 Logística Del Proyecto 37

7. Conclusiones y recomendaciones 38

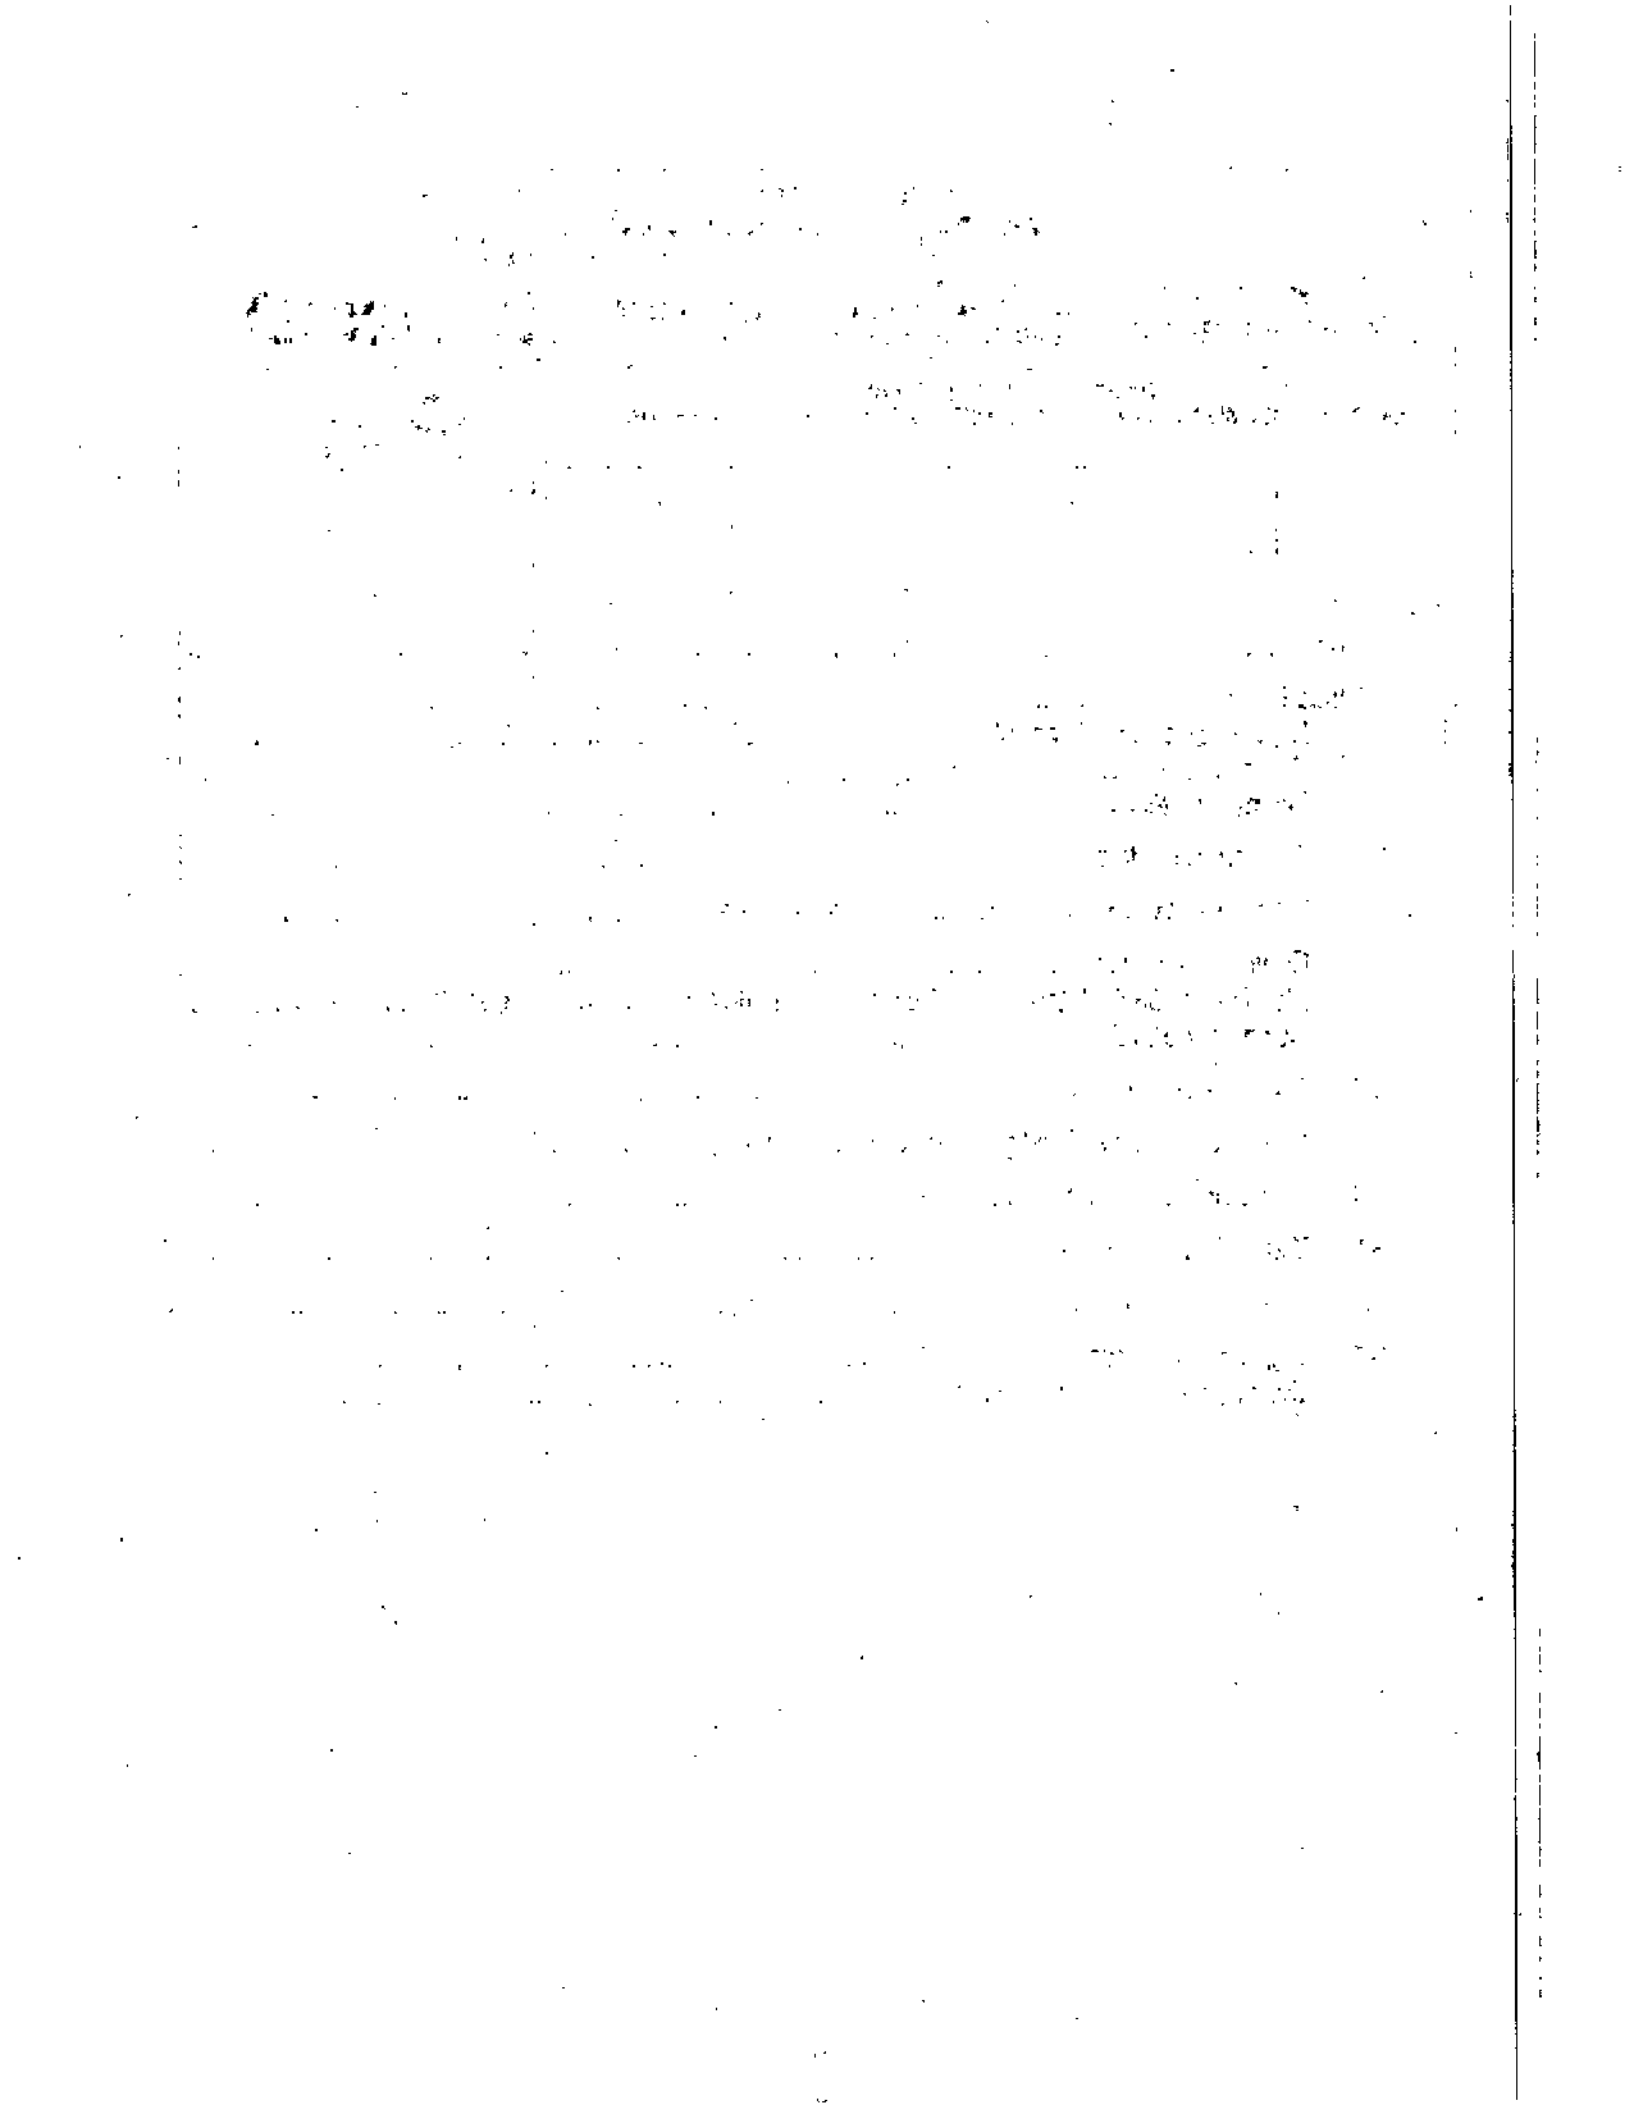


I. Lista de tablas

Tabla 1: Especificaciones del contrato de interventoría y de obra....9
Tabla 2: Personal Profesional....10
Tabla 3: Listado CIV contractuales....15
Tabla 4: Listado de CIV priorizados por la alcaldía local de RafaelUribe Uribe....20
Tabla 5 Listado de CIV excluidas por la alcaldía local de RafaelUribe Uribe....21
Tabla 6 Listado de CIV Incluidas- priorizados por la alcaldía local de RafaelUribe Uribe....22



II. Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Instalación PMT ..... Ilustración 2 Demolición Placa Existente 23
Ilustración 3 Instalación Geomalla ..... Ilustración 4 Instalación Asfalto 23
Ilustración 5 Instalación Malle Electrosoldada ..... Ilustración 6 Instalación Geotextil 24
Ilustración 7 Extensión de Sello ..... Ilustración 8 Fundida Concreto 24
Ilustración 9 Construcción Cajas de Inspección ..... Ilustración 10 Instalación de Malla Electrosoldada 25
Ilustración 11 Fundida Espacio Público 25
Ilustración 12 Excavación Mecánica ..... Ilustración 13 Instalación de malla electrosoldada y Geotextil 26
Ilustración 14 Instalación Sardinel ..... Ilustración 15 Fundida Concreto 26
Ilustración 16 Extensión y Compactación de Subbase ..... Ilustración 17 Instalación de Malla Electrosoldada 27
Ilustración 18 Construcción de cajas de Inspección ..... Ilustración 19 Fundida Espacio público 27
Ilustración 20 Instalación señalización ..... Ilustración 21 Demolición 28
Ilustración 22 Instalación de Geomalla ..... Ilustración 23 Extensión Mezcla asfáltica 28
Ilustración 24 Instalación PMT ..... Ilustración 25 Extensión de Sello 29
Ilustración 26 Extensión de MBR ..... Ilustración 27 Fundida de Concreto 29
Ilustración 28 Instalación PMT ..... Ilustración 29 Excavación Manual 30
Ilustración 30 Extensión Geotextil ..... Ilustración 31 Extensión de Sub Base 30
Ilustración 32 Instalación PMT ..... Ilustración 33 Excavación Mecánica 31
Ilustración 34 Instalación PMT ..... Ilustración 35 Excavación Mecánica 31
Ilustración 36 Fundida Cárcamo ..... Ilustración 37 Extensión y Compactación de Sub Base 32
Ilustración 38 Construcción de Cárcamo 32
Ilustración 39 Instalación PMT ..... Ilustración 40 Excavación Mecánica 33

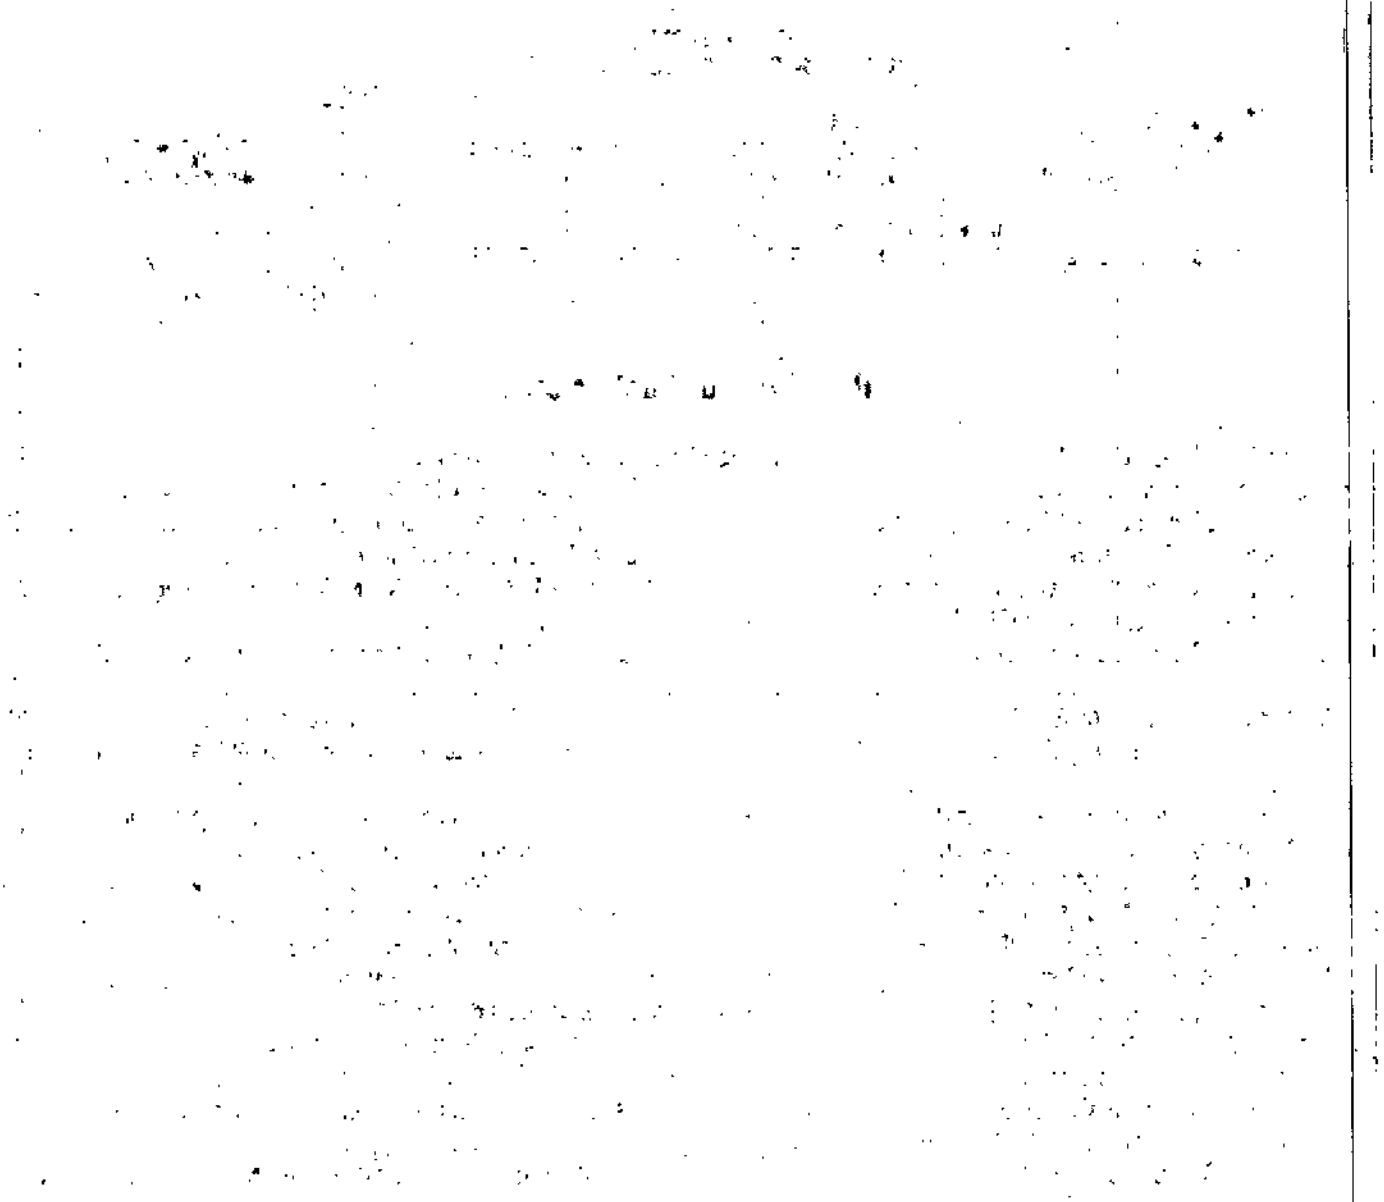

1. Introducción

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe (FDLRUU), con el objeto de mejorar la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las vías locales, ha realizado el Contrato de Interventoría No. 320 de 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"** que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO RU 2020** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra No. 321 de 2019 cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el ***01 de marzo 2021 al 31 de Marzo 2021.***

Por consiguiente, el presente documento contiene una introducción, seguido del capítulo donde se exponen las generalidades del proyecto, como lo es la localización de este, la asignación de los segmentos viales, las especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto. Por último, se detallará las actividades realizadas con respecto al aspecto técnico desarrollado en el periodo de este informe con respecto al contrato de obra y el de interventoría.

2. Generalidades

2.1 Introducción

El FDLRUU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLRUU-LP-224-2019 realizó el contrato de Obra No. 321 de 2019, que tiene como objeto la **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."** *para* intervenir las vias de la localidad, cuyo contratista es el CONSORCIO RU 2020.

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la Ciudad de Bogotá, esta localidad es la No. 18 del Distrito Capital. La Localidad de Rafael Uribe Uribe (BOGOTA, 2019) tiene una extensión total de 1.334 hectáreas. Está ubicada en el sur de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Antonio Nariño al norte, Usme al sur, San Cristóbal al oriente y Tunjuelito al Occidente, esta localidad es en parte plana y en parte montañosa, ambas totalmente urbanizadas. (URIBE, 2020)

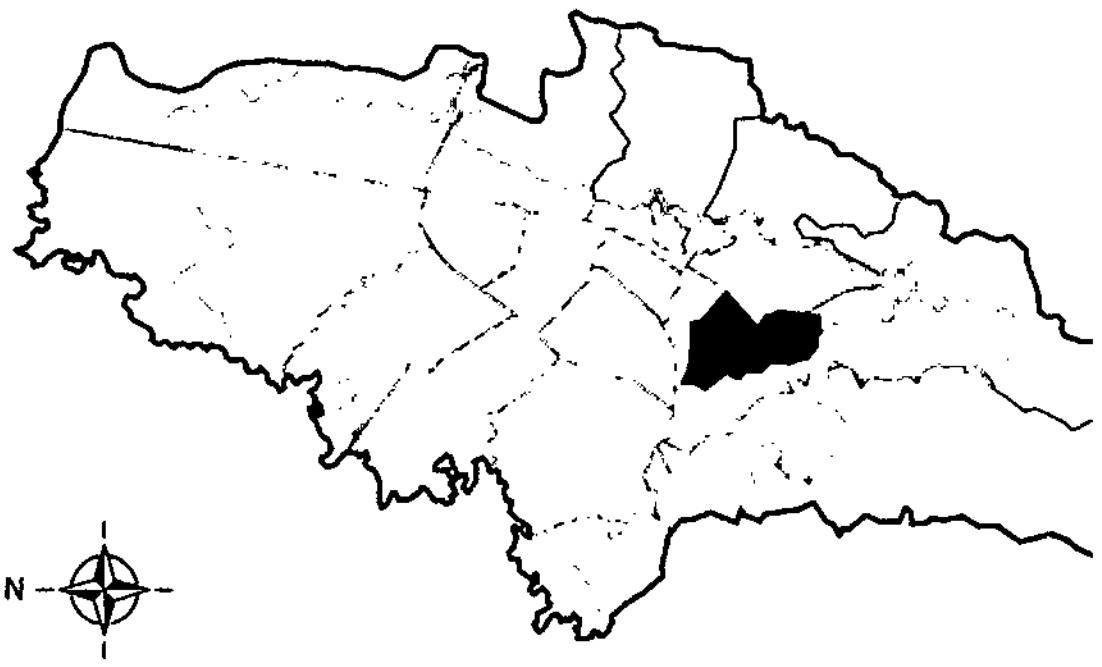
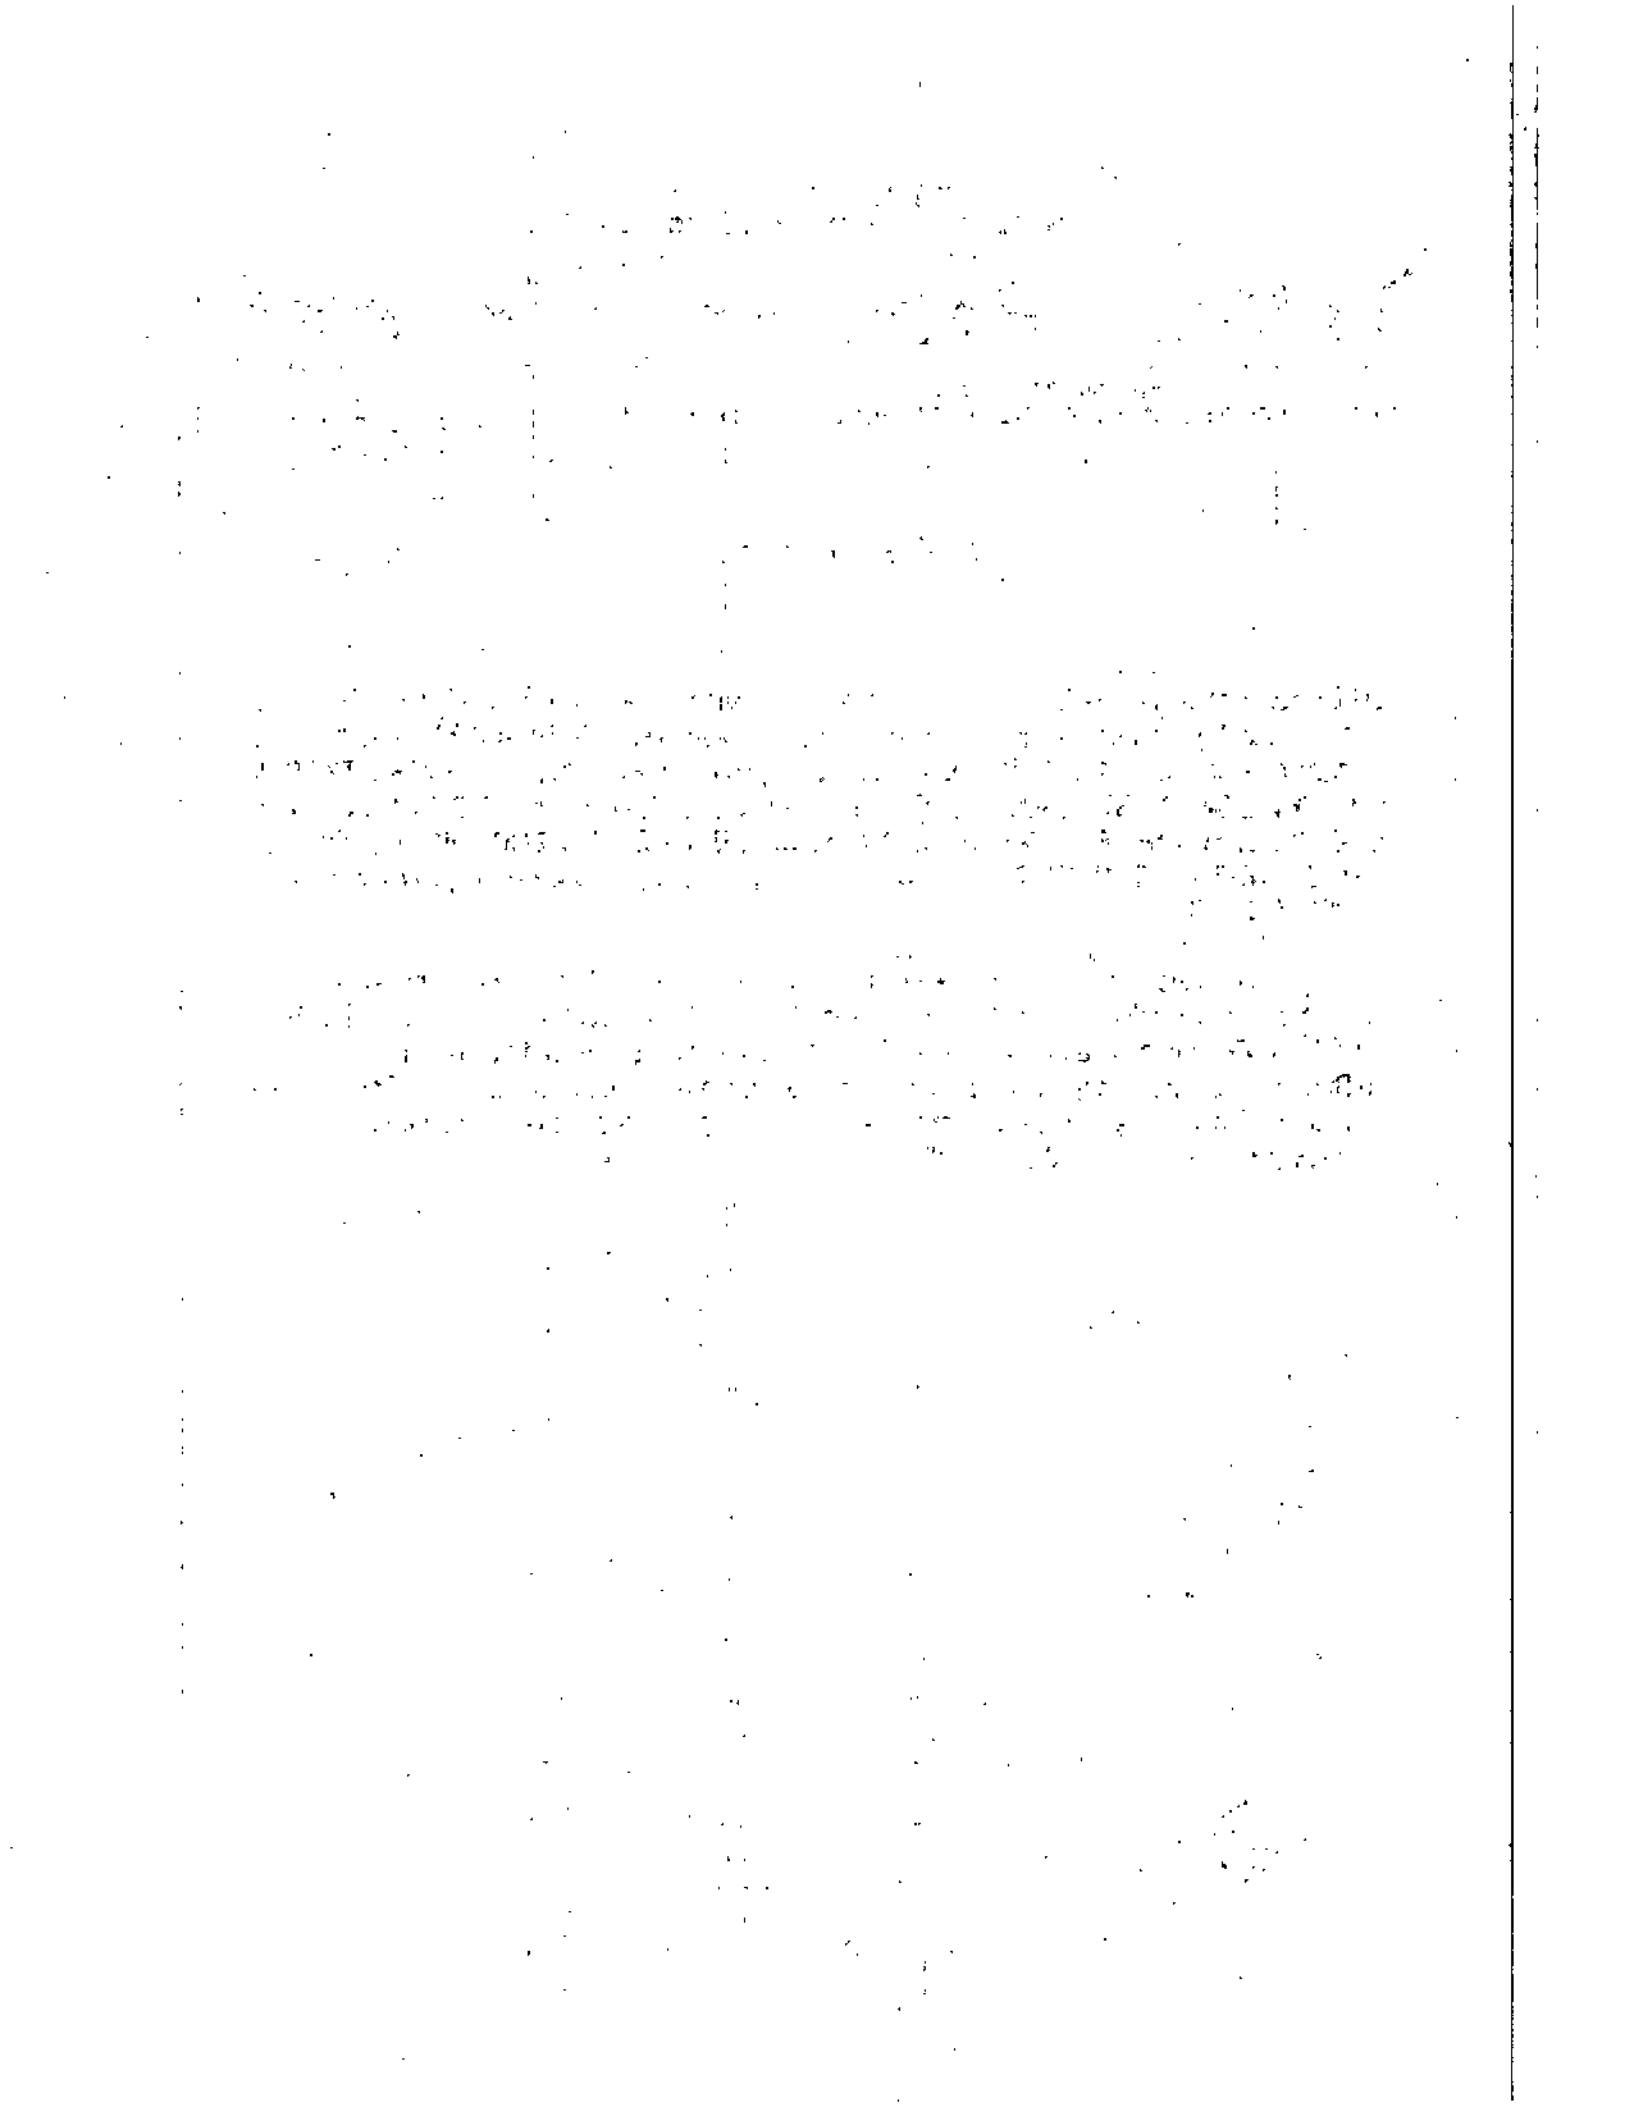


Ilustración 1: Mapa localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2019
(https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)#/media/Archivo:Bogot%C3%A1_-_Rafael_Uribe_Uribe.svg)



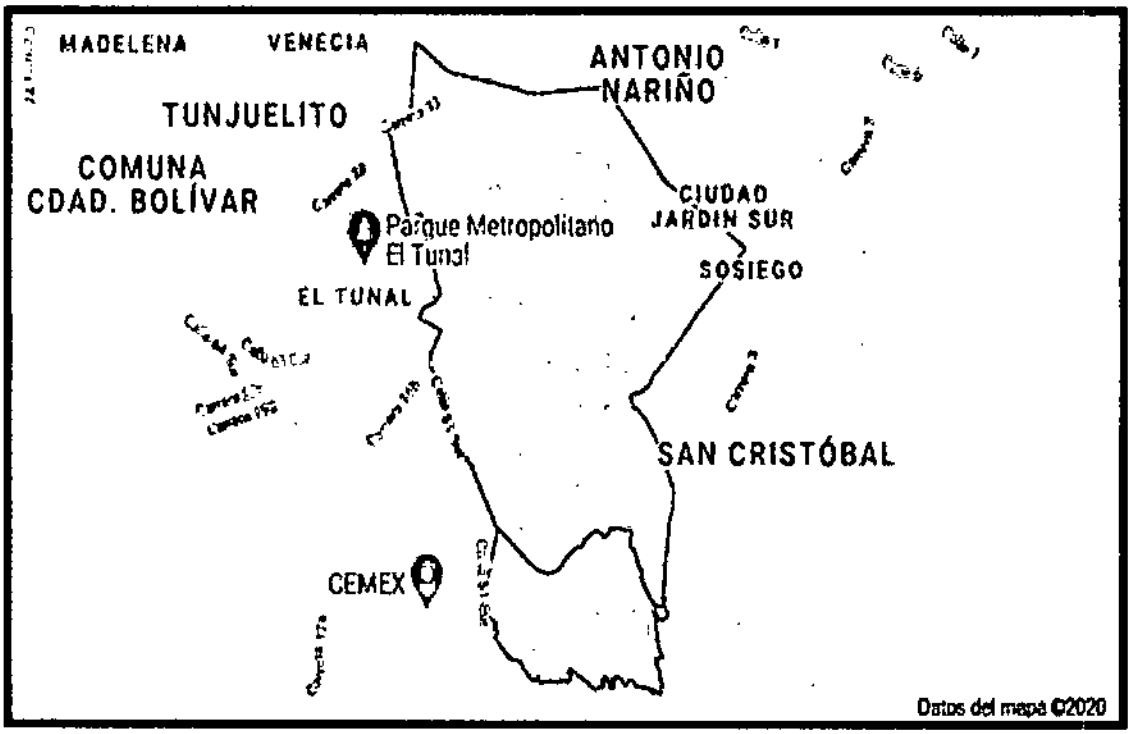


Ilustración 2: Mapa localidad Rafael Uribe Uribe (mapa.bogota.gov.co)

3. Especificaciones del contrato

En la Tabla 1 se exponen las especificaciones generales propias de cada contrato, tanto de la interventoría como el de obra.

Tabla 1 Especificaciones del contrato de interventoría y de obra.

Contrato Interventoría No. 320 DE 2019	
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"**
Plazo inicial	Nueve (09) meses
Plazo Prorroga	Tres (03) meses
Fecha de Iniciación	23 de enero de 2020
Fecha de Terminación 1	22 de octubre de 2020
Fecha de Terminación 2	12 de enero de 2021
Fecha final con prorroga	12 de abril de 2021
Valor inicial del Contrato	$ 1.648.309.220
Valor adición	$419.767.872
Valor Total del Contrato	$2.068.077.092
Interventoría	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
Tiempo de ejecución	Doce (12) mese


Contrato de Obra Pública No. 321 DE 2019	
OBJETO	**"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."**
Fecha de Suscripción	30 de diciembre de 2016
Plazo inicial	Nueve (09) meses
Fecha de Iniciación	23 de enero de 2020
Fecha de Terminación 1	22 de octubre de 2020
Fecha de Terminación 2	12 de enero de 2021
Fecha Terminación con Prorroga	12 de abril de 2021
Valor inicial del Contrato	$ 18.582.132.280
Valor Adición	$4.737.567.168
Valor total Contrato	$23.319.699.448
Contratista	CONSORCIO RU 2020
Tiempo de ejecución	Doce (12) meses

4. Roles del proyecto

En la Tabla 2, se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión.

Tabla 2 Personal Profesional.

Cargo	Nombre	Responsabilidad	Teléfono
Supervisor del Proyecto	Ing. Edson Rosas	Supervisión por parte del FDL a los contratos de obra e Interventoría.	
Director de interventoría	Ing. Carlos Arámbula.	Representación Legal de la Interventoría.	9371881
Residente de Interventoría	Ing. Juan Pablo Lemus.	Residente de la Interventoría.	9371881
Director de Obra	Ing. Juan Felipe Delgado.	Dirección de la ejecución de la Obra.	

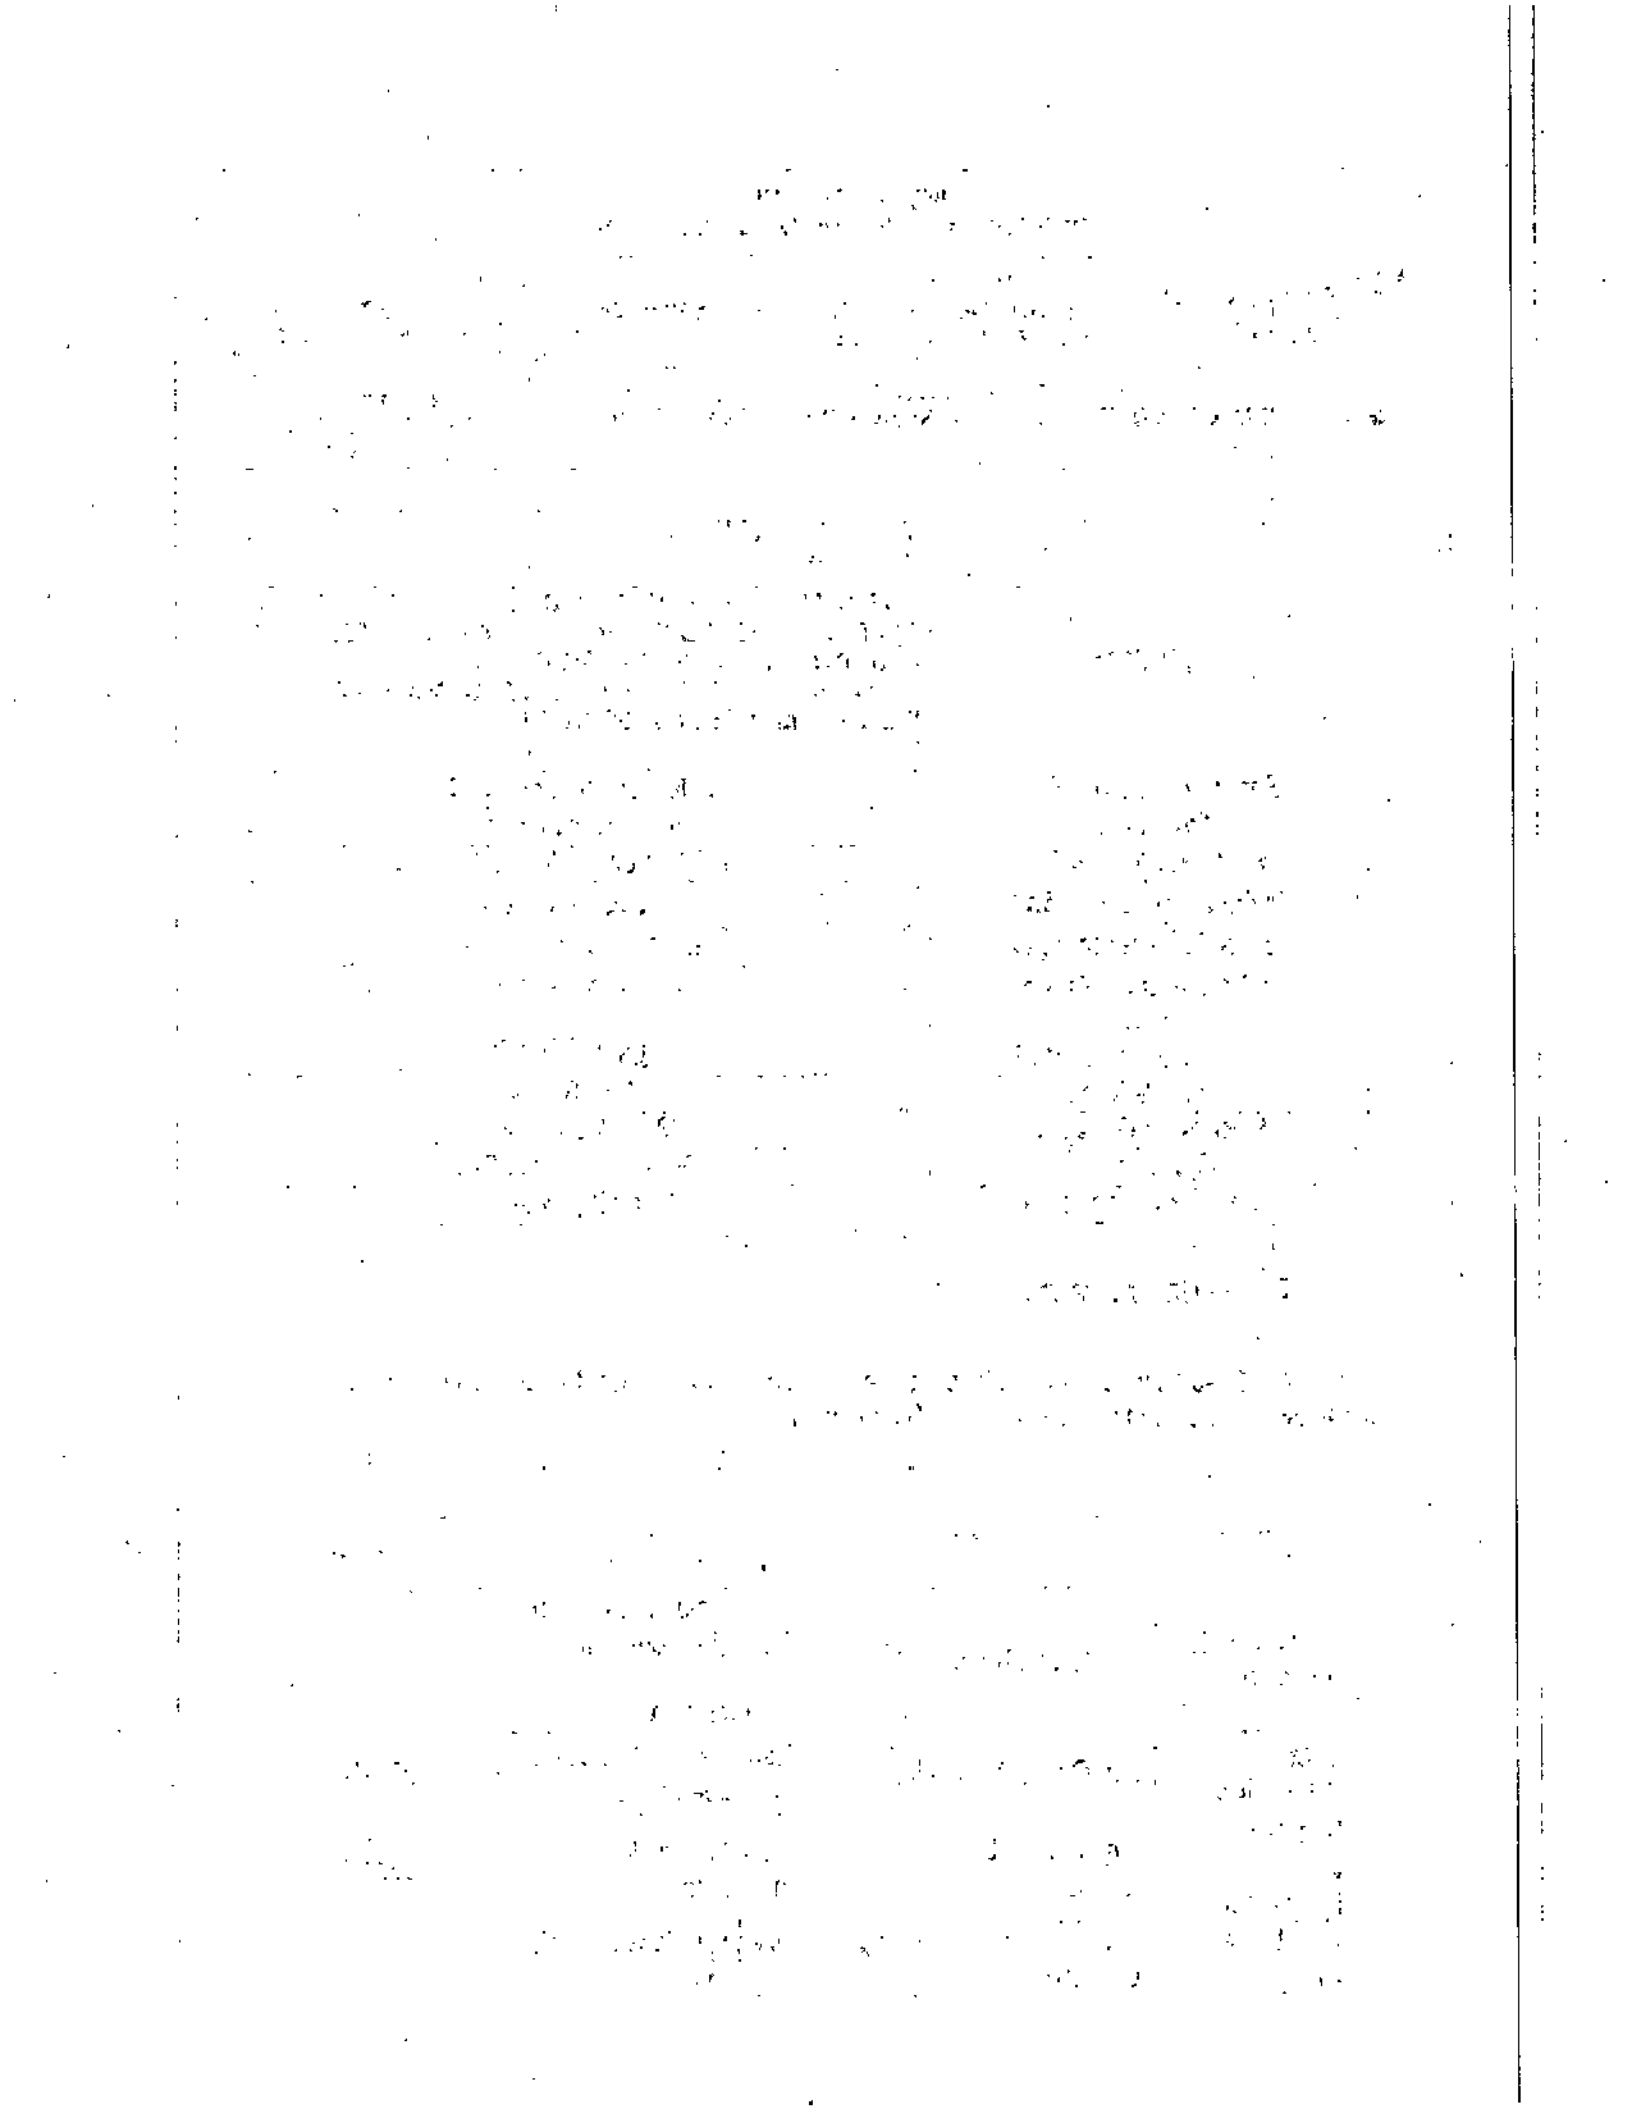

5. Información técnica

5.1 Programación de obra:

El contratista entregó la programación inicial de la etapa preliminar la cual fue revisada y avalada por esta interventoría. Esta describe las actividades preliminares a realizar previo a las actividades de ejecución:

- Inventario de la malla vial local e intermedia (auscultación visual y fotografías).
- Levantamientos topográficos de CIV.
- Procedimiento de campo.
- Procesamiento de deflexiones.
- Índice de condición del pavimento.
- Diagnóstico y condición del pavimento (PCI).
- Estudios y diseños elaboración de los módulos elásticos de la subrasante.
- Diagnostico social de UPZ.
- Diagnostico especializado.
- Determinación de la condición del pavimento.
- Propuestas de intervención.
- Entrega de estudios y diseño de estructuras.

5.2 Estado de la obra durante el periodo de preliminares.

Estudios y diseños.

En el periodo de ejecución de este informe, se encuentra en un 100% el proceso de estudios y diseños, de manera que el constructor sigue el proceso de construcción teniendo muy en cuenta y aplicando estos estudios y diseños de la infraestructura de la malla vial local, con el fin de ejecutar la obra teniendo en cuenta las condiciones actuales, así como la implementación de las Especificaciones técnicas de los materiales y procesos de construcción vigentes de acuerdo con las normas para la ciudad de Bogotá. La elaboración de los estudios y diseños tuvo como antecedente técnico los diagnósticos que fueron revisados y aprobados por esta interventoría.

Para tal fin se realizaron las siguientes actividades:

- Inventario de daños, empleando la metodología del PCI.
- Proyección del TPD y evaluación del número de ejes equivalentes.
- Diagnóstico.
- Definición de intervenciones con base a metodología IDU.

5.3 Control de avances

A la fecha en el contrato 321 de 2019, se ha realizado todo el proceso de priorización de vías, análisis de los diagnósticos, y se culminó con la fase de estudios y diseños. De manera que en esta etapa se continua en la ejecución del proceso constructivo de los diferentes CIV a intervenir.


6. Plan De Acción De Interventoría Durante El Periodo Comprendido Entre el 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.

En la tabla 3 que veremos a continuación, encontraremos el listado de CIV contractual entregado por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe.

CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	UPZ
18001890	KR 13 BIS	CL31 F	CL 31 G SUR	36
18001692	CL 30 SUR	KR 12 L	KR 12 K	36
18001795	CL 23 SUR	KR 10 B	KR 10 C	36
18001964	CL 26 B SUR	KR 11	KR 12 K	36
18001567	KR 14 BIS B	CL 27 A	CL 27 C	36
18000460	KR 27	CL 39 SUR	CL 36 A SUR	39
18000985	CL 30 SUR	KR 20	KR 20 A	39
18000380	KR 25	CL 28 A SUR	CL 29 SUR	39
18000389	KR 25	CL 29 SUR	CL 29 A SUR	39
18000406	KR 25	CL 29 A SUR	CL 30 SUR	39
18000165	CL 41 SUR	KR 31 BIS	KR 32	39
18000864	CL 31 B	KR 23	KR 23 B	39
18001180	CL 42 A SUR	KR 24	KR 23 B	39
18000106	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	39
18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26 A	39


18000250	KR 26	CL 27 SUR	CL 26 SUR	39
18000291	KR 26	CL 27 A SUR	CL 27 SUR	39
18000201	CL 31 SUR	KR 26 B	KR 26 D	39
18000241	CL 35 C SUR	KR 26 D	KR 26 F	39
18000320	CL 25 A SUR	KR 24 B	KR 24 C	39
18001036	KR 23	CL 35 SUR	CL 34 SUR	39
18001055	KR 23	CL 35 SUR	CL 35 A SUR	39
18001153	KR 19 B BIS	CL 29 s	CL 30 s	39
18001122	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 29 s	39
18001100	CL 28 c sur	KR 19 c	KR 19 B BIS	39
18001099	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 28 B sur	39
18001058	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 B sur	39
18001031	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 s	39
18001084	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	39
18000205	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 31	39
18002249	DG 32G SUR	KR 13 A	KR 13	53
18002090	KR 13 A BIS A	TV 13 A BIS	DG 32 B BIS S	53
18003398	KR 11 D	CL 43 SUR	CL 43 BIS A SUR	53
18003337	KR 11 H BIS	CL 43 BIS A SUR	CL 43 A SUR	53
18002837	DG 32 B SUR	TV 12 G	KR 12 B	53
18004057	KR 12 A	CL 50 D sur	AV Caracas	53
18003547	KR 10 B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	53
30001318	KR 12 K	CL 32 A SUR	CL 32 BIS SUR	53
18001949	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 BIS	53
18001995	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 B BIS SUR	53
18001769	KR 13 K	CL 35 B SUR	CL 36 SUR	53
18001737	KR 13 K	CL 35 A SUR	CL 35 B SUR	53
18001115	KR 19	CL 28 SUR	CL 28 A SUR	39
18001135	KR 19	CL 28 A SUR	CL 28 B SUR	39
18000627	TV 26 A BIS	KR 27	DG 32 C BIS SUR	39
18000661	TV 26 A BIS	DG 45 A SUR	CL 44 SUR	39
18002332	KR 12 J	DG 32 C SUR	DG 32 C BIS SUR	53
18002324	KR 12 J	DG 32 B BIS SUR	DG 32 C SUR	53

18003792	DG 44A	TV 5M	TV 5L	54
18003265	CL 48 C	KR 13	KR 12 BIS	54
18003665	DG 39d sur	KR 9F	TV 9F	54
18003843	KR 4C	CLL 51 S	CLL 52 S	54
18004609	DG 48 K BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	54
18004534	DG 48 J BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	54
18004489	KR 9	CL 49B SUR	CL 49BBIS SUR	54
18004021	DG 46 SUR	TV 5L	TV 5J	54
18003594	CL 50B SUR	KR 13BIS	KR 13	54
18004059	CL 50 B SUR	KR 12	KR 11 D	54
18004104	CL 50 B SUR	KR 11 C	KR 11 D	54
50009406	TV 3	CL 48 L SUR	FINAL DE VIA	54
18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	54
18005054	KR 5 A	CL 48 M	CL 48 L	54
18007711	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5B	54
18004897	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5 C	54
50001100	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5D	54
18004836	CL 48 K s	KR 5D	KR 5 f	54
18005065	CL 48N SUR	KR 5C	KR 5B	54
18005006	KR 5D	CL 48N SUR	CL 48 M SUR	54
18007562	CL 48N SUR	KR 5D	KR 5D BIS	54
18003953	KR 11 D	CL 49 F BIS SUR	CL 49 H SUR	54
18003954	CL 49 H SUR	KR 11 D	KR 12	54
18003863	KR 12A	CL 49 I SUR	CL 49 H SUR	54
18007465	DG 49C BIS A SUR	DG 49 D SUR	VIA CERRADA	54
18004004	CL 49B SUR	KR 11 A	KR 11 A BIS A	54
18007472	CL 49A BIS A SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	54
18007471	CL 49A BIS SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	54
18003871	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49 B SUR	54
18003833	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	54
18003755	CL 49A SUR	KR 11 C	KR 11 B	54
18003896	CL 49A BIS A SUR	KR 11 B	KR 11 A BIS A	54
18003945	CL 49A BIS A SUR	KR 11 A BIS A	KR 11A BIS	54

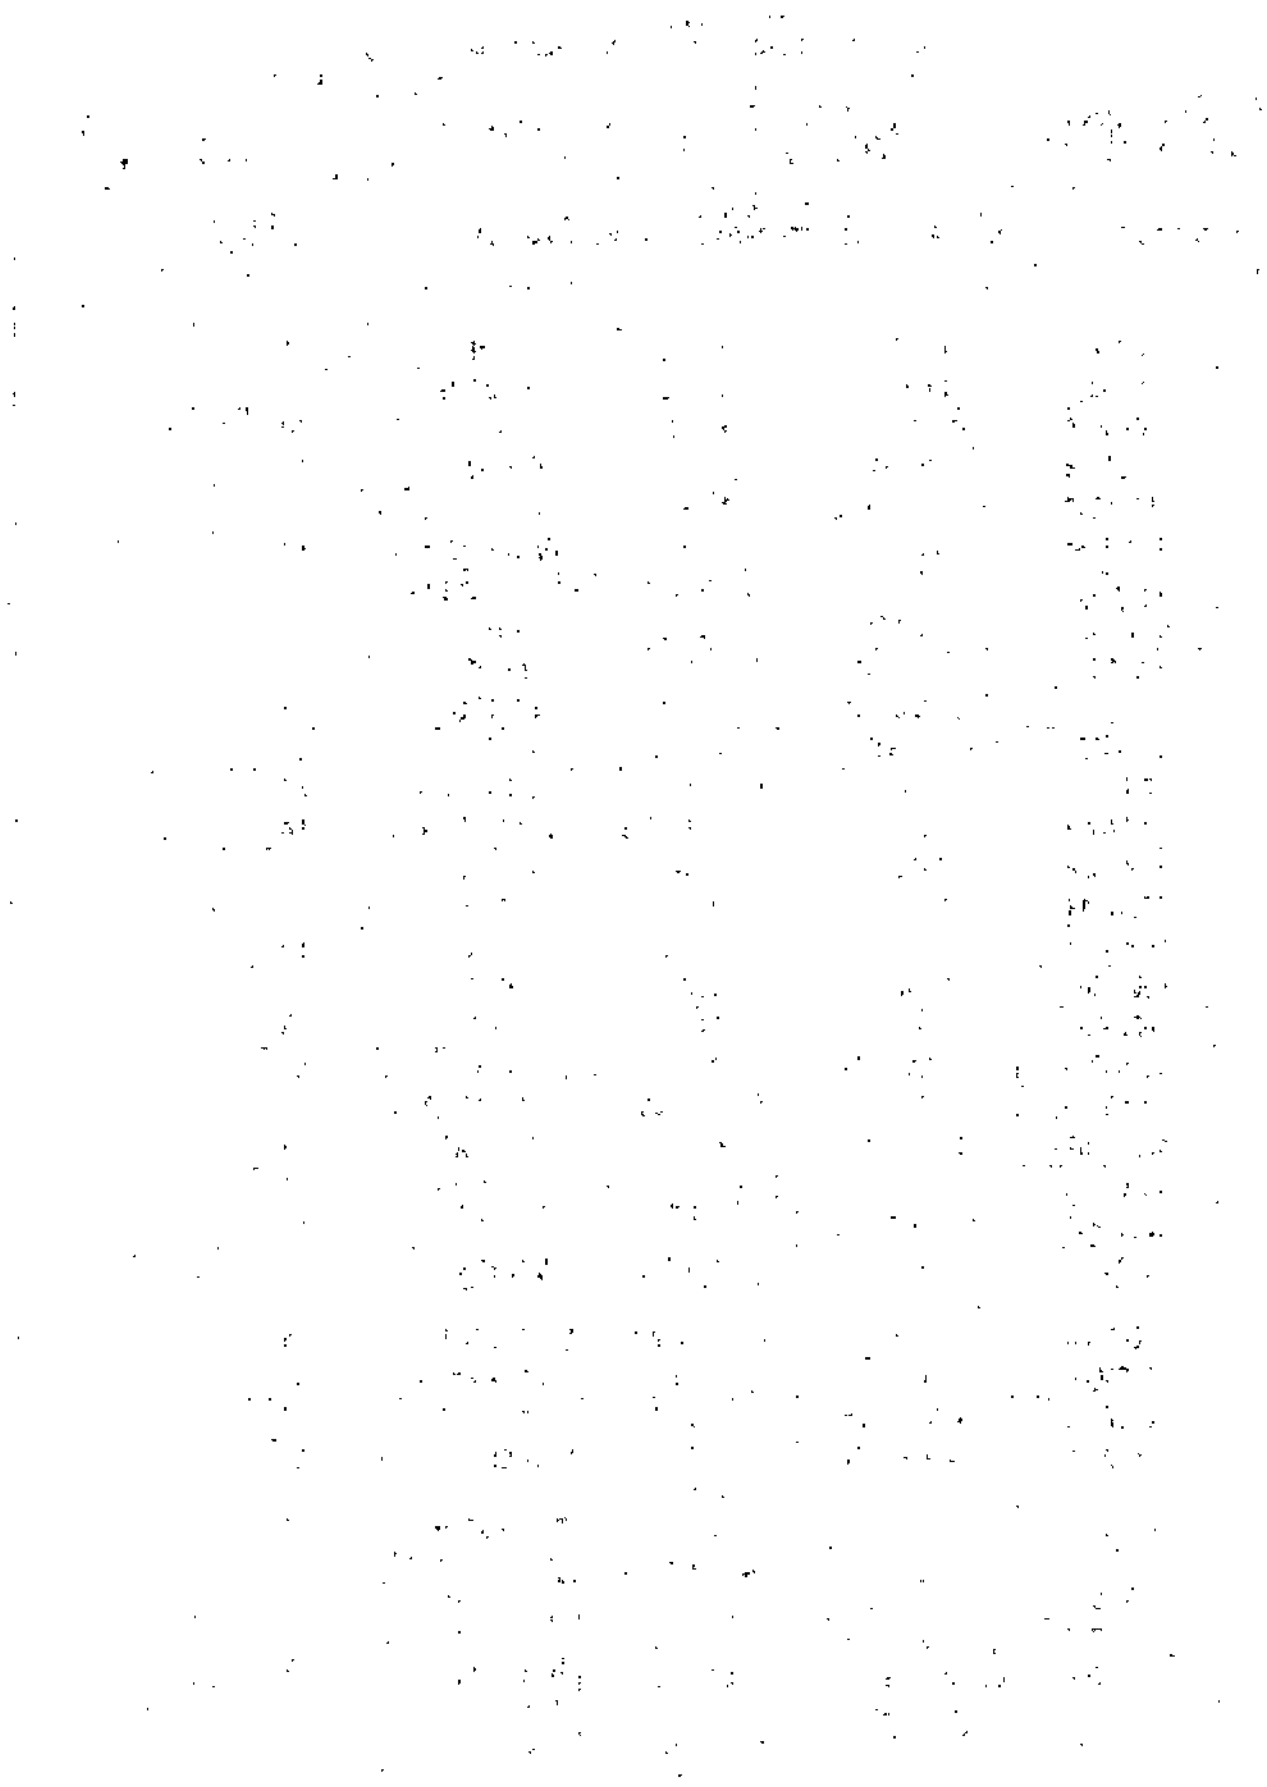

18003895	KR 11A BIS	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	54
18007473	KR 11A BIS	CL 49A SUR	VIA CERRADA	54
50001073	CL 49A SUR	KR 11	KR 11ABIS	54
18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	55
18006296	CLL 49A S	KR 2C E	KR 2D E	55
18006434	CL 49A S	KR 3B E	KR 3C E	55
18007348	KR 2B E	CL 49BISB SUR	TV 1C E	55
18007347	KR 2B E	CL 49BIS SUR	CL 49BISB SUR	55
50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR	55
50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL	55
50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR	55
18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	55
18006329	DG 53 SUR	KR 4 BIS B	KR 4 A	55
18006312	DG 53 SUR	KR 4 A	KR 4 B	55
18005321	CL 48RBIS S	KR 4	KR 5	55
18006046	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	55
18005815	CL 53B SUR	TV 5C	TV 5B Bis	55
18005858	CL 53C SUR	TV 5C	TV 5B Bis	55
18005326	KR 5 C	CL 48 X SUR	CL 48 Y SUR	55
18005229	KR 5BBIS	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	55
18005228	KR 5C	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	55
18003440	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	54
18003460	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	54


Tabla 3 Listado CIV contractuales.

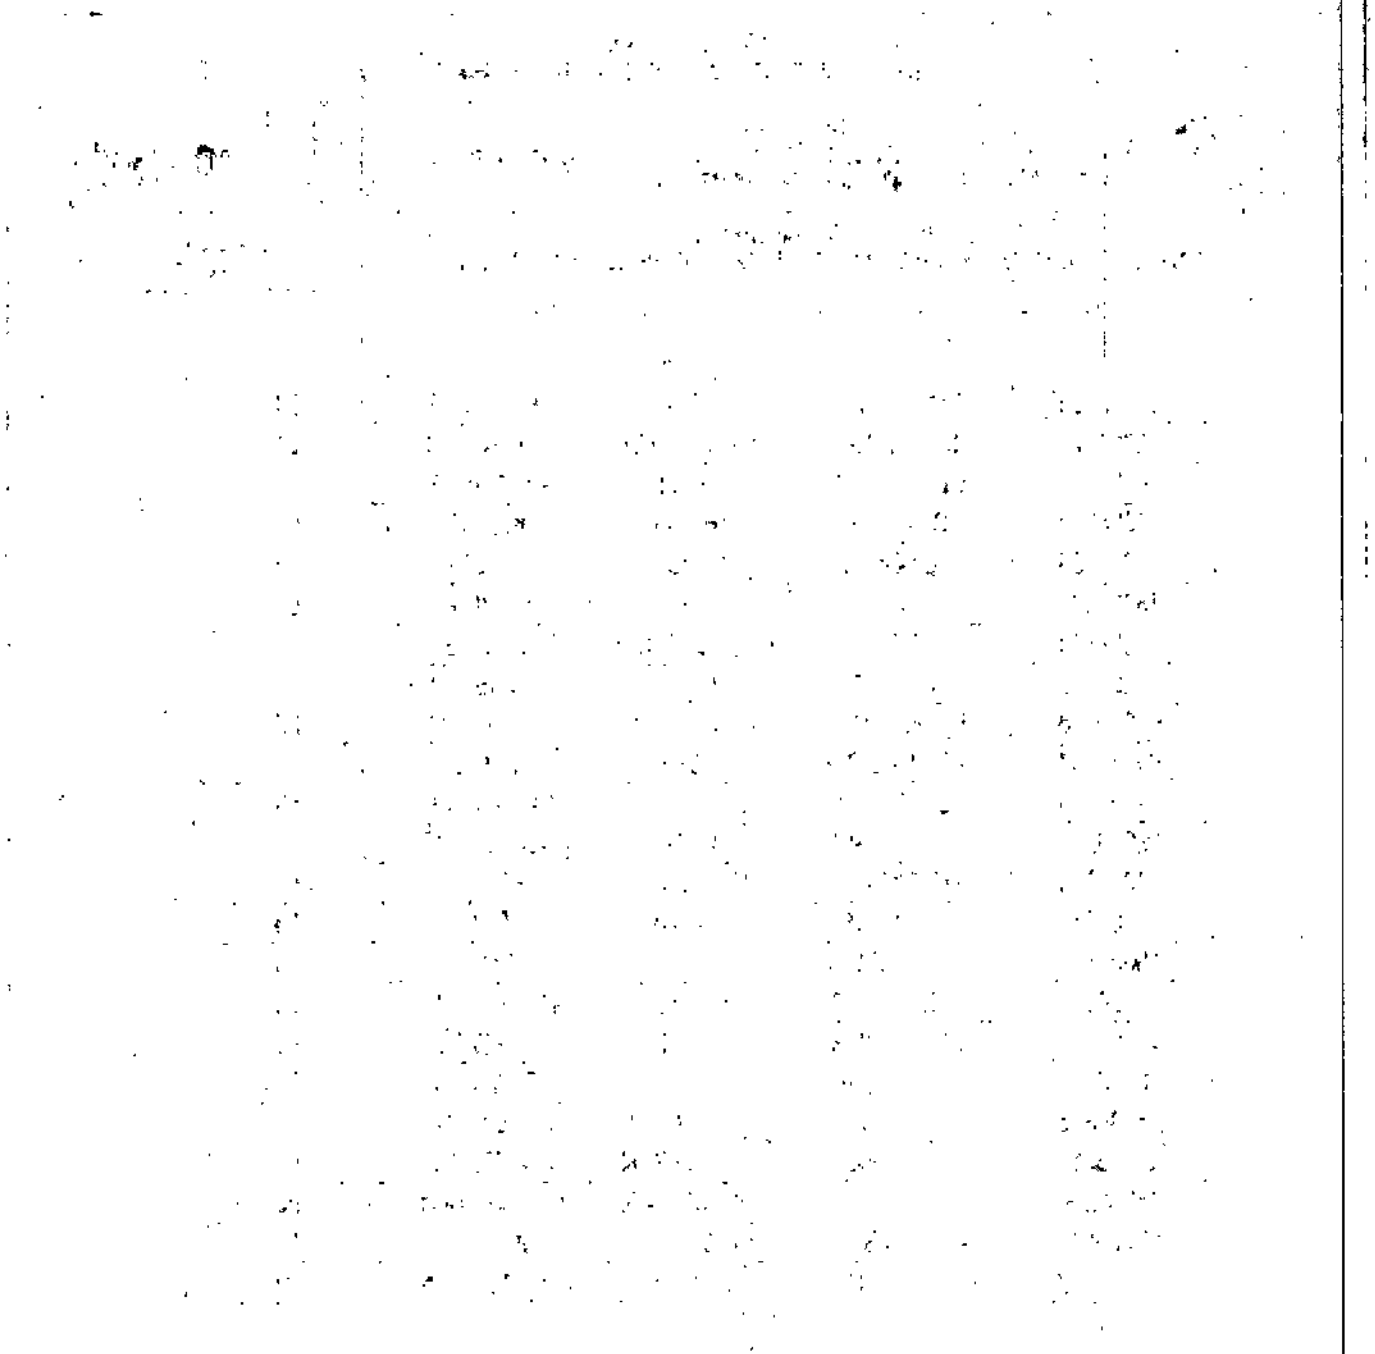

Basados en el listado contractual, se realizó recorridos por cada uno de ellos acompañados por esta interventoría y el supervisor de la Alcaldía Local, observando el estado actual de las vías y las necesidades de la comunidad para poder priorizar todos los CIV. De manera que el supervisor realizo la entrega de un nuevo listado vías ya priorizado en el comité n°2 realizado el día 11 de marzo del 2020.

UPZ	CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	TIPO DE OBRA	ORDEN DE INTERVENCIÒN
53	18002324	CR 12J	DG 32B BIS SUR	DG 32C SUR	Rehabilitación	1
53	18002332	CR 12J	DG 32C SUR	DG 32C BIS SUR	Rehabilitación	1
53	18003547	KR 10 B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	Reconstrucción	1
54	18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	Reconstrucción	1
55	50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR		2
55	50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR		2
55	50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL		2
54	18003833	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	Reconstrucción	3
54	18003863	KR 12A	CL 49 I SUR	CL 49 H SUR	Reconstrucción	3
54	18003871	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49 B SUR	Reconstrucción	3
54	18003895	KR 11A BIS	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	Reconstrucción	3
54	18003896	CL 49A BIS A SUR	KR 11 B	KR 11 A BIS A	Reconstrucción	3
54	18004004	CL 49B SUR	KR 11 A	KR 11 A BIS A	Reconstrucción	3
54	18007465	DG 49C BIS A SUR	DGONAL 49 D SUR	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	18007471	CL 49A BIS SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	Reconstrucción	3

54	18007472	CL 49A BIS A SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	18007473	KR 11A BIS	CL 49A SUR	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	50001073	CL 49A SUR	KR 11	KR 11ABIS	Reconstrucción	3
54	18003265	CL 48 C	KR 13	KR 12 BIS	Reconstrucción	4
55	18005321	CL 48RBIS S	KR 4	KR 5	Reconstrucción	5
39	18000201	CL 31 SUR	KR 26 B	KR 26 D	Rehabilitación	6
55	18005815	CL 53B SUR	TV 5C	TV 5B Bis	Reconstrucción	7
55	18005858	CL 53C SUR	TV 5C	TV 5B Bis	Reconstrucción	7
39	18000320	CL 25A SUR	KR 24B	KR 24C	Rehabilitación	9
39	18000627	TV 26A BIS	CR 27	DG 45A SUR	Rehabilitación	10
39	18000661	TV 26A BIS	DG 45A SUR	CL 44 SUR	Rehabilitación	10
55	18005516	CLL 48 X SUR	CRA 2F	CRA 3	Rehabilitación	11
55	18005530	CLL 48 X SUR	CRA 2 D	CRA 2F	Rehabilitación	11
55	18005628	CLL 48 X SUR	CRA 2	CRA 2 D	Rehabilitación	11
55	18005658	CLL 48 X SUR	CRA 1 G	CRA 2	Rehabilitación	11
55	18005681	CLL 48 X SUR	CRA 1 F	CRA 1 G	Rehabilitación	11
55	18005326	KR 5 C	CL 48 X SUR	CL 48 Y SUR	Rehabilitación	12
54	50009406	TV 3	CL 48 L SUR	FINAL DE VIA	Reconstrucción	12
39	18000089	KR 33	DG 40B SUR	DG 41 SUR	Reconstrucción	12
54	18003792	DG 44A	TV 5M -	TV 5L	Reconstrucción	13
54	18003594	CL 50B SUR	KR 13BIS	KR 13	Rehabilitación	14
53	18004057	KR 12 A	CL 50 D sur	AV Caracas	Reconstrucción	14
39	18000380	KR 25	CL 28 A SUR	CL 29 SUR	Reconstrucción	15

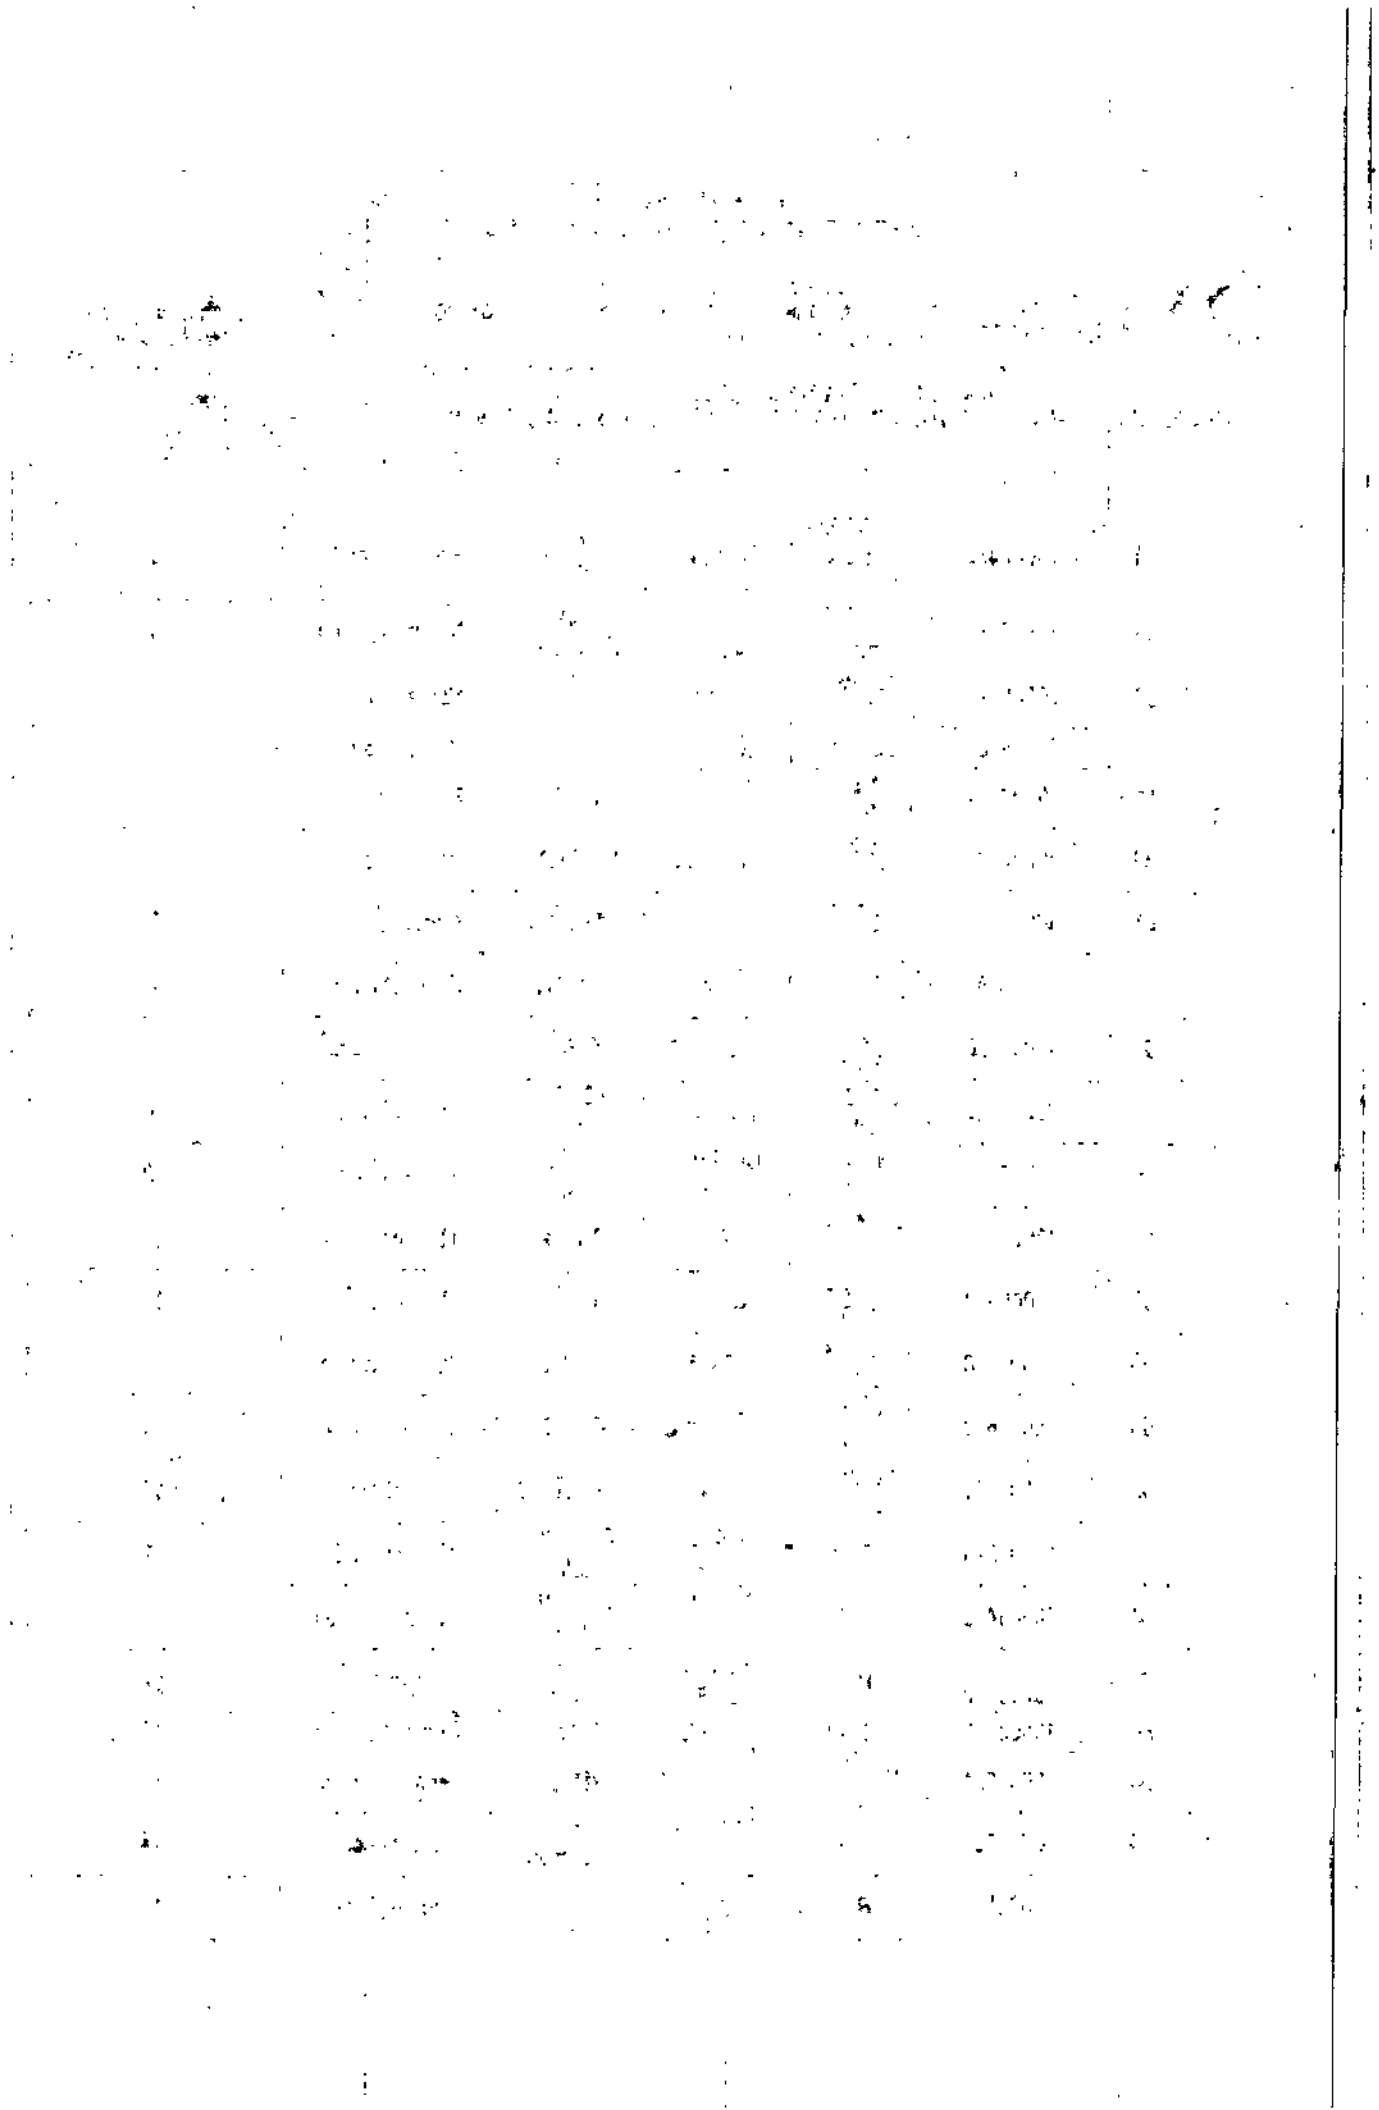

39	18000389	KR 25	CL 29 SUR	CL 29 A SUR	Rehabilitación	15
39	18000406	KR 25	CL 29 A SUR	CL 30 SUR	Rehabilitación	15
55	18005570	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 A	CRA 4 B	Rehabilitación	16
55	18005600	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	Rehabilitación	16
39	18000241	CL 35C sur	KR 26D	KR 26F	Rehabilitación	17
54	18004836	CL 48 K s	KR 5D	KR 5 f	Rehabilitación	18
54	18004897	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5 C	Rehabilitación	18
54	18005006	KR 5D	CL 48N SUR	CL 48 M SUR	Rehabilitación	18
54	18005054	KR 5 A	CL 48 M	CL 48 L	Rehabilitación	18
54	18005065	CL 48N SUR	KR 5C	KR 5B	Rehabilitación	18
54	18007562	CL 48N SUR	KR 5D	KR 5D BIS	Rehabilitación	18
54	18007711	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5B	Rehabilitación	18
54	50001100	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5D	Rehabilitación	18
54	18004534	DG 48 J BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	Rehabilitación	19
54	18004609	DG 48 K BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	Rehabilitación	19
53	18001737	KR 13K	CL 35A SUR	CL 35B SUR	Reconstrucción	20
53	18001769	KR 13K	CL 35B SUR	CL 36 SUR	Reconstrucción	20
54	18003440	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	Rehabilitación	20
54	18003460	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	Rehabilitación	20
55	18006322	CRA 4 BIS B	DG 52 A SUR	DG 53 SUR	Rehabilitación	21
39	18001100	CL 28 c sur	KR 19 c	KR 19 B BIS	Rehabilitación	22
55	18005228	KR 5C	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	Rehabilitación	23

55	18005229	KR 5BBIS	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	Rehabilitación	23
39	18000165	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 32	Rehabilitación	24
39	18000205	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 31	Rehabilitación	24
53	18002837	DG 32 B SUR	TV 12 G	KR 12 B	Reconstrucción	25
55	18005769	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48UBIS SUR	Reconstrucción	26
36	18001567	KR 14 BIS B	CLL 27 A	CLL 27 C	Rehabilitación	27
36	18001692	CL 30 sur	KR 12 L	KR 12 K	Rehabilitación	27
36	18001890	KR 13bis	CL31 F	CL 31 G SUR	Rehabilitación	27
54	18003843	KR 4C	CLL 51 S	CLL 52 S	Rehabilitación	27
55	18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	Rehabilitación	27
55	18006312	DG 53 SUR	KR 4 A	KR 4 B	Rehabilitación	27
55	18006329	DG 53 SUR	KR 4 BIS B	KR 4 A	Rehabilitación	27
39	18001031	KR 19 B BIS	CL 28 A Sur	CL 28 s	Rehabilitación	28
39	18001036	KR 23	CL 35 s	CL 34 s	Rehabilitación	28
39	18001055	KR 23	CL 35 s	CL 35 A s	Rehabilitación	28
39	18001058	KR 19 B BIS	CL 28 A Sur	CL 28 B sur	Rehabilitación	28
39	18001084	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	Rehabilitación	28
39	18001099	KR 19 B BIS	CL 28 c Sur	CL 28 B Sur	Rehabilitación	28
39	18001122	KR 19 B BIS	CL 28 c Sur	CL 29 s	Rehabilitación	28
39	18001153	KR 19 B BIS	CL 29 s	CL 30 s	Rehabilitación	28
39	18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26ª	Rehabilitación	29
39	18000250	KR 26	CL 27 SUR	CL 26 SUR	Rehabilitación	29
39	18000291	KR 26	CL 27 A SUR	CL 27 SUR	Rehabilitación	29
39	18000864	CL 31 B	KR 23	KR 23B	Rehabilitación	29

39	18001180	CL 42A SUR	KR 24	KR 23B	Rehabilitación	29
36	18001795	CL 23 SUR	KR 10 B	KR 10 C	Rehabilitación	30
53	18001949	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 BIS	Rehabilitación	30
36	18001964	CL 26 B sur	KR 11	KR 12	Rehabilitación	30
53	18001995	TV 15 B	DG 32 B	DG 32 B BIS SUR	Rehabilitación	30

Table 4 Listado de CIV priorizados por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe.

En el comité realizado el día 14 de septiembre de 2020, donde se encontraban presentes el contratista, supervisor del fondo local de Rafael Uribe Uribe y la interventoría se modifica el listado de segmentos viales, en el cual se incluyen y se excluyen CIV.

Table 5 Listado CIV excluidos por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe

CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	BARRIO	OBSERVACION DE CONTRATO
X 18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	GOVAROVA	CONTRACTUAL
X 18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	PORTAL	CONTRACTUAL
X 18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	DIANA TURBAY VALLE	CONTRACTUAL
x 50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR	PALERMO	CONTRACTUAL
x 50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR	PALERMO	CONTRACTUAL
x 50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL	PALERMO	CONTRACTUAL
X 18000460	KR 27	CL 39 SUR	CL 36A SUR	INGLES	CONTRACTUAL
X 18000985	CL 30 SUR	KR 20	KR 20 A	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18001115	CR 19	CL 28 SUR	CL 28A SUR	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18001135	CR 19	CL 28A SUR	CL 28 B SUR	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18002090	KR 13 A BIS A	TRSV 13 A BIS	DGONAL 32 B BIS S	COLINAS	CONTRACTUAL
X 18002249	DG 32G SUR	KR 13 A	KR 13	COLINAS	CONTRACTUAL
X 18003337	KR 11 H BIS	CL 43 BIS A SUR	CL 43 A SUR	CARMEN DEL SOL	CONTRACTUAL

18003665	DGONAL 39d sur	KR 9F	TV 9F	PUERTO RICO	CONTRACTUAL
X 18003755	CL 49A SUR	KR 11 C	KR 11 B	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003945	CL 49A BIS A SUR	KR 11 A BIS A	KR 11A BIS	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003953	KR 11 D	CL 49 F BIS SUR	CL 49 H SUR	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003954	CL 49 H SUR	KR 11 D	KR 12	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18004021	DG 46 SUR	TV 5L	TV 5J	ALTOS DE MOLINOS	CONTRACTUAL
X 18004059	CL 50 B SUR	KR 12	KR 11 D	CONSUELO	CONTRACTUAL
X 18004104	CL 50 B SUR	KR 11 C	KR 11 D	CONSUELO	CONTRACTUAL
X 18004489	KR 9	CL 49B SUR	CL 49BBIS SUR	MADRID	CONTRACTUAL
X 18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ	CONTRACTUAL
X 18006046	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ	CONTRACTUAL
X 18006296	CLL 49A S	KR 2C E	KR 2D E	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 18006434	CL 49A S	KR 3B E	KR 3C E	DIANA TURBAY CULTIVOS	CONTRACTUAL
X 18007347	KR 2B E	CL 49BIS SUR	CL 49BISB SUR	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 18007348	KR 2B E	CL 49BISB SUR	TV 1C E	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 30001318	KR 12 K	CL 32 A SUR	CL 32 BIS SUR	COLINAS	CONTRACTUAL



el comité realizado el día 19 de Febrero de 2021, donde se encontraban presentes el contratista, supervisor del fondo local de Rafael Uribe Uribe y la interventoría se define un nuevo listado de segmentos viales priorizados para la respectiva adición.

CIV	BARRIO	UPZ	TIPO DE INTERVENCION	EJE VIAL	INICIO	FIN	PRIORIDAD
18005769	Diana Turbay Lanceros	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48UBIS SUR	Inicial
18001055	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23	CL 35 s	CL 35 A s	Inicial
18001084	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	Inicial
18000783	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23D	CL 32A SUR	CL 33 SUR	Inicial
18000742	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23F	CL 32A SUR	CL 33 SUR	Inicial
18000595	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23F	CL 31 S	CL 31ABIS S	Inicial
18005570	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 A	CRA 4 B	Inicial
18005600	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	Inicial
18001987	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	CL 32 C	DG 32 F SUR	Inicial
18002022	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	DG 32 F SUR	DG 32 G SUR	Inicial
18002069	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	DG 32 G SUR	DG 32 H SUR	Inicial
18002189	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 F BIS	Inicial
18002157	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 B BIS SUR	Inicial
18006943	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 F BIS	DG 32 F BIS	Inicial
18005132	Marruecos	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	KR 5 M	CL 49 A BIS	CL 49 C	Inicial
18004621	Principe de Bochica	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	DG 48I SUR	KR 5A	KR 5B	Ultima
18004626	Principe de Bochica	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	DG 48I SUR	KR 5B	KR 5C	Ultima
18000106	Santiago Pérez	SAN JOSE (36)	REHABILITACION	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	Ultima
18000159	Santiago Pérez	QUIROGA (39)	REHABILITACION	CL 26 SUR	KR 26	KR 26A	Ultima
18003440	Arboleda	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	Muy Ultima
18003460	Arboleda	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	Muy Ultima
18001737	Rio de Janeiro	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13K	CL 35A SUR	CL 35B SUR	Muy Ultima
18001769	Rio de Janeiro	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13K	CL 35B SUR	CL 36 SUR	Muy Ultima

Tabla 6 Listado segmentos viales incluidos

A la fecha se continúan actividades rehabilitación y reconstrucción en los frentes La paz, Callejón de santa Barbara, Callejón Quiroga, Diana Turbay Lanceros, Bochica, Príncipe de Bochica, Colinas, Calle del tango y Marruecos.

CARRERA 12 D, DESDE DIAGONAL 32 C SUR HASTA DIAGONAL 32 B SUR - CIV 18002611 MANTENIMIENTO

Este segmento vial requiere una intervención tipo mantenimiento en horario nocturno, en el cual se realizó instalación de PMT y se inicia con demolición de las placas existentes, instalación de geomalla con el fin de darle así resistencia a la flexibilidad que pueda tener el asfalto, realizando su extendido de forma totalmente plana y uniforme y finalmente se hace la instalación, nivelación y compactación de mezcla asfáltica para la finalización al mantenimiento.



Ilustración 1 Instalación PMT

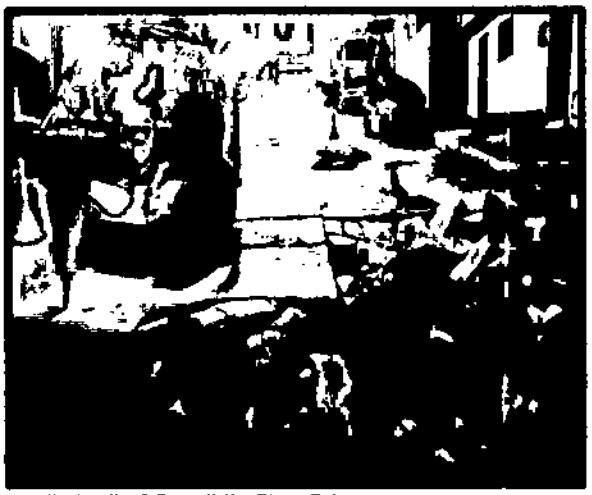


Ilustración 2 Demolición Placa Existente

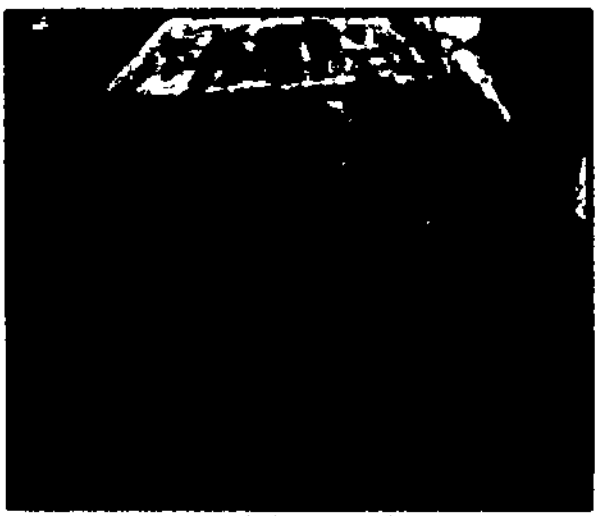


Ilustración 3 Instalación Geomalla



Ilustración 4 Instalación Asfalto

Carrera 23, desde Calle 35 sur hasta Calle 36 sur- Espacio Público CIVs 18001055 – 18001084

Este segmento vial requiere una intervención de espacio público, en el cual se realiza instalación de PMT aprobado por la interventoría y se da inicio con la demolición del andén, excavación manual, rellenos y fundida de andenes para el mejoramiento de los accesos a las viviendas.



Ilustración 5 Instalación Malla Electrosoldada



Ilustración 6 Instalación Geotextil



Ilustración 7 Extensión de Sello



Ilustración 8 Fundida Concreto

Carrera 4 Bis B, Desde Diagonal 52 A Sur hasta Diagonal 53 Sur – Rehabilitación CIV 18006322 LA PAZ

El tramo requiere una intervención de tipo rehabilitación en el cual ya se realizo fundida del segmento vial y se encuentra en intervención de espacio público, en el cual se inicia con la actividad de demolición de espacio público existente y se rellenos para la estabilización del espacio público cumpliendo con las especificaciones técnicas entregadas por el especialista, se extiende geotextil y 0.45 de sub base, nivelados y compactados, adicionalmente se hace la construcción de cajas de inspección de 60x60 y de muros estructurales, se realiza corte, figurado y amarre de malla electrosoldada y finalmente fundida de andenes en ambos costados de la vía.



Ilustración 9 Construcción Cajas de Inspección

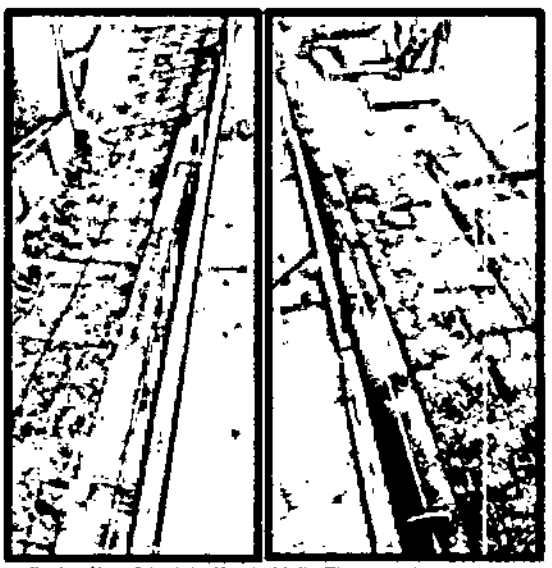


Ilustración 10 Instalación de Malla Electrosoldada



Ilustración 11 Fundida Espacio Público

Carrera 5 A, Desde Calle 48 M sur hasta Calle 48 L – Espacio Público CIV 18005054 Bochica

Este segmento vial requiere intervención de espacio público, se realizó instalación de PMT, siendo este revisado y aprobado por la interventoria se da inicio con excavación mecánica del tramo, extensión de Geotextil, extensión y compactación de Sub Base, instalación de sardinel y fundida de segmento vial.



Ilustración 12 Excavación Mecánica

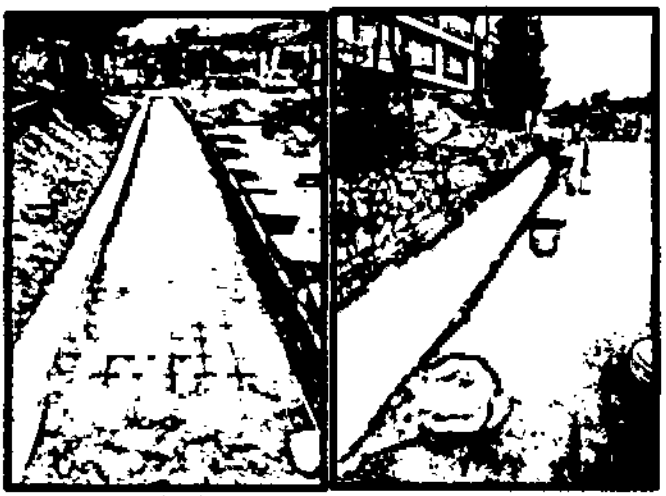


Ilustración 13 Instalación de malla electrosoldada y Geotextil



Ilustración 14 Instalación Sardinel

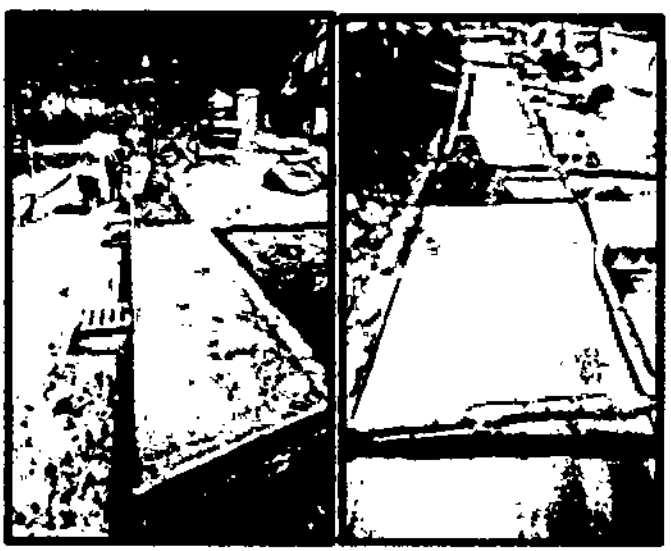


Ilustración 15 Fundida Concreto

Diagonal 48 J Bis Sur, Desde Transversal 5 Q hasta Transversa 5 Q Bis A – Rehabilitación CIV 18004534 CALLEJON

El tramo requiere un tipo de intervención de rehabilitación, en el cual ya se encuentra fundido el segmento vial y se da inicio con la adecuación de espacio público, en el cual se realiza rellenos para la estabilización del espacio público cumpliendo con las especificaciones técnicas, asimismo, se hace la instalación sardinel, construcción de las cajas domiciliarias para la conexión de la tubería de aguas residuales de las viviendas y se realiza la fundida de los respectivos andenes con concreto.



Ilustración 16 Extensión y Compactación de Subbase

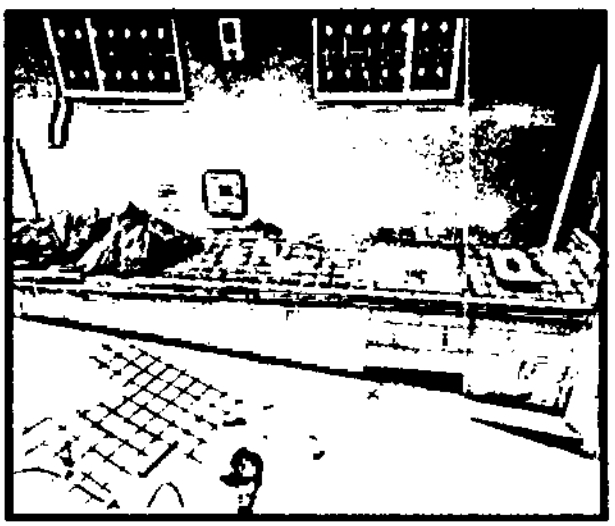


Ilustración 17 Instalación de Malla Electrosoldada



Ilustración 18 Construcción de cajas de inspeccion



Ilustración 19 Fundida Espacio publico

Calle 26 D Sur, Desde Carrera 11 D hasta Diagonal 32 A Sur - Mantenimiento CIV 18002851.

Este segmento vial requiere una intervención tipo mantenimiento en el cual se realizó instalación de PMT y se inicia con demolición de las placas existentes, instalación de geomalla con el fin de darle así resistencia a la flexibilidad que pueda tener el asfalto, realizando su extendido de forma totalmente plana y uniforme y finalmente se hace la instalación, nivelación y compactación de mezcla asfáltica para la finalización al mantenimiento.


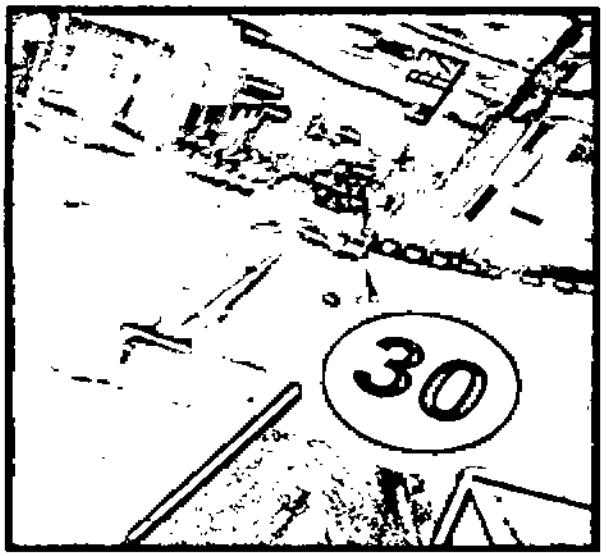


Ilustración 20 Instalación señalización

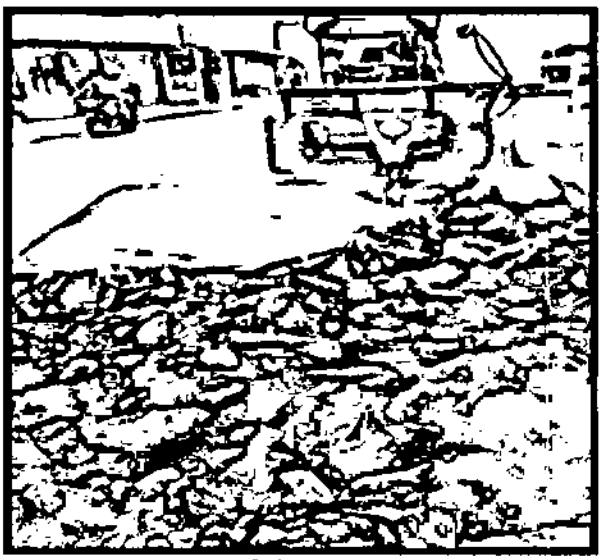

Ilustracion 21 Demolición

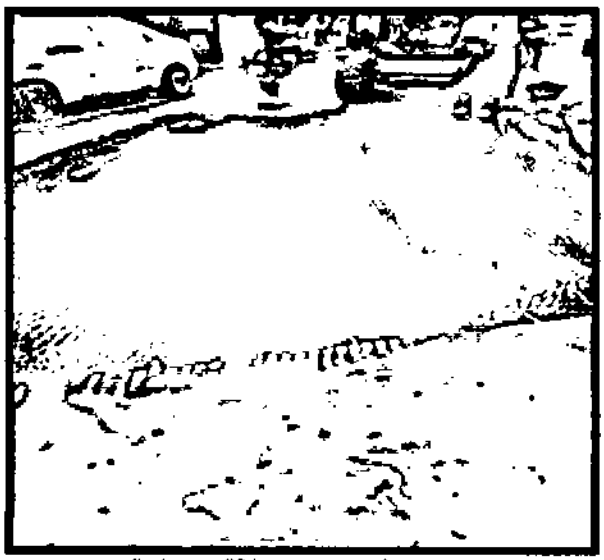


Ilustración 22 Instalación de Geomalla



Ilustración 23 Extensión Mezcla asfaltica

Diagonal 48 I Sur, Desde Carrera 5 A hasta Carrera 5 C - Rehabilitación CIV 18004621 – 18004626.

Este segmento vial requiere intervención de espacio público, se realizó instalación de PMT, siendo este revisado y aprobado por la interventoría se da inicio con excavación mecánica del tramo, extensión de Geotextil, extensión y compactación de Sub Base, instalación de sardinel y fundida de segmento vial.



Ilustración 24 Instalación PMT



Ilustración 25 Extensión de Sello



Ilustración 26 Extensión de MBR

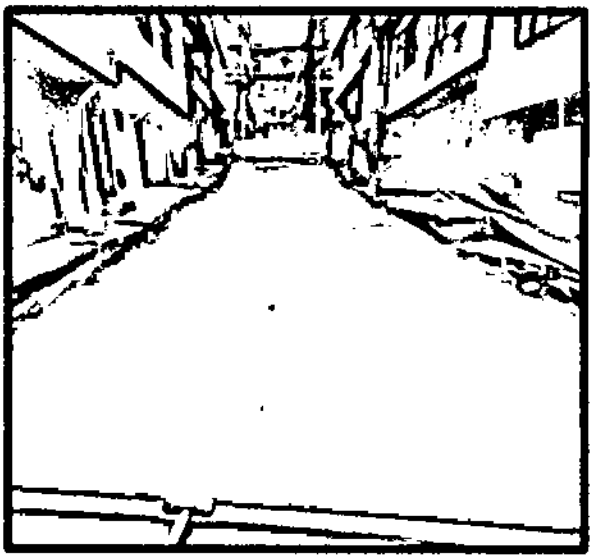


Ilustración 27 Fundida de Concreto

Carrera 23 F, Desde Calle 31 Sur hasta Calle 33 Sur – Espacio Público CIV 18000783 - 18000742.

Este segmento vial requiere una intervención de espacio público, en el cual se realiza instalación de PMT aprobado por la interventoría y se da inicio con la demolición del andén, excavación manual, rellenos para el mejoramiento de los accesos a las viviendas.

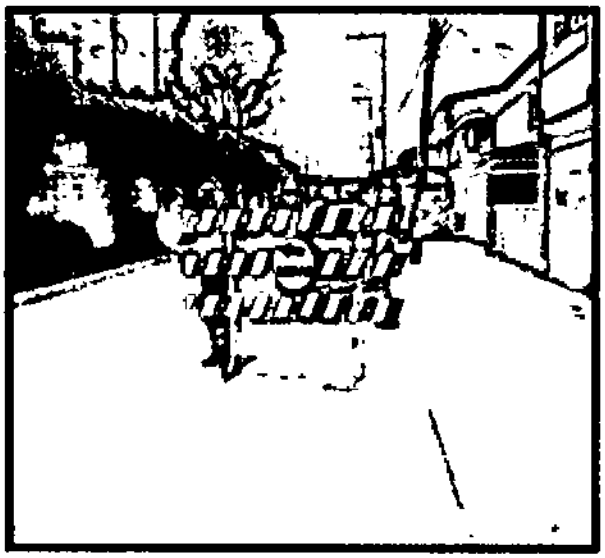


Ilustración 28 Instalación PMT



Ilustración 29 Excavación Manual



Ilustración 30 Extensión Geotextil



Ilustración 31 Extensión de Sub Base

Carrera 13 A, Desde Diagonal 32 D Bis hasta Diagonal 32 F Bis - Rehabilitación CIV 18002157 – 18002189 – 18006943 COLINAS

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, revisado y aprobado por esta interventoría y se da inicio con la excavación mecánica del tramo.



Ilustración 32 Instalación PMT

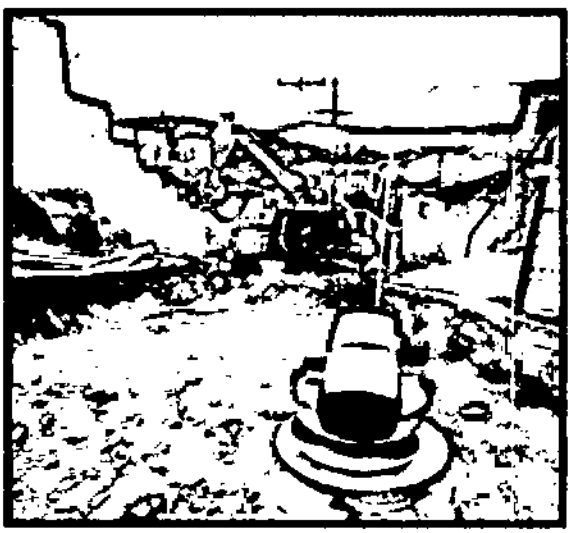


Ilustración 33 Excavación Mecánica

Carrera 13 B, Desde Diagonal 32 F Sur hasta Diagonal 32 H Sur - Rehabilitación CIV 18002022 – 18002069.TANGO

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, revisado y aprobado por esta interventoría y se da inicio con la excavación mecánica del tramo.



Ilustración 34 Instalación PMT

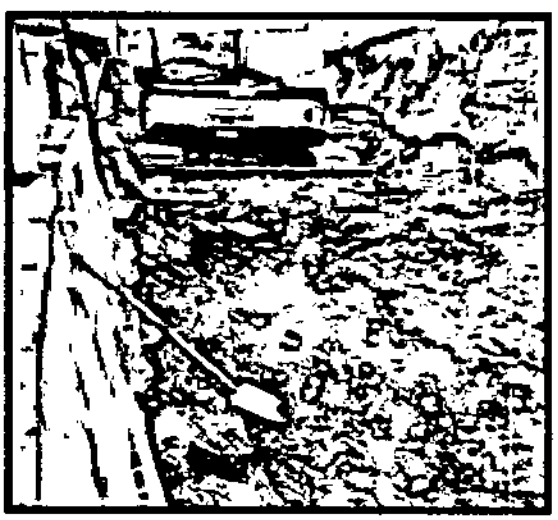


Ilustración 35 Excavación Mecánica

Carrera 1 A, Desde Calle 48 X sur hasta Calle 48 U BIS sur – Rehabilitación CIV 18005769 Lanceros

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, revisado y aprobado por esta interventoría, se realiza fundida de cárcamo, extensión y compactación de subbase y fundida de segmento vial.

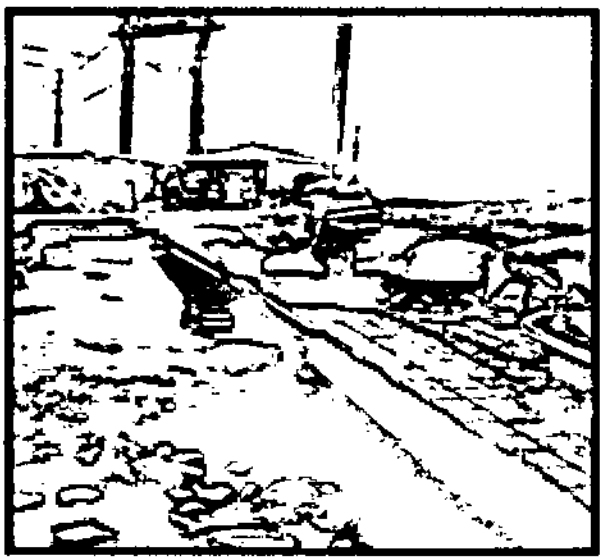


Ilustración 36 Fundida Cárcamo



Ilustración 37 Extensión y Compactación de Sub Base

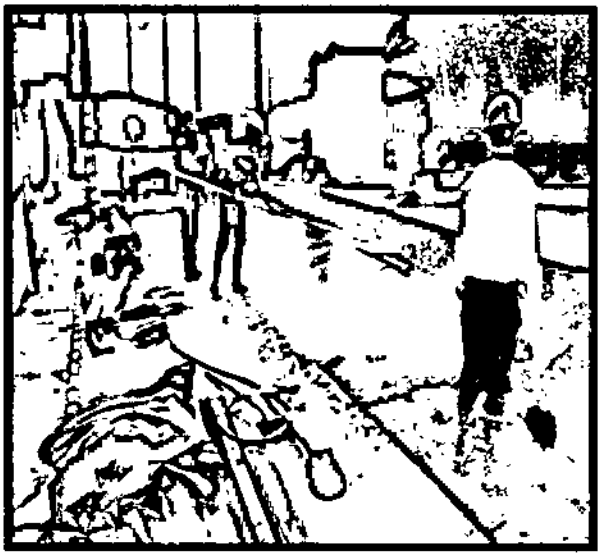


Ilustración 38 Construcción de Cárcamo

Carrera 5 M, Desde Calle 49 A Bis hasta la Calle 49 C - Reconstrucción CIV 18005132.

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, revisado y aprobado por esta interventoría y se da inicio con la excavación mecánica del tramo.

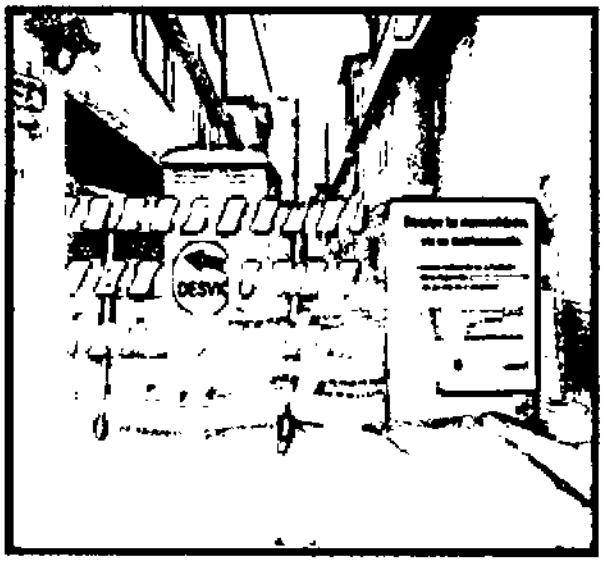


Ilustración 39 Instalación PMT

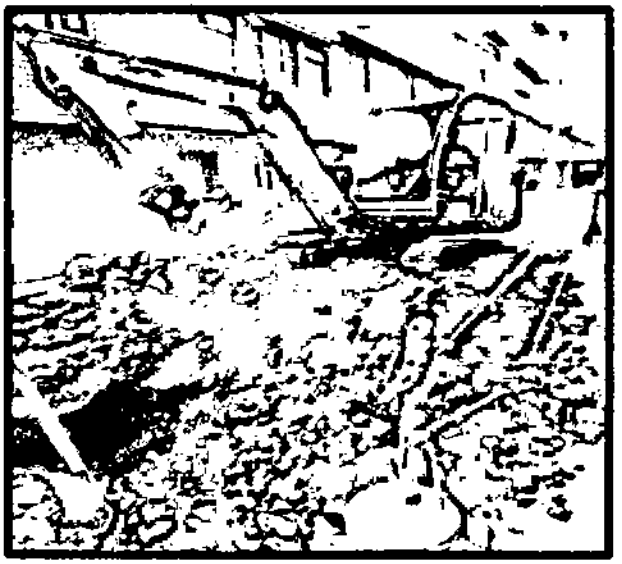


Ilustración 40 Excavación Mecánica

AVANCE DE OBRA

De acuerdo con la información anterior se puede concluir que el avance financiero del contratista es del 90% al acta 9.

6.2 Objetivos De La Calidad

Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto de interventoría están planteados de la siguiente forma:

- Se realizó el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoria oportuna y eficaz.
- Revisar y aprobar diagnósticos de las zonas realizados por el contratista.
- Se llevó a cabo revisión de un nuevo presupuesto más aterrizado para el proyecto por parte del constructor.
- Revisar certificados de calidad de los materiales puestos en obra.
- Verificar el proceso constructivo empleado por el contratista.
- Revisar todos los ensayos de laboratorio tomados en obra.

6.3 Responsabilidades Y Obligaciones Del Interventor

El interventor será responsable:

- Realizar control, la supervisión y la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. De la misma forma, debe ejercer control técnico, ambiental, de gestión social, financiera, presupuestal, operativo y administrativo del proyecto.
- Ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con las actividades formuladas para la primera etapa, descritas en la propuesta, la cual forma parte integral del contrato.
- Mantener el personal profesional ofertados en la propuesta.
- Semanalmente o cada vez que se estime conveniente deberán celebrarse reuniones de seguimiento.
- Revisar y aprobar el plan y el programa de trabajo e inversiones dentro del plazo señalado en el cronograma de actividades.
- Revisar diagnósticos y presupuestos de las vías a intervenir los cuales serán adelantados en los tres primeros meses del convenio y se entregarán previo a la iniciación de las obras.
- Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del convenio, si a ello hubiere lugar.

Presentar informes mensuales:

- De carácter Técnico y Administrativo

El interventor debe realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del convenio, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultades, el cumplimiento de obligaciones y la ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles, además de las previstas en las condiciones técnicas y todas aquellas que se desprenden del objeto del convenio de Interventoría, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

Además, tiene como obligación velar por todas las acciones encaminadas al cumplimiento del proceso de Interventoría, para llevar el acatamiento de las mejores prácticas Administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultad, el cumplimiento de obligaciones y las ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles.

- De carácter Ambiental, SISO y Social

El interventor tiene como responsabilidad vigilar, controlar e inspeccionar el cumplimiento Ambiental, Social y de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de todas las actividades que se desarrollan en el entorno de la obra.

6.4 Reuniones De Control

Se llevarán a cabo reuniones de comité técnico entre el contratista, la Interventoría, el supervisor y apoyo a la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía según lo estipulado en los términos de referencia del proyecto. En las cuales se revisarán los avances y retrasos presentados en cada uno de los ámbitos que abarca el proyecto de obra de los segmentos viales en ejecución y además se expondrán las dificultades presentadas en los procesos necesarios para dar inicio con la ejecución de nuevos CIV.

6.5 Ejecución Del Proyecto

Para la ejecución del proyecto se dispuso de ciertos elementos de entrada, etapas y actividades de realización requeridos para el desarrollo a cabalidad de este. A continuación, se presentan cuáles son estos objetos necesarios para la aplicación de la Interventoría.

Elementos De Entrada Del Proyecto

Se seguirá durante todas las fases del proyecto la normatividad vigente a saber:

- Manual / Cartilla Interventoría IDU.
- Cuadros de Seguimientos.

6.6 Diseño Y Desarrollo

Asistencia Técnica Y Desarrollo Del Proyecto


INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S y su equipo profesional realiza la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para las obras de la malla vial local en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C, del contrato de obra No. 321 de 2018 suscrito por CONSORCIO RU 2020 y tendrá en cuenta las siguientesacciones:

- Suministrar al FONDO informes periódicos, de forma semanal con corte los viernes, del CONTRATO y realizar los controles en forma clara, correcta y precisa de los aspectos técnicos, administrativos, contables y las estadísticas.
- Autorizar los pagos de los servicios prestados por el Contratista cumpliendo con el objeto del contrato, el presupuesto del CONTRATO y los requerimientos enmarcados dentro de la Ley.

- Supervisar el trámite y cumplimiento de los respectivos procedimientos y normas requeridas en desarrollo del contrato 321 de 2019.
- Para lograr los objetivos señalados previamente, el FONDO apalancará la labor de la Interventoría mediante las siguientes acciones:
- Definir junto con la interventoría y el Contratista, el área de aferencia de los TRAMOS VIALES A INTERVENIR, los sitios y tipo de intervención para dar cumplimiento a su objeto.
- Dar aprobación al programa de ejecución, del plan de inversiones y del flujo de fondos del convenio.
- Destinar los recursos necesarios para cubrir los costos directos, indirectos y la Interventoría del CONTRATO.

6.7 Logística Del Proyecto

Tal como se indicó anteriormente se plantea la Logística principal para el desarrollo del Contrato, que se constituirían en una metodología ordenada de trabajo. En esta se indica la participación de los actores, las acciones a seguir y el producto resultado de estas acciones.

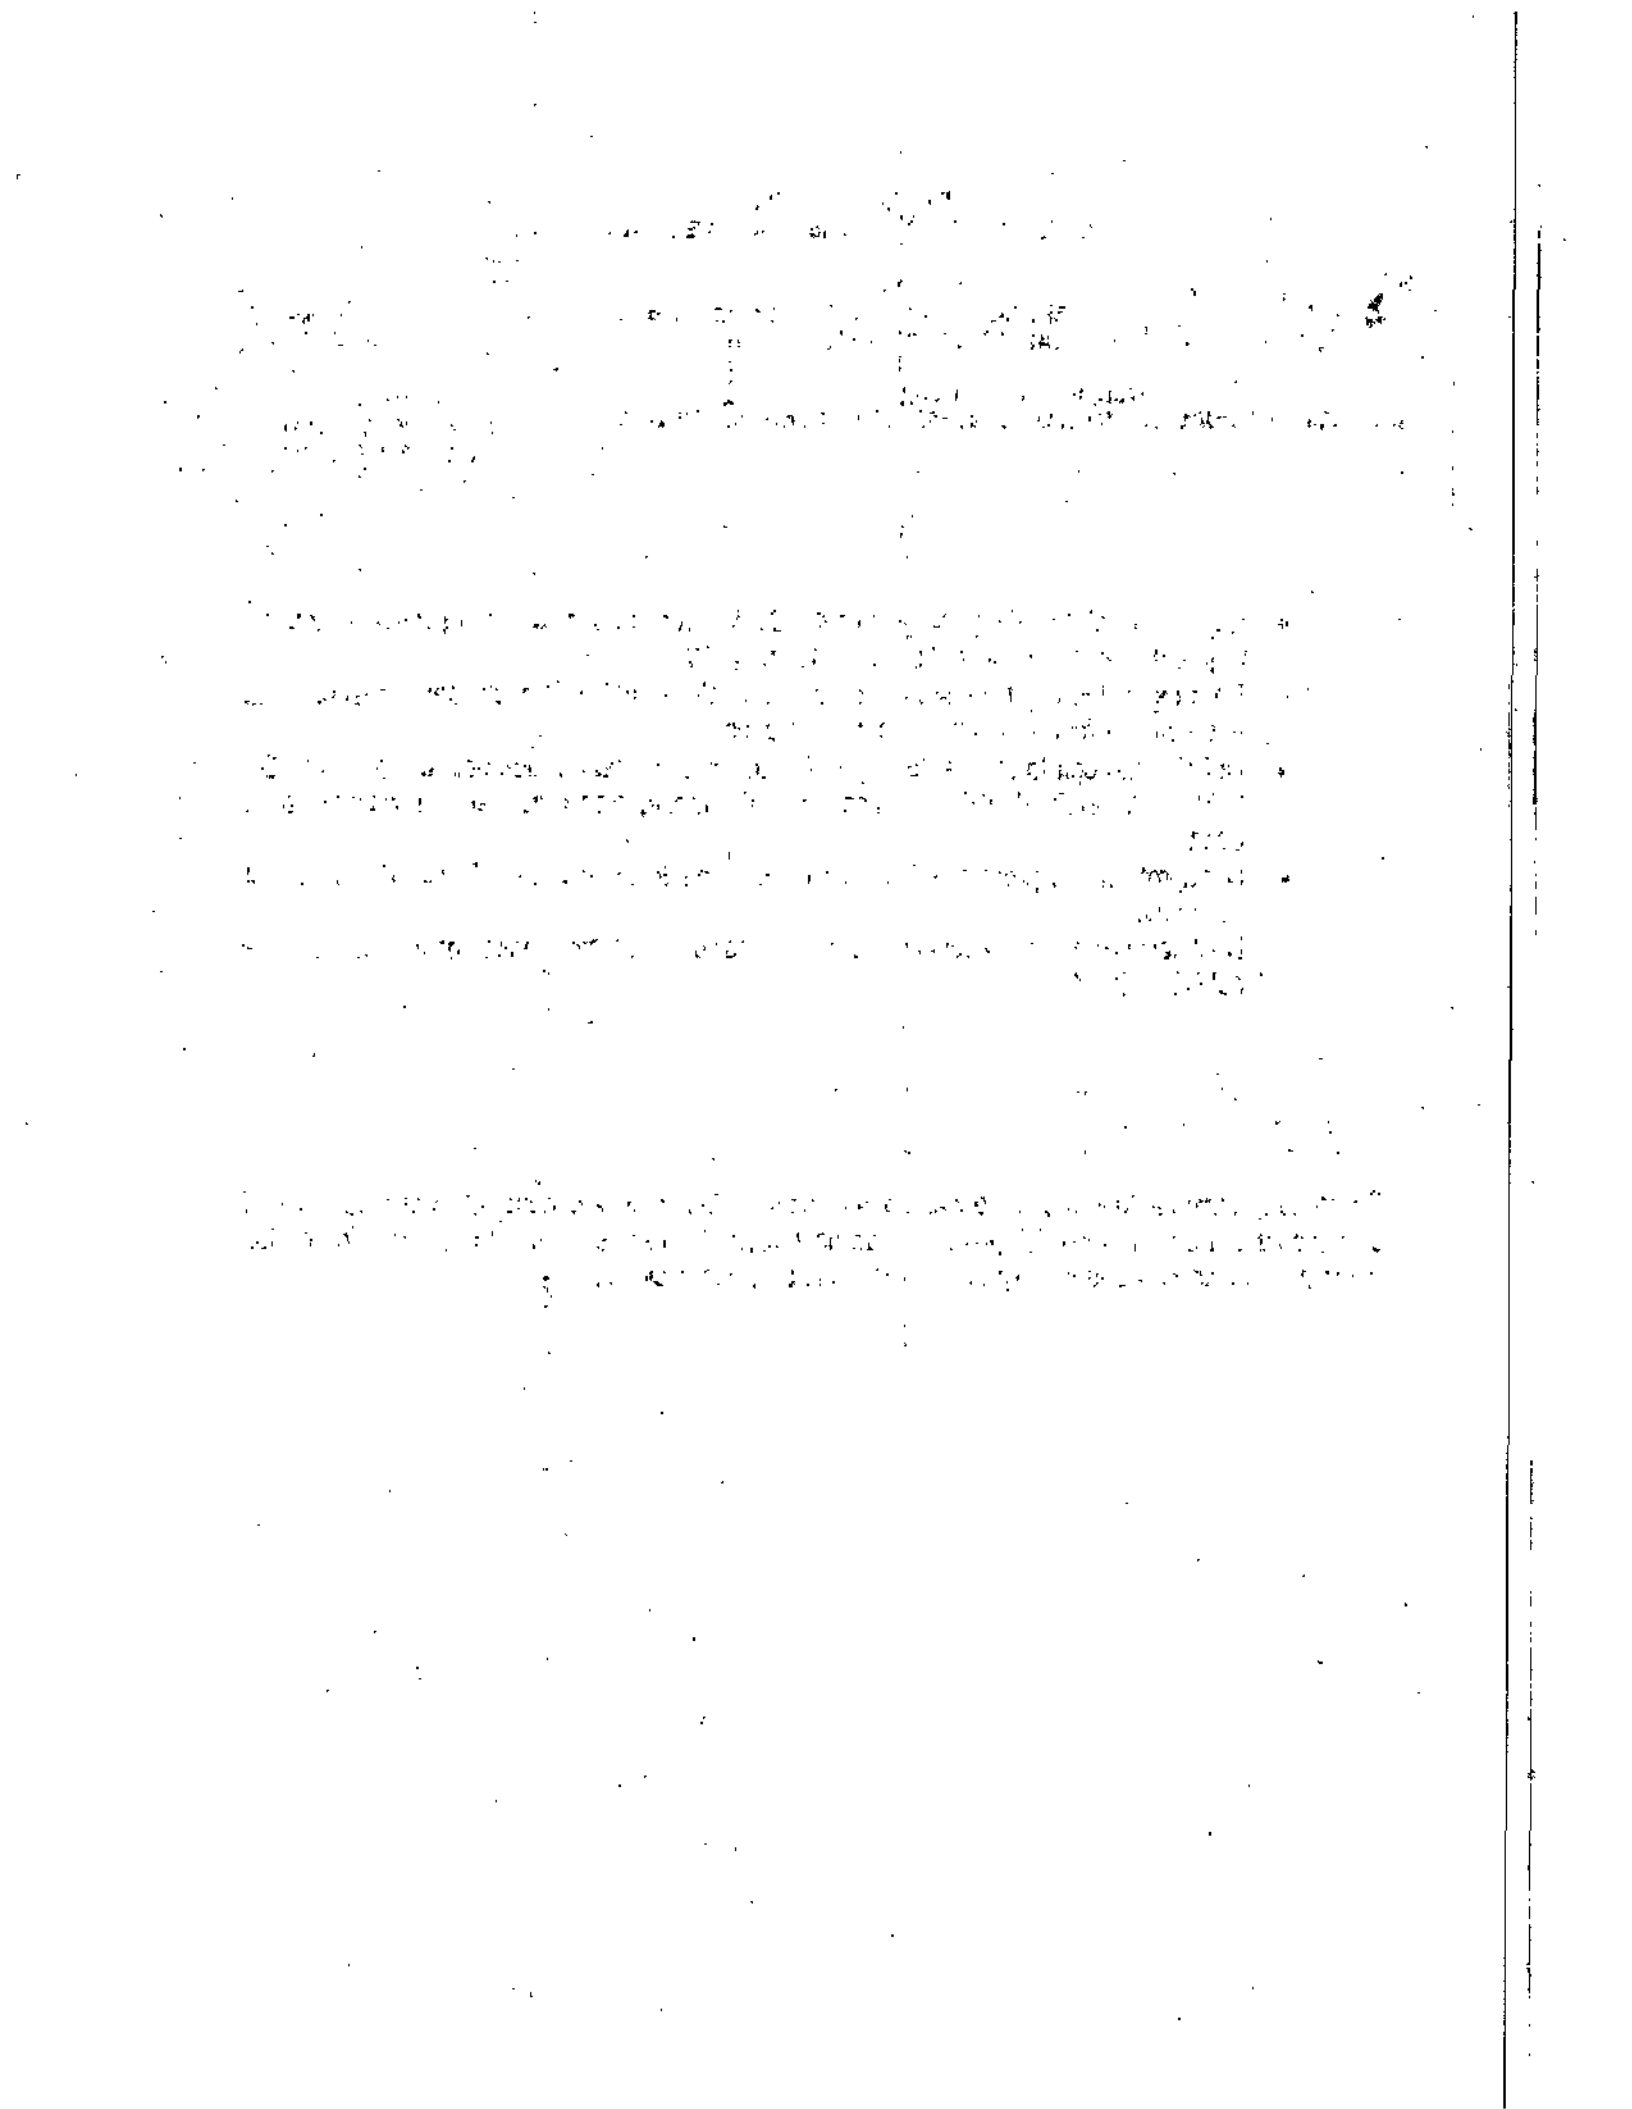

7. Conclusiones y recomendaciones

- Se realiza el debido acompañamiento de las labores de obra realizadas por el contratista y velando por el correcto proceso constructivo utilizado en obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

- Los CIV que se encuentran en ejecución cuentan con la correcta instalación de PMT el cual ha sido revisado y avalado por esta interventoría. De igual manera se solicita al contratista estar atento a la fecha de finalización de este para realizar su renovación a tiempo.

- Se continúa con la revisión de los ensayos de densidad practicados a los CIVs intervenidos, los cuales cumplen con el porcentaje establecido.

- El área social de la interventoría continúa haciendo acompañamiento a todas las actividades asociadas a esta área, ejecutadas por el contratista, con la finalidad que la comunidad quede conforme con la actividad a ejecutar.

- En el transcurso del mes se han registrado fuertes lluvias, lo cual afecta en el momento de la ejecución de las diferentes actividades programadas en los segmentos viales


- Todo el personal de esta interventoría se ha acogido y cumplido a cabalidad el protocolo de bioseguridad del contratista, con el fin de mitigar el contagio por COVID 19.

- Se destaca la correcta implementación del protocolo de bioseguridad por parte del contratista, logrando mitigar el riesgo de contagio por COVID 19.

- La interventoría continúa verificando que el contratista continúe con el personal necesario en cada frente, de igual manera la maquinaria y herramienta para realizar las labores diarias.

- Se recomienda al contratista continuar con el rendimiento que llevan en las labores de obra y de ser posible mejorarlo.

- Se inicia con la revisión de los remates finales de obra, de manera que cada CIV quede listo para recibir por la interventoría y el apoyo a la supervisión.

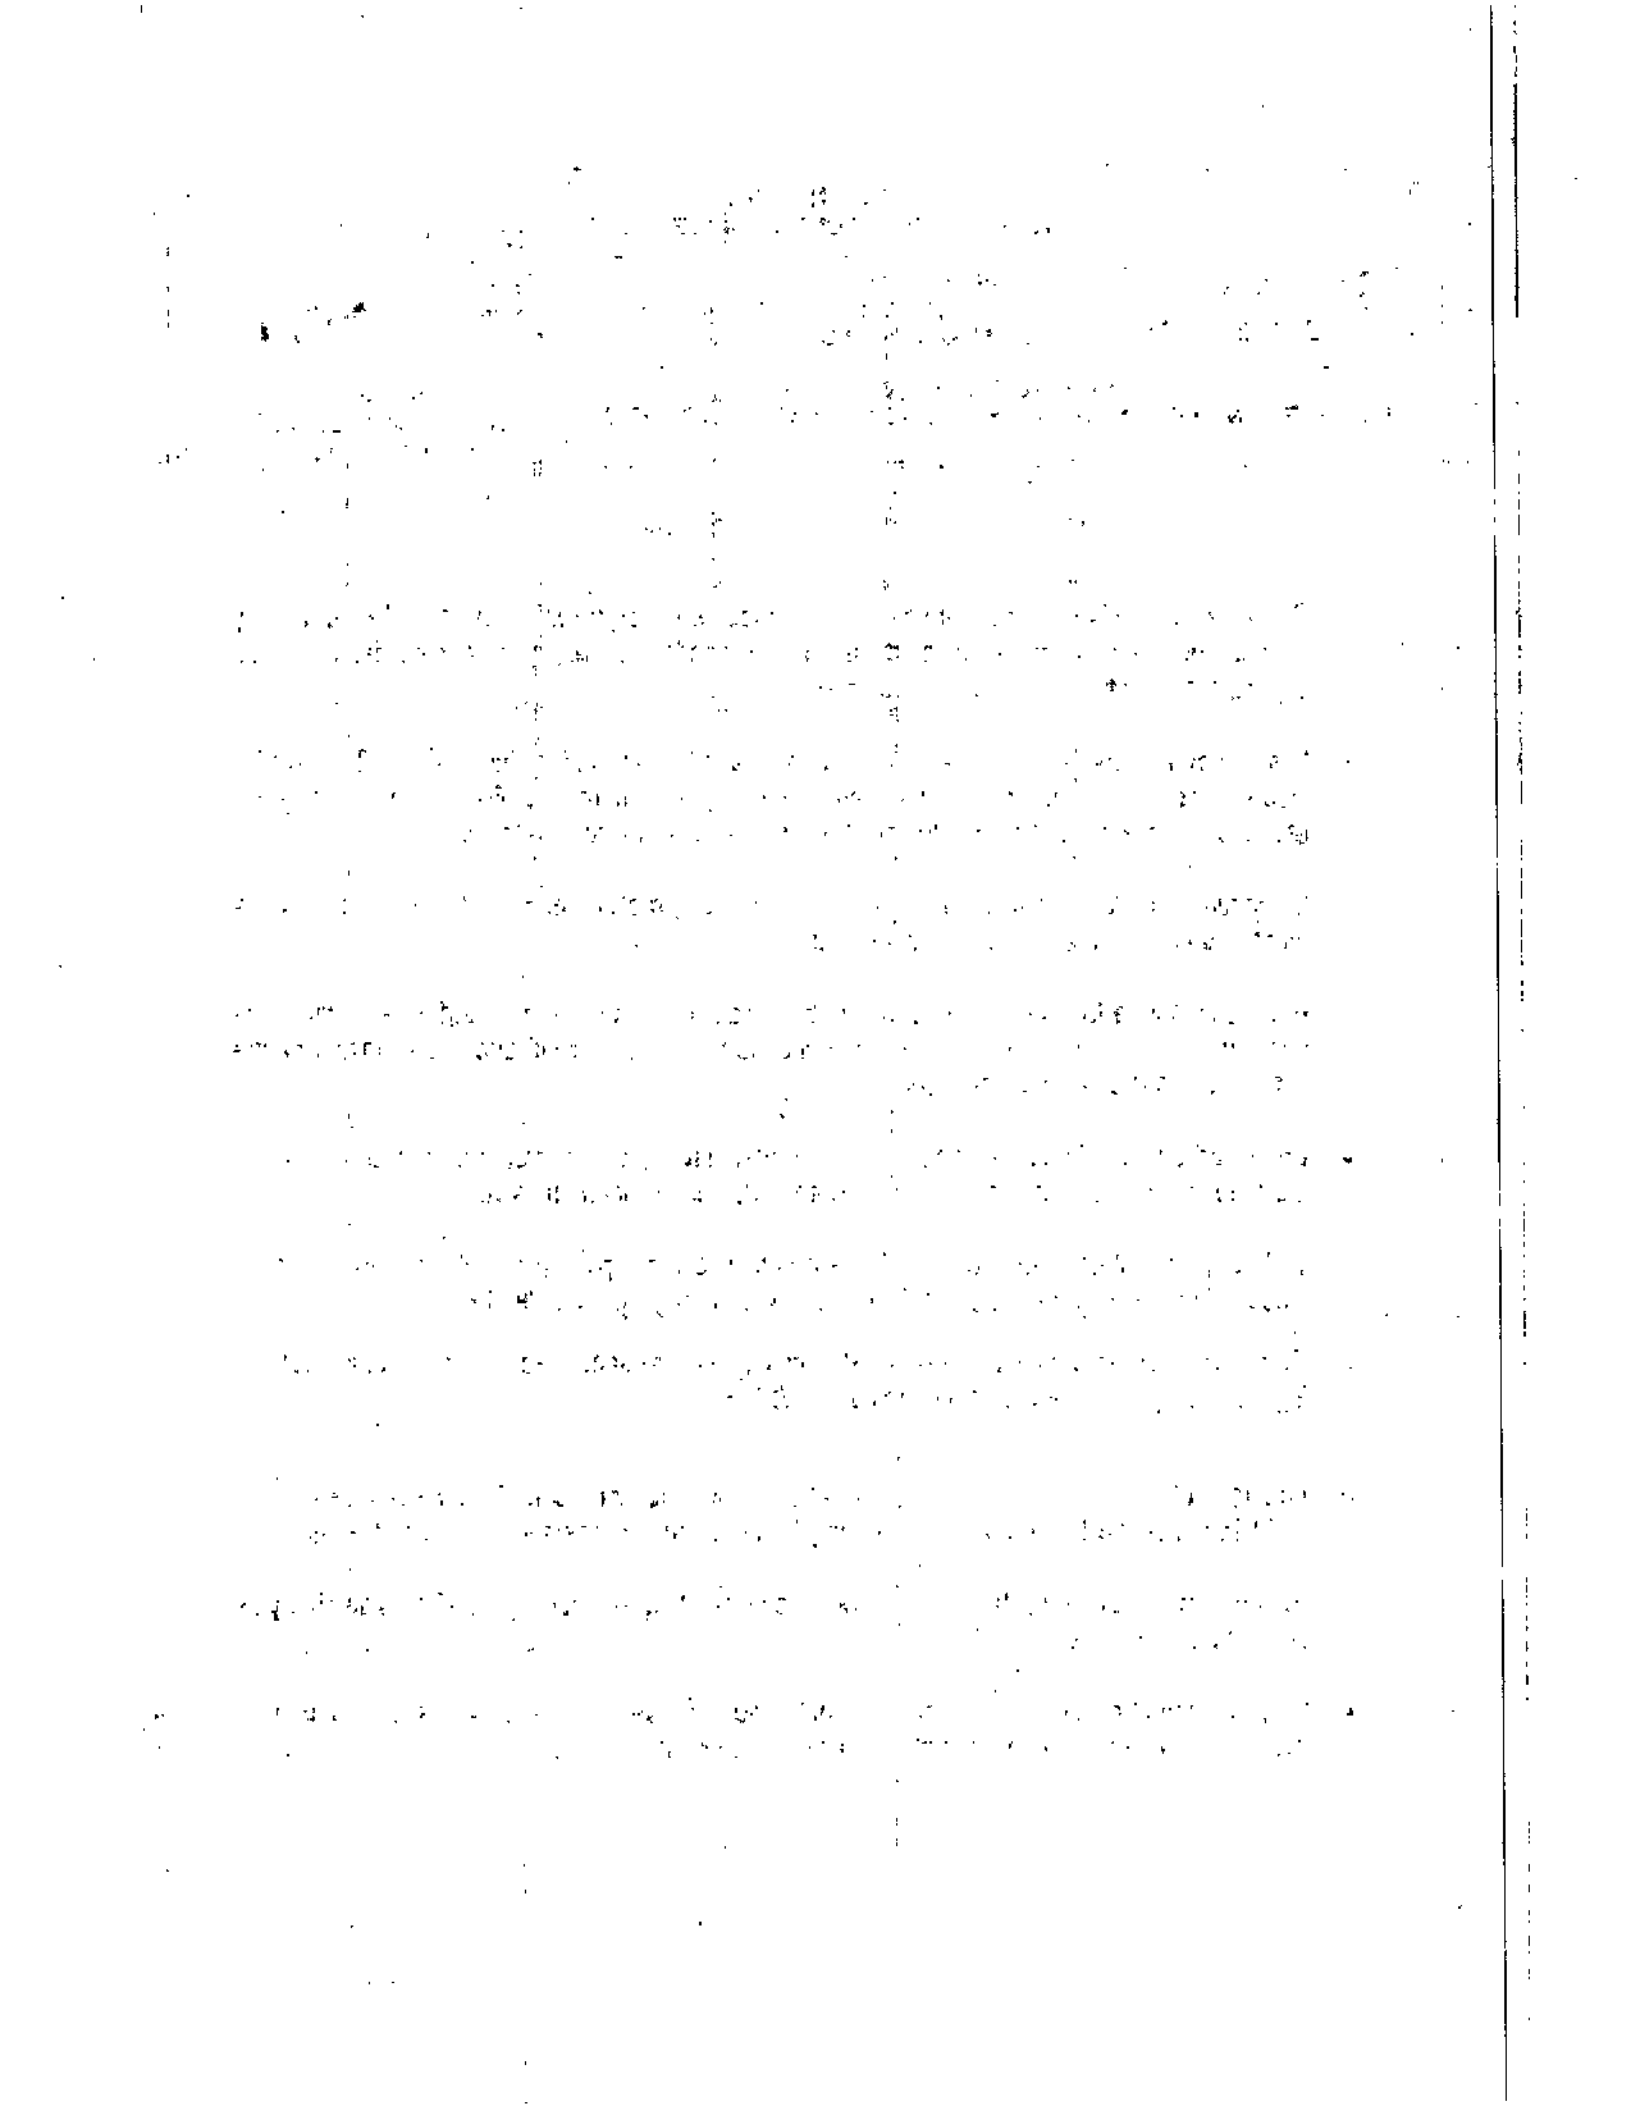

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
1	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR		Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA		Ing. FROILAN ANDRES COLORADO			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza instalacipon de cola de raton para dilataciones

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
2	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con la construccion y reconstruccion de cajas de inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
3	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FÍSICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se continua con la construccion y reconstruccion de cajas de Inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
4	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza construccion de muro estructural
Se continua con excavacion de espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
5	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO
MAÑANA		x	
TARDE		x	
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS		
TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		
PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	
RAZONES	Se presentan lluvias moderadas 07:30 a 13:30				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza construccion de muro estructural
Se continua con excavacion de espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01		
FECHA		
6	3	2021
DD	MM	AA

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019
MANTENIMIENTO VIAL
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza instalacion de bordillo A80

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
8	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FÍSICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con demolición de espacio público y construccion de cajas de inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
9	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV		18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO
MAÑANA			
TARDE		x	
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

- Se presentan fuertes lluvias de 16:00 a 18:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continue con demolición de espacio público , construccion de cajas de inspeccion y se inicia excavacion para vigas de amarre

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
10	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FÍSICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se inicia extension de base para espacio publico e instalacion de cajitas para medidor de agua potable

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
11	3	2021		
OD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO
	MAÑANA		x
	TARDE		x
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presenta fuertes lluvias 07:50 a 09:00 y 15:00 a 17:50

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con extension de base para espacio publico e instalacion de cajillas para medidor de agua potable

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
12	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			x
	TARDE			x
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presenta fuertes lluvias durante el transcurso de dia

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con extension de base para espacio publico
Se continua con levantamiento de muros estructurales

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
13	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencilles	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Cenguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con demolicion de espacio publico y nivelacion de cajas de inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
15	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI x	NO
MAÑANA		
TARDE	x	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	8
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan fuertes lluvias 15:40 a 17:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con levantamiento de muro en bloque estructural

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
16	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE			x
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan fuertes lluvias 13:30 a 17:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza nivelacion de cajillas de acueducto
Se inicia pañete en paredes de andenes

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
17	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO
MAÑANA			
TARDE		x	
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan fuertes lluvias 7:45 a 11:45

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza retiro de material saturado por las fuertes lluvias y se realiza instalacion de nuevo material

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORIA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
18	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI x	NO
MAÑANA		
TARDE	x	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	-
Volquetas dobletroques	-
Retroescavadoras	-
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan fuertes lluvias 12.30 a 16:30

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza vaciado de concreto para espacio publico en horas de la mañana

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
19	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE		x	
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UNO	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan leves en el transcurso del dia

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza acabados y remates de espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
20	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblietroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inicia demolicion de espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
23	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con excavación y demolición de espacio publico
Se realiza construccion de cajas de Inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	x	NO	
	MAÑANA			
	TARDE		x	
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan fuertes lluvias 15:30 a 17:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con excavación y demolición de espacio publico
Se realiza construccion de cajas de inspeccion

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
25	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE [ ] SI [ ] NO [ ]
RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza vaciado de concreto en costado derecho del segmento vial

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	8
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FÍSICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE [ ] SI [ ] NO [ ]
RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza vaciado de concreto en costado derecho del segmento vial

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 370 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realizan resanes y remates de espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
29	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se Inicia demolicion de espacio publico
Se realiza construccion de muro en bloque estructural

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
30	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ	CIV	18006322	
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis	DESDE	Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MANANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua demolicion de espacio publico
Se realiza construccion de muro en bloque estructural

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
31	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	LA PAZ		CIV	18006322
NOMENCLATURA	Carrera 4 bis		DESDE Diagonal 52 A	HASTA	Diagonal 53 sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	9
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJON		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza vaciado de concreto en costado izquierdo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
1	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	
MAÑANA				
TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realza demolicion placa anden existenten y se inicia excavacion mecanica

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
2	3	2021		
OD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza exyension de primera capa e instalación de caja de registro acueducto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
3	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES		CIV	18001055-18001084
NOMENCLATURA	Carrera 23		DESDE Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillos	1
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende segunda capa de material
Se inicia demolición y excavacion en otro segmento del CIV

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
4	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Contadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de un segmento del espacio publico

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
5	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con demolición de anden en placa de concreto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
6	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se continua con demolición y excavación de anden en placa de concreto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
8	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS		
TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza extension de material, Instalación de Malla electrosoldada y Geotextil
se realiza contruccion de cajas domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
9	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillos	1
Volquetas doble troque	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTÉXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de anden, instalación de cajas de registro de acueducto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga D

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
10	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 38 Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO
MAÑANA			
TARDE		X	
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan lluvias fuertes desde las 15:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza extension de material, instalación de Malla electrosoldada y Geotextil
se realiza contruccion de cajas domiciliarias

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
11	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 36 Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X
	NO	
MAÑANA		
TARDE		X
ACCIDENTES	SI	
	NO	X

PERSONAL	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS		
TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		
PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan lluvias fuertes desde las 15:00

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de anden, instalación de cajas de registro de acueducto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga D

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
12	3	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA ANDENES	CIV	18001055-18001084	
NOMENCLATURA	Carrera 23	DESDE	Calle 35 sur	HASTA	Calle 38 Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X
	NO	
	MAÑANA	
	TARDE	X
ACCIDENTES	SI	
	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	7
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	
Transito	3
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

Se presentan lluvias leves durante todo el día.

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza fundida de anden, instalación de cajas de registro de acueducto

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga D

ADRIANA QUIROGA
