Bogotá D.C 04 Junio de 2021.

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE.
ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E) Ciudad
Bogotá

Asunto. Informe ejecutivo No.14
Ref.: Contrato de Interventoría No. 320 DE 2019

Después de la revisión y ejecución de actividades en las vías priorizadas por la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, la Interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S, hace entrega del Informe ejecutivo de Interventoría al contrato de obra No. 321 de 2019, cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."** bajo la ejecución del contratista **CONSORCIO RU 2020**.

La Interventoría certifica que el contratista cumple con los Aportes parafiscales, a su vez certifica que los profesionales y personal de obra que intervienen en el proyecto se encuentran cobijados por pagos de seguridad social integral (E.P.S, A.F.P, Y A.R.P) y parafiscales (SENA, I.C.B.F Y caja de compensación familiar.) toda esta información se encuentra ampliamente soportada en el informe entregado por el contratista.

Cordialmente.


CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal
Interventoría y Construciviles S.A.S

CONTRATO No. 320 DE 2019

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 14 PERIODO DEL 01 DE MAYO 2021 AL 31 DE MAYO 2021

BOGOTÁ D. C. MAYO 2021

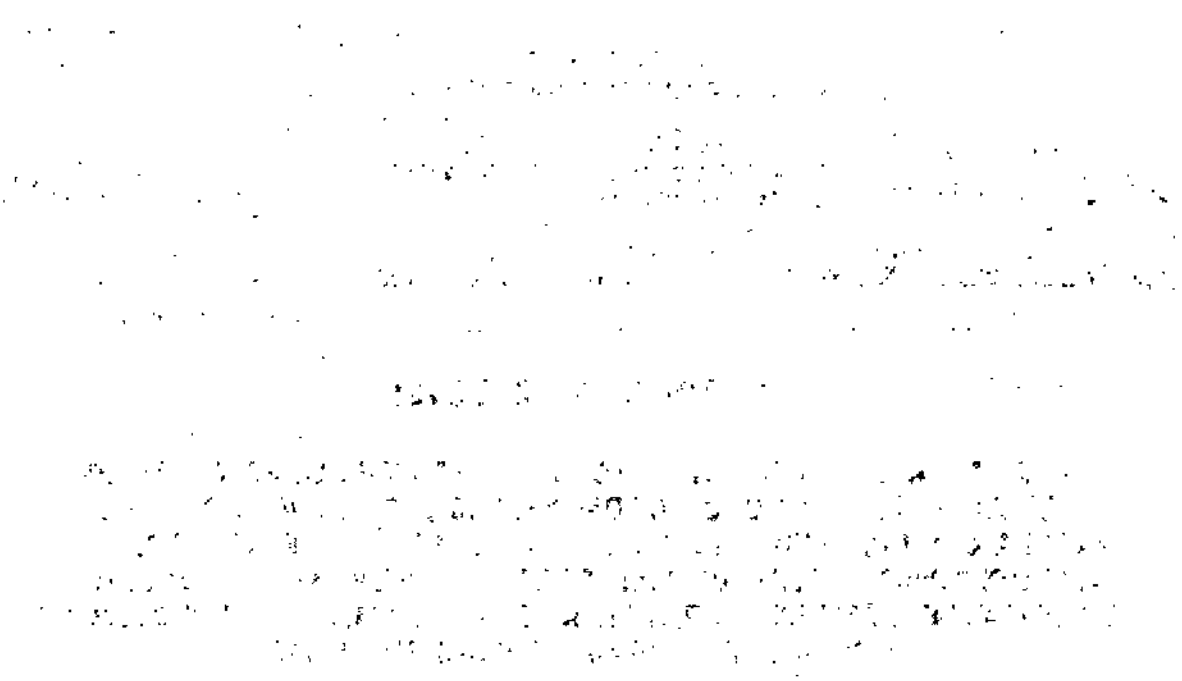

Contenido

Introducción

2. Generalidades 7

2.1 Introducción 7

3. Especificaciones del contrato 9

4. Roles del proyecto 10

5. Información técnica 11

5.1 Programación de obra: 11

5.2 Estado de la obra durante el periodo de preliminares 11

5.3 Control de avances 12

6. Plan De Acción De Interventoría 12

6.1. Actividades Ejecutadas en el Periodo 23

6.2. Objetivos De La Calidad 28

6.3. Responsabilidades Y Obligaciones Del Interventor 28


6.4. Reuniones De Control 29

6.5. Ejecución Del Proyecto 30

6.6. Diseño Y Desarrollo 30

6.7. Logística Del Proyecto 31

7. Conclusiones y recomendaciones 32

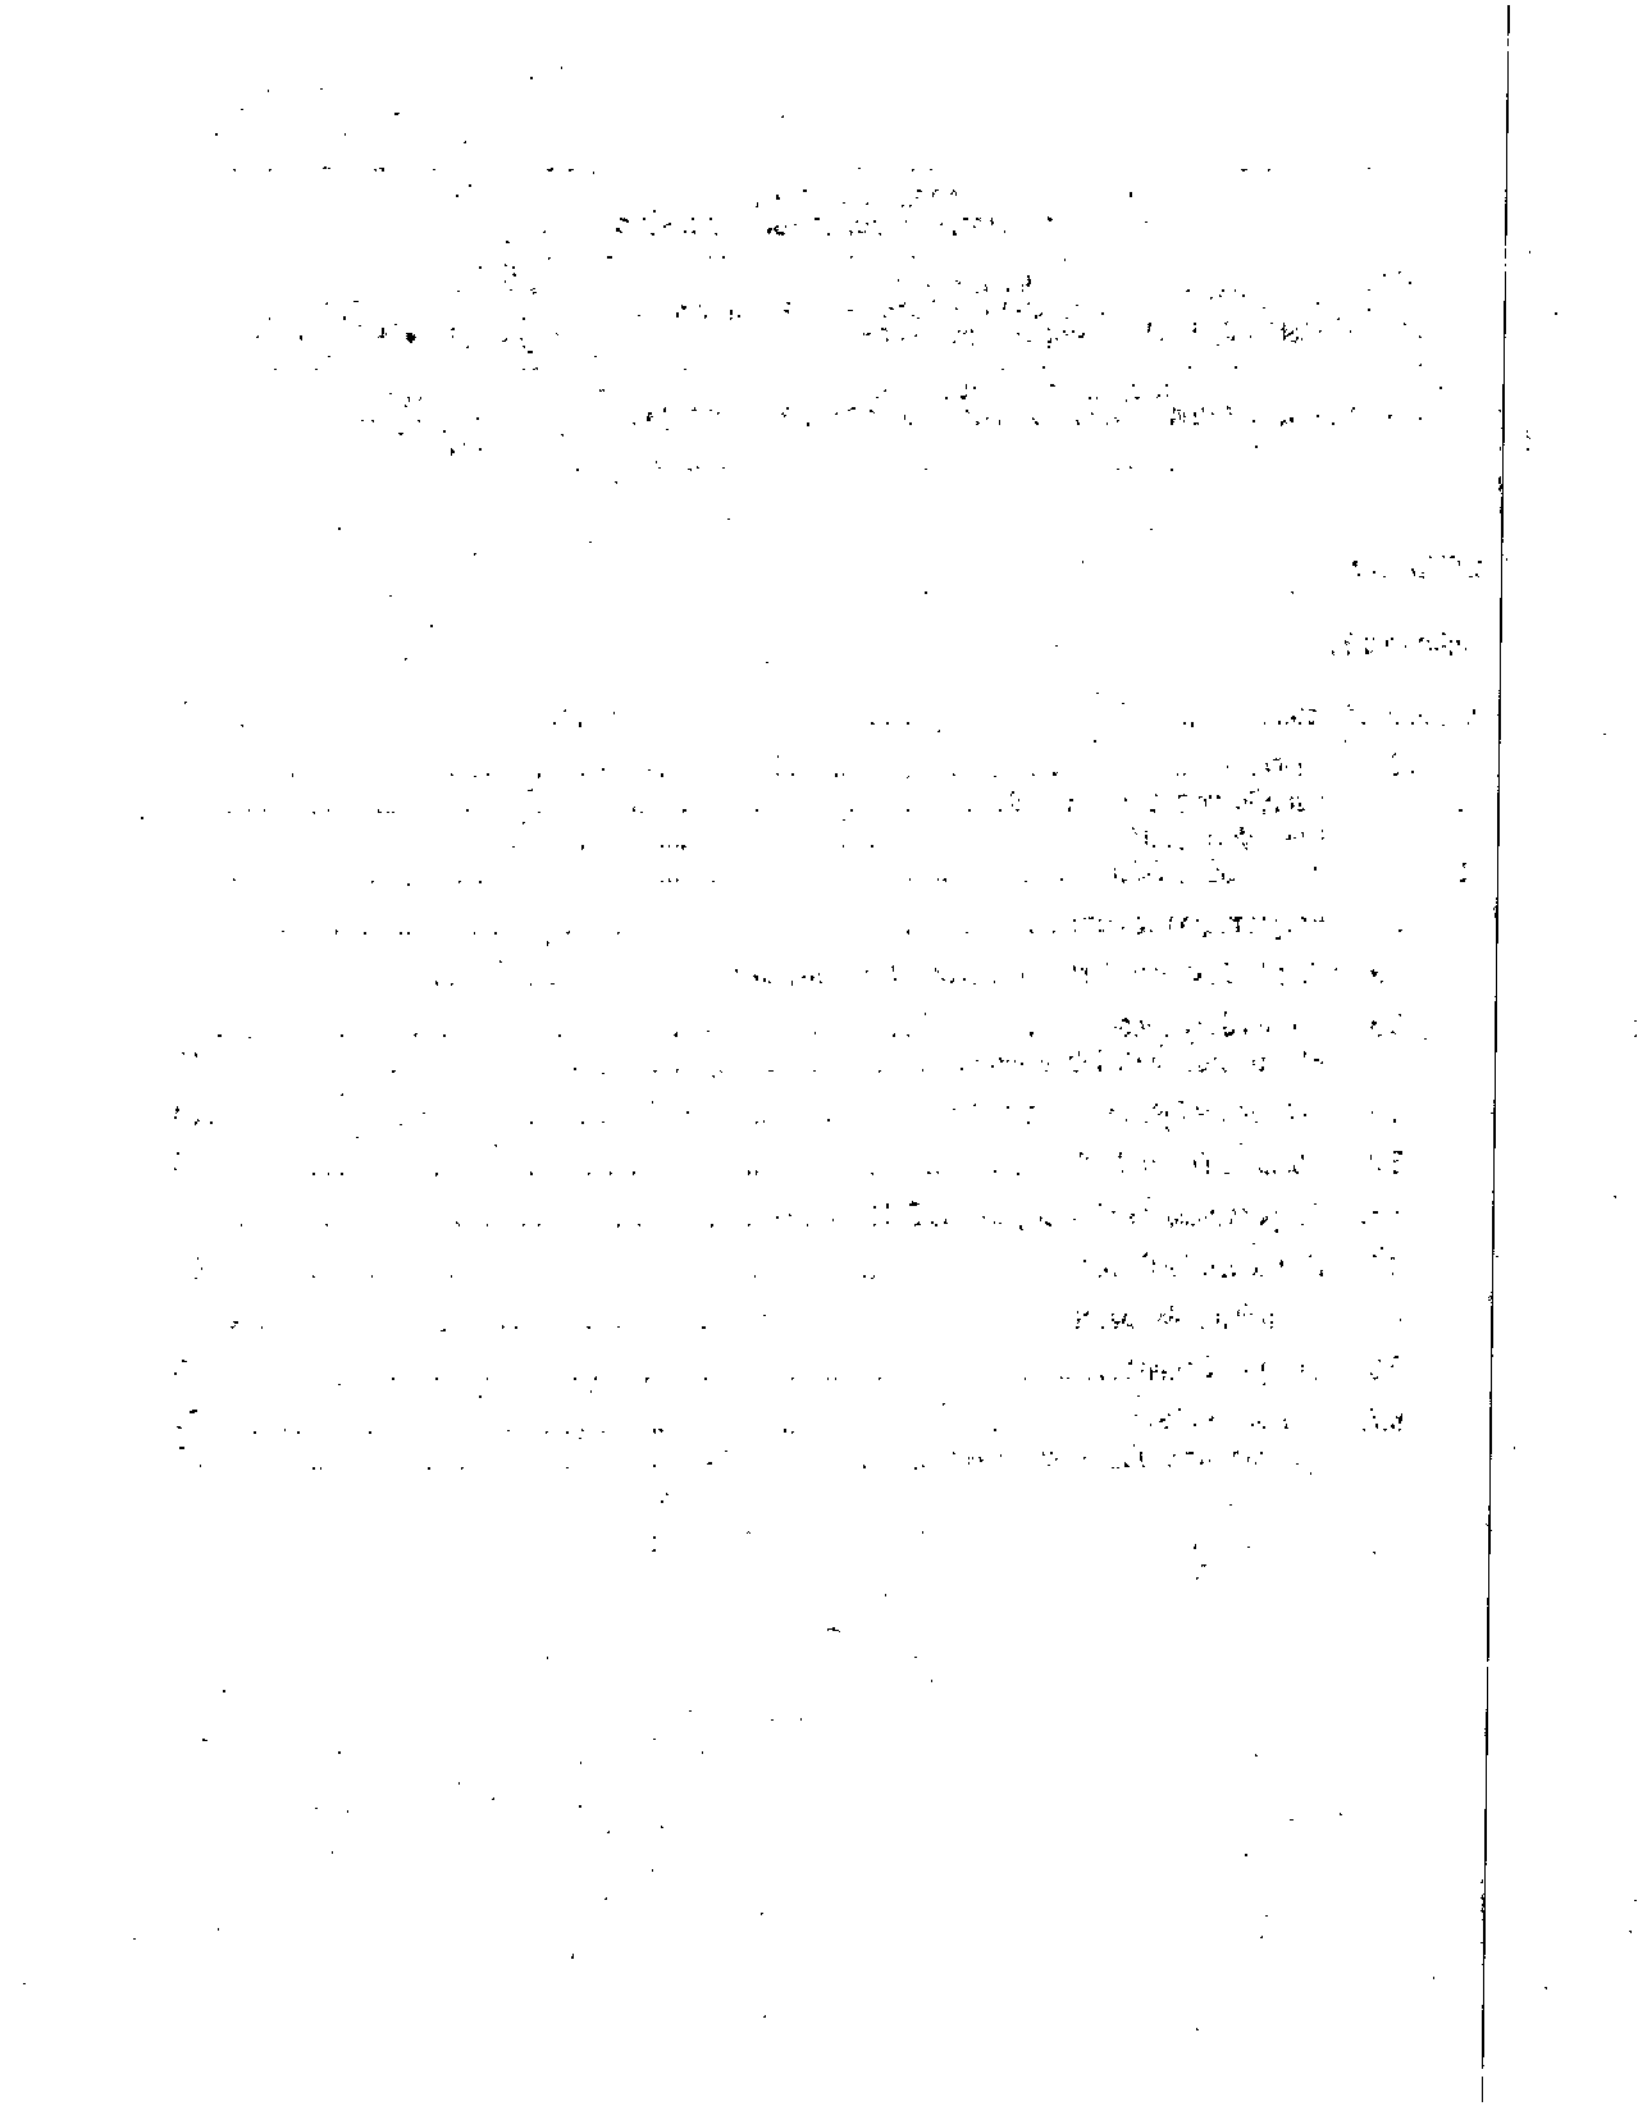


I. Lista de tablas

Tabla 1 Especificaciones del contrato de interventoría y de obra....9
Tabla 2 Personal Profesional....10
Tabla 3 Listado CIV contractuales....15
Tabla 4 Listado de CIV priorizados por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe....20
Tabla 5 Listado CIV excluidos por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe....20
Tabla 6 Listado segmentos viales incluidos adición 1....22
Tabla 7 Listado segmentos viales incluidos adición 2....23

II. Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Instalación PMT
Ilustración 2 Demolición Anden....24
Ilustración 3 Extensión de Geotextil y Sub base
Ilustración 4 Compactación de Material e Instalación de cuneta....24
Ilustración 5 Fundida de Anden
Ilustración 6 Fundida de Anden....25
Ilustración 7 Fundida de Bordillo....25
Ilustración 8 Excavación Mecánica
Ilustración 9 Construcción de Pozo....26
Ilustración 10 Construcción Caja de Inspección
Ilustración 11 Construcción y fundida de Cárcamo....26
Ilustración 12 Instalación de Tubería
Ilustración 13 Instalación de Cargue....27
Ilustración 14 Construcción de Cajas de Inspección
Ilustración 15 Construcción pozo....27

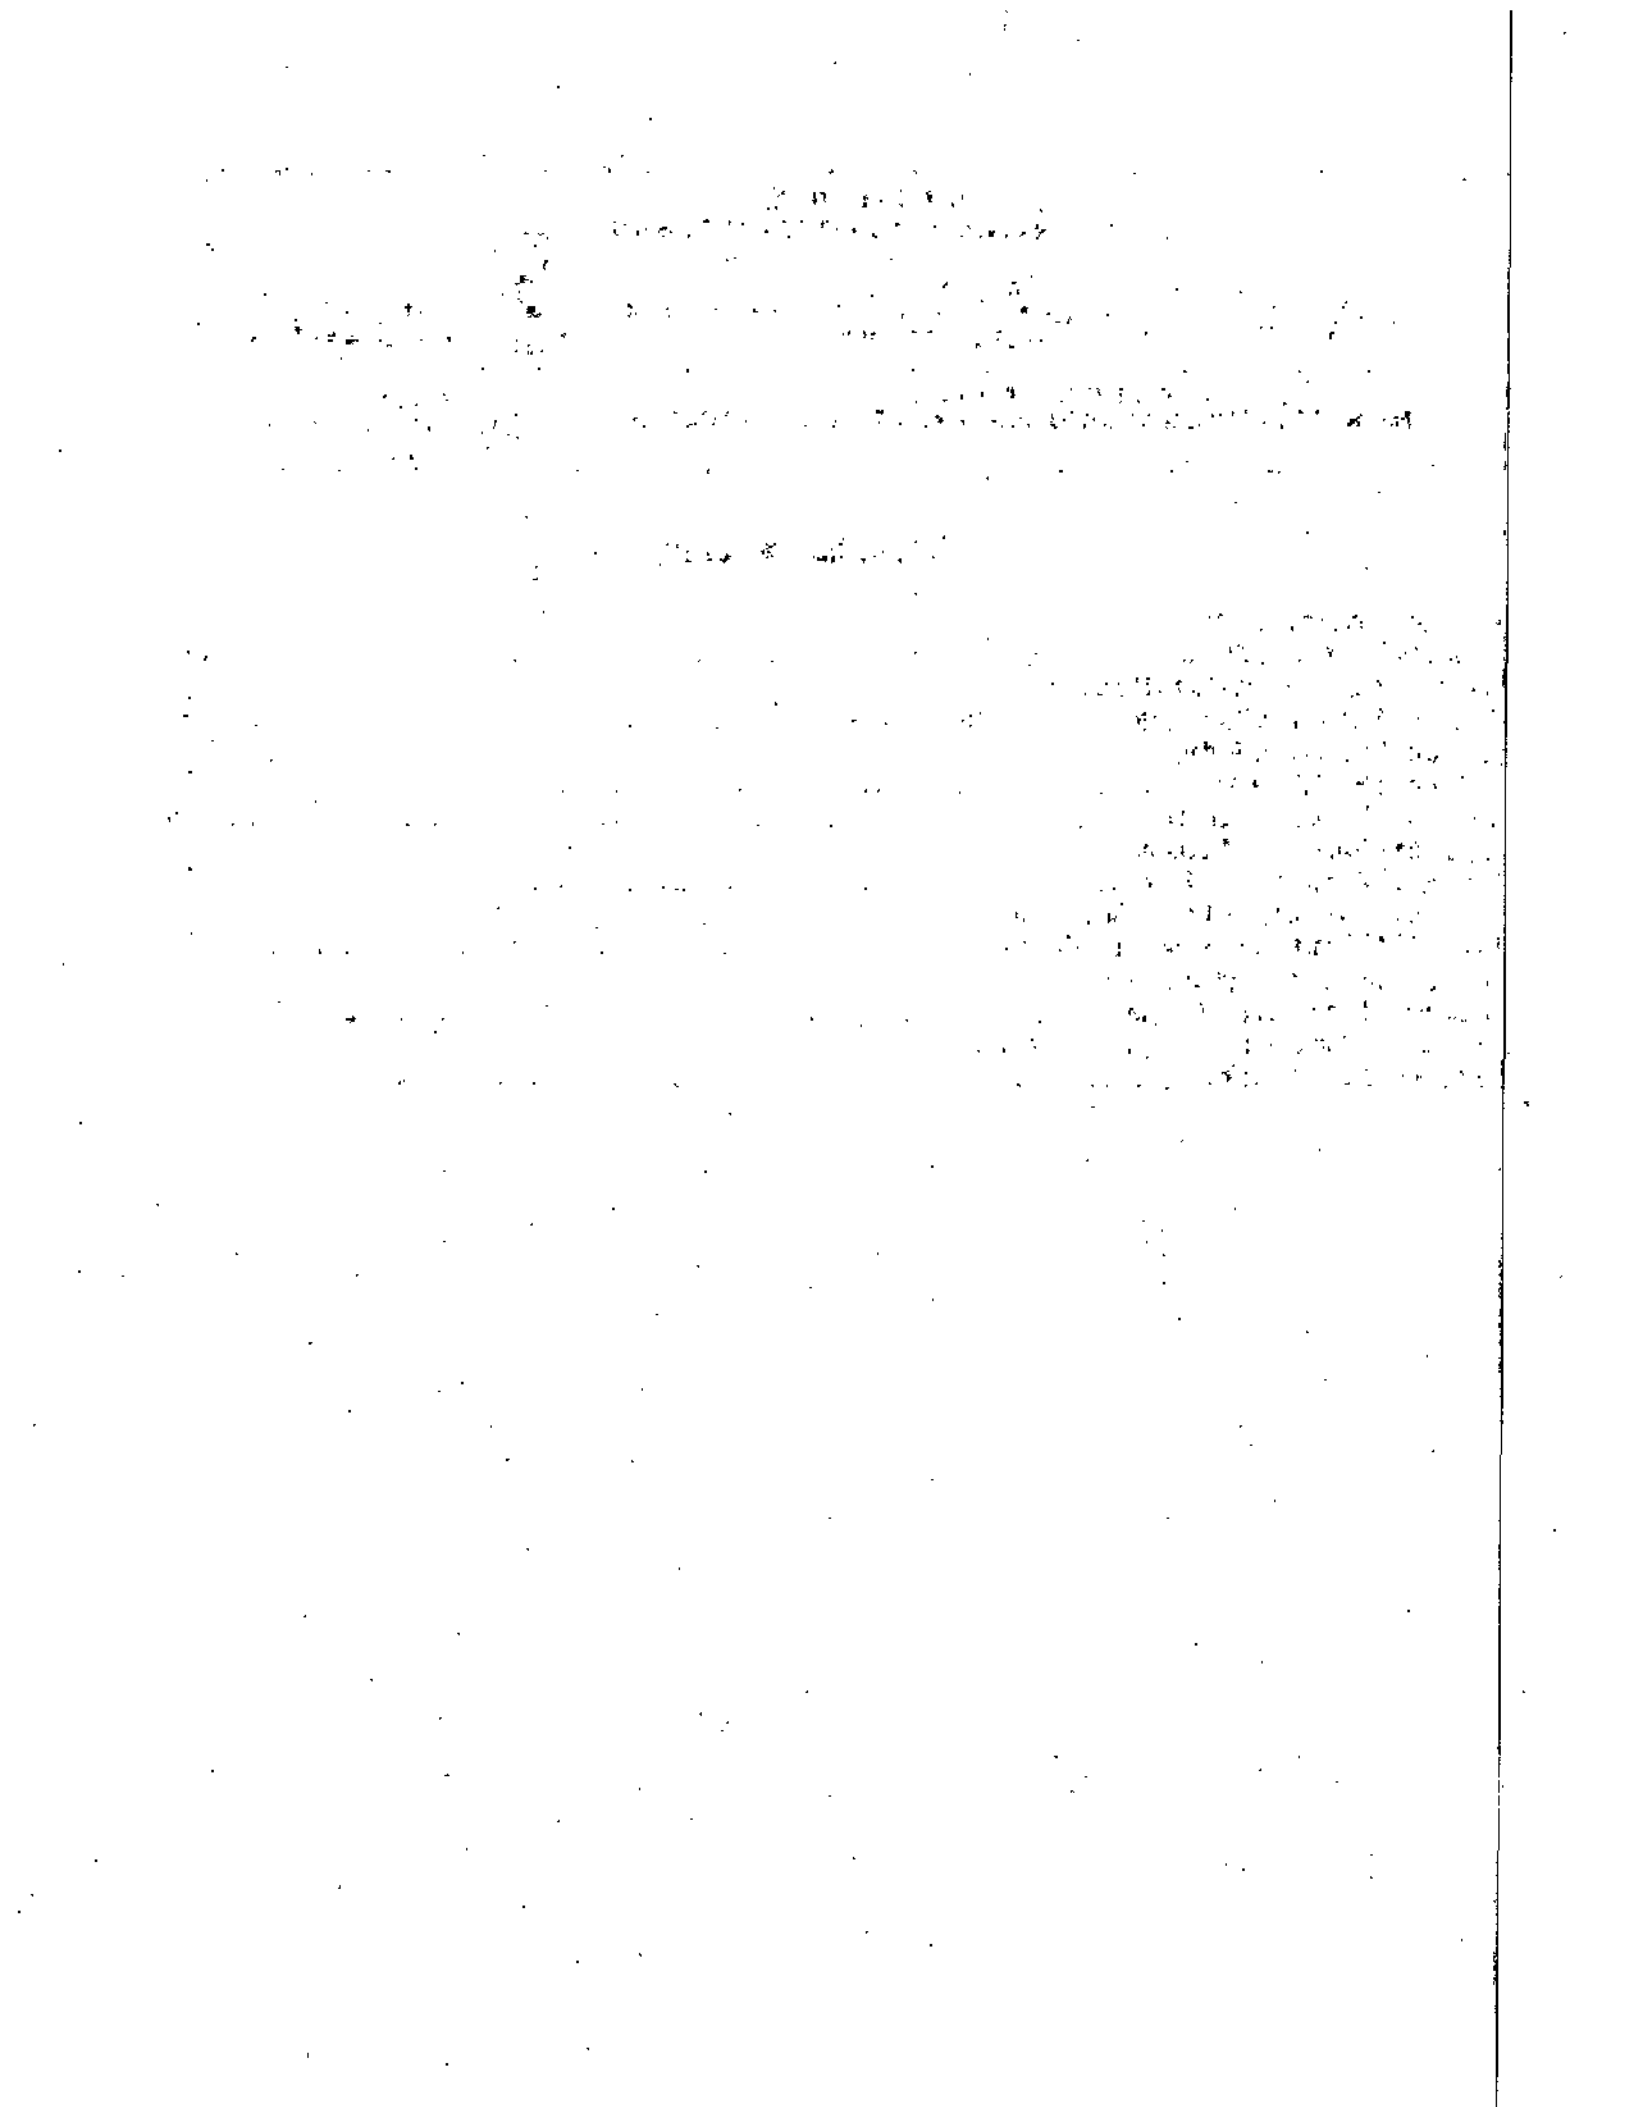


1. Introducción

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe (FDLRUU), con el objeto de mejorar la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las vías locales, ha realizado el Contrato de Interventoría No. 320 de 2019, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"** que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO RU 2020** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra No. 321 de 2019 cuyo objeto es **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el ***01 de mayo 2021 al 30 de mayo 2021.***

Por consiguiente, el presente documento contiene una introducción, seguido del capítulo donde se exponen las generalidades del proyecto, como lo es la localización de este, la asignación de los segmentos viales, las especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto. Por último, se detallará las actividades realizadas con respecto al aspecto técnico desarrollado en el periodo de este informe con respecto al contrato de obra y el de interventoría.

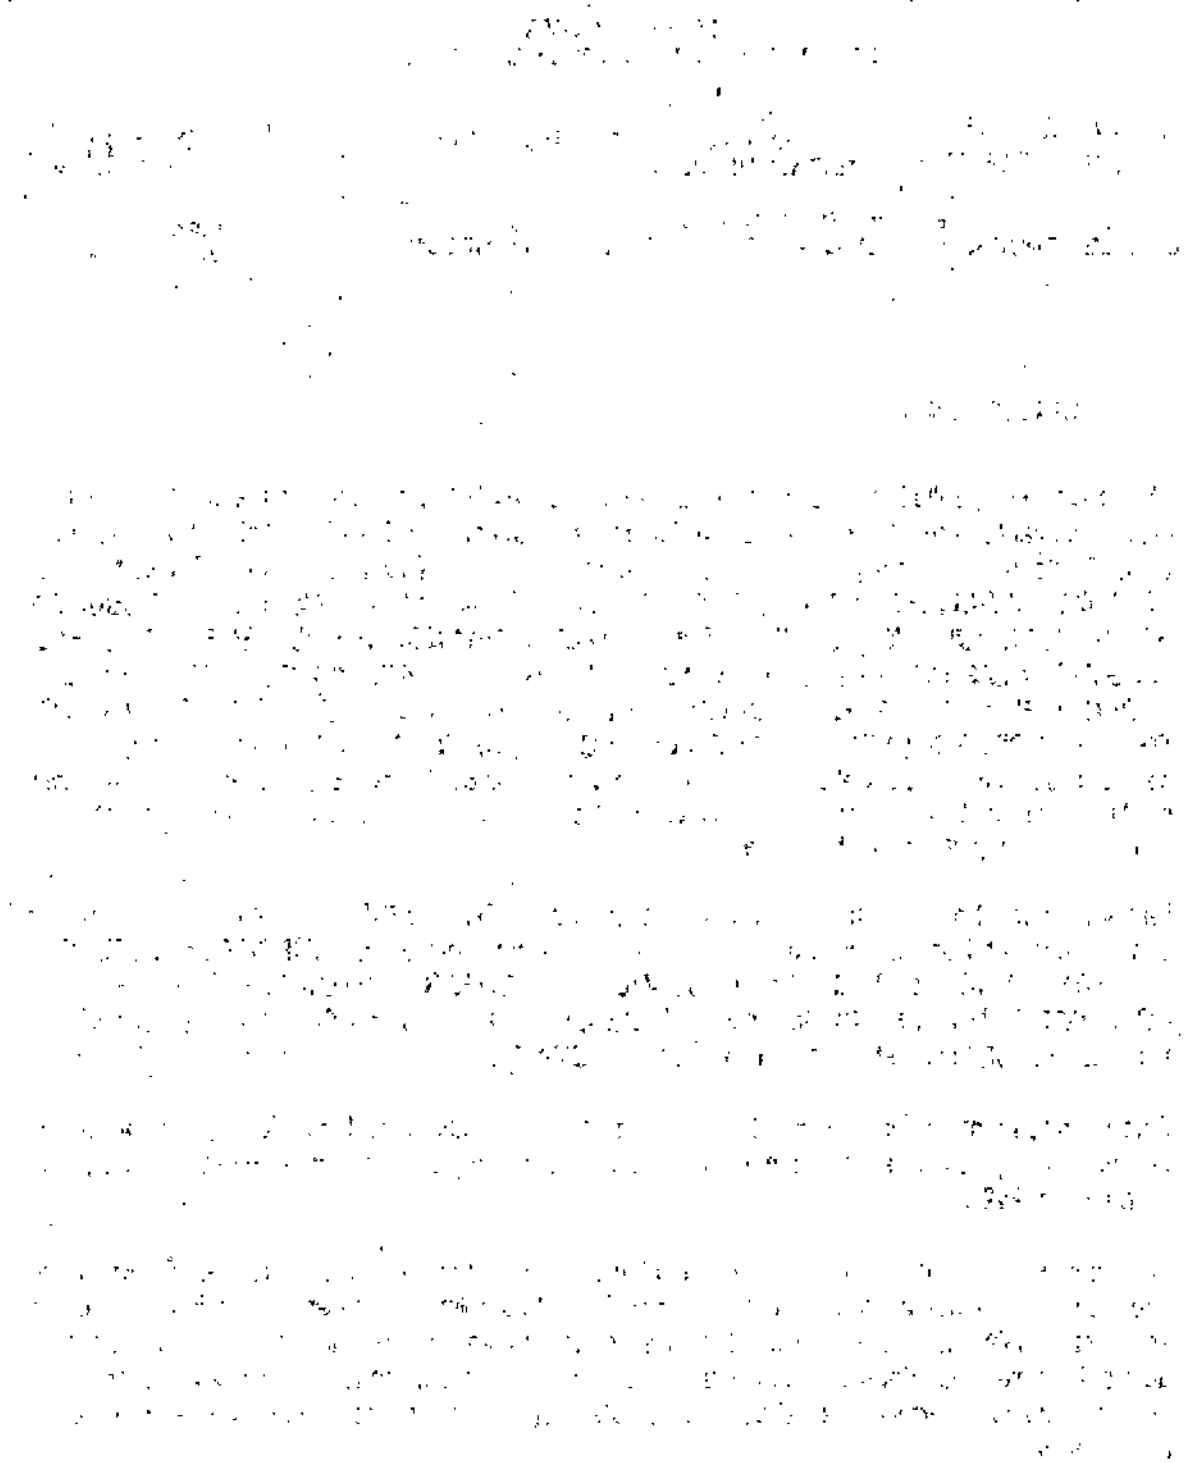

2. Generalidades

2.1 Introducción

El FDLRUU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento de las vias de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLRUU-LP-224-2019 realizó el contrato de Obra No. 321 de 2019, que tiene como objeto la **"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."** *para* intervenir las vias de la localidad, cuyo contratista es el CONSORCIO RU 2020.

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la Ciudad de Bogotá, esta localidad es la No. 18 del Distrito Capital. La Localidad de Rafael Uribe Uribe (BOGOTA, 2019) tiene una extensión total de 1.334 hectáreas. Está ubicada en el sur de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Antonio Nariño al norte, Usme al sur, San Cristóbal al oriente y Tunjuelito al Occidente, esta localidad es en parte plana y en parte montañosa, ambas totalmente urbanizadas. (URIBE, 2020)

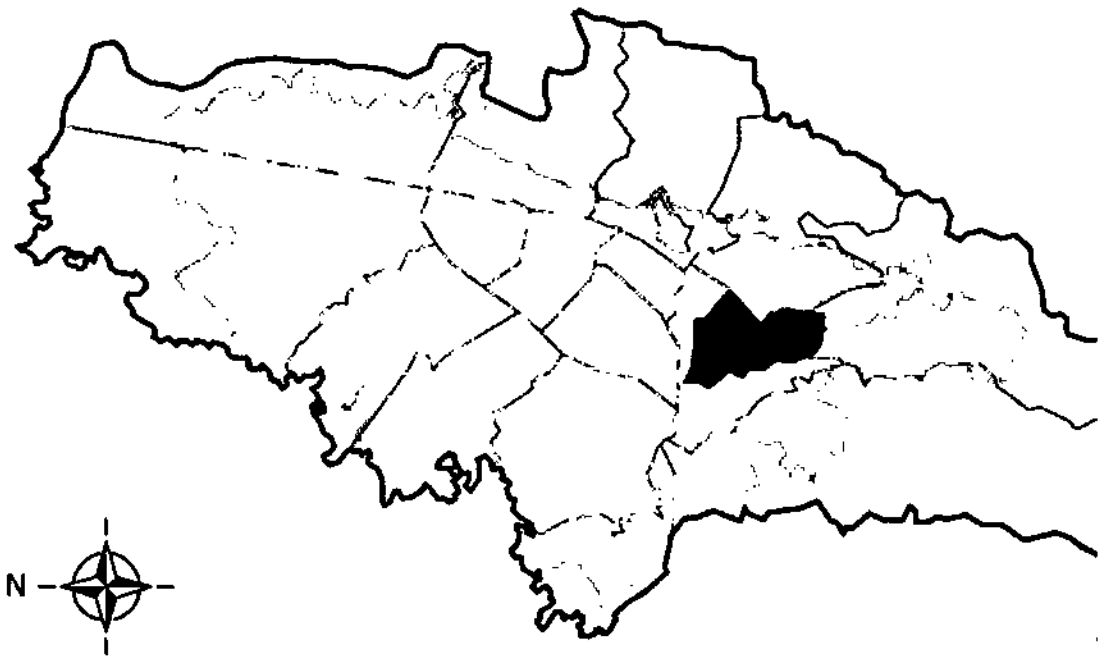
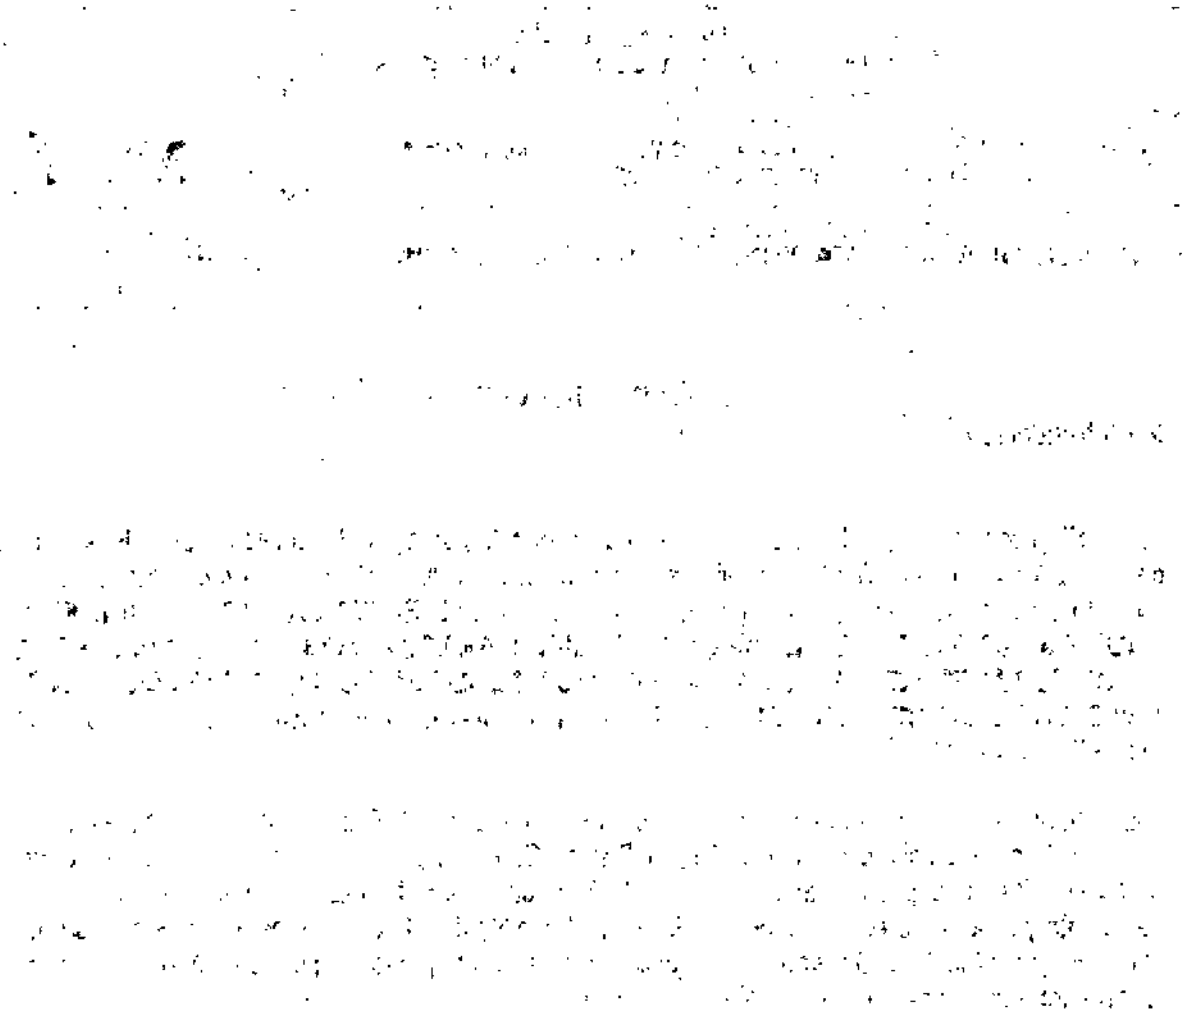


Ilustración 1: Mapa localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá D.C. 2019
(https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)#/media/Archivo:Bogot%C3%A1_-_Rafael_Uribe_Uribe.svg)



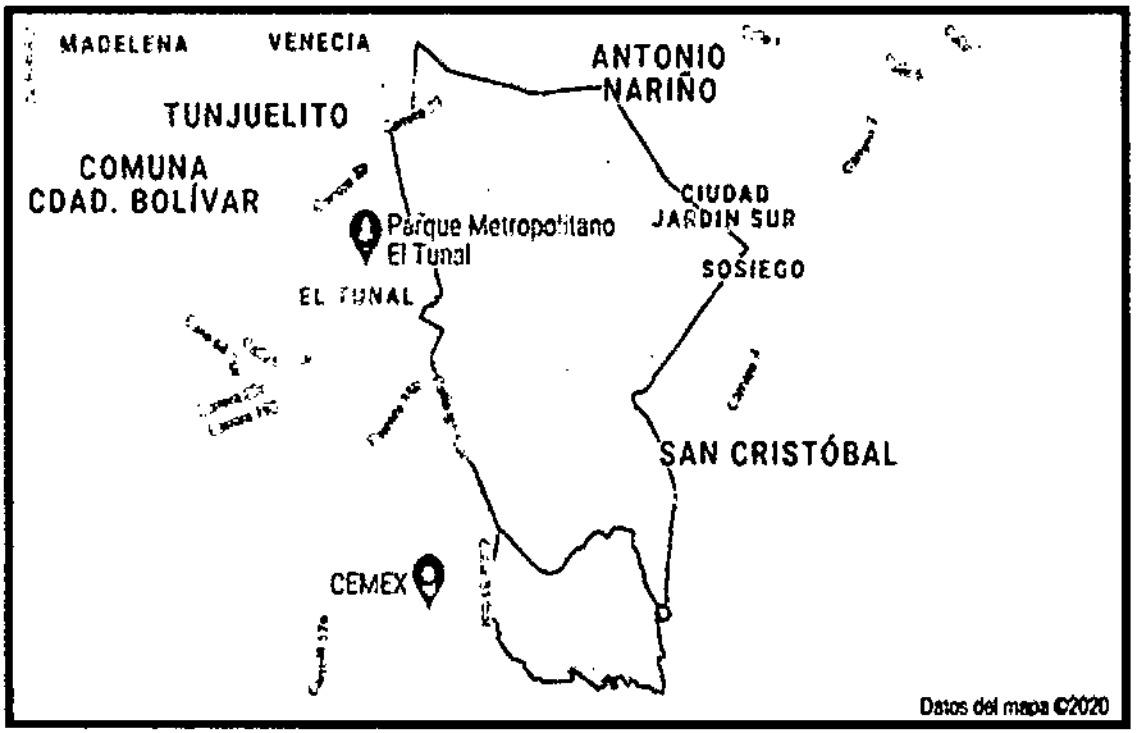


Ilustración 2: Mapa localidad Rafael Uribe Uribe (mapa.bogota.gov.co)




3. Especificaciones del contrato

En la Tabla 1 se exponen las especificaciones generales propias de cada contrato, tanto de la interventoría como el de obra.

Tabla 1 Especificaciones del contrato de interventoría y de obra.

Contrato Interventoría No. 320 DE 2019	
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C., DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. FDLRUU-LP-224 DE 2019"**
Plazo inicial	Nueve (09) meses
Plazo Prorroga 1	Tres (03) meses
Plazo Prorroga 2	Dos (02) meses
Plazo Prorroga 3	Cuatro (04) meses
Fecha de Iniciación	23 de enero de 2020
Fecha de Terminación 1	22 de octubre de 2020
Fecha de Terminación 2	12 de enero de 2021
Fecha de Terminación 3	12 de abril de 2021
Fecha de Terminación 4	12 de junio de 2021
Fecha final con prorroga	12 de octubre de 2021
Valor Inicial	$1.648.309.220
Valor adición 1	$419.767.872
Valor adición 2	$245.100.000
Valor Total del Contrato	$2.313.117.092
Interventoría	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
Tiempo de ejecución	Dieciocho (18) meses

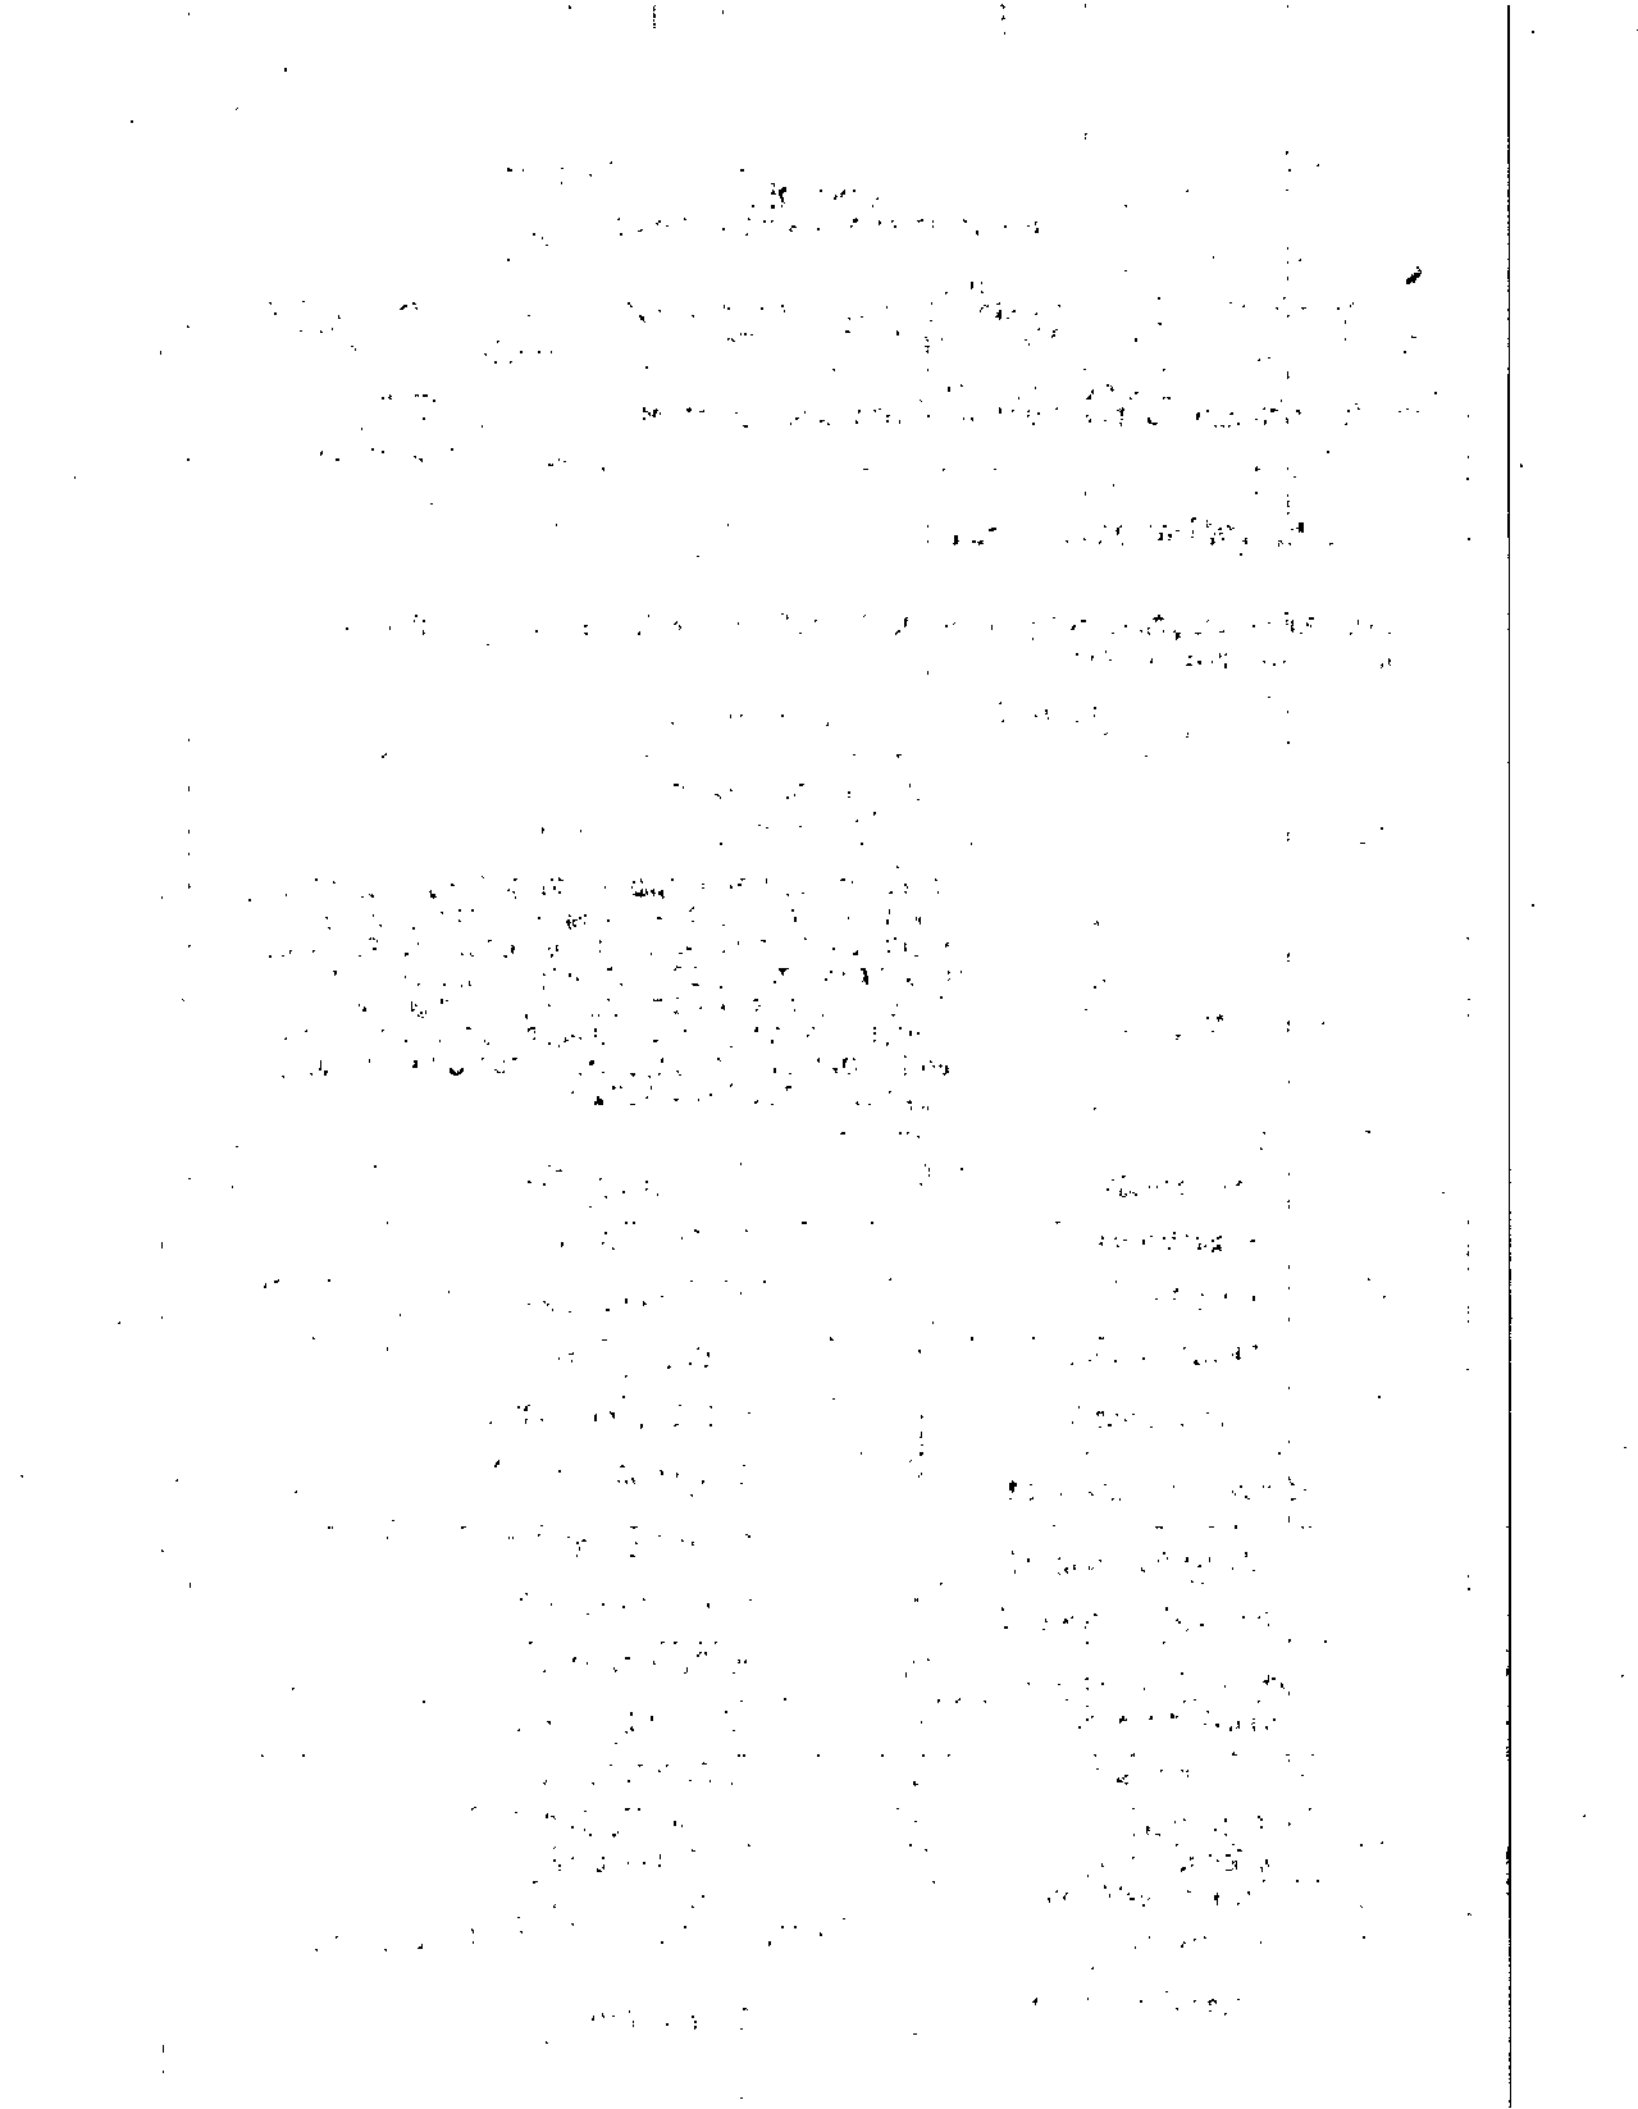


Contrato de Obra Pública No. 321 DE 2019	
OBJETO	**"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C."**
Fecha de Suscripción	30 de diciembre de 2019
Plazo inicial	Nueve (09) meses
Fecha de Iniciación	23 de enero de 2020
Fecha de Terminación 1	22 de octubre de 2020
Fecha de Terminación 2	12 de enero de 2021
Fecha de Terminación 3	12 de abril de 2021
Fecha de Terminación 4	12 de junio de 2021
Fecha Terminación con Prorroga	12 de octubre de 2021
Valor inicial del Contrato	$ 18.582.132.280
Valor Adición 1	$4.737.567.168
Valor Adición 2	$2.759.113.000
Valor total Contrato	$26.078.812.448
Contratista	CONSORCIO RU 2020
Tiempo de ejecución	Dieciocho (18) meses

4. Roles del proyecto

En la Tabla 2, se describen los participantes en la ejecución del proyecto, tanto de la parte de contratista, como de la interventoría y la Supervisión.

Tabla 2 Personal Profesional.

Cargo	Nombre	Responsabilidad	Teléfono
Supervisor del Proyecto	Ing. Edson Rosas	Supervisión por parte del FDL a los contratos de obra e Interventoría.	
Director de interventoría	Ing. Carlos Arámbula.	Representación Legal de la Interventoría.	9371881
Residente de Interventoría	Ing. Juan Pablo Lemus.	Residente de la Interventoría.	9371881
Director de Obra	Ing. Juan Felipe Delgado.	Dirección de la ejecución de la Obra.	

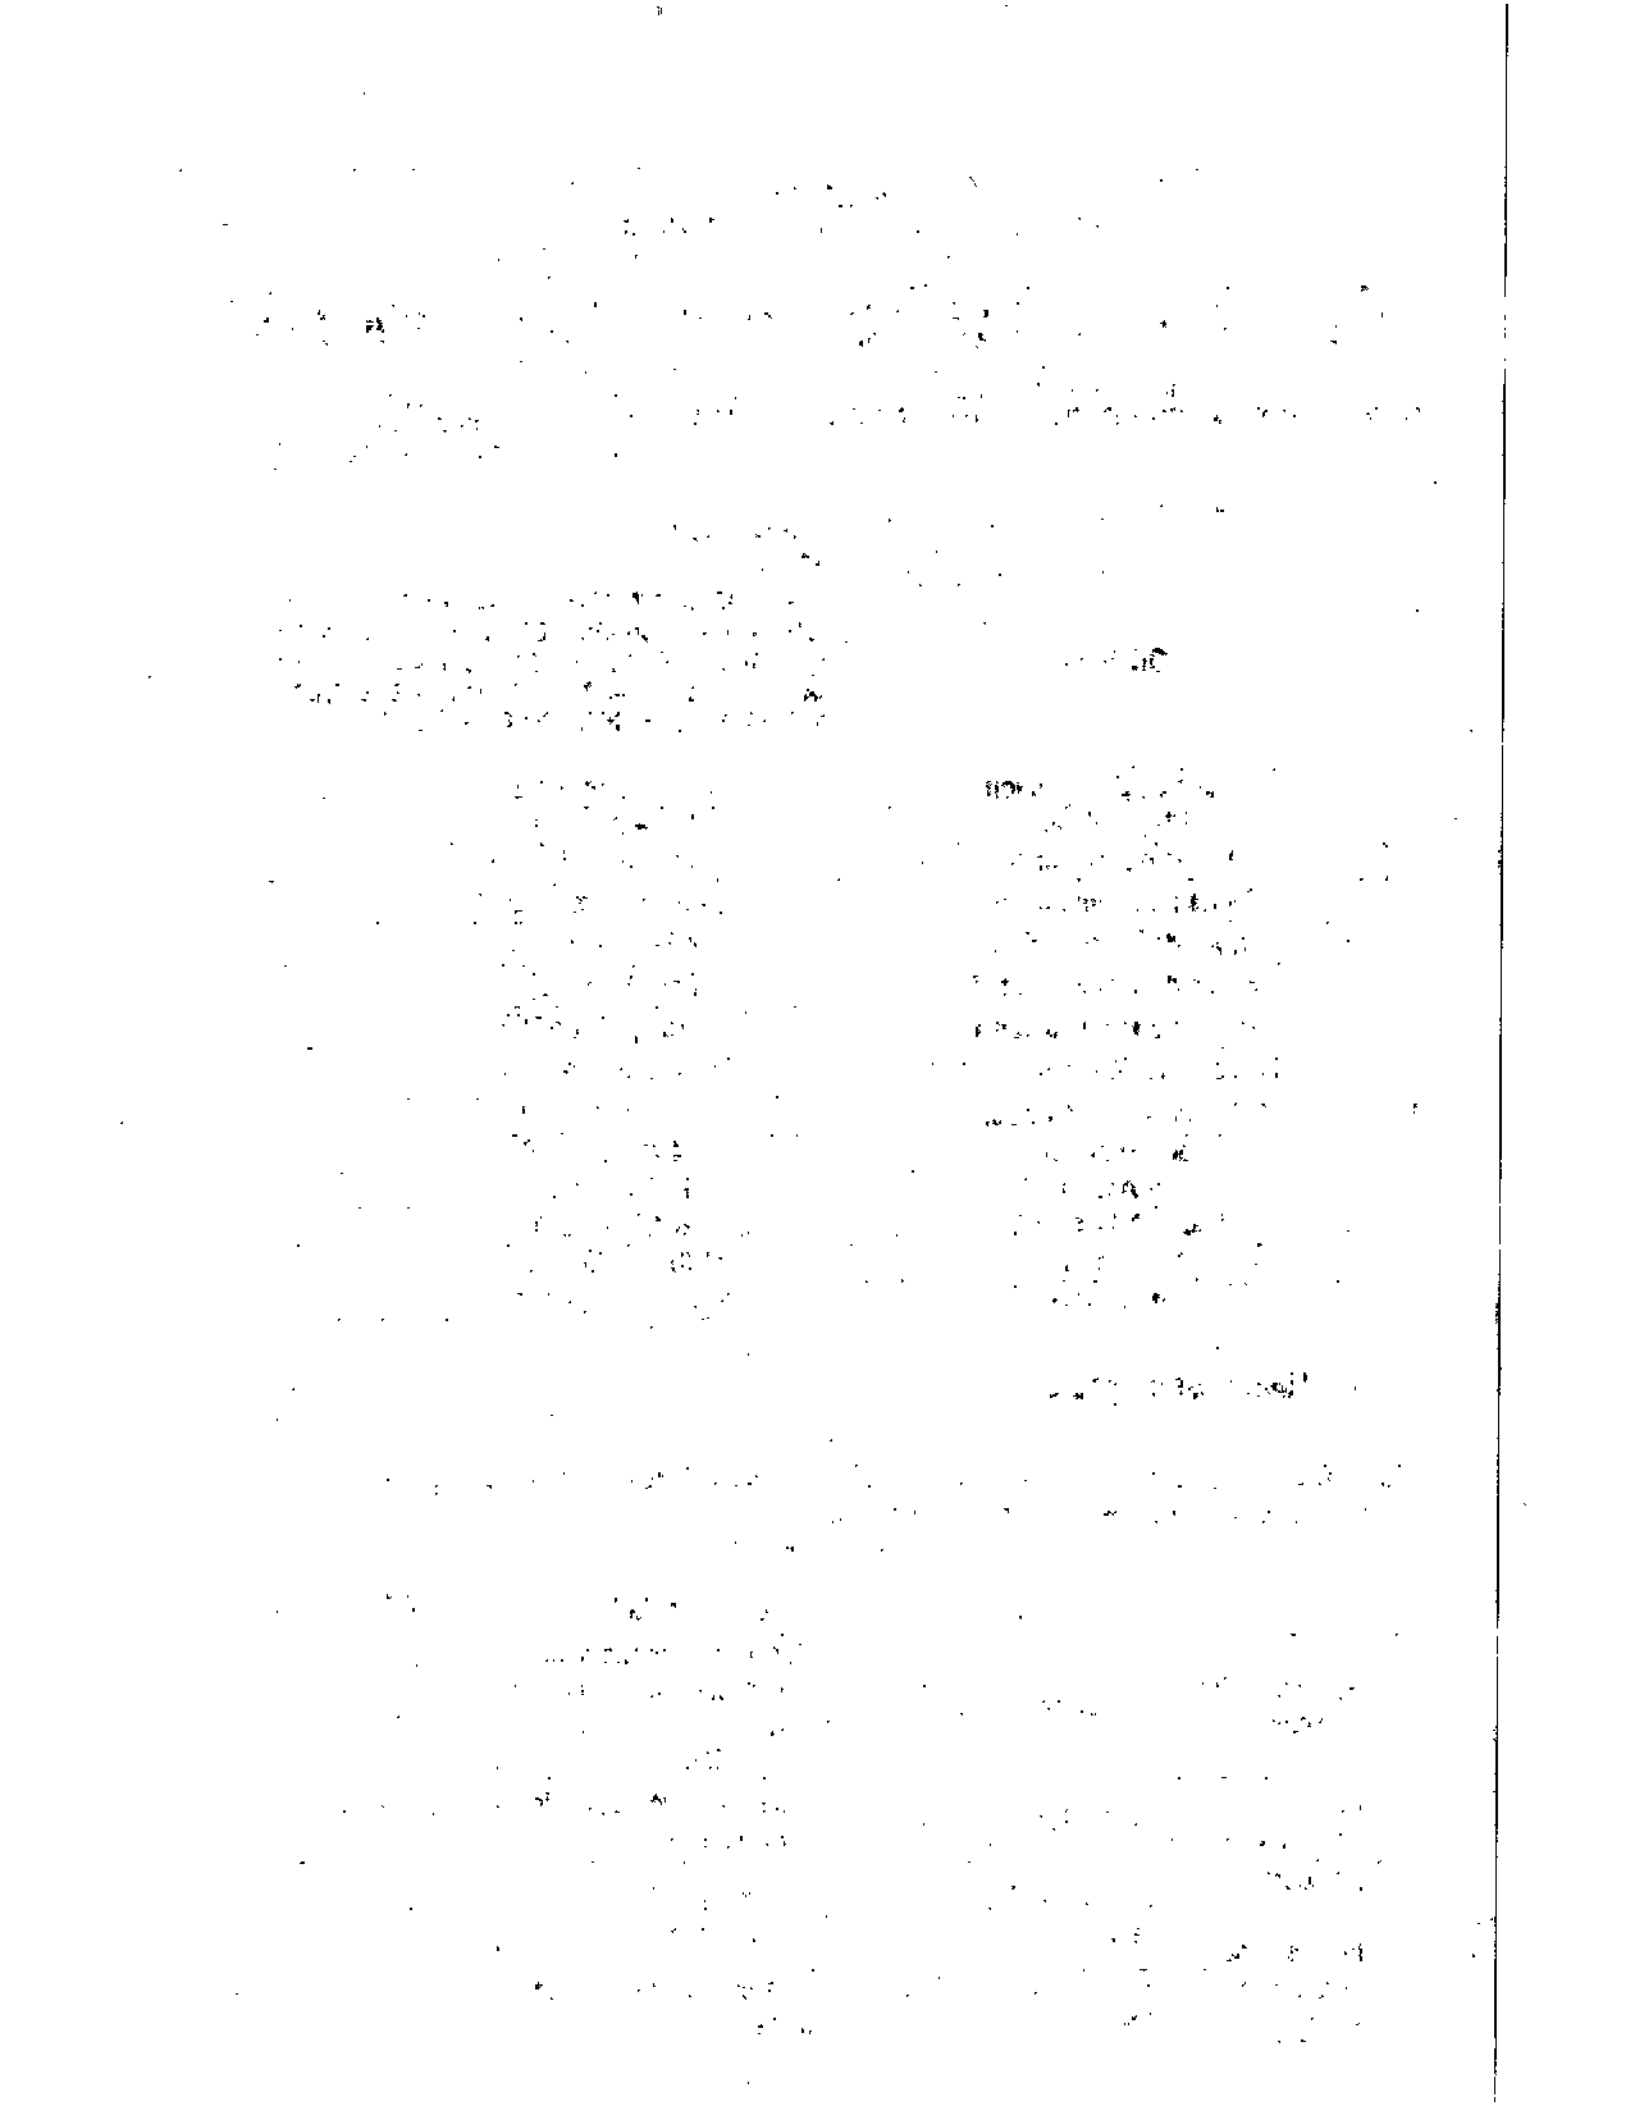

5. Información técnica

5.1 Programación de obra:


El contratista entregó la programación inicial de la etapa preliminar la cual fue revisada y avalada por esta interventoría. Esta describe las actividades preliminares a realizar previo a las actividades de ejecución:

- Inventario de la malla vial local e intermedia (auscultación visual y fotografías).
- Levantamientos topográficos de CIV.
- Procedimiento de campo.
- Procesamiento de deflexiones.
- Índice de condición del pavimento.
- Diagnóstico y condición del pavimento (PCI).
- Estudios y diseños elaboración de los módulos elásticos de la subrasante.
- Diagnostico social de UPZ.
- Diagnostico especializado.
- Determinación de la condición del pavimento.
- Propuestas de intervención.
- Entrega de estudios y diseño de estructuras.

5.2 Estado de la obra durante el periodo de preliminares.

Estudios y diseños.

En el periodo de ejecución de este informe, se encuentra en un 100% el proceso de estudios y diseños, de manera que el constructor sigue el proceso de construcción teniendo muy en cuenta y aplicando estos estudios y diseños de la infraestructura de la malla vial local, con el fin de ejecutar la obra teniendo en cuenta las condiciones actuales, así como la implementación de las Especificaciones técnicas de los materiales y procesos de construcción vigentes de acuerdo con las normas para la ciudad de Bogotá. La elaboración de los estudios y diseños tuvo como antecedente técnico los diagnósticos que fueron revisados y aprobados por esta interventoría.

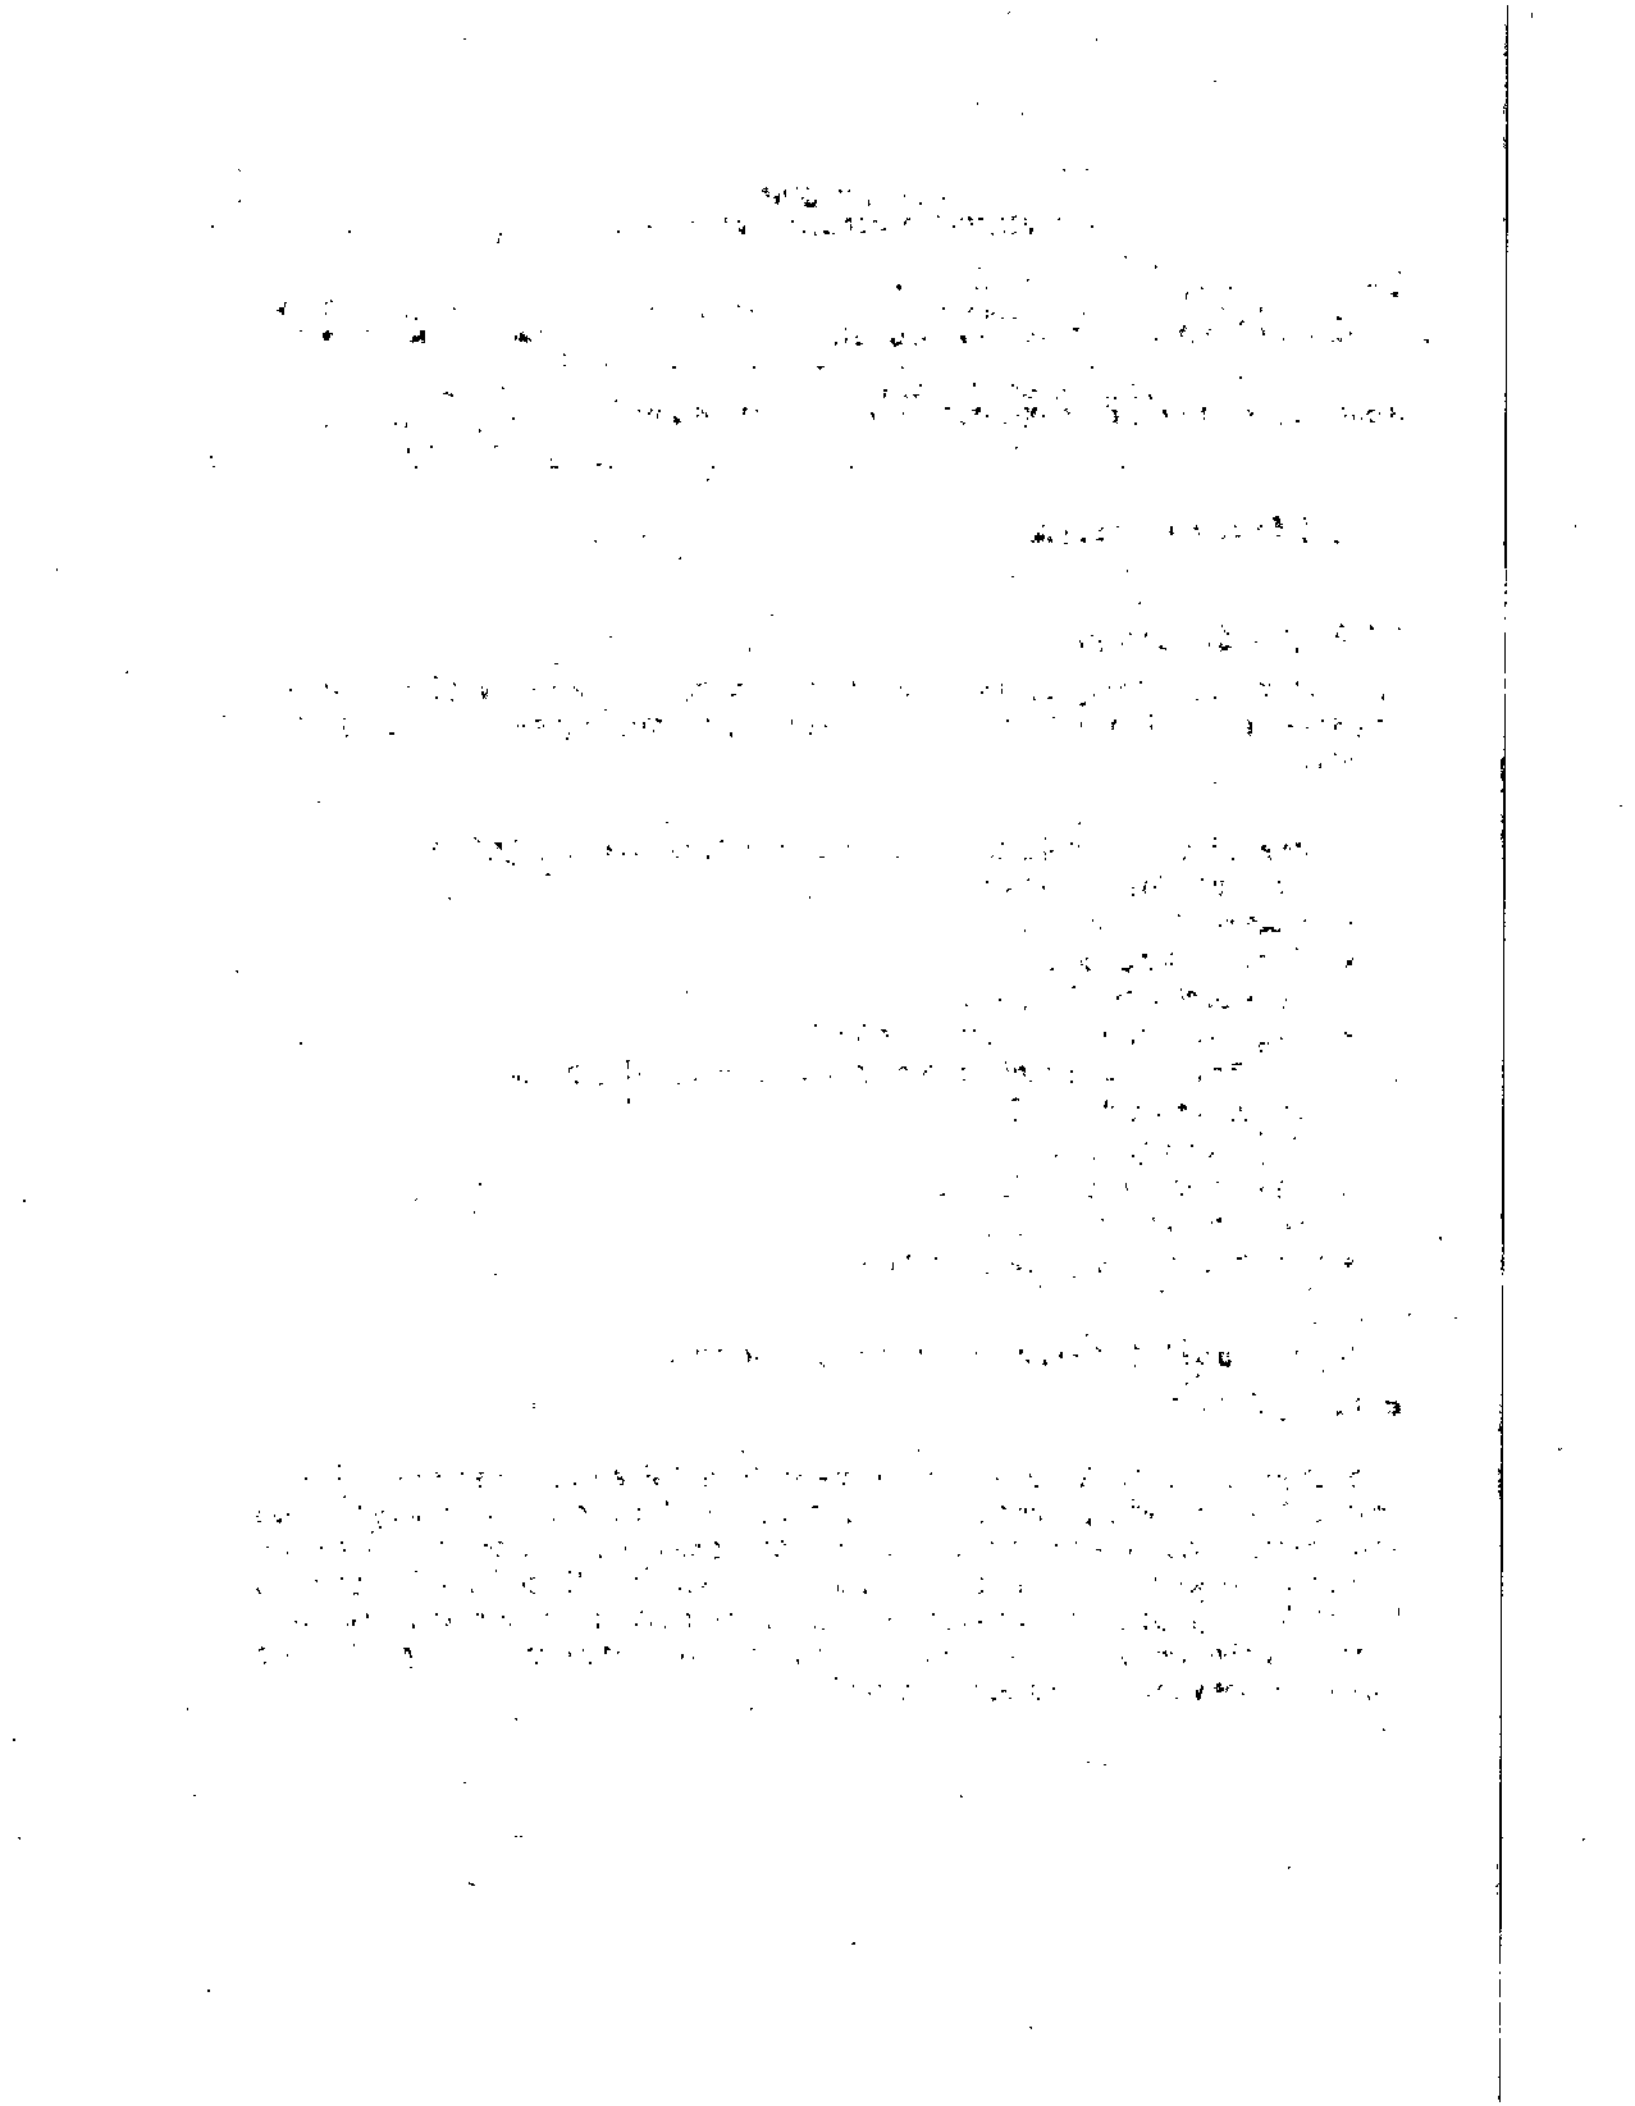

Para tal fin se realizaron las siguientes actividades:

- Inventario de daños, empleando la metodología del PCI.
- Proyección del TPD y evaluación del número de ejes equivalentes.
- Diagnóstico.
- Definición de intervenciones con base a metodología IDU.


5.3 Control de avances

A la fecha en el contrato 321 de 2019, se ha realizado todo el proceso de priorización de vías, análisis de los diagnósticos, y se culminó con la fase de estudios y diseños. De manera que en esta etapa se continua en la ejecución del proceso constructivo de los diferentes CIV a intervenir.


6. Plan De Acción De Interventoría

En la tabla 3 que veremos a continuación, encontraremos el listado de CIV contractual entregado por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe.

CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	UPZ
18001890	KR 13 BIS	CL31 F	CL 31 G SUR	36
18001692	CL 30 SUR	KR 12 L	KR 12 K	36
18001795	CL 23 SUR	KR 10 B	KR 10 C	36
18001964	CL 26 B SUR	KR 11	KR 12 K	36
18001567	KR 14 BIS B	CL 27 A	CL 27 C	36
18000460	KR 27	CL 39 SUR	CL 36 A SUR	39
18000985	CL 30 SUR	KR 20	KR 20 A	39
18000380	KR 25	CL 28 A SUR	CL 29 SUR	39
18000389	KR 25	CL 29 SUR	CL 29 A SUR	39
18000406	KR 25	CL 29 A SUR	CL 30 SUR	39
18000165	CL 41 SUR	KR 31 BIS	KR 32	39
18000864	CL 31 B	KR 23	KR 23 B	39
18001180	CL 42 A SUR	KR 24	KR 23 B	39
18000106	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	39
18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26 A	39

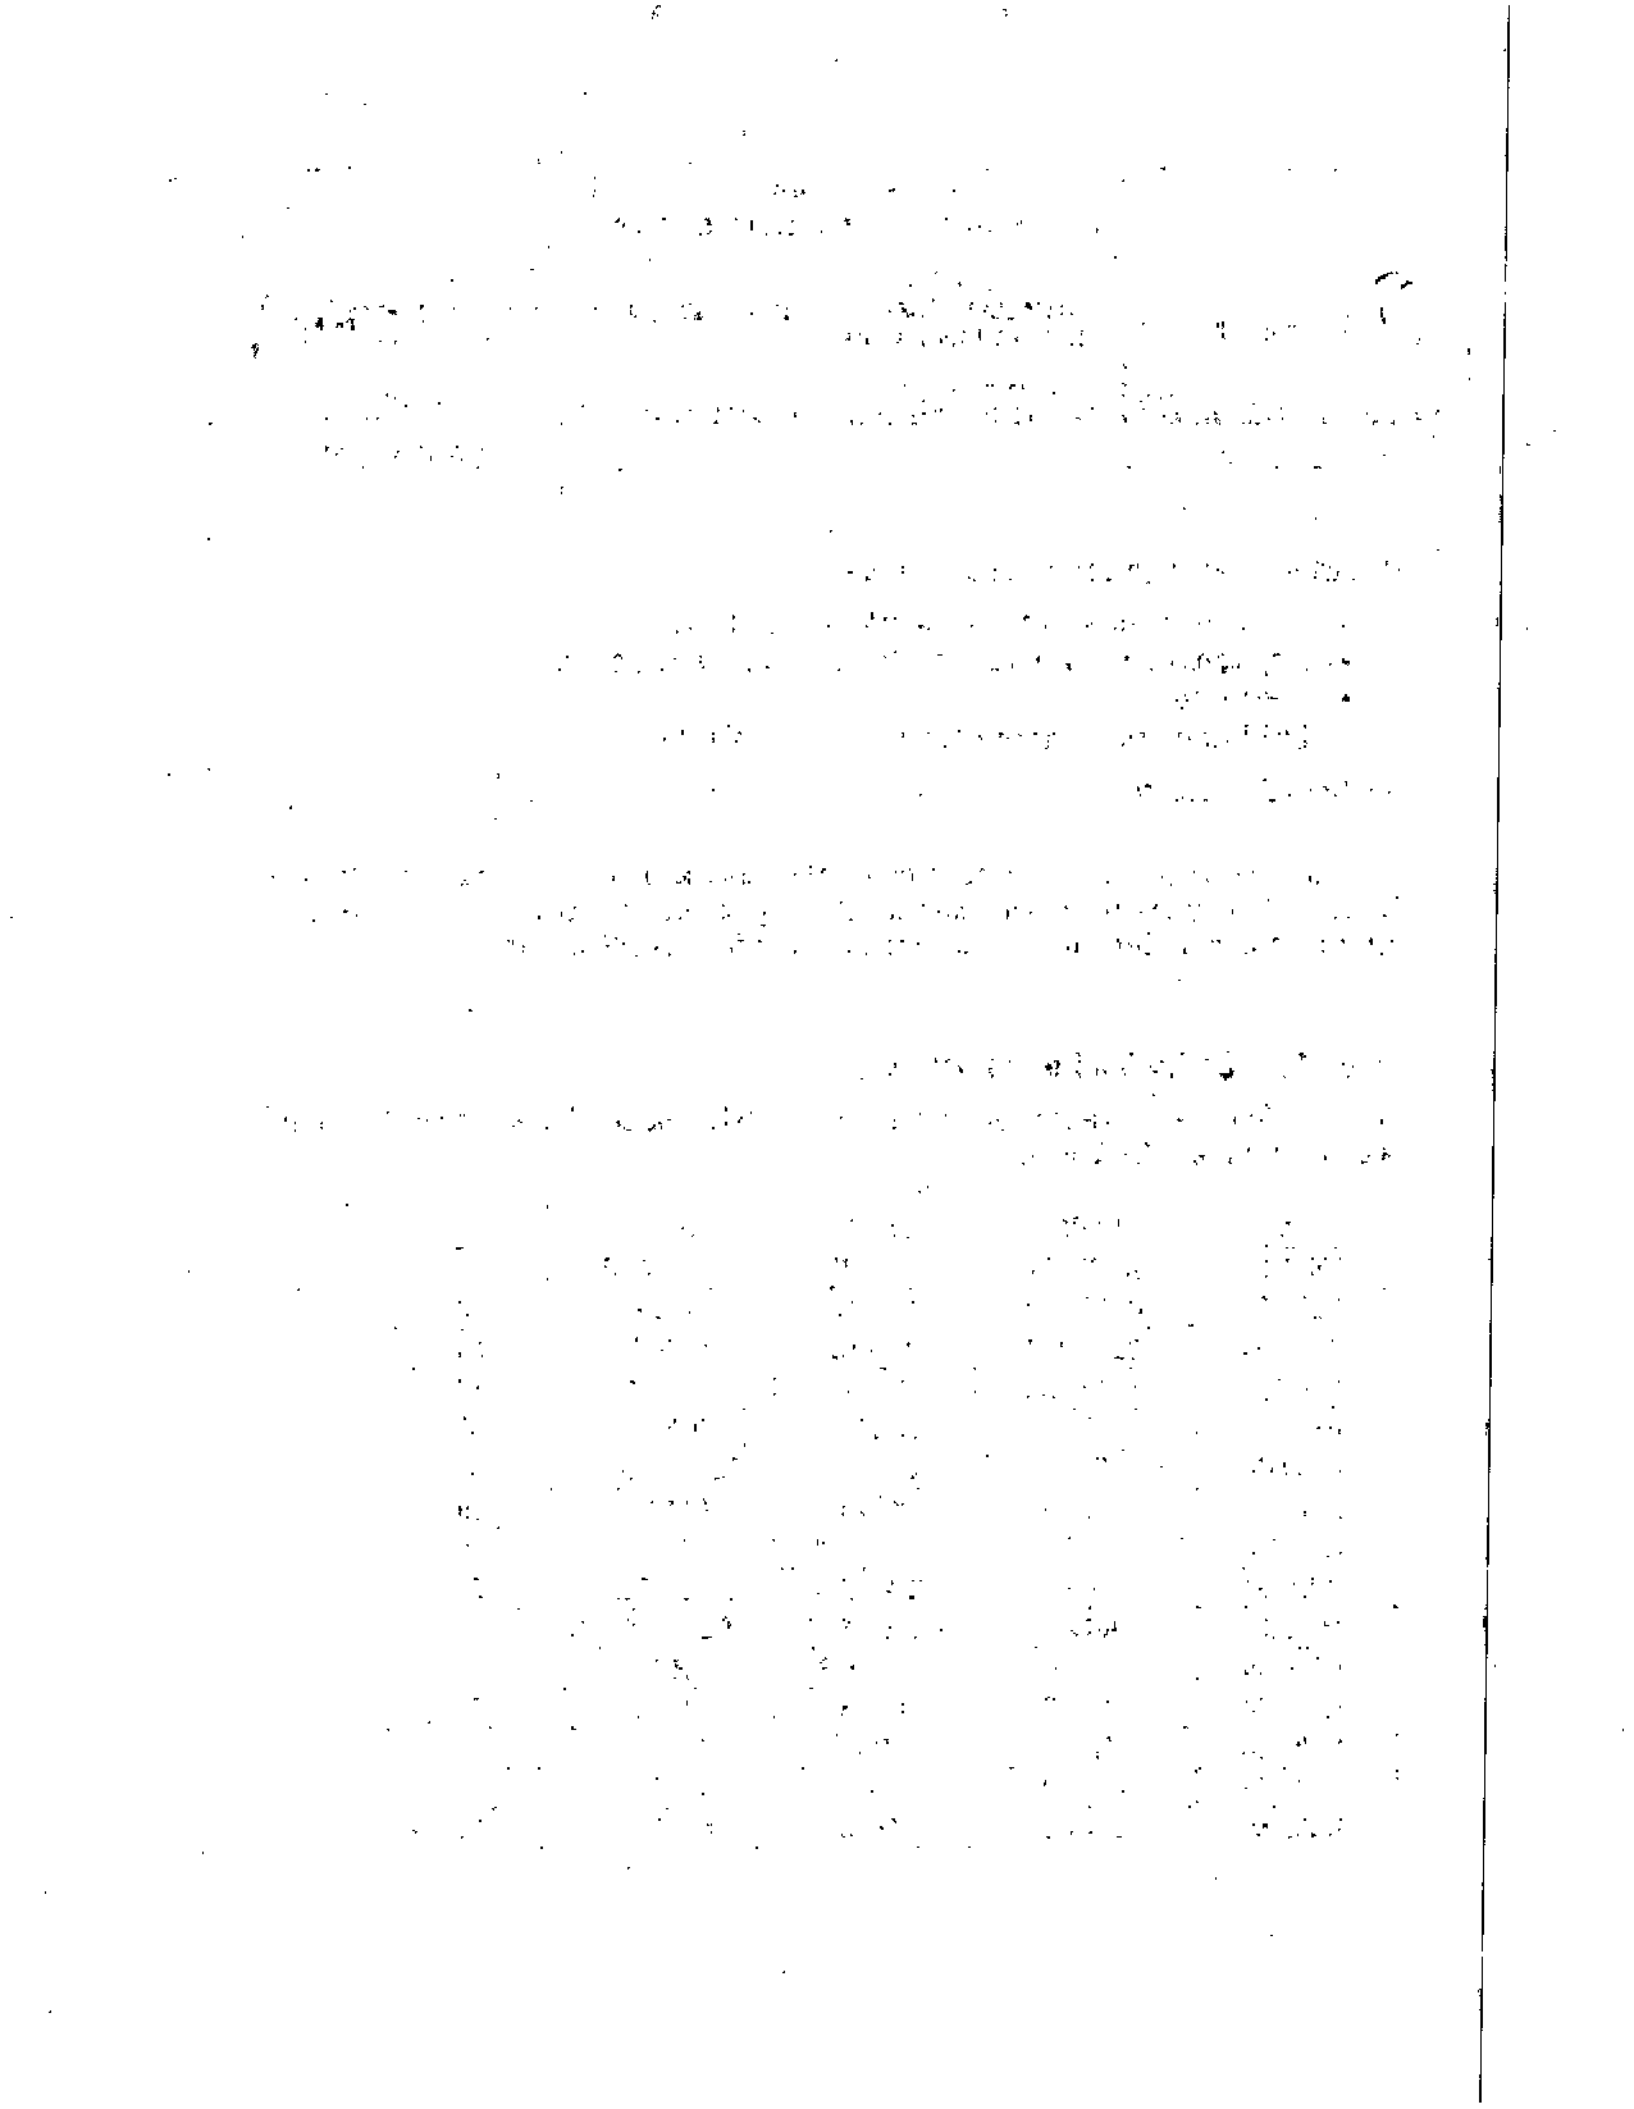


18000250	KR 26	CL 27 SUR	CL 26 SUR	39
18000291	KR 26	CL 27 A SUR	CL 27 SUR	39
18000201	CL 31 SUR	KR 26 B	KR 26 D	39
18000241	CL 35 C SUR	KR 26 D	KR 26 F	39
18000320	CL 25 A SUR	KR 24 B	KR 24 C	39
18001036	KR 23	CL 35 SUR	CL 34 SUR	39
18001055	KR 23	CL 35 SUR	CL 35 A SUR	39
18001153	KR 19 B BIS	CL 29 s	CL 30 s	39
18001122	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 29 s	39
18001100	CL 28 c sur	KR 19 c	KR 19 B BIS	39
18001099	KR 19 B BIS	CL 28 c sur	CL 28 B sur	39
18001058	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 B sur	39
18001031	KR 19 B BIS	CL 28 A sur	CL 28 s	39
18001084	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	39
18000205	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 31	39
18002249	DG 32G SUR	KR 13 A	KR 13	53
18002090	KR 13 A BIS A	TV 13 A BIS	DG 32 B BIS S	53
18003398	KR 11 D	CL 43 SUR	CL 43 BIS A SUR	53
18003337	KR 11 H BIS	CL 43 BIS A SUR	CL 43 A SUR	53
18002837	DG 32 B SUR	TV 12 G	KR 12 B	53
18004057	KR 12 A	CL 50 D sur	AV Caracas	53
18003547	KR 10 B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	53
30001318	KR 12 K	CL 32 A SUR	CL 32 BIS SUR	53
18001949	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 BIS	53
18001995	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 B BIS SUR	53
18001769	KR 13 K	CL 35 B SUR	CL 36 SUR	53
18001737	KR 13 K	CL 35 A SUR	CL 35 B SUR	53
18001115	KR 19	CL 28 SUR	CL 28 A SUR	39
18001135	KR 19	CL 28 A SUR	CL 28 B SUR	39
18000627	TV 26 A BIS	KR 27	DG 32 C BIS SUR	39
18000661	TV 26 A BIS	DG 45 A SUR	CL 44 SUR	39
18002332	KR 12 J	DG 32 C SUR	DG 32 C BIS SUR	53
18002324	KR 12 J	DG 32 B BIS SUR	DG 32 C SUR	53

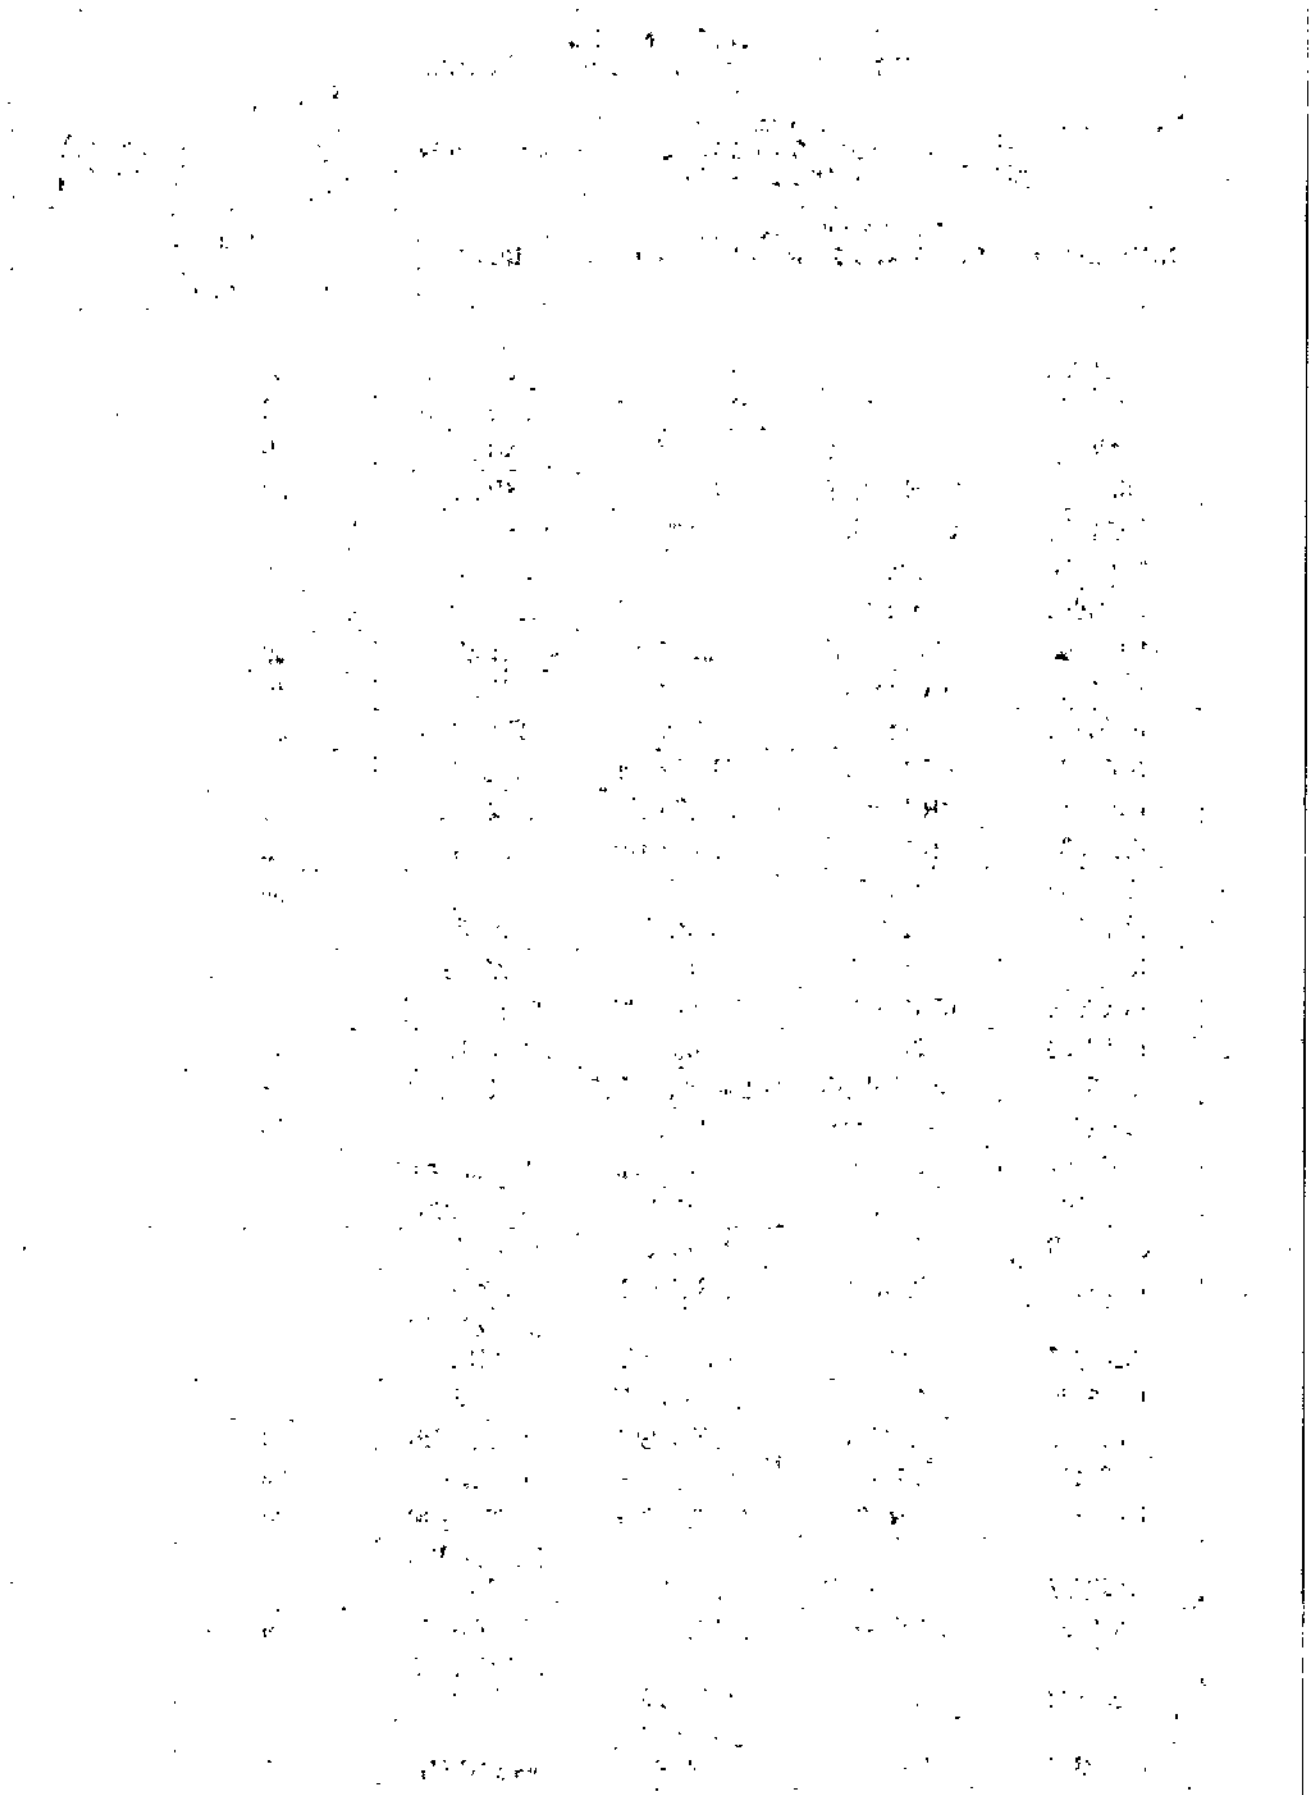

18003792	DG 44A	TV 5M	TV 5L	54
18003265	CL 48 C	KR 13	KR 12 BIS	54
18003665	DG 39d sur	KR 9F	TV 9F	54
18003843	KR 4C	CLL 51 S	CLL 52 S	54
18004609	DG 48 K BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	54
18004534	DG 48 J BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	54
18004489	KR 9	CL 49B SUR	CL 49BBIS SUR	54
18004021	DG 46 SUR	TV 5L	TV 5J	54
18003594	CL 50B SUR	KR 13BIS	KR 13	54
18004059	CL 50 B SUR	KR 12	KR 11 D	54
18004104	CL 50 B SUR	KR 11 C	KR 11 D	54
50009406	TV 3	CL 48 L SUR	FINAL DE VIA	54
18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	54
18005054	KR 5 A	CL 48 M	CL 48 L	54
18007711	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5B	54
18004897	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5 C	54
50001100	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5D	54
18004836	CL 48 K s	KR 5D	KR 5 f	54
18005065	CL 48N SUR	KR 5C	KR 5B	54
18005006	KR 5D	CL 48N SUR	CL 48 M SUR	54
18007562	CL 48N SUR	KR 5D	KR 5D BIS	54
18003953	KR 11 D	CL 49 F BIS SUR	CL 49 H SUR	54
18003954	CL 49 H SUR	KR 11 D	KR 12	54
18003863	KR 12A	CL 49 I SUR	CL 49 H SUR	54
18007465	DG 49C BIS A SUR	DG 49 D SUR	VIA CERRADA	54
18004004	CL 49B SUR	KR 11 A	KR 11 A BIS A	54
18007472	CL 49A BIS A SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	54
18007471	CL 49A BIS SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	54
18003871	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49 B SUR	54
18003833	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	54
18003755	CL 49A SUR	KR 11 C	KR 11 B	54
18003896	CL 49A BIS A SUR	KR 11 B	KR 11 A BIS A	54
18003945	CL 49A BIS A SUR	KR 11 A BIS A	KR 11A BIS	54


18003895	KR 11A BIS	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	54
18007473	KR 11A BIS	CL 49A SUR	VIA CERRADA	54
50001073	CL 49A SUR	KR 11	KR 11ABIS	54
18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	55
18006296	CLL 49A S	KR 2C E	KR 2D E	55
18006434	CL 49A S	KR 3B E	KR 3C E	55
18007348	KR 2B E	CL 49BISB SUR	TV 1C E	55
18007347	KR 2B E	CL 49BIS SUR	CL 49BISB SUR	55
50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR	55
50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL	55
50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR	55
18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	55
18006329	DG 53 SUR	KR 4 BIS B	KR 4 A	55
18006312	DG 53 SUR	KR 4 A	KR 4 B	55
18005321	CL 48RBIS S	KR 4	KR 5	55
18006046	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	55
18005815	CL 53B SUR	TV 5C	TV 5B Bis	55
18005858	CL 53C SUR	TV 5C	TV 5B Bis	55
18005326	KR 5 C	CL 48 X SUR	CL 48 Y SUR	55
18005229	KR 5BBIS	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	55
18005228	KR 5C	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	55
18003440	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	54
18003460	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	54

Tabla 3 Listado CIV contractuales.

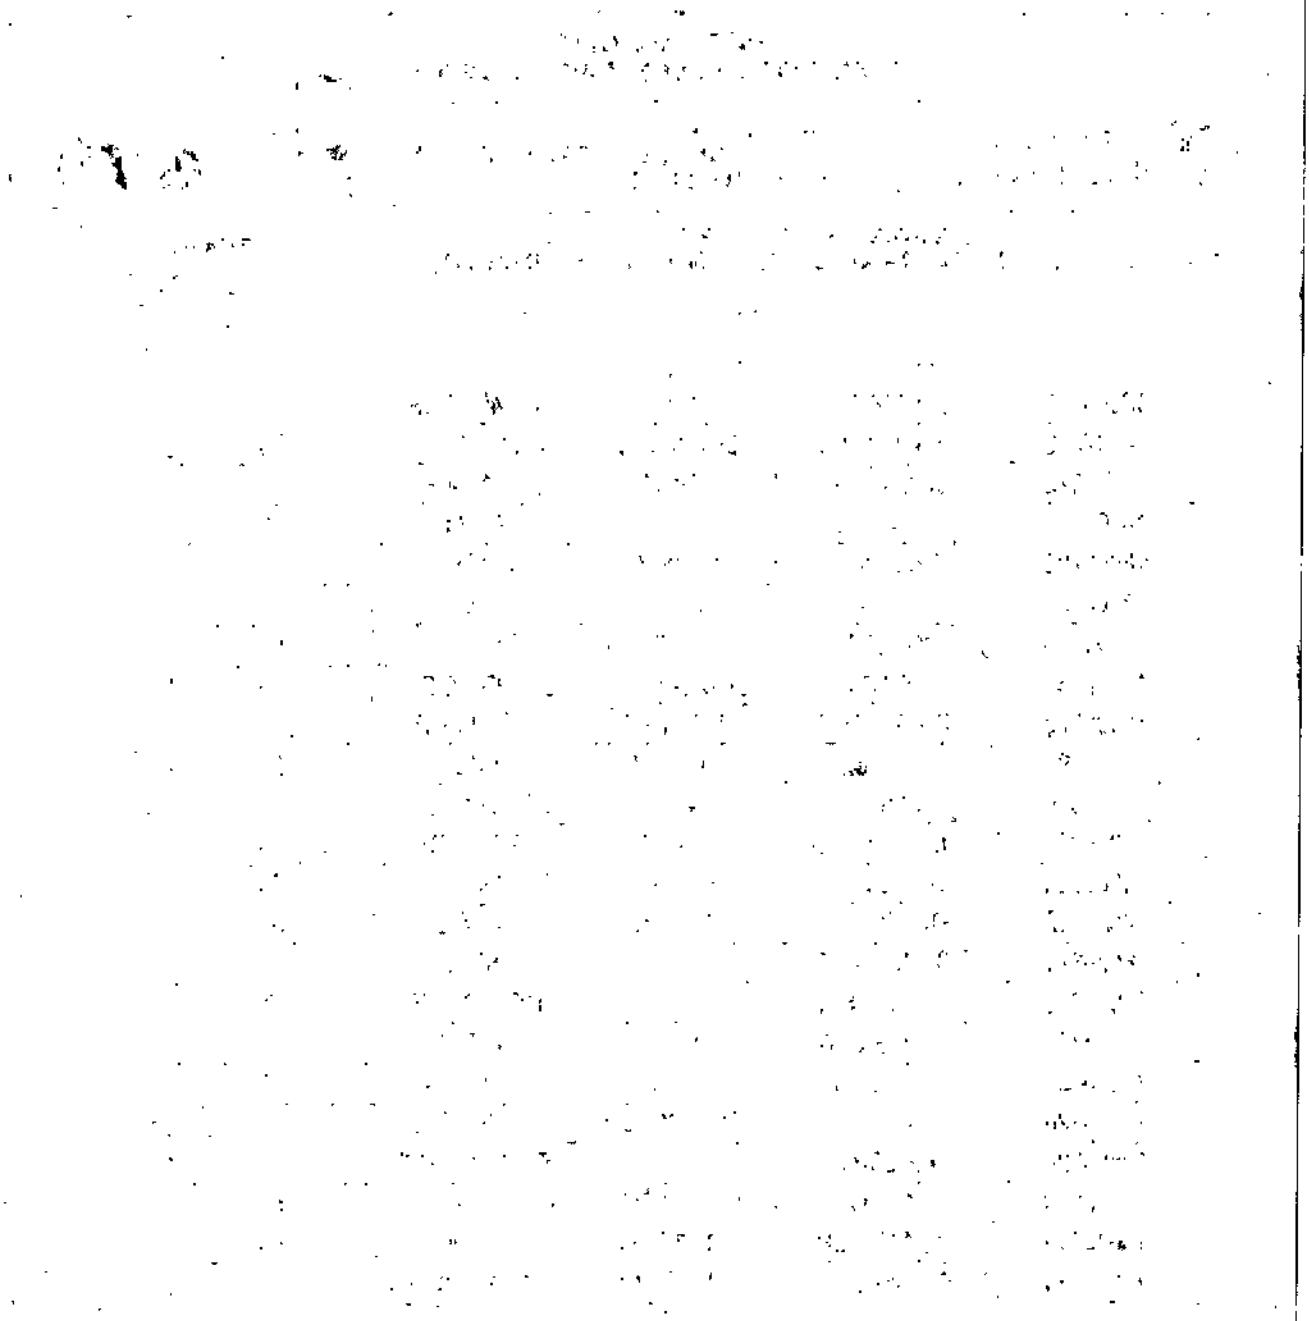

Basados en el listado contractual, se realizó recorridos por cada uno de ellos acompañados por esta interventoria y el supervisor de la Alcaldía Local, observando el estado actual de las vías y las necesidades de la comunidad para poder priorizar todos los CIV. De manera que el supervisor realizo la entrega de un nuevo listado vías ya priorizado en el comité n°2 realizado el día 11 de marzo del 2020.


UPZ	CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	TIPO DE OBRA	ORDEN DE INTERVENCIÒN
53	18002324	CR 12J	DG 32B BIS SUR	DG 32C SUR	Rehabilitación	1
53	18002332	CR 12J	DG 32C SUR	DG 32C BIS SUR	Rehabilitación	1
53	18003547	KR 10 B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	Reconstrucción	1
54	18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	Reconstrucción	1
55	50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR		2
55	50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR		2
55	50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL		2
54	18003833	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	Reconstrucción	3
54	18003863	KR 12A	CL 49 I SUR	CL 49 H SUR	Reconstrucción	3
54	18003871	KR 11 B	CL 49A BIS A SUR	CL 49 B SUR	Reconstrucción	3
54	18003895	KR 11A BIS	CL 49A BIS A SUR	CL 49A SUR	Reconstrucción	3
54	18003896	CL 49A BIS A SUR	KR 11 B	KR 11 A BIS A	Reconstrucción	3
54	18004004	CL 49B SUR	KR 11 A	KR 11 A BIS A	Reconstrucción	3
54	18007465	DG 49C BIS A SUR	DGONAL 49 D SUR	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	18007471	CL 49A BIS SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	Reconstrucción	3

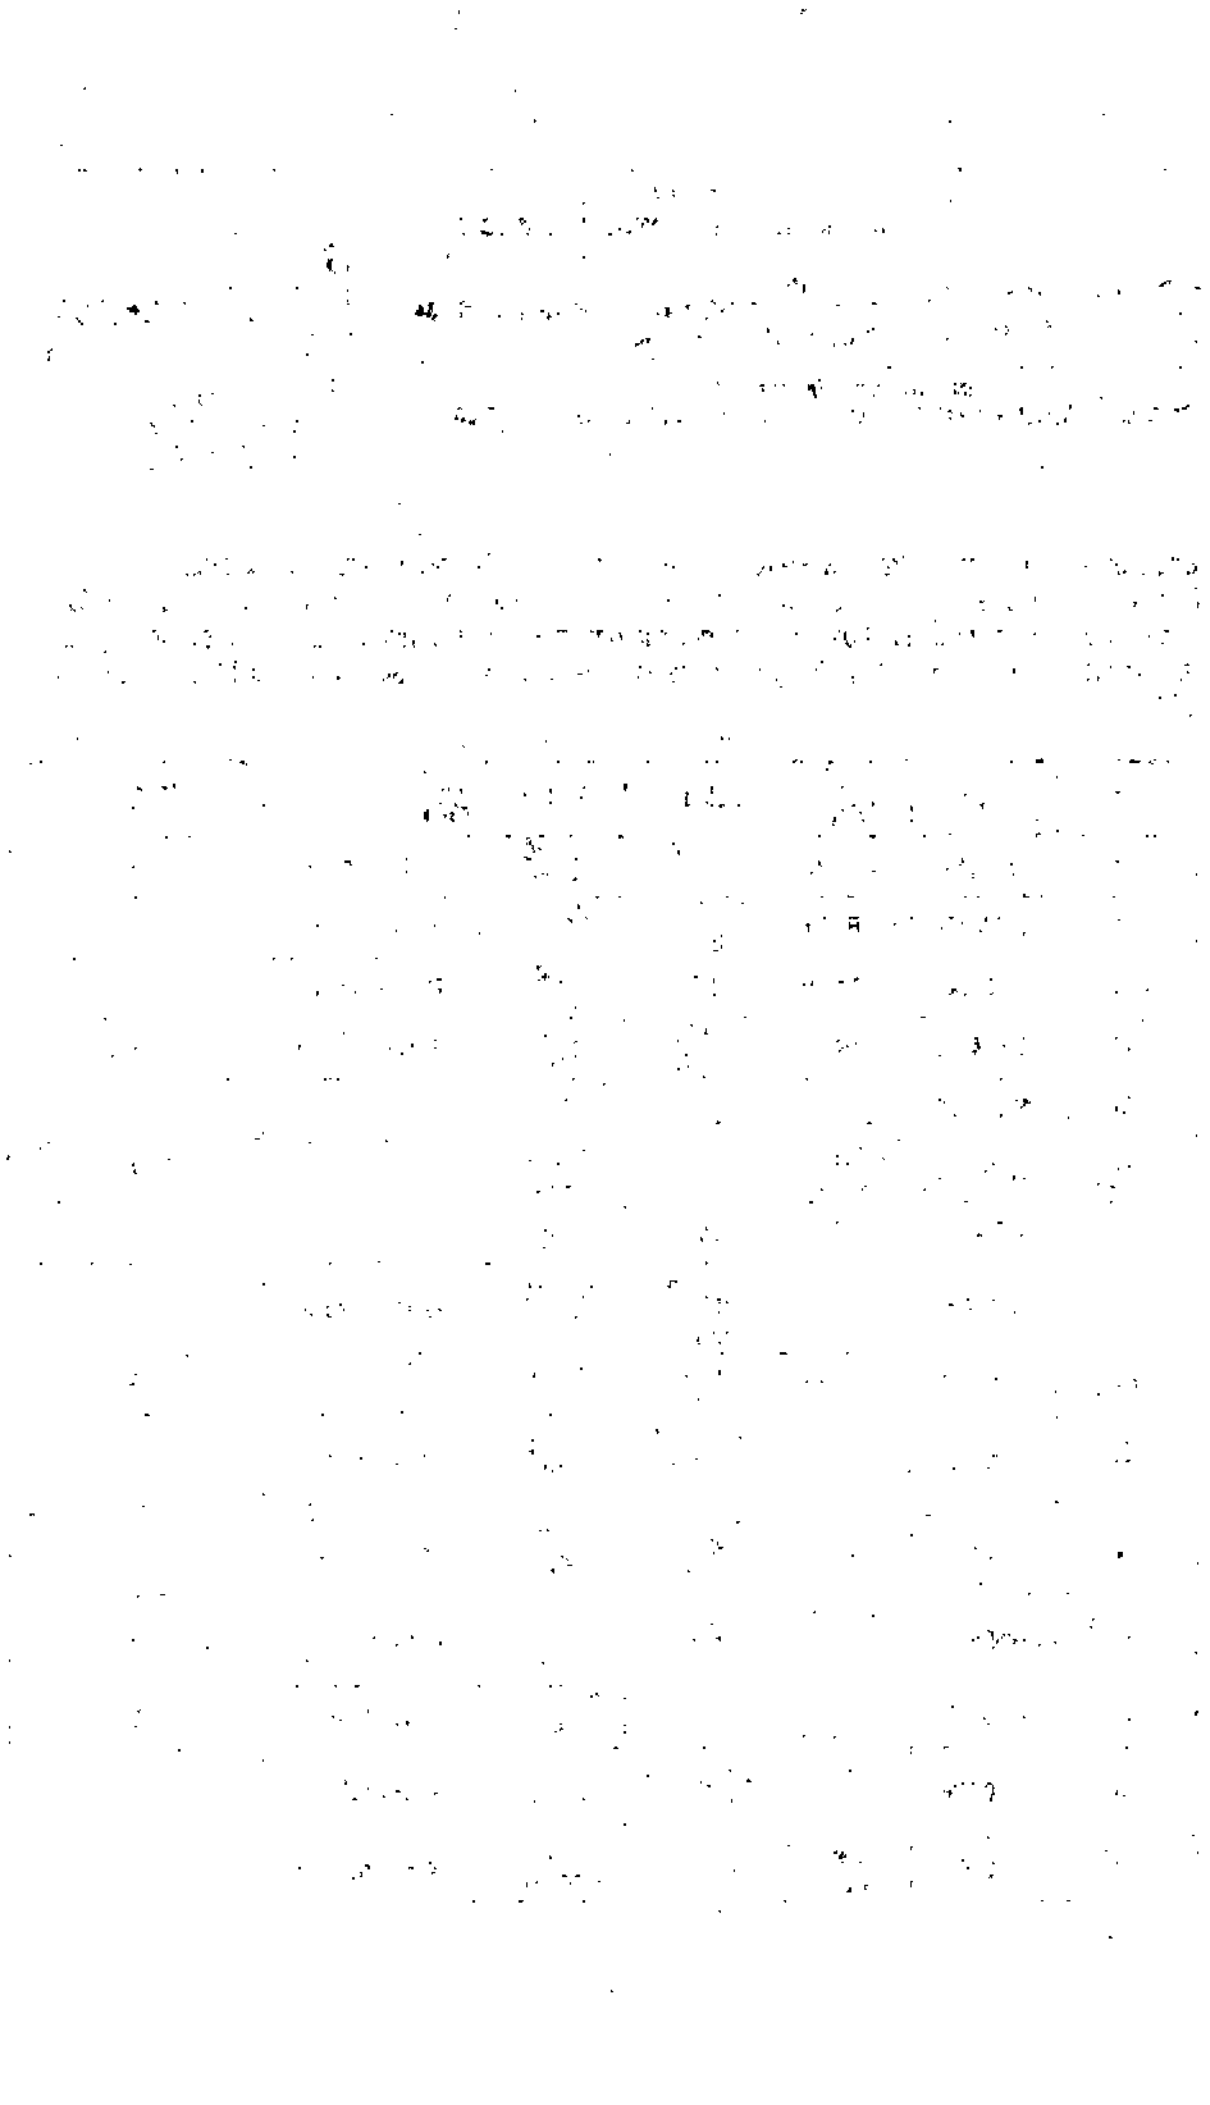

54	18007472	CL 49A BIS A SUR	KR 11 C	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	18007473	KR 11A BIS	CL 49A SUR	VIA CERRADA	Reconstrucción	3
54	50001073	CL 49A SUR	KR 11	KR 11ABIS	Reconstrucción	3
54	18003265	CL 48 C	KR 13	KR 12 BIS	Reconstrucción	4
55	18005321	CL 48RBIS S	KR 4	KR 5	Reconstrucción	5
39	18000201	CL 31 SUR	KR 26 B	KR 26 D	Rehabilitación	6
55	18005815	CL 53B SUR	TV 5C	TV 5B Bis	Reconstrucción	7
55	18005858	CL 53C SUR	TV 5C	TV 5B Bis	Reconstrucción	7
39	18000320	CL 25A SUR	KR 24B	KR 24C	Rehabilitación	9
39	18000627	TV 26A BIS	CR 27	DG 45A SUR	Rehabilitación	10
39	18000661	TV 26A BIS	DG 45A SUR	CL 44 SUR	Rehabilitación	10
55	18005516	CLL 48 X SUR	CRA 2F	CRA 3	Rehabilitación	11
55	18005530	CLL 48 X SUR	CRA 2 D	CRA 2F	Rehabilitación	11
55	18005628	CLL 48 X SUR	CRA 2	CRA 2 D	Rehabilitación	11
55	18005658	CLL 48 X SUR	CRA 1 G	CRA 2	Rehabilitación	11
55	18005681	CLL 48 X SUR	CRA 1 F	CRA 1 G	Rehabilitación	11
55	18005326	KR 5 C	CL 48 X SUR	CL 48 Y SUR	Rehabilitación	12
54	50009406	TV 3	CL 48 L SUR	FINAL DE VIA	Reconstrucción	12
39	18000089	KR 33	DG 40B SUR	DG 41 SUR	Reconstrucción	12
54	18003792	DG 44A	TV 5M -	TV 5L	Reconstrucción	13
54	18003594	CL 50B SUR	KR 13BIS	KR 13	Rehabilitación	14
53	18004057	KR 12 A	CL 50 D sur	AV Caracas	Reconstrucción	14
39	18000380	KR 25	CL 28 A SUR	CL 29 SUR	Reconstrucción	15

39	18000389	KR 25	CL 29 SUR	CL 29 A SUR	Rehabilitación	15
39	18000406	KR 25	CL 29 A SUR	CL 30 SUR	Rehabilitación	15
55	18005570	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 A	CRA 4 B	Rehabilitación	16
55	18005600	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	Rehabilitación	16
39	18000241	CL 35C sur	KR 26D	KR 26F	Rehabilitación	17
54	18004836	CL 48 K s	KR 5D	KR 5 f	Rehabilitación	18
54	18004897	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5 C	Rehabilitación	18
54	18005006	KR 5D	CL 48N SUR	CL 48 M SUR	Rehabilitación	18
54	18005054	KR 5 A	CL 48 M	CL 48 L	Rehabilitación	18
54	18005065	CL 48N SUR	KR 5C	KR 5B	Rehabilitación	18
54	18007562	CL 48N SUR	KR 5D	KR 5D BIS	Rehabilitación	18
54	18007711	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5B	Rehabilitación	18
54	50001100	CL 48 K s	KR 5 C	KR 5D	Rehabilitación	18
54	18004534	DG 48 J BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	Rehabilitación	19
54	18004609	DG 48 K BIS S	TV 5 Q	TV 5 Q BIS A	Rehabilitación	19
53	18001737	KR 13K	CL 35A SUR	CL 35B SUR	Reconstrucción	20
53	18001769	KR 13K	CL 35B SUR	CL 36 SUR	Reconstrucción	20
54	18003440	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13ª	Rehabilitación	20
54	18003460	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	Rehabilitación	20
55	18006322	CRA 4 BIS B	DG 52 A SUR	DG 53 SUR	Rehabilitación	21
39	18001100	CL 28 c sur	KR 19 c	KR 19 B BIS	Rehabilitación	22
55	18005228	KR 5C	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	Rehabilitación	23

55	18005229	KR 5BBIS	CL 48Q SUR	CL 48PBISC S	Rehabilitación	23
39	18000165	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 32	Rehabilitación	24
39	18000205	CL 41 s	KR 31 BIS	KR 31	Rehabilitación	24
53	18002837	DG 32 B SUR	TV 12 G	KR 12 B	Reconstrucción	25
55	18005769	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48UBIS SUR	Reconstrucción	26
36	18001567	KR 14 BIS B	CLL 27 A	CLL 27 C	Rehabilitación	27
36	18001692	CL 30 sur	KR 12 L	KR 12 K	Rehabilitación	27
36	18001890	KR 13bis	CL31 F	CL 31 G SUR	Rehabilitación	27
54	18003843	KR 4C	CLL 51 S	CLL 52 S	Rehabilitación	27
55	18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	Rehabilitación	27
55	18006312	DG 53 SUR	KR 4 A	KR 4 B	Rehabilitación	27
55	18006329	DG 53 SUR	KR 4 BIS B	KR 4 A	Rehabilitación	27
39	18001031	KR 19 B BIS	CL 28 A Sur	CL 28 s	Rehabilitación	28
39	18001036	KR 23	CL 35 s	CL 34 s	Rehabilitación	28
39	18001055	KR 23	CL 35 s	CL 35 A s	Rehabilitación	28
39	18001058	KR 19 B BIS	CL 28 A Sur	CL 28 B sur	Rehabilitación	28
39	18001084	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	Rehabilitación	28
39	18001099	KR 19 B BIS	CL 28 c Sur	CL 28 B Sur	Rehabilitación	28
39	18001122	KR 19 B BIS	CL 28 c Sur	CL 29 s	Rehabilitación	28
39	18001153	KR 19 B BIS	CL 29 s	CL 30 s	Rehabilitación	28
39	18000159	CL 26 SUR	KR 26	KR 26ª	Rehabilitación	29
39	18000250	KR 26	CL 27 SUR	CL 26 SUR	Rehabilitación	29
39	18000291	KR 26	CL 27 A SUR	CL 27 SUR	Rehabilitación	29
39	18000864	CL 31 B	KR 23	KR 23B	Rehabilitación	29

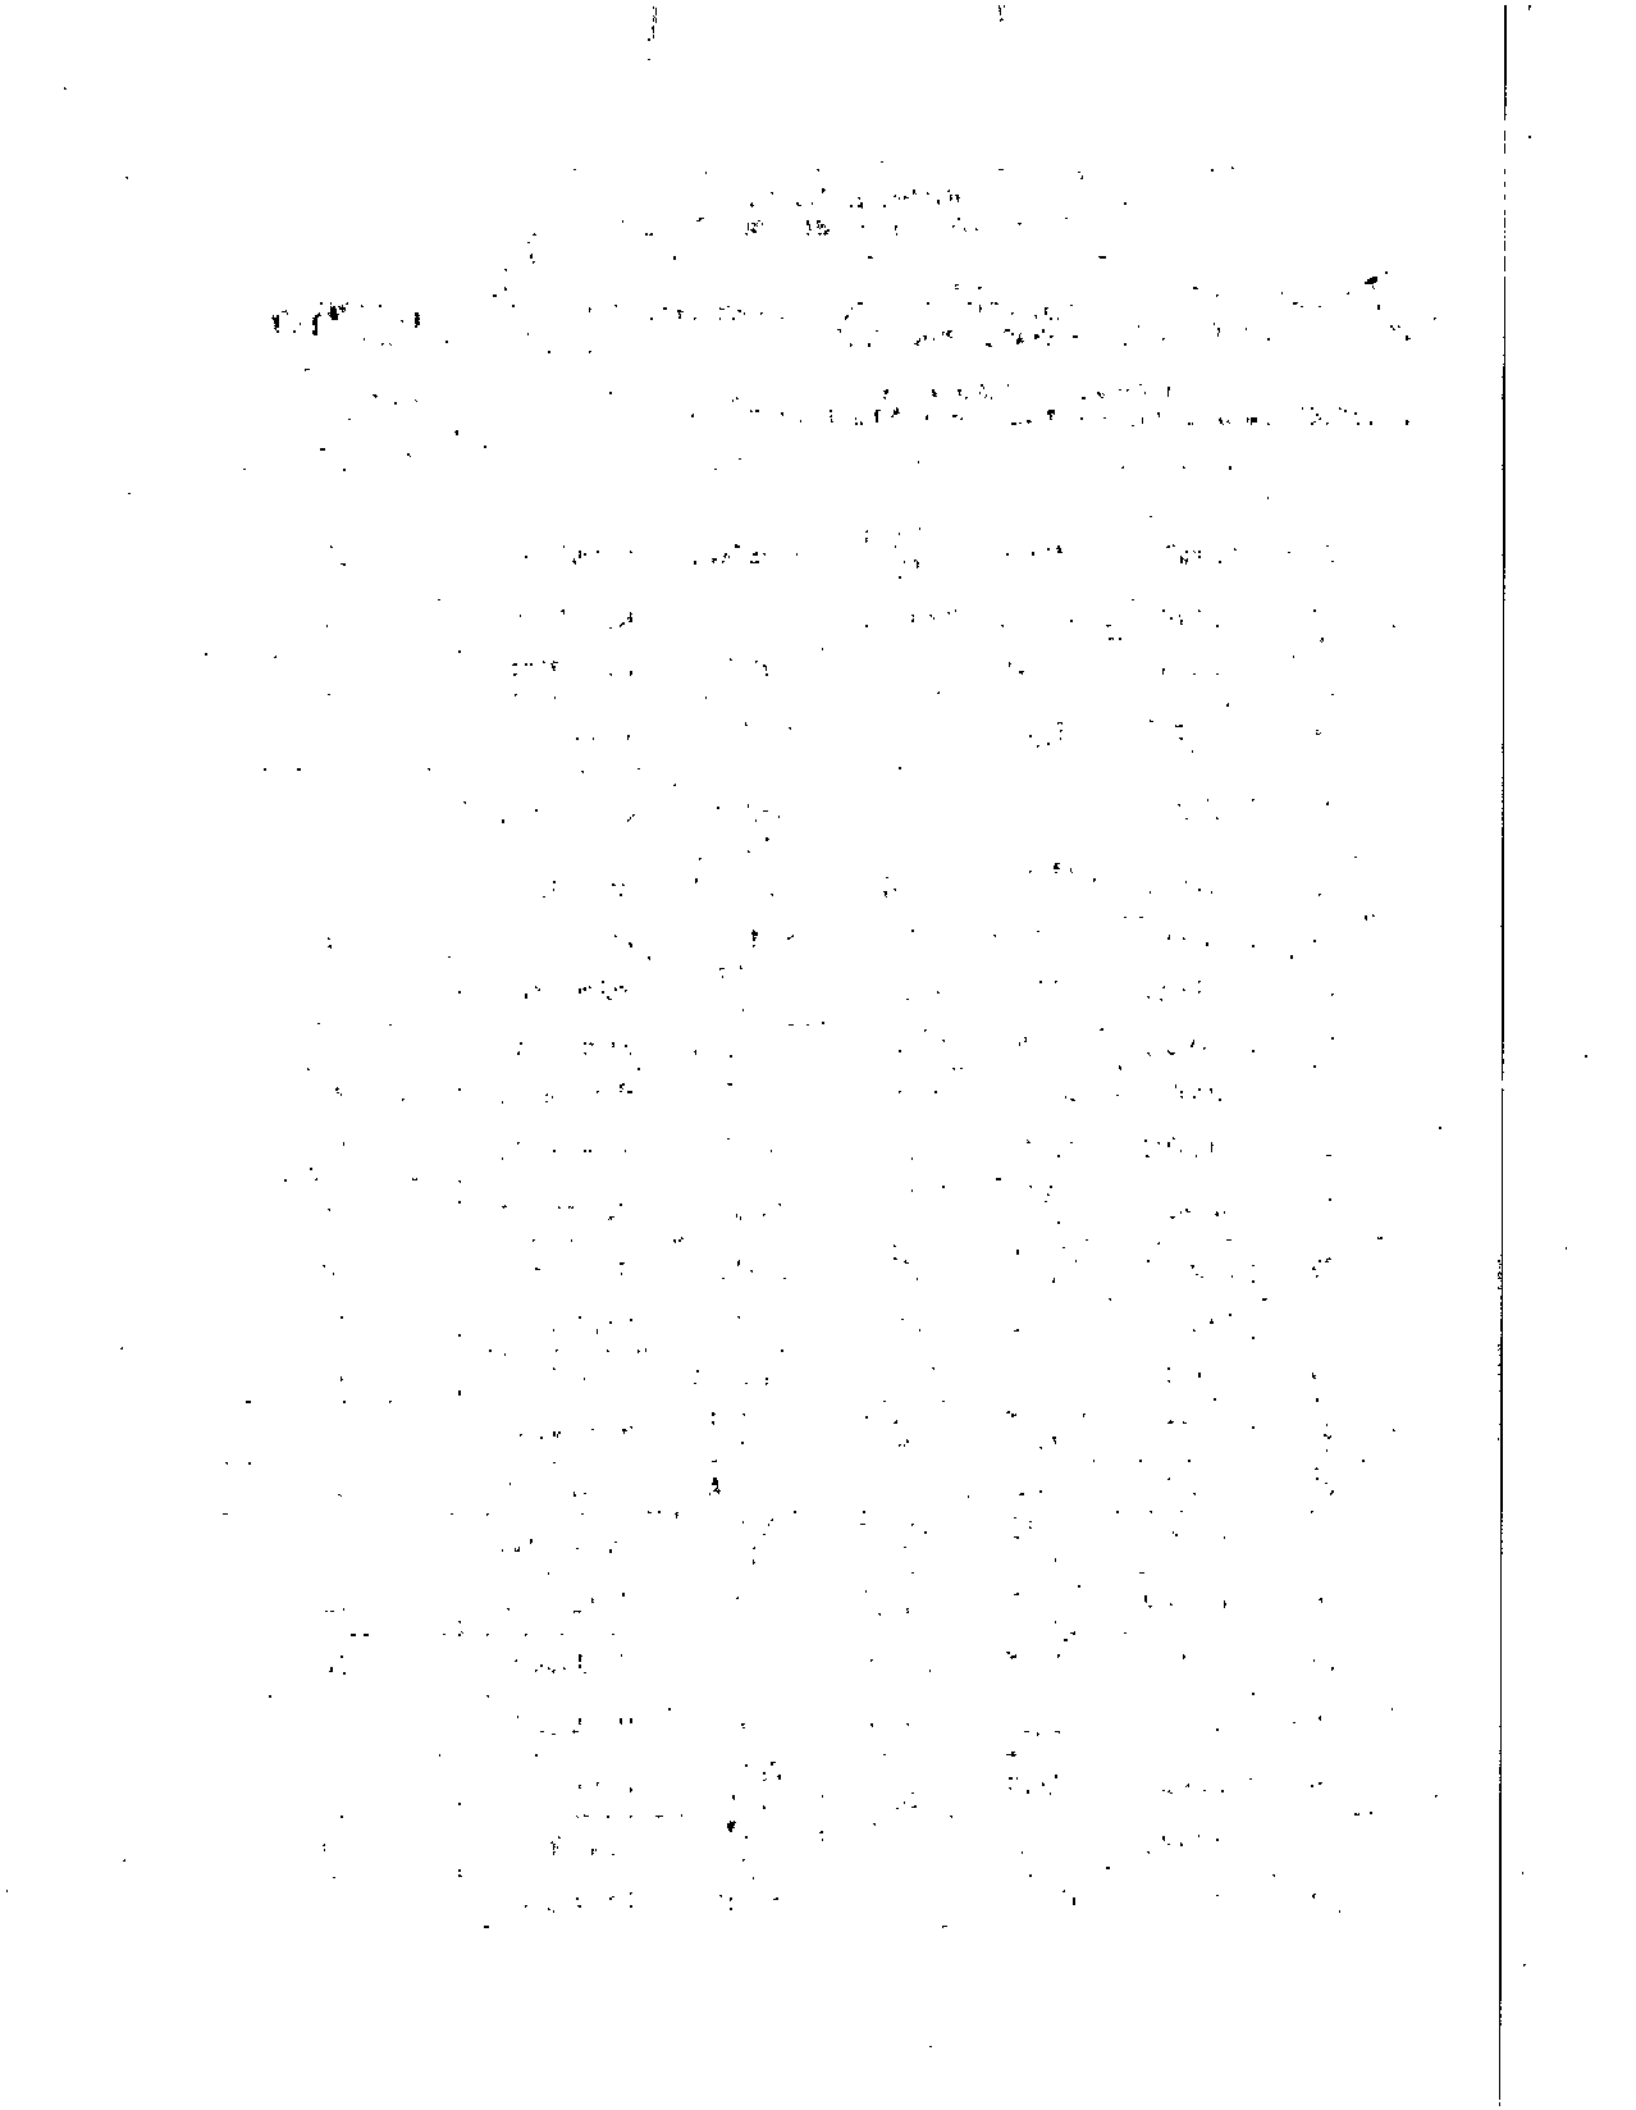

39	18001180	CL 42A SUR	KR 24	KR 23B	Rehabilitación	29
36	18001795	CL 23 SUR	KR 10 B	KR 10 C	Rehabilitación	30
53	18001949	TV 15 B	DG 32 BIS	DG 32 BIS	Rehabilitación	30
36	18001964	CL 26 B sur	KR 11	KR 12	Rehabilitación	30
53	18001995	TV 15 B	DG 32 B	DG 32 B BIS SUR	Rehabilitación	30

Tabla 4 Listado de CIV priorizados por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe.

En el comité realizado el día 14 de septiembre de 2020, donde se encontraban presentes el contratista, supervisor del fondo local de Rafael Uribe Uribe y la interventoría se modifica el listado de segmentos viales, en el cual se incluyen y se excluyen CIV.

Tabla 5 Listado CIV excluidos por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe

CIV	EJE VIAL	INICIAL	FINAL	BARRIO	OBSERVACION DE CONTRATO
X 18004599	KR 7	CL 49 F BIS S	CL 49 G SUR	GOVAROVA	CONTRACTUAL
X 18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	PORTAL	CONTRACTUAL
X 18006010	CL 48R S	KR 2A E	KR 2 E	DIANA TURBAY VALLE	CONTRACTUAL
x 50000378	DG 50 BIS S	CL 51A SUR	CL 51 SUR	PALERMO	CONTRACTUAL
x 50000379	DG51A BIS S	NULL	CL 51A SUR	PALERMO	CONTRACTUAL
x 50004997	DG51A BIS S	CL 52A S	NULL	PALERMO	CONTRACTUAL
X 18000460	KR 27	CL 39 SUR	CL 36A SUR	INGLES	CONTRACTUAL
X 18000985	CL 30 SUR	KR 20	KR 20 A	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18001115	CR 19	CL 28 SUR	CL 28A SUR	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18001135	CR 19	CL 28A SUR	CL 28 B SUR	QUIROGA	CONTRACTUAL
X 18002090	KR 13 A BIS A	TRSV 13 A BIS	DGONAL 32 B BIS S	COLINAS	CONTRACTUAL
X 18002249	DG 32G SUR	KR 13 A	KR 13	COLINAS	CONTRACTUAL
X 18003337	KR 11 H BIS	CL 43 BIS A SUR	CL 43 A SUR	CARMEN DEL SOL	CONTRACTUAL

18003665	DGONAL 39d sur	KR 9F	TV 9F	PUERTO RICO	CONTRACTUAL
X 18003755	CL 49A SUR	KR 11 C	KR 11 B	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003945	CL 49A BIS A SUR	KR 11 A BIS A	KR 11A BIS	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003953	KR 11 D	CL 49 F BIS SUR	CL 49 H SUR	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18003954	CL 49 H SUR	KR 11 D	KR 12	PLAYON	CONTRACTUAL
X 18004021	DG 46 SUR	TV 5L	TV 5J	ALTOS DE MOLINOS	CONTRACTUAL
X 18004059	CL 50 B SUR	KR 12	KR 11 D	CONSUELO	CONTRACTUAL
X 18004104	CL 50 B SUR	KR 11 C	KR 11 D	CONSUELO	CONTRACTUAL
X 18004489	KR 9	CL 49B SUR	CL 49BBIS SUR	MADRID	CONTRACTUAL
X 18005833	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ	CONTRACTUAL
X 18006046	CL 53 Bis SUR	TV 5C	DG 52A SUR	LA PAZ	CONTRACTUAL
X 18006296	CLL 49A S	KR 2C E	KR 2D E	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 18006434	CL 49A S	KR 3B E	KR 3C E	DIANA TURBAY CULTIVOS	CONTRACTUAL
X 18007347	KR 2B E	CL 49BIS SUR	CL 49BISB SUR	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 18007348	KR 2B E	CL 49BISB SUR	TV 1C E	DIANA TURBAY	CONTRACTUAL
X 30001318	KR 12 K	CL 32 A SUR	CL 32 BIS SUR	COLINAS	CONTRACTUAL



El comité realizado el día 19 de febrero de 2021, donde se encontraban presentes el contratista, supervisor del fondo local de Rafael Uribe Uribe y la interventoría se define un nuevo listado de segmentos viales priorizados para la respectiva adición 1.

CIV	BARRIO	UPZ	TIPO DE INTERVENCION	EJE VIAL	INICIO	FIN	PRIORIDAD
18005769	Diana Turbay Lanceros	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	KR 1A	CL 48X SUR	CL 48UBIS SUR	Inicial
18001055	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23	CL 35 s	CL 35 A s	Inicial
18001084	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23	CL 36 s	CL 35 A s	Inicial
18000783	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23D	CL 32A SUR	CL 33 SUR	Inicial
18000742	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23F	CL 32A SUR	CL 33 SUR	Inicial
18000595	Quiroga	QUIROGA (39)	ESPACIO PUBLICO	KR 23F	CL 31 S	CL 31ABIS S	Inicial
18005570	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 A	CRA 4 B	Inicial
18005600	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	CLL 49 BIS SUR	CRA 4 BIS	CRA 4 A	Inicial
18001987	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	CL 32 C	DG 32 F SUR	Inicial
18002022	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	DG 32 F SUR	DG 32 G SUR	Inicial
18002069	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 B	DG 32 G SUR	DG 32 H SUR	Inicial
18002189	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 F BIS	Inicial
18002157	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 D BIS	DG 32 B BIS SUR	Inicial
18006943	Colinas	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13 A	DG 32 F BIS	DG 32 F BIS	Inicial
18005132	Marruecos	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	KR 5 M	CL 49 A BIS	CL 49 C	Inicial
18004621	Principe de Bochica	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	DG 48I SUR	KR 5A	KR 5B	Ultima
18004626	Principe de Bochica	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	DG 48I SUR	KR 5B	KR 5C	Ultima
18000106	Santiago Pérez	SAN JOSE (36)	REHABILITACION	CL 26 SUR	KR 26 C	KR 27	Ultima
18000159	Santiago Pérez	QUIROGA (39)	REHABILITACION	CL 26 SUR	KR 26	KR 26A	Ultima
18003440	Arboleda	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	CL 49G SUR	KR 13 BIS A	KR 13A	Muy Ultima
18003460	Arboleda	MARRUECOS (54)	REHABILITACION	CL 49G SUR	KR 13 BIS	KR 13 BIS A	Muy Ultima
18001737	Rio de Janeiro	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13K	CL 35A SUR	CL 35B SUR	Muy Ultima
18001769	Rio de Janeiro	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACION	KR 13K	CL 35B SUR	CL 36 SUR	Muy Ultima

Tabla 6 Listado segmentos viales incluidos adición 1

En el comité realizado el día 18 de mayo de 2021, donde se encontraban presentes el contratista, supervisor del fondo local de Rafael Uribe Uribe y la interventoria se define un nuevo listado de segmentos viales priorizados para la respectiva adición 2 de acuerdo con los segmentos viales aprobados de los presupuestos participativos.

CIV	BARRIO	UPZ	TIPO DE INTERVENCIÓN	EJE VIAL	INICIO	FIN
18005677	Diana Turbay – Valle	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACION	CL 48 Q SUR	KR 1	KR 1 ESTE
18005709	Diana Turbay – Valle	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CL 48 Q SUR	KR 1 ESTE	KR 1 A ESTE
18005862	Diana Turbay – Valle	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CI 48 Q SUR	KR 1 A ESTE	KR 1 C ESTE
18008006	Diana Turbay – Valle	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CI 48 Q SUR	KR 1 C ESTE	KR 1 D ESTE
18006965	Diana Turbay – Valle	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CL 48 Q SUR	KR 1 D ESTE	KR 2 ESTE
18002614	San Jorge	MARCO FIDEL SUAREZ (53)	REHABILITACIÓN	KR 12 G BIS A	CL 41 SUR	CL 42 SUR
18005169	Molinos	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CL 49 G SUR	KR 5 N	KR 5 M
18005141	Molinos	DIANA TURBAY (55)	REHABILITACIÓN	CL 49 G SUR	KR 5 N	KR 5 R
18005073	Molinos	DIANA TURBAY (55)	ESPACIO PÚBLICO	CL 49 G SUR	KR 5 R	KR 5 T
18005033	Molinos	DIANA TURBAY (55)	ESPACIO PÚBLICO	CL 49 G SUR	KR 5 T	KR 5 U
18005504	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	ESPACIO PÚBLICO	KR 3	CL 48 R SUR	CL 48 T SUR
18005449	Diana Turbay	DIANA TURBAY (55)	ESPACIO PÚBLICO	KR 3	CL 48 R SUR	CL 48 T SUR

Table 7 Listado segmentos viales incluidos adición 2

6.1.Actividades Ejecutadas en el Periodo

A la fecha se continúan actividades rehabilitación y reconstrucción en los frentes de Quiroga, Colinas, Socorro II y Marruecos.

Carrera 23 F, Desde Calle 31 Sur hasta Calle 31 A Bis Sur – Espacio Público CIV 18000595 QUIROGA

Este segmento vial requiere una intervención de espacio público, en el cual se realiza instalación de PMT aprobado por la interventoría y se da inicio con la demolición del andén, excavación manual, Extensión de Geotextil y Extensión y compactación de Sub Base e instalación de cunetas.

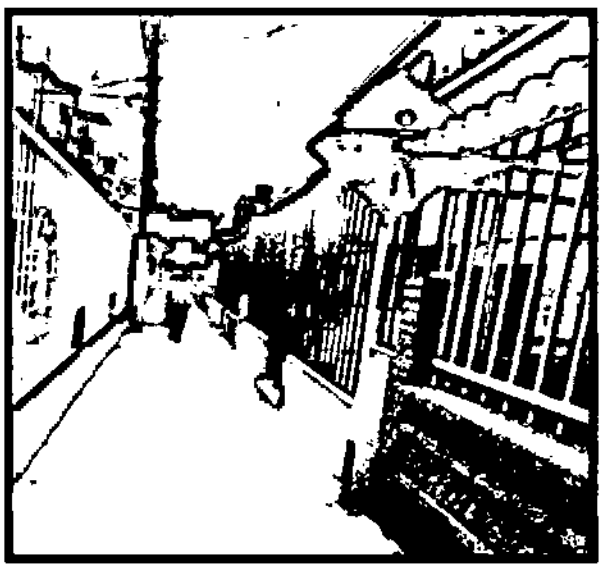


Ilustración 1 Instalación PMT



Ilustración 2 Demolición Anden



Ilustración 3 Extensión de Geotextil y Sub base



Ilustración 4 Compactación de Material e Instalación de cuneta

Calle 49 G Sur, Desde Carrera 13 A hasta Carrera 13 Bis A - Rehabilitación CIV 18003440 – 18003495 SOCORRO

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, se realiza instalación de formaleta, se realiza corte, figurado y amarre de malla electrosoldada y finalmente fundida de andenes y sardinel garantizando el acceso de la comunidad a los predios.

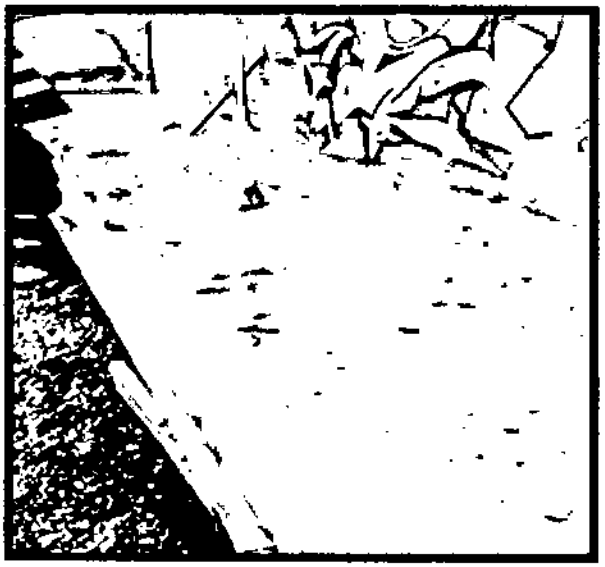


Ilustración 5 Fundida de Anden



Ilustración 6 Fundida de Anden

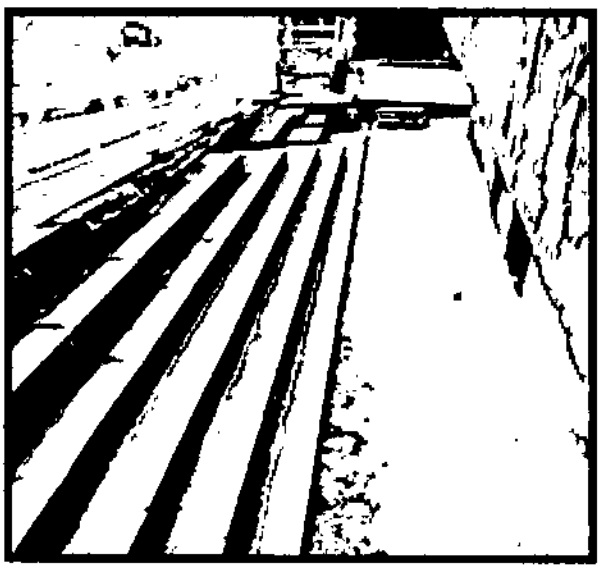


Ilustración 7 Fundida de Bordillo

Carrera 13 A, Desde Diagonal 32 D Bis hasta Diagonal 32 F Bis - Rehabilitación CIV 18002189 – 18006943 COLINAS

Este segmento vial requiere una intervención tipo rehabilitación, en el cual se instala PMT, revisado y aprobado por esta interventoría y se da inicio con la excavación mecánica del tramo 2, se realiza instalación de tubería de 8" y 6", se realiza fundida de placa fondo en concreto, construcción de pozo, construcción y fundida de cárcamo, demolición de sardinel y construcción de caja de inspección.



Ilustración 8 Excavación Mecánica

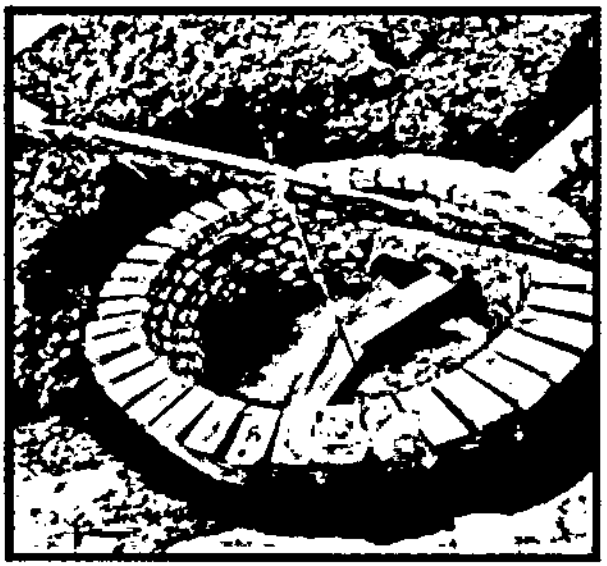


Ilustración 9 Construcción de Pozo



Ilustración 10 Construccion Caja de Inspección

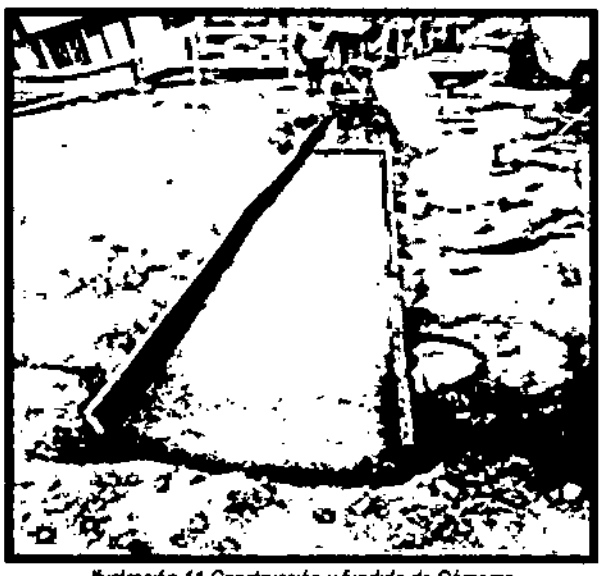


Ilustración 11 Construcción y fundida de Cárcamo

Carrera 5 M, Desde Calle 49 A Bis hasta la Calle 49 C - Reconstrucción CIV 18005132 Marruecos

Este segmento vial requiere una intervención tipo reconstrucción, el cual continua con instalación de tubería de la red sanitaria, construcción de cajas de inspección, construcción de pozos, instalación de cargue y Compactación de material.



Ilustración 12 Instalación de Tubería

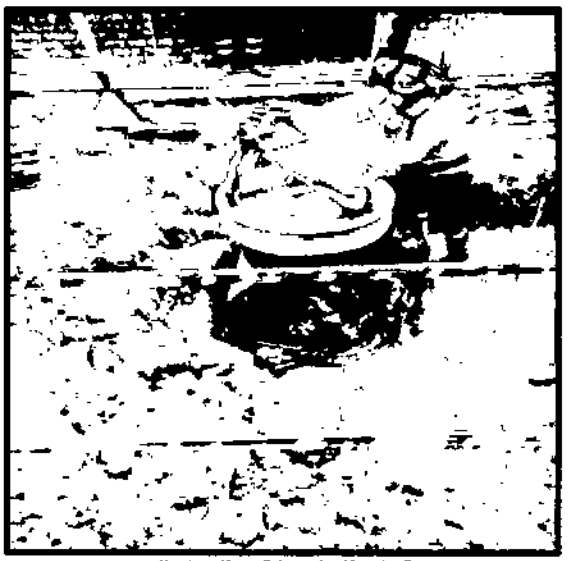


Ilustración 13 Instalación de Cargue

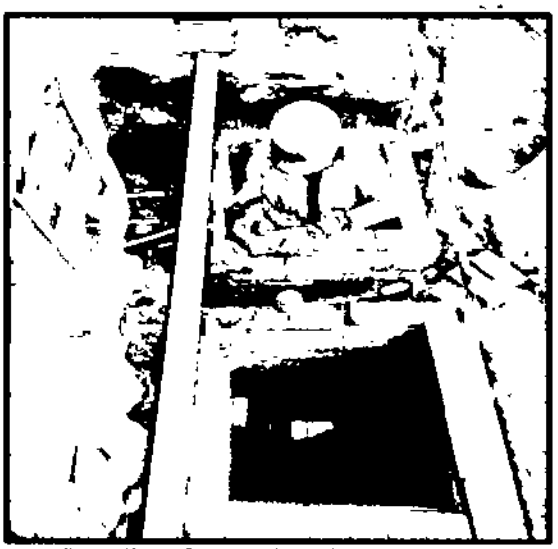


Ilustración 14 Construcción de Cajas de Inspección

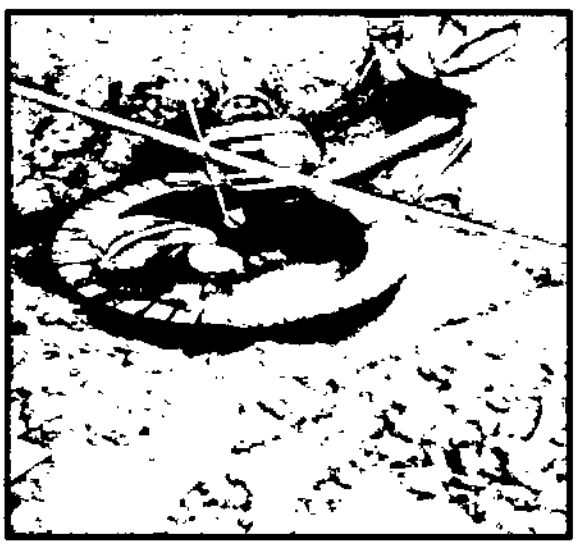


Ilustración 15 Construcción pozo

AVANCE DE OBRA

De acuerdo con la información anterior se puede concluir que el avance financiero del contratista es del 83.58%.

6.2.Objetivos De La Calidad


Los objetivos de calidad que abarcan el proyecto de interventoría están planteados de la siguiente forma:

6.2.1. Se realizó el proceso de recopilación y extracción de información para así mismo ofrecer una Interventoría oportuna y eficaz.
6.2.2. Revisar y aprobar diagnósticos de las zonas realizados por el contratista.
6.2.3. Se llevó a cabo revisión de un nuevo presupuesto más aterrizado para el proyecto por parte del constructor.
6.2.4. Revisar certificados de calidad de los materiales puestos en obra.
6.2.5. Verificar el proceso constructivo empleado por el contratista.
6.2.6. Revisar todos los ensayos de laboratorio tomados en obra.

6.3.Responsabilidades Y Obligaciones Del Interventor

El interventor será responsable:

6.3.1. Realizar control, la supervisión y la vigilancia y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. De la misma forma, debe ejercer control técnico, ambiental, de gestión social, financiera, presupuestal, operativo y administrativo del proyecto.
6.3.2. Ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo con las actividades formuladas para la primera etapa, descritas en la propuesta, la cual forma parte integral del contrato.
6.3.3. Mantener el personal profesional ofertados en la propuesta.
6.3.4. Semanalmente o cada vez que se estime conveniente deberán celebrarse reuniones de seguimiento.
6.3.5. Revisar y aprobar el plan y el programa de trabajo e inversiones dentro del plazo señalado en el cronograma de actividades.
6.3.6. Revisar diagnósticos y presupuestos de las vías a intervenir los cuales serán adelantados en los tres primeros meses del convenio y se entregarán previo a la iniciación de las obras.
6.3.7. Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del convenio, si a ello hubiere lugar.

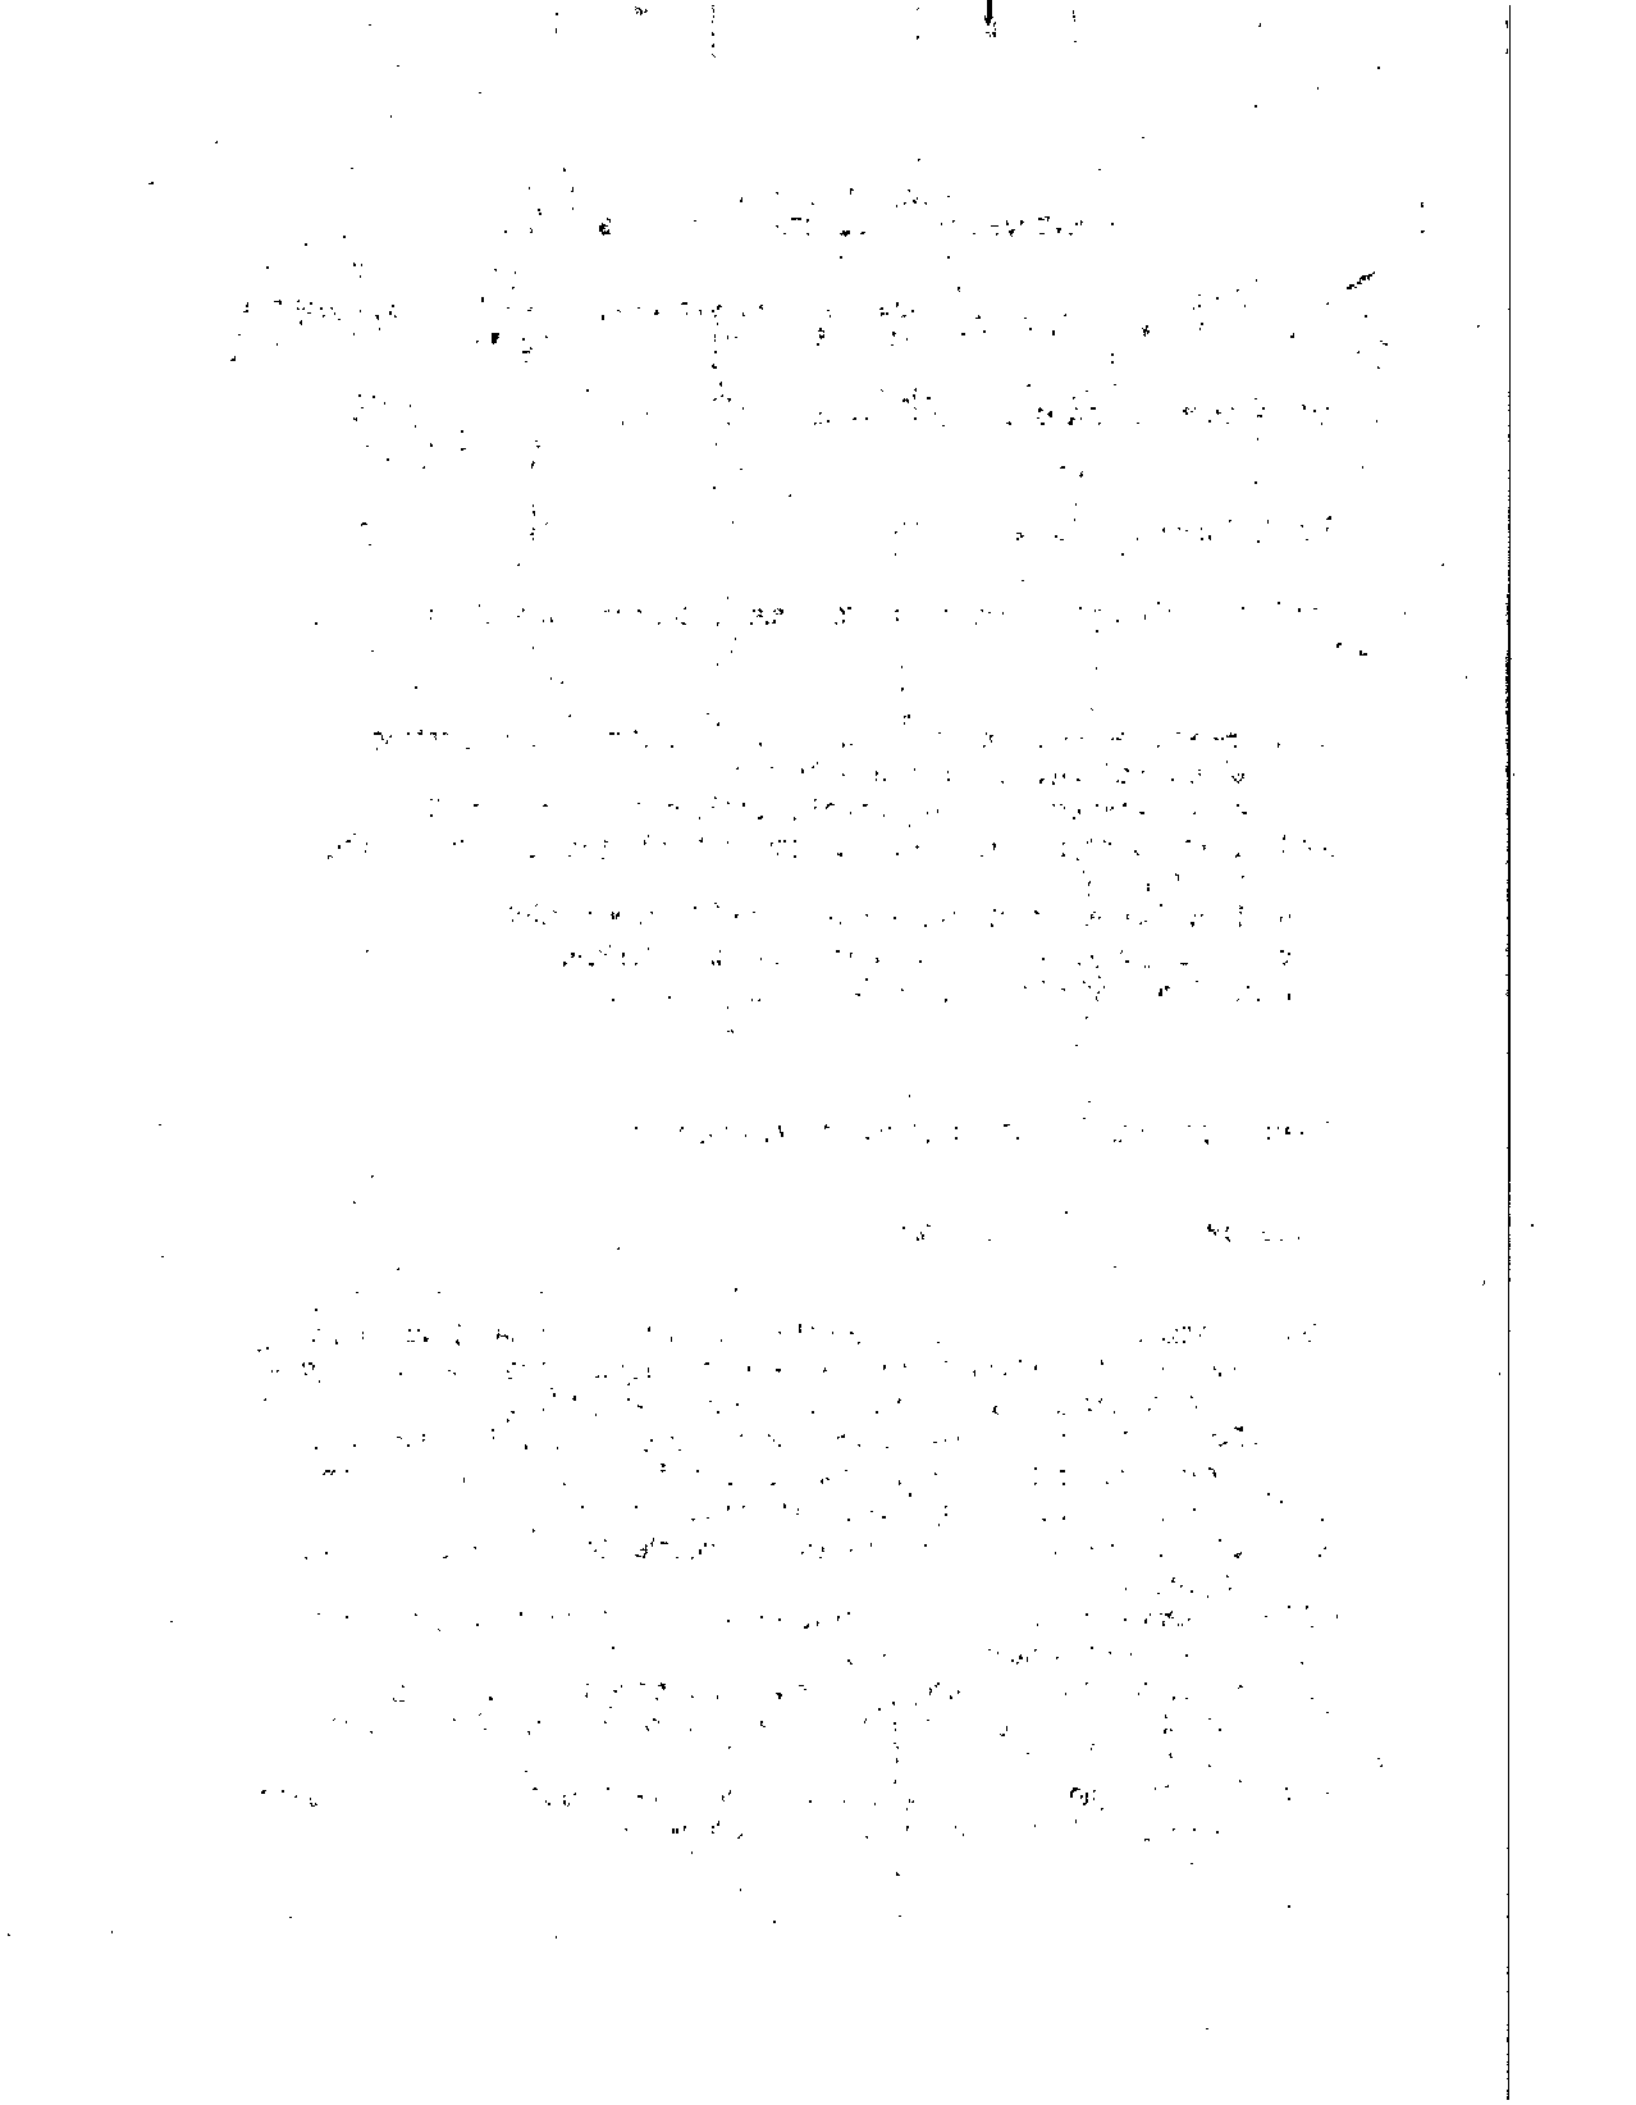

Presentar informes mensuales:

6.3.8. De carácter Técnico y Administrativo

El interventor debe realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del convenio, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultades, el cumplimiento de obligaciones y la ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles, además de las previstas en las condiciones técnicas y todas aquellas que se desprenden del objeto del convenio de Interventoría, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.


Además, tiene como obligación velar por todas las acciones encaminadas al cumplimiento del proceso de Interventoría, para llevar el acatamiento de las mejores prácticas Administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de la facultad, el cumplimiento de obligaciones y las ejecuciones de las revisiones, las verificaciones y controles.

6.3.9. De carácter Ambiental, SISO y Social

El interventor tiene como responsabilidad vigilar, controlar e inspeccionar el cumplimiento Ambiental, Social y de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de todas las actividades que se desarrollan en el entorno de la obra.

6.4.Reuniones De Control

Se llevarán a cabo reuniones de comité técnico entre el contratista, la Interventoría, el supervisor y apoyo a la supervisión del proyecto por parte de la alcaldia según lo estipulado en los términos de referencia del proyecto. En las cuales se revisarán los avances y retrasos presentados en cada uno de los ámbitos que abarca el proyecto de obra de los segmentos viales en ejecución y además se expondrán las dificultades presentadas en los procesos necesarios para dar inicio con la ejecución de nuevos CIV.

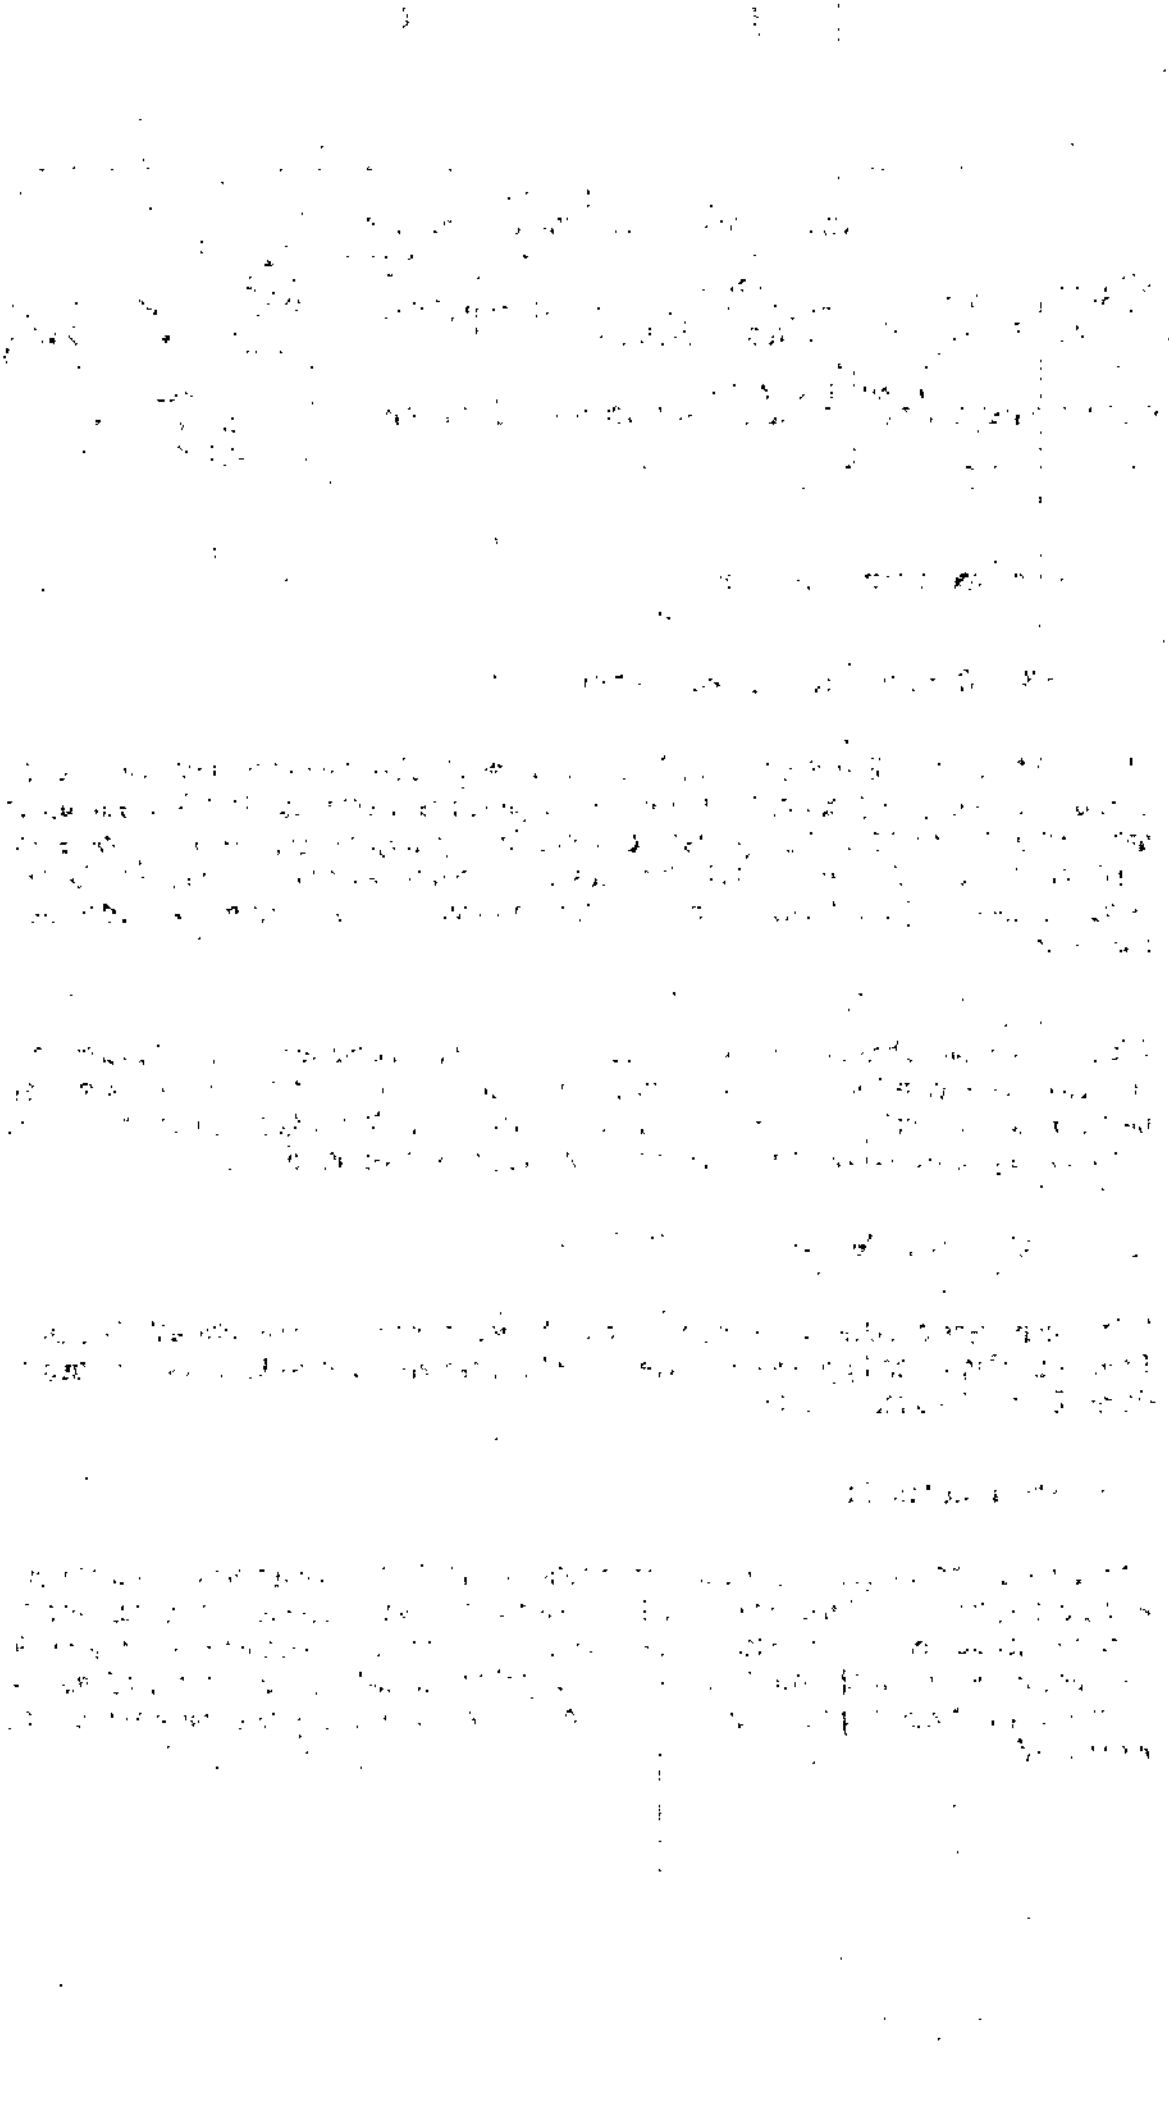

6.5.Ejecución Del Proyecto

Para la ejecución del proyecto se dispuso de ciertos elementos de entrada, etapas y actividades de realización requeridos para el desarrollo a cabalidad de este. A continuación, se presentan cuáles son estos objetos necesarios para la aplicación de la Interventoría.

Elementos De Entrada Del Proyecto

Se seguirá durante todas las fases del proyecto la normatividad vigente a saber:


6.5.1. Manual / Cartilla Interventoría IDU.
6.5.2. Cuadros de Seguimientos.

6.6.Diseño Y Desarrollo

Asistencia Técnica Y Desarrollo Del Proyecto

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S y su equipo profesional realiza la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para las obras de la malla vial local en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá D.C, del contrato de obra No. 321 de 2018 suscrito por CONSORCIO RU 2020 y tendrá en cuenta las siguientes acciones:

6.6.1. Suministrar al FONDO informes periódicos, de forma semanal con corte los viernes, del CONTRATO y realizar los controles en forma clara, correcta y precisa de los aspectos técnicos, administrativos, contables y las estadísticas.
6.6.2. Autorizar los pagos de los servicios prestados por el Contratista cumpliendo con el objeto del contrato, el presupuesto del CONTRATO y los requerimientos enmarcados dentro de la Ley.

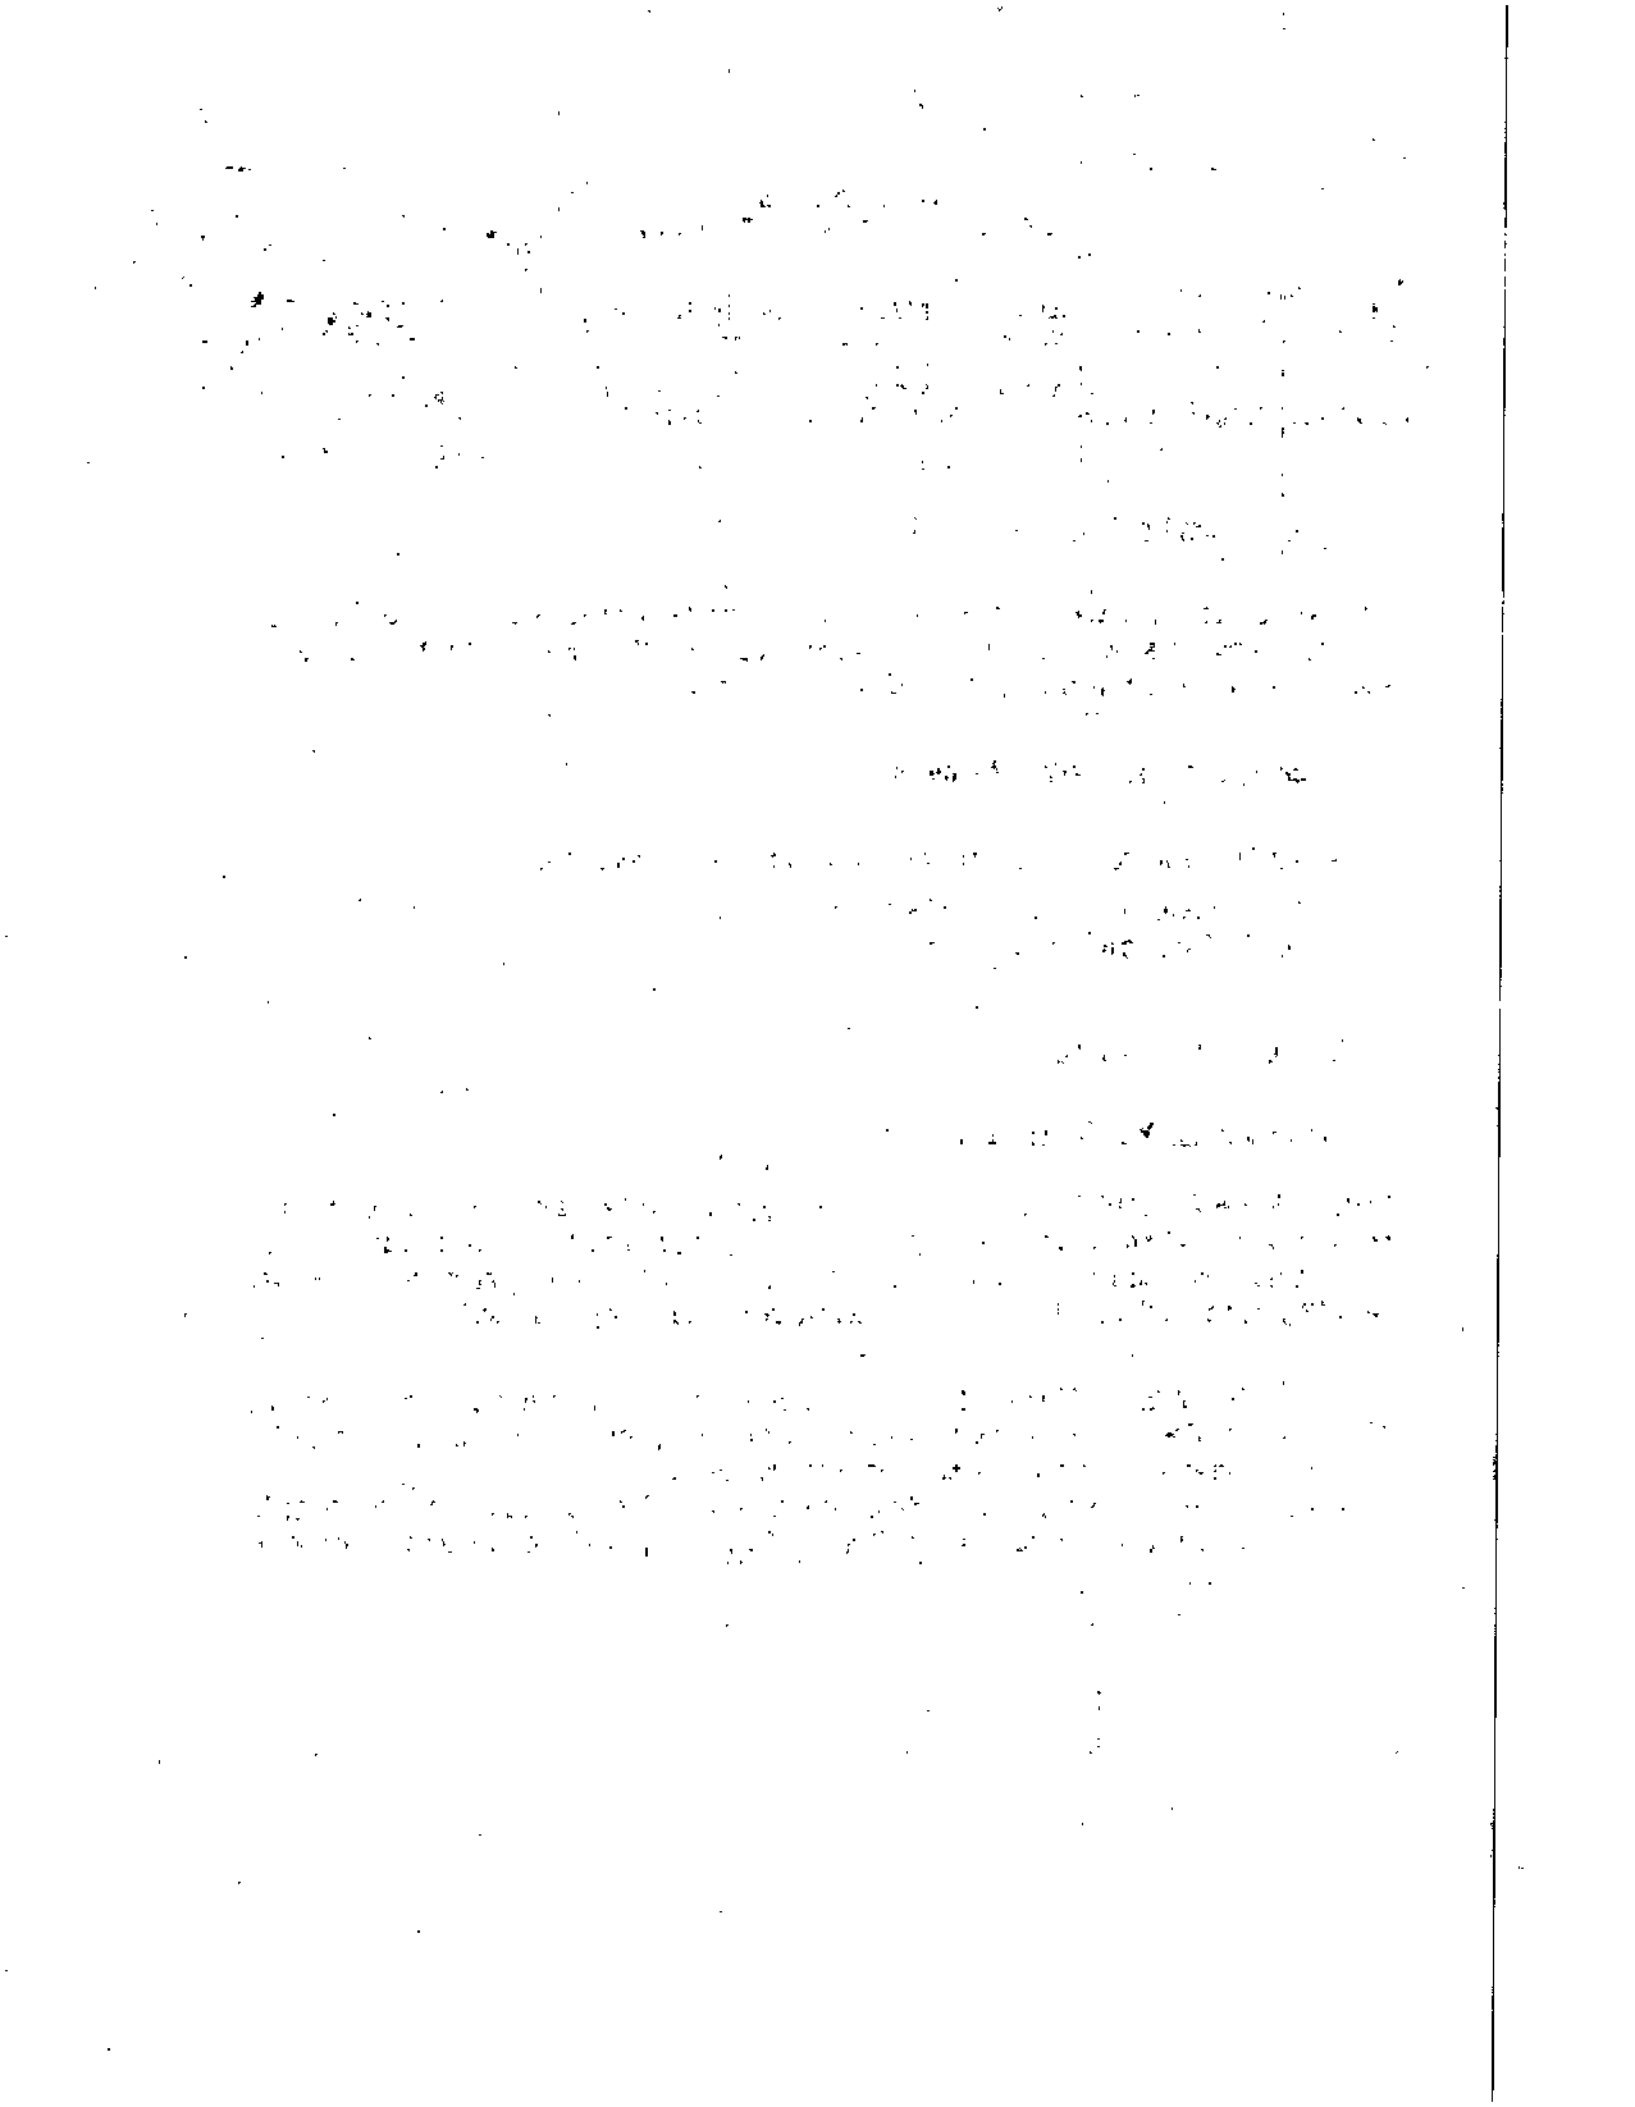

6.6.3. Supervisar el trámite y cumplimiento de los respectivos procedimientos y normas requeridas en desarrollo del contrato 321 de 2019.

6.6.4. Para lograr los objetivos señalados previamente, el FONDO apalancará la labor de la Interventoría mediante las siguientes acciones:

6.6.5. Definir junto con la interventoría y el Contratista, el área de aferencia de los TRAMOS VIALES A INTERVENIR, los sitios y tipo de intervención para dar cumplimiento a su objeto.

6.6.6. Dar aprobación al programa de ejecución, del plan de inversiones y del flujo de fondos del convenio.

6.6.7. Destinar los recursos necesarios para cubrir los costos directos, indirectos y la Interventoría del CONTRATO.

6.7.Logística Del Proyecto

Tal como se indicó anteriormente se plantea la Logística principal para el desarrollo del Contrato, que se constituirían en una metodología ordenada de trabajo. En esta se indica la participación de los actores, las acciones a seguir y el producto resultado de estas acciones.

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1.1. Se realiza el debido acompañamiento de las labores de obra realizadas por el contratista y velando por el correcto proceso constructivo utilizado en obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

7.1.2. Los CIV que se encuentran en ejecución cuentan con la correcta instalación de PMT el cual ha sido revisado y avalado por esta interventoría. De igual manera se solicita al contratista estar atento a la fecha de finalización de este para realizar su renovación a tiempo. Adicionalmente se han generado una serie de atrasos en los últimos PMT's solicitados puesto que la SDM tiene nuevas reglamentaciones, ocasionando unas mayores demoras acostumbradas en los tramites.

7.1.3. Se continúa con la revisión de los ensayos de densidad practicados a los CIVs intervenidos, los cuales cumplen con el porcentaje establecido.

7.1.4. El área social de la interventoria continúa haciendo acompañamiento a todas las actividades asociadas a esta área, ejecutadas por el contratista, con la finalidad que la comunidad quede conforme con la actividad a ejecutar.

7.1.5. En el transcurso del mes se han registrado fuertes lluvias, lo cual afecta en el momento de la ejecución de las diferentes actividades programadas en los segmentos viales.

7.1.6. Desde el día 28 de abril de 2021 se ha venido presentando el PARO NACIONAL INDEFINIDO, lo cual ha generado el cierre de las vías de acceso a canteras y botaderos, lo cual no ha permitido avanzar de acuerdo con la programación.


7.1.7. Todo el personal de esta interventoría se ha acogido y cumplido a cabalidad el protocolo de bioseguridad del contratista, con el fin de mitigar el contagio por COVID 19.

7.1.8. Se destaca la correcta implementación del protocolo de bioseguridad por parte del contratista, logrando mitigar el riesgo de contagio por COVID 19.

7.1.9. La interventoría continúa verificando que el contratista continúe con el personal necesario en cada frente, de igual manera la maquinaria y herramienta para realizar las labores diarias.

7.1.10. Se recomienda al contratista continuar con el rendimiento que llevan en las labores de obra y de ser posible mejorarlo.

7.1.11. Se inicia con la revisión de los remates finales de obra, de manera que cada CIV quede listo para recibir por la interventoría y el apoyo a la supervisión.

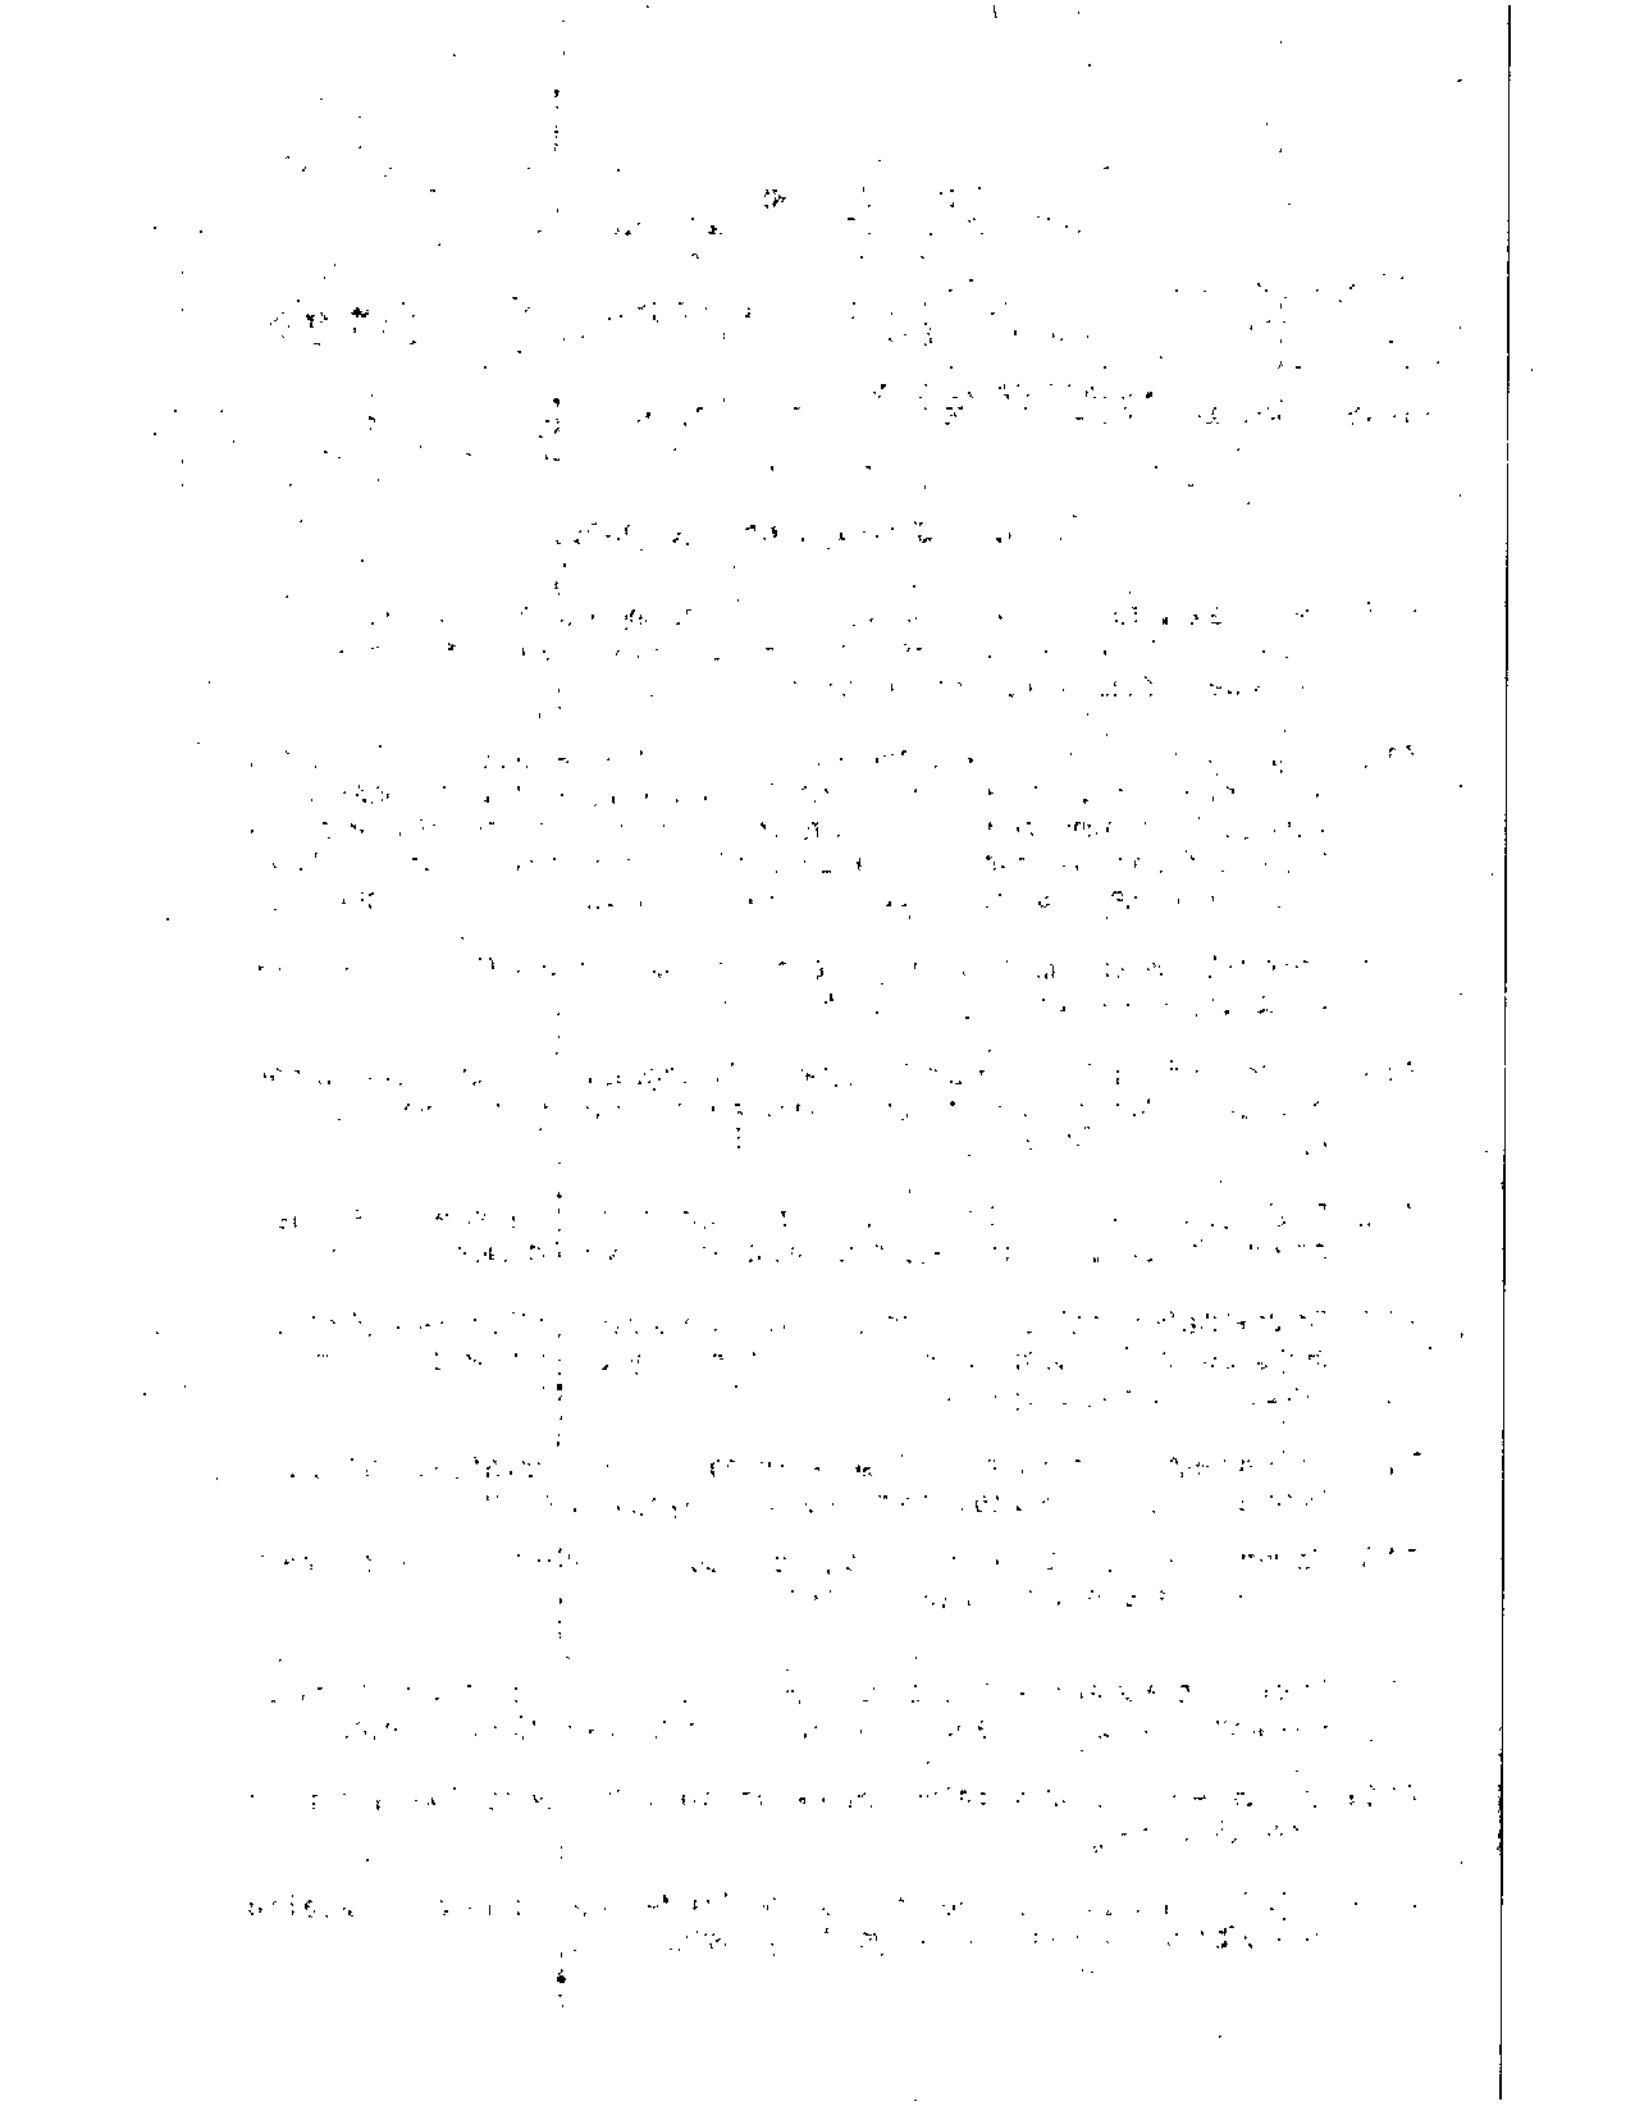

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
3	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS		
TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
4	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA: SI [X] NO [ ]
MAÑANA [ ]
TARDE [X]
ACCIDENTES: SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJON		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se continuan con las excavaciones manuales para la construcción de las cajas de inspección entre las abscisas K0+060 - K0+070

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
5	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: No se realizaron actividades debido al paro nacional

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
6	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA — SI [ ] NO [X]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES — SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza la construcción de las cajas de inspección de 0.6 x 0.6 m, levantadas en mampostería y son adecuadas con sus respectivos marcos , , siguen manifestaciones por lo que no es posible traer material para la obra

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
7	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X
	NO	
	MAÑANA	X
	TARDE	X
ACCIDENTES	SI	
	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA


Se continua con las respectivas excavaciones y construcción de cajas de inspección, se hace una jornada de señalización el tramo con polisombra para la prevención de caidas por los habitantes del sector

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

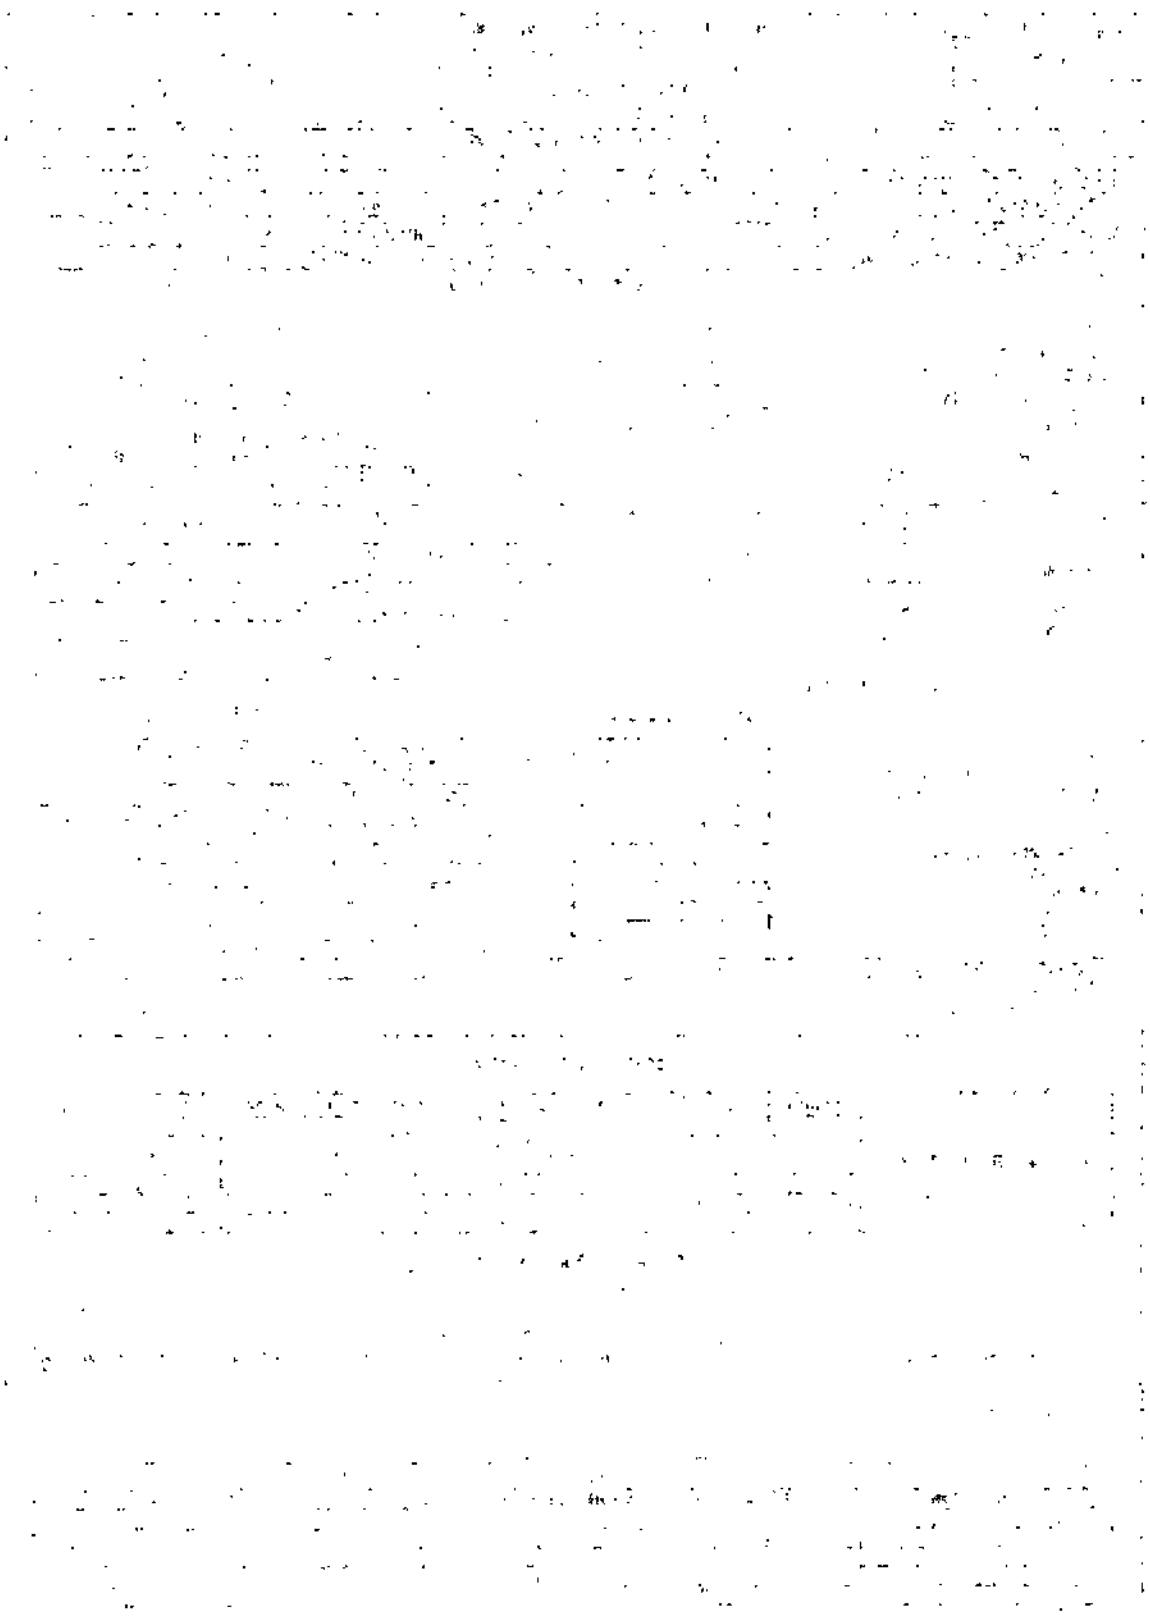

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
8	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI X	NO
MAÑANA		X
TARDE		X
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Señalización de los senderos peatonales, jornada de orden y aseo, además se rellenaron los costados de las cajas de inspección con material B-200

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

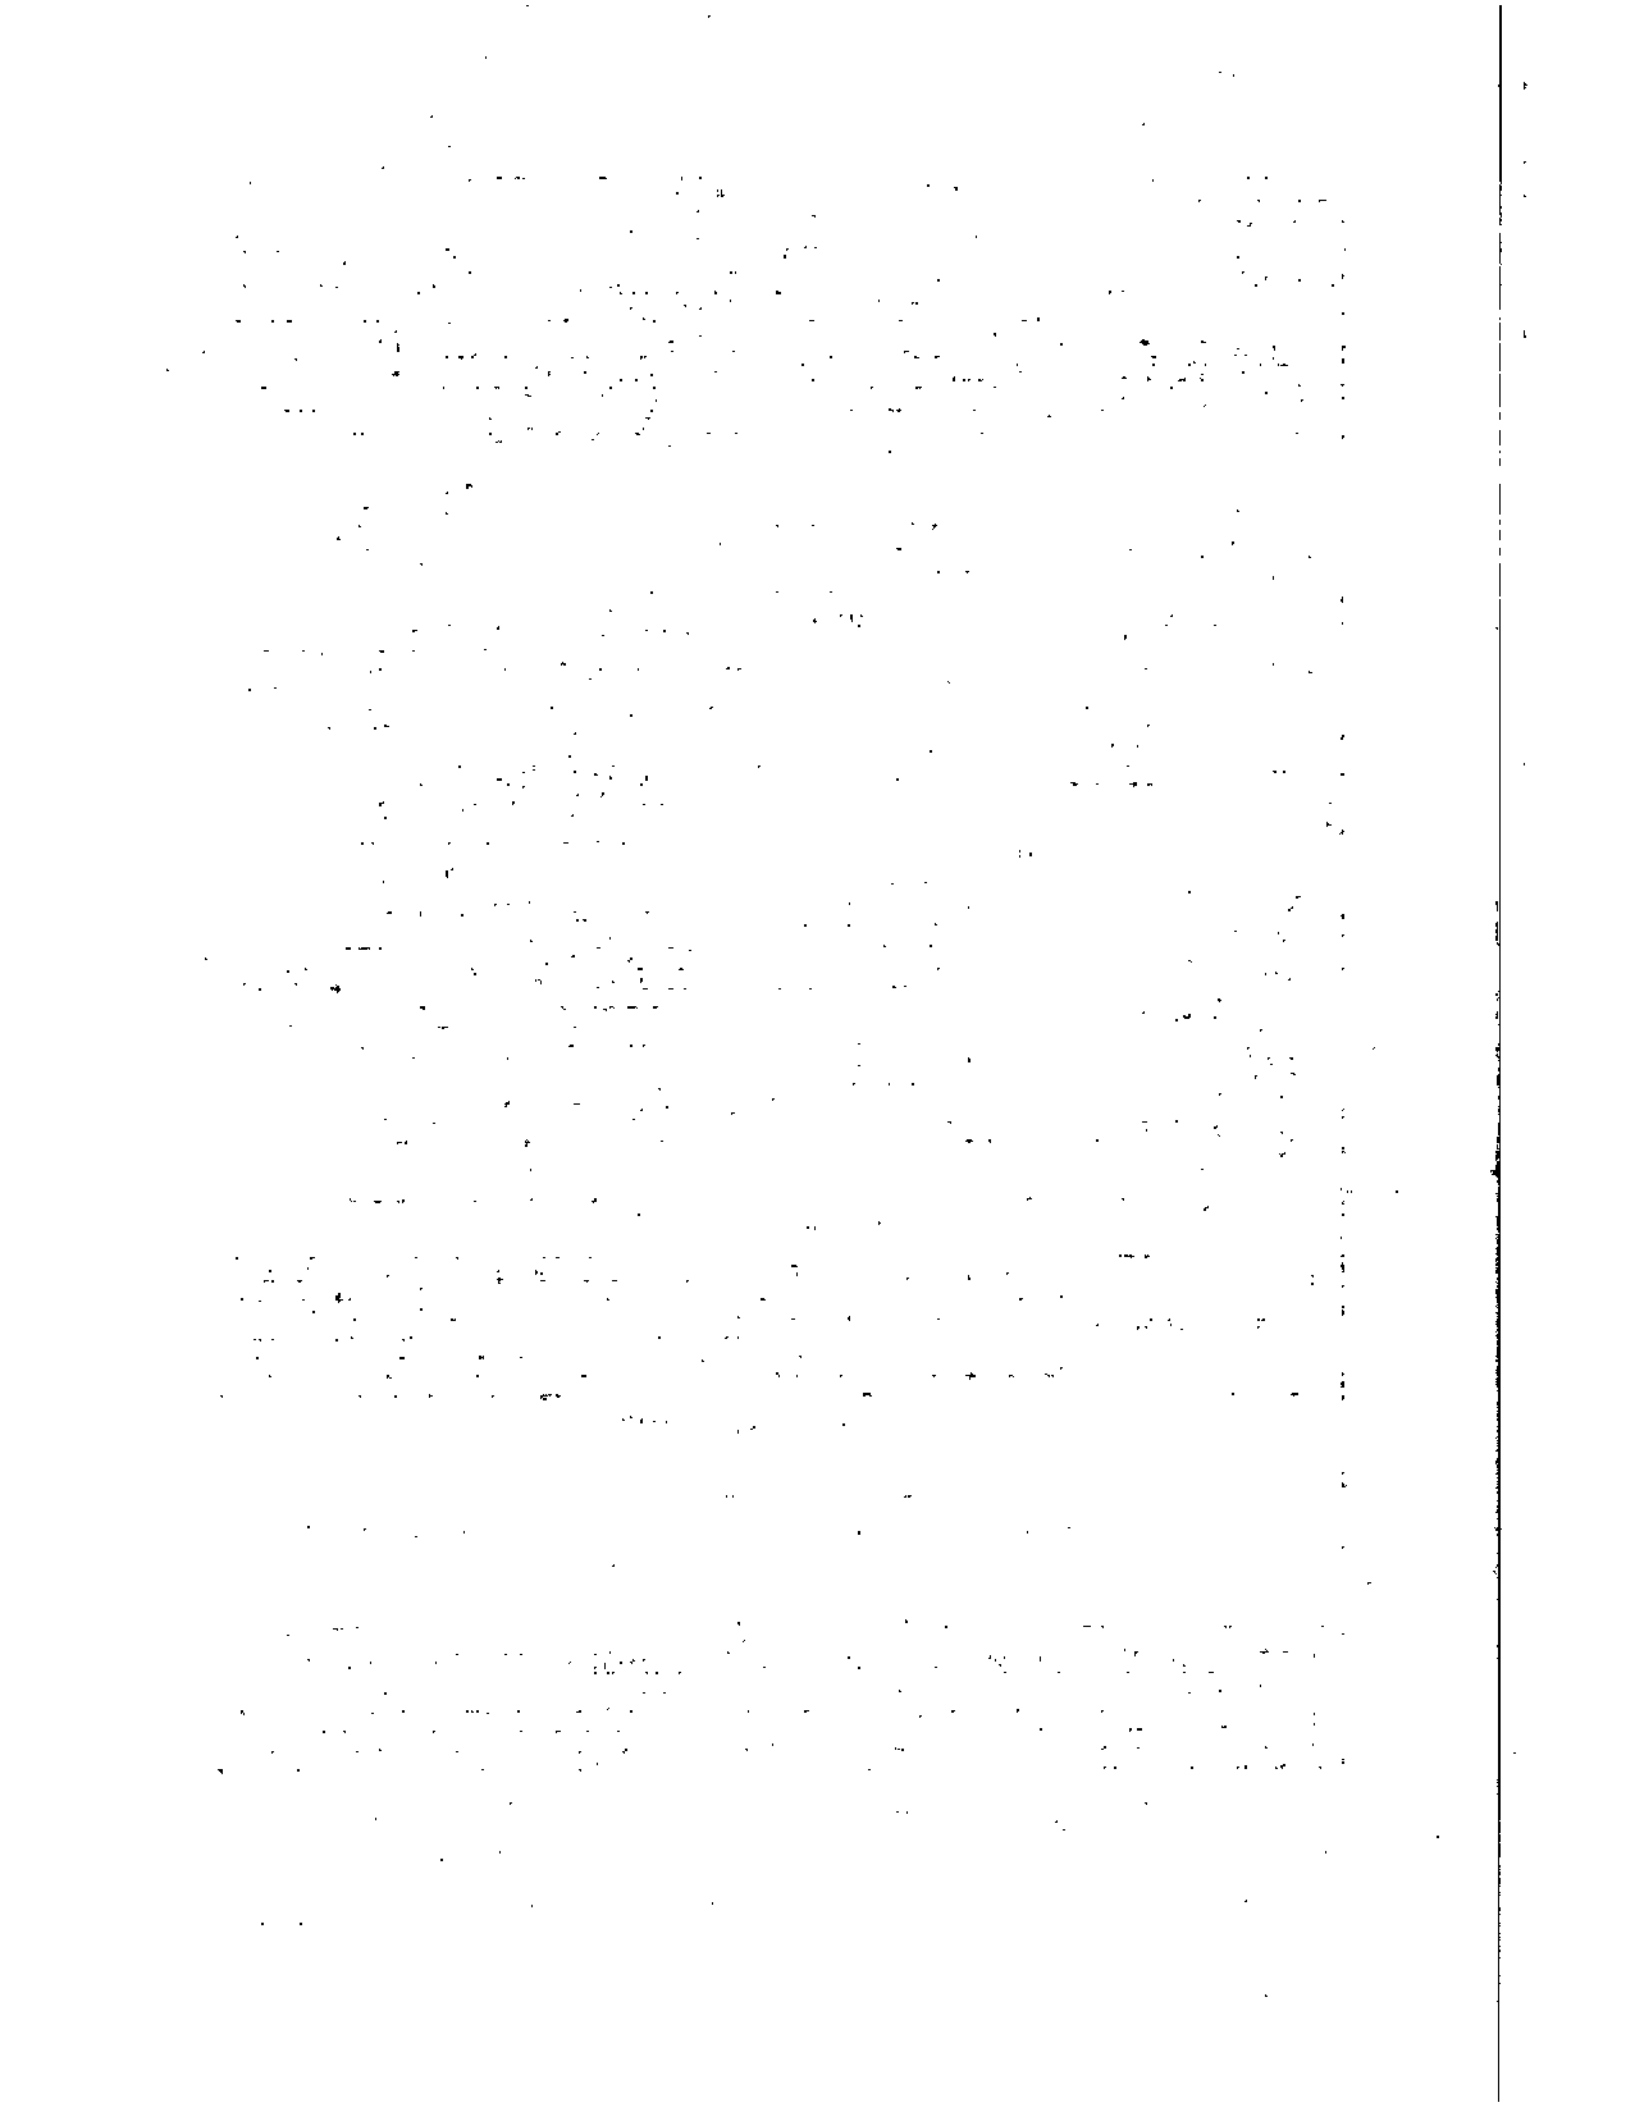

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
10	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO	
MAÑANA				
TARDE				X
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KG	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES

Debido a las condiciones presentadas por el paro nacional en el tramo no realizan actividades constructivas

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU 680	15	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

No se realizan actividades constructivas por falta de material debido a que las volquetas no llegan al sitio

FALTOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
11	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	1
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU 860	45	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	UYU860	15	ptrituradoo

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza la excavación mecánica para la construcción de la red sanitaria restante antes de entrar el pozo , seguidamente se instala la tuberia correspondiente, se nivela con triturado y se rellena con recebo, dejando las capas de suelo bien compactas con ayuda del canguro

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
12	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU 850	30	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza limpieza de gran parte del material resultante de la excavación de las cajas de inspección y se hace relleno con recebo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 370 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	
13	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	15005132
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblotroques	1
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU660	15	

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	UYU 860	15	Retiurados

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se continua con la limpeiza del material de excavación y se inicia excavación mecánica para la construcción del pozo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

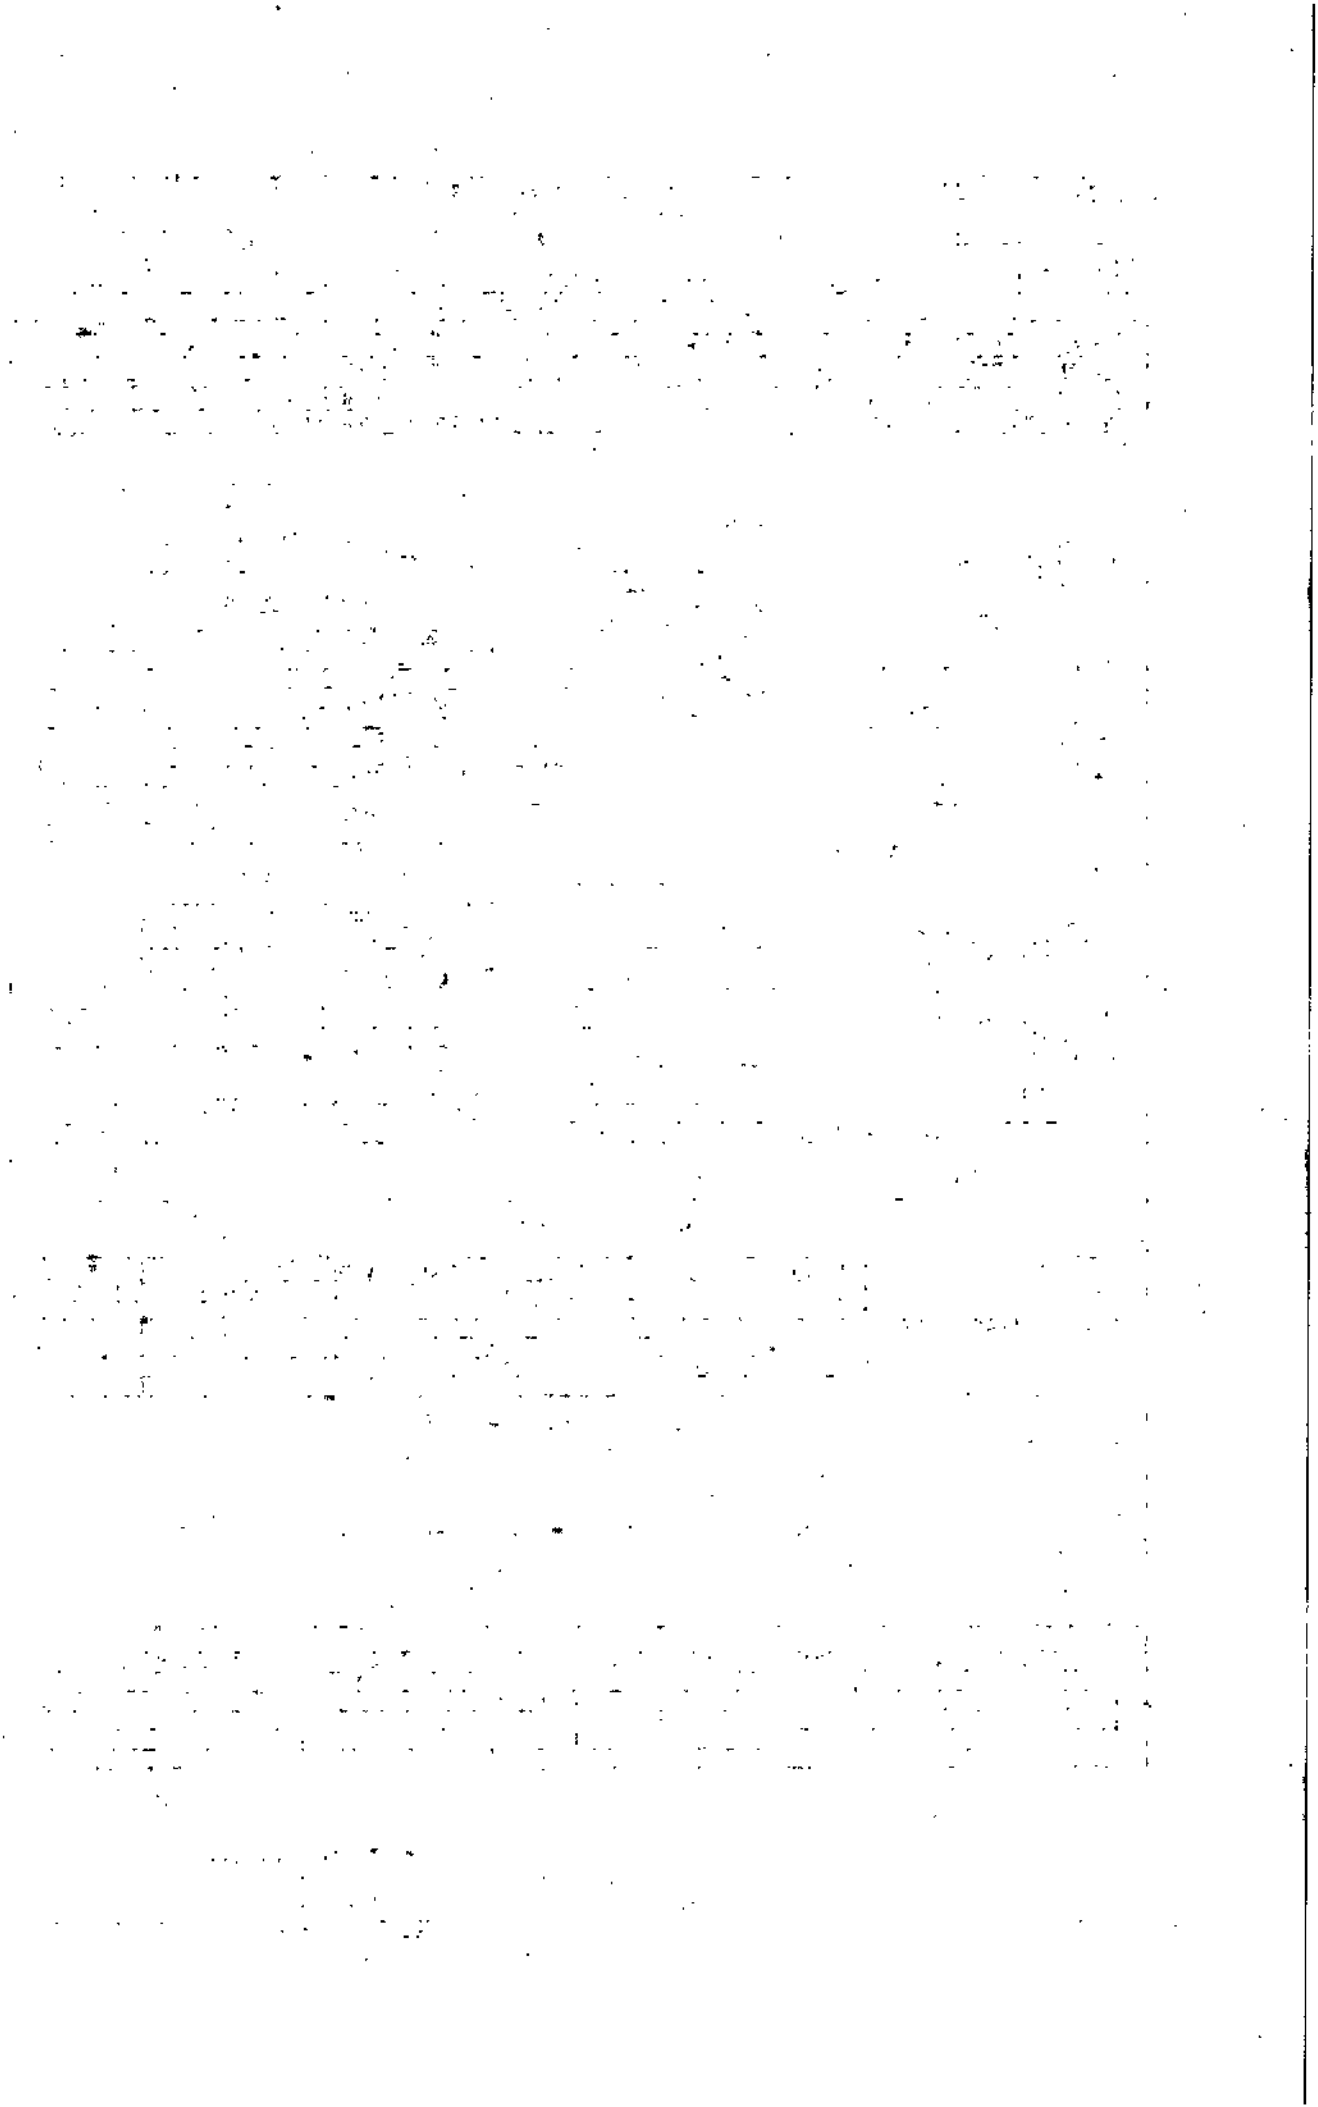

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
14	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR SM	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Excavación mecánica para la construcción del pozo y ajuste de tubería de novafort y levantamiento en mampostería de este mismo, sigue construcción de cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

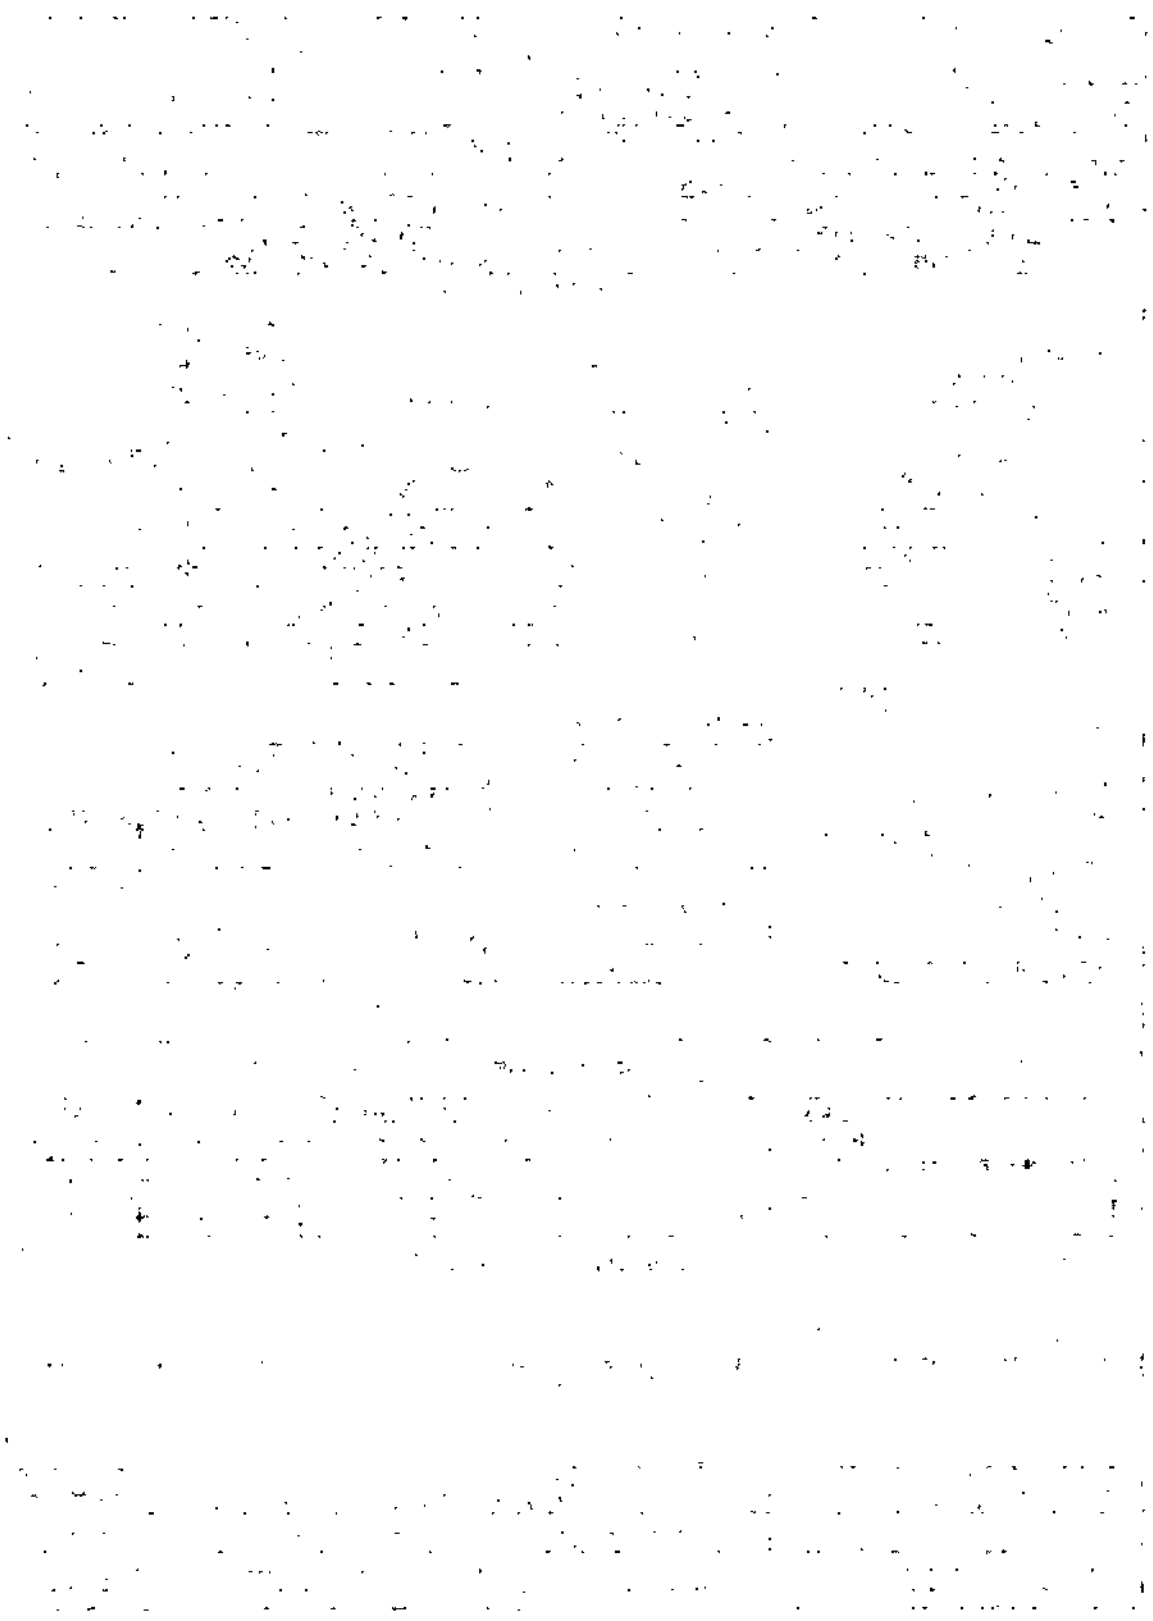

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
15	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI X	NO
	MAÑANA X	
	TARDE X	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Relleno con recebo a los costados del pozo, este relleno se hizo en capas de 20 cm aproximadamente y se compactó con ayuda del canguro, instalación de geotextil en el perímetro externo del pozo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

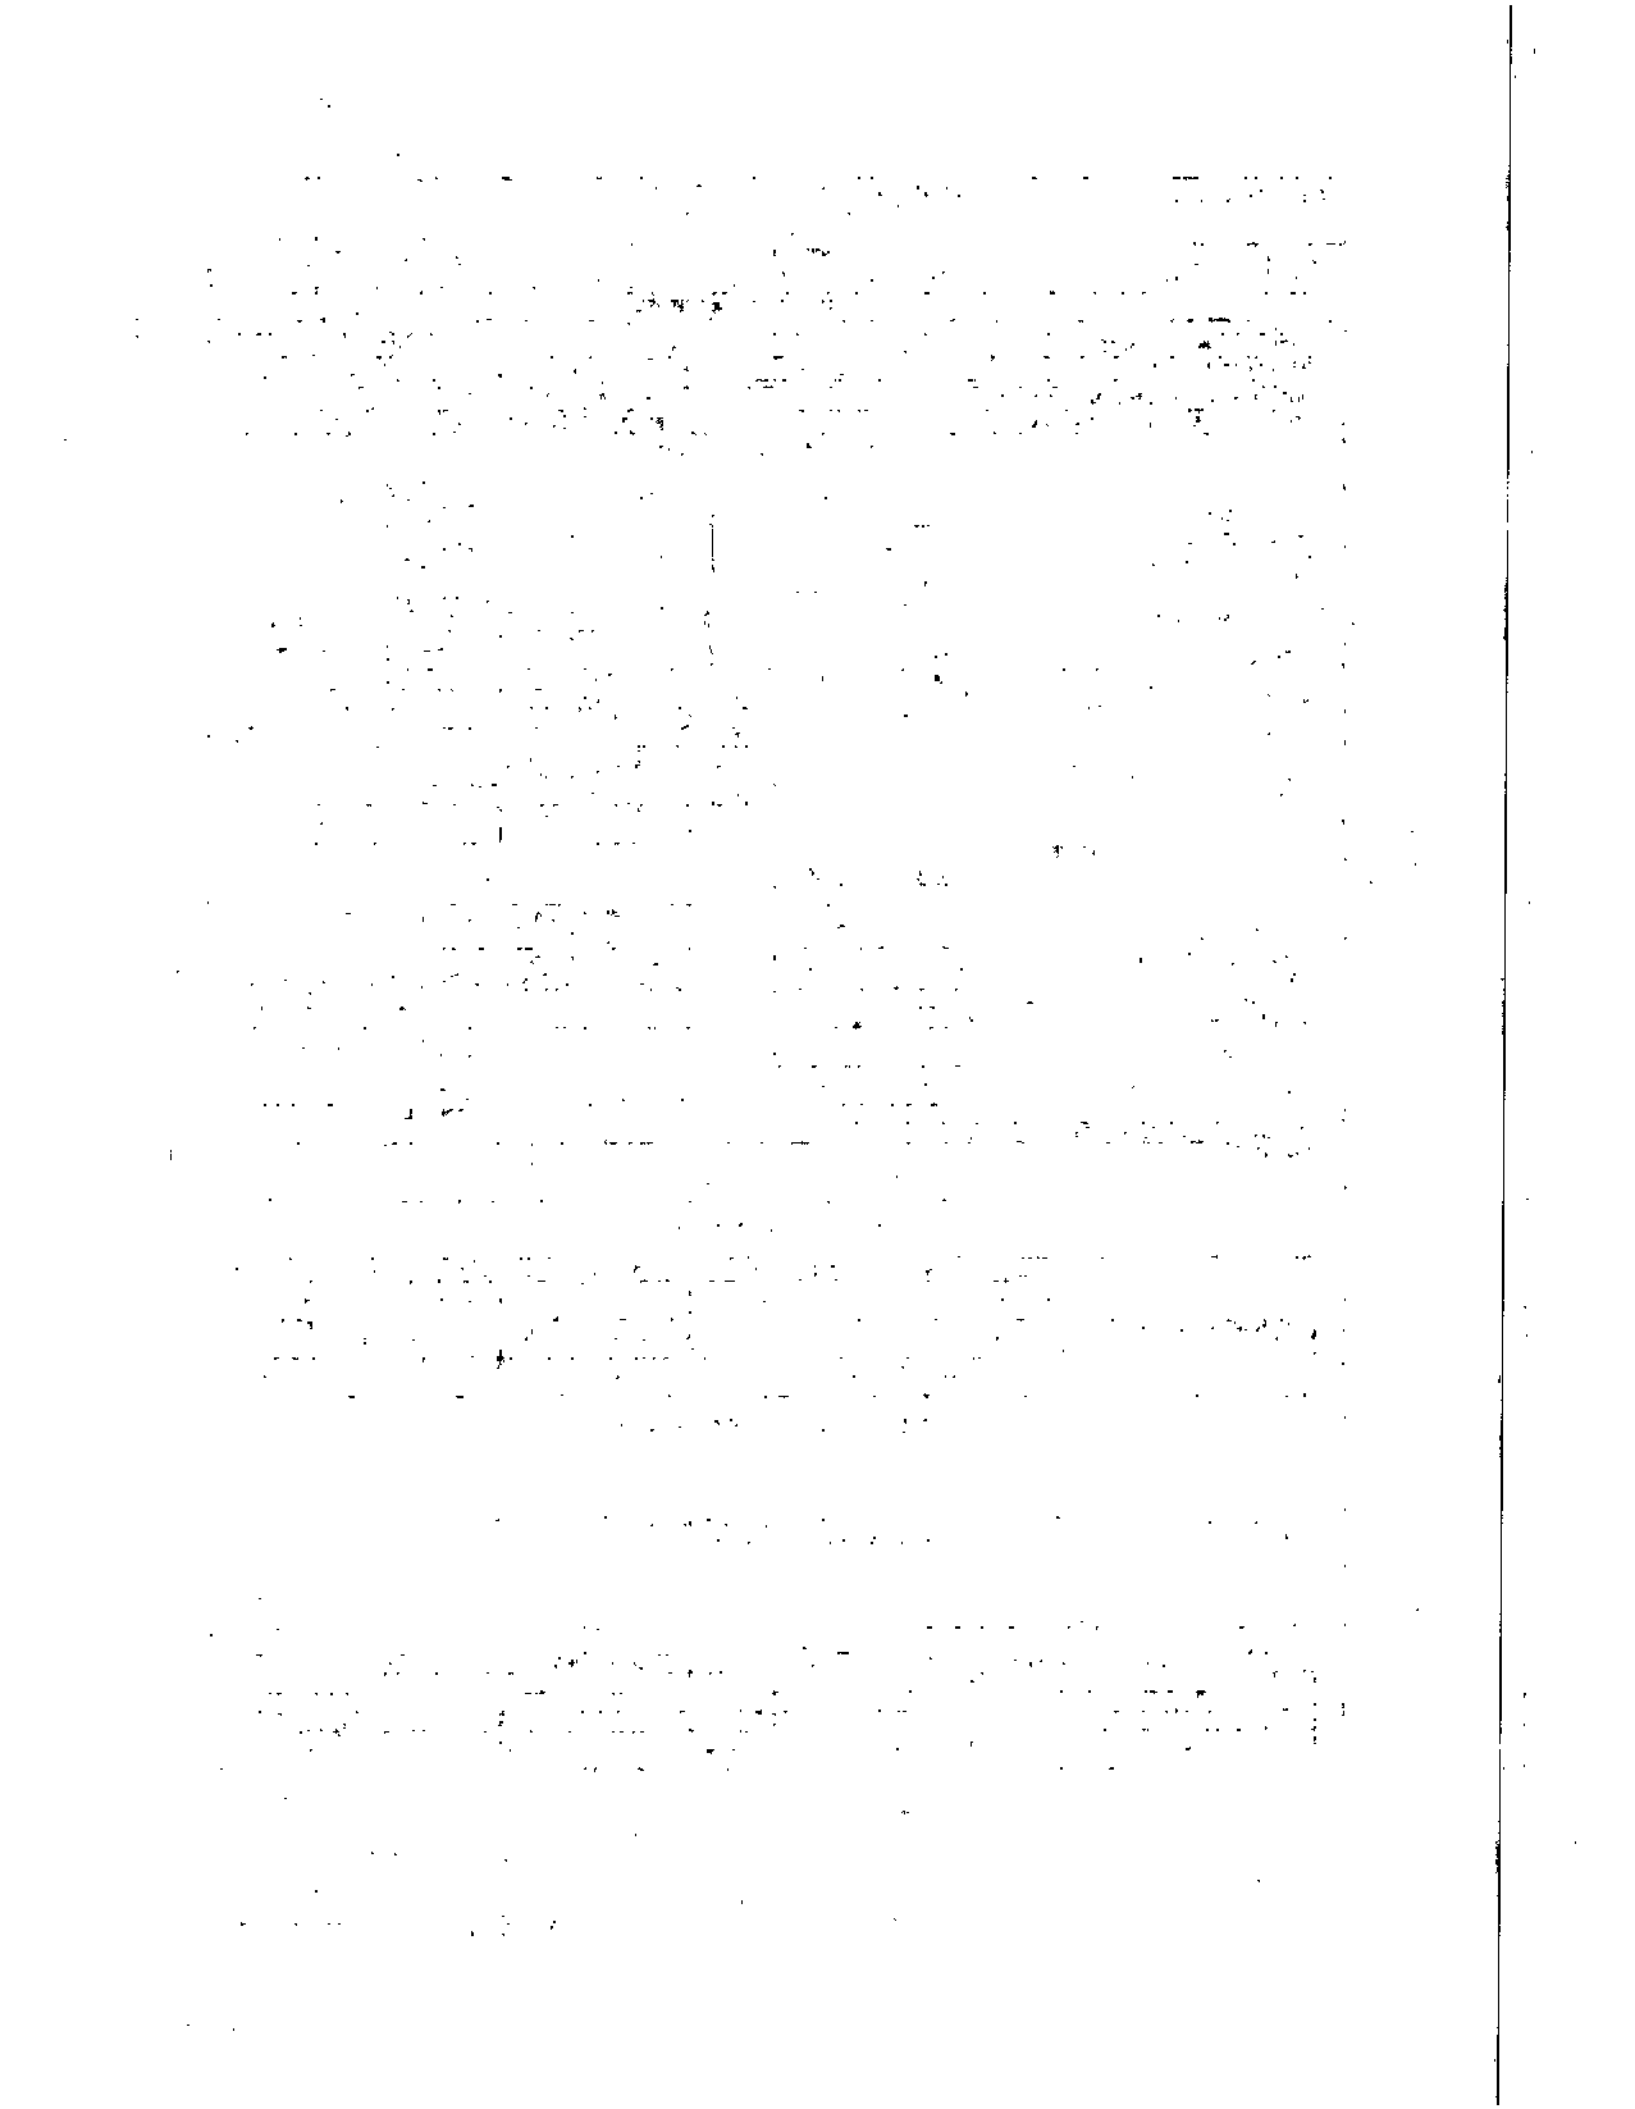

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
18	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 48A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Tránsito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UFX675	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se instala la reducción cono del pozo con su respectivo cargue, se realiza relleno con material B200 bien compactado con ayuda del canguro, además de allo se continuan excavaciones para la construcción de las cajas de inspección

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

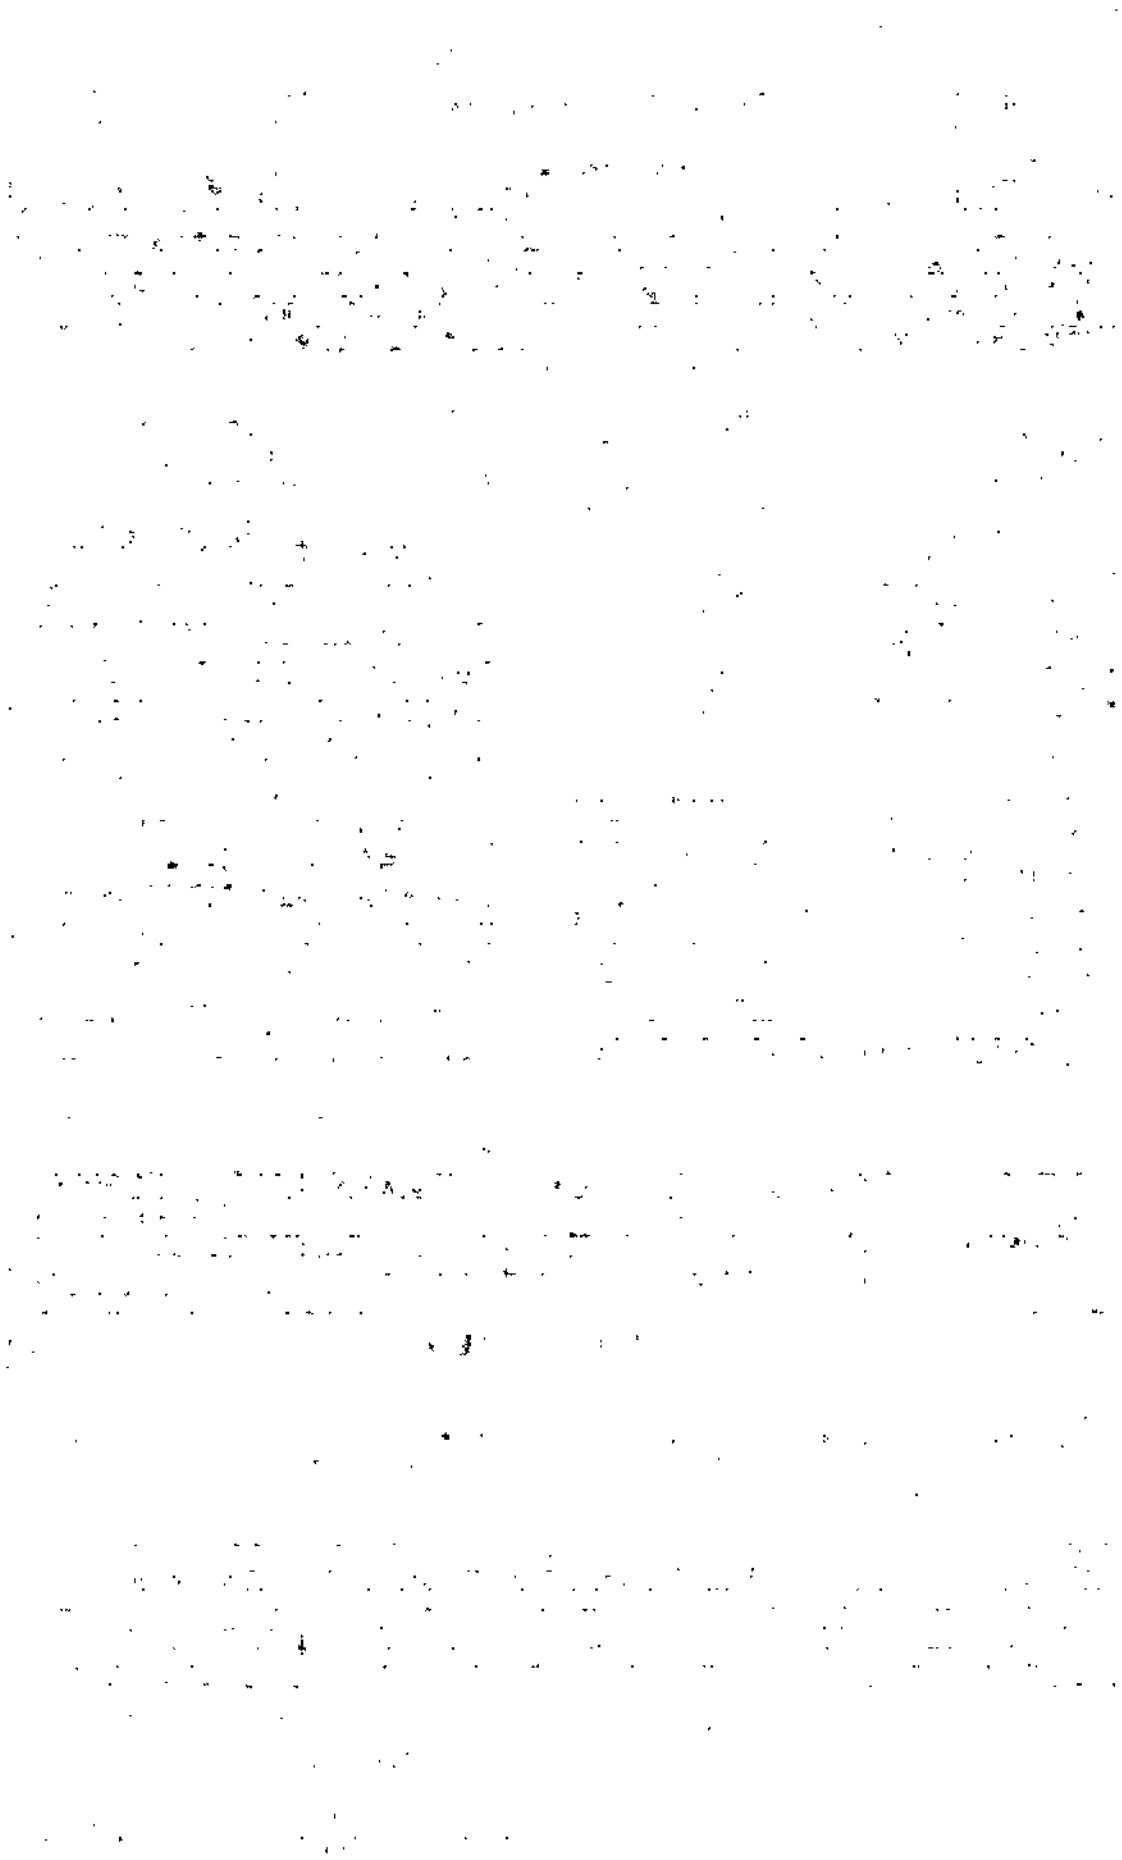

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
19	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	16005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS					
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO					

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se continua con la construcción de las cajas de inspección entre las abscisas K0+054 y K0+056 y se hace el respectivo relleno al perimetro externo con recebo dejandolo bien compactado con el pisón

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
20	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	19005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	3
Operarios	2
Topografia	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	UYU 860	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realizan excavaciones manuales de 1.20 x 0.80 m para la construcción de las cajas de inspección de 0.6 x 0.6 m entre las abscisas K0+048 Y K0+050 Y K0+037,5 - K0+039,5, tambien se realiza la construcción de dos cajas de inspección en las abscisas K0+056 hasta le K0+058

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 370 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 371 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	16005132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografo	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se continua con las respectivas excavaciones y construcción de cajas de inspección, las excavaciones se realizan en las abscisas K0+035- K0+033 y K0+027 hasta la K0+029 , y la construcción de las cajas fueron en la abscisa K0+053- K0+055

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

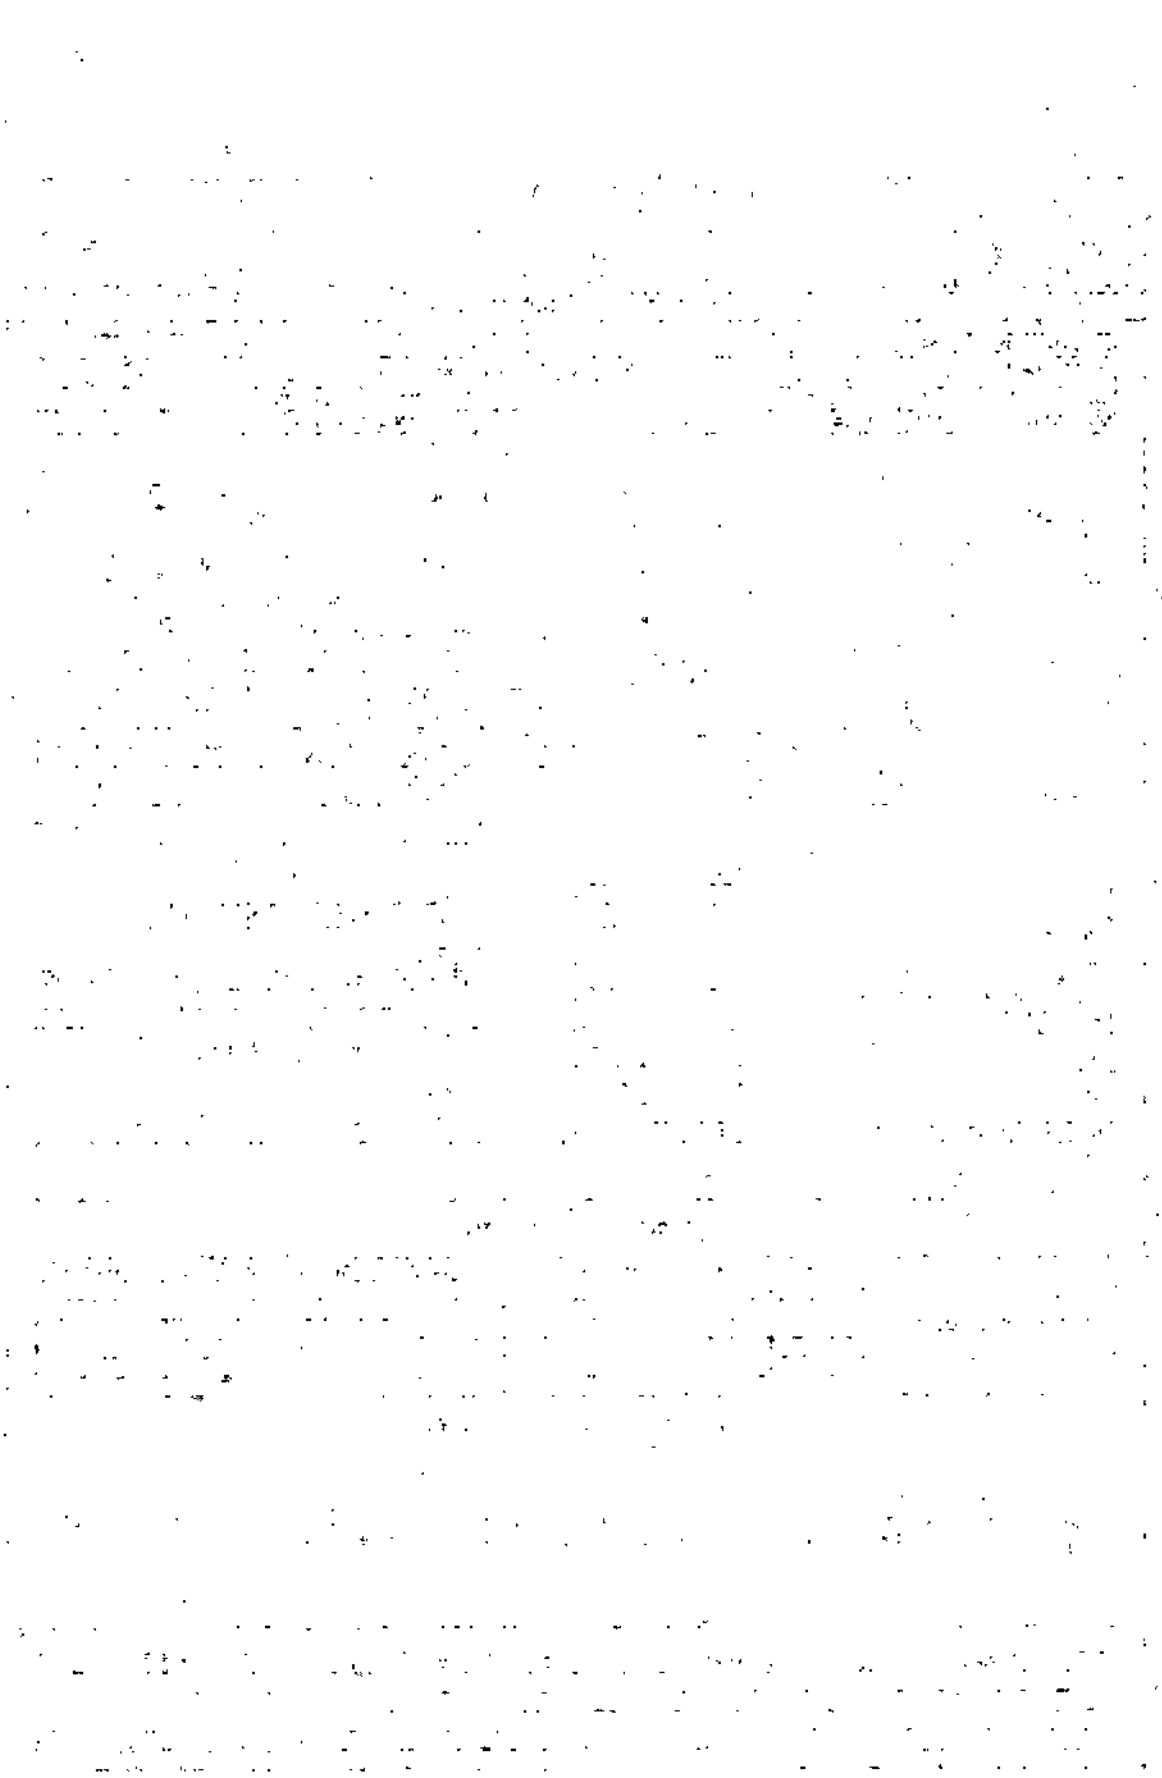

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [X]
MAÑANA [ ]
TARDE [ ]
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJON		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se continua con las respectivas excavaciones y construcción de cajas de inspección, se realiza jornada de orden, aseo y señalización en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

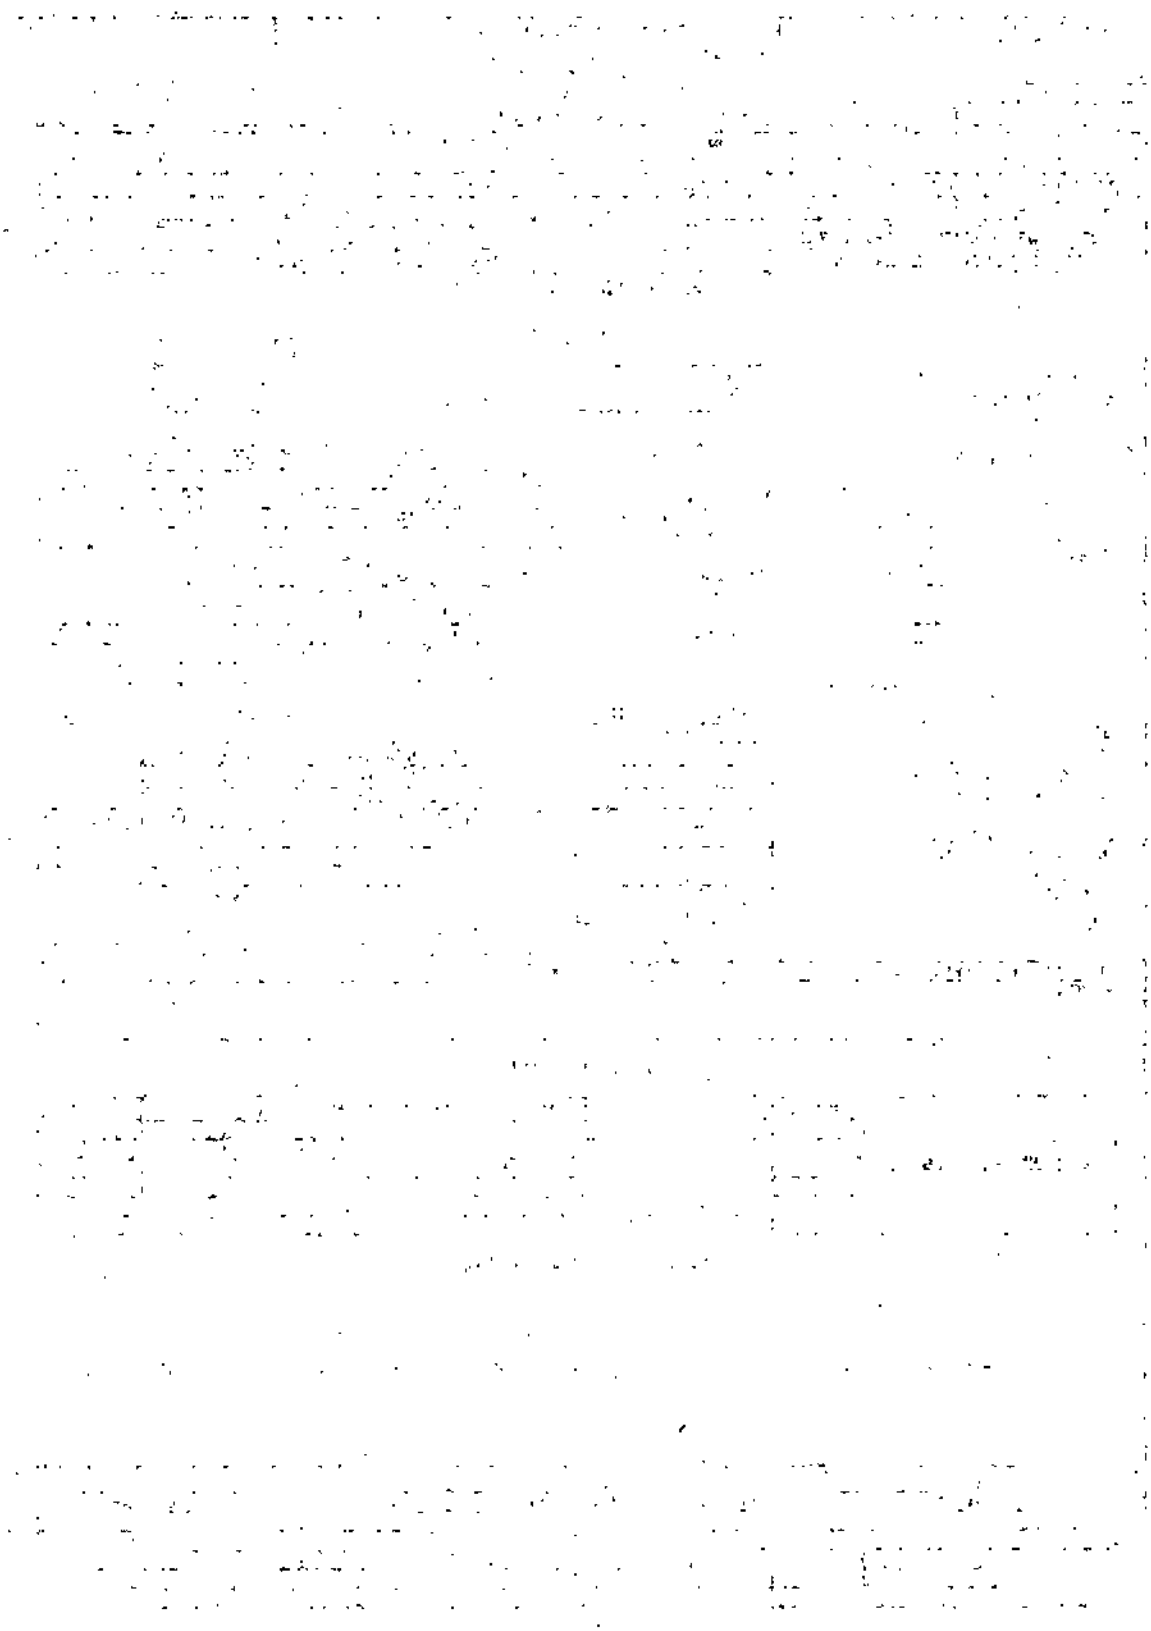

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA SI [ ] NO [x]
MAÑANA
TARDE
ACCIDENTES SI [ ] NO [X]

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	1
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU 880	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
RECEBO	UYU880	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza construcción de cajas de inspección en el costado derecho entre las abscisas K0+037,6 Y K0+038,6

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
25	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO x

PERSONAL

	CANT
Ingeniero	
Inspectores	4
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroque	1
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU860	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se inicia excavación mecánica y manual para la construcción de la vía entre las abscisas K0+070 -K0+082, además de esto continuan actividades de construcción de las cajas de inspección por le costado derecho en las abscisas K0+032,8 Y K0+033,9

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
	MAÑANA	
	TARDE	
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA


Continua excavación manual de las cajas de inspección y tambien de la via hasta el nivel de la subrasante, además de ellos se realiza construcción de cajas de inspección en las abscisas K0+027,8 y K0+28,9

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

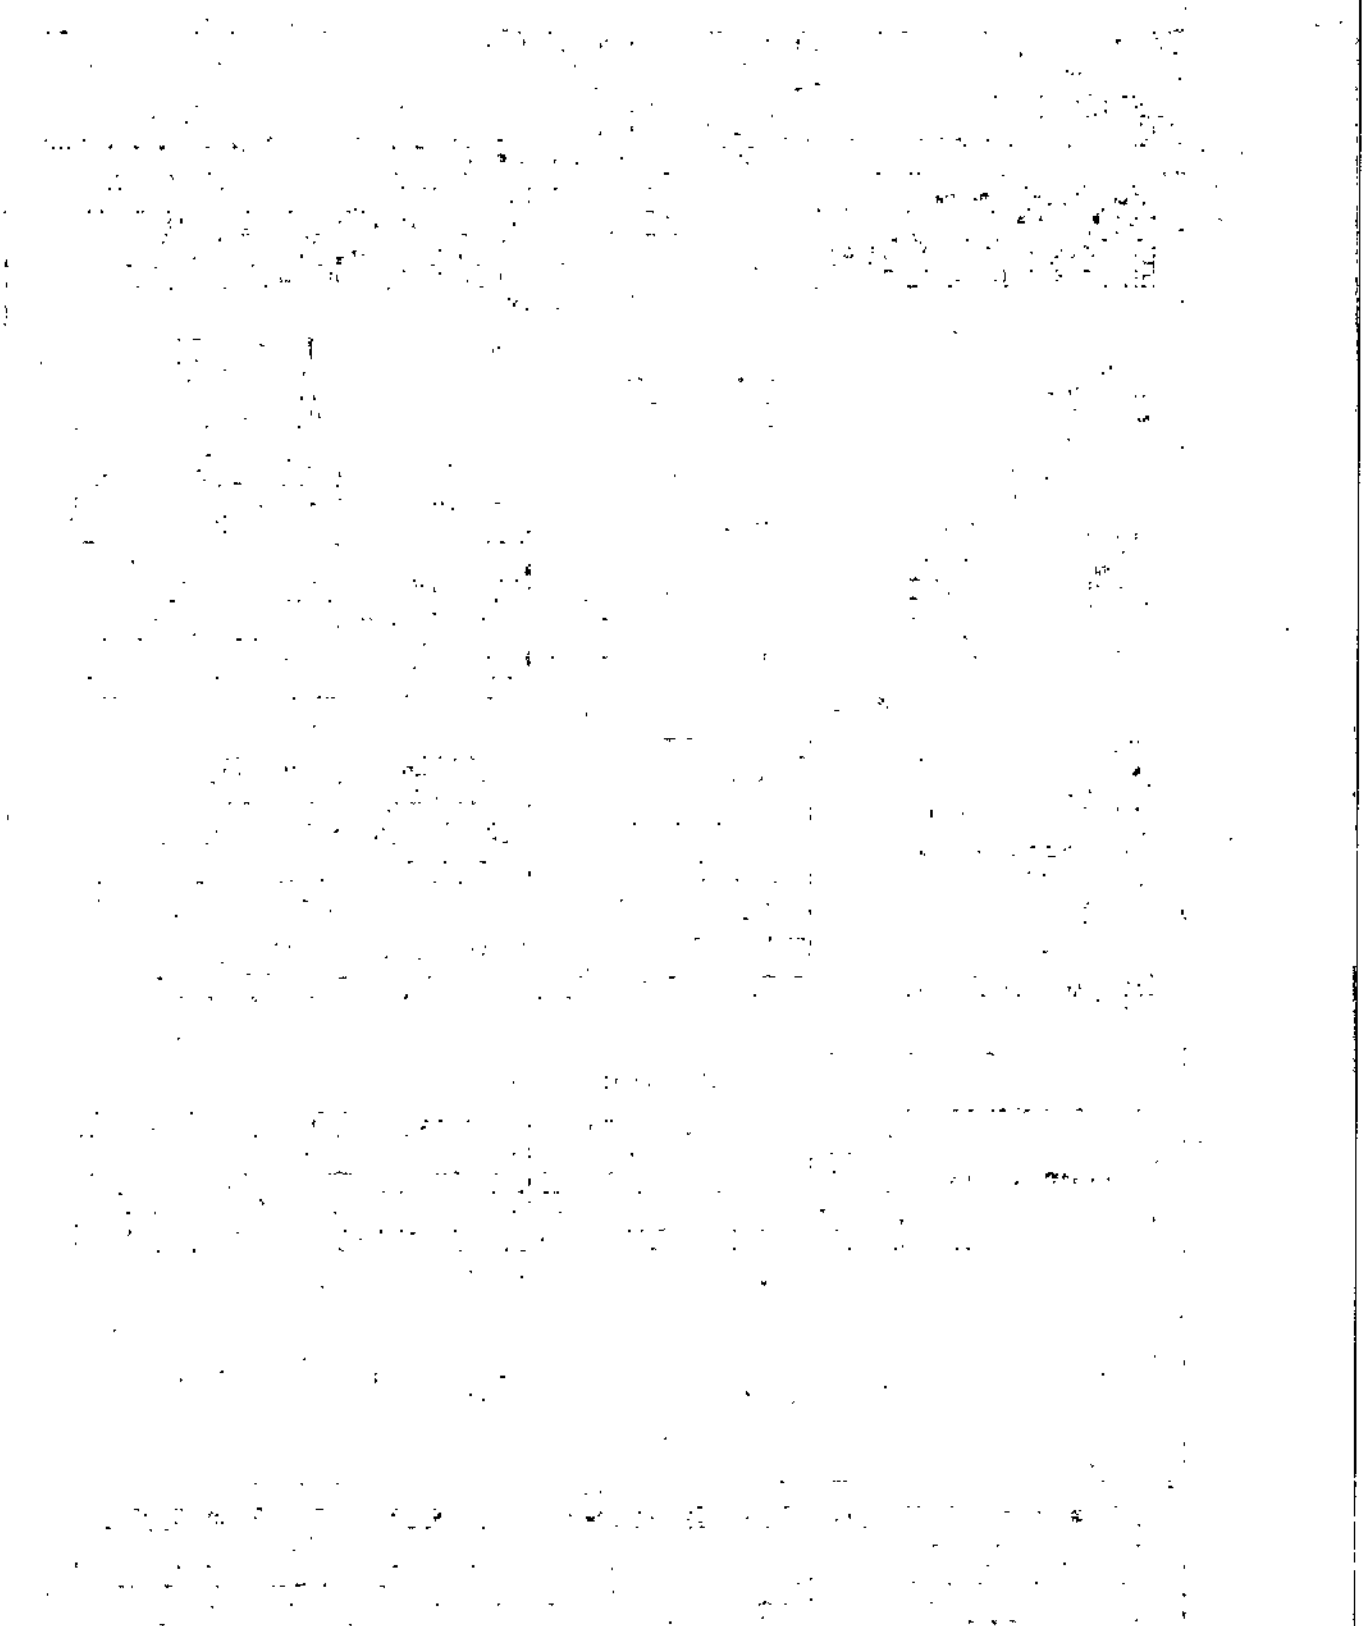

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS	CIV	18006132	
NOMENCLATURA	KR 5M	DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	X	NO
MAÑANA			
TARDE		X	
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblotroque	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU860	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA


Se realizan excavaciones manuales de 1.20 x 0.80 m x 1.70 para la construcción de las cajas de inspección de 0.6 x 0.6 m por el costado derecho del CIV

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

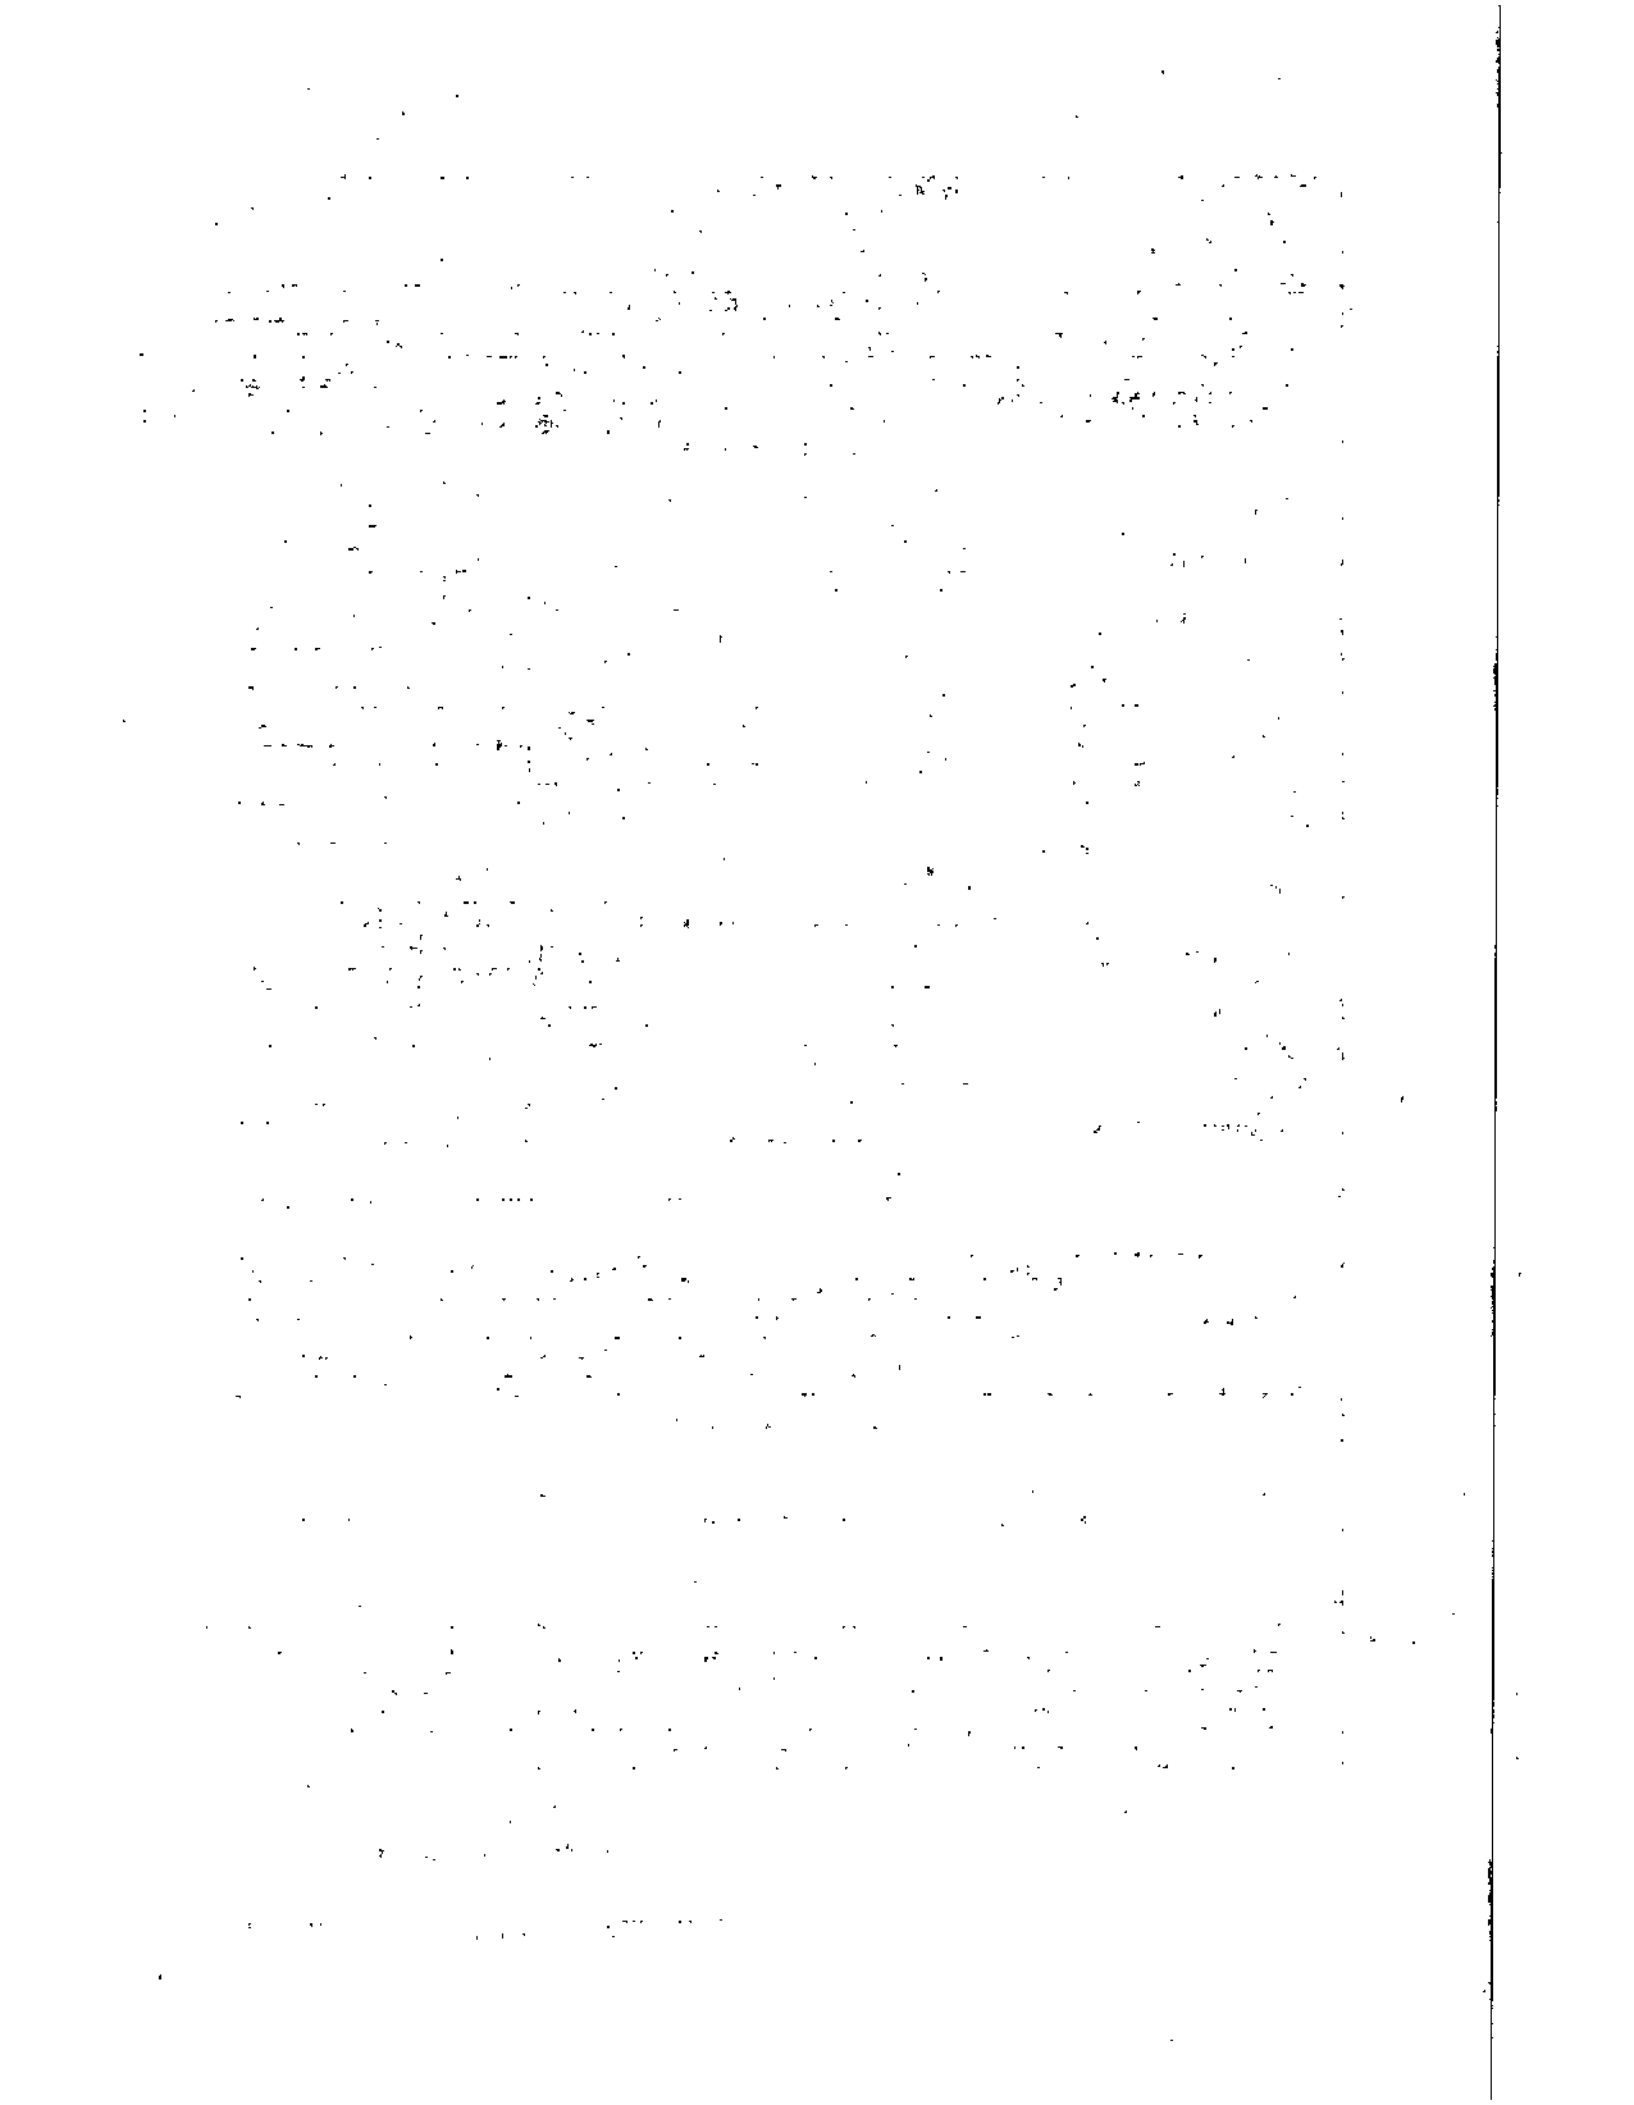

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	UYU660	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se continua con los respectivos excavaciones y construcción de cajas de inspección por el costado derecho de la vía

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

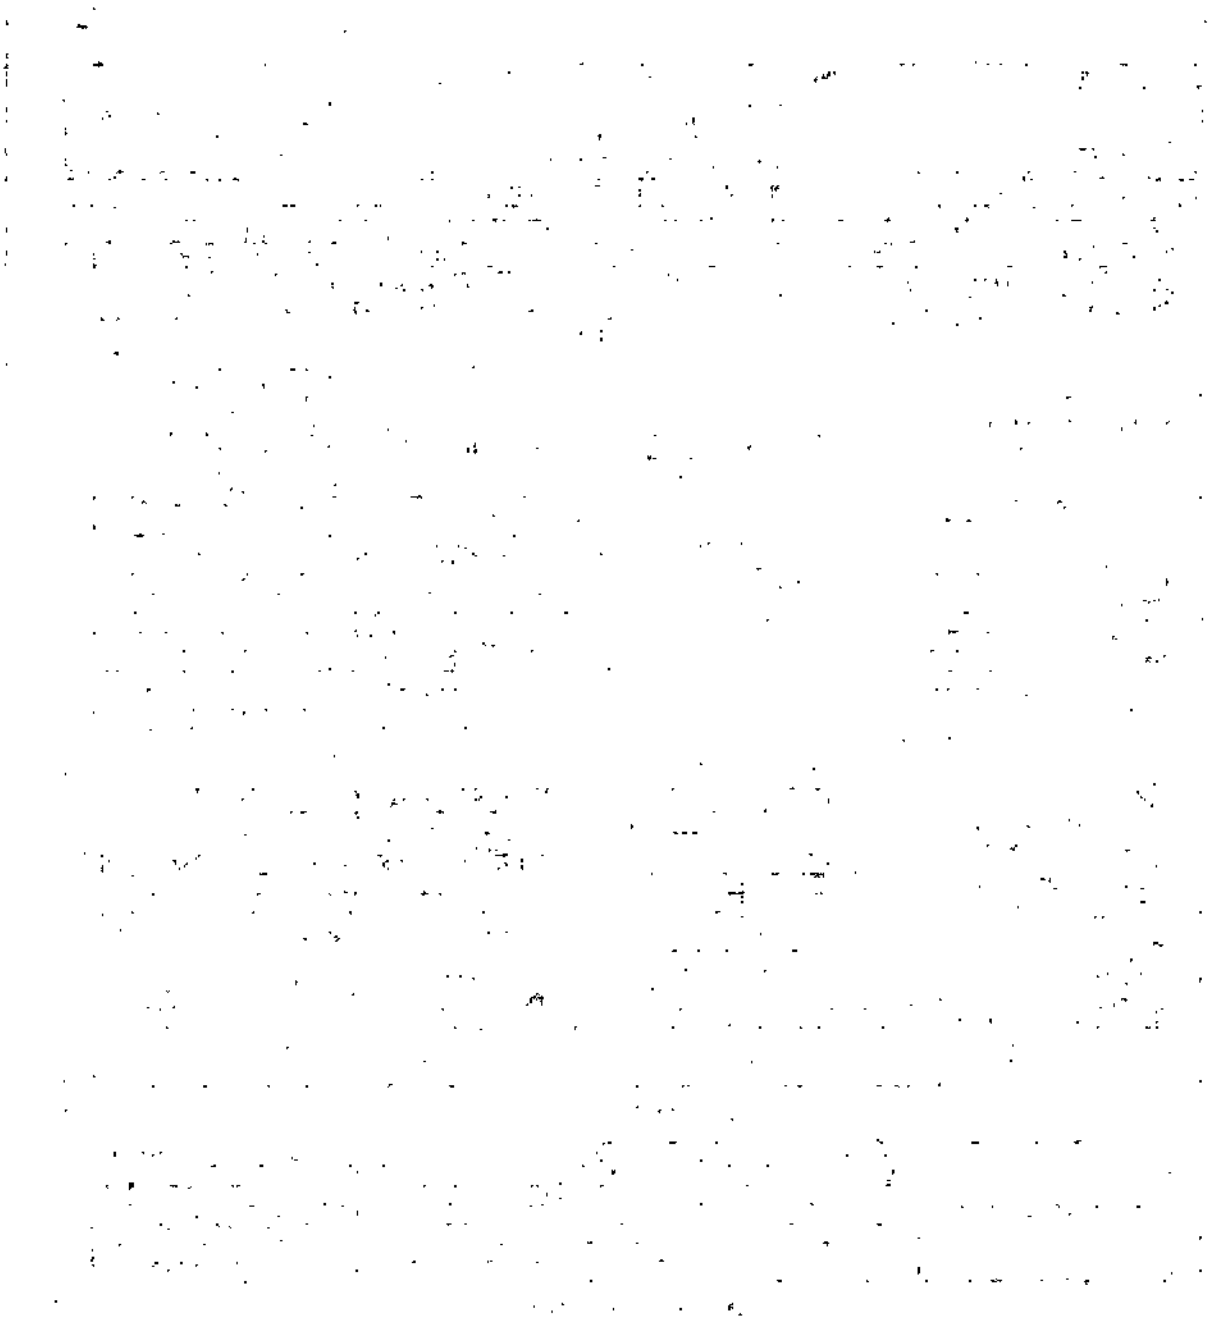

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 370 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
29	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	MARRUECOS		CIV	18005132	
NOMENCLATURA	KR 5M		DESDE	CL 49A BIS SUR	HASTA	CL 49C SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	4
Obreros	5
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	5
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realizan excavaciones por el costado derecho de la via, el tramo se deja señalizado y se realiza jornada de orden y aseo en el mismo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
11	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL	CANT	EQUIPO	CANT
Ingenieros		Volquetas sencillas	
Inspectores	3	Volquetas dobletroques	
Obreros		Retroexcavadoras	
Operarios		Compactadoras	
Topografía	2	Cargadores	
Brigadistas		Finisher	
Transito	7	Cortadora	
Vigilantes	1	Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA	KD	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS	BEAC	MD20
TEMPERATURA		
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza la visita al tramo y se cubre con malla los diferenets sumideros que se encuentren cerca a la zona intervenida

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
12	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA		CIV	180000595
NOMENCLATURA	KR 23 F		DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJON		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se instala PMT y por parte de interventoria se da el aval para que se inicien las actividades

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 370 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2018 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
13	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000585	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL	CANT	EQUIPO	CANT
Ingenieros		Volquetas sencillas	
Inspectores	3	Volquetas doble troques	
Obreros	2	Retroexcavadoras	
Operarios		Compactadores	
Topografía	2	Cargadores	
Brigadistas		Finisher	
Transito	7	Cortadora	
Vigilantes	1	Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA	KO	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS	BEAC	MD20
TEMPERATURA		
LLEGADA		
COMPACTACION		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se demole la capa de concreto de los primeros 20 metros del tramo y se excavan los primeros 5 metros lineales hasta tener el espesor necesario para la estructura de diseño

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

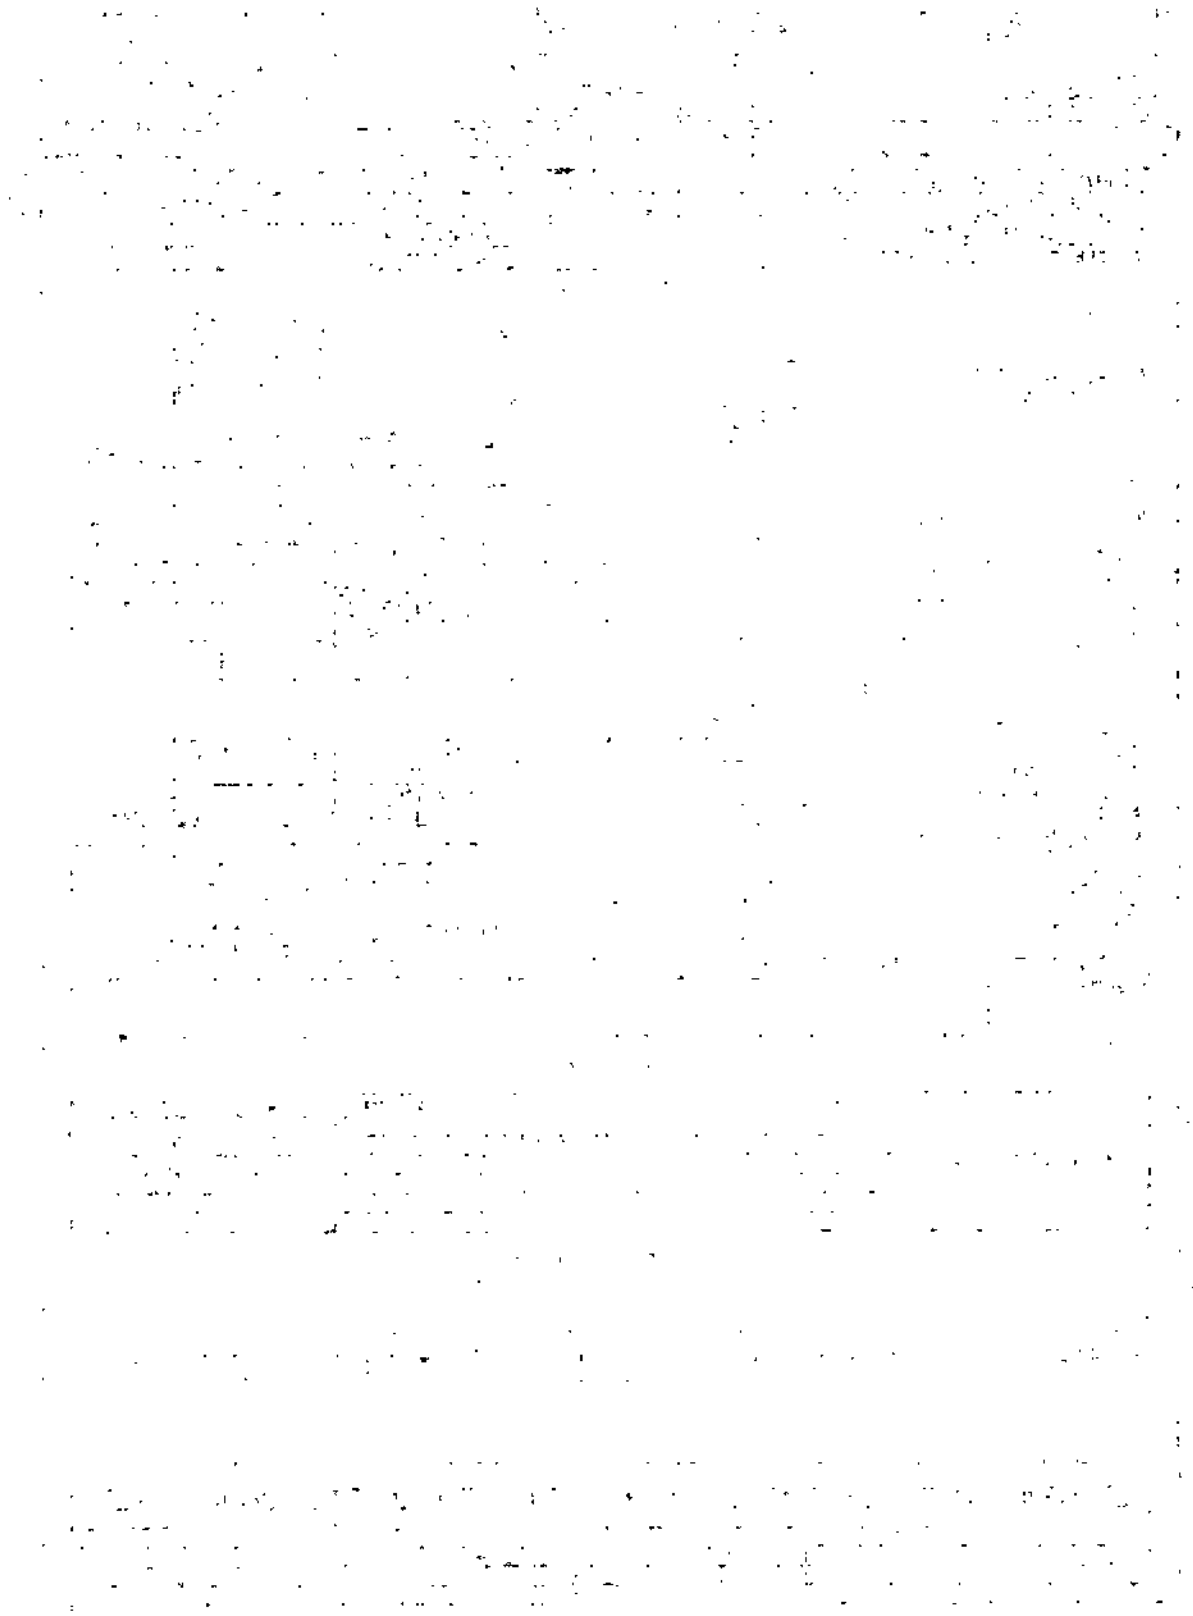

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 329 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
15	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA		CIV	180000595
NOMENCLATURA	KR 23 F		DESDE	CL 31 SUR	HASTA CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblotroques	1
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se recoge todo el material proveniente de la excavación de los primeros 20 metros del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
18	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	x
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillos	
Volquetes doblotroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Continua jornada de demolición de la placa de concreto existente y se realiza excavación manual a una profundidad de 40 cm

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
19	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000585	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO x

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	7
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS . _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Finaliza demolición y excavación del tramo hasta el nivel de la subrasante, se verifican niveles para cumplir con la estructura necesaria

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
20	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA		CIV	180000595
NOMENCLATURA	KR 23 F		DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillos	
Volquetes doblotroques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	X

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	USD444	15	EXCAVACIÓN

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Cargue manual de volqueta, se cargan 15 m3 de material de excavación

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
21	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA		CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F		DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	x
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN
SUBBBASE GRANULAR	USD 444	15	

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Llega material B600 , se extiende y se compactan la subbase granular en capas de 20 cm con ayuda del canguro

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
22	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO x
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FÍSICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERÍA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se extiende geotextil y subbase granular desde la abscisa K0+043 hasta la K0+030 , se realiza jornada de orden y aseo en el tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
24	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000585	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	8
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troques	
Retroexcavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se realiza relleno con subbase granular 20 cm por encima de la subrasante con instalación de geotextil entre las abscisas K0+030 a la K0+030 y se realiza excavación previa para instalación de cuneta

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2018 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
25	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL	CANT	EQUIPO	CANT
Ingenieros		Volquetas sencillas	
Inspectores	3	Volquetas doblestroques	
Obreros	2	Retroescavadores	
Operarios		Compactadores	
Topografía	2	Cargadores	
Brigadistas		Finisher	
Transito	8	Cortadora	
Vigilantes	1	Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS		
TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CARCAMOS	
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x
RAZONES					

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	USD444	7	Escombros

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Continua jornada de instalación de geotextil y base granular, además de esto se realiza cargue manual de escombro a volqueta

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
26	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACION	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA		CIV	160000595
NOMENCLATURA	KR 23 F		DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO x

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetes dobletroques	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	KG	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

B. MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Finaliza instalación de geotextil y subbase granular con un espesor de 0,20 m, la compactación fue realizada de manera adecuada con ayuda del canguro

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M3	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS			

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
27	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000505	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO x
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	8
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblestroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA


Se realiza excavación para la instalación de la cuneta A-120 a lo largo del eje del sendero peatonal y se inicia la instalación desde la abscisa K0+050 hasta la K0+022

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA

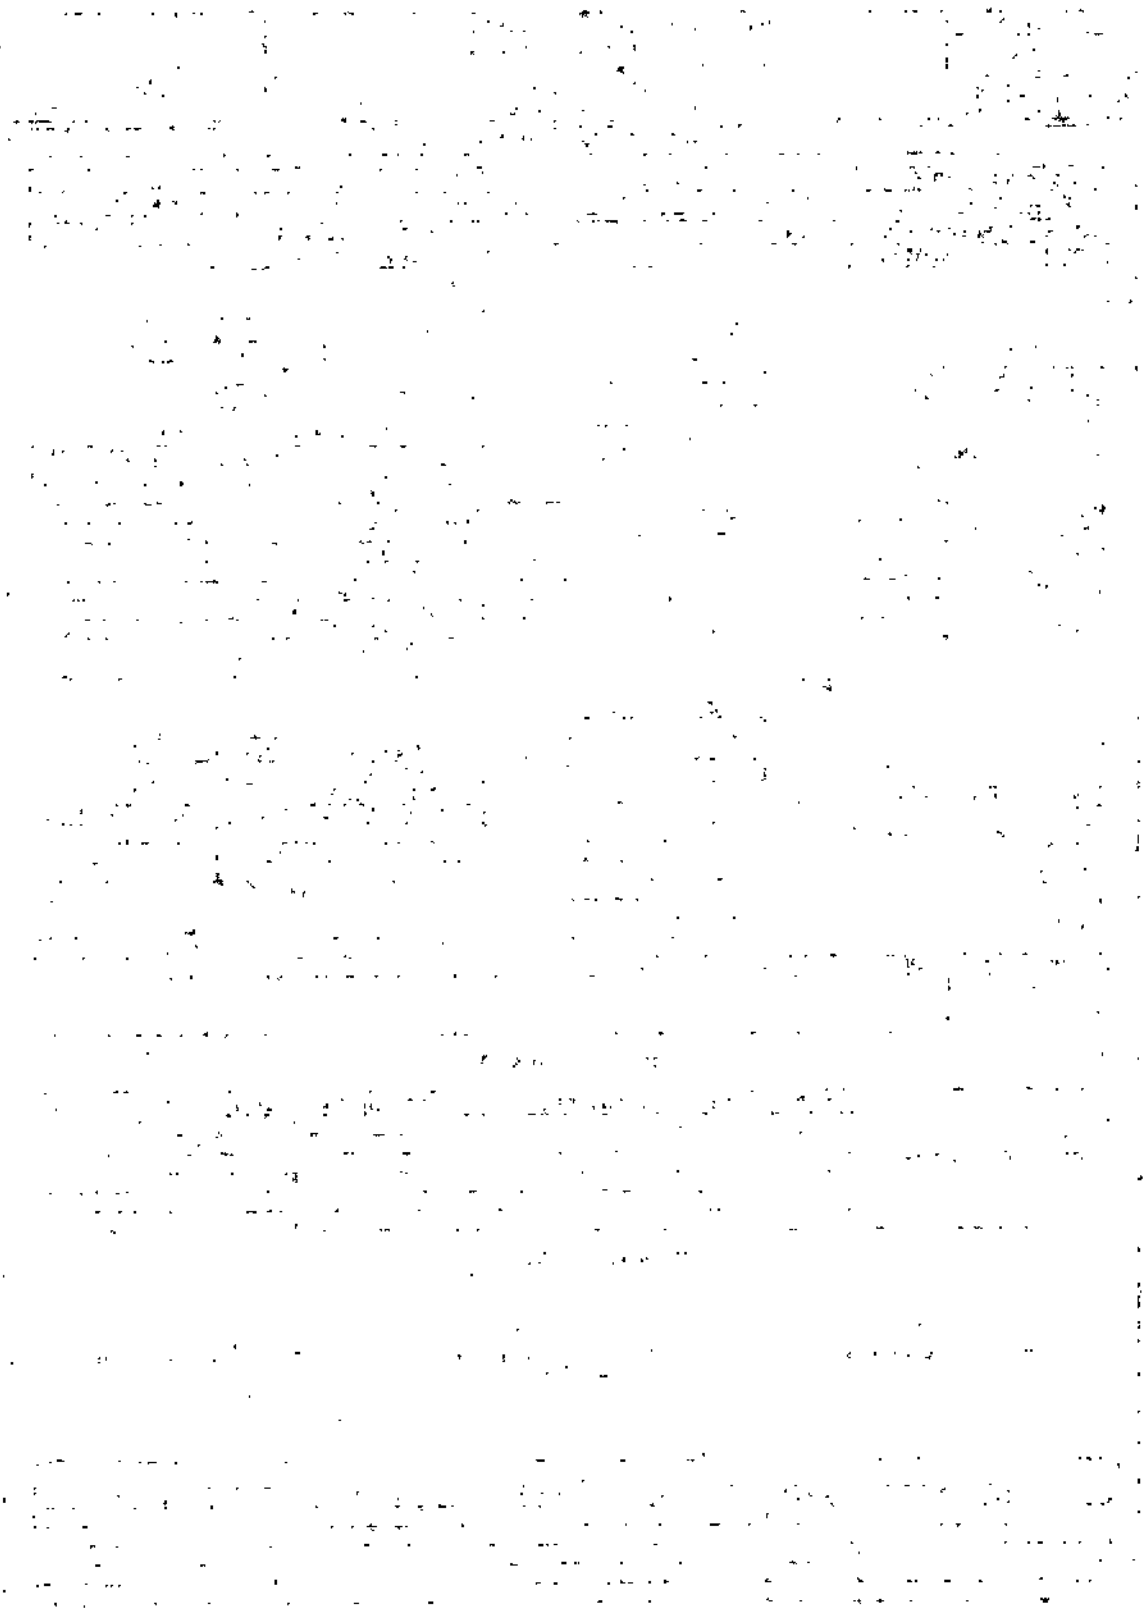

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
28	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	2
Brigadistas	
Tránsito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doble troque	
Retroexcavadoras	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	1

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCION		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se continua con la instalación de la cuneta A-120 entre la abscisa K0+022 hasta la K0+005 dejandola emboquillada

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 330 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
20	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	QUIROGA IV ETAPA	CIV	180000595	
NOMENCLATURA	KR 23 F	DESDE	CL 31 SUR	HASTA	CL 31 A SUR
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS				
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO				

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	x
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	3
Obreros	2
Operarios	
Topografía	
Brigadistas	
Transito	6
Vigilantes	1

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas doblotroques	1
Retroexcavadores	
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	KØ	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	x

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Finaliza instalación de cuenta en el tramo con su respectivo emboquillado, también se realiza jornada de orden, aseo y señalización del tramo

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

OSCAR FERNANDO LUGO MOLINA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
3	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	COLINAS	CIV	18002189-18002157-18006943	
NOMENCLATURA	Carrera 13 A	DESDE	Diagonal 32 B BIS Sur	HASTA	Diagonal 32 F BIS Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJON		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DEBIDO A MANIFESTACIONES Y CIERRE DE LAS VIAS NO ES POSIBLE REALIZAR AVANCE DE LAS ACTIVIDADES YA QUE LAS CANTERAS NO REALIZAN ENVIO A MATERIALES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

D. FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
4	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	COLINAS		CIV	18002189-18002157-18006943
NOMENCLATURA	Carrera 13 A		DESDE Diagonal 32 B BIS Sur	HASTA	Diagonal 32 F BIS Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO	X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI	NO	X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillas	
Volquetes dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DEBIDO A MANIFESTACIONES Y CIERRE DE LAS VIAS NO ES POSIBLE REALIZAR AVANCE DE LAS ACTIVIDADES YA QUE LAS CANTERAS NO REALIZAN ENVIO A MATERIALES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA



FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
5	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	COLINAS		CIV	18002189-18002157-18006843	
NOMENCLATURA	Carrera 13 A		DESDE	Diagonal 32 B BIS Sur	HASTA	Diagonal 32 F BIS Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
MAÑANA			
TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DEBIDO A MANIFESTACIONES Y CIERRE DE LAS VIAS NO ES POSIBLE REALIZAR AVANCE DE LAS ACTIVIDADES YA QUE LAS CANTERAS NO REALIZAN ENVIO A MATERIALES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
6	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	COLINAS		CIV	18002189-18002157-18006943
NOMENCLATURA	Carrera 13 A		DESDE Diagonal 32 B BIS Sur	HASTA	Diagonal 32 F BIS Sur

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. FROILAN ANDRES COLORADO

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	-
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI	NO X
MAÑANA		
TARDE		
ACCIDENTES	SI	NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetes sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadores	1
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERIA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI	X	NO	

RAZONES: DEBIDO A MANIFESTACIONES Y CIERRE DE LAS VIAS NO ES POSIBLE REALIZAR AVANCE DE LAS ACTIVIDADES YA QUE LAS CANTERAS NO REALIZAN ENVIO A MATERIALES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA

FORMATO UNAL-01			INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 320 DE 2019 INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 321 DE 2019 MANTENIMIENTO VIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTÁ Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
FECHA				
7	5	2021		
DD	MM	AA		

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	COLINAS	CIV	18002189-18002157-18006943	
NOMENCLATURA	Carrera 13 A	DESDE	Diagonal 32 B BIS Sur	HASTA	Diagonal 32 F BIS Sur
NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR		Ing. JUAN PABLO LEMUS			
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA		Ing. FROILAN ANDRES COLORADO			

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO X
	MAÑANA		
	TARDE		
ACCIDENTES	SI		NO X

PERSONAL

	CANT
Ingenieros	
Inspectores	2
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO

	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroexcavadoras	1
Compactadores	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

AVANCE FISICO DE OBRA

	K0	OBSERVACIÓN
ASFALTO		
CONCRETO		
MBR		
GEOTEXTIL		
SELLO O SBG-A		
RAJÓN		
CAJAS DE INSPECCIÓN		
TUBERIA SANITARIA		
TUBERÍA PLUVIAL		
DOMICILIARIAS		

MATERIALES

	UND	CANT
BEAC		
MD20		
EMULSION ASFALTICA CRL-0		
EMULSION ASFALTICA CRL-1		
RAJÓN		
SELLO O SUB-BASE GRANULAR (SBG-A)		
BASE GRANULAR (BG-A)		
MBR O RAP		
CONCRETO		
CEMENTO		
ESCOMBRO		

PRUEBAS

TEMPERATURA	BEAC	MD20
LLEGADA		
COMPACTACIÓN		

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS _____
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE		SI		NO	

RAZONES

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M3	ESCOMBRERA

TRANS MATERIAL	PLACA	M3	ORIGEN

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza instalación de formaleta para anden en costado derecho

FALLOS

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA M2	VOLUMEN M3	OBSERVACIONES

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Adriana Quiroga

ADRIANA QUIROGA
