UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA


MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 12/8/2021	FINAL DE OBRA:	15/09/2021	REPORTE DIARIO No 01	FECHA DE REPORTE:	13/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: BELLICORP	PLAZO: 35 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM
CONDICION INSEGURA	0	0
ACTO INSEGURO	0	0
NEAR MISS	0	0
ACCIDENTE	0	0

AVANCE DE OBRA					
MOVILIZACION DE MAQUINARIA	0,5%		% PROGRAMADO	% FISICO	JORNADA LABORAL
MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	0%				INICIO 7:00 a. m.
ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	0%	DIARIO	1,0%	0,5%	FINAL 4:00 p. m.
CONSTRUCCION LOCACION	0%	ACUMULADO			HORAS EXTRA

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora			MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6			TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camioneta doblecabina				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	2	16	Camioneta doblecabina 4X4	8	8		
			Camabaja	8	8		
TOTAL HH		40	TOTAL HH		16		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Movilizacion de maquinaria amarilla motoniveladora desde Sabana de Torres (Santander), hasta el casco urbano de Guamal (Magdalena)
2. Induccion técnica operador (motoniveladora) y personal MONC

CANTIDADES DE OBRA


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5	1	
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMME)			


REGISTRO FOTOGRAFICO




MOTONIVELADORA CATERPILLAR 16G

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE:	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

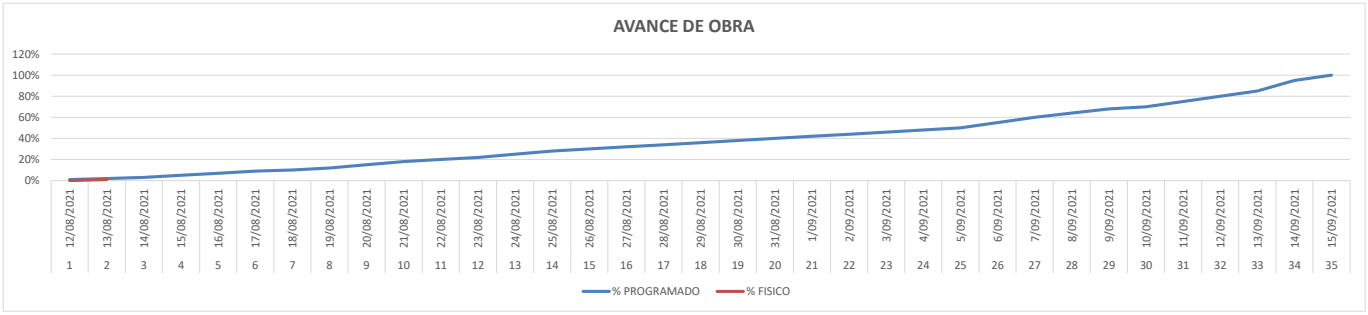
AVANCE DE OBRA
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
12/08/2021
13/08/2021
14/08/2021
15/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
21/08/2021
22/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
29/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
1/09/2021
2/09/2021
3/09/2021
4/09/2021
5/09/2021
6/09/2021
7/09/2021
8/09/2021
9/09/2021
10/09/2021
11/09/2021
12/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
% PROGRAMADO
% FISICO

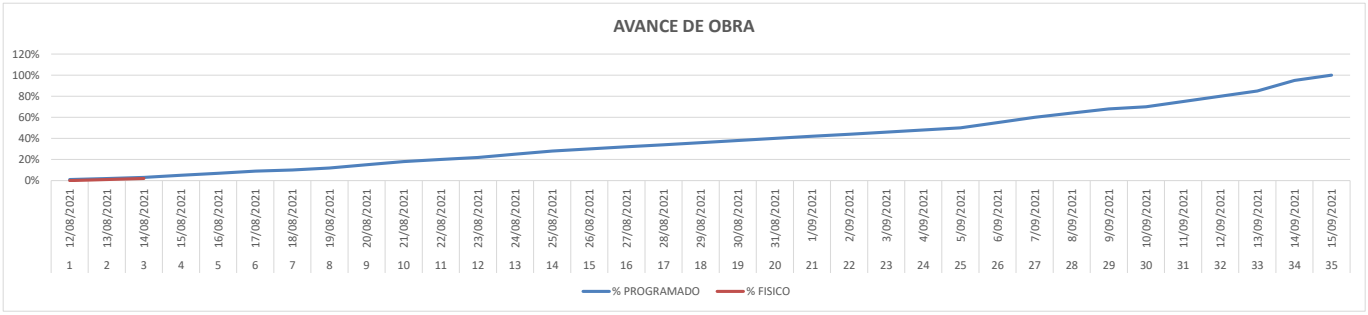
AVANCE DE OBRA
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
12/08/2021
13/08/2021
14/08/2021
15/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
21/08/2021
22/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
29/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
1/09/2021
2/09/2021
3/09/2021
4/09/2021
5/09/2021
6/09/2021
7/09/2021
8/09/2021
9/09/2021
10/09/2021
11/09/2021
12/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
% PROGRAMADO
% FISICO

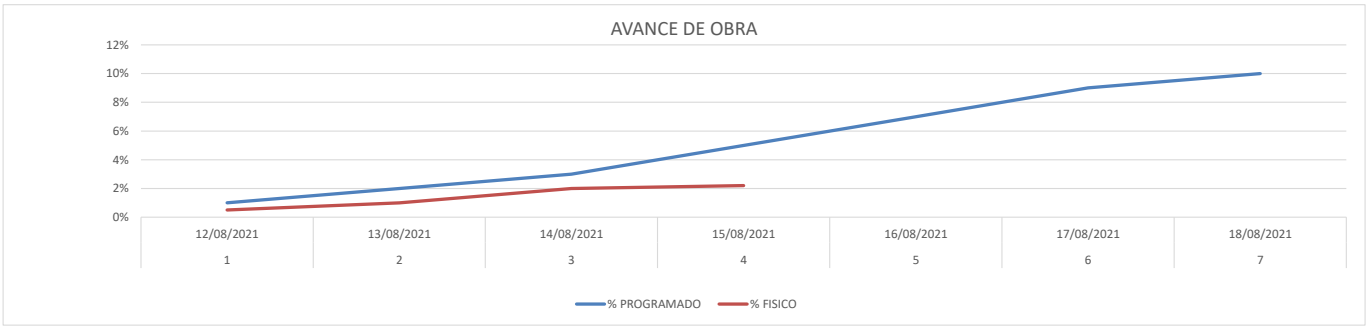
AVANCE DE OBRA
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
12/08/2021
1
13/08/2021
2
14/08/2021
3
15/08/2021
4
16/08/2021
5
17/08/2021
6
18/08/2021
7
% PROGRAMADO
% FISICO

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA


INICIO DE OBRA: 12/8/2021	**FINAL DE OBRA: 15/9/2021**	**REPORTE DIARIO No 05**	**FECHA DE REPORTE:**	**17/08/2021**	**EJECUTOR: SERCOMADI - UT**	**INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021**	**PLAZO: 35 DIAS**

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES	
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	20%
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%

AVANCE DE OBRA		
	% PROGRAMADO	% FISICO
DIARIO	2,0%	
ACUMULADO	7,0%	2,2%

JORNADA LABORAL	
INICIO	7:00 a. m.
FINAL	4:00 p. m.
HORAS EXTRA	

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO		
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS
Ingeniero civil	1	8
Supervisor HSE	1	8
Administrador	1	8
Topógrafo		
Cadenero		
Maestro de obra		
Oficial		
Ayudante		
Controlador vial		
Operador de maquinaria		
Conductor		
TOTAL HH		24

CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA		
DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS
Motoniveladora		
Buldocer D6		
Retroexcavadora P 200		
Retrocargador		
Vibrocompactador		
Camioneta doblecabina		
Hormigonera		
Buseta		
Carrotanque		
Volqueta sencilla		
Camioneta doblecabina 4X4		
Camabaja		
TOTAL HH		0

HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
JORNADA	HORAS
MAÑANA	
TARDE	
TOTAL	
ACUMULADO	

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inspección del tramao de via que se intervendra el dia de mañana
2. Elaboracion de ATS para el mantenimiento de la via

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Km 2+150



Km 2+400



Km 2+500

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

UNIÓN TEMPORAL ERSCOMADI

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 12/8/2021	FINAL DE OBRA: 15/9/2021	REPORTE DIARIO No 06	FECHA DE REPORTE: 18/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 35 DIAS


INDICADORES H & S	CANT.	ACUM
CONDICION INSEGURA	0	0
ACTO INSEGURO	0	0
NEAR MISS	0	0
ACCIDENTE	0	0

PESO DE LAS ACTIVIDADES	
MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%
MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%
ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%
CONSTRUCCION LOCACION	55%

AVANCE DE OBRA	% PROGRAMADO	% FISICO
DIARIO	2,0%	
ACUMULADO	9,0%	2,2%

JORNADA LABORAL	
INICIO	7:00 a. m.
FINAL	4:00 p. m.
HORAS EXTRA	

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO		
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS
Ingeniero civil	1	8
Supervisor HSE	1	8
Administrador	1	8
Topógrafo		
Cadenero		
Maestro de obra		
Oficial		
Ayudante		
Controlador vial	2	16
Operador de maquinaria	3	24
Conductor		
TOTAL HH		64

CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA		
DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS
Motoniveladora		
Buldocer D6		
Retroexcavadora P 200		
Retrocargador		
Vibrocompactador		
Hormigonera		
Camioneta doblecabina		
Buseta		
Carrotanque		
Volqueta sencilla		
Camioneta doblecabina 4X4		
Camabaja		
TOTAL HH		0

HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
JORNADA	HORAS
MAÑANA	
TARDE	
TOTAL	
ACUMULADO	

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Acompañamiento inspección preoperacional bulldocer y vibrocompactador.
2. Por falla mecánica de la motoniveladora, se suspendieron las actividaes del mantenimiento de la vía.

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMNISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



CHARLA HSE



PREOPERACIONAL BULLDOCER

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

UNIÓN TEMPORAL ERCOMADI

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA


INICIO DE OBRA: 12/8/2021	**FINAL DE OBRA: 15/9/2021**	**REPORTE DIARIO No 07**	**FECHA DE REPORTE:**	**19/08/2021**	**EJECUTOR: SERCOMADI - UT**	**INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021**	**PLAZO: 35 DIAS**

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES	
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%

AVANCE DE OBRA		
	% PROGRAMADO	% FISICO
DIARIO	2,0%	
ACUMULADO	9,0%	2,2%

JORNADA LABORAL	
INICIO	7:00 a. m.
FINAL	4:00 p. m.
HORAS EXTRA	

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO		
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS
Ingeniero civil	1	8
Supervisor HSE	1	8
Administrador	1	8
Topógrafo		
Cadenero		
Maestro de obra		
Oficial		
Ayudante		
Controlador vial		
Operador de maquinaria		
Conductor	1	8
TOTAL HH		32

CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA		
DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS
Motoniveladora		
Buldocer D6		
Retroexcavadora P 200		
Retrocargador		
Vibrocompactador		
Hormigonera		
Camioneta doblecabina		
Buseta		
Carrotanque		
Volqueta sencilla		
Camioneta doblecabina 4X4	1	8
Camabaja		
TOTAL HH		8

HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
JORNADA	HORAS
MAÑANA	
TARDE	
TOTAL	
ACUMULADO	

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Actividades de cierre de algunas de las desviaciones evidenciados en la inspección preoperacional (vibrocompactador)
2. Acompañamiento reaparación mecánica motoniveladora

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA:	**FIRMA:**	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	**NOMBRE: ALEXIS MEZA**	**NOMBRE: LUIS ZARATE**
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	**CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI**	**CARGO: INTERVENTORIA CIVIL**

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 16/08/2021	FINAL DE OBRA: 30/9/2021	REPORTE DIARIO No 08	FECHA DE REPORTE:	20/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS


INDICADORES H & S	CANT.	ACUM
CONDICION INSEGURA	0	0
ACTO INSEGURO	0	0
NEAR MISS	0	0
ACCIDENTE	0	0

PESO DE LAS ACTIVIDADES	
MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%
MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%
ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%
CONSTRUCCION LOCACION	55%

AVANCE DE OBRA	
PROGRAMADO	EJECUTADO
100%	80%
0,0%	0%
100,0%	10,0%
0,0%	0,0%
AVANCE TOTAL	5,0%

JORNADA LABORAL	
INICIO	7:00 a. m.
FINAL	4:00 p. m.
HORAS EXTRA	

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO		
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS
Ingeniero civil	1	8
Supervisor HSE	1	8
Administrador	1	8
Topógrafo		
Cadenero		
Maestro de obra		
Oficial		
Ayudante	5	40
Controlador vial		
Operador de maquinaria	2	16
Conductor	1	8
TOTAL HH		88

CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA		
DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS
Motoniveladora	1	8
Buldocer D6	1	8
Retroexcavadora P 200		
Retrocargador		
Vibrocompactador		
Hormigonera		
Camabaja		
Buseta		
Carrotanque		
Volqueta sencilla		
Camioneta doblecabina 4X4	1	8
TOTAL HH		24

HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
JORNADA	HORAS
MAÑANA	
TARDE	
TOTAL	
ACUMULADO	10

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se inicio con la actividad de descapote de la locación con la motoniveadora y el bulldozer a las 8 am, la maquinaria se entierra debido a la saturación que presenta el material, por lo tanto se suspendió esta actividad.

2. Descargue de los postes para el cerramiento perimetral.

3. Descargue de la planta estadio

4.Teniendo encuenta el estado actual del terreno de la locación, debido a las intensas lluvias que se han presentado en la zona y otros imprevistos que nos han impactado negativamente el cronograma de obra, nos encontramos evaluando un plan de choque, para poder nievelar la curva de avence (S).

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMINISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA (M3)	310		100
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE (Km)	0,31		
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2" (M3)	426		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA (M3-Km)	27690		
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Material saturado area de la locación





Planta estadio

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 09	FECHA DE REPORTE:	21/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 47 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100	60%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	0	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	9	1,0%	HORAS EXTRA	
AVANCE TOTAL					20,0	3,6%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	10
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camioneta doblecabina				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
			Camabaja				
TOTAL HH		32	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Instalación de postes para cerramiento perimetral
2. Continua el material saturado en la locación , lo que impide trabajar con maquinaria amarrilla.
3. Se alquiló una retroexcavadora 130D, el día de mañana la movilizan desde Mompox hasta la locación

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS	20		20
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Actividades cerramiento perimetral

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 10	FECHA DE REPORTE:	22/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 47 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100	60%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	0	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	9	1,0%	HORAS EXTRA	
AVANCE TOTAL					20,0	3,6%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	10
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camioneta doblecabina				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
			Camabaja				
TOTAL HH		32	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Instalación de postes para cerramiento perimetral
2. Continua el material saturado en la locación , lo que impide trabajar con maquinaria amarrilla.
3. Se alquiló una retroexcavadora 130D, el día de mañana la movilizan desde Mompox hasta la locación

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS	20		20
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Actividades cerramiento perimetral

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 10	FECHA DE REPORTE:	22/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 47 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100	60%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	0	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	9	1,0%	HORAS EXTRA	
AVANCE TOTAL					20,0	3,6%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	10
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camioneta doblecabina				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
			Camabaja				
TOTAL HH		32	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Instalación de postes para cerramiento perimetral
2. Continua el material saturado en la locación , lo que impide trabajar con maquinaria amarrilla.
3. Se alquiló una retroexcavadora 130D, el día de mañana la movilizan desde Mompox hasta la locación

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		3
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE			
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"			
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS	20		20
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividades cerramiento perimetral

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X

PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 16/08/2021	FINAL DE OBRA: 30/9/2021	REPORTE DIARIO No 12	FECHA DE REPORTE:	24/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS


INDICADORES H & S	CANT.	ACUM
CONDICION INSEGURA	0	0
ACTO INSEGURO	0	0
NEAR MISS	0	0
ACCIDENTE	0	0

PESO DE LAS ACTIVIDADES	
MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%
MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%
ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%
CONSTRUCCION LOCACION	55%

AVANCE DE OBRA	PROGRAMADO	EJECUTADO
	100%	80%
	0,0%	0%
	100,0%	10,0%
	0,0%	0,0%
AVANCE TOTAL		5,0%

JORNADA LABORAL	
INICIO	7:00 a. m.
FINAL	4:00 p. m.
HORAS EXTRA	

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO		
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS
Ingeniero civil	1	8
Supervisor HSE	1	8
Administrador	1	8
Topógrafo		
Cadenero		
Maestro de obra		
Oficial		
Ayudante	5	40
Controlador vial		
Operador de maquinaria	2	16
Conductor	1	8
TOTAL HH		88

CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA		
DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS
Motoniveladora	1	8
Buldocer D6	1	8
Retroexcavadora P 200		
Retrocargador		
Vibrocompactador		
Hormigonera		
Camabaja		
Buseta		
Carrotanque		
Volqueta sencilla		
Camioneta doblecabina 4X4	1	8
TOTAL HH		24

HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
JORNADA	HORAS
MAÑANA	
TARDE	
TOTAL	
ACUMULADO	10

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se inicio con la actividad de descapote de la locación con la motoniveadora y el bulldozer a las 8 am, la maquinaria se entierra debido a la saturación que presenta el material, por lo tanto se suspendió esta actividad.

2. Descargue de los postes para el cerramiento perimetral.

3. Descargue de la planta estadio

4.Teniendo encuenta el estado actual del terreno de la locación, debido a las intensas lluvias que se han presentado en la zona y otros imprevistos que nos han impactado negativamente el cronograma de obra, nos encontramos evaluando un plan de choque, para poder nievelar la curva de avence (S).

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES			
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM			
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA			
3	SUMINISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"			
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
	ADECUACION VIA DE ACCESO			
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA (M3)	310		100
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE (Km)	0,31		
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2" (M3)	426		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA (M3-Km)	27690		
	CONSTRUCCION LOCACION			
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO			
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA			
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO			
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA			
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"			
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO			
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO			
16	SUMINISTRO E INSTALCION DESARENADOR METALICO			
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO			
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS			
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS			
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS			
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)			

REGISTRO FOTOGRAFICO



Material saturado area de la locación





Planta estadio

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 13	FECHA DE REPORTE: 25/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	60%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	0,0%	2,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	4,1%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	10
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camabaja				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
TOTAL HH		32	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con la excavación para la instalación de los postes en concreto para el cerramiento perimetral.
2. Instalación del campamento movil, punto ecológico y elemenstos de seguridad industrial.
3. Continúa la primera capa del terreno de la locación saturada, intentamos nuevamente realizar descapote con el bulldozer D7 obteniendo malos resultados, debido al peso de la máquina hace que se entierre .

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Movilización de bulldozer D5
2. Excavacion manual para instalación de los postes del cerramiento perimetral

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Movilización retroexcavadora sobre orugas

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500		
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERR RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400		
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



CAMPAMENTO MOVIL



CERRAMIENTO PERIMETRAL

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 14	FECHA DE REPORTE: 26/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	60%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	0,0%	3,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	4,7%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D6			TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora P 200			TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	10
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camabaja				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
TOTAL HH		32	TOTAL HH		16		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con la excavación para la instalación de los postes en concreto para el cerramiento perimetral.
2. Movilización retroexcavadora orugada 130D hasta Guamal.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1.Excavacion manual para instalación de los postes para el cerramiento perimetral
2.Movilización bulldozer D5

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Movilización retroexcavadora sobre orugas

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500		
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERR RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400		
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cerramiento Perimetral

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 15	FECHA DE REPORTE:	27/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	90%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	0,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	8,0%	5,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	7,3%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / 0TROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora	1	8	MAÑANA	4
Supervisor HSE	1	8	Buldocer D5	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora 130D	1	8	TOTAL	4
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	14
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera			se presentaron fuertes precipitaciones en la zona, desde la noche anterior hasta altas horas de la madrugada, afectando el inicio de actividades con la maquinaria amarilla.	
Oficial			Camabaja				
Ayudante	5	40	Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
TOTAL HH		72	TOTAL HH		32		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Descargue de material en la plataforma (geotextil, geomembrana, malla en acero, carpas, señalizacion vial)
2. Se inicia descapote con la retroexcavadora en el costado sur de la locación.
3. Descargue de material triturado para concreto simple

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Descapote con maquinaria en el area de la locación (buldocer D5 y retroexcavadora)
2. Cerramiento perimetral (aplicación de concreto simple para fijar y plomar postes de cermiento)
3. Templar alambre de puas para el cerramiento

ACTIVIDADES PENDIENTES

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500	1000	1000
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERR RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400		
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descapote (locación)



Geotextil - geomembrana



Material para concreto simple

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 16	FECHA DE REPORTE:	28/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	90%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	40,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	12,0%	8,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	12,9%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora Caterpillar 120G	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer Caterpillar D5	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora Hitachi 130D	1	8	TOTAL	4
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	14
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camabaja				
Ayudante	5	40	Buseta				
Controlador vial	2	16	Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
TOTAL HH		88	TOTAL HH		32		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Descapote de la via de acceso
2. Decapote area de la locación
3. Cajeo para reemplazo de material en el area de la placa taladro y zona plana
4. Cerramiento perimetral (aplicación de concreto simple para fijar y plomar postes de cerrmiento)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Descapote con maquinaria en el area de la locación (bulldocer D5 y retroexcavadora)
2. Cajeos para reemplazo de material en zonas en areas de poca capacidad portante

ACTIVIDADES PENDIENTES

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465	375	375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31	0,3	0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500	1350	2350
	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL				
11	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
12	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
14	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
15	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
16	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
17	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
18	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
20	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400	200	200
21	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



CERRAMIENTO PERIMETRAL



AREA PLACA TALADRO



DESCAPOTE

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 17	FECHA DE REPORTE:	29/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	90%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	45,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	15,0%	11,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	15,1%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora Caterpillar 120G	1	8	MAÑANA	
Supervisor HSE	1	8	Buldocer Caterpillar D5	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora Hitachi 130D	1	8	TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	14
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera				
Oficial			Camabaja				
Ayudante			Buseta				
Controlador vial			Carrotanque				
Operador de maquinaria			Volqueta sencilla				
Conductor			Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
Mecánico	1	8					
TOTAL HH		32	TOTAL HH		32		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Conformación y cuneteo vía de acceso
2. Descapote de la locación
3. Adecuación del area plana, se retiró el material organico hasta llegar a la cota de subrasante, para cimentar la placa taladro.
4. Se construyó carreteable dentro la plataforma que conecta la zona plana con la via de acceso, como proceso constructivo para poder realizar actividades simultaneas.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Descapote con maquinaria en el area de la locación (bulldocer D5 y retroexcavadora)
2. Figurado de acero para el contrapozo
3. Cerramiento perimetral, templar 4 hilos de alambra de puas

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Cajeo para reemplazo de material en zonas en areas de poca capacidad portante sobre la vía de acceso.

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500	450	2800
11	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL	M2	10000		
12	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
13	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
15	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
16	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
17	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
18	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
20	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
21	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400		200
22	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONFORMACION DE LA SUBRASANTE



PANORAMICA LOCACION



CARRETEABLE HASTA ZONA PLANA

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 18	FECHA DE REPORTE:	30/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	90%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	45,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	18,0%	15,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	17,3%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora Caterpillar 120G			MAÑANA	5
Supervisor HSE	1	8	Buldocer Caterpillar D5	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora Hitachi 130D	1	8	TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	19
Cadenero			Vibrocompactador			OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera			Se presentaron fuertes precipitaciones en la noche anterior hasta altas horas de la madrugada.	
Oficial			Camabaja				
Ayudante	5	40	Buseta				
Controlador vial	2	16	Carrotanque				
Operador de maquinaria	2	16	Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
Mecánico	1	8					
TOTAL HH		112	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona, se iniciaron trabajos con la maquinaria amarilla despues de medio dia.
2. Descapote de la locación
3. Figurado de acero para refuerzo del contrpozo
4. Instalación alambre de púas 4 hilos par el cerramiento perimetral

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Descapote con maquinaria en el area de la locación (bulldocer D5 y retroexcavadora)
2. Cerramiento perimetral, templar 4 hilos de alambra de puas
3. Localizacion y replanteo del contrapozo y placa taladro

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Cajeo para reemplazo de material en zonas en areas de poca capacidad portante sobre la vía de acceso.

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500	300	3100
11	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL	M2	10000		
12	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
13	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
15	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
16	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
17	ACERO DE REFUERZO	KG	1981	362	362
17	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
18	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
20	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
21	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400	80	280
22	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCACION 8 AM



DESCAPOTE



ACERO DE REFUERZO CONTRAPOZO

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL

POZO PAILITAS - ANH - 1 - X


PREDIO LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTMENTO DE MAGDALENA

INICIO DE OBRA: 13/08/2021	FINAL DE OBRA: 27/9/2021	REPORTE DIARIO No 19	FECHA DE REPORTE:	31/08/2021	EJECUTOR: SERCOMADI - UT	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021	PLAZO: 46 DIAS

INDICADORES H & S	CANT.	ACUM	PESO DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE DE OBRA		JORNADA LABORAL	
					PROGRAMADO	EJECUTADO		
CONDICION INSEGURA	0	0	MOVILIZACION DE MAQUINARIA	5%	100%	90%		
ACTO INSEGURO	0	0	MANTENIMIENTO VIA PÚBLICA	30%	50,0%	0%	INICIO	7:00 a. m.
NEAR MISS	0	0	ADECAUCIÓN VIA DE ACCESO	10%	100,0%	45,0%	FINAL	4:00 p. m.
ACCIDENTE	0	0	CONSTRUCCION LOCACION	55%	20,0%	16,0%	HORAS EXTRA	
					AVANCE TOTAL	17,8%		

CURVA S



CONTROL PERSONAL EN OBRA UTILIZADO			CONTROL DE EQUIPO UTILIZDOS EN OBRA			HORAS PERDIDA POR LLUVIA / OTROS MOTIVOS	
CATEGORIA	CANTIDAD	HORAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	HORAS	JORNADA	HORAS
Ingeniero civil	1	8	Motoniveladora Caterpillar 120G	1		MAÑANA	6
Supervisor HSE	1	8	Buldocer Caterpillar D5	1	8	TARDE	
Administrador	1	8	Retroexcavadora Hitachi 130D	1	8	TOTAL	
Topógrafo			Retrocargador			ACUMULADO	25
Cadenero			Vibrocompactador	1		OBSERVACIONES	
Maestro de obra			Hormigonera			Se presentaron precipitaciones hasta la 1pm.	
Oficial			Camabaja				
Ayudante	5	40	Buseta				
Controlador vial	2	16	Carrotanque				
Operador de maquinaria	3	24	Volqueta sencilla				
Conductor	1	8	Camioneta doblecabina 4X4	1	8		
Mecánico	1	8					
TOTAL HH		120	TOTAL HH		24		

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona, se iniciaron trabajos con la maquinaria amarilla a las 2pm
2. Construccion de zanjas para desaguar la locacion
3. Figurado de acero para refuerzo del contrpozo
4. Instalación alambre de púas 4 hilos para el cerramiento perimetral

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

1. Descapote con maquinaria en el area de la locación (bulldocer D5 y retroexcavadora)
2. Cerramiento perimetral, templar 4 hilos de alambra de puas
3. Suministro de piedra, para cajeo de fallos sobre la via de acceso.
4. Acarreo material de cantera (piedra)

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Cajeo para reemplazo de material en zonas en areas de poca capacidad portante sobre la via de acceso.
2. Localizacion y replanteo del contrapozo y placa taladro

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	5		4
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	0,3		
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	KM	1200		
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	465		375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,31		0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	613,8		
8	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	39897		
	CONSTRUCCION LOCACION				
9	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10000		
10	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	3500	50	3150
11	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL	M2	10000		
12	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO	M3	5194		
13	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	337610		
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		
15	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		
16	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	27		
17	ACERO DE REFUERZO	KG	1981	362	362
17	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		
18	SUMINISTRO E INSTALCION SKMMER METALICO	UND	1		
19	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		
20	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		
21	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400	60	340
22	SUMINISTRO E INSTALCION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCACIÓN

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: JUAN GUILLERMO PRADA	NOMBRE: ALEXIS MEZA	NOMBRE: LUIS ZARATE
CARGO: INGENIERO CIVIL - UT SERCOMADI	CARGO: DIRECTOR PROYECTO- UT SERCOMADI	CARGO: INTERVENTORIA CIVIL
