BITACORA DE OBRA

FECHA DE CORTE:

03 DE SEPTIEMBRE A 04 DE OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.2791201

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA PROYECTO 8492-SGPS-2021 SENNOVA DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ"

ELABORÓ:

CIVILAGS S.A.S.

SOGAMOSO - BOYACÁ

2021

315 738 8988 - 301 790 8043
afg.civilags@gmail.com
Calle 2ª 25 35 Sogamoso Boyacá

INFORME FINAL DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2791201
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
SUPERVISIOR DESIGNADO:	JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
CONTRATISTA:	CIVILAGS SAS
NIT:	901446198-2
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
ACTA DE INICIO:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA PROYECTO 8492-SGPS-2021 SENNOVA DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA
VALOR:	**$**40.048.000,00
Fecha de firma del acta de inicio de obra:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETIVO

Por parte del contratista, se trabajará y proyectará a cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido por la entidad, buscando la manera más adecuada y profesional posible, para que todas las actividades queden ejecutadas de tal manera como lo ha solicitado la entidad.

Entregar a satisfacción los espacios intervenidos por nosotros para el uso de estudiantes e instructores, cumpliendo con los estándares de calidad del SENA, Siguiendo parámetros requeridos para disposición de los espacios y herramientas para poder brindar una enseñanza por sus instructores y que sus alumnos reciban una formación de calidad.

CONTROL OPERATIVO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- SEDE CENTRO MINERO

Se realiza reunión de reconocimiento del laboratorio día viernes 06 de septiembre aclarando actividades y alcance del desarrollo contractivo del laboratorio, se inicia con actividades de demolición de pisos.

Se realizan las localizaciones, demoliciones de pisos, muros y excavaciones en áreas definidas a intervenir por la supervisión en común acuerdo.

CUADRILLA DE REMODELACIÓN LABORATORIO DE BIOTEGNOLOGIA

SEMANA 1

Se realizan charlas interactivas para el pre ingreso de personal al centro minero con los profesionales de SST y residente de obra, empalmando información de manejo de labores exámenes y funciones de personal, empleando a su vez conocimiento de protocolos de bioseguridad para desarrollo y manejo de actividades diarias.

Para iniciar con la intervención del ambiente de formación o laboratorio se adelantó con las siguientes actividades para los días comprendidos entre fechas del 6 al 11 de septiembre del año en curso; para esta primera semana se emplean actividades de demolición de enchapes de piso, dando paso a realizar el cimbrado para la ubicación de mesones proporcionando el desarrollo de su mampostería y pañetes de los mismos; sobre llevando un porcentaje de avance dentro de los ítems 1.1,8.3 y 5.1.








SEMANA 2

Sobre la segunda semana se desempeñaron labores para los días comprendidos entre fechas del 13 al 18 de septiembre del año en curso, dando paso para pañetes, salida para tomas, mesones, cielo Razo, red sanitaria y puntos hidráulicos, alistado de pisos; llevando labores sobre cuarto de gases en demoliciones de muro en ladrillo y excavaciones pertinentes para adecuaciones del mismo espacio. Esta semana sumo desempeño en actividades enunciadas sobre los ítems 1.2,2.1,3.1,4.2, 5.1, 7.3,7.1,8.1 y 8.2.

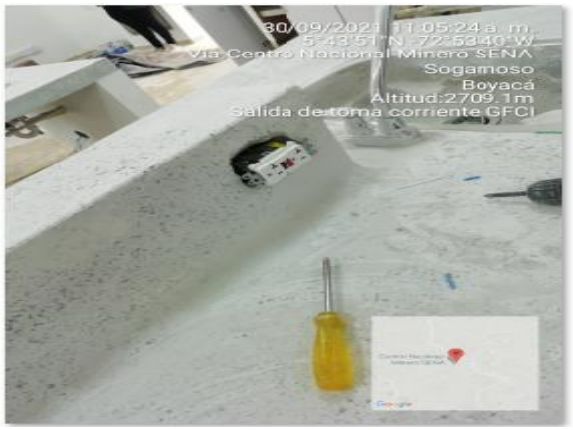









SEMANA 3

Para la tercera semana se desempeñaron para los días comprendidos entre fechas del 20 al 25 de septiembre del año en curso, llevando labores en mesones, pisos, mampostería, pañete y estuco dentro del laboratorio; entablando a su vez mampostería en área de cuarto de gases ejecutando armado y desarrollo de placa maciza en concreto de 3000psi. Esta semana sumo desempeño en actividades enunciadas sobre los ítems 2.1,1.3,8.3,5.1,5.2 y 8.5.









CIVILAGS INGENIERIA	**CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA PROYECTO 8492-SGPS-2021 SENNOVA DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA.**	**CÓDIGO:**
		VERSION: 1
	BITACORA	FECHA:04/10/21

SEMANA 4

Para la cuarta semana para los días comprendidos entre fechas del 27 de septiembre al 4 de octubre del año en curso, se desempeñaron labores en estuco, acabados sobre mesones, cielo Razo, pintura, instalaciones de luminarias, suministro y retiro de lavaplatos, instalación de puertas; para el cuarto de gases se realiza placa base, pañete para el mismo en adecuaciones pertinentes. Esta semana sumo desempeño en actividades enunciadas sobre los ítems 2.1,3.1,4.1,5.1,5.2,5.3,6.1,7.2,8.4 y 8.6. Por consiguiente, se desempeña jornada de aseo y retiro de escombros según lo inducido por el ítem 9.1, en general dando por terminado el ambiente llegando al objetivo principal.









315 738 8988 - 301 790 8043
afg.civilags@gmail.com
Calle 2ª 25 35 Sogamoso Boyacá

CIVILAGS INGENIERIA	**CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA PROYECTO 8492-SGPS-2021 SENNOVA DEL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA.**	**CÓDIGO:**
		VERSION: 1
	BITACORA	FECHA:04/10/21







Firma

Carolina Rojas

Elaboro por parte del contratista

Fecha: 05-10-2021

Firma

Carolina Rojas

Reviso por parte del contratista

Fecha: 05-10-2021

315 738 8988 - 301 790 8043
afg.civilags@gmail.com
Calle 2ª 25 35 Sogamoso Boyacá
