HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL
AERA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N° 1 **DEL:** 08/10/2021 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/10/2021 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 155-2021 **CONTRATISTA:** INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN (INCLUIDO DESMONTE DE LAS PUERTAS EXISTENTES) DE PUERTAS EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE 10 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA UBICAR EN LAS ENTRADAS DE LOS PISOS EN LAS ESCALERAS CENTRAL NORTE Y CENTRAL SUR DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/2021 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10/12/2021 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	x	Prorroga		Aclaraciones técnicas	
Suspendido		Adición		Cambio de especificación	

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		lija	15	pulidora	1	Ingeniero	1
		pintura	3			Instaladores	4
		masilla	1 ,5				
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-)	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,000	$ 0,00


GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	7	53

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

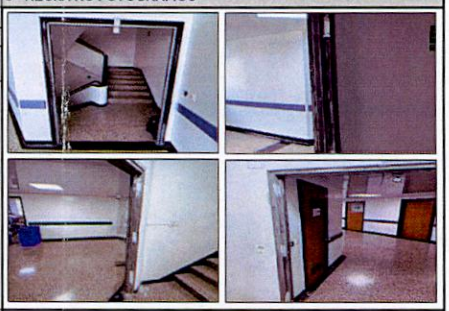

6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES, RESANES, MASILLADO Y LIJADO DE MARCOS PUERTAS DE ENTRADA DE LOS PISOS CENTRAL SUR EDIFICIO PRINCIPAL

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	



8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:

9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	
	INICIAL	ACTUAL
Directos+AIU+IVA	$98.236.584,00	$98.236.584,00
Obras Adicionales		
TOTAL		$98.236.584,00

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Programa de salud ocupacional	
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboró:	Revisó:
JUAN MANUEL NOVOA **Representante Legal** Firma y posfirma	**MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ** **Supervisor ROMPE/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO** Firma y posfirma
