
INFORME SEMANAL 7
GRUPO No. 1


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021





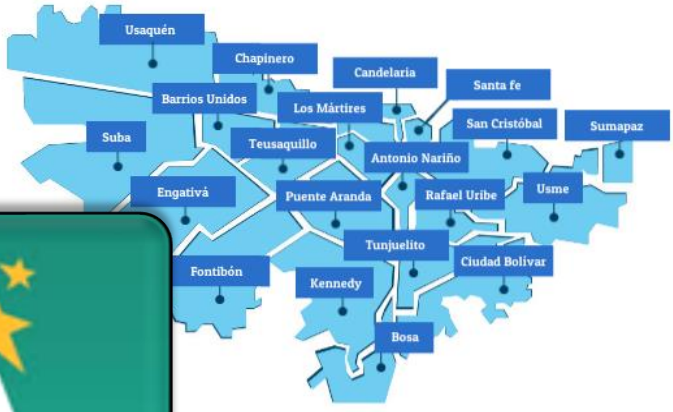

Secretaría del Hábitat

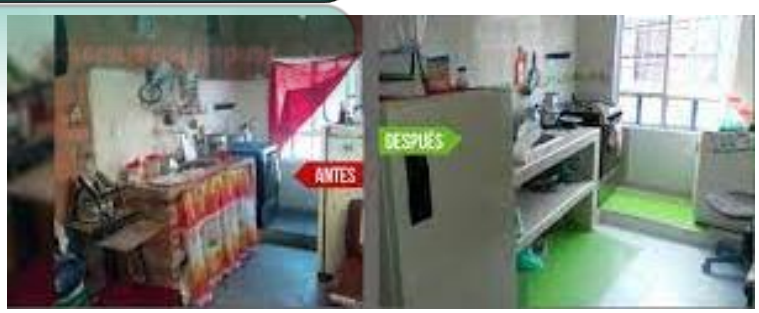

SEMANA 7 DEL 27 DE SEP. AL 03 DE OCT. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN


En este informe ejecutivo, comprendido del 27 de septiembre al 03 de Octubre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la SÉPTIMA semana las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra.

Posterior a la validación de las viviendas en el sector de Habitarte, se inician actividades de ejecución de obra por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** así mismo se inicia la validación en el sector de UNIR (50 viviendas).


Existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur, con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios en el sector de Habitarte.

Se realiza la prueba de instalación de la cubierta a una de las viviendas del sector de Habitarte, esto con el fin de establecer el procedimiento y cumplimiento de la normativa vigente con es la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.

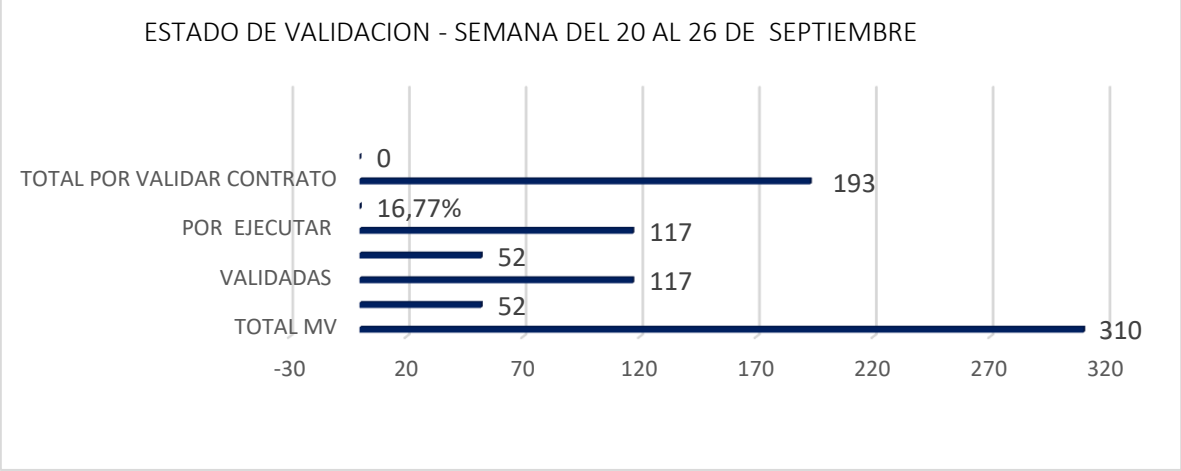

Avance de validaciones realizadas al 3 DE OCTUBRE 2021: **Total 117**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 52**
Validaciones por realizar: **193 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**

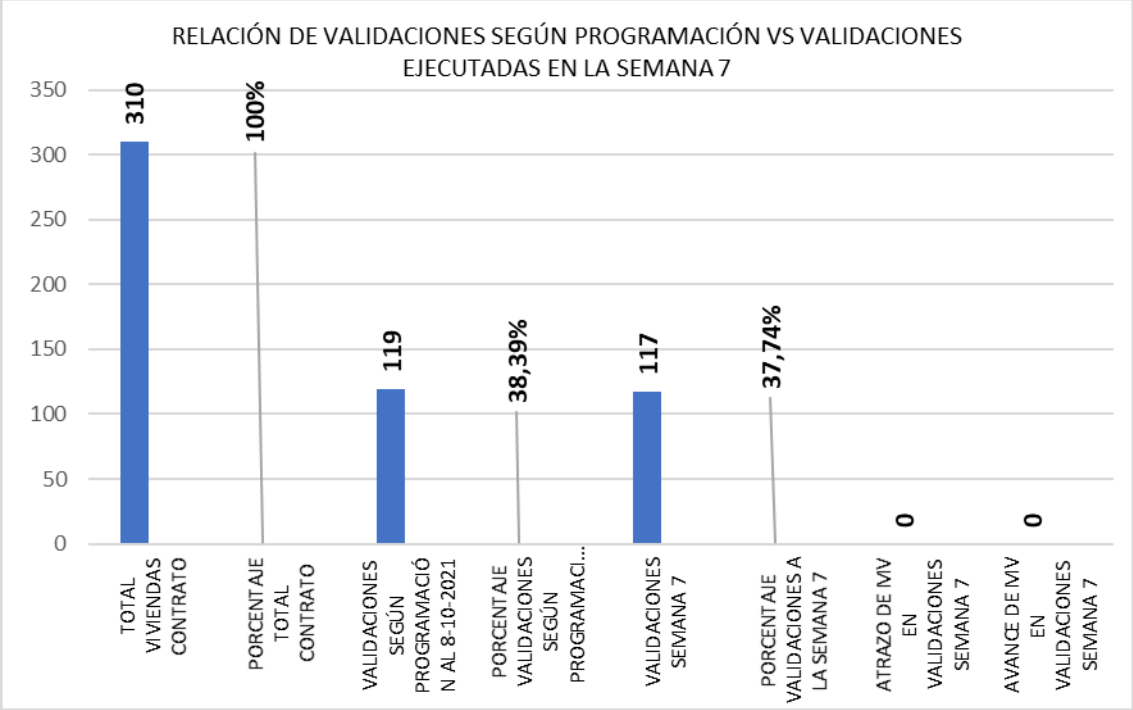

Para el presente informe (semana 7) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en cumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 8 de octubre del 2021 deberá finalizar con 119 validaciones y a la fecha posee 117 validaciones terminadas, teniendo aún tiempo para ejecutar las dos (2) faltantes.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	22	3	0	9	0	16	21,21%	0
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	0	0	3	0,00%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			28	28	25	3	0	9	0	19	10,60%	0

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	20	5	0	10		15	17,84%	0
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0		1	0,00%	0
Subtotal			28	28	22	6	0	10	0	18	5,95%	0

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	0	9	0	0	83,56%	0
		UNIR	50		8	42	0	0	0	50	0,00%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			59	59	17	42	0	9	0	50	41,78%	0

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	15		11	31,27%	
		Urbanización compartir	2		2	0	0	1		1	0,00%	
Técnico Responsable												
Subtotal			28	28	28	0	0	16	0	12	15,63%	0


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	5	0	2	53,57%	0
		Juan Pablo II	13		12	1	0	1	0	12	0,38%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	2	0	4	10,33%	0
Subtotal			26	26	25	1	0	8	0	18	21,43%	0

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		Marandu	7	169	7	0	0	5	0	2	53,57%	0
		Juan Pablo II	98		89	9	0	44	0	54	30,85%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	0	3	0	10	2,58%	0
		Acacias IV	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		UNIR	50		8	42	0	0	0	50	0,00%	0
Subtotal			169	169	117	52	0	52	0	117	17,40%	0

GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 7 DEL 27 de sep. al 03 de Oct.


Para la semana 7, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

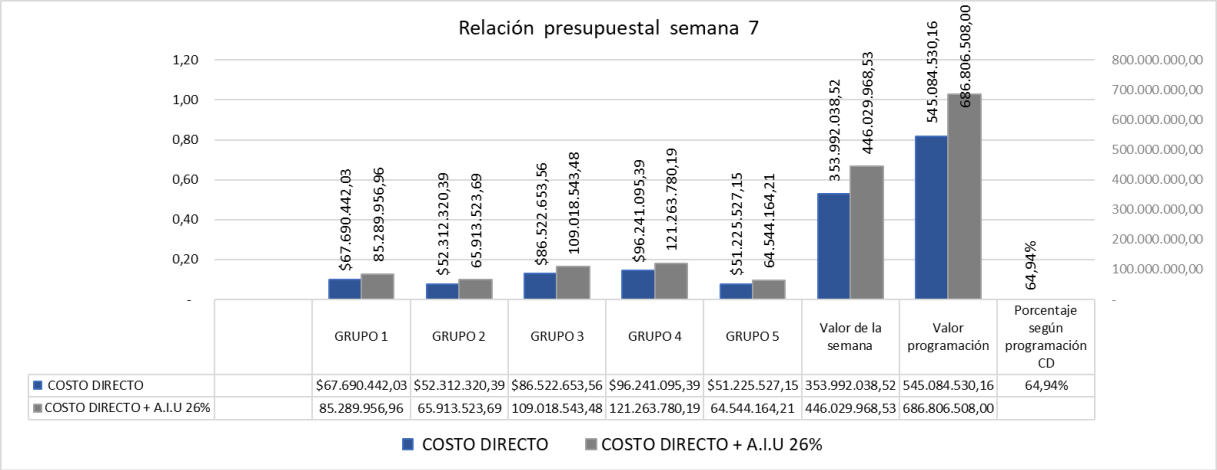

	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	Valor de la semana	Valor programación	Porcentaje según programación CD
COSTO DIRECTO	$67.690.442,03	$52.312.320,39	$86.522.653,56	$96.241.095,39	$51.225.527,15	353.992.038,52	545.084.530,16	64,94%
COSTO DIRECTO + A.I.U 26%	85.289.956,96	65.913.523,69	109.018.543,48	121.263.780,19	64.544.164,21	446.029.968,53	686.806.508,00	

así mismo, el contratista presenta un avance en la ejecución de obra en el costo directo para la semana del 64.94% al presente informe, contemplando que la finalización en la ejecución de las 46 viviendas según la programación es el 21 de octubre del 2021.

En este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra en cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que para el día 21 de octubre de 2021 entregara 46 viviendas, y a la fecha de este informe, se encuentra en ejecución de 52 viviendas.

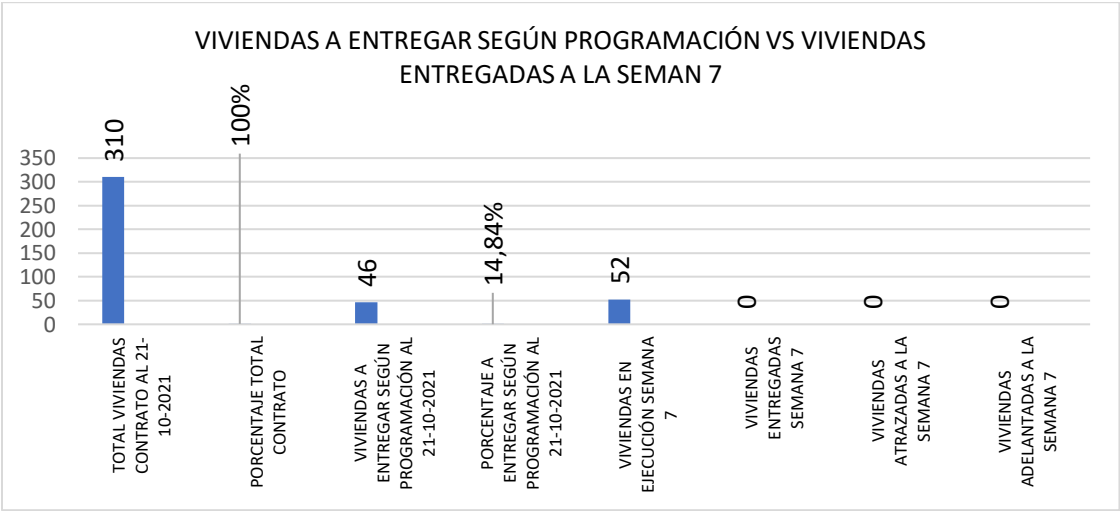

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **3-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	22	3	0	9	0	16	21,21%	0
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	0	0	3	0,00%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**25**	**3**	0	**9**	**0**	**19**	**10,60%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**SEPTIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					**SEMANA DEL 27 AL 3**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 7**
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.684.224,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION		75,57%	**97,73%**
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.016,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION		69,43%	**98,59%**

3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.733.479,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	64,91%	**92,56%**
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO	$ 12.893.657,0	$ 11.427.635,0	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	21,95%	**44,82%**
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO	$ 12.204.961,0	$ 12.204.961,0	10/09/2021	10/10/2021	EN EJECUCION	30,48%	**36,78%**
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI / NO	$ 12.897.510,0	$ 11.186.603,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	13,81%	**27,06%**
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI / NO	$ 12.894.063,0	$ 11.626.077,0	13/09/2021	13/10/2021	EN EJECUCION	43,00%	**60,69%**
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI / NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	32,89%	**35,30%**
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI / NO	$ 12.898.207,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	19,11%	**36,62%**
10	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI / NO		$ 11.864.372,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
11	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI / NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
12	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI / NO		$ 11.797.280,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
13	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI / NO		$ 12.002.565,2			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI / NO		$ 11.887.610,4			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
15	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI / NO		$ 11.489.381,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
16	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI / NO		$ 11.245.957,8			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
17	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI / NO		$ 11.890.753,3			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
18	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI / NO		$ 10.023.595,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
19	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI / NO		$ 9.359.388,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
20	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI / NO		$ 10.799.101,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
21	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.769.237,4			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
22	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI / NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
23	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI / NO		$ 11.021.230,8			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI / NO		$ 11.704.303,9			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
25	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI / NO		$ 12.095.771,5			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
26	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI / NO		$ 11.953.028,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
27	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI / NO		$ 11.612.217,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
28	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI / NO		$ 11.789.319,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. Ingenieros Constructores e Interventores

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	27/09/2021	AL	3/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

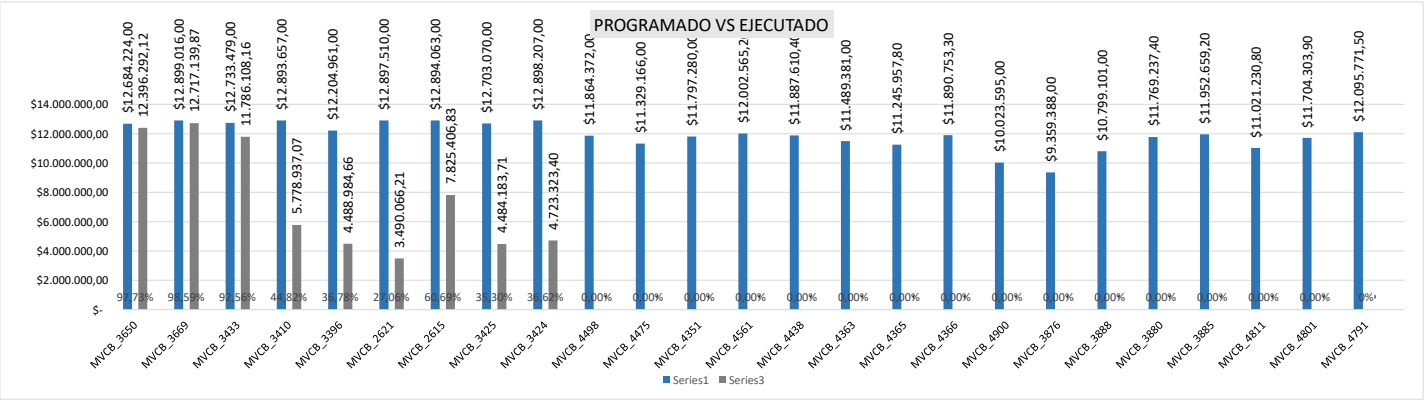

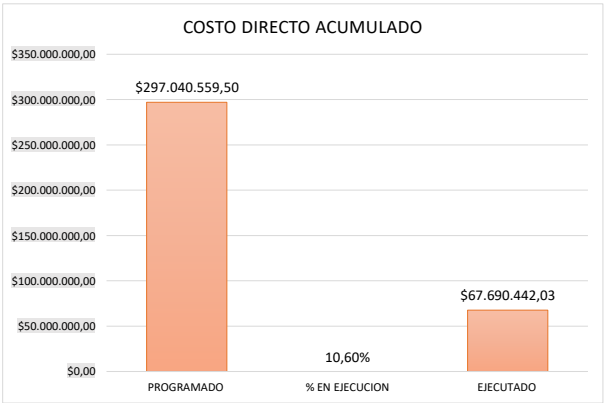

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúan actividades de obra en las nueve (9) casas aperturadas. Se llevó a cabo un comité técnico en la oficina de interventoría junto con el contratista, donde se debatieron temas relacionados con la calidad de los materiales a instalar. Durante el presente período se realizó de validación en siete (7) nuevas viviendas.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

1	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Esta vivienda se encuentra en el 37% de ejecución. Se aplicó pintura vinilo sobre muros de alcoba 3, área de lavandería y hall de cocina. Se terminó enchape de piso en área de lavandería y hall de cocina. Se avanza en enchape cerámico de piso y pared de baño 2. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
2	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	Continua avance de obra. Se terminó la instalación de cerámica de piso en la zona de lavandería. Se demolió mesón de cocina y se levantan mochetas para fundir nuevo mesón. Se hicieron puntos hidrosanitarios para instalación del nuevo lavadero. Se alistó piso en área del baño. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
3	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	La vivienda presenta un bajo rendimiento en avance. Se levantó mocheta y se funde entrepaño de cocina en concreto. Se dejaron requerimientos en bitácora. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
4	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	Esta vivienda se encuentra en el 99% de ejecución. Se terminó la instalación de cerámica de piso en alcoba1, escaleras y hall de acceso. En el área de baño se instaló el cielo raso, combo sanitario. En la zona de lavandería se terminó enchape y se instaló el lavadero. Pendiente instalación de marco y puerta del baño. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
5	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	Vivienda con un 98% de avance en ejecución. Se hicieron requerimientos para corregir enchape en zona de cocina. Se terminó enchape de mesones, paredes y piso en el área de cocina. Se termina aplicación de pintura vinilo en las zonas de sala comedor, alcobas y cocina. Se instaló enchape de pared en zona de lavandería, falta emboquillar. Se termina la instalación de cielo raso en tablilla pvc; faltan remates. En el área de baño se enchapó la pared faltante y se instaló el nuevo sanitario. Pendiente aseo de obra. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. Se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
6	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	Se realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se dejan anotaciones en bitácora del avance de las diferentes actividades. En el área de cocina se terminaron las actividades de enchape de muros, pisos y mesones. Se terminó la instalación de cielo raso en tablilla pvc en las áreas de sala, alcobas y halles. En el área de lavandería se demolió el lavadero existente, se instaló cerámica de piso, se paneta muro y se avanza en instalación de enchape cerámico de pared; se aplicó pintura vinilo sobre muro de lavandería. Se tomaron fotografías para evidenciar el avance de obra.
7	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	Se avanza en actividades de instalación de cielo raso pvc en áreas de alcoba 1 y sala comedor. Se evidenció poco avance de obra.
8	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	Se instaló cerámica de piso en áreas de sala y alcoba 1. Se avanza en aplicación de pintura vinilo en muros de sala, alcoba 1 y hall de acceso. Se efectúa registro fotográfico del avance de obra y se deja constancia en bitácora.
9	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se terminó la instalación de enchape en pisos de sala comedor, cocina, baño, hall de alcobas y alcoba 2. En el área de baño se instaló enchape en pared y se elaboró el bordillo de ducha. de baño. Pendientes remates de pintura. Se deja registro en bitácora de obra y se toman fotografías del avance de actividades.
46	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
47	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
48	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.

49	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
50	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
51	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
52	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
53	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
54	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
81	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 30 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
82	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 30 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
83	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 30 de septiembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
84	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 01 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
85	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 01 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. La vivienda presenta ambientes y áreas en buenas condiciones de habitabilidad. LA BENEFICIARIA EXPRESA QUE TIENE PROBLEMAS CON LA CUBIERTA. Solicita su cambio.
86	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 01 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
87	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 01 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría ajustaron presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas y validadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	4/10/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	4/10/2021
Continuar validaciones y estructuración de presupuestos en las viviendas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	4/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

A la fecha se encuentran aperturadas y con ejecución de actividades de obra, nueve (9) viviendas.

Durante el presente período se hicieron visitas de validación en siete (7) viviendas, que corresponden a cinco (5) en el barrio Juan Pablo II, y dos (2) en la Urbanización Compartir. Se tienen a la fecha un total de 25 viviendas validadas; se encuentran aperturadas y en ejecución de actividades, nueve (9) viviendas.

La mayor parte de la semana se presentó tiempo seco.

Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuran presupuestos y se proyectan actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **3-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	20	5	0	10		15	17,84%	0
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	0		2	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0		1	0,00%	0
Subtotal			**28**	**28**	**22**	**6**	0	**10**	**0**	**18**	**5,95%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**SEPTIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 27 AL 3**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 7**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	**MVCB_4892**	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
2	**MVCB_4644**	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO		$ 12.077.142,10	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	12,00%	**39,00%**

3	**MVCB_4629**	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	8,00%	**27,00%**
4	**MVCB_4628**	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI NO		$ 12.238.468,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	80,00%	**99,00%**
5	**MVCB_4272**	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI NO		$ 11.377.892,80	24/09/2021	24/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**9,00%**
6	**MVCB_4152**	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
7	**MVCB_4689**	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
8	**MVCB_4694**	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI NO		$ 10.770.153,00	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	85,00%	**99,00%**
9	**MVCB_4744**	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI NO		$ 12.024.568,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	45,00%	**93,00%**
10	**MVCB_4732**	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	35,00%	**39,00%**
11	**MVCB_4233**	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**15,00%**
12	**MVCB_4219**	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**10,00%**
13	**MVCB_4401**	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI NO		$ 12.076.903,30			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	**MVCB_4407**	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	12,50%	**16,00%**
15	**MVCB_4929**	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI NO		$ 12.150.294,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
16	**MVCB_4843**	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI NO		$ 11.998.548,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
17	**MVCB_4842**	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
18	**MVCB_4838**	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI NO		$ 11.606.673,70			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
19	**MVCB_2243**	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
20	**MVCB_3839**	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI NO		$ 11.592.989,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
21	**MVCB_3863**	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI NO		$ 11.981.782,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
22	**MVCB_3809**	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI NO		$ 12.198.500,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
23	**MVCB_3803**	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI NO		$ 11.854.190,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
24	**MVCB_3798**	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI NO		$ 12.205.262,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
25	**MVCB_3822**	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI NO		$ 11.991.555,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2											
26	**MVCB_1072**	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO		$ 12.284.986,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
27	**MVCB_0213**	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO		$ 12.154.953,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
ACACIAS IV ETAPA 2											
28	**MVCB_4968**	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	27/09/2021	AL	3/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

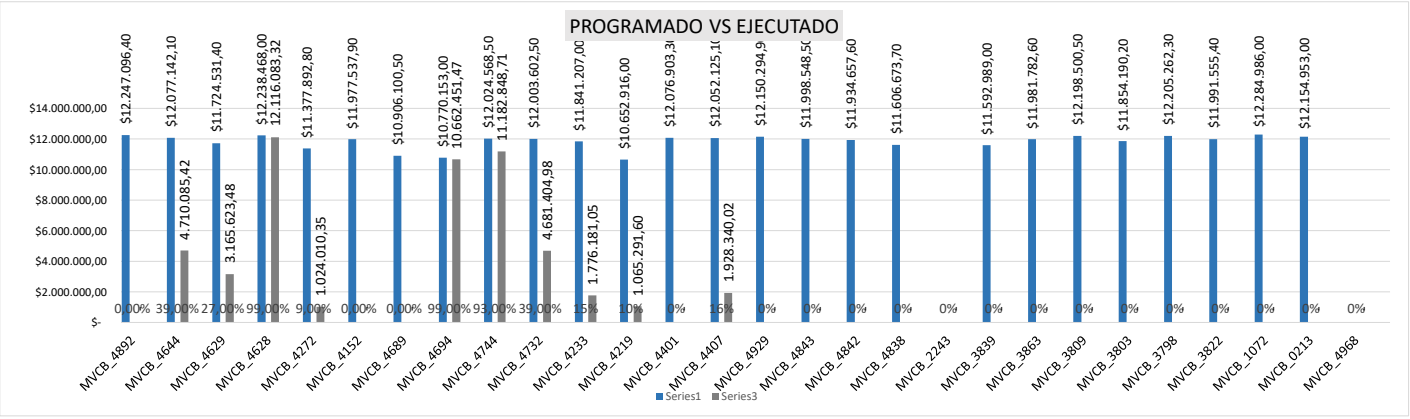

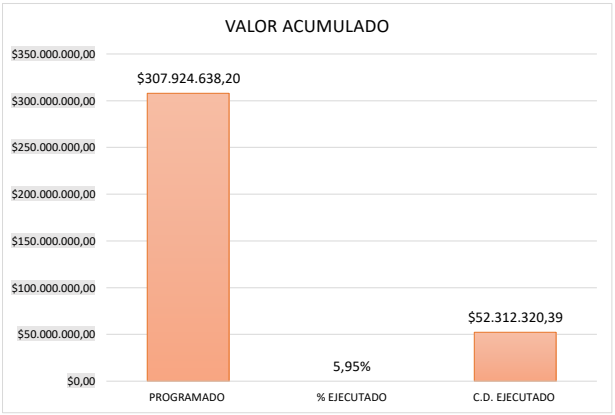

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 28de septiembre se inician actividades de pañete muros en la alcoba 3 El día 29 de septiembre continua actividad de pañetes en alcoba 3. El día 30 de septiembre inicia actividad de pañete muros en la alcoba 2
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 28 de septiembre se realiza enchape muros y mesón cocina El día 29 de septiembre se revisa piso de alcoba del beneficiario reportando una para cambio, adicionalmente se revisa enchape de muros y piso en baño. Se inicia actividad de enchape piso en hall de entrada. El día 30 de septiembre continua actividad de enchape piso en hall y enchape de muros en cocina y se inicia actividad de pintura muros
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 28 de septiembre se verifican actividades y se solicita detallar algunas partes para entrega y la llegada de la puerta. Predio visitado con la secretaria del hábitat . El día 30 de septiembre se realiza visita para solicitar detallar algunas áreas antes de la entrega, se solicita la llegada de puerta y ducha
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 28 de septiembre se solicita cambio de piezas de colores en cocina y se notifica a la oficina de interventoría que el constructor no realizo la búsqueda de piso similar al instalado en alcoba del beneficiario y sala. El día 29 de septiembre se visita el predio con el director de interventoría quien informa que en reunión acordaron aceptar el piso de dos tonos y adicionalmente solicita no dejar la pintura tan rendida para realizar pintura de muros. El día 30 de septiembre continua actividad de enchape de piso en halles e inicia actividad de estuco en muros de de alcoba del hijo del beneficiario El día 1 de Octubre se ve la necesidad de implementar una preparación de superficie en muros de la alcoba de la hija del beneficiario, ya que con la pintura nueva se levanto toda la pintura que se estaba aplicando y realizar estuco y pintura.
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 28 de septiembre se termina enchape piso en alcobas se revisa piso no encontrando ninguna coca, se inicia estuco muros en alcobas 1 y 2 El día 29 de septiembre se realiza pintura muros en alcobas 1 y 2 El día 30 de septiembre no se realizaron actividades ya que la beneficiaria realizo una adecuación en la zona de ropas y no se contaban con áreas libres para trabajar El día 1 de Octubre, se retoman las actividades de pañete muros en zona de ropas y baño.
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 28 de septiembre se revisa piso evidenciando algunas cocas; se solicita cambio. Predio visitado con la secretaria del hábitat; el señor muy difícil de lidiar y alega por todo. El día 29 de septiembre siendo 8;40 am nos presentamos al predio y el beneficiario no se encuentra, se llama he informa que llega después de las 9am para que continúen las actividades de guarda escoba y emboquillada de piso. El día 30 de septiembre se inicia actividad de alistado piso en la tercera alcoba El día 1 de octubre se inicia actividad de picado de muros en cocina y se inicia enchape de muros y picado de muros en baño, demolición de bordillo y ajuste de punto hidráulico en ducha.
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 28 de septiembre se detalla pañete en alcoba y cocina, se realiza alistado de piso en sala y alcoba del beneficiario . El día 29 de septiembre se realiza araña de piso en el baño y se inicia actividad de enchape piso en sala. El día 30 de septiembre continua la actividad de enchape piso en alcoba y hall. El día 1 de octubre se realiza actividad de estuco muros en cocina, se inicia enchape muros en baño y se arma el entrepaño del mesón,
ETAPA II			
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 28 de septiembre se realiza demolición enchape de cocina, baño y zona de ropas, demolición mesón cocina y picado de piso para alistado. El día 29 de septiembre se inicia actividad de alistado piso en alcoba 2 y alcoba1. El beneficiario solicita que no se traslade el punto hidráulico de la cocina sino que le traigan una llave de cuello de ganso de pared, el contratista informa que dirá al subcontratista la solicitud. El día 30 de septiembre se termina el alistado en hall . El día 1 de octubre llega material de enchape e inician actividad de enchape piso

12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 28 de septiembre se termina pañete en taller alcoba de la madre de la beneficiaria y se inicia pañete en hall. El día 29 de septiembre se termina la actividad de pañete en la habitación de la beneficiaria y pañetes en hall se esta rematando. El día 30 de septiembre se realiza pañete muros en zona de la escalera. El día 1 de Octubre se inicia pañete muros en zona de la cocina
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 28 de septiembre se inicia estuco muros en alcobas 1. El 29 de septiembre se realiza estucado de muros en alcoba 2, se informa al maestro áreas a enchapar y el beneficiario solicita que no se realice actividad de cielo raso sino que se contemple dejar el enchape de piso de la alcoba principal. El 30 de septiembre se realiza alistado de cerdo en alcoba 1 y alcoba 2. El 1 de octubre se inicia alistado de piso en cocina y sala.
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.
20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 se realiza validación del predio
21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	El día 22 se realiza validación del predio
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 22 se realiza validación del predio

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reunión de interventoría y constructora para definir temas de interés para interventoría	Interventoría y constructora	27/09/2021-
Visita de la secretaria del hábitat	Hábitat	28/09/2021
Reunión de la Secretaria del hábitat con directores de constructora e interventoría en oficina del sector que se esta interviniendo.	Hábitat, constructora e interventoría	29/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 27 de septiembre día soleado.

El día Martes 28de septiembre soleado con vientos, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .


El día Miércoles 29 de septiembre mañana soleada y tarde nublada con lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Jueves 30 de septiembre día nublado con vientos fuertes y lluvias en la tarde, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Viernes 1 de octubre día soleado , no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4842 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de cocina	

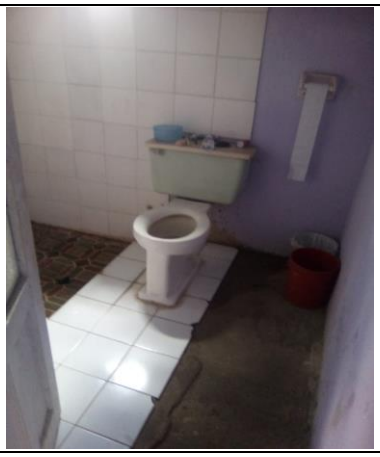

FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de baño	



FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de alcoba	



FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de cubierta	



FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de cubierta	



FECHA	Jueves 23 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alcoba de beneficiario	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4233 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Martes28 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Inicia actividades de estucado muros en alcoba 1	



FECHA	Miercoles 29 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Estuco de muros alcoba 2 y hall	




FECHA	Jueves 30, de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso en alcoba1	



FECHA	Jueves 30, de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso en alcoba2	



FECHA	Viernes 1 de octubre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso sala-cocina	

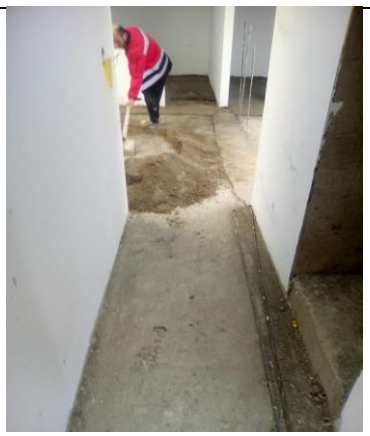

FECHA	Viernes 1 de octubre del 2021
DESCRIPCION	
Alistado de piso hall	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4407 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Martes 28 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Inicia pañete muos en hall	



FECHA	Miercoles 29 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Pañete muros alcoba de la beneficiaria	



FECHA	Miercoles 29 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Continua pañete muros en hall	



FECHA	Jueves 30 de septiembre del 2021
DESCRIPCION	
Inicia pañete muros en escalera	



FECHA	Viernes 1 de octubre del 2021
DESCRIPCION	
Pañete muros en cocina	



FECHA	Viernes 1 de octubre del 2021
DESCRIPCION	
Pañete muros en cocina	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**3-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	0	9	0	0	83,56%	0
		UNIR	50		8	42	0	0	0	50	0,00%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			**59**	**59**	**17**	**42**	0	**9**	**0**	**50**	**41,78%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 27 AL 3
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			SEMANA 7
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION		59,99%	99,57%
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO		$ 11.211.390,00	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION		69,43%	99,00%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO		$ 11.927.560,50	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION		58,67%	98,00%

4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO		$ 12.087.004,90	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	44,96%	80,42%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO		$ 12.289.771,00	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	21,80%	60,42%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	51,69%	77,71%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	33,43%	71,93%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO		$ 12.059.809,40	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	18,69%	67,47%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO		$ 9.602.199,70	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	65,45%	97,55%
BARRIO UNIR II											
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40				0,00%	0,00%
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO		$ 9.707.226,00			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50				0,00%	0,00%
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO		$ 10.814.060,70			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO		$ 9.765.458,80				0,00%	0,00%
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO		$ 11.422.010,10			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO		$ 11.764.713,90			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00				0,00%	0,00%
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO		$ 11.150.820,20			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO		$ 11.271.883,80			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70				0,00%	0,00%
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60				0,00%	0,00%
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO		$ 11.935.867,00			EN VALIDACION	0,00%	0,00%
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40				0,00%	0,00%
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO		$ 9.870.988,30				0,00%	0,00%
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00				0,00%	0,00%

27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60				0,00%	0,00%
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60				0,00%	0,00%
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30				0,00%	0,00%
30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00				0,00%	0,00%
31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20				0,00%	0,00%
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90				0,00%	0,00%
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00				0,00%	0,00%
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00				0,00%	0,00%
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00				0,00%	0,00%
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10				0,00%	0,00%
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00				0,00%	0,00%
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80				0,00%	0,00%
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60				0,00%	0,00%
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50				0,00%	0,00%
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80				0,00%	0,00%
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00				0,00%	0,00%
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50				0,00%	0,00%
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80				0,00%	0,00%
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50				0,00%	0,00%
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40				0,00%	0,00%
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90				0,00%	0,00%
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00				0,00%	0,00%
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50				0,00%	0,00%
50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60				0,00%	0,00%

51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20				0,00%	0,00%
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50				0,00%	0,00%
53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00				0,00%	0,00%
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10				0,00%	0,00%
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00				0,00%	0,00%
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00				0,00%	0,00%
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00				0,00%	0,00%
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20				0,00%	0,00%
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60				0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	7	DEL	**27/09/2021**	AL	**3/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

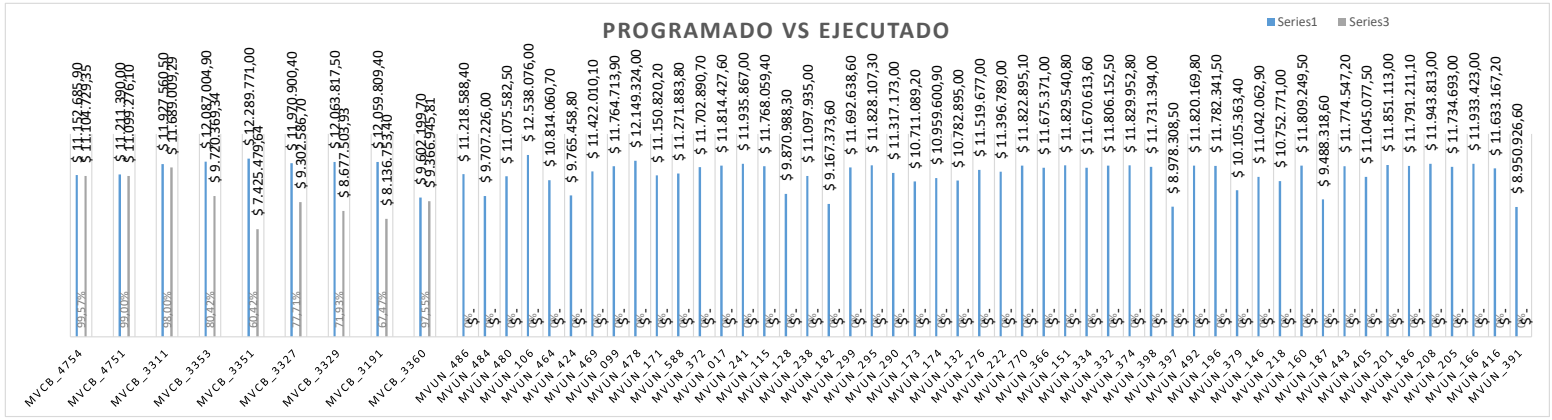

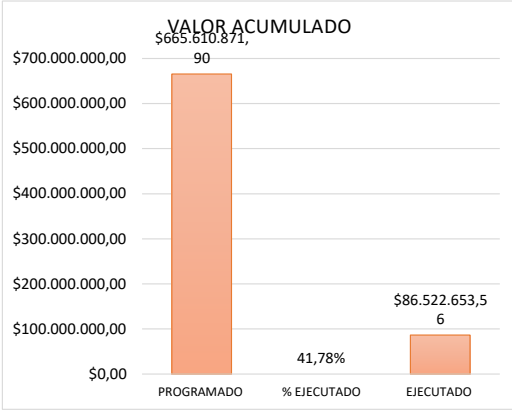

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Cielo raso,Instalacion de Puerta de Madera Baño
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Estuco areas de cocina y Baño,Instalacion de Puerta de madera baño,Combo sanitarios,Lineales en granito,
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Aplicación de estuco y Pintura Habitaciones y Cocina,Instalacion de lavadero,Enchape muro Patio de ropas
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Instalacion de Combo sanitario,Cielo raso,Estuco Sala
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Enchape de piso Ceramico sala,Estuco.Enchape cocina y Baño
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Enchape de piso Ceramico Sala,Meson de Cocina,Instalacion de Lavadero,Estuco y Pintura Habitaciones y Sala,
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Enchape de piso Ceramico Habitaciones,Aplicación de Pintura Blanca,Hall y Enchape cocina
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Piso Ceramico cocina,enchape cocina y Baño,Estuco Hall

9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Estuco y Pintura en areas de Cocina y Hall,
BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
1	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
2	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
3	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
4	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
5	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
6	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial

7	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
8	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	20/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se aprobado presupuestos iniciales para determinar Actas de Mayores o menores

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :


En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3351 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)

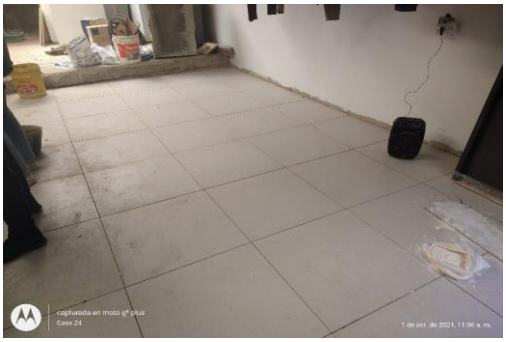

viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Baño



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Baño



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Cocina



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Fundicion Meson en Concreto

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3329 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Suministro e instalación de Piso Ceramico Habitacion



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Suministro e instalación de Piso Ceramico Habitacion



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Enchape Ceramico Pared Baño



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Enchape Ceramico Pared Cocina



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Suministro e instalación de Piso Ceramico Hall



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Suministro e instalación de Piso Ceramico Hall

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3191 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso ceramico Area Cocina



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape muro y Meson cocina



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pisos Habitacion 1



viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pisos Habitacion 1

viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Demolicion de Enchape Meson existente

viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Demolicion de Enchape Muro existente

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **3-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	15		11	31,27%	
		Urbanización compartir	2		2	0	0	1		1	0,00%	
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**16**	**0**	**12**	**15,63%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**SEPTIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 27 AL 3**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 7**

BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO		$ 12.079.596,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	40,00%	**65,00%**
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO		$ 11.947.615,50	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	60,00%	**92,00%**
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI / NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI / NO		$ 12.169.719,00	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	80,00%	**95,00%**
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI / NO		$ 12.149.156,80	27/09/2021	27/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**56,00%**
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI / NO		$ 11.701.628,10	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	80,00%	**95,00%**
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI / NO		$ 11.769.775,40	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	80,00%	**95,00%**
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI / NO		$ 11.326.716,60	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	65,00%	**82,00%**
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI / NO		$ 11.528.955,20	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	40,00%	**75,00%**
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.792.129,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.676.457,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI / NO		$ 12.027.750,70			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI / NO		$ 12.884.127,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI / NO		$ 11.678.378,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI / NO		$ 11.386.359,00	30/09/2021	30/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI / NO		$ 11.687.008,20			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI / NO		$ 11.887.405,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI / NO		$ 11.878.089,50	20/09/2021	20/10/2021	EN EJECUCION	20,00%	**47,00%**
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI / NO		$ 11.904.933,20	20/09/2021	20/10/2021	EN EJECUCION	30,00%	**74,00%**
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI / NO		$ 11.888.710,30	30/09/2021	30/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI / NO		$ 12.028.047,20	29/09/2021	29/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**12,00%**
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021	29/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**5,00%**
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI / NO		$ 11.196.334,10			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60	29/09/2021	29/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**20,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO		$ 11.547.979,00	30/09/2021	30/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		$ 10.062.877,30			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	27/09/2021	AL	3/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

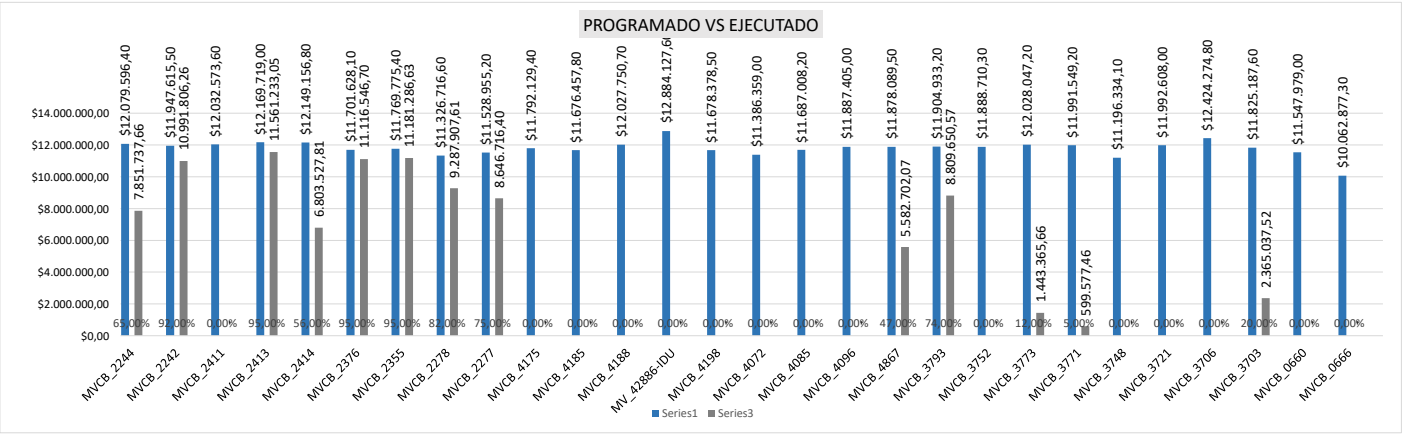



4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: instalación de enchape de muro en baño, pintura de muros en alcobas. Se hizo entrega parcial de alcoba 2 - piso 2 a satisfacción de la beneficiaria. Se demuestra muy poco avance de obra en la vivienda a lo largo de la semana.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Enchape de mesón de cocina, instalación de enchape de muros y piso de cocina y baño, aplicación de estuco en muros de habitación, sala y hall, Instalción de lavadero, instalación de sanitario en baño. Se demuestra poco avance de obra en la vivienda a lo largo de la semana.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	Vivienda aperturada el día lunes 27 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han realizado las siguientes actividades de obra: Desmonte de cubierta y su estrucutura, instalación de perfilería metalica para la cubierta, instalación de chanfles y tejas arquitectónicas de todo el área a intervenir.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Se terminó instalación de enchape de piso en alcoba piso 1, se terminó instalación de cielo raso en todo el área del piso 3, a falta de entrega de luminarias LED a propietarios.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Alistado de piso en alcoba e instalación de enchape de este espacio, demolición de mesón y pañete de muro de cocina, preparación de muro para pañete y enchape de cocina, fundición de mesón y enchape del mismo. Pintura de muros en alcoba y hall. Lavadero y puerta de baño evidenciados en la vivienda para su respectiva instalación.
7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Hasta la fecha del presente informe se han terminado actividades de obra en la vivienda, a falta de la instalación de la puerta de baño.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Hasta la fecha del presente informe se han terminado actividades de obra en la vivienda. Día jueves 30 de septiembre se le solicita al contratista cambiar piezas de enchape de muro de baño debido a mala ejecución durante su instalación. Viernes 1 de osctubre, se cambiaron dichas piezas y fueron revisadas y aprobadas a satisfacción. El muro posterior de la vivienda presenta humedad proviniente del terreno, se le informa a beneficiaria que dicho muro se entrega sin garantía debido a este problema.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Hasta la fecha del presente informe se han terminado actividades de obra en la vivienda, a falta de la instalación de la puerta de baño.
10	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Instalación de enchape de piso en alcobas, hall y comedor. Enchape de muros de baño patio de ropas y cocina, enchape de meson de cocina. Se solicita a maestros cambiar piezas de enchape de piso de diferentes tonos en alcobas.
11	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros en alcobas, alistado de piso en alcobas. Enchape de piso en alcoba, enchape de muro en zona de lavadero, estuco en muros de alcobas.
12	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día jueves 30 de septiembre de 2021. Los beneficiarios realizaron modificaciones solicitadas previamente a la ejecución de obras a satisfacción.
13	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día miercoles 29 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros en alcobas y hall.
14	MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día jueves 30 de septiembre de 2021. Los beneficiarios realizaron modificaciones solicitadas previamente a la ejecución de obras a satisfacción.

15	MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
16	MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día miercoles 29 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de pisos en todo el área. Se solicita a beneficiarios arreglar red eléctrica ya que se funden los bombillos.
17	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
18	MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Se realiza segunda visita de validación el día miercoles 29 de septiembre de 2021 en compañía del director de interventoría. Se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
19	MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día miercoles 29 de septiembre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de muro de baño para ampliación, demolición de mochetas de cocina y desmonte de lavaplatos, pañete de muros en hall, alcoba y cocina, regatas en muros para tuberías eléctricas e hidraulicas, tubería hidrosanitaria en cocina y baño.
20	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
21	MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
22	MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
23	MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	Se hace visita de apertura el día jueves 30 de septiembre de 2021 e inicio de actividades de obra el día viernes 1 de octubre de 2021. Los beneficiarios aún no realizan modificaciones solicitadas.
24	MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
25	MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Se realiza visita de validación el día viernes 24 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
26	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Se realiza visita de validación el día martes 28 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
27	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Se realiza visita de validación el día martes 28 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.
28	MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Se realiza visita de validación el día jueves 30 de septiembre de 2021, se hace medición del predio y ajuste de presupuesto.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A lo largo de la semana se ha realiado visitas de apertura e inicio de actividades de obra en siete (7) predios del barrio Juan Pablo II para un total de dieciséis (16) viviendas en ejecucuión. También se realizó visita de apertura en las viviendas faltantes del frente, para un total de veintiocho (28) presupuestos validados.	Residentes de interventoría y de contratista	27/09/2021-

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

Miercoles 29 de septiembre de 2021: MVCB_2414 Se retrasan actividades en cubiertas debido a lluvia.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2277 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	miércoles, 22 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de muro de cocina y preparación de piso	



FECHA	lunes, 20 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Instalación de enchape de piso	



FECHA	viernes, 24 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Aplicación de pintura en muros	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2278 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR




FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de muros y mesón de cocina	



FECHA	martes, 28 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Istalación de lavadero	



FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Llave de paso de lavadero	

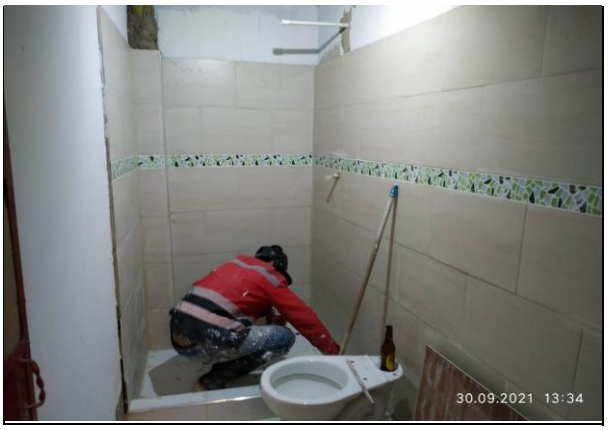

FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Instalación de enchapes y sanitario en baño	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_2214 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Desmonte de tejas e instalación de estrucutra metálica	



FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Teja arquitectónica a instalar	

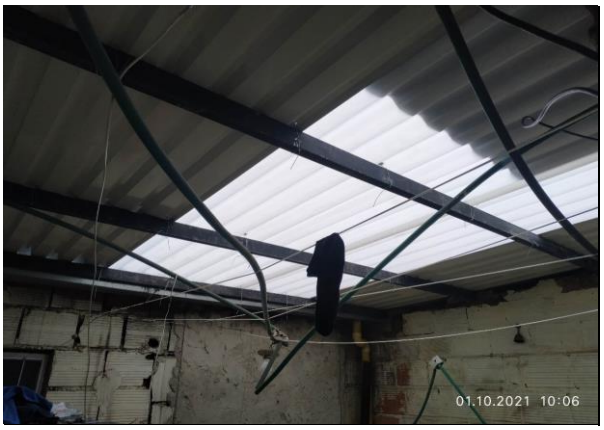

FECHA	viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Teja traslúcida instalada en patio	



FECHA	viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Escaleras empleadas para la ejecución de cubiertas	



FECHA	viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Amarres de teja a estructura	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2242 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR




FECHA	viernes, 1 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso en alcoba piso 1	



FECHA	martes, 28 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Láminas de cielo raso en PVC presentes en la vivienda	



FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Cielo raso instalado en área de 3 piso	

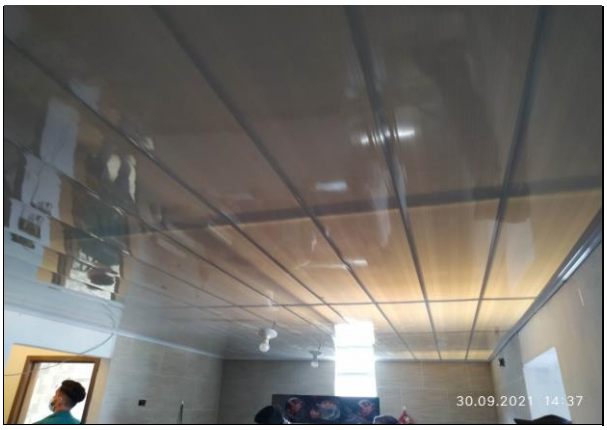

FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Cielo raso instalado en área de 3 piso	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**3-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Camila Giraldo Jimenez	Marandu	7	26	7	0	0	5	0	2	53,57%	0
		Juan Pablo II	13		12	1	0	1	0	12	0,38%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	2	0	4	10,33%	0
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	0	**8**	**0**	**18**	**21,43%**	**0**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEPTIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 27 AL 03
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 7**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	70,00%	82,00%

4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO		$ 11.811.116,20	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	85,00%	93,00%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO		$ 11.941.531,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	25,00%	54,00%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 9.757.539,80	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	50,00%	60,00%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO		$ 11.884.972,10	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	75,00%	86,00%
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29			VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50	24/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO		$ 11.197.949,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO		$ 12.940.470,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO		$ 11.528.505,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO		$ 11.926.026,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	5,00%	34,00%
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO		$ 11.809.681,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	5,00%	28,00%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	7	DEL	27/09/2021	AL	3/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

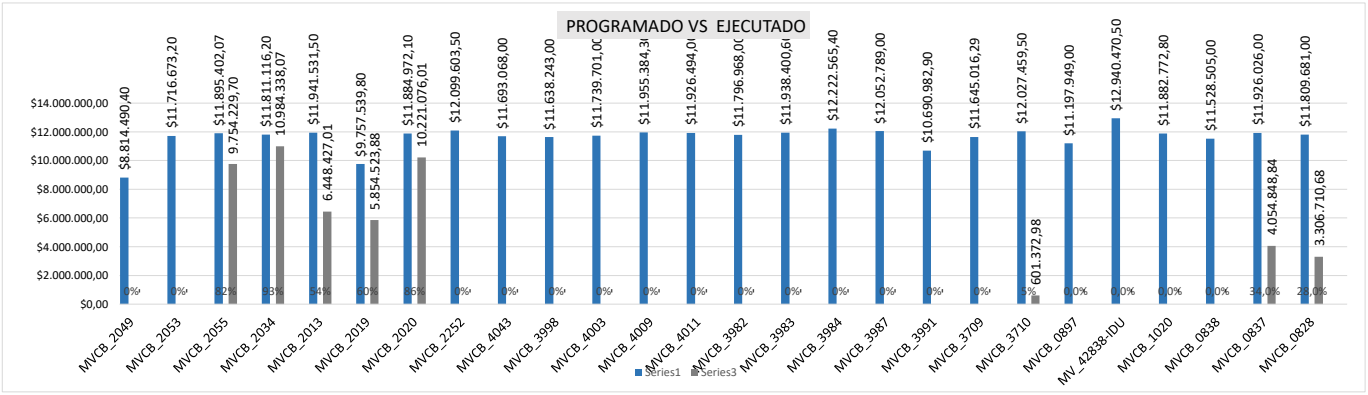

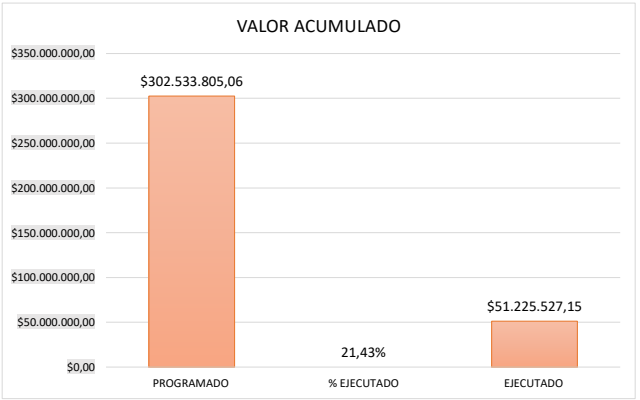

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU			
1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en aplicación de estuco general, se finaliza enchape de cocina y baño. Se inicia con imtervencion en zona de lavado.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia que se finaliza intervencion en zonas de primer piso (Cocina, baño, hall de acceso y sala) Se continua con intervecion en habitacion con actividad de enchape de piso y aplicación de estuco.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en zonas comunes, hall y habitacion, se realiza pañete en zona de lavado y construccion de meson de cocina.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia instalacion de enchape de piso en cocina, se realiza instalacion de lavadero y se finaliza construccion de meson de cocina.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia que se finaliza actividades en cocina, enchape de escaleras y sala.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
6	MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza validacion de la vivienda el dia 30/09/2021. En la cual se prioriza intervencion de pisos en general. Se evidencia en visita de validacion el mal estado de la cubierta a lo que se le informa a la beneficiaria la posible intervencion de esta sin embargo ella y su hijo manifiestan que realizaran los arreglos de la cubierta mas adelante y que dsean se realice la intervencion en pisos y arreglo de cocina.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
7	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza validacion de la vivienda el dia 28/09/2021. En la cual se evidencia baño en excelente estado por tal motivo no se realizara ninguna intervencion en este, se prioriza cocina, zona de lavado, habitaciones con actividades de pañete y pisos en general.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MV_42838-IDU









FECHA: 28/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza visita de validacion en la vivienda donde se prioriza intervencion en cocina, zona de lavado, pañete, pintura y enchape de pisos en general.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_0837





FECHA: 30/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de enchape de piso en habitaciones y preparacion de muros.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_0828





FECHA: 30/09/2021

DESCRIPCIÓN: Se inicia con pañete en baño, sala y hall de acceso.

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

MVCB_4629 JORGE ANDRÉS JIMÉNEZ bajo acta se acuerda con beneficiario las siguientes actividades: enchape de pisos en todas las zonas de la vivienda, cambio de combo sanitario y puerta de baño, con respectivo enchape en paredes, construcción de mesón nuevo enchapado y enchape de paredes de esta, adecuación de puntos hidráulicos y enchape de salpicadero en zona de lavado, actividad de pintura en zona de cocina, baño, patio y alcoba #4, dejando claro que esta última actividad se ejecutará siempre y cuando los muros no tengan humedad. El beneficiario adquiere el compromiso de tener los espacios en que se ejecutarán las obras disponibles.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante esta semana se realizaron las siguientes validaciones:

RELACIÓN DE VALIDACIONES HABITARTE

28/09/2021 MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA
28/09/2021 - MV_42886_IDU. MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO,
28/09/2021 - MVCB_4198. LUCIO CIFUENTES VEGA,
29/09/2021 - MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.
30/09/2021 - MVCB_4175. MARÍA ELSY MAYORCA RODRÍGUEZ.
30/09/2021- MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.
30/09/2021 MVCB_3987 AURA MARÍA BUSTAMANTE DE LÓPEZ
30/09/2021- MVCB_0474: MABEL ASTRID LÓPEZ GÁMEZ.
30/09/2021- MVCB_4900: MARTHA TERESA MEJÍA CASTRO,
1/10/2021- MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS.
1/10/2021- MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZÓN CÁRDENAS
1/10/2021- MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ.
1/10/2021- MVCB_3876: HERNANDO CALDERÓN CIFUENTES

RELACIÓN DE VALIDACIONES UNIR


28/09/2021 - MVUN_ 106: CANDE DE JESÚS ESPITIA LÓPEZ,
28/09/2021 - MVUN_ 464: TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,
28/09/2021 - MVUN_ 484: PEDRO IGNACIO PLAZAS,
28/09/2021 - MVUN_ 171: DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,
30/09/2021 - MVUN_ 469:JUVENAL MELO PINZÓN,
30/09/2021 - MVUN_ 099: FERNANDO MORENO MARIÑO,
30/09/2021 - MVUN_ 588: AMIRA PÉREZ CORTES,
30/09/2021 - MVUN_ 241: MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ,

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron socializaciones en ninguno de los territorios.

PQR

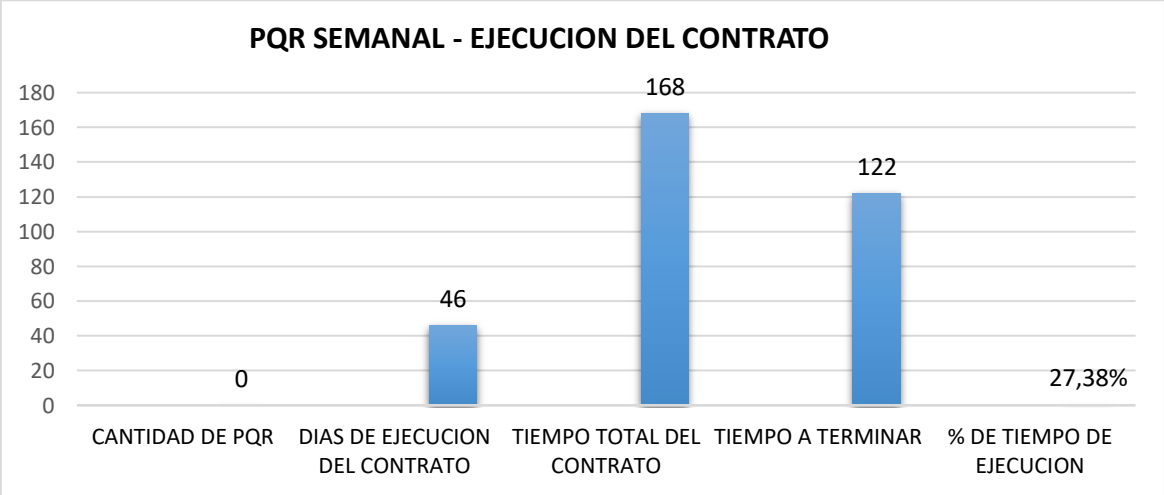

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 46 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA	26/09/2021	**PERIODO No.**	6	DEL	**20/09/2021**	AL	**26/09/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
VALIDACIONES REALIZADAS
28/09/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** URBANIZACIÓN COMPARTIR Se realiza proceso de validación y caracterización social
28/09/2021 - **MV_42886_IDU. MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
28/09/2021 - **MVCB_4198. LUCIO CIFUENTES VEGA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
29/09/2021 - **MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.** Atiende la visita su hermano autorizado YESID SIMBAQUEBA AFRICANO, entrega fotocopias de documentos de identidad y carta de autorización.
30/09/2021 - **MVCB_4175. MARÍA ELSY MAYORCA RODRÍGUEZ.** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
30/09/2021- **MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
30/09/2021 **MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ** Se realiza proceso de validación y caracterización social
30/09/2021- **MVCB_0474: MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
30/09/2021- **MVCB_4900: MARTHA TERESA MEJIA CASTRO**, Se realiza visita de validación social y tecnica. recibe visita Cuñada Autorizada **NUBIA NANCY CARRETO.** Se brinda la información pertienete al proyecto, autorizada no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
VALIDACIONES FALLIDAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
27/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
29/09/202 **- MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS:** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
29/09/2021- **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Recibe visita autorizado (padre) **RAFAEL REYES VANEGAS TOVAR**, Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y reco

29/09/2021- **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
30/09/2021 - **MVCB_3752: Jesús ANTONIO LÓPEZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
30/09/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
30/09/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA.** Se hace contacto teléfonico con su hijo JOSE MARTÍNEZ para darle a conocer las recomendaciones ya que la beneficiaria es una persona de la tercera edad. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
30/09/2021 **MV-42838-IDU DECIDERIO MAYORGA** el beneficiario refiere que no puede estar pendiente el fin de semana de las obras por lo cual solicita se aperture desde el dia lunes 4 de octubre de 2020
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
27/09/2021- **MVCB_0828 AMPARO UTELIA APONTE.** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiaria no se encuentra al momento de la visita, maestro reporta que la beneficiaria tiene dudas sobre algunas actividades de obra, se realiza claridad que escaleras no se intervienen.
27/09/2021- **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se resuelven dudas al beneficiario sobre actividad de estuco y pintura en areas de la vivienda, via telefonica con el tecnico encargado de la vivieda.
27/01/2021- **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMIDIO,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiario se encuentra conforme con las obras no presenta dudas,
27/09/2021- **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se observa personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria no refiere dudas y/o inconformidades con el avance.
27/09/2021- **MVCB_2019 CLARA MARÍA RESURRECCIÓN LOPEZ,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área socia, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL** TORRES Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021- **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiario solicita dar prioridad en obras en 2 piso. No refiere dudas. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades.
27/09/2021- **MVCB_2034: AMINTA SABOGAL,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiara reporta tener un altercado el dia sabado 25/09/2021 con uno maestro, se escala situación para dar seguimiento y llamado de atención al personal.
28/09/2021- **MVCB_3669: GABRIELA MUÑOZ:** Se realiza visita de seguimiento a la obra social y técnica. Atiende la visita la autorizada **ÍNGRID PAOLA GARAVITO** Refiere conformidad con los avances de obra, solicita dar prioridad a las obras de debido a que arrendataria se encuentra en dieta por maternidad.

28/09/2021- **MVCB_ 3650. MARTHA NUBIA POSADA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria manifiesta inconformidad con la instalación del mesón existente en cocina ya que falta asegurarlo y rematar actividades en el área.
28/09/2021- MVCB_ 3433. ELENA MOJICA DE GUTIÉRREZ: Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se resuelven dudas a beneficiaria, quien muestra conformidad con los avances en las obras. Se evidencian maestros ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_ 3396 ÁNGEL ESTELA MENDOZA.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades. Se evidencia maestros ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_2615 CARMEN CECILIA BLANCO:** Se realiza visita social y técnico de seguimiento a la obra. Beneficiaria se encuentra en cita médica, no reportó dudas y/o inquietudes. Personal de obra ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Atiende la visita social y tecnica decontratista e interventoria el autorizado **STIVEN HERREÑO.** Se realiza seguimiento de obra, el encargado del predio refiere conformidad con las actividades que se están ejecutando. Pendiente compromiso re ubicar puntos de gas y corte de puerta
28/09/2021- **MVCB_ 3425. PABLO ANTONIO CUERVO.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades, se solicita priorizar zona de baño. Se evidencian maestros en obra.
28/09/2021- **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES**. Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria expresa inconformidad por demoras en la obra. Se solicita al contratista priorizar obras.
28/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra. Se observa personal de obra en la casa.
28/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra. El hijo de la beneficiaria refleja felicidad por las labores constructivas; los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia
28/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente.
28/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra en compañía de la secretaria del hábitat, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
28/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad.
28/09/2021 - **MVCB_3329: HECTOR ZAMBRANO.** Se realiza visita de seguimiento, Beneficiario indicaciones conformidad con los avances constructivos. No manifiesta dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_3191 DORA ALBA RUBIO.** Seguimiento en el cuál se evidencia maestros ejecutando actividades de obra, beneficiaria expresa conformidad con el rendimiento de los maestros. No refiere dudas y/o inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad por las labores constructivas, indica dudas técnica la cual se resuelve por los técnico. Se observa personal de obra en el predio.
28/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA

28/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,SEGUIMIENTO , SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA.
28/09/2021 - **MVCB_ 4629: JORGE ANDRES JIMENEZ,** SEGUIMIENTO, SE EXPLICA AL BENEFICIARIO NUEVAMENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO , EL BENEFICIARIO MUESTRA INCONFORMIDAD POR NO TENER GARANTIAS DE LOS PISOS , POR ESTADO DE CUBIERTA.
29/09/2021-M**VVB_4233:BEATRZ CORREDOR:** LA BENEFICIARIA MANIFIESTA AL AREA TECNICA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ACTIVIDAD DEL PVC POR POSIBLRES GTERASEN LA CUBIERTA
29/09/2021-M**VVB_4219: MAURCIO MARTIN** ,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO.
29/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA
29/09/2021 - **MVCB_ 4407 GLORIA STELLLA ALARCON,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO
29/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad.
29/09/2021- **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, se evidencia maestro, sin embargo no se refleja mayor avance en las obras.
29/09/2021-**MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, La beneficiaria indica conformidad con el avance. Se observa personal de obra en el predio.
29/09/2021- **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, se realiza recomendación frente a remates en muro, pendiente puerta para entrega de vivienda
29/09/2021**- MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora **LAURA SÁNCHEZ**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, Se observa maestros en ejecutando actividades. No se reportan dudas.
29/09/2021- **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria,Se evidencia terminación de actividades, pendiente puerta para entrega.
29/09/2021- **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia terminación de obras, pendiente puerta para entrega de vivienda.
29/09/2021- **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes
29/09/2021- **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. no se evidencia avances en las obras. Beneficiario no se encuentra en la vivienda.
29/09/2021 - **MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
29/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
29/09/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
29/09/2021 - **MVCB_ 3191** :**DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando
29/01/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS**
29/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat

29/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
29/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
29/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION** LOPEZ RODRIGUEZ Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021- **MVCB_ 4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ:** se realiza visita de seguimiento a la obra con técnicos y sociales del contratista e interventoría, beneficiario se encuentra despejando áreas para interveni demas areas de la vivienda. No refiere dudas y/o inconformidades.
30/09/2021- **MVCB_ 3433. ELENA MOJICA DE GUTIÉRREZ**. Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencia personal ejecutando actividades. Beneficiaria satisfecha con avances.
30/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,EL BENEFICIARIO AVANCES EN OBRA
30/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA
30/09/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ, SEGUMIENTO ,** SE EVIDENCIA ANVANCE EN OBRAS
30/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN DE ACABADOS
30/09/2021_**MVCB_4272: NIEVES LIZARAZO** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
30/09/2021_**MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** SE EVIDENCIAS AVANCES EN OBRA
01/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad y alegría por las labores adelantadas
01/10/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra. El hijo de la beneficiaria refleja felicidad por las labores constructivas; los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
01/10/2021 - **MVCB_4072:** La encargada indica que solo hay un maestro y no han traído material
01/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Recibe visita autorizado (padre) RAFAEL REYES VANEGAS TOVAR, se observa personal de obra en el predio y conformidad por parte de la familia.
01/10/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,SEGUIMIENTO , SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA.

01/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE REALIZA ENTREGA DE ESPACIOS: COCINA , BAÑO , HABITACIONES.
01/10/2021_**MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** SE EVIDENCIAS AVANCES EN OBRA
01/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
01/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
01/10/2021 - **MVCB_ 4754: ALBERTO HUESO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
01/10/2021 - **MVCB_ 4751: MARIA LIGIA SOTO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda, atiende la visita hijo **DIEGO SOTO.**
01/10/2021 - **MVCB_ 3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario no se encontraba al momento de la visita se deja anotacion en la bitacora de las actividades de obra ejecutadas.
01/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **LETICIA CASTRO.**

01/10/2021 - **MVCB_ 3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **RUBIELA GOMEZ.**
01/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, el hijo encargado del predio **DUVAN BARRIOS** no se encontraba al momento de la visita se dejan anotación en bitacora de las actividades que se estan ejecutando
ENTREGAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
NO SE PRESENTARON ENTREGAS
RENUNCIAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
no se realizaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
28/09/2021 **- MVUN_ 106: CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 464: TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIS HENAO,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 484: PEDRO IGNACIO PLAZAS,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 171: DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 469:JUVENAL MELO PINZON,**Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 099: FERNANDO MORENO MARIÑO,**Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 588: AMIRA PEREZ CORTES,**Validación sin novedad, atendio visita **JUAN CARLOS CASTILLO** hijo de beneficiaria se cuenta con carta de autorización
30/09/2021 **- MVUN_ 241:MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ,** Validación social realizada, pendiente validación componente tecnico.
APERTURAS

No se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
BARRIO O TERRITORIO
JUAN PABLO ll
HISTORIAS DE VIDA
MVCB_3793: WILSON MORACAICEDO: Postulada historia de vida.
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE
MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMENEZ bajo acta se acuerda con beneficiario las siguientes actividades: enchape de pisos en todas las zonas de la vivienda, cambio de combo sanitario y puerta de baño, con respectivo enchape en paredes, construcción de mesón nuevo enchapado y enchape de paredes de esta, adecuación de puntos hidráulicos y enchape de salpicadero en zona de lavado, actividad de pintura en zona de cocina, baño, patio y alcoba #4, dejando claro que esta última actividad se ejecutará siempre y cuando los muros no tengan humedad. El beneficiario adquiere el compromiso de tener los espacios en que se ejecutarán las obras disponibles.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

SEMANA 7 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE		
VALIDACIONES		
Validación. MVCB__4175. MARÍA ELSY MAYORCA RODRÍGUEZ Desarrollo Juan Pablo II	**VALIDACIÓN, MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO, COMPARTIR**	**VALIDACION MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DESARROLLO JUAN PABLO II**
		
Validación. MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MV_42886_IDU. MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_4198. LUCIO CIFUENTES VEGA. Desarrollo Juan Pablo II**
		

VALIDACIÓN, MVCB_0474: MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ. COMPARTIR	VALIDACIÓN, MVCB_4900: MARTHA TERESA MEJIA CASTRO. COMPARTIR	VALIDACIÓN, MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS, JUAN PABLO II
		
VALIDACIÓN, MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ., JUAN PABLO II	VALIDACION, MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES, JUAN PABLO II	VALIDACIÓN, MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS, JUAN PABLO II
		
VALIDACIONES DESARROLLO UNIR II		

Validación. MVUN_ 106: CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ. Desarrollo UNIR II	Validación. MVUN_ 464: TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIS HENAO. Desarrollo UNIR II	Validación. MVUN_ 484: PEDRO IGNACIO PLAZAS Desarrollo UNIR II
		
Seguimiento de obra.MVCB_ 0837: RAMIRO QUINTERO Desarrollo Urbanizacion compartir	**Seguimiento de obra. MVCB_ 2020 BLANCA CUSTODIA MORENO Desarrollo Marandu**	**Seguimiento de obra.MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO Desarrollo Juan Pablo II**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS					
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021															
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															

MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021															
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021															
MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021															
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															

MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															

MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021															
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															

MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 7. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

A la fecha del informe No. 7 se entrega el plan de calidad ajustado y es remitido a la Secretaría Distrital del Hábitat

Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	27/09/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	7
HASTA	3/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, a continuación, un resumen de ellas:

1. Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Inducción al personal operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y se realiza divulgación de protocolo de bioseguridad en las viviendas, en compañía de la interventoría.
3. También se hace entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios en las viviendas aperturadas.
4. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizan charlas de SST, y se continúa verificando el uso de la guarda de seguridad de las pulidoras.
5. Se realizan charlas sobre posturas adecuadas, y uso permanente del tapabocas, al personal operativo, y charla de distanciamiento social en aplicación del protocolo de bioseguridad.
6. Se realiza prueba de cambio de cubiertas en acompañamiento de la secretaria de hábitat y la interventoría, se realizan cambios en el borrador según el seguimiento al procedimiento de cambio de cubiertas arquitectónicas, para radicación de documento final a interventoría. Se evidenció por interventoría acto inseguro el día 01 de octubre en el procedimiento de la instalación de cubiertas, por lo que se realizó charla a trabajadores y a la coordinadora de alturas.
7. Se realizaron recargas de kit de bioseguridad en las viviendas aperturadas de acuerdo a necesidad y gasto realizado y evidenciado en las visitas.
8. Se realizo implementación de protocolo de bioseguridad en las validaciones del territorio UNIR II.

9. Se realiza alistamiento de documentación para entrega de viviendas.
10. Se adquirieron los elementos faltantes y de reemplazo del botiquín para el PAC
11. Se realizo comité de obra en las instalaciones del PAC en compañía de la secretaria de hábitat e interventoría.

Se hace el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, y se está en la revisión de afiliaciones al SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo que ingreso esta semana. Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente.

INTERVENTORIA
Se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios, así como las que están en ejecución. Se verifico actividad de instalación de cubiertas encontrando actos y condiciones inseguras que fueron informadas al contratista para que tome la respectivas acciones, se evidenció presencia de Coordinador de alturas, sin embargo, no se le noto liderazgo para evitar que estas acciones se presentaran dejando hacer a los obreros las actividades incumpliendo normas de trabajo seguro; el compromiso de no acceder a 1.50 no se cumplió y los trabajadores se ubicaron en el último escalón de la escalera y por otra parte se subieron en los perfiles llegando a superar los 1.50 y no usaron ningún tipo de medida preventiva, solo hasta que la interventoría tomo las acciones necesarias para frenar la actividad y que se corrigiera mediante charla a los involucrados. No ofrece garantía la persona que esta realizando la actividad de supervisión para evitar trabajo en altura. El personal SST del contratista se desplaza al área de la instalación de la cubierta y toman acciones correctivas a los hallazgos hacen llamados de atención y charlas de sensibilización. Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo. Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto delos kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas. Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 11 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y afiliaciones al día.
2. CAPACITACION contratista
Inducción al personal operativo que ingresa - sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad, Charlas sobre posturas adecuadas, uso permanente de tapabocas, distanciamiento social

2.1 CAPACITACION Interventoría

La interventoría recibió información sobre "Tres factores que te ayudaran a tomar decisiones mas seguras" Ubicación, proximidad, Tiempo.

Se envió información vía WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS.

3. Gestión Ambiental

Los escombros generados en las casa cercanas a terminación, se hará la recolección previo a la entrega final, para dejar soporte fotográfico y registro de firmas con el beneficiario.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**0**		
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**12**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**18**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las validaciones y Aperturas de Vivienda a los beneficiarios y maestros.
Se reviso en las visitas a los mv, el uso de las guardas de seguridad en las pulidoras, se anexa registro fotográfico
Se hace seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros, y se les recarga el kit de bioseguridad a necesidad
Se adquieren materiales faltantes botiquín para el PAC.

El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**3984**	37,25	3,5	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**6344**	56,85	7	**1232**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**11664**	102,26	26,17	**4064**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2. Condiciones y Acciones Substandar

4.2.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Personal no hace uso de los EPP	Se informa al contratista para su corrección, se dan indicaciones al involucrado sobre el uso correcto de EPP.	NO

2	Se encuentra al trabajador en una altura mayor a 1.50 mts sobre la estructura de la cubierta, en prueba de instalación, sin EPP de alturas.	Se hace llamado de atención, se detiene la actividad, el SST del contratista hace charla de sensibilización y sugiere trabajo seguro, coordinador de altura no muestra liderazgo sobre el tema.	Se detuvo la acción.

5. Registro Fotográfico	
CHARLA DE SEGURIDAD	**REFUERZO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL**
	
MVCB 2013	**MVCB 2019**
CHARLA INTERVENTORIA	**CHARLA INTERVENTORIA**
	
CIUDAD BOLIVAR	**CIUDAD BOLIVAR**

RECARGAS KIT DE BIOSEGURIDAD	
	
MVCB 4628	**MVCB 4744**
RECARGAS KIT DE BIOSEGURIDAD	
	
MVCB 4628	**MVCB 3424**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	83	3984	6,0	0,0		2,75	0,00	34,50	0,00	37,25			0	0					
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	3,50			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
				97	**4656**	**6**	**0**	**0,0**	**6,25**	**0,00**	**34,50**	**0,00**	**40,75**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	4.656
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	7.576
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	15.728
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	40,75
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	63,85
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	128,43

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	12
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	18
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO, CHARLAS SOBRE USO DE TAPABOCAS, POSTURAS ADECUADAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SENSIBILIZACION DE PROTOCOLO				
	MV 2414	**MV 4744**	**MV 3410**	**MV 2020**
La interventoría recibió información sobre "Tres factores que te ayudaran a tomar decisiones mas seguras" Ubicación, proximidad, Tiempo. Se envió información via WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS.				

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
4	SST	Personal no usa EPP adecuado y falta reposición de guantes	1		24/09/2021		PROFESIONAL SST CONTRATISTA	
5	SST	Personal trabajando sobre los perfiles de la cubierta, durante la prueba de instalación, no cuenta con medidas de control, ni EPP para altura superior a 1.50, coordinador de altura no exige cumplimiento.	1	1	1/10/2021	1/10/2021	Coordinador de altura y SST del contratista	  

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	**5,00**
TOTAL ACCIONES CERRADAS	**4,00**

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	70	0	0	0	83	1	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**70**	**84**	**0**	**83**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI			SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI			SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI			SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI			SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI			SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI			SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI			SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI			SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI			SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI			SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI			SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI			SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI			SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI			SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI			SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI			SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI			SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI			SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI			SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI			SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI			SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI			SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**70**	**60**	**0**	**83**	**1**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3425		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2278		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3424		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2615		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD TRABAJADOR SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		


REGISTRO FOTOGRAFICO




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4744		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUIMIENTO DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN EL MV SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3396		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3424		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3425		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3327		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3410		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	USO DE TAPABOCA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3424		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4628		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3327		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3410		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4272		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REPOSICION DE TAPABOCAS SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4629		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN PRUEBA DE CUBIERTA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		





MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CORRECCIÓN ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN PRUEBA DE CUBIERTA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		

	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**19 septiembre de 2021**	**PERIODO**	**MES 1**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E															
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E															
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E															
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E															
Verificacion diaria de los elementos de bioseguiridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E															
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E															
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E															
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E																
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E															
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E															
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E															
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS						FECHA		19 septiembre de 2021										PERIODO		MES 1			
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E															
Inspeción camilla	Contratista								P				p				p				p				p
Inspección Extintores	Contratista								P				P				P				P				P
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E																
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
							E		E	E															
diligenciamiento del formato recogida de escoombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista																								
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista					P																			
						E																			
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista																								
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	11	18	13	13	12	19	12	12	12	19	12	12	12	19	11	11	11	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	10	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,91%	88,89%	92,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		89,66%		46,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				93,88%				21,05%				0,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	24,45%																							
