
INFORME SEMANAL 8
GRUPO No. 1


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021





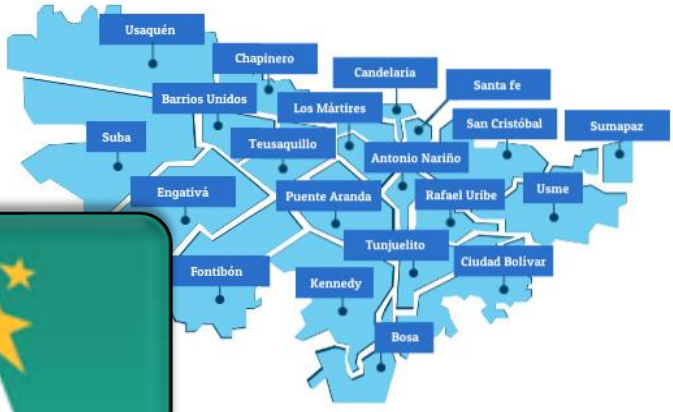

Secretaría del Hábitat

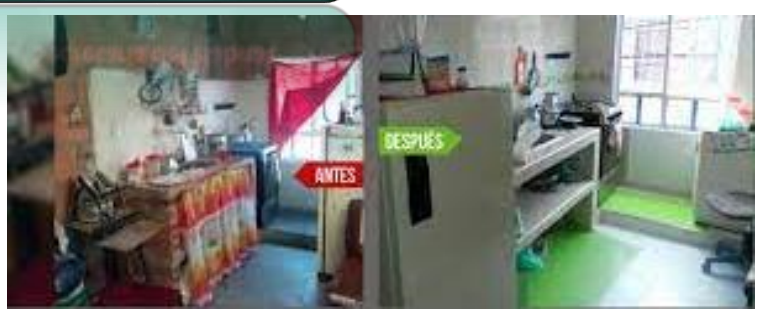

SEMANA 8 DEL 04 DE OCT. AL 10 DE OCT. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN


En este informe ejecutivo, comprendido del 04 de OCTUBRE al 10 de Octubre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la OCTAVA semana las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra.

Posterior a la validación de las viviendas en el sector de Habitarte, se inician actividades de ejecución de obra por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** así mismo se inicia la validación en el sector de UNIR (50 viviendas) así como la apertura e inicio de actividades de obra.


Existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur (HABITARTE), y en (UNIR) aún no se ha instalado, estos puntos con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios en el sector de Habitarte.

Se realiza la prueba de instalación de la cubierta a una de las viviendas del sector de Habitarte, esto con el fin de establecer el procedimiento y cumplimiento de la normativa vigente con es la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.

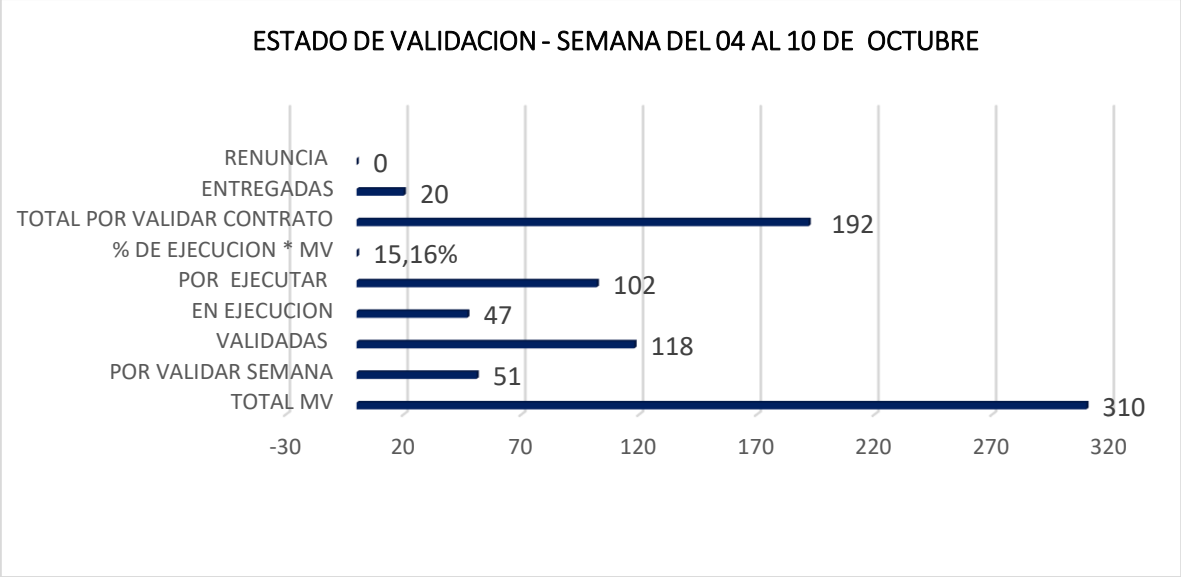

Avance de validaciones realizadas al 10 DE OCTUBRE 2021: **Total 118**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 47**
Validaciones por realizar: **192 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**
Entregadas**: 20**

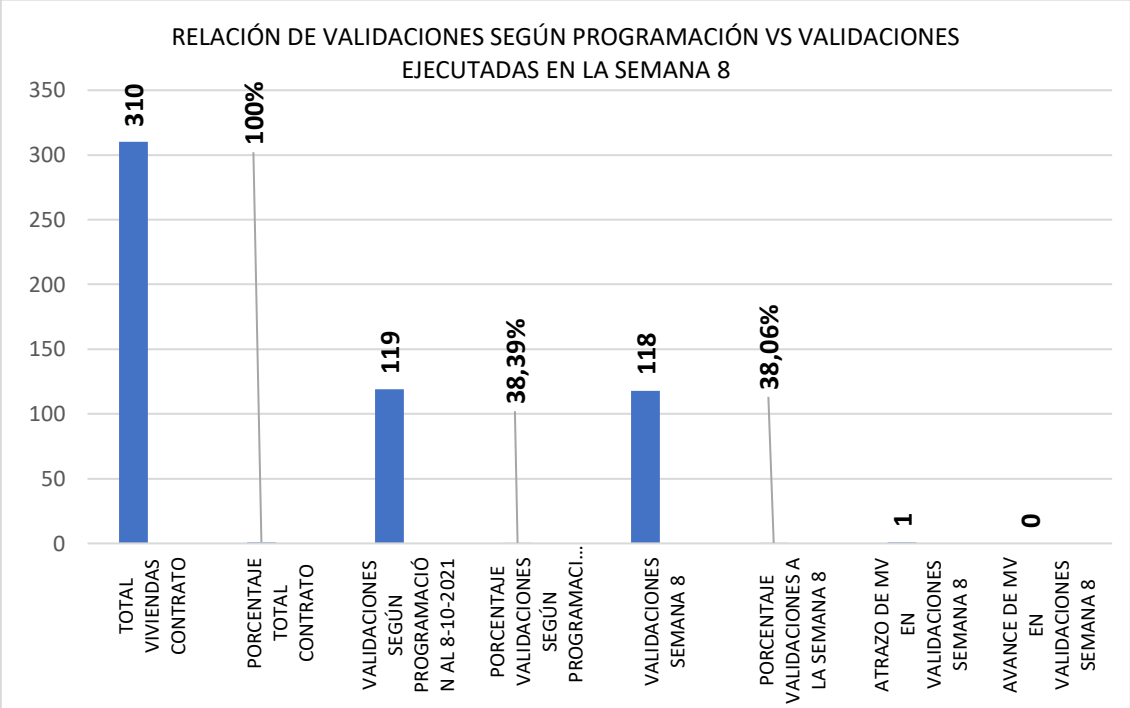

Para el presente informe (semana 8) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en incumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 8 de octubre del 2021 deberá finalizar con 119 validaciones y a la fecha posee 118 validaciones terminadas, lo que indica que está con un faltante de una (1) vivienda por validar.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	23	2	0	9	4	12	29,17%	4
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	1	0	2	0,00%	0
Técnico Responsable					0	0	0					0
					0	0	0					0
Subtotal			**28**	**28**	**26**	**2**	0	**10**	**4**	**14**	**14,59%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	20	5	3	8	3	14	27,56%	3
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	1	0	1	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
												0
Subtotal			**28**	**28**	**22**	**6**	0	**9**	**3**	**16**	**9,19%**	**0**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	2	4	5	0	99,12%	5
		UNIR	50		8	42	0	3	0	47	0,00%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3				0	0	0					0
					0	0						0
Subtotal			**59**	**59**	**17**	**42**	0	**7**	**5**	**47**	**49,56%**	**5**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	12	5	9	43,12%	5
		Urbanización compartir	2		2	0	0	1	0	1	17,50%	0
Técnico Responsable												0
												0
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**13**	**5**	**10**	**30,31%**	**5**


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	2	3	2	67,86%	3
		Juan Pablo II	13		12	1	0	1	0	12	3,54%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	5	0	1	27,50%	0
												0
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	0	**8**	**3**	**15**	**32,97%**	**3**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		Marandu	7	169	7	0	0	2	3	2	67,86%	3
		Juan Pablo II	98		90	8	5	34	17	47	40,50%	17
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	0	8	0	5	11,25%	0
		UNIR	50		8	42	0	3	0	47	0,00%	0
		Acacias IV	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**169**	**169**	**118**	**51**	**5**	**47**	**20**	**102**	**23,92%**	**20**

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA

RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 8 DEL 04 de Oct. al 10 de Oct.


Para la semana 8, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

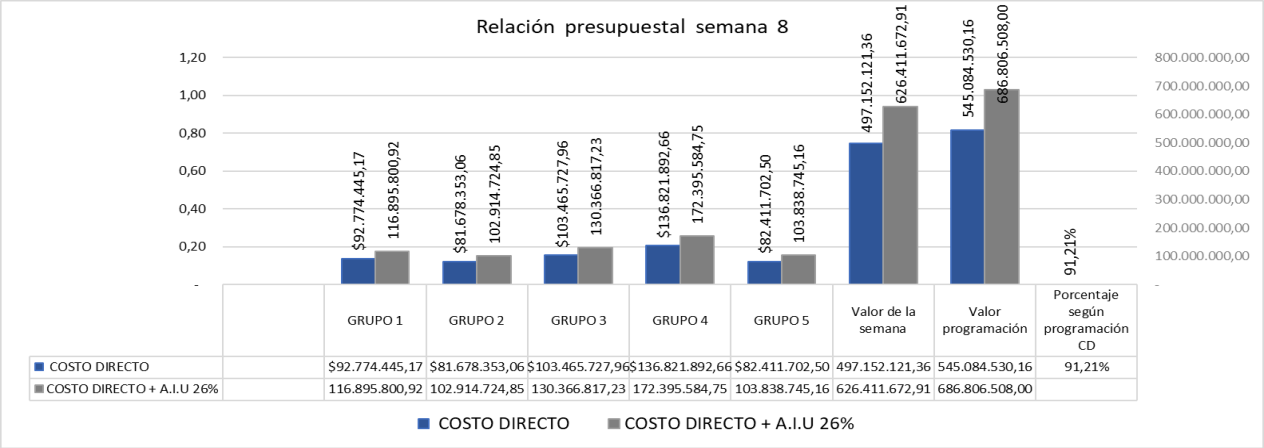

		GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	Valor de la semana	Valor programación	Porcentaje según programación CD
COSTO DIRECTO		$92.774.445,17	$81.678.353,06	$103.465.727,96	$136.821.892,66	$82.411.702,50	497.152.121,36	545.084.530,16	91,21%
COSTO DIRECTO + A.I.U 26%		116.895.800,92	102.914.724,85	130.366.817,23	172.395.584,75	103.838.745,16	626.411.672,91	686.806.508,00	

así mismo, el contratista presenta un avance en la ejecución de obra en el costo directo para la semana del 91.21% al presente informe, contemplando que la finalización en la ejecución de las 46 viviendas según la programación es el 21 de octubre del 2021.

En este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra en cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que para el día 21 de octubre de 2021 entregara 46 viviendas, y a la fecha de este informe, se encuentran entregadas 20 viviendas y en ejecución de 47 viviendas.

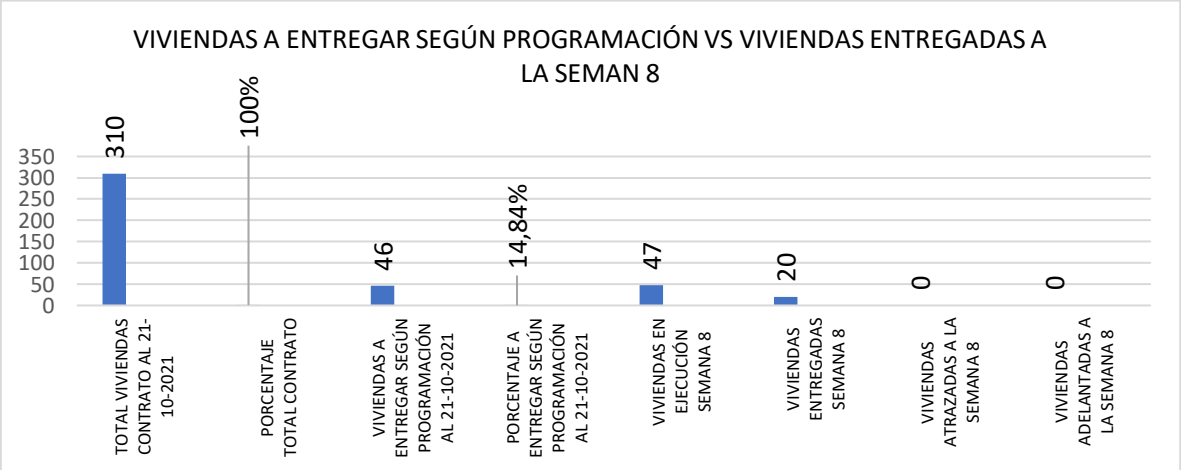

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **10-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	23	2	0	9	4	12	29,17%	4
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	1	0	2	0,00%	0
Técnico Responsable					0	0	0					0
					0	0	0					0
Subtotal			**28**	**28**	**26**	**2**	0	**10**	**4**	**14**	**14,59%**	**4**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL												
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 4 AL 10	
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 8**	
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	97,73%	100,00%	
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	98,59%	100,00%	
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	92,56%	100,00%	

4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO		$ 11.427.635,0	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	44,82%	69,95%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	10/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	36,78%	100,00%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI / NO		$ 11.186.603,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	27,06%	58,88%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI / NO		$ 11.626.077,0	13/09/2021	13/10/2021	EN EJECUCION	60,69%	78,38%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI / NO		$ 10.707.871,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	35,30%	70,94%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI / NO		$ 10.902.052,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	36,62%	51,10%
46	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI / NO		$ 11.864.372,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
47	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI / NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
48	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI / NO		$ 11.797.280,0	7/10/2021	6/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
49	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI / NO		$ 12.002.565,2	7/10/2021	6/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
50	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI / NO		$ 11.887.610,4	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
51	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI / NO		$ 11.489.381,0	6/10/2012	5/11/2012	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
52	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI / NO		$ 11.245.957,8			VALIDADA	0,00%	0,00%
53	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI / NO		$ 11.890.753,3			VALIDADA	0,00%	0,00%
83	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI / NO		$ 10.023.595,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
84	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI / NO		$ 9.359.388,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
85	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI / NO		$ 10.799.101,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
86	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.769.237,4			VALIDADA	0,00%	0,00%
87	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI / NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	0,00%
88	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI / NO		$ 11.021.230,8				0,00%	0,00%
89	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI / NO		$ 11.704.303,9				0,00%	0,00%
90	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI / NO		$ 12.095.771,5			VALIDADA	0,00%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
54	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI / NO		$ 11.953.028,0	8/10/2021	7/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
81	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI / NO		$ 11.612.217,0			VALIDADA	0,00%	0%
82	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI / NO		$ 11.789.319,0			VALIDADA	0,00%	0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	8	DEL	**4/10/2021**	AL	**10/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

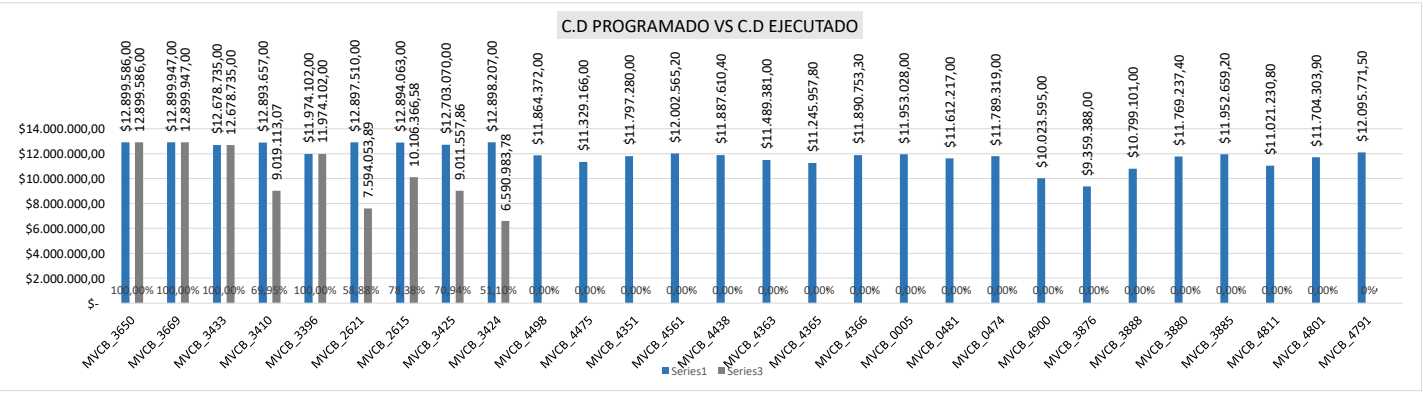

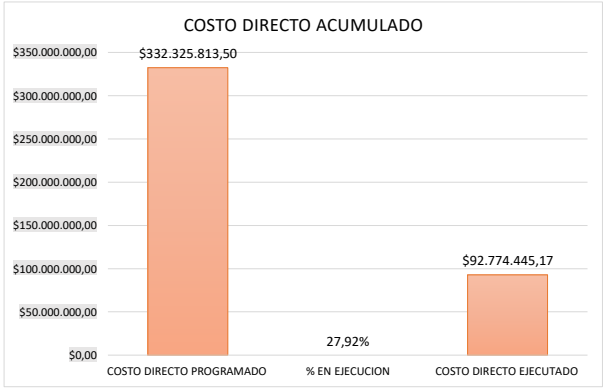

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Se terminaron actividades proyectadas y se entregaron cuatro (4) viviendas. Continúan actividades de obra en diez (10) viviendas. Durante el presente período se realizó validación de una (1) vivienda.			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	Se terminó la instalación de cielo raso pvc en alcoba 1, sala comedor y alcoba 2. Se avanza en instalación de estructura para cielo raso en hall de alcobas.
5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	La vivienda presenta atraso en la ejecución de actividades. Se instaló cerámica de piso en áreas comedor, cocina, hall de acceso y alcoba 2. En el área de cocina se fundió mesón proyectado y se avanza en la instalación de enchape de mesones y pared. En la zona del baño se inicia instalación de enchape de pared. Se efectúa registro fotográfico del avance de obra y se deja constancia en bitácora.
7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se aplicó pintura vinilo en muros de alcoba 1. Se terminó el enchape de mesón y pared en área de cocina. En la zona del baño se instaló el combo sanitario. Se avanza en remates de pintura vinilo sobre muros de sala y hall de alcobas. Se instaló puerta en la alcoba 2. Se inicia instalación de estructura para cielo raso pvc. Se deja registro en bitácora de obra y se toman fotografías del avance de actividades.
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	La vivienda presenta atraso en ejecución. Se instaló piso cerámico en alcoba 1 y 2. Se hizo alistado de piso en comedor. En el área de baño se terminó enchape de pared y piso, se instaló el cielo raso pvc. En el área de cocina se fundió el mesón y se inició el enchape de pared. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Esta vivienda presenta atraso en su ejecución. Se terminaron actividades de vinilo en la alcoba 3, área de lavandería y hall de cocina. En el área de baño se terminó el enchape de piso y pared, se instaló el combo sanitario y puerta. En el área de cocina se fundió el mesón y se inició el enchape de pared y mesón. Se registraron actividades en bitácora y se efectuó registro fotográfico del avance de obra.
46	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
47	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
48	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	El día 7 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
49	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	El día 7 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.

50	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	El día 6 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
51	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	El día 6 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
52	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
53	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
83	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
84	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
85	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
86	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
87	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
90	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 4 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de interventoría y contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se realizaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
54	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	El día 8 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
81	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
82	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría ajustaron presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas y validadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	11/10/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	11/10/2021
Continuar validaciones y estructuración de presupuestos en las viviendas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	11/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
En el presente período en el barrio Juan Pablo II, se entregaron cuatro (4) viviendas, y se aperturaron cuatro (4) viviendas para iniciar actividades. En la Urbanización Compartir se dio apertura a una (1) vivienda para inicio de actividades. Durante el presente período se efectuó validación de una (1) vivienda en el barrio Juan Pablo II, quedando pendientes dos (2) viviendas por validar. Se tienen a la fecha un total de 25 viviendas validadas; se encuentran aperturadas y en ejecución de actividades, nueve (9) viviendas. La mayor parte de la semana se presentó tiempo seco. Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuran presupuestos y se proyectan actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc.
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4791 JUAN PABLO II - VALIDACION



FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual de sala comedor	




FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual de lavandería	




FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del baño	



FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la cocina	

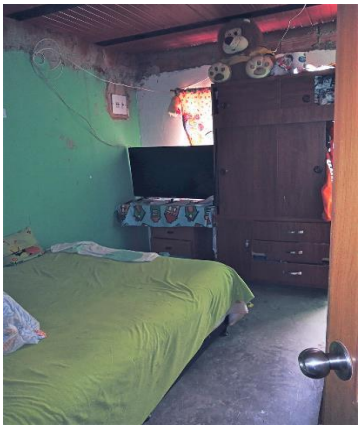

FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la alcoba 1	

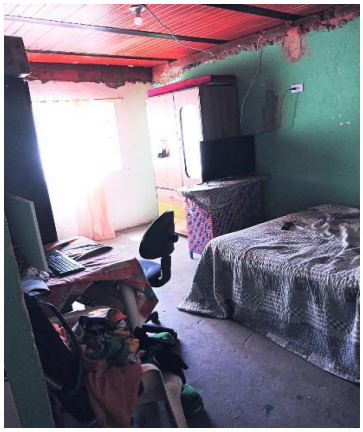

FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual alcoba 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3650 JUAN PABLO II - ENTREGA DE OBRA



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del área de cocina	




FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la zona de lavandería	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del área del baño	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final área de patio interno y hall de alcobas	

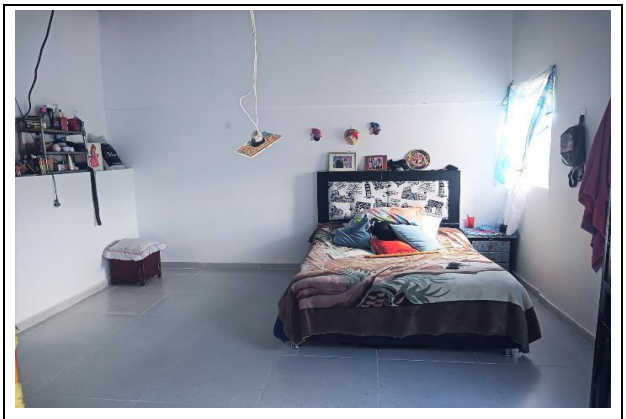

FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la alcoba principal	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la alcoba 3	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_3669 JUAN PABLO II - ENTREGA DE OBRA



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final sala comedor	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final cocina	

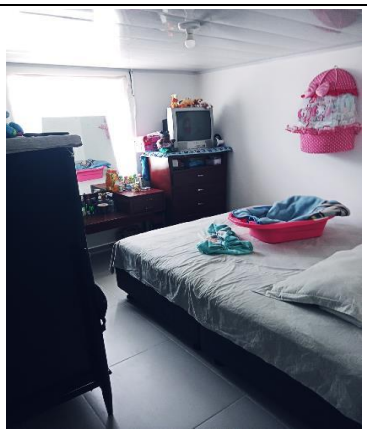

FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final alcoba 1	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final alcoba 2	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final lavandería	



FECHA	jueves, 7 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final área del baño	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	10-oct-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	20	5	3	8	3	14	27,56%	3
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	1	0	1	0,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
												0
Subtotal			**28**	**28**	**22**	**6**	0	**9**	**3**	**16**	**9,19%**	**3**

SE

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 4 AL 10
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 8

BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO		$ 12.077.142,10	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	39,00%	97,00%
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	27,00%	65,00%
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO	$ 12.124.137,35	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	99,00%	100,00%
5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO		$ 11.377.892,80	24/09/2021	24/10/2021	EN EJECUCION	9,00%	40,00%
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,40	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	99,00%	100,00%
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI / NO	$ 12.388.424,33	$ 12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	93,00%	100,00%
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI / NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	39,00%	68,00%
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI / NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	15,00%	49,00%
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI / NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	10,00%	10,00%
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI / NO		$ 12.076.903,30	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	10,00%
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI / NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	16,00%	50,00%
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI / NO		$ 12.150.294,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI / NO		$ 11.998.548,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI / NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI / NO		$ 11.606.673,70			VALIDADA	0,00%	0,00%
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI / NO		$ 11.592.989,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI / NO		$ 11.981.782,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI NO		$ 12.198.500,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI NO		$ 11.854.190,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI NO		$ 12.205.262,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI NO		$ 11.991.555,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2											
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO		$ 12.284.986,00			VALIDADA	0,00%	0,00
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO		$ 12.154.953,00	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00
ACACIAS IV ETAPA 2											
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	8	DEL	**4/10/2021**	AL	**10/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

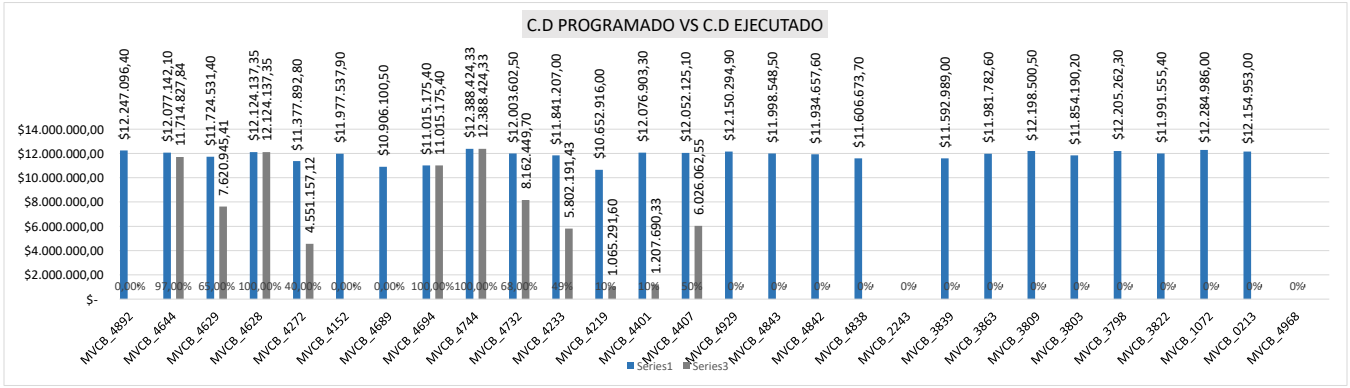

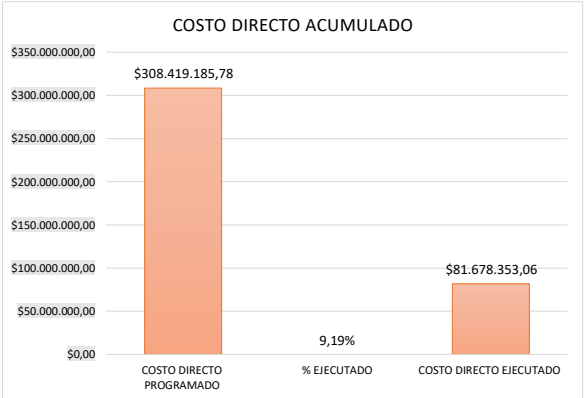

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 4 de octubre se inicia actividad de pañete muros en hall y cocina. El día 5 octubre continua actividad pañete en esta área y se realizan guías maestras para pañete en baño El día 7 de octubre se termina las actividades de pañete muros en alcoba 3 y baño El día 8 de octubre se inicia actividad de alistado piso y se aspira a dejar alistado las tres alcobas, hall, cocina y sala para el día de mañana nueve de octubre.
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de septiembre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario**
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 4 de octubre se realiza pañete en zona de ropas y se termina alistado de piso en zona de cocina y ropas. El día 6 de octubre se funde mesón cocina entrepaño superior. El día 7 de octubre se inicia actividad de enchape muros en cocina y zona de ropas El día 8 de octubre continua actividad de enchape muros en cocina y zona de ropas
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 4 de octubre continua actividad de enchape muros en área de cocina y baño. El día 5 de octubre se inicia actividad de enchape piso en baño. El día 6 de octubre se inicia actividad de enchape mesón cocina. El día 7 de octubre se realiza demolición de lavadero. El día 8 de octubre continua actividades de enchape en cocina y se inicia enchape muros en lavadero.
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 4 de octubre se realiza mesón cocina entrepaño superior. El día 5 de octubre se revisa enchape de muros en baño y piso de la alcoba 1 se identifican piezas a cambiar en las dos áreas. El día 7 de octubre se revisa piso de sala y hall , adicionalmente se verifican cantidades de obra ejecutadas. El día 8 de octubre se inician cambio de piezas cocas, enchape de muros en cocina y mesón cocina.

ETAPA No. II			
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 5 de octubre se visita el predio con la novedad que los maestros pasaron mal los niveles y el enchape estaba quedando muy mal instalado, Se ve la necesidad de levantar dodo el piso y el alistado realizado. El día 6 de octubre se inician las actividades de demoliciones y se notifica al beneficiario del cambio de maestros; el beneficiario notifica su inconformidad y el daño que se le causo con la demolición, ya que tiene enchapado el techo de la cocina del primer piso y todo se despego. El día 7 de octubre se presenta a los nuevos maestros se les informa las actividades, se les solicita pasar de nuevo niveles y mirar el estado de los sifones del segundo piso, área a intervenir y se desmonta el enchape de techo en cocina del primer piso El día 8 de octubre no se presenta el maestro a realizar actividades, el beneficiario continua manifestando su inconformidad en las actividades y el predio presenta un retroceso en lo avanzado
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 15 de septiembre se realiza validación del predio.
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 4 de octubre se inicia actividad de alistado piso en alcoba y hall. El día 5 de octubre se realiza alistado de piso en área del talle y alcoba de la beneficiaria. El día 6 de octubre se termina actividad de alistado piso en hall restante y cocina; adicionalmente inician actividad de enchape piso en alcoba de la abuela. El día 7 de octubre se realiza enchape piso en área del taller. El día 8 de octubre inicia actividad de enchape piso en alcoba de la beneficiaria
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 6 de octubre se realiza acta de inicio en el predio. El día 7 de octubre se inician actividades de demolición de pisos y enchape de muros en zona de ropas y baño. El día 8 de octubre re realizan actividades de pañetes muros en zona de ropas y alcoba, se inicia actividad de estuco muros y mamposteria en ventanas fuera de servivio. Se recomienda al contratista realizar retiro de escombros ya que se encuentran recostados a una pared, lo cual puede causar daños en el muro.
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 16 de septiembre se realiza validación del predio.
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	Se realiza acta de inicio el día 6 de octubre
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 4 de octubre inicia actividad de enchape piso en alcoba 1. El día 5 de octubre se realiza enchape de piso en alcoba 2 y estucado de muros en sala-cocina. El día 6 de octubre se funde mesón cocina entrepaño inferior. El día 7 de octubre se notifica al beneficiario que no se consiguió del mismo piso y por tanto se va a contemplar es el estuco y pintura de la alcoba que hace falta y balcón. El día 8 de octubre se funde el segundo entrepaño de la cocina, el cual quedo mal modulado; informa el beneficiario que el lo solicito así ya que tiene unas ollas tamaleras y necesita el espacio inferior mas grande que el superior
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.

20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 se realiza validación del predio
21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	El día 22 se realiza validación del predio
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 22 se realiza validación del predio

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Recorrido del director de interventoría para evidenciar problemas que se han presentado y soluciones	Interventoría	5/10/2021-
Visita de la secretaria del hábitat para realizar entregas	Hábitat	10/06/2021
Reunión de la Gerente del consorcio de la constructora con el personal de ellos	Constructora	10/08/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 4 de octubre día soleado.

El día Martes 5 de octubre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Miércoles 6 de octubre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Jueves 7 de octubre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Viernes 8 de octubre día soleado , no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**10-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	2	4	5	0	99,12%	5
		UNIR	50		8	42	0	3	0	47	0,00%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3				0	0	0					
					0	0						
Subtotal			**59**	**59**	**17**	**42**	0	**7**	**5**	**47**	**49,56%**	**5**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 4 AL 10
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 8**
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA		99,57%	100,00%

2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI NO	$ 12.975.027,00	$ 11.211.390,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI NO	$ 12.978.942,00	$ 11.927.560,50	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	98,00%	100,00%
4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO		$ 12.087.004,90	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	80,42%	98,35%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO		$ 12.289.771,00	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	60,42%	97,72%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	77,71%	100,00%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	71,93%	100,00%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO		$ 12.059.809,40	10/09/2021	25/09/2021	EN EJECUCION	67,47%	98,47%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO		$ 9.602.199,70	9/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	97,55%	97,55%
BARRIO UNIR II											
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO		$ 9.707.226,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO		$ 10.814.060,70	7/10/2021	22/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO		$ 9.765.458,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO		$ 11.422.010,10	7/10/2021	22/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO		$ 11.764.713,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO		$ 11.150.820,20	7/10/2021	22/10/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO		$ 11.271.883,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO		$ 11.935.867,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO		$ 9.870.988,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	8	DEL	**4/10/2021**	AL	**10/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

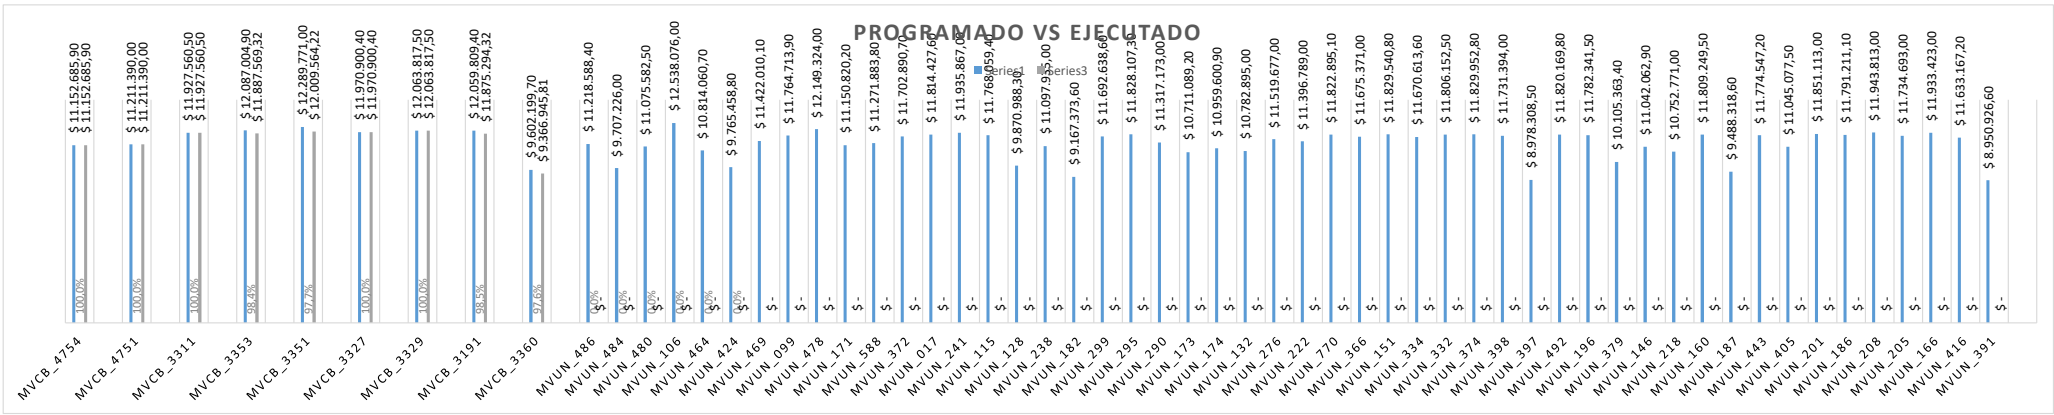



4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Instalacion de Puerta de Madera Baño.Aplicacion de Estuco y Piso ceramico Habitacion
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Instalacion de Puerta de Madera Baño.Aplicacion de Estuco y Piso ceramico Habitacion
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Piso Ceramico Hall.Ebchape muro Baño.Estuco Habitaciones
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social evidenciando ejecucion en actividades de: Estuco y Pintura en areas de Hall.Instalacion de Cielo raso Cocina,
BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
1	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion,
2	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
3	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
4	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
5	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
6	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
7	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
8	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	20/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No se aprobado presupuestos iniciales para determinar Actas de Mayores o menores
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3353 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Cielo Raso Sala



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Cielo Raso Baño



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Enchape Ceramico Pared Baño



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Combo Sanitario



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Aplicación de estuco y pintura Sala



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Aplicación de estuco y pintura Sala

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3351 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Baño



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion Combo Sanitario



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Aplicacion de Estuco y Pintura




viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Cocina

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_3327 JUAN PABLO II - CIUDAD BOLIVAR (Seguimiento de Ejecucion)




viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor

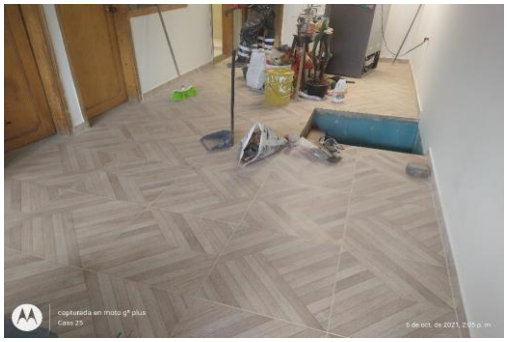


viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Piso Ceramico Sala -Comedor



viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro Baño

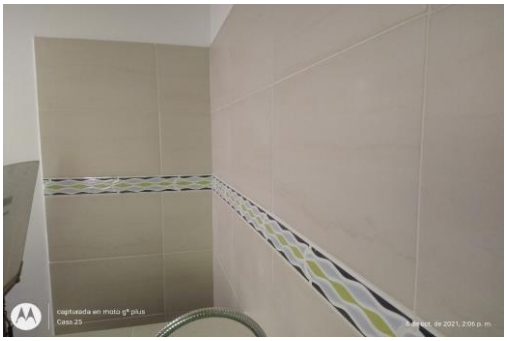

viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Instalacion enchape muro cocina

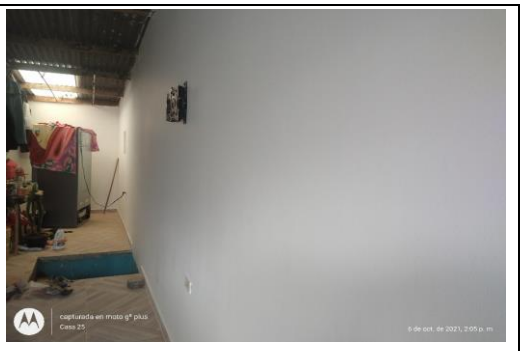

viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Aplicación de Pintura Sala

viernes, 8 de octubre de 2021
DESCRIPCION

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **10-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	12	5	9	43,12%	5
		rbanización compar	2		2	0	0	1	0	1	17,50%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**13**	**5**	**10**	**30,31%**	**5**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 4 AL 10
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 8**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1												
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO		$ 12.079.596,40	8/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA		65,00%	100,0%

2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI NO		$ 11.947.615,50	8/09/2021	5/10/2021	ENTREGADA	92,00%	100,0%
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	0,0%
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI NO		$ 12.169.719,00	8/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	95,00%	100,0%
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI NO		$ 12.149.156,80	27/09/2021		EN EJECUCION	56,00%	68,0%
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI NO		$ 11.701.628,10	9/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	95,00%	100,0%
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI NO		$ 11.769.775,40	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	95,00%	100,0%
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI NO		$ 11.326.716,60	7/09/2021		EN EJECUCION	82,00%	96,0%
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI NO		$ 11.528.955,20	7/09/2021		EN EJECUCION	75,00%	92,0%
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.792.129,40			VALIDADA	0,00%	0,0%
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.676.457,80	5/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	10,0%
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI NO		$ 12.027.750,70			VALIDADA	0,00%	0,0%
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI NO		$ 12.884.127,60			VALIDADA	0,00%	0,0%
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI NO		$ 11.678.378,50			VALIDADA	0,00%	0,0%
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI NO		$ 11.386.359,00	30/09/2021		EN EJECUCION	0,00%	30,0%
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI NO		$ 11.687.008,20			VALIDADA	0,00%	0,0%
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI NO		$ 11.887.405,00			VALIDADA	0,00%	0,0%
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI NO		$ 11.878.089,50	20/09/2021		EN EJECUCION	47,00%	82,0%
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO		$ 11.904.933,20	20/09/2021		EN EJECUCION	74,00%	95,0%
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO		$ 11.888.710,30	30/09/2021		EN EJECUCION	0,00%	16,0%
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		$ 12.028.047,20	29/09/2021		EN EJECUCION	12,00%	43,0%
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021		EN EJECUCION	5,00%	29,0%
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		$ 11.196.334,10			VALIDADA	0,00%	0,0%
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00			VALIDADA	0,00%	0,0%
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80	6/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	15,0%
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60	29/09/2021		EN EJECUCION	20,00%	45,0%
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO		$ 11.547.979,00	30/09/2021		EN EJECUCION	0,00%	35,0%
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		$ 10.062.877,30			VALIDADA	0,00%	0,0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	8	DEL	**4/10/2021**	AL	**10/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

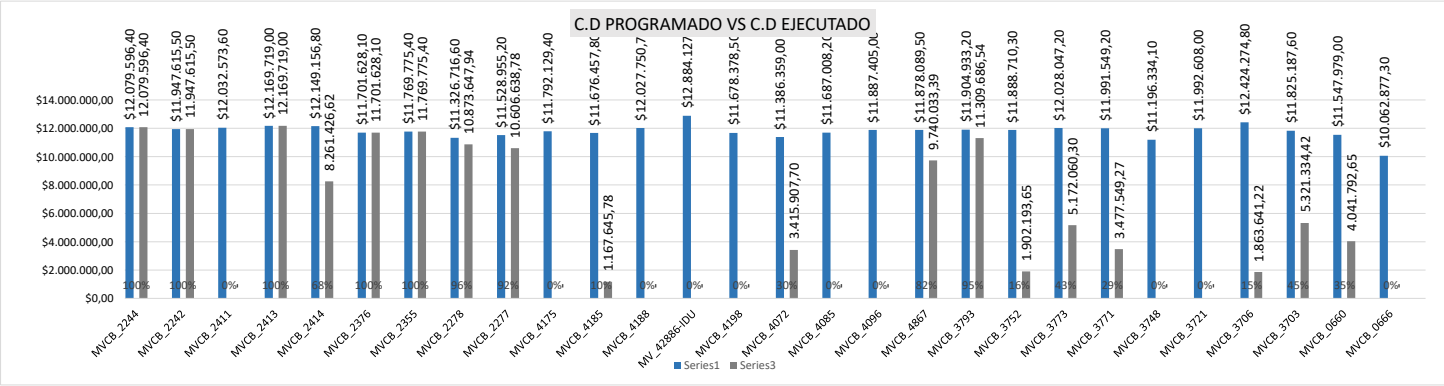

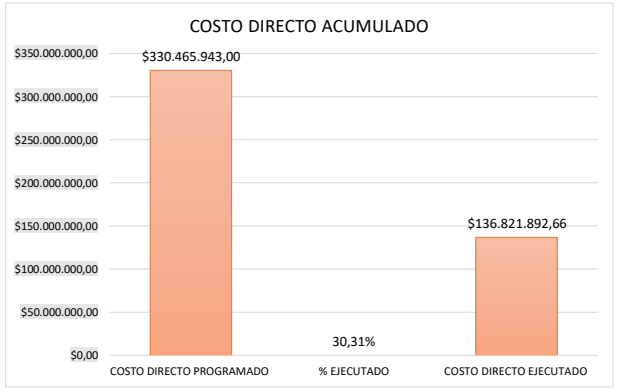

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Instalación de combo sanitario en baño, enchape de muro en zona de lavadero y puntos hidrosanitarios de lavadero y lavadora. Enchape de piso en sala y cocina. Se demuestra muy poco avance de obra en la vivienda a lo largo de la semana.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Hasta la fecha del presente informe se han adelantadoado las siguientes actividades de obra: Instalación de cielo raso en sala, alcoba y hall, enchapes de zona de lavadero, baño y cocina, bocapuertas de todos los espacios.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	Hasta la fecha del presente informe se han realizado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros en patio y hall, punto hidraulico de lavamanos, puntos hidrosanitarios de lavadora y lavadero, demolición de enchape de cocina.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 6 de octubre de 2021.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día viernes 8 de octubre de 2021.
7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día martes 5 de octubre de 2021.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 6 de octubre de 2021.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día miercoles 6 de octubre de 2021.
10	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Se terminan actividades de obra en la vivienda a falta de la instalación de puerta de baño. Se revisa obras hechas y se corrigen correctamente actividades mal ejecutadas.
11	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de piso en alcobas y cocina, alistado y enchape de piso de estos mismos espacios. Se hace entrega parcial de zona de lavadero y alcoba.
12	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistado y enchape de piso en alcobas, demolición de mesón de cocina, pañetes y alistado de piso en baño.
13	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistados de piso y pañete de muros de todo el área, primera capa de pintura en muros de alcobas, enchape de piso en alcobas.
14	MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistados de piso y pañete de muros de sala y alcobas, primera capa de pintura en muros de alcobas, enchape de piso en sala y alcoba, demolición de enchape de baño.
15	MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
16	MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistados de piso en todo el área, estuco en muros de hall y sala, preparación de muros en cocina e instalación de enchape de piso en sala. El beneficiario reparó red eléctrica como se le había solicitado.

17	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
18	MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
19	MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: muro en mampostería en baño, red hidrosanitaria en baño, cocina y lavadero, pañete de muros y alistados de piso en todo el área, instalación de enchape de piso en alcobas. El contratista modificó actividades y presupuesto para mejor ejecución de las obas.
20	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día miercoles 6 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistado de piso en patio y estuco en muros del primer nivel.
21	MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
22	MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
23	MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: desmonte de lavadero y aparatos sanitarios, puntos hidrosanitarios de baño, alistado de piso en baño, sala y patio de ropas, enchape de muros en baño. La beneficiaria realizó modificaciones en la red de gas como se le había solicitado.
24	MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día martes 5 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco en muros de apartamento de primer nivel. Demolición de enchape de baño e instalación de enchape nuevo.
25	MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
26	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
27	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
28	MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A lo largo de la semana se ha realiado visitas de apertura e inicio de actividades de obra en dos (2) predios del barrio Juan Pablo II para un total de dieciséis (12) viviendas en ejecucuión. También se realizó entrega de cinco (5) viviendas del barrio Juan Pablo II primer etapa.	Residentes de interventoría y de contratista	4/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

No se reporta afectaciones en las obras debido a clima.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2242 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cocina piso 1	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Zona de lavadero	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 1 piso 1	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cielo raso instalado en área de 3 piso	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cielo raso instalado en área de 3 piso	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Patio de ropas	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2355 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR




FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cocina en uso	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 1	

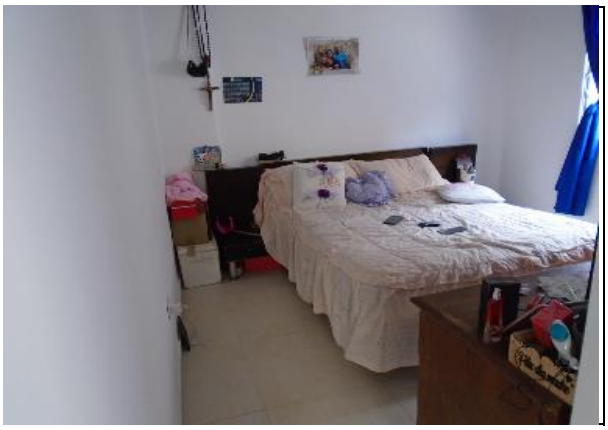

FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 2	




FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Sala comedor	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_3793 JUAN PABLO SEGUNDO - CIUDAD BOLIVAR

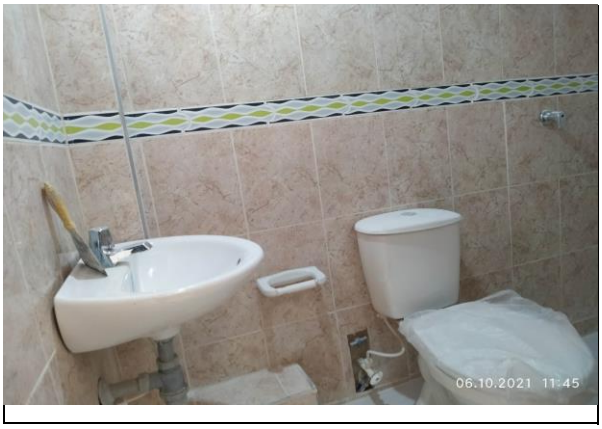

FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño terminado y funcionando	



FECHA	miércoles, 6 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso y bocapuertas terminados	

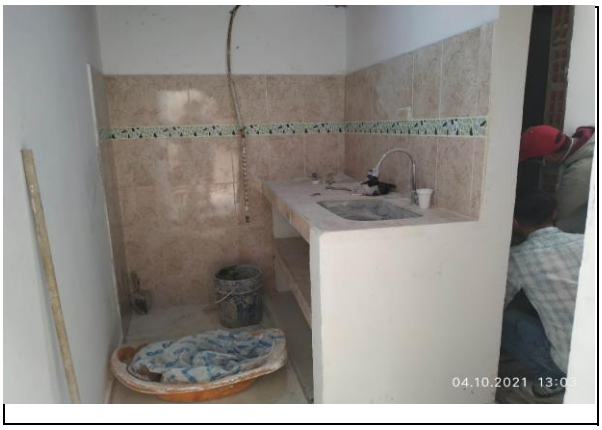

FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cocina enchapada y con lavaplatos instalado	



FECHA	lunes, 4 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de piso y de muro instalado en patio de ropas	

FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de muros en patio de ropas	

FECHA	jueves, 30 de septiembre de 2021
DESCRIPCION	
Enchape de muros y mesón de cocina	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	10-oct-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	2	3	2	67,86%	3
		Juan Pablo II	13		12	1	0	1	0	12	3,54%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	5	0	1	27,50%	0
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	0	**8**	**3**	**15**	**32,97%**	**3**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 4 AL 10
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 8**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0,00%

3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	82,00%	85,00%
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	93,00%	100,00%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO		$ 11.941.531,50	8/09/2021	23/09/2021	EN EJECUCION	54,00%	90,00%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO	$ 12.454.097,94	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	60,00%	100,00%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO	$ 11.911.502,95	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	86,00%	100,00%
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29			VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50	24/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	5,00%	46,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO		$ 11.197.949,00	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	10,00%
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO		$ 12.940.470,50	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	15,00%
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO		$ 11.528.505,00	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	20,00%
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO		$ 11.926.026,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	34,00%	80,00%
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO		$ 11.809.681,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	28,00%	40,00%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	8	DEL	4/10/2021	AL	10/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


No.	INDICADORES BARRIO O TERRITORIO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	**$384.891.593,07**	7,50%	5,48%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	**$103.838.745,16**	2,02%	

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

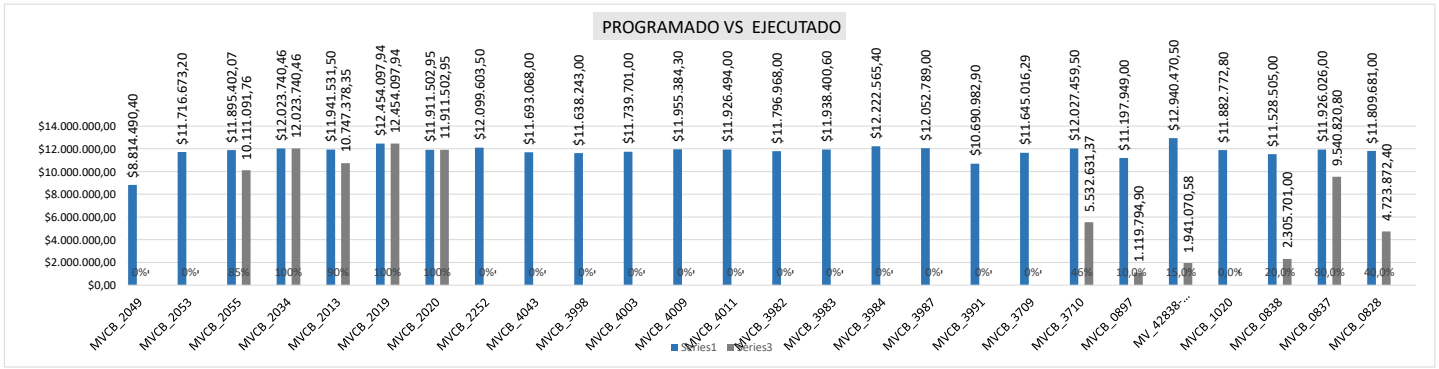

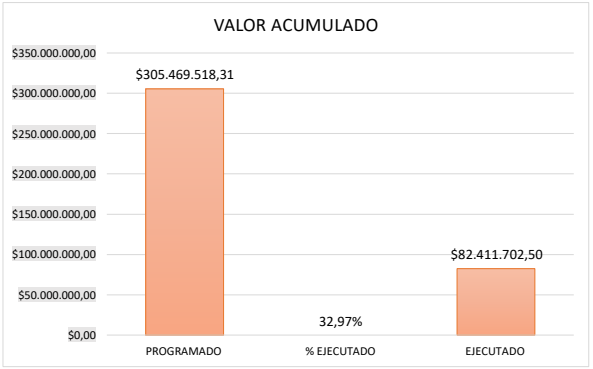

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU			
1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en zonas comunes, habitacion y cocina, Se finaliza intervencion en cocina y zona de lavado las cuales se reciben a satisfaccion.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia que se finaliza intervecion en sala, cocina y zona de lavado, se instala puerta de baño y se solicita al Contratista subsanar detalles para posterior entrega de la vivienda.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
11	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en alistado de pisos, preparacion de muros para instalacion de enchape de pared y se inicia con instalacion de enchape de pared en cocina y zona de lavado.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
12	MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 04 de Octubre de 2021, se socializan actividades y presupuesto inicial al beneficiario el cual esta de acuerdo con la intervencion que se realizara. Se inicia con demolicion de pañete y meson de cocina, alistado de piso y pañete en habitacion 2.
7	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en pañete general de primer piso y preparacion de muro en habitaciones.
12	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia demolicion de meson de cocina, se realiza pañete general.
13	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia preparacion de muros y pañete en sala, se inicia actividad de pañete en baño y cocina.
14	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en actividad de estuco general.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCB_2019









FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de las actividades ejecutadas durante el mejoramiento de vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCB_2020









FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de las actividades ejecutadas durante el mejoramiento de vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3710



FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape en baño de primer piso.



FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion de muros para instalacion de enchape en zona de lavado.



FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza toma de niveles y alistado de pisos en general.



FECHA: 08/10/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza preparacion de muros para instalacion de enchape en cocina

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante esta semana se realizaron las siguientes validaciones:

RELACIÓN DE VALIDACIONES HABITARTE


04/10/201 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRAN GONZÁLEZ**.

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron socializaciones en ninguno de los territorios.

PQR

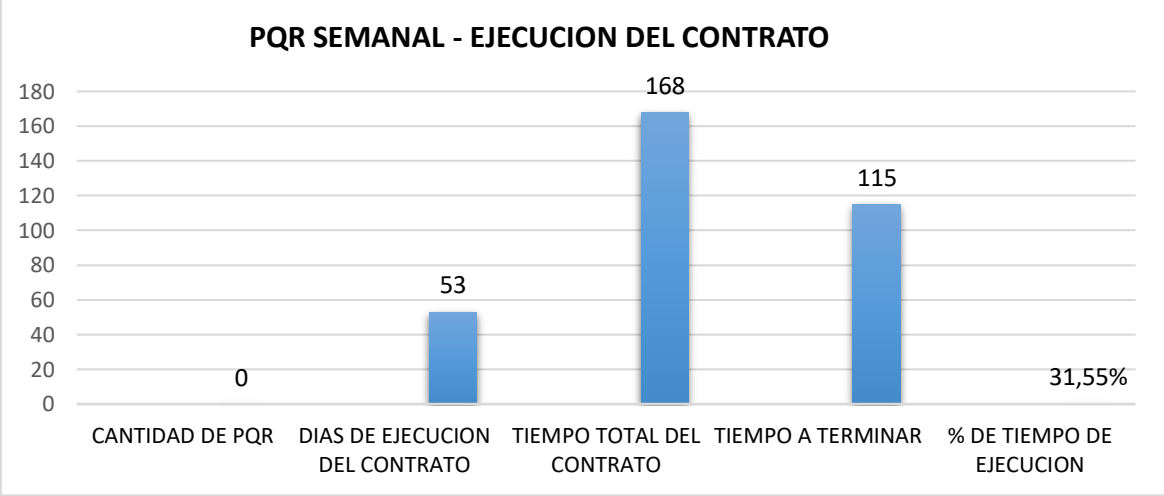

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 53 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	10/10/2021	**PERIODO No.**	8	DEL	**4/10/2021**	AL	**10/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU

SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE

VALIDACIONES REALIZADAS

04/10/201 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ** Se realiza validación social en la vivienda se diligencia formato de caracterización social.

VALIDACIONES FALLIDAS
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
4/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
4/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
4/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
05/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
06/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
06/10/2021 **MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUZ PINILLA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
06/10/2021 **MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
06/10/2021 **MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO ,** Se realiza la apertura el beneficiario ya habia realizado los arreglos acordanos en la tuberia.
06/10/2021 **MVCB_4401 GUSTAVO MARTINEZ PRIETO,**Se realiza apertura sin ninguna novedad
07/10/202 **- MVCB_4561: ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Recibe visita autorizado **MIRYAN LOPEZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
07/10/2021- **MVCB_4351 JENIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
08/10/2021- **MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO:** Recibe visita autorizado hijo **EDIXON CAMELO** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
NO SE PRESENTARON EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
04/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** Segimiento, se evidencia avances en la obra

04/10/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ, SEGUMIENTO ,** Se evidencia avances en acabado de obra.
04/10/2021_**MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** Se evidencia avances en acabado de obra, sin novedad
04/10/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** se encuentra en terminacion de acabados, vivienda sin novedad
05/10/2021-M**VCB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** , Se realiza acta con compromisos para acabados de la obra (PINTURA EN HOLL ,MURO DE LA HABITACIÓN LATERAL 4 ESPACIO DONDE SE EVIDENCIA HUMEDAD O GRASA.)
05/10/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN** , Se presenta observacion por parte del beneficiario el piso se encuentra en desnivel.
05/10/2021_**MVCB_4233 BEATRIZ CORREDOR** : Se evidencia avances obra.
05/10/2021_**MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : Se evidencia avances obra.
05/10/2021 - **MVCB_ 3410: OCTAVIO VALENCIA LLANO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados.
05/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
05/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
05/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **LETICIA CASTRO.**
05/10/2021 - **MVCB_ 3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **RUBIELA GOMEZ.**
05/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, el encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS** no se encontraba al momento de la visita
5/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** se realiza seguimiento social, el beneficiario se encuentra de acuerdo con las actividades ejecutadas en la vivienda no presenta dudas referente a la ejecución de las obras
5/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** la beneficiaria está de acuerdo con las actividades realizadas en la vivienda: sin novedad desde el área social
5/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se adiciona actividad de enchape de escaleras, la beneficiariua se encuentra conforme con las actividades.
5/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Se adiciona actividad de enchape de escaleras.
5/10/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** vivienda Sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN** , Se presenta observaciones por parte del beneficiario,(afectación en el emchape de techo de cocina primer piso);el director de obra por parte del contratista se acerca a la vivienda dando solución, a los requerimientos del Beneficiario de la siguiente manera: 1. Desmonte de emchape de cocina del techo . 2. Se hará cambio del personal, 3. El beneficiario se compromete a habilitar el espacio de la cocina para realizar las obras ya mencionadas.

6/10/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGA**L En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_2019CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_4639 JORGE ANDRES JIMENEZ** RODRIGUEZ En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, refiere estar satisfecho en cuanto a la ejecucion de la obra
07/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Sin novedad desde el área social
07/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** Se evidencia avances obra.
07/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Sin novedad desde el área social
08/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende visita el encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS,** proxima semana entrega de vivienda
08/10/2021- **MVCB_2615 CARMEN CECILIA BLANCO:** Se realiza visita social y técnico de seguimiento a la obra. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria no reporta dudas y/o inconformidades.
08/10/2021- **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **DIANA HERREÑO.** Se realiza seguimiento de obra, se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto. Encargada expresa conformidad con los avances.
08/10/2021- **MVCB_ 3410 OCTAVIO VALENCIA LLANO.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros en obra, se resuelven dudas e inquietudes. Expresan conformidad con los avances.
08/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, proxima semana entrega de vivienda
08/102021 - **MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, no atendieron a la puerta para revisar las actividades pendientes para la entrega ya qué de la parte técnica se ajustaron actividades del presupuesto por esta razón no se ha realizado entrega de la vivienda.
08/10/201 -**MVCB_GUSTAVO MARTINEZ**: Se evidencia avances obra.
ENTREGAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
05/10/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.

06/10/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO LEÓN.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO** ,Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/10/2021 - **MVCB_ 4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** Se entrega la vivienda a conformidad en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
06/10/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ,** Se entrega la vivienda a conformidad de la persona encargada (hija del beneficiario YESICA TORRES, en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
06/10/2021 - **MVCB_ 4751: MARIA LIGIA SOTO,**Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, recibe las obras de mejoramiento el encargado del predio el hijo **DIEGO SOTO**, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/10/2021 **MVCB_3433 ELENA MOJICA DE GUTIERREZ** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_ 3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, recibe las obras de mejoramiento la encargada del predio **YADIRA RAMÍREZ** se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
07/10/2021 - **MVCB_ 4744:,ALVARO ZUBIETA TUNJANO,** Se entrega la vivienda a conformidad en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
07/10/2021 **MVCB_3650 MARTHA NUBIA POSADA:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
07/10/2021 **MVCB 3669 GABRIELA MUÑOZ:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 **MVCB_3396 ANGEL ESTELA MENDOZA:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 - **MVCB_2244: CARMEN CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
08/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico , vivienda libre de escombros.
08/10/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico, vivienda libre de escombros .
08/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico, vivienda libre de escombros.
RENUNCIAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.

ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
no se realizaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
no se realizaron en el transcurso de la semana
APERTURAS
07/10/2021 - **MVUN_464: TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIS HENAO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
07/10/2021 - **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
07/10/2021 - **MVUN_171: DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
No se realizaron en el transcurso de la semana
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana

PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
09/10/2021: **PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**: Se da apertura en horario de 8:30am a 12:00m. Se acerca la Señora **Luz Mila Vasquez** para solicitar información sobre el proyecto de Mejoramiento de vivienda, se le brinda orientación para iniciar proceso. **Desarrollo:** Juan Pablo II.
09/10/2021: **PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**: Se da apertura en horario de 8:30am a 12:00m. Se acerca el Señor **FELIX ANTONIO GAONA CALLEJAS,** Propietario de la vivienda **MVCB_2278**, para solicitar información sobre la entrega de su vivienda, se le informa que la profesional social encargada se comunicara con un dia de antelación para programar dicha entrega de la vivienda.
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
BARRIO O TERRITORIO
MVCB_4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR: El 07/10/2021 se firma el consentimiento para la grabación y registro fotográfico durante las tres etapas de ejecución, por parte de la beneficiaria. NOTA: La SDHT este mismo con el área de comunicación realizó visita a la vivienda para tomar evidencia fotográfica a la beneficiaria, el cual esta vivienda tendrá seguimiento fílmico y fotográfico en las tres etapas de ejecución.
HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE
MVCB_4219: Se presenta observaciones por parte del beneficiario (afectación en el enchape de techo de cocina primer piso), el director de obra por parte del contratista se acerca a la vivienda dando solución, a los requerimientos del Beneficiario de la siguiente manera: 1) Desmonte de enchape de cocina del techo . 2) Se hará cambio del personal, 3) El beneficiario se compromete a habilitar el espacio de la cocina para realizar las obras ya mencionadas

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

SEMANA 8 DEL 04 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE		
VALIDACIONES		
SEGUMIENTO 8/10/201 -MVCB_GUSTAVO MARTINEZ: Desarrollo Juan Pablo II	**SEGUIMIENTO DE OBRA 04/10/2021 - MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO , Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4072. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4072. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO. Desarrollo Marandu	**Seguimiento de obra. MVCB_0828 AMANDA UTELIA. Desarrollo COMPARTIR**	**Seguimiento de obra. MV-42838- IDU DESIDERIO MAYORGA Desarrollo COMPARTIR**
		
Seguimiento de obra. MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA. Desarrollo COMPARTIR	**Seguimiento de obra. MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO Desarrollo COMPARTIR**	**Seguimiento de obra. MVCB_3710. JORGE EDUARDO MORENO Desarrollo Juan Pablo II**
		
ENTREGAS DE VIVIENDAS		
Entrega de vivienda. MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA. Desarrollo Juan Pablo II	**Entrega de mejoramiento. MVCB_2244: CARMEN CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA, Desarrollo Juan Pablo II**	**Entrega de mejoramiento. MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO LEÓN Desarrollo Juan Pablo II**

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021														
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021														
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021															
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															

MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021																
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021																
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021																
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																

MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021															
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021															
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021															

MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021																
MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021																
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021																
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021																

MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021																
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021																
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021															
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																

MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021																
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021																
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																

MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 7. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

A la fecha del informe No. 7 se entrega el plan de calidad ajustado y es remitido a la Secretaría Distrital del Hábitat

Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 04 aL 10 DE OCTUBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	4/10/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	8
HASTA	10/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las actividades planteadas en el plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades

1. Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Implementación de Protocolo de bioseguridad para las Aperturas de Vivienda, También se hace Entrega de kit de bioseguridad para beneficiario y trabajadores, charlas de Divulgación de protocolo de Bioseguridad en el Territorio de Unir II.
3. Inducción al personal operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y se realiza divulgación de protocolo de bioseguridad en las viviendas, en compañía de la interventoría.
4. También se hace entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios en las viviendas aperturadas.
5. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizan charlas de SST.
6. Se realizan charlas sobre Orden y Aseo al personal operativo, y charla de divulgación del protocolo de Bioseguridad en aplicación del protocolo de bioseguridad.
7. Se radica Procedimiento de Cambio de Cubiertas a interventoría y se está a la espera de revisión por parte técnica de Interventoría.
8. Se realizan entregas de Viviendas, dejando constancia firmada de recibido sin escombro, por parte del área SST, las cuales se enviarán a la entidad a través de los expedientes con su respectivo registro fotográfico.
9. Se realiza la entrega de la Señalética de Bioseguridad en las entregas de Vivienda, se deja evidencia fotográfica.
10. . Se realiza alistamiento de documentación para entrega de viviendas.
11. Se realiza alistamiento de Documentación para entrega de expedientes
12. Se realiza alistamiento de elementos para PAC Para territorio UNIR II.
13. Se revisan pin de Volqueta y Vales de Escombro.
14. Se anexa Inspecciones Realizadas en la prueba del Procedimiento de Instalación de Cubierta.

Se hace el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, y se está en la revisión de afiliaciones al SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo que ingreso esta semana. Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente.

INTERVENTORIA
Se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, en seguimiento y en ejecución, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, y de los beneficiarios, así como las que están en ejecución. Se inició apertura en UNIR II, se hace el respectivo acompañamiento y entrega de kits de beneficiario y trabajadores durante la presentación del personal, se recalca el uso de EPP y cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Se pasa a revisión del área técnica el procedimiento de instalación de cubiertas. Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo. La recogida de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombro y se haga entrega los afiches del correcto lavado de manos y las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde) Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas. Se hace recarga de kit de bioseguridad al personal de interventoría y reposición de tapabocas Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 13 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y cuenta con afiliaciones al día.

2. CAPACITACION contratista
Inducción al personal operativo que ingresa - sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad, Charlas sobre Orden y aseo.
2.1 CAPACITACION Interventoría
La interventoría recibió información sobre la variante delta. Se envió información vía WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS.
3. Gestión Ambiental
La recogida de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las casas entregadas, se haya recogido el escombro y se haga entrega los afiches del correcto lavado de manos y las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde)

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**18**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**24**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

• Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las y Aperturas de Vivienda a los beneficiarios y maestros.
• En las visitas a los MV se realiza charlas de Bioseguridad.
• Se hace seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros.
• Durante las entregas se deja constancia que las vivienda se encuentran libres de los escombros generados por la intervención, los beneficiarios firman a satisfacción y se deja evidencia fotográfica.
• Se anexan las inspecciones realizadas en la prueba de instalación de Cubierta.

El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**4992**	24,67	3,50	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**11336**	81,52	10,50	**1232**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**16656**	126,93	29,67	**4064**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico

KIT BOSEGURIDAD BENEFICIARIO	KIT BIOSEGURIDAD TRABAJADORES
	
MVCB 4072	**MVCB 4867**

CHARLA APERTURA UNIR II	CHARLA REFUERZO A TRABAJADORES
	
UNIR II	MVCB 3773
RECARGAS KIT DE BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA	
	
RECARGA ALCOHOL	REPOSICIÓN DE TAPABOCAS

ENTREGA DE VIVIENDAS	
	
MVCB 3327 - vivienda entregada - Folleto lavado manos	**MVCB 3396 - vivienda entregada - Folleto lavado manos**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	104	4992	6,0	0,0		0,00	0,00	24,67	0,00	24,67			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	3,50			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0					
				118	**5664**	**6**	**0**	**0,0**	**3,50**	**0,00**	**24,67**	**0,00**	**28,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	5.664
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	12.568
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	20.720
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	28,17
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	92,02
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	156,60

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	6
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	18
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	24
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO, CHARLAS SOBRE ORDEN Y ASEO, SENSIBILIZACION DE PROTOCOLO				
	MVCB 4867	**MVCB 3752**	**MVCB 3793**	**MVCB 4867**
La interventoría recibió información sobre variante delta Se envió información via WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS.				

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
4	SST	Personal no usa EPP adecuado y falta reposición de guantes	1	1	24/09/2021	25/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 
5	SST	Personal trabajando sobre los perfiles de la cubierta, durante la prueba de instalación, no cuenta con medidas de control, ni EPP para altura superior a 1.50, coordinador de altura no exige cumplimiento.	1	1	1/10/2021	1/10/2021	Coordinador de altura y SST del contratista	  

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	**5,00**
TOTAL ACCIONES CERRADAS	**5,00**

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	91	0	0	0	104	1	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI			SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI			SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI			SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI			SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI			SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI			SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI			SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI			SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI			SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI			SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI			SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI			SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**91**	**84**	**0**	**104**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**91**	**105**	**0**	**104**	**1**	

SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021					
	NOMBRE	**PERMISO DE TRABAJO**	**UBICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO**
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737,035,804,021,982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922,650,031,121,978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**10 DE OCTUBRE 2021**	**PERIODO**	**MES 2**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E	E														
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E	E														
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E														
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E														
Verificacion diaria de los elementos de bioseguridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E														
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E														
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E														
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E																
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E														
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E														
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E														
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS						FECHA		10 DE OCTUBRE 2021						PERIODO	MES 2								
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E															
Inspeción camilla	Contratista								P				P				P				P				P
Inspección Extintores	Contratista								P				P				P				P				P
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E		E														
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E		E	E	E														
diligenciamiento del formato recogida de escoombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
											E														
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista																								
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista					P																			
						E																			
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista																								
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	11	18	13	13	12	19	12	12	12	19	12	12	12	19	11	11	11	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	10	16	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,91%	88,89%	92,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		89,66%		96,15%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				93,88%				43,86%				0,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	29,20%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA DE VIVIENDA UNIR II SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
171		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
660		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTRWGA DE KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
828		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
838		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
897		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VOLANTE DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
4072		



MVUN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	KIT BENEFICIARIO SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
171		



MVUN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
171		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREEGA KIT DE BIOSEGURIDAD TRABAJADORES SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
3793		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUIMIENTO DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN EL MV SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
4072		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURAS ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
4351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
3752		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA Y ENTREGA DE KITS TRABAJADOR Y BENEFICIARO USO DE TAPABOCAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
213		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA Y ENTREGA DE KITS TRABAJADOR Y BENEFICIARO USO DE TAPABOCAS SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
4401		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	KIT BENEFICIARIO SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
660		

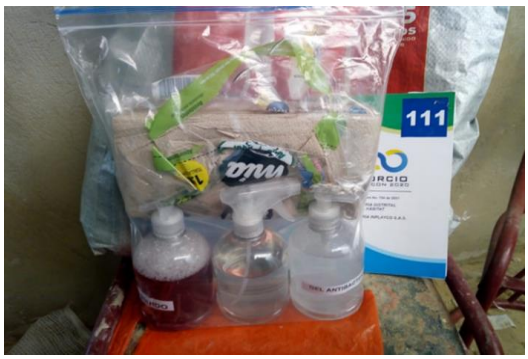

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2021
3703		
