

INFORME SEMANAL 9





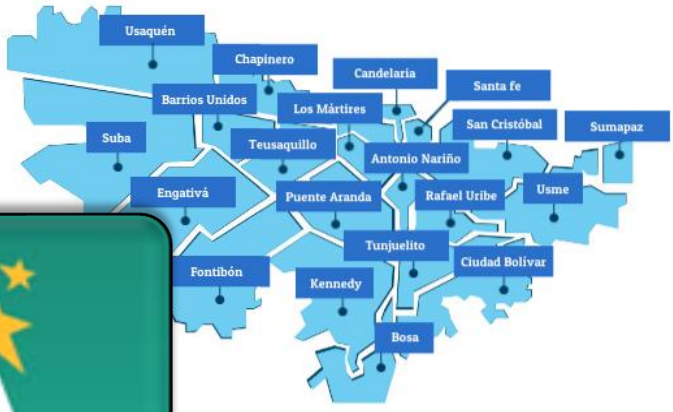

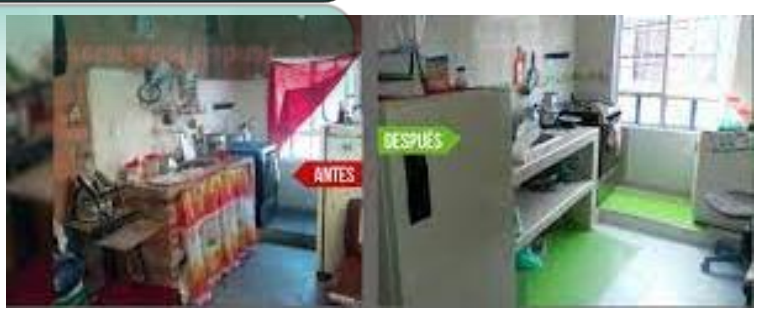

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021

SEMANA 9 DEL 11 DE OCT. AL 17 DE OCT. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN


En este informe ejecutivo, comprendido del 11 de OCTUBRE al 17 de Octubre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la NOVENA semana las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra.

Posterior a la validación de las viviendas en el sector de Habitarte, se inician actividades de ejecución de obra por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** así mismo se inicia la validación en el sector de UNIR (50 viviendas) así como la apertura e inicio de actividades de obra.


Existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur (HABITARTE), y en (UNIR) aún no se ha instalado por razones de localización y seguridad lo que fue expuesto en comité de obra, estos puntos con el fin de garantizar y resolver las dudas, inquietudes, quejas o reclamos de los beneficiarios en el sector de Habitarte.

Se realiza la prueba de instalación de la cubierta a una de las viviendas del sector de Habitarte, esto con el fin de establecer el procedimiento y cumplimiento de la normativa vigente con es la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.

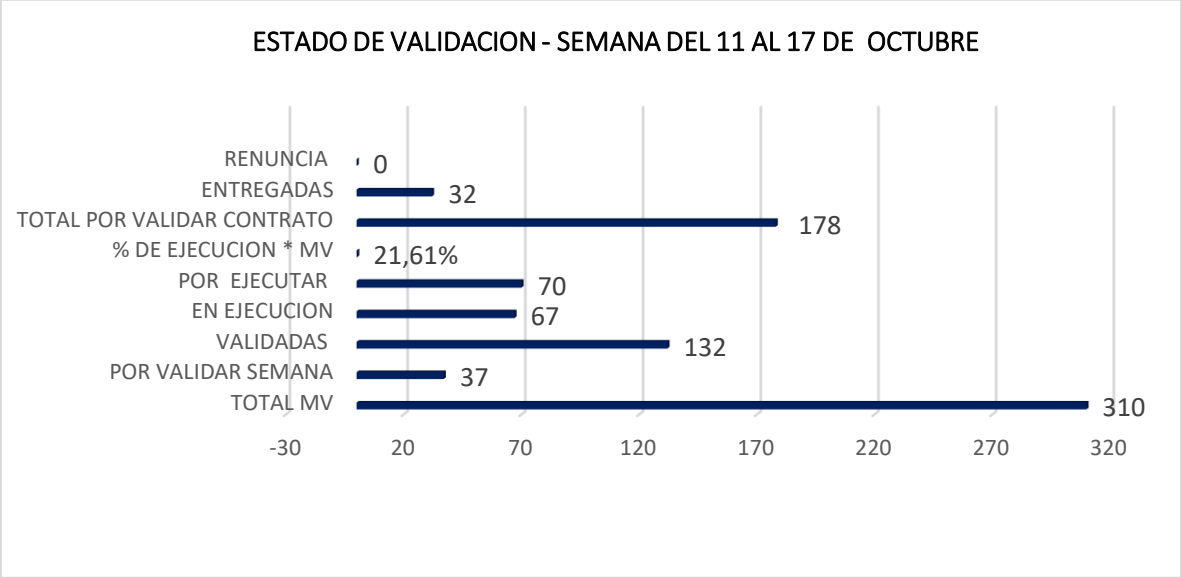

Avance de validaciones realizadas al 17 DE OCTUBRE 2021: **Total 132**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 67**
Validaciones por realizar: **178 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**
Entregadas**: 32**

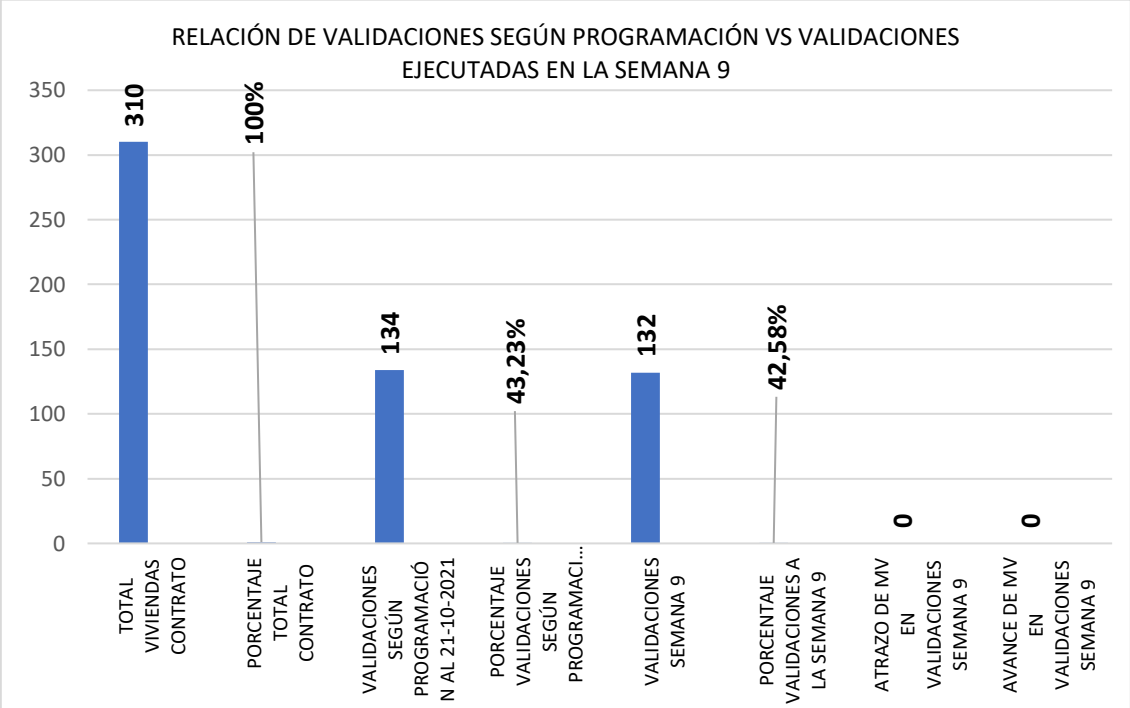

Para el presente informe (semana 9) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en cumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 21 de octubre del 2021 deberá finalizar con 134 validaciones y a la fecha posee 132 validaciones terminadas.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	25	0	6	14	5	6	35,42%	5
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	0,33%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			28	28	28	0	0	17	5	6	17,88%	5

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	25	0	5	12	4	9	37,52%	4
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	2	0	0	7,50%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			28	28	28	0	0	14	4	10	15,01%	4

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 3	JUAN PABLO II	9	59	9	0	2	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		14	36	0	9	0	41	2,02%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			59	59	23	36	0	9	9	41	51,01%	9

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	12	10	4	55,81%	10
		Urbanización compartir	2		2	0	0	2	0	0	44,50%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			28	28	28	0	0	14	10	4	50,15%	10


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	1	4	2	70,71%	4
		Juan Pablo II	13		12	1	0	7	0	6	6,69%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	5	0	1	46,33%	0
Subtotal			26	26	25	1	0	13	4	9	41,25%	4

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución					
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción	
Arq. o Ing. Responsable	CONSOLIDADO	Marandu	7	169	7	0	0	1	4	2	70,71%	4	0
		Juan Pablo II	98		97	1	13	45	28	25	47,09%	28	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	0	12	0	1	24,67%	0	0
		UNIR	50		14	36	0	9	0	41	2,02%	0	0
		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0	0
Subtotal			169	169	132	37	13	67	32	70	28,90%	32	0

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA


RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 9 DEL 11 de Oct. al 17 de Oct.

Para la semana 9, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

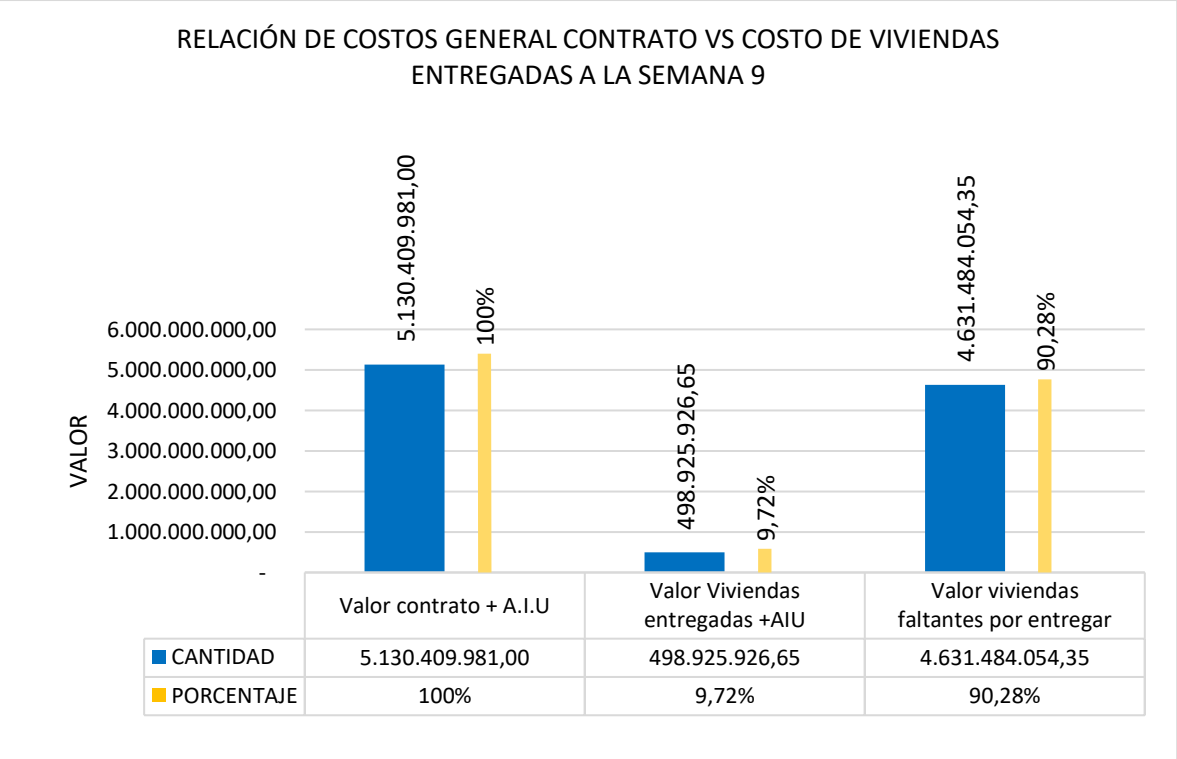


así mismo, el contratista presenta un porcentaje en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para la semana (9), del 9.72%.


En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 108 días para finalizar el contrato con 278 viviendas por entregar.

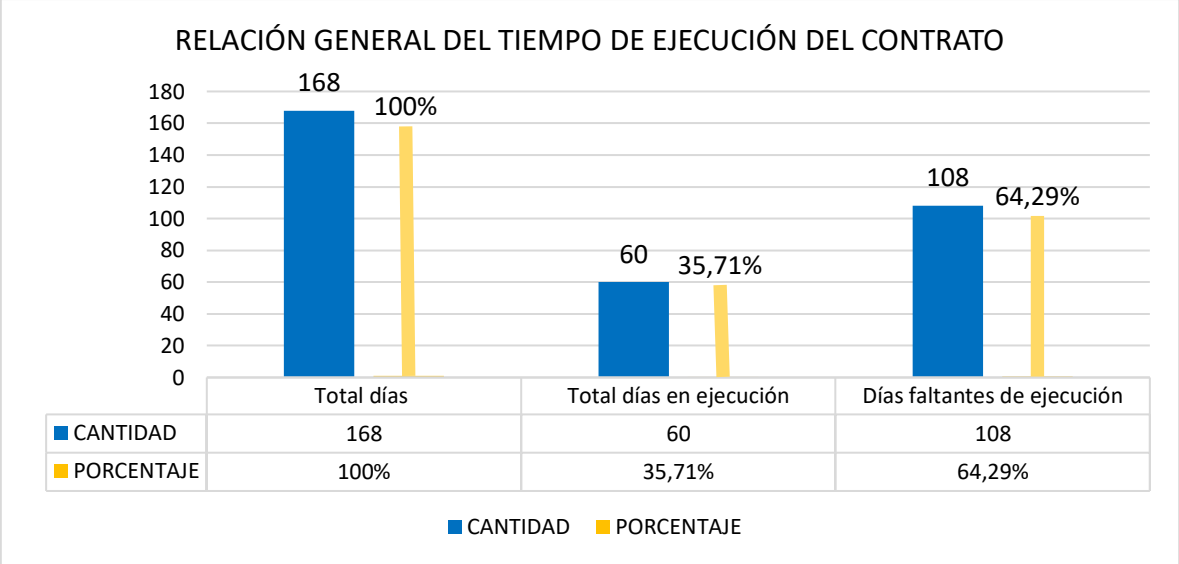

Finalmente, en este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra en cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que para el día 21 de octubre de 2021 entregara 46 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 32 viviendas faltado 12 viviendas por entregar para el próximo informe, de igual manera se encuentran en ejecución de 67 viviendas.

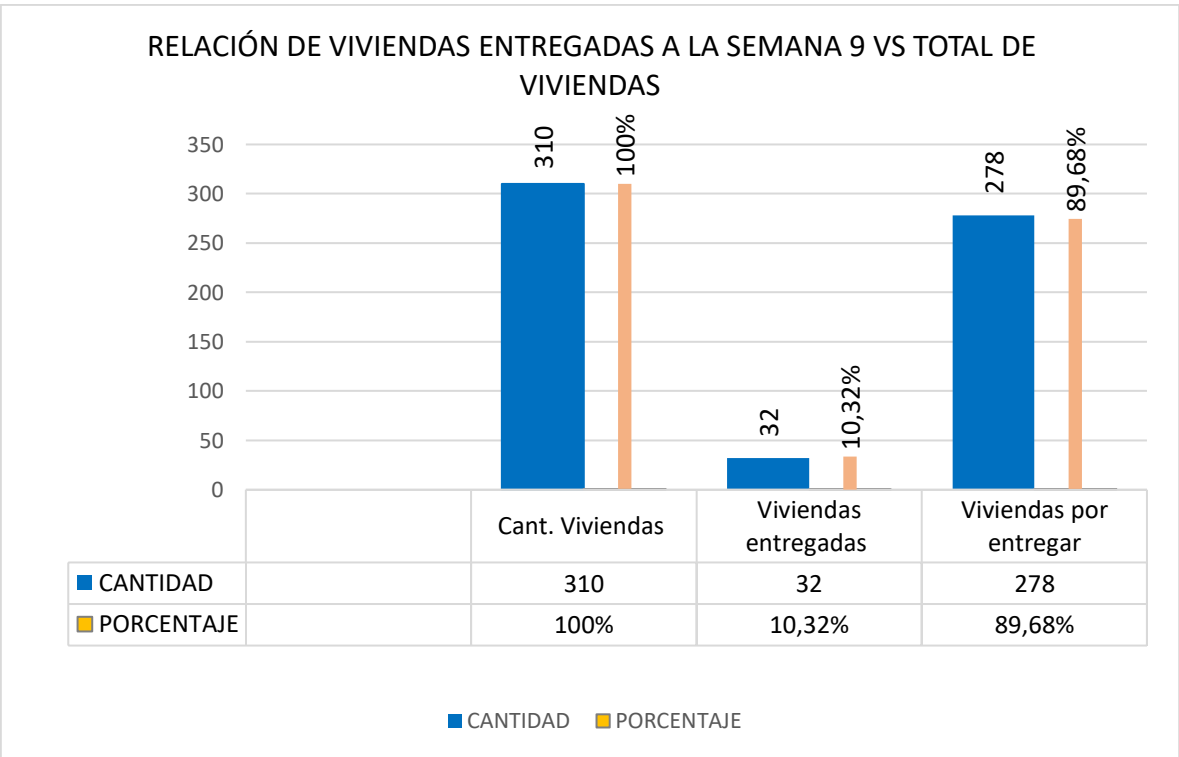

De acuerdo a la ejecución que esta realizando el contratista, a continuación se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que a la semana 9 se encuentran activas.

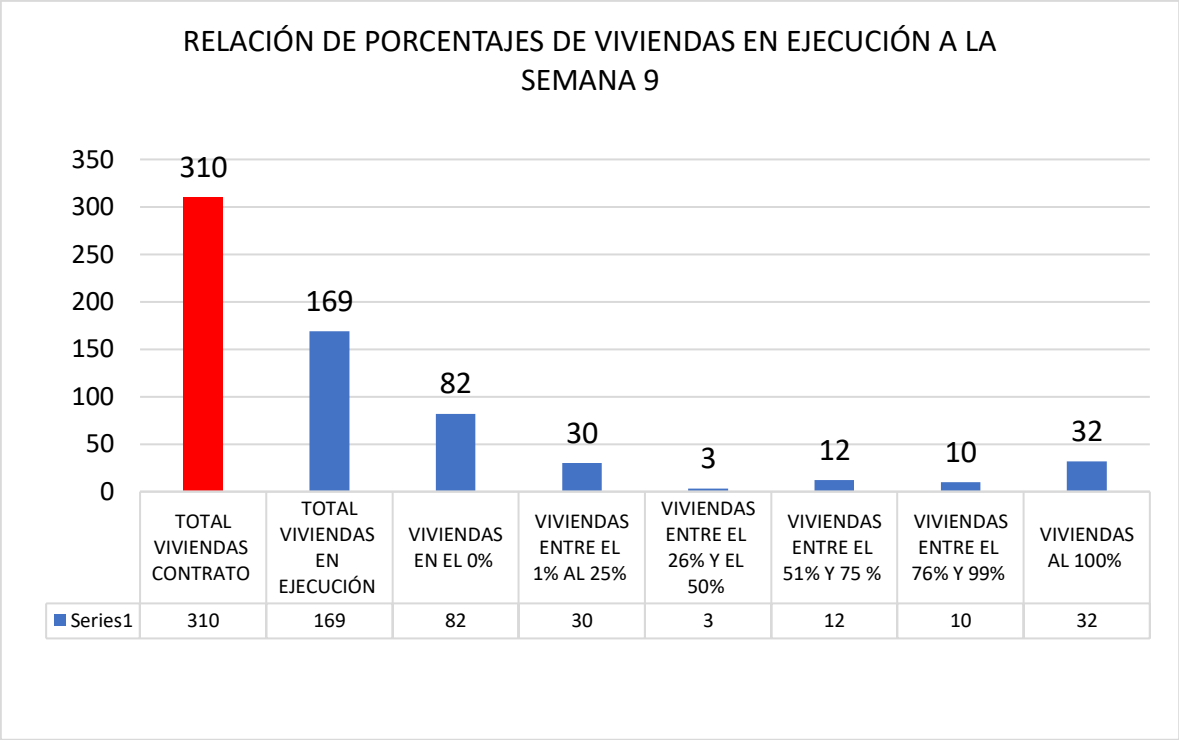

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	17-nov-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	25	0	6	14	5	6	35,42%	5
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	0,33%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**17**	**5**	**6**	**17,88%**	**5**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL											**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**					SEMANA DEL 11 AL 17
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución			**SEMANA 9**
BARRIO JUAN PABLO II												
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA		100,00%	100,00%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA		100,00%	100,00%

3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI NO	$ 12.020.042,0	$ 11.427.635,0	14/09/2021	14/10/2021	EN EJECUCION	69,95%	99,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	10/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO		$ 11.186.603,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	58,88%	73,11%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO		$ 11.626.077,0	13/09/2021	13/10/2021	EN EJECUCION	78,38%	97,13%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	9/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	70,94%	100,00%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO		$ 10.902.052,0	9/09/2021	9/10/2021	EN EJECUCION	51,10%	66,24%
46	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0	12/10/2021	11/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	3,52%
47	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
48	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0	7/10/2021	6/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
49	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2	7/10/2021	6/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	9,91%
50	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	12,68%
51	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0	6/10/2012	5/11/2012	EN EJECUCION	0,00%	10,12%
52	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8	12/10/2021	11/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	3,50%
53	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3	11/10/2021	10/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	2,89%
83	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0			VALIDADA	0,00%	0,00%
84	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0	14/10/2021	13/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	1,50%
85	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0	14/10/2021	13/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	1,00%
86	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
87	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	0,00%
88	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8			VALIDADA	0,00%	0,00%

89	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9			VALIDADA	0,00%	0,00%
90	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5			VALIDADA	0,00%	0,00%

URBANIZACION COMPARTIR											
54	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		$ 11.953.028,0	8/10/2021	7/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	1%
81	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		$ 11.612.217,0	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
82	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		$ 11.789.319,0	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0%
											0%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	9	DEL	11/10/2021	AL	17/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

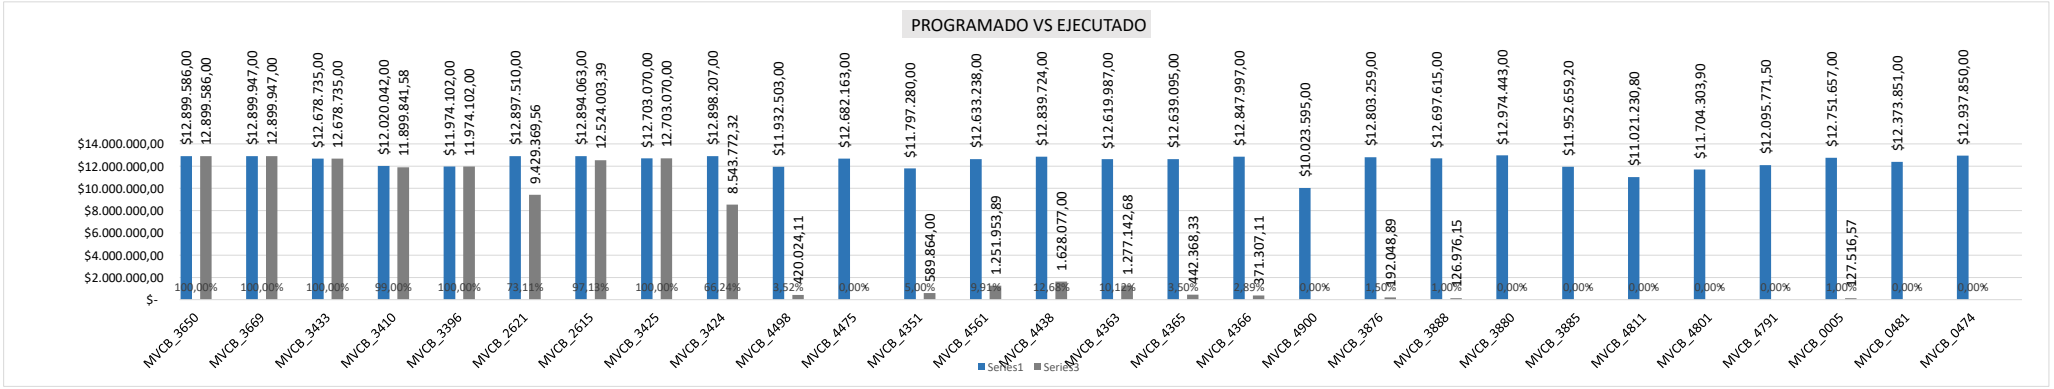

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Durante el presente período se entregó una (1) vivienda en el barrio Juan Pablo II, y se aperturaron ocho (8) viviendas.			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	Se instaló cielo raso pvc en áreas de hall de alcobas, lavandería, bano 2, alcobas 3 y 4. Se enchapó piso de alcoba 2 y hall de alcobas. Se avanzo en aplicación de estuco y vinilo en alcoba 2; aplicación de pintura vinilo en alcobas 3 y 4. Enchape de muros de lavandería. Vivienda en el 99% de avance.
5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	La vivienda presenta atraso en la ejecución de actividades. Se termina la instalación de enchapes en meson y pared de cocina. Se instaló el enchape de pared del bano. En la zona de lavandería se avanza en panete de muros.
7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	La vivienda presenta retraso en la ejecución. Se instalaron lavaplatos y grifería en la cocina. Se termina instalación de cielor raso pvc en las áreas de sala, cocina, alcoba 1, corredor de alcobas, bano. En la alcoba se avanzó con instalación de estructura para cielo raso. Se deja registro en bitácora de obra y se toman fotografías del avance de actividades.
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Esta vivienda presenta atraso en su ejecución. Se terminó el enchape de pared y meson de la cocina 2 y se instaló el lavaplatos con su grifería. Se iniciaron actividades de alistado de pisos en la sala, cocina 1 y alcoba 1.
46	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	El día 12 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. Se iniciaron actividades de obra, se acopia material arena y cemento para alistado y panete.
47	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
48	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	Se iniciaron actividades en la vivienda. Se avanza en panetes del área de la sala. Se demolió el meson de la cocina. En el área de bano se demolio enchape y se adecuaron puntos sanitarios e hidráulicos. Se demolió la baldosa de piso existente en la alcoba 1.
49	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	Se dio inicio a las actividades de obra. Se adelantaron panetes de muros en sala, bano 1 y cocina. Se deja registro de actividades en bitacora y se hace registro fotográfico del avance de obra.
50	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	Se iniciaron actividades de obra. Se demolió baldosa existente en piso de alcoba 1. Se efectuó alistado de piso en hall de entrada, alcobas 2 y 3, y se instaló cerámica en estas mismas áreas.

51	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	Se iniciaron actividades de obra en la vivienda. Se demolió baldosa existente en pisos de cocina y hall de alcobas. Se pica superficie de piso esmaltado en áreas de alcoba 1, sala. Se avanza en actividades de aplicación de estuco en la sala y alcoba 1.
52	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.
53	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.
83	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
84	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para panete y alistado de pisos.
85	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para panete y alistado de pisos.
86	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para panete y alistado de pisos.
87	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
88	MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 13 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de interventoría y contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se realizaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
89	MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 13 de octubre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de interventoría y contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se realizaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
90	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
54	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	Se iniciaron actividades de obra. Se conforma superficie en el área de patio, para fundir placa de contrapiso.
81	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.
82	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	Se iniciaron actividades de obra. Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría ajustaron presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas y validadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	19/10/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	19/10/2011
Estructurar presupuestos y aperturar viviendas validadas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	19/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

En el presente período en el barrio Juan Pablo II, se entregó una (1) vivienda y se aperturaron seis (6) viviendas. En la Urbanización Compartir se aperturaron las dos (2) viviendas faltantes. A la fecha se encuentran en ejecución diecisiete (17) viviendas. Están validadas y sin aperturar, seis (6) viviendas.

Durante el presente período se efectuó la validación de las últimas dos (2) viviendas en el barrio Juan Pablo II. Se tienen a la fecha un total de 28 viviendas validadas.

Durante la semana se presentaron lluvias fuertes.

Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuran presupuestos y se proyectan actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4811 JUAN PABLO II - VALIDACION




FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual de alcoba 1	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual alcoba 2	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del baño	

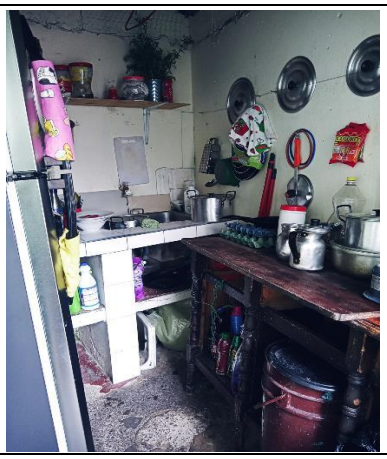

FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la cocina	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del área de lavandería	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista inicial del corredor principal	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_4801 JUAN PABLO II - VALIDACION



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual de sala - alcoba 1	




FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual de la alcoba 2	

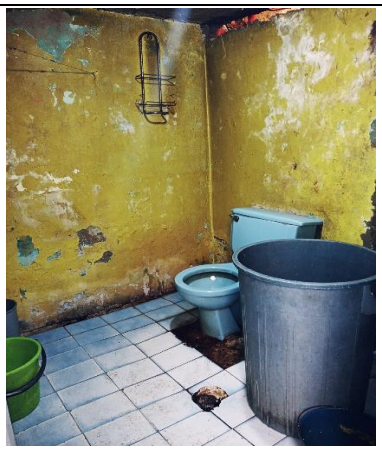

FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista actual del baño	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la cocina	

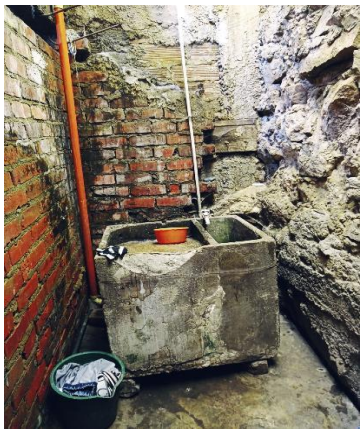

FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del área de lavandería	



FECHA	miércoles, 13 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista inicial del corredor interior	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3425 JUAN PABLO II - ENTREGA DE VIVIENDA



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del área del comedor	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de patio interno y zona de lavandería	




FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del área del baño	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final del área de cocina	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la alcoba 1	

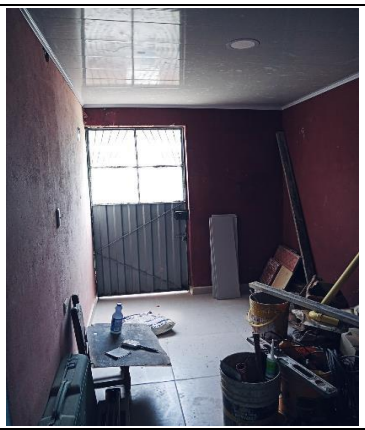

FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Vista final de la alcoba 2	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **17-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	25	0	5	12	4	9	37,52%	4
		rbanizacion Compart	2		2	0	0	2	0	0	7,50%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	**0**	**14**	**4**	**10**	**15,01%**	**4**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
											SEMANA DEL 11 AL 17
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 9**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO	$ 12.503.233,92	$ 12.077.142,10	**14/09/2021**	**12/10/2021**	ENTREGADA	97,00%	100,00%

3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021	8/10/2021	EN EJECUCION	65,00%	90,00%
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO	$ 12.124.137,35	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO		$ 11.377.892,80	24/09/2021	24/10/2021	EN EJECUCION	40,00%	40,00%
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	0,00%
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,4	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI / NO	$ 12.388.424,33	$ 12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI / NO		$ 12.003.602,50	7/09/2021	7/10/2021	EN EJECUCION	68,00%	95,00%
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI / NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	49,00%	55,00%
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI / NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	10,00%	85,00%
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI / NO		$ 12.076.903,30	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	10,00%	58,00%
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI / NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	50,00%	75,00%
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI / NO		$ 12.150.294,90	12/10/2021	11/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	10,00%
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI / NO		$ 11.998.548,50	13/10/2021	12/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	10,00%
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI / NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI / NO	$ 12.890.215	$ 11.606.673,70	14/10/2021	13/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI / NO		$ 11.592.989,00	12/10/2021	11/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	15,00%
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI / NO		$ 11.981.782,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI / NO		$ 12.198.500,50			VALIDADA	0,00%	0,00%
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI / NO		$ 11.854.190,20	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI / NO		$ 12.205.262,30			VALIDADA	0,00%	0,00%
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI / NO		$ 11.991.555,40			VALIDADA	0,00%	0,00%
URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2											
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI / NO		$ 12.284.986,00	12/10/2021	11/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	10,00%
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI / NO		$ 12.154.953,00	6/10/2021	5/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
ACACIAS IV ETAPA 2											
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	**9**	DEL	**11/10/2021**	AL	**17/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

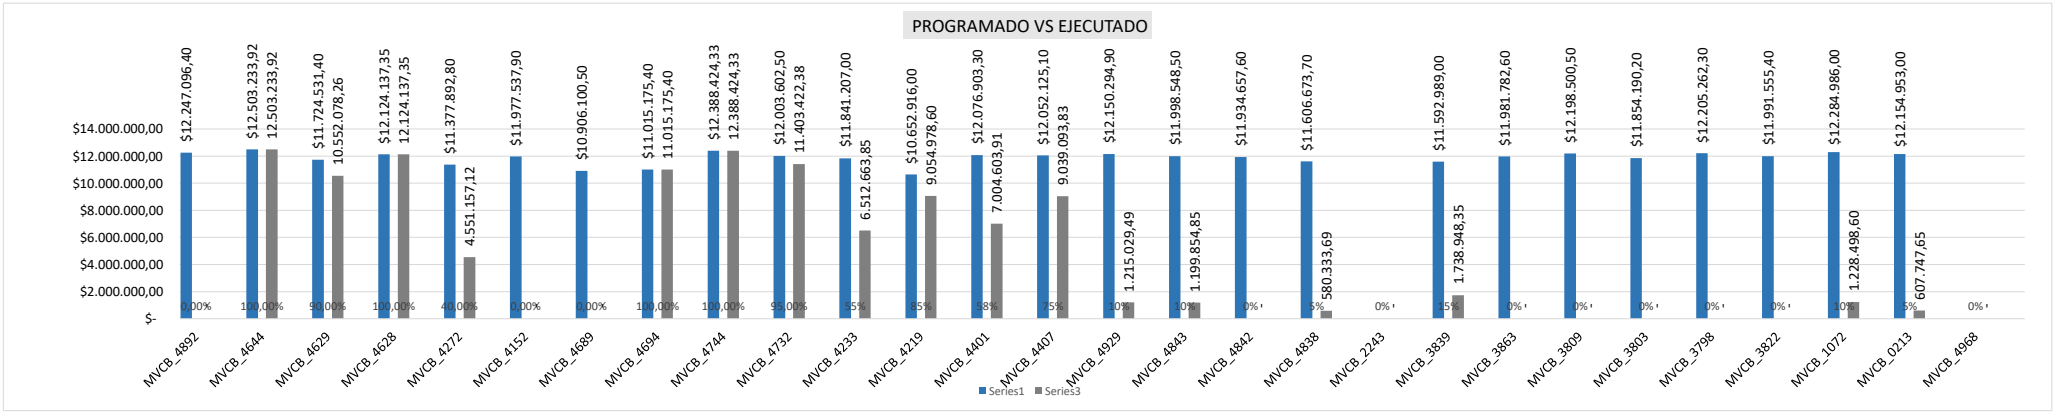

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 11 de octubre, predio parado no se presentan maestros a trabajar. El día 12 octubre, inicia actividad de estuco en alcoba1 El día 13 de octubre, se realiza estuco en muros de hall El día 14 de octubre, predio parado no se presenta ni maestros ni materiales. El beneficiario manifiesta su inconformidad con respecto a la demora de materiales y el personal que no es constante en las labores
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de octubre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario**
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 11 de octubre se inicia enchape de muros y piso en baño. El día 12 de octubre continua enchape de piso en baño y se arma bordillo de ducha. El día 13 de octubre remates de enchape de piso en zona de cocina El día 14 de octubre continua enchape de bordillo de ducha El día 15 de octubre enchape de mesón cocina e instalación de platero y grifería
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 11 de octubre, alistado de piso alcobas zona posterior . El día 12 de octubre, no se realizan actividades. El día 13 de octubre, se inicia actividad de enchape de piso. El día 14 de octubre, continua actividad de enchape de piso y escalones .
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. **El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario**.

11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 11 de octubre, trabajaron el sábado y parte de domingo en alistado de piso en hall, alcobas y zona de ropas. El día 12 de octubre, se inician las actividades de enchape de piso en hall. El día 13 de octubre, continua enchape en hall e inicia actividades de enchape en alcoba y zona de ropas El día 14 de octubre, inicia actividad de enchape de muros en zona de ropas y baño El día 15 de octubre emboquillan enchape de muro en zona de ropas y baño e inician enchape en cocina
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	Se realiza acta de inicio el día 12 de octubre El día 14 de octubre, se inicia actividad de pañete muros en baño y zona de ropas El día 15 de octubre continua actividad de pañete muros en las actividades del día anterior
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 11 de octubre se realiza enchape de piso en hall, el subcontratista visita el predio y le pareció que mejor cambiar la modulación de esta zona y mando a realizar un boca puerta en toda la mitad del hall, algo bastante desagradable. Se envía foto a la oficina de interventoría El día 12 de octubre, continua enchampe en la zona del dia anterior . El día 13 de octubre se inicia actividad de estuco en el taller . El día 14 de octubre se termina actividad de estuco en taller y continua a la alboba de la abula. El día 15 de octubre se termina actividad de estuco en alcobas y hall
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 11 de octubre, se funde losa de piso en zona de patio. El día 12 de octubre, se inicia enchape de muros en baño . El día 13 de octubre, termina enchape de muros en baño y enchape de piso en baño. El día 14 de octubre, se realiza enchape de muros en cocina y estuco de muros en alcoba y zona de ropas El día 15 de octubre se realiza enchape de piso en alcoba 1 y cocina
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	Se realiza acta de inicio el día 12 de octubre . El día 14 de octubre se realiza alistado de piso en alcoba del beneficiarios y se demuele mesón en la alcoba. El día 15 de octubre se inicia actividad de estuco muros en alcoba del beneficiario. El beneficiario solicita no realizar demolición de mesón cocinas y se contemple actividad de pañete muros
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	En esta semana se realiza demolición de mesón y enchape en cocina y rayado o picado de piso en sala. Al predio no llego materiales en el transcurso de la semana se notifica a oficina de interventoría que el predio no cuenta con maestros ni materiales y no reporta mayor avance en las actividades.
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 11 de octubre, se inicia enchape de piso en comedor cocina El día 12 de octubre continua actividad de enchape en el área del día anterior. El día 13 de octubre se Inicia actividad de enchape piso en hall. El día 14de octubre continua actividad de enchape piso en hall El día 15 de octubre inicia actividad de estuco muros en hall
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	Se realiza acta de inicio el 13 de octubre. El día 14 de octubre el predio no cuenta con materiales ni con personal realizando actividades El día 15 de octubre se inicia actividad de alistado de piso en las dos alcobas posteriores
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.
20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 de septiembre se realiza validación del predio
21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	Se realiza acta de inicio el día 14 de octubre El día 15 de octubre inicia actividad de desmonte de sanitario primer piso.
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	Se realiza acta de inicio el 12 de octubre, presentando a los maestros El día 13 de octubre se realiza alistado de piso en sala El día 14 de octubre alistado de piso en cocina y hall El día 15 de octubre se termina de alistar la cocina y hall parte posterior

23	MVCB 3863	Fabio Rodríguez	El día 11 de octubre se realiza validación del predio
24	MVCB 3809	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 11 de octubre se realiza validación del predio
25	MVCB 3803	Luz Dary Sáenz Capera	Se realiza acta de inicio el día 15 de octubre
26	MVCB 3798	María Aliria Medina de Beltrán	El día 12 de octubre se realiza validación del predio
27	MVCB 3822	Sory Inés Costes López	El día 12 de octubre se realiza validación del predio
28	MVCB 4968	Lucas Raúl Beltrán Prieto	El 21 de Septiembre se realiza validación del predio

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Comité de obra	Interventoría, Hábitat y Constructora	13/10/2021-
Reunión para informar al personal lo charlado en el comité de obra y aclarar dudas de APUS y Cubierta	Interventoría	14/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 11 de octubre día nublado con lluvias en la tarde, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Martes 12 de octubre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Miércoles 13 de octubre día soleado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Jueves 14 de octubre día nublado, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

El día Viernes 15 de octubre día soleado , no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_3803 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Zona de ropas a intervenir	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba a realizar mejoras	

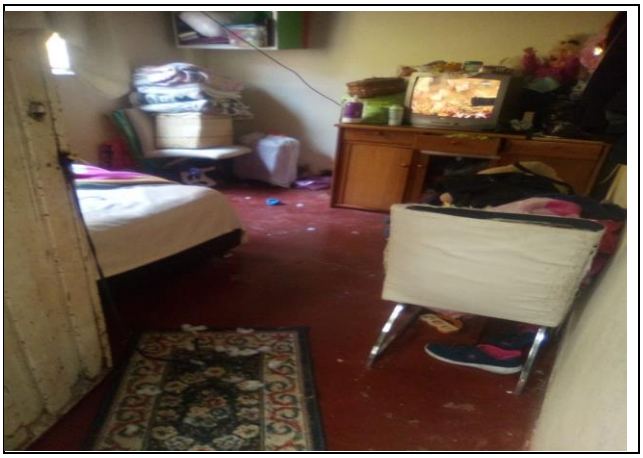

FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 2 a realizar mejoras	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño a intervenir	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cocina a intervenir	



FECHA	Viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Acta de inicio	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**17-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	2	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		14	36	0	9	0	41	2,02%	0
Técnico Responsable	Arq.Leonardo Solano				0	0	0					
					0	0						
Subtotal			**59**	**59**	**23**	**36**	0	**9**	**9**	**41**	**51,01%**	**9**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**			**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 11 AL 17
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 9**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO	$ 12.975.027,00	$ 11.211.390,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO	$ 12.978.942,00	$ 11.927.560,50	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%

4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO		$ 12.087.004,90	**8/09/2021**	**11/10/20211**	ENTREGADA	98,35%	100,00%
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO		$ 12.289.771,00	**10/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	97,72%	100,00%
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO		$ 12.059.809,40	**10/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	98,47%	100,00%
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO		$ 9.602.199,70	**9/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	97,55%	100,00%
				BARRIO UNIR II							
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO		$ 9.707.226,00	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO		$ 10.814.060,70	7/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	24,64%
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO		$ 9.765.458,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO		$ 11.422.010,10	7/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	15,02%
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO		$ 11.764.713,90	13/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	11,30%
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO		$ 11.150.820,20	7/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	39,21%
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO		$ 11.271.883,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO		$ 11.935.867,00	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO		$ 9.870.988,30	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	2,00%
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	0,00%	2,00%
30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00	15/10/2021		VALIDADA	0,00%	0,00%

31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20	15/10/2021		VALIDADA	0,00%	0,00%
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90	15/10/2021		VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	8	DEL	**11/10/2021**	AL	**17/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

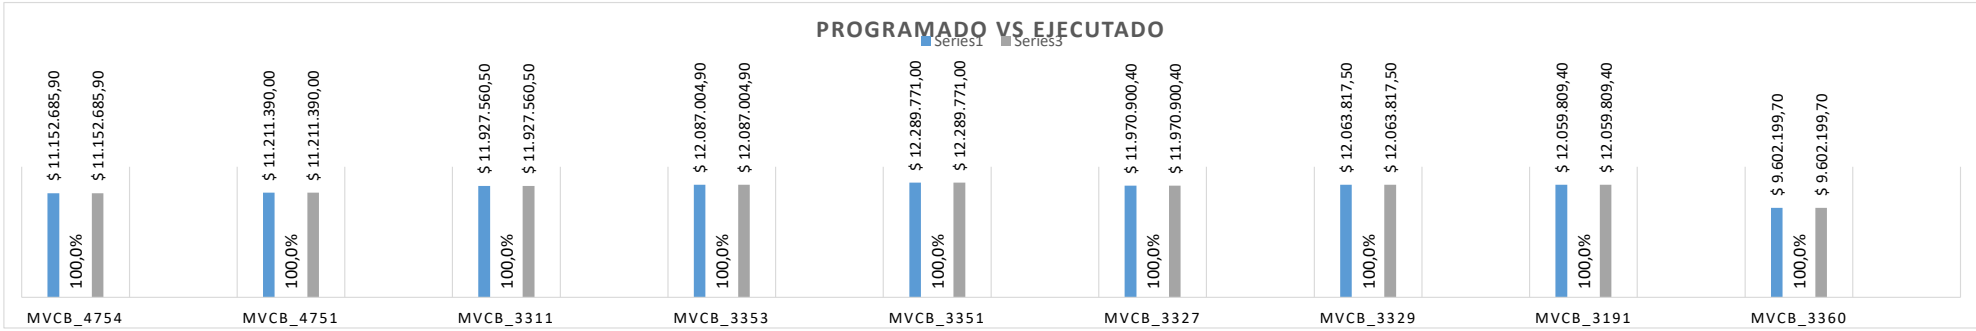

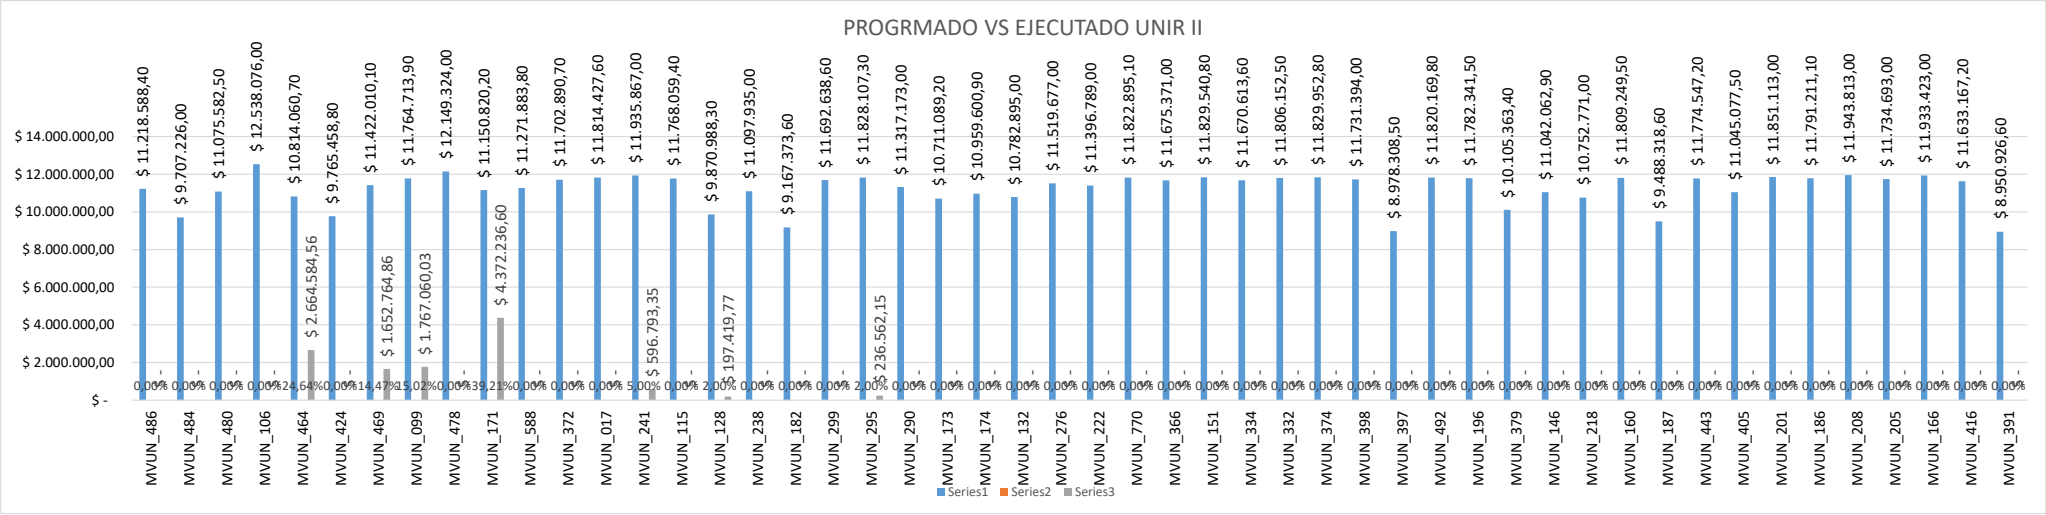

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
1	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
2	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
3	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4 y aplicación de estuco en muros de area Sala-Comedor
4	MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
5	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia apliacacion pañete convencional en mamposteria Habitacion 2,
6	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia Alistado de piso en mortero 1:4 Areas de Sala-comedor
7	MVUN_478	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	No ha sido posible efectuar visita tecnico-social
8	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
9	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
10	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
11	MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
12	MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar

13	MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
14	MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
15	MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
16	MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
17	MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
18	MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
19	MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	20/09/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No se aprobado presupuestos iniciales para determinar Actas de Mayores o menores
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVUN_464 UNIR II - ENGATIVA (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4 Habitacion 1



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4 Habitacion 2

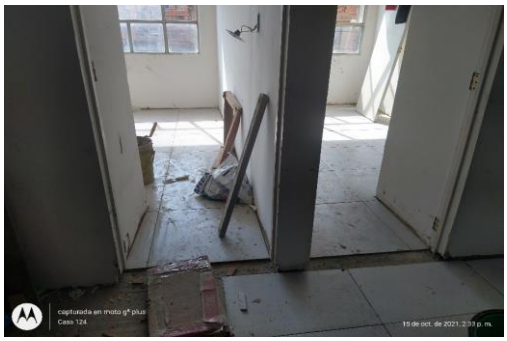


viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape de piso Ceramico



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape de piso Ceramico



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4 Cocina

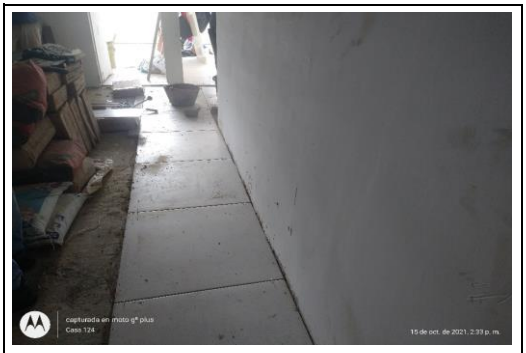

viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape de piso Ceramico

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVUN_469 UNIR II - ENGATIVA (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Puntos Hidraulicos Cocina



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm




viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVUN_099 UNIR II - ENGATIVA (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4

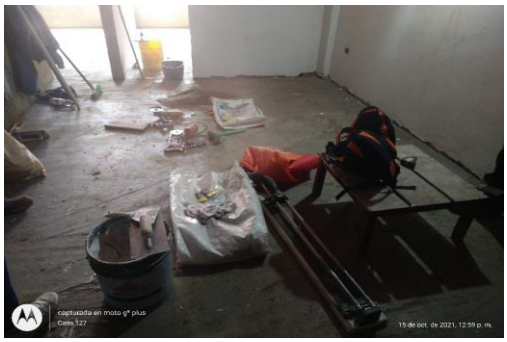

viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Estuco sobre pañete muros



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4

viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION

viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVUN_171 UNIR II - ENGATIVA (Seguimiento de Ejecucion)



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Alistado de piso en mortero 1:4




viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape de piso



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Enchape de piso



viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Estuco sobre pañete muros

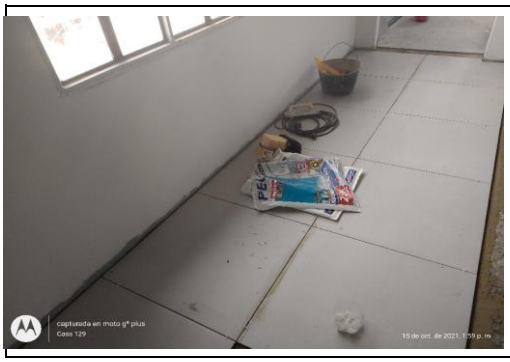

viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION
Estuco sobre pañete muros

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **17-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	0	12	10	4	55,81%	10
		Urbanización compartir	2		2	0	0	2	0	0	44,50%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**14**	**10**	**4**	**50,15%**	**10**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	SEMANA DEL 11 AL 17
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 9**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO	$ 12.978.390,83	$ 12.079.596,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO	$ 12.460.609,4	$ 11.947.615,50	**8/09/2021**	**5/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%

3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI / NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI / NO	$ 12.636.225,99	$ 12.169.719,00	**8/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI / NO		$ 12.149.156,80	**27/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	68,00%	100,00%
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI / NO	$ 12.516.986,46	$ 11.701.628,10	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI / NO	$ 12.253.349,05	$ 11.769.775,40	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI / NO	$ 12.978.808,77	$ 11.326.716,60	**7/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	96,00%	100,00%
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI / NO		$ 11.528.955,20	**7/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	92,00%	100,00%
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.792.129,40	11/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	8,00%
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.676.457,80	5/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	20,00%
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI / NO		$ 12.027.750,70	11/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI / NO		$ 12.884.127,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI / NO		$ 11.678.378,50	12/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI / NO		$ 11.386.359,00	30/09/2021		EN EJECUCION	30,00%	74,00%
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI / NO		$ 11.687.008,20	11/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	6,00%
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI / NO		$ 11.887.405,00	11/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	5,00%
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI / NO		$ 11.878.089,50	**20/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	82,00%	100,00%
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI / NO	$ 12.978.659,81	$ 11.904.933,20	**20/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	95,00%	100,00%
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI / NO		$ 11.888.710,30	30/09/2021		EN EJECUCION	16,00%	95,00%
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI / NO		$ 12.028.047,20	29/09/2021		EN EJECUCION	43,00%	81,00%
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021		EN EJECUCION	29,00%	59,00%
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI / NO		$ 11.196.334,10			VALIDADA	0,00%	0,00%
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI / NO		$ 11.992.608,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI / NO		$ 12.424.274,80	6/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	35,00%
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI / NO		$ 11.825.187,60	29/09/2021		EN EJECUCION	45,00%	68,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI / NO		$ 11.547.979,00	30/09/2021		EN EJECUCION	35,00%	84,00%
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI / NO		$ 10.062.877,30	14/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	5,00%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	9	DEL	11/10/2021	AL	17/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

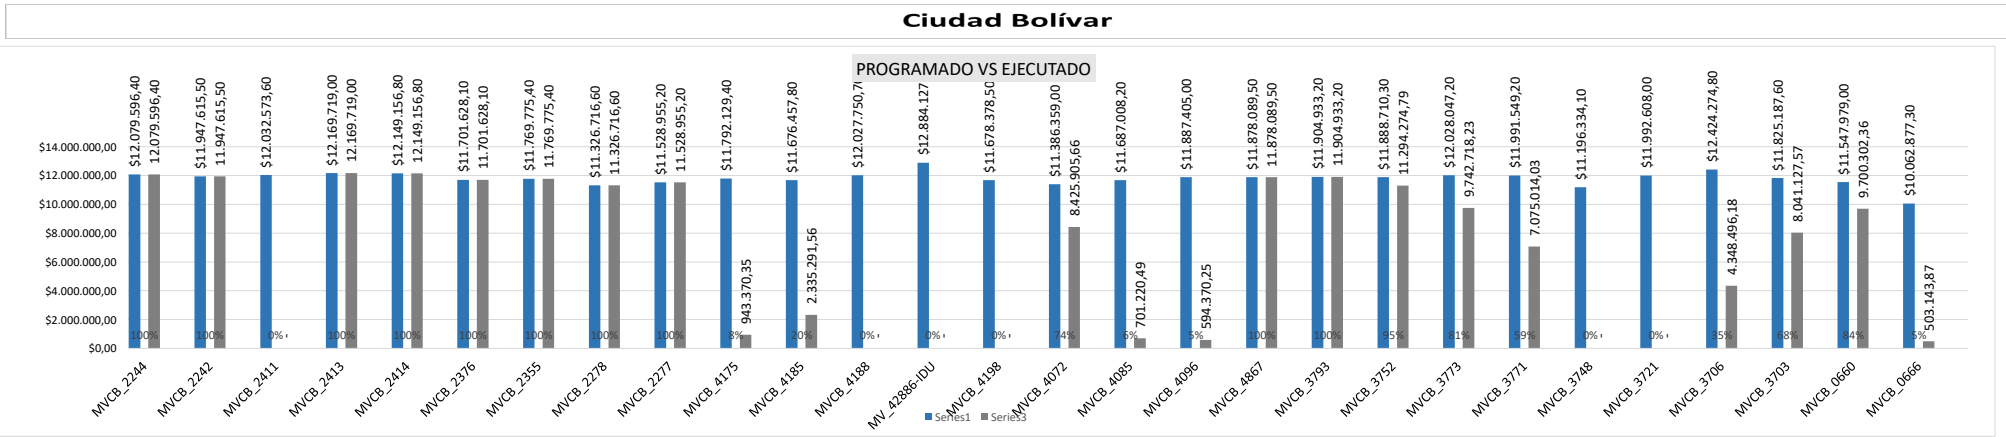

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día viernes 15 de octubre de 2021.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día lunes 11 de octubre de 2021.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día jueves 14 de octubre de 2021.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Vivienda entregada.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Vivienda entregada.
7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Vivienda entregada.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Vivienda entregada.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Vivienda entregada.
10	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día jueves 14 de octubre de 2021.
11	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día viernes 15 de octubre de 2021.
12	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete y enchape de muros de cocina y baño, enchape de pisos de alcobas, cocina y baño. Fundición de mesón de cocina.
13	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco de muros de sala y hall, pintura de muros de todo el área, puntos hidraulicos en cocina y baño, enchapes de pisos y de muros en todo el área.
14	MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	Hasta la fecha del presente informe se han terminado las actividades de obra, a falta de detalles y remates. Vivienda lista para entrega a inicio de la siguiente semana.
15	MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día jueves 14 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Preparación de piso en alcobas y estuco de muros en alcobas.
16	MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de piso en todo el área, estuco en muros de alcobas, patio y sala, demolición de lavadero.

17	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
18	MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
19	MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Fundición de mesón de cocina, enchapes de muro y piso de todo el área. Se hizo cambio de personal de obra por lo cual hubo poco avance de actividades.
20	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchape de piso de patio, alistado de piso y pañete de muros en baño piso 1 y estructura para cielo raso en primer nivel.
21	MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día lunes 11 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de mesón cocina 2, pisos y enchapes de baño 2
22	MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día lunes 11 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco de muros en alcobas piso 1. Demolición de enchape de cocina. Se le aclara a la beneficiaria que no se da garantía en esta ona debido a la humedad presente.
23	MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de muro de piso y muros en baño y patio de ropas, demolición de mesón de cocina y pañete del mismo espacio. Alcoba 2 terminada y entregada, se aclara a beneficiarios que un muro presenta humedades por lo tanto no se da garantía de esta actividad.
24	MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Se entrega apartamento piso 1 con estuco y pintura de muros en alcobas, cocina y enchape de baño con combo nuevo. Se inicia actividad en terraza piso 4.
25	MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día lunes 11 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe no se inician actividades de obra.
26	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
27	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día martes 12 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe no se realizan actividades de obra.
28	MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día lunes 11 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de todo el área

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A lo largo de la semana se ha realiado visitas de apertura e inicio de actividades de obra en cinco (5) predios del barrio Juan Pablo II y uno (1) de Urbanización compartir. También se realizó entrega de cinco (5) viviendas del barrio Juan Pablo II primer etapa. Actualmente se encuentran catorce (14) viviendas en ejecucuión.	Residentes de interventoría y de contratista	11/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

No se reporta afectaciones en las obras debido a clima.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_2277 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba piso 1 terminada y entregada	




FECHA	jueves, 14 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Zona de la cocina con enchapes de piso y muros.	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño terminado y funcionando correctamente	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Zona de lavadero con enchapes de muro y pisos y lavadero nuevo	

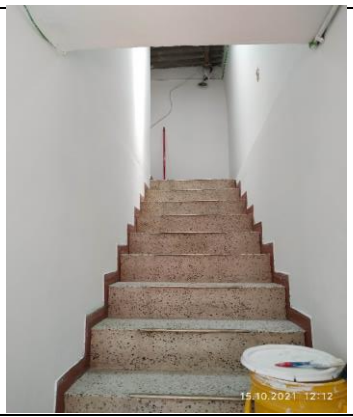

FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Muros de escalera pintados	



FECHA	viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCIÓN	
Entrega a beneficiaria	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	17-oct-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	0	1	4	2	70,71%	4
		Juan Pablo II	13		12	1	0	7	0	6	6,69%	0
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	0	5	0	1	46,33%	0
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	0	**13**	**4**	**9**	**41,25%**	**4**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 11 AL 17
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 9**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	0,00%

2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	0,00%
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO		$ 11.895.402,07	7/09/2021	22/09/2021	EN EJECUCION	85,00%	95,00%
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI / NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI / NO		$ 11.941.531,50	**8/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	90,00%	100,00%
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI / NO	$ 12.454.097,94	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI / NO	$ 11.911.502,95	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	100,00%
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI / NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	0,00%
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI / NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI / NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI / NO		$ 11.739.701,00	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI / NO		$ 11.955.384,30	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI / NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI / NO		$ 11.796.968,00	13/10/2021	12/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	5,00%
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI / NO		$ 11.938.400,60			VALIDADA	0,00%	0,00%
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI / NO		$ 12.222.565,40	15/10/2021	14/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI / NO		$ 12.052.789,00			VALIDADA	0,00%	0,00%
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI / NO		$ 10.690.982,90	13/10/2021	12/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	0,00%
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI / NO		$ 11.645.016,29	11/10/2021	10/11/2021	EN EJECUCION	0,00%	15,00%
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI / NO		$ 12.027.459,50	24/09/2021	24/09/2021	EN EJECUCION	46,00%	67,00%
URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI / NO		$ 11.197.949,00	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	10,00%	15,00%
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI / NO		$ 12.940.470,50	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	15,00%	52,00%
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI / NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	0,00%
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI / NO		$ 11.528.505,00	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	20,00%	63,00%
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI / NO		$ 11.926.026,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	80,00%	85,00%
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI / NO		$ 11.809.681,00	21/09/2021	21/10/2021	EN EJECUCION	40,00%	63,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	9	DEL	11/10/2021	AL	17/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

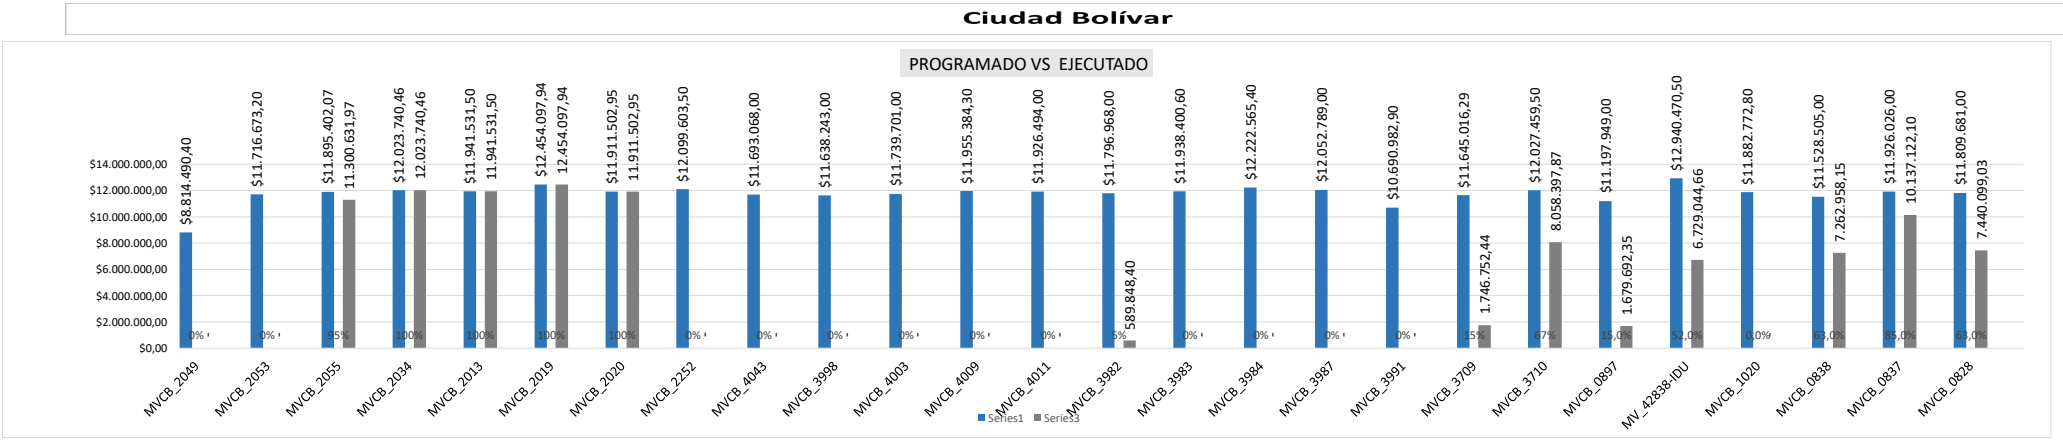

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU			
1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda en donde se evidencia avance en instalacion de cielo raso en habitaciones e instalacion de enchape de piso en escaleras y hall de acceso
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 13 de Octubre de 2021.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
8	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 15 de Octubre de 2021, en la cual se le socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria la cual acepta sin ningun inconveniente. Se apertura sin personal operativo, el Contratista se compromete a llevar personal a mas tardar dia martes 18 de octubre.
9	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza apertura de la vivienda el dia 15 de Octubre de 2021, en la cual se le socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria la cual acepta sin ningun inconveniente. Se apertura sin personal operativo, el Contratista se compromete a llevar personal a mas tardar dia martes 18 de octubre.
6	MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza apertura de la vivienda el dia 13 de Octubre de 2021, en la cual se le socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria la cual acepta sin ningun inconveniente. Se realiza recorrido el dia 15 de Octubre de 2021 en el cual no se evidencia personal operativo avanzando en actividades, se le informa al Contratista el cual se compromete a iniciar actividades a mas tardar el dia martes 18 de Octubre.
8	MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza apertura de la vivienda el dia 15 de Octubre de 2021, en la cual se le socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria la cual acepta sin ningun inconveniente. Se apertura sin personal operativo, el Contratista se compromete a llevar personal a mas tardar dia martes 18 de octubre.
9	MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza apertura de la vivienda el dia 13 de Octubre de 2021, en la cual se le socializa presupuesto y actividades iniciales a la beneficiaria la cual acepta sin ningun inconveniente. Se realiza recorrido el dia 15 de Octubre de 2021 en el cual no se evidencia personal operativo avanzando en actividades, se le informa al Contratista el cual se compromete a iniciar actividades a mas tardar el dia martes 18 de Octubre.
10	MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en relleno de material seleccionado y alistado de piso en habitacion 1 y sala, se inicia con actividad general de pañete.
11	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en instalacion general de enchape de piso y estructura para cielo raso.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
7	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en aplicación de estuco en general y construccion de meson y entrepaño de cocina.
12	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia finalizacion en actividades de zona n° 2 de la vivienda (Instalacion de enchape de piso en sala, cocina, hall y baño; instalacion de enchape de pared en cocina y baño; y actividad de pañete y pintura en cocina) Se inicia con pañete en cocina de zona n° 1.

13	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en pañete de baño y cocina, se realiza instalacion de enchape de pared en cocina y baño.
14	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en actividad general de estuco e instalacion de enchape de pared en baño.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVCB_3803 JUAN PABLO SEGUNDO CIUDAD BOLIVAR



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Zona de ropas a intervenir	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba a realizar mejoras	

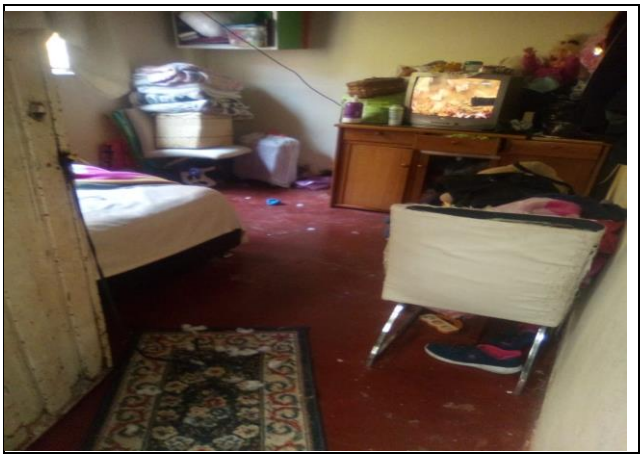

FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Alcoba 2 a realizar mejoras	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Baño a intervenir	



FECHA	Lunes, 11 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Cocina a intervenir	



FECHA	Viernes, 15 de octubre de 2021
DESCRIPCION	
Acta de inicio	

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

15/10/2021-**MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA,** Se observa que en la vivienda existe un problema socioeconómico, familiar, y de entorno con los vecinos (De tipo social qué puede afectar el desarrollo de la obra) el contratista presentará informe puntual del caso.(en visita de validación se identifica problemática con vecinos, beneficiario informa que la vivienda contigua a su casa afecto la estabilidad de su vivienda, ocasionando diversas afectaciones (fisuras, grietas y desprendimientos de material) por esta razón ha tenido diferentes inconvenientes con el vecino, llegando a las vías de hecho (afectaciones físicas y a la propiedad privada por parte de los involucrados) por este hecho la beneficiaria realizo diligencia en la fiscalía para evidenciar la situación, , la beneficiaria, no tiene buenas relaciones con ninguno de sus vecinos, en su relato comenta que fue condenada por nueve años, de los cuales tres estuvo privada de la libertad, vive con sus dos hijas y cinco nietos, la beneficiaria se encarga de las labores del hogar y sus hijas, trabajan en la informalidad)

Se solicita acompañamiento del la SDHT

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante esta semana se realizaron las siguientes validaciones:

RELACIÓN DE VALIDACIONES HABITARTE

HABITARTE

11/10/2021 - MVCB_ 3863: FABIO RODRIGUEZ TOQUICA,
11/10/2021 - MVCB_ 3809: ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ ,
12/10/2021 - MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA,
12/10/2021 - MVCB_ 3822 SORY INES CORTES LOPEZ ,
12/10/2021 - MVCB_ 3798: MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,
13/10/2021 MVCB_4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ:
13/10/2021 MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:

UNIR


12/10/2021-MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,
12/10/2021-MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,
14/10/2021- MVUN_299 LUZ MARÍNA CASTAÑEDA MONTENEGRO,
14/10/2021-MVUN_182 NYDIA BUSTOS LÓPEZ,
15/10/2021- MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ,
15/10/2021- MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO,
15/10/2021-MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA,
12/10/2021- MVUN_241 : MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ,

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana no se realizaron socializaciones en ninguno de los territorios.

PQR

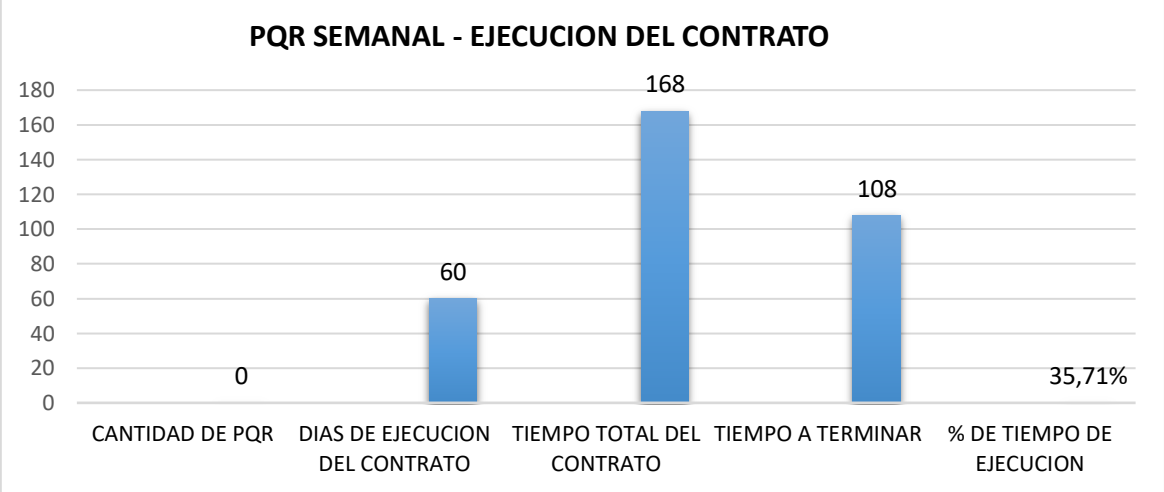

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 60 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	18/10/2021	**PERIODO No.**	9	DEL	**11/10/2021**	AL	**17/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU

SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE

VALIDACIONES REALIZADAS
11/10/2021 - **MVCB_ 3863:FABIO RODRIGUEZ TOQUICA,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
11/10/2021 - **MVCB_ 3809: ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ ,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
12/10/2021 - **MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
12/10/2021 - **MVCB_ 3822 SORY INES CORTES LOPEZ** , ES LA HIJA DE LA PROPIETARIA QUIEN APARECE BENEFICIARIA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, REGISTRA DISCPACIDAD DESDE EL NACIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL, QUIEN QUEDA ACARGO DE LA OBRA ES LA SEÑORA CLARA INES LOPEZ
12/10/2021 - **MVCB_ 3798: MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,** SIN NINGUNA NOVEDAD
13/10/2021 **MVCB_4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ:** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.

13/10/2021 **MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:** Se realiza validación a esposa **CINDY MARCELA GUEVARA** con carte de autorizacion. Se realizco contacto telefonico con el beneficiario ya que numero telefonico estaba errado en base de datos y no habia sido posibile la comunicación para concertar validación.

VALIDACIONES FALLIDAS
no se presentaron en el transcurso de la semana
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
11/10/2021-**MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO**,Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
11/10/2021 - **MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
11/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
11/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Se hace apertura ; con su hija autorizada GLORIA LILIANA AMAYA con carta de autorización en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
11/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
11/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
12/10/2021 - **MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
12/10/2021 - **MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA ,** APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD.
12/10/2021 - **MVCB_ 3839: JOSE CUADRADO CUADRADO ,** APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD
12/10/2021 - **MVCB_ 4929: PEDRO PABLO SALAMANCA ,**SE REALIZA APERTURA DE VIVIENDA SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA **(cubierta)**

12/10/202 **- MVCB_4498: ELCI RUTH ORTIZ MORENO:** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de

12/10/2021- **MVCB_4365: OLGA BLANCO DE RIAÑO.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.

13/10/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.

13/10/2021 **MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
13/10/2021 - **MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados**.**
14/10/2021 - **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
14/10/2021 **MVCB_ 4838 YENNY ARLET AREVALO PACHON:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentar
14/10/2021 **MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES: S**e realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresenta
14/10/2021 **MVCB_ 3888 GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan n
15/10/2021 **MVCB_0481 MARCO JULIO MARTINEZ** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros
15/10/2021 **MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros enc
15/10/2021 **MVCB_ 3880 FIDELGNO RODRGUEZ:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros e
15/10/2021 - **MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA ,**APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD
15/10/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
15/10/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA S**e hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
15/10/2021 **MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
12/10/2021- **MVCB_4475 MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO:** No es posible realizar apertura, debido a que la beneficiaria se encuentra realizando obras en el 3 piso y tiene material en el area que se intervendrá.
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
11/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál se hace entrega de kit ecológico al beneficiario y a los trabajadores. El señor Pedro no indica dudas e inquietudes
11/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS** La encargada manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
11/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
11/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas
11/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observan maestros encargados.
11/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta dudas e inquietudes sobre un área a intervenir a lo cual el contratista le resuelve dicha duda. Se observa personal de obra en el predio.
11/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se evidencia personal de obra en el predio ya que está desocupada y los maestros tienen las llaves para poder ingresar.
11/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa
11/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad con el avance. No sé observa personal de obra en el predio.

11/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Se realiza seguimiento y se evidencia avance importante en las labores de obra, se despejan dudas.
11/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra y se resuelven dudas de los beneficiarios
11/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra y se resuelven dudas de los beneficiarios
12/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra
12/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra
12/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio estableciendo compromisos con la beneficiaria para el inicio de las labores de obra
12/10/2021- **MVCB_4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **MIRIAM LOPEZ.** Se realiza visita de seguimiento social y técnico, contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejercitando actividades. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
12/10/2021- **MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades, se resuelven dudas a la propietaria quien expresa conformidad con los avances.
12/10/2021- **MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.** Se realiza visita de seguimiento a la obra social. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. No se reportan dudas y/o inconformidades
12/10/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no se encuentra en el momento. Se deja recomendación frente a los compromisos de estar al tanto de la obra y dejar bitácora en un lugar visible y fácil acceso.
12/10/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO. A**tiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO.** Se realiza visita de seguimiento social para resolver dudas técnicas al propietario e hijo autorizado y dar continuidad a la obra. Se les reitera la importacia que frente a cualquier duda y/o inconformidad, se debe seguir el conducto regular con el contratista/ interventoria. Los maestros no resuelven dudas al respecto.
12/10/2021 **MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ** se realiza visita de seguimiento con los técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere dudas y/o inconformidades.
12/10/2021 **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES.** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Obras se encuentran en pausa debido a que la beneficiaria no ha solucionado el punto de gas en la vivienda para poder trasladarse de espacio y dar continuidad a las obras. Se le reitera que no tocamos puntos de gas y eléctricos y que ha sido una instrucción que se dio desde el inicio del proyecto. Se compromete a dar pronta solución para continuar con las obras.
12/10/2021 **MVCB_2621 ALIX ÁNGULO AMADO.** Se realiza seguimiento social de obra. No se encuentra beneficiario ni autorizado en la vivienda. Se reitera la importancia de permanecer un adulto durante la ejecución de las obras y dejar la bitácora en un lugar visible y de fácil acceso.
13/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
13/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. S**eguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas
13/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observan maestros encargados.
13/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se evidencia personal de obra en el predio ya que está desocupada y los maestros tienen las llaves para poder ingresar.
13/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
13/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
13/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad con el avance. No sé observa personal de obra en el predio.
13/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
14/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas.
14/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS** La encargada manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
14/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál mi se observan a los maestros encargados.
14/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad
14/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.

14/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál el contratista le indica a la beneficiaria que hay un cambio en el presupuesto. Se evidencia maestros encargados
14/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, SIN NOVEDAD POR PARTE DE LA BENEFICIARIA
14/10/2021 - **MVCB_ 4272: NIEVES LIZARAZO ,** SEGUIMIENTO, NO SE EVIDENCIA MAESTROS EN OBRA .
14/10/2021 - **MVCB_ 4233: BEATRIZ RUSINQUE ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, SIN NOVEDAD POR PARTE DE LA BENEFICIARIA
14/10/2021_MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN , SE REALIZA ACLARACIONES AL BENEFICIARIO EN CUANTO AL EMCHAPE DE COCINA Y BAÑO CON LAS MEMORIAS POR PAETE DEL PROFESIONAL TECNICO.
14/10/2021_MVCB_4401 GUSTAVO MARTINEZ , SE PRESENTA OBERVACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO
14/10/2021_**MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
14/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social
14/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio vivienda sin novedad social
14/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Se realiza seguimiento y se evidencia avance importante en las labores de obra, el benefivciario manifiesta conformidad en la ejecucion.
14/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** no se encontraba la persona autorizada por el beneficiario
14/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se realiza seguimiento de actividades, el beneficiario muestra inconformidad con los maestros ya que fuman cigarrillo dentro de la viviebndaa se hace el respectivio llamado de atencion al contratista
14/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra, sin novedades desde el area social.
14/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza verificación de actividades en el predio y se replantearon temas técnicos, la señora solicita verificación de presupuesto para saber si se podían realizar las escaleras
14/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra.
14/10/2021_**MVCB_3839**: **JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO** SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
14/10/2021_**MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
15/10/2021_**MVCB_4843 MARISOL PALACIOS : NO SE** SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA - NO HAY MAESTROS EN OBRA
15/10/2021_**MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANCA :**SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
15/10/201 -MVCB_ **0213 JOSE LEONARDO SERRANO:** : NO SE SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA - NO HAY MAESTROS EN OBRA
15/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.
15/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.
15/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál el contratista le indica a la beneficiaria que hay un cambio en el presupuesto. Se evidencia maestros encargados
15/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad con dudas en la instalación de un enchape en cuál no está en el presupuesto, se le explica que el recurso no alcanza y se deja registro en bitácora.
15/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál se observan nuevamente a los maestros encargados.

15/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA RAMÍREZ VARGAS .** La encargada MIRIAM SÁNCHEZ manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio .
15/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora manifiesta que desde el día lunes no hay personal de obra en el predio, el contratista indica que hará reasignación de personal.
15/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
15/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
15/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
ENTREGAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
11/10/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NAVARRO AGUIRRE .** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
11/10/2021-**MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA**,Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
11/10/2021- **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
12/10/2021 - **MVCB_ 4694, JOSE ALIRIO TORRES** SE REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA-Se entrega la vivienda a conformidad del benficiario , en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social. Entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad. Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. Entrega de kit ecológico
13/10/2021- **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
13/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES S**e realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
13/10/2021-**MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
14/10/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO .** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos:en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
14/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SÁNCHEZ.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos:en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 **MVCB_3425 PABLO ANTONIO CUERVO:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidades.
RENUNCIAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.

ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
no se realizaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
12/10/2021-**MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** validación sin novedad
12/10/2021-**MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ**, validación sin novedad
14/10/2021- **MVUN_299 LUZ MARÍNA CASTAÑEDA MONTENEGRO,**validación sin novedad
14/10/2021-**MVUN_182 NYDIA BUSTOS LÓPEZ,** validación sin novedad
15/10/2021- **MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ,** validación sin novedad
15/10/2021- **MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO,**validación sin novedad
15/10/2021-**MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA,** validación realizada la vivienda presenta problematicas socioeconómicas, familiares, que se ve reflejado en su entorno social
12/10/2021- **MVUN_241 : MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ,** acompañemiento de realización de validación tecnica
VALIDACIONES FALLIDAS
12/10/2021-**MVUN_478 HÉCTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA,** validación fallida se realizó contacto teléfono con el beneficiario pero no atendió la puerta.
14/10/2021-**MVUN_238 ALIRIO CONTRERAS,** validación fallida se evidencia que las condiciones técnicas de la vivienda requieren verificaciones adicionales de la parte técnica.
APERTURAS
12/10/2021**- MVUN_099 FERNANDO MORENO MARIÑO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021- **MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ** , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021**-MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021- **MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/10/2021- **MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/10/2021- **MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana

SEGUIMIENTOS SOCIALES
13/10/2021- **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
14/10/2021-**MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
14/10/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
15/10/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
14/10/2021- **MVUN_099 FERNANDO MORENO MARIÑO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
15/10/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
En espera de la selección de la historia de vida del territorio Habitarte por parte de la entidad, estas fueron enviadas el día 12/10/2021. MVCB_4351, MVCB_3793, MVCB_4744, MVCB_2055, MVCB_2020.

BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
15/10/2021-**MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA,** Se observa que en la vivienda existe un problema socioeconómico, familiar, y de entorno con los vecinos (De tipo social qué puede afectar el desarrollo de la obra) el contratista presentará informe puntual del caso.(en visita de validación se identifica problemática con vecinos, beneficiario informa que la vivienda contigua a su casa afecto la estabilidad de su vivienda, ocasionando diversas afectaciones (fisuras, grietas y desprendimientos de material) por esta razón ha tenido diferentes inconvenientes con el
6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE

VALIDACIONES

APERTURA DE VIVIENDA 12/10/2021 - MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA , Desarrollo Juan Pablo II- APARECE EN BASE COMPARTIR	APERTURA DE VIVIENDA 12/10/2021 - MVCB_ 3839: JOSE CUADRADO CUADRADO ,Desarrollo Juan Pablo II	APERTURA DE VIVIENDA 15/10/2021 - MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA Desarrollo Juan Pablo II
		
Apertura de obra MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO, Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ Desarrollo Compartir**
		

APERTURA,MVCB_3880 FIDELIGNO RODRIGUEZ ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES ,JUAN PABLO
		
APERTURA,MVCB_3888 GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_0481 MARCO JULIO MARTÍNEZ MADER ,COMPARTIR	APERTURA,MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ, COMPARTIR
		

APERTURA,MVCB_4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO ,JUAN PABLO	APERTURA FALLIDA,MVCB_4475 MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO, JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_4498 ELCI RUTH ORTIZ MORENO,JUAN PABLO
		
Apertura de vivienda -MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO. Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA Desarrollo Juan Pablo II**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de	8/09/2021															
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021														
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021														
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021	14/10/2021														

MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras, vivienda aperturada solo por el contratista(cubierta)	12/10/2021															
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	15/102021														
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021															
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021															

MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021															
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/03/2021															
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021															
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021														
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021														
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															
MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															

MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	15/102021														
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021															
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021															
MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															

MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021																
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021																
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/201																
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021																
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021																

MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	13/10/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021																
MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021																

MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021																
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	12/10/2021															
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACIO N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	11/10/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	11/10/2021															

MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021														
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021														
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021														
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021															
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	14/10/2021														
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														

MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021																
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021																
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	15/102021															
MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																

MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021																
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	11/10/2021															
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021																
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	13/10/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	13/10/2021															

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 7. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	11/10/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	9
HASTA	17/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades

1. Se hace acompañamiento y verificación de la Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Entrega de Kits durante las nuevas aperturas para beneficiario y trabajadores, charlas de Divulgación de protocolo de Bioseguridad con apoyo del personal Social.
3. No se presentaron ingresos durante la semana por lo tanto no se realiza inducción
4. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizaron charlas de refuerzo de SST.
5. Se realizan entregas de Viviendas, dejando constancia firmada de recibido sin escombro, por parte del área SST, las cuales hacen parte de los soportes de las viviendas.
6. Se realiza la entrega de la Señalética de Bioseguridad en las entregas de Vivienda, se deja evidencia fotográfica.
7. Verificación de los soportes que deben entregarse por MV, del componente ambiental y de Bioseguridad.
8. Se revisan pin de Volqueta y Vales de Escombro.

Se hace el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas. Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente

INTERVENTORIA
Se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, se cumple los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social de interventoría en terreno sobre Riesgo público (Riesgos de la zona como robos, raponazo entre otros) Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo. Se verifica que en las entregas de viviendas, se realice sin presencia de escombros en la casa y que se realice la entrega de los afiches del correcto lavado de manos y clasificación de residuos con las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde). Existen sectores en donde se ha evidenciado que el riesgo publico es muy elevado y se han dado pautas para no realizar desplazamientos aislados,siempre debe hacerse en grupo. Se hace recarga de kit de bioseguridad al personal de interventoría y reposición de tapabocas Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 13 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y cuenta con afiliaciones al día.
2. CAPACITACION contratista
Charla de divulgacion del.protocolo de bioseguridad Charla de lavado de manos Charla de uso de tapabocas
2.1 CAPACITACION Interventoría
Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social de interventoría en terreno sobre Riesgo público (Riesgos de la zona como robos, raponazo entre otros)
3. Gestión Ambiental
La recogida de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las casas entregadas, se haya recogido el escombro y se haga entrega los afiches del correcto lavado de manos y las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde)

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**24**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**30**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

• Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las y Aperturas de Vivienda a los beneficiarios y maestros.
• En las visitas a los MV se realiza charlas de Bioseguridad.
• Se hace seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros.
• Se revisa y se deja constancia en las entregas de Vivienda que estas se encuentran libres de los escombros generados por la intervención, los beneficiarios firman a satisfacción y se deja evidencia fotográfica.

• El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**4992**	8,67	3,50	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**16328**	90,19	14,00	**2576**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**21648**	135,60	33,17	**5408**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico

MV ENTREGADO LIBRE DE ESCOMBRO






MVCB 3425





MVCB 4867

	
RECARGA DE KIT INTERVENTORIA	**CHARLA INTERVENTORÍA**
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT TRABAJADOR MVCB 4838	**ENTREGA KIT TRABAJADOR MVCB 3839**

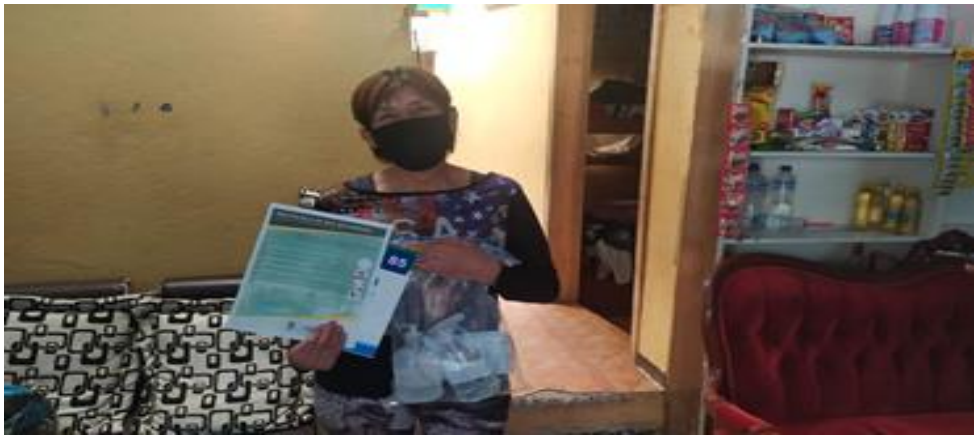PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVCB 3876	ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVCB 3888

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	104	4992	6,0	0,0		2,17	0,00	6,50	0,00	**8,67**			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	**3,50**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0						
				118	**5664**	**6**	**0**	**0,0**	**5,67**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**12,17**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	5.664
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	18.904
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	27.056
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	12,17
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	104,19
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	168,77

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	6
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	24
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	30
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Charla de divulgacion del.protocolo de bioseguridad Charla de lavado de manos Charla de uso de tapabocas				
	MVCB 3793	**MVCB 3752**	**MVCB 4867**	**MVCB 4867**
La interventoría recibió información sobre RIESGO PUBLICO				

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	91	0	0	0	104	1	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI			SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI			SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI			SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI			SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI			SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI			SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI			SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI			SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI			SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI			SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI			SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI			SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI			SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI			SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**91**	**84**	**0**	**104**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**91**	**105**	**0**	**104**	**1**	

SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021					
	NOMBRE	**PERMISO DE TRABAJO**	**UBICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO**
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES


SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**18 DE OCTUBRE 2021**	**PERIODO**	**MES 2**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																									
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P						
				E		E	E	E	E	E	E																
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
				E		E	E	E	E	E	E																
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																							
				E																							
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																							
				E																							
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																						
					E																						
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																						
					E																						
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																						
					E																						
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
							E	E	E	E	E																
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E															
Verificacion diaria de los elementos de bioseguririrdad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E															
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
							E	E	E	E	E	E															
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E															
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p		
						E			E																		
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
						E	E	E	E	E	E	E															
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
							E	E	E	E	E	E															
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
				E	E	E	E	E	E	E	E	E															
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P		
									E																		
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																										

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS							FECHA	18 DE OCTUBRE 2021										PERIODO	MES 2				
PLAN DE TRABAJO SG SST			AÑO 2021																					
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E															
Inspeción camilla	Contratista								p				p				p				p				p
Inspección Extintores	Contratista								P				P				P				P				P
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E		E	E													
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
							E		E	E	E	E													
diligenciamiento del formato recogida de escoombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
											E														
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista																								
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista					P																			
						E																			
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista																								
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	11	18	13	13	9	19	12	12	12	19	12	12	12	19	11	11	11	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	10	16	12	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,91%	88,89%	92,31%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		89,66%		96,15%		32,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				93,88%				62,96%				0,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	32,84%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3839		



MV CB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4838		



MV CB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3803		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4096		




MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3803		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REFUERZO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3839		



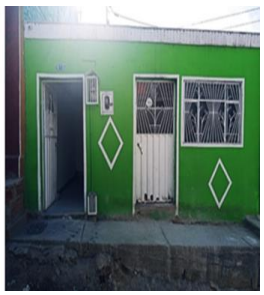

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA SIN ESCOMBROS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3425		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA DE VIVIENDA, ENTREGA DE KIT BENEFICIARIO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3880		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4072		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4085		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4096		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4175		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4183		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4363		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4366		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE INTERVENTORIA SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
N/A		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE INTERVENTORIA SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
N/A		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4561		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA - AFICHE PROTOCOLO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
2013		



MVUN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA - AFICHE PROTOCOLO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
2277		



MVUN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA - AFICHE PROTOCOLO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
2414		



MVUN	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA - AFICHE PROTOCOLO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
3351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA - AFICHE PROTOCOLO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2021
3793		
