

INFORME SEMANAL 11





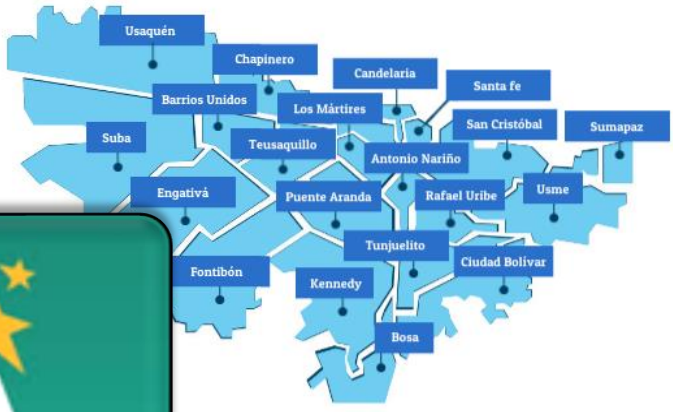

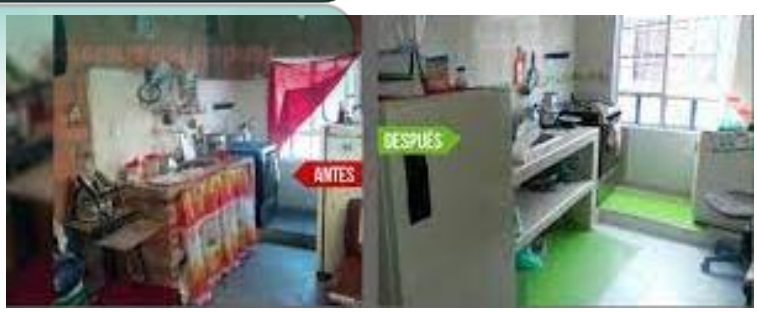

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021

SEMANA 11 DEL 25 DE OCT. AL 31 DE OCT. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).

ETAPA DE VALIDACIÓN


En este informe ejecutivo, comprendido del 25 de OCTUBRE al 31 de Octubre del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la semana Once, las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra en general en los territorios de Habitarte, Jerusalén y Unir II.

Se continúa las actividades de obra en las viviendas en el sector de Habitarte por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** así mismo se continua con la validación en el sector de UNIR (50 viviendas) al igual que la apertura e inicio de actividades de obra.


Existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur (HABITARTE), y en (UNIR) se está localizado en una bodega, Calle 75 #119-26, ya que por razones de localización y seguridad el contratista expone que es complejo su adquisición en arriendo.

Se continúa con las actividades de instalación de la cubierta en el sector de Habitarte, cumpliendo con el procedimiento y la normativa vigente con es la resolución 1409 de 2012, como lo solicita el anexo técnico de obra y la legislación Nacional.

Avance de Validaciones.

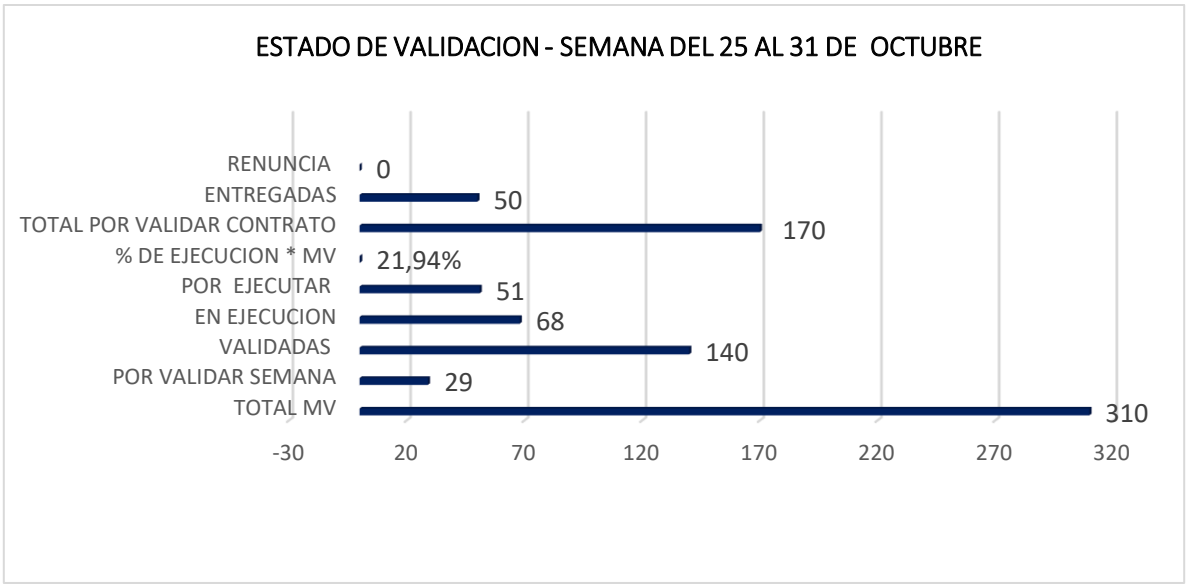

Avance de validaciones realizadas al 31 DE OCTUBRE 2021: **Total 140**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 68**
Validaciones por realizar: **170 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **0**
Entregadas**: 50**

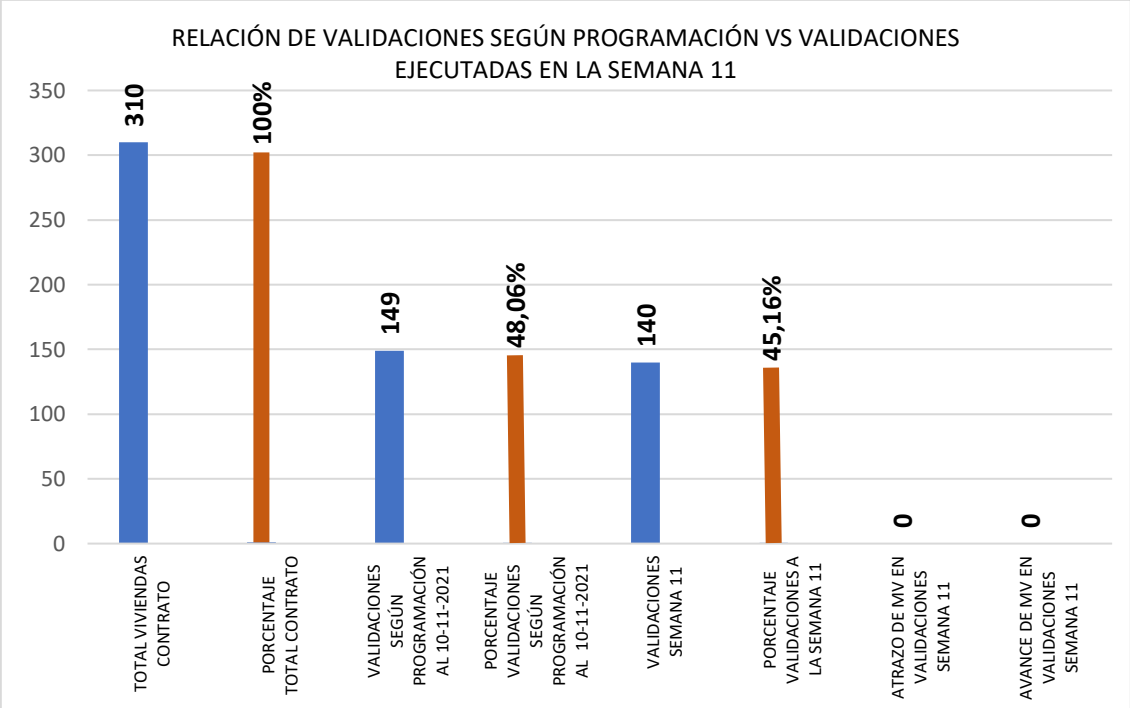

Para el presente informe (semana 11) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en cumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 10 de Noviembre del 2021 deberá finalizar con 149 validaciones y a la fecha posee 140 validaciones terminadas.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	25	0	9	14	9	2	62,49%	9
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	19,42%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**17**	**9**	**2**	**40,95%**	**9**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	25	0	6	15	6	4	59,32%	6
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	2	0	0	15,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**17**	**6**	**5**	**24,77%**	**6**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		22	28	0	16	0	34	11,28%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			**59**	**59**	**31**	**28**	0	**16**	**9**	**34**	**55,64%**	**9**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	11	8	15	3	71,00%	15
		Urbanización compartir	2		2	0	1	1	1	0	67,00%	1
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	**12**	**9**	**16**	**3**	**69,00%**	**16**


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
		Juan Pablo II	13		12	1	1	8	1	4	27,62%	1
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	4	1	4	1	81,67%	4
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	10	**9**	**10**	**7**	**60,24%**	**10**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GENERAL	Marandu	7	169	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
		Juan Pablo II	98		97	1	33	45	40	13	64,09%	40
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	5	7	5	1	45,77%	5
		UNIR	50		22	28	0	16	0	34	11,28%	0
		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**169**	**169**	**140**	**29**	**43**	**68**	**50**	**51**	**38,51%**	**50**

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA


RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 11 DEL 25 de Oct. al 31 de Oct.

Para la semana 11, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

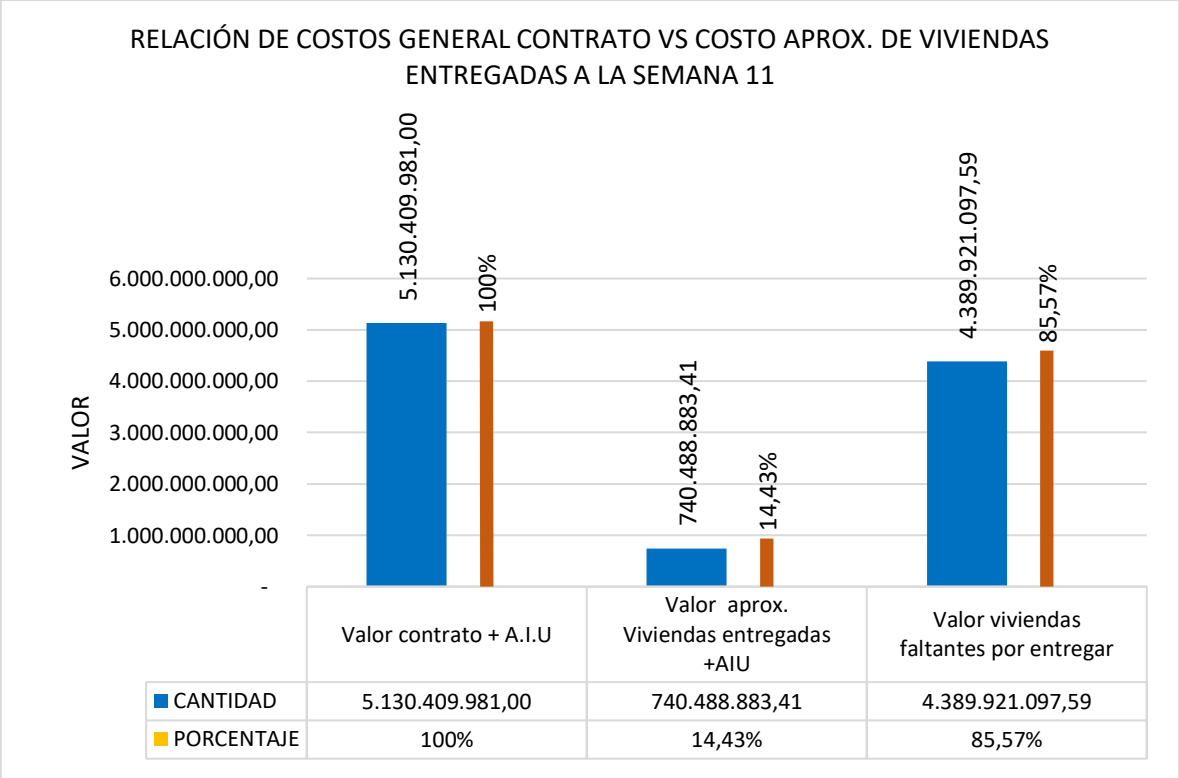


así mismo, el contratista presenta un porcentaje aprox. en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para la semana (11), del 14.43%.


En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 94 días para finalizar el contrato con 260 viviendas por entregar.

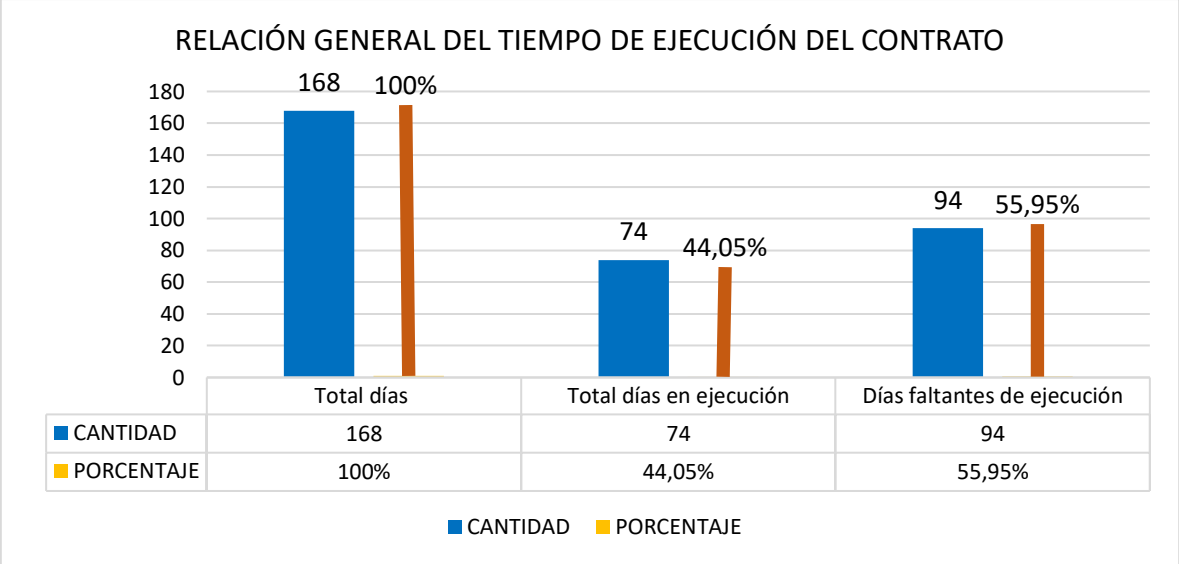

Finalmente, en este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra en cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que para el día 29 de noviembre de 2021 entregara 134 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 50 viviendas, de igual manera se encuentran en ejecución de 68 viviendas.

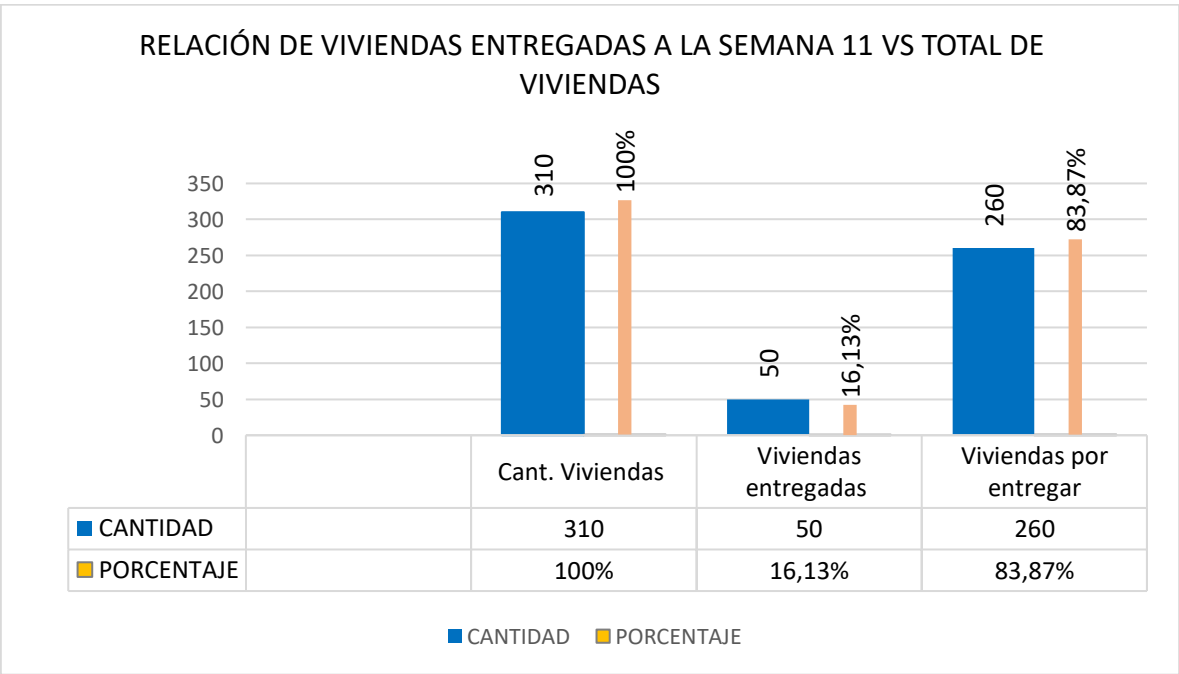

De acuerdo con la ejecución que esta realizando el contratista, a continuación, se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que a la semana 10 se encuentran activas.

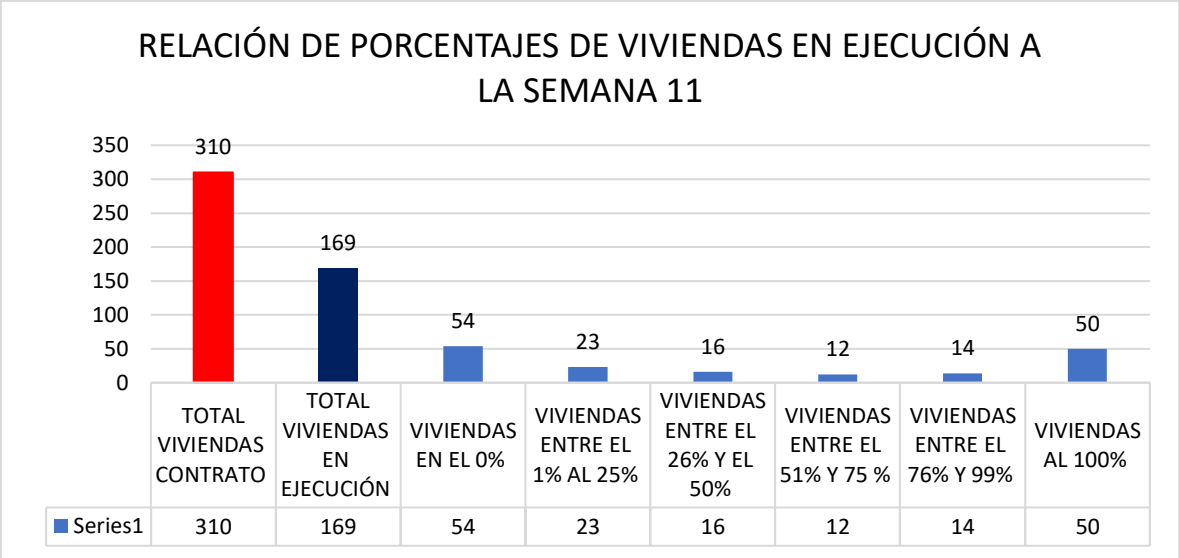

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **31-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	28	25	0	9	14	9	2	62,49%	9
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	19,42%	0
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**17**	**9**	**2**	**40,95%**	**9**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 25 AL 31
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 11**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	7/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	8/09/2021	7/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	7/09/2021	6/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%

4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI NO	$ 12.020.042,0	$ 11.427.635,0	14/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	10/09/2021	8/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO	$ 12.897.510,0	$ 11.186.603,0	9/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO	$ 12.894.063,0	$ 11.626.077,0	13/09/2021	19/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	9/09/2021	15/10/2021	ENTREGADA	100,00%	100,00%
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO	$ 12.972.425,0	$ 10.902.052,0	9/09/2021	27/10/2021	ENTREGADA	81,19%	100,00%
10	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0	12/10/2021		EN EJECUCION	29,32%	52,98%
11	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0	28/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	0,00%
12	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0	7/10/2021		EN EJECUCION	60,84%	95,12%
13	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2	7/10/2021		EN EJECUCION	50,29%	80,32%
14	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4	6/10/2021		EN EJECUCION	48,38%	88,96%
15	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0	6/10/2012		EN EJECUCION	29,89%	69,77%
16	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8	12/10/2021		EN EJECUCION	38,23%	53,17%
17	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3	11/10/2021		EN EJECUCION	10,40%	61,58%
18	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0	20/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	23,00%
19	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0	14/10/2021		EN EJECUCION	2,09%	8,95%
20	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0	14/10/2021		EN EJECUCION	8,82%	53,97%
21	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4	15/10/2021		EN EJECUCION	4,91%	25,62%
22	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	0,00%
23	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8	21/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	22,38%
24	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9			VALIDADA	0,00%	0,00%
25	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5	20/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	26,33%

URBANIZACION COMPARTIR											
26	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		$ 11.953.028,0	8/10/2021		EN EJECUCION	22,71%	40,11%
27	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		$ 11.612.217,0	15/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	6,00%
28	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		$ 11.789.319,0	15/10/2021		EN EJECUCION	6,25%	12,16%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	11	DEL	25/10/2021	AL	31/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

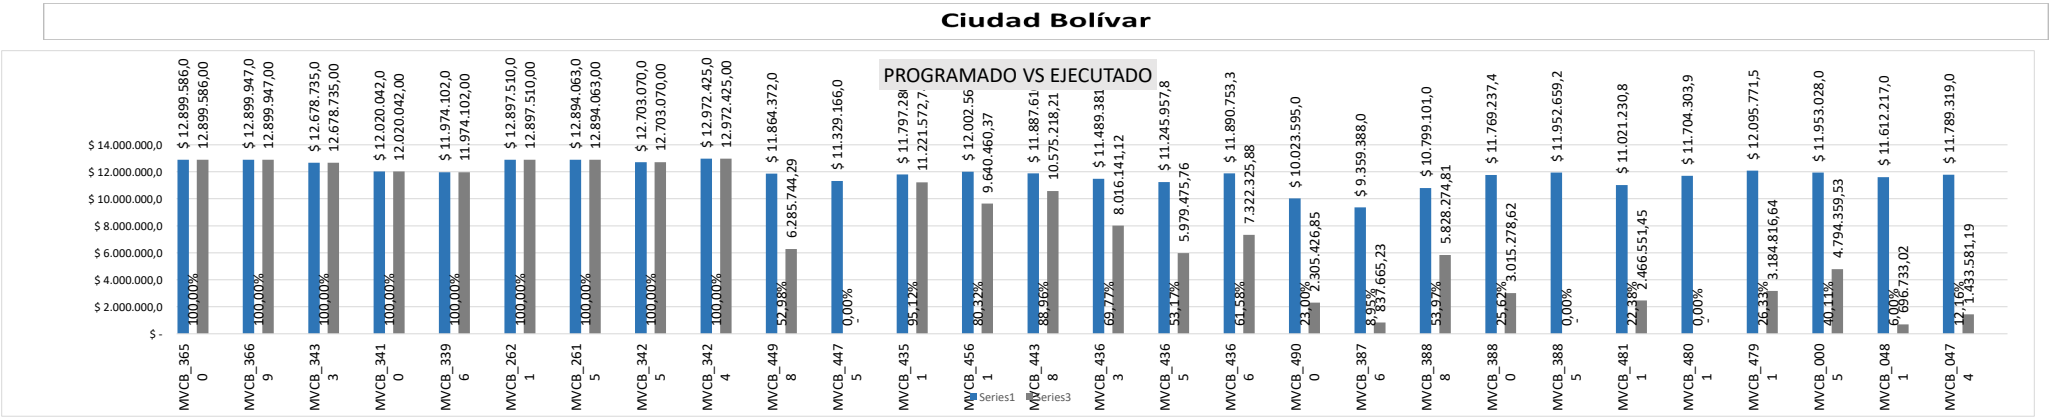

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Durante el presente período se entregó una (1) vivienda en el barrio Juan Pablo II y se aperturó una (1).			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
10	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	Se instaló cerámica de piso en área de lavandería y en la alcoba 2. Se encapó pared del área de lavandería. Se instaló cielo raso pvc en alcoba 2. En el área de cocina, se demolió mesón antiguo, y se fundió el nuevo; se enchapa pared de cocina.
11	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	El día 28 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario.
12	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	Se terminaron los enchapes de mesón, se instalaron el lavaplatos y la grifería, se aplicó estuco y vinilo sobre paredes. Se aplicó pintura vinilo sobre muros de todas las áreas de la casa. Se instaló cielo raso pvc en todas las áreas de la vivienda. Vivienda en el 95% de avance.
13	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	Se estucaron y pintaron los muros de sala y cocina. En la zona de cocina se terminaron los enchapes de mesón, se instalo lavaplatos. Quedaron enchapados los pisos de sala comedor, cocina y bano, sala 2, hall de alcobas. Se enchaparon los muros de baño. Se instaló cielo raso de tablilla pvc en áreas de sala y cocina. Vivienda con avance del 80%.
14	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	Se terminó enchape de piso en la alcoba 1. Se avanza en enchape de muros y pisos del área de lavandería. En la zona de cocina se enchaparon paredes, mesones, piso y se instalo el lavaplatos. Se continuó y terminó pintura vinilo en muros de alcobas, corredores y lavandería. Se enchapó el piso del baño y se elaboró el bordillo de la ducha. Se instaló cielo raso pvc en área de alcobas 1, 2, y 3.
15	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	Se instaló cerámica de piso con sus guardaescobas, en alcobas 1 y 2, sala comedor, corredor de alcobas, baño y cocina con sus . En el área de cocina se enchaparon las paredes. Igualmente, en el área de baño se terminaron los enchapes de muros y se elaboró el bordillo de la ducha. Se avanza en aplicación de pintura vinilo sobre muros de sala comedor, alcobas 1 y 2, corredor de alcobas, cocina y baño.
16	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	Se enchaparon los pisos de sala comedor y corredor de acceso. Se avanzó en aplicación de pintura vinilo en sala comedor, alcobas 1 y 2, corredor de alcobas y patio interior.
17	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	Se aplicó estuco acrílico sobre pañete de muros de punto fijo, hall de alcobas y baño. En la alcoba 4 enchapó el piso y se aplicó pintura vinilo en muros. En el área de cocina se fundieron los mesones y se avanza en enchape de los mismos. Se enchaparon piso y paredes de baño. Se preparó superficie de concreto y se instaló cerámica de piso en alcoba 1.
18	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	En el área de sala comedor, se terminó el alistado de piso, se instaló la cerámica de piso con su guardaescoba, y se aplicó estuco sobre muros.
19	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se avanzó en pañete de muros de corredor de acceso, cocina, baño, muros de patio interior. Se adecuaron puntos hidrosanitarios para lavaplatos.
20	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	Se instaló cerámica de piso en sala comedor, corredor de cocina, baño, cocina y corredor de alcobas. En área de lavandería se enchaparon las paredes y mochetas para lavadero. Se instaló la estructura metálica para cielo raso en áreas de sala comedor, cocina, alcoba 1, corredor de alcobas y baño 2. Se aplicó estuco en paredes de baño, cocina y corredor de cocina.
21	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	Se avanzó en actividades de pañetes en muros de alcobas 1, 2 y 3, en muros de patio interior, área de lavandería y cocina. Se alistaron pisos de alcobas 1, 2 y 3, patio interno y cocina.

22	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
23	MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	Se alistaron pisos y se instaló cerámica en áreas de alcobas 1 y 2. Se avanzó en aplicación de estuco y pintura vinilo en la alcoba 1. Se instaló estructura metálica para cielo raso en alcoba 1.
24	MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
25	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	Se iniciaron actividades de obra. Se avanzó en pañetes lineales en parte superior de muros de alcobas 1 y 2. Se aplicó estuco acrílico en áreas de alcobas 1, 2 y en sala comedor. Se avanzó en instalación de cerámica de piso en alcobas 1, 2 y en sala comedor.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
26	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	Se alista piso y se instala cerámica de piso en alcoba 1 y en patio interno. Se aplica estuco acrílico en muros de alcoba 1 y sala. Se pañetan muros de cocina y se inicia instalación de cerámica de pared.
27	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	Se iniciaron actividades de obra. Se avanzó en pañetes de muros de alcoba 4 y muro de comedor. La vivienda presentó muy poco avance de ejecución de actividades.
28	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	Se pañetaron muros de alcoba 2. Se alistaron pisos de hall de alcobas. Se evidenció muy poco avance de actividades.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto, residentes de contratista y la interventoría ajustaron presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas y validadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	1/11/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	1/11/2021
Estructurar presupuestos y aperturar viviendas validadas.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	1/11/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

A la fecha se han entregado nueve (9) viviendas en el barrio Juan Pablo II.

Se tienen a la fecha un total de 28 viviendas validadas, de las cuales se han entregado nueve (9). Se encuentran en ejecución diecisiete (17) viviendas: catorce (14) en el barrio Juan Pablo II y tres (3) en la urbanización Compartir. Hay dos (2) viviendas validadas que aún no se han aperturado, corresponden a mejoramiento de cubierta.

Se presentaron lloviznas hacia mediodía y en horas de la tarde.

Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuran presupuestos y se proyectaron actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **31-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

EMANAS

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	28	25	0	6	15	6	4	59,32%	6
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	2	0	0	15,00%	0
Técnico Responsable		Acacias IV	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	0	**17**	**6**	**5**	**24,77%**	**6**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 25 AL 31
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 11
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO	$ 12.503.233,92	$ 12.077.142,10	**14/09/2021**	**12/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO	$ 12.940.220,00	$ 11.724.531,40	**8/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO	$ 12.124.137,35	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO		$ 11.377.892,80	24/09/2021		EN EJECUCION	80,00%	**90,00%**
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,4	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI / NO	$ 12.388.424,33	$ 12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI / NO	$ 12.169.139,33	$ 12.003.602,50	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI / NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021		EN EJECUCION	80,00%	**90,00%**
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI / NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021		EN EJECUCION	99,00%	**99,00%**
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI / NO		$ 12.076.903,30	6/10/2021		EN EJECUCION	85,00%	**99,00%**
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI / NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021		EN EJECUCION	86,00%	**90,00%**
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI / NO		$ 12.150.294,90	12/10/2021		EN EJECUCION	17,00%	**40,00%**
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI / NO		$ 11.998.548,50	13/10/2021		EN EJECUCION	45,00%	**65,00%**
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI / NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI / NO		$ 11.606.673,70	14/10/2021		EN EJECUCION	35,00%	**75,00%**
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI / NO			29/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	**5,00%**
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI / NO		$ 11.592.989,00	12/10/2021		EN EJECUCION	35,00%	**65,00%**
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI / NO		$ 11.981.782,60	28/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI / NO		$ 12.198.500,50	21/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**60,00%**
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI / NO		$ 11.854.190,20	15/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**40,00%**
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI / NO		$ 12.205.262,30	22/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**15,00%**
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI / NO		$ 11.991.555,40	21/10/2021		EN EJECUCION	2,00%	**50,00%**
URBANIZACION COMPARTIR ETAPA 2											
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI / NO		$ 12.284.986,00	12/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**15,00%**
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI / NO		$ 12.154.953,00	6/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**15,00%**
ACACIAS IV ETAPA 2											
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	11	DEL	25/10/2021	AL	31/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

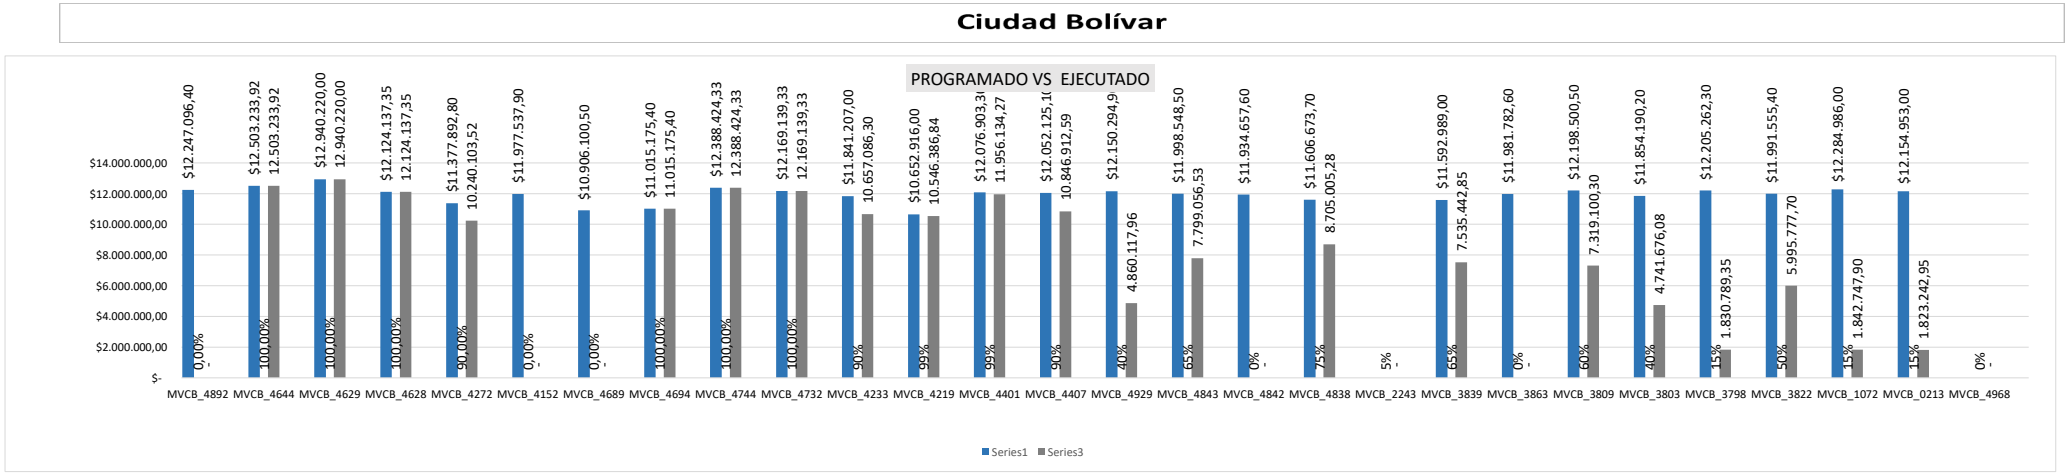

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 25 de octubre, se inicia enchape de muros en baño, Se revisa boquilla de piso y muros de cocina y se solicita arreglos. El día 28 de octubre, se revisa boquilla de piso, se solicita arreglos; adicionalmente se revisan enchape de baño y de cocina solicitando arreglos de la llave del mesón, cielo raso de baño rellenar con silicona blanca los detalles que hacen falta, boquilla de mesón, instalación de puerta. El día 29 de octubre no han terminado los requerimientos realizados
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de octubre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario**
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 19 de octubre se instala puerta de baño y se realiza boquilla de mesón en cocina e instalación de lavaplatos. **El día 19 de octubre se entrega predio a la beneficiaria**.
9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 19 de octubre, en espera de llegada de puerta y detalles de acabados en baño y cocina . El día 20 de octubre, en espera de llegada de puerta. El día 21 llega la puerta y se instala **El día 22 de octubre se entrega el predio a beneficiario**
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. **El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario**.
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 27 de octubre, realizan visita al predio para evidenciar la tubería tapada, según lo informa el beneficiario y en videos enviados. Se evidencia que todas los sifones están funcionando sin ningún problema adicionalmente se les aplica soda caustica para destaponar sifones con agua caliente en cocina y patio de ropas. Se realiza un video donde quedan reportadas las evidencias anteriormente mencionadas. La hija del beneficiario indica una zona de la ducha que no quedo con caída al sifón, el contratista se compromete a realizar los cambios el día siguiente El día 28 de octubre, se regresa al predio con el maestro para realizar las reparaciones en la zona de la ducha y emboquillar una zona de la alcoba donde se soltó la boquilla. El día 29 de octubre, Se va a mirar las reparaciones realizadas pero el beneficiario no se encuentra, se dejan las canecas para la entrega. El Director de Interventoría autoriza pagar un enchape de techo que se despego al realizar las actividades de picado de piso con barra en una placa fácil. " mala ejecución del constructor"
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 25 de octubre, se acude al predio dos veces sin que ni maestro ni beneficiario atendiera. El predio completa la semana sin actividades. Son dos semanas sin realizar actividades
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 25 de octubre, se funde entrepaño superior en la cocina, se aclara que encima del lavadero va enchape de pared. El día 27 de octubre se solicita arreglos en el mesón de la cocina en win y platero. El día 28 de octubre se inician las reparaciones y la instalación del cielo raso en alcoba de la mamá de la beneficiaria

14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	El día 25 de octubre, Se realiza enchape de piso en alcoba y hall de segundo piso, se enchapa mocheta de lavadero y se arma estructura de mesón de cocina. El día 27 de octubre se realiza boquilla zona de ropas, boquilla en baño y se esta instalando cielo raso en alcoba. El día 28 de octubre se revisan las actividades ejecutadas y cantidades, adicionalmente se solicita remates en cielo raso e instalación de la sifa
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 25 de octubre, predio sin realizar actividades; el maestro manifiesta inconformidad de poca continuidad en las actividades de mejoras, Se le comunica que se informo a la oficina de interventoría. El día 27 de octubre, se solicita cambio de boquilla en alcoba, camio de pieza coca en muro de baño y arreglo de enchape de muros en zona de ropas. El día 28 de octubre inicia el cambio de la boquilla de piso y cambio de piezas en zona de ropa.
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 25 de octubre, no se realizan actividades en el predio. El predio completa la semana sin actividades. El constructor informa que el sábado retomaran actividades en el predio
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 25 de octubre, se inicia enchape de piso en el baño. El día 27 de octubre, se inicia enchape de muros en baño. El día 28 de octubre, continua enchape de muros en baño , se inicia estuco de muros en alcoba principal y balcón. El día 29 de octubre, se verifican cantidades ejecutadas y es un predio que si trabajan el fin de semana y llega la puerta se podría entregar el martes.
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 25 de octubre, continua actividad de enchape muros en cocina El día 27 de octubre, continua actividad de enchape muros y mesón cocina, se va a hablar con la beneficiaria para reajustar la actividad de estuco y pintura ya que el predio presenta filtraciones de la placa en varias zonas. El 29 de octubre, la beneficiaria informa que ellos quieren el estuco y pintura ya que tienen un material para pañetar el patio y que pronto ya van a realizar la cubierta del techo del segundo piso y el problema de filtraciones quedara solucionado.
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 29 de septiembre se realiza acta de inicio.
20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 de septiembre se realiza validación del predio
21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	El día 25 de octubre, continua actividad de boquilla piso en el segundo piso. El día 28 de octubre, se ha instalado cielo raso en todo el segundo piso y se inicia actividad de pintura muros. El día 29 de octubre se inicia enchape de piso en alcoba del primer piso.
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 25 de octubre, enchapan paredes de muros en cocina. El día 27 de octubre, se solicita al constructor arreglo de boquilla y piezas que están hundidas y otras que están mas altas. Se esta realizando enchape de muros y mesón cocina El día 28 de octubre, se inicia alistado de piso en hall zona posterior y enchape de muros en baño . El día 29 de octubre, se realiza mampostería tapando una ventana de la parte superior y se continua solicitando cambio de boquilla de piso y de piezas de piso que están por debajo de las otras
23	MVCB 3863	Fabio Rodríguez	El día 28 de octubre se realiza acta de inicio del predio
24	MVCB 3809	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 25 de octubre, trabajaron el fin de semana y se encontró pañetadas las dos alcobas y se estaba pañetando el hall. El día 28 de octubre, se ha realizado enchape de piso de alcobas y de una sección del hall y se ha instalado cielo raso en las alcobas. El día 29 de octubre, se verifican cantidades ejecutadas y continua el avance en la instalación del cielo raso y estuco en muros.
25	MVCB 3803	Luz Dary Sáenz Capera	El día 25 de octubre, trabajaron el fin de semana, alistaron el piso de una alcoba y se realiza reparaciones de pañete donde se presenta una fisura y toca resanar el pañete de un muro para poder estucar El día 28 de octubre se ha realizado enchape de piso en alcoba y sala, adicionalmente estuco de muros en la alcoba. El día 29 de octubre se termina enchape de piso en alcoba y se arma la estructura del mesón cocina
26	MVCB 3798	María Aliria Medina de Beltrán	El día 27 de octubre se realiza alistado de piso en alcoba 2 y cocina. Los días 28 y 29 de octubre no se realizan actividades

27	MVCB 3822	Sory Inés Costes López	El día 25 de octubre, trabajaron el fin de semana; dejando alistado el piso de cocina alcoba3, ropas y comedor El día 27 de octubre, se inicia actividad de enchape de pisos en cocina y baño. El día 29 de octubre, se enchapa comedor
28	MVCB 4968	Lucas Raúl Beltrán Prieto	El 21 de Septiembre se realiza validación del predio

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
El día 26 de octubre reunión salón comunal de Jerusalén, para socializar inicio de actividades	Hábitat, constructora e interventoría	26/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Lunes 25 de octubre día nublado y a las 11am empezó a llover por 45 minutos, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Martes 26 de octubre mañana soleada y tarde de lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Miércoles 27 de octubre día soleado en la mañana tarde de lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Jueves 28de octubre día soleado en la mañana tarde de lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día Viernes 29 de octubre día soleado en la mañana tarde de lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**31-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000000 7715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000000 7715	**Valor del contrato**	Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		22	28	0	16	0	34	11,28%	0
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			**59**	**59**	**31**	**28**	0	**16**	**9**	**34**	**55,64%**	**9**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 25 AL 31
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 11
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO	$ 12.975.027,15	$ 11.211.390,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO	$ 12.978.940,00	$ 11.927.560,50	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI / NO	$ 12.616.698,00	$ 12.087.004,90	**8/09/2021**	**11/10/20211**	ENTREGADA	1000,00%	**100,00%**
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI / NO	$ 12.978.942,00	$ 12.289.771,00	**10/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI / NO		$ 11.970.900,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI / NO		$ 12.063.817,50	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI / NO	$ 12.086.766,49	$ 12.059.809,40	**10/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI / NO	$ 9.725.095,00	$ 9.602.199,70	**9/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
BARRIO UNIR II											
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI / NO		$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI / NO		$ 9.707.226,00	15/10/2021		EN EJECUCION	27,59%	**49,63%**
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI / NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI / NO		$ 12.538.076,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI / NO		$ 10.814.060,70	7/10/2021		EN EJECUCION	55,10%	**64,83%**
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI / NO		$ 9.765.458,80	27/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**1,84%**
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI / NO		$ 11.422.010,10	7/10/2021		EN EJECUCION	69,23%	**80,38%**
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI / NO		$ 11.764.713,90	13/10/2021		EN EJECUCION	68,49%	**80,82%**
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI / NO		$ 12.149.324,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI / NO		$ 11.150.820,20	7/10/2021		EN EJECUCION	78,77%	**90,49%**
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI / NO		$ 11.271.883,80	27/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**2,04%**
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI / NO		$ 11.702.890,70			RENUNCIA	0,00%	**0,00%**
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI / NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI / NO		$ 11.935.867,00	14/10/2021		EN EJECUCION	11,93%	**25,00%**
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI / NO		$ 11.768.059,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI / NO		$ 9.870.988,30	14/10/2021		EN EJECUCION	24,70%	**27,89%**
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI / NO		$ 11.097.935,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60	15/10/2021		EN EJECUCION	38,26%	**44,56%**
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30	14/10/2021		EN EJECUCION	37,79%	**45,09%**
30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00	15/10/2021		EN EJECUCION	9,53%	**17,61%**
31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20	15/10/2021		EN EJECUCION	2,00%	**15,05%**
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90	15/10/2021		EN EJECUCION	2,00%	**15,00%**
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00	27/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**1,89%**
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90			EN EJECUCION	0,00%	**1,88%**
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	11	DEL	**25/10/2021**	AL	**31/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

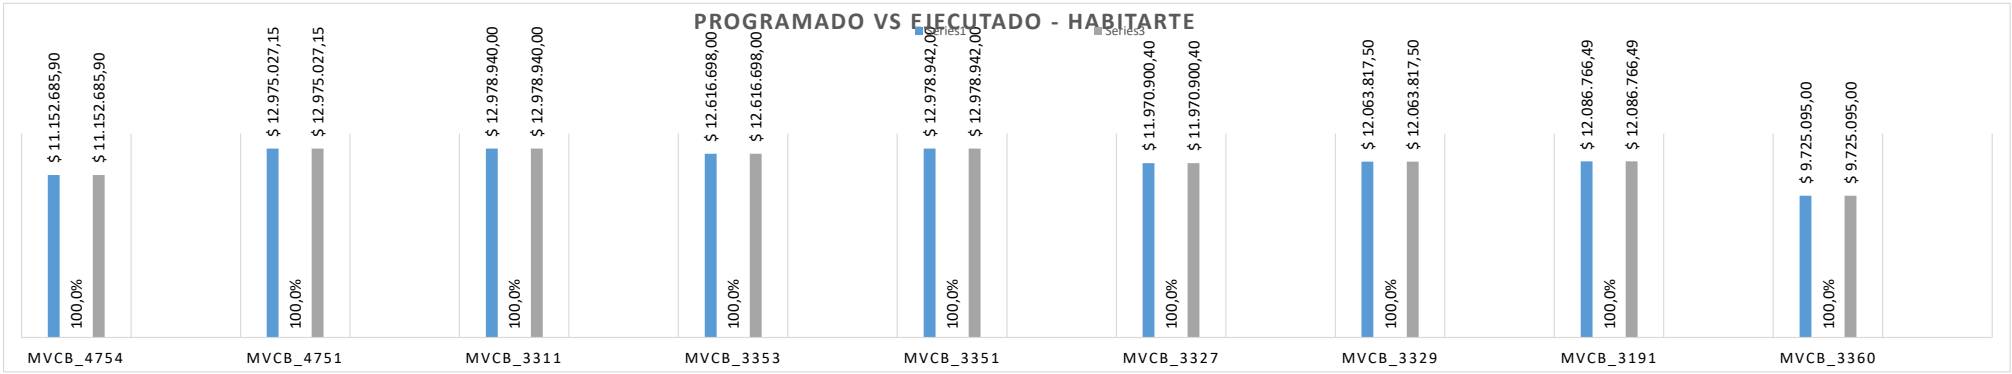

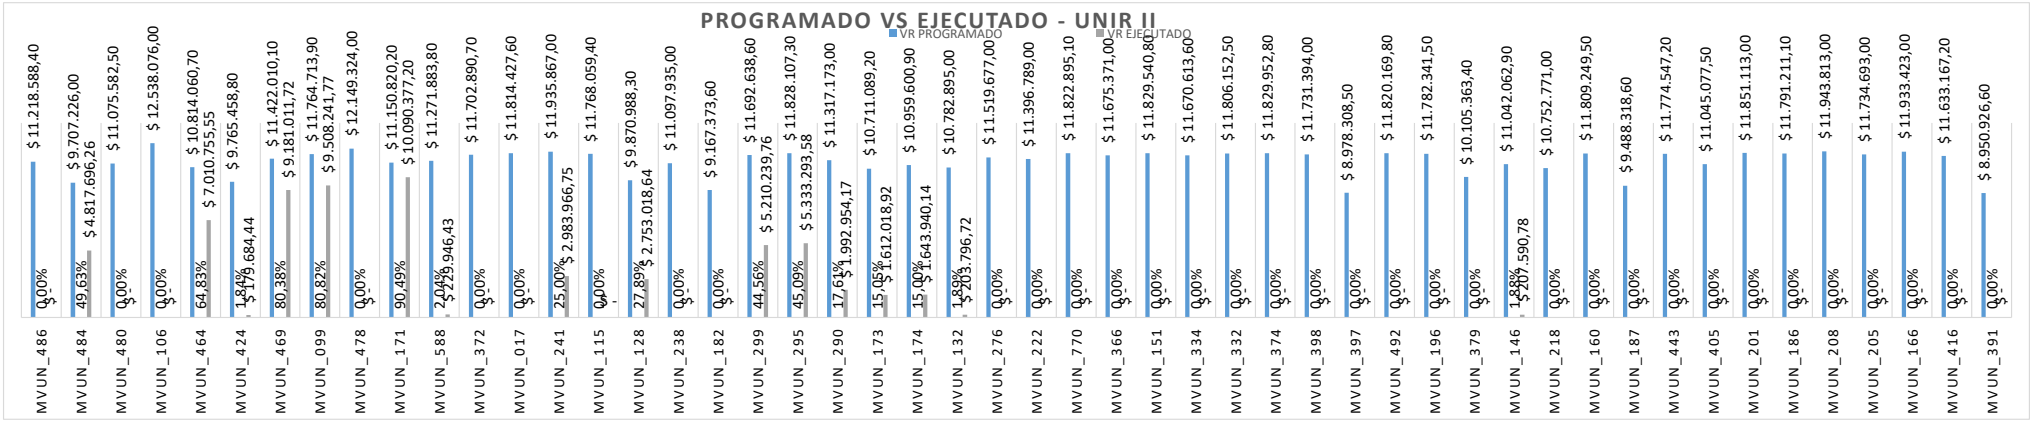

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR

1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
10	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de Montaje de Estructura para Cielo raso en PVC Areas de Sala comedor y Habitacion.
11	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
12	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar,Meson de Cocina
13	MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
14	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar,Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas formato 60 x 30 o similar.
15	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar,Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas formato 60 x 30 o similar.
16	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape de piso Ceramico Formato 60 x 60 o similar,Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas formato 60 x 30 o similar.
17	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
18	MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda
19	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para baños y ropas formato 60 x 30 o similar.Instalacion de Combo Sanitario y Cieloraso area Baño,
20	MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
21	MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4.
22	MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
23	MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
24	MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de Estuco sobre pañete en Habitacion 2,Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm.

25	MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4.Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm.
26	MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Demolicion Piso Ceramico Existente
27	MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
28	MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de Estuco sobre pañete en Habitaciones
29	MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
30	MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
31	MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	29/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda .Esta renuncia se presenta en el MVUN_372

Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **31-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

SE

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	28	26	0	11	8	15	3	71,00%	15
		Urbanización compartir	2		2	0	1	1	1	0	67,00%	1
Técnico Responsable												
Subtotal			**28**	**28**	**28**	**0**	**12**	**9**	**16**	**3**	**69,00%**	**16**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	OCTUBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 25 AL 31
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 11
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO	$ 12.978.390,83	$ 12.079.596,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO	$ 12.460.609,4	$ 11.947.615,50	**8/09/2021**	**5/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI NO	$ 12.636.225,99	$ 12.169.719,00	**8/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI NO	$ 12.978.434,15	$ 12.149.156,80	**27/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	68,00%	**100,00%**
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI NO	$ 12.516.986,46	$ 11.701.628,10	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI NO	$ 12.253.349,05	$ 11.769.775,40	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI NO	$ 12.978.808,77	$ 11.326.716,60	**7/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI NO	$ 11.473.441,99	$ 11.528.955,20	**7/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.792.129,40	11/10/2021		EN EJECUCION	20,00%	**48,00%**
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.676.457,80	**5/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	32,00%	**100,00%**
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI NO		$ 12.027.750,70	11/10/2021		EN EJECUCION	8,00%	**24,00%**
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI NO		$ 12.884.127,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI NO		$ 11.678.378,50	12/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**15,00%**
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI NO		$ 11.386.359,00	**30/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	92,00%	**100,00%**
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI NO		$ 11.687.008,20	11/10/2021		EN EJECUCION	65,00%	**85,00%**
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI NO		$ 11.887.405,00	11/10/2021		EN EJECUCION	29,00%	**54,00%**
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI NO	$ 12.978.495,17	$ 11.878.089,50	**20/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO	$ 12.978.659,81	$ 11.904.933,20	**20/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO	$ 1.297.826,00	$ 11.888.710,30	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		$ 12.028.047,20	**29/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	90,00%	**100,00%**
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021		EN EJECUCION	65,00%	**72,00%**
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		$ 11.196.334,10			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00	29/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80	6/10/2021		EN EJECUCION	40,00%	**48,00%**
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60	**29/09/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	75,00%	**100,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO	$ 12.978.809	$ 11.547.979,00	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		$ 10.062.877,30	14/10/2021		EN EJECUCION	25,00%	**34,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	11	DEL	25/10/2021	AL	31/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

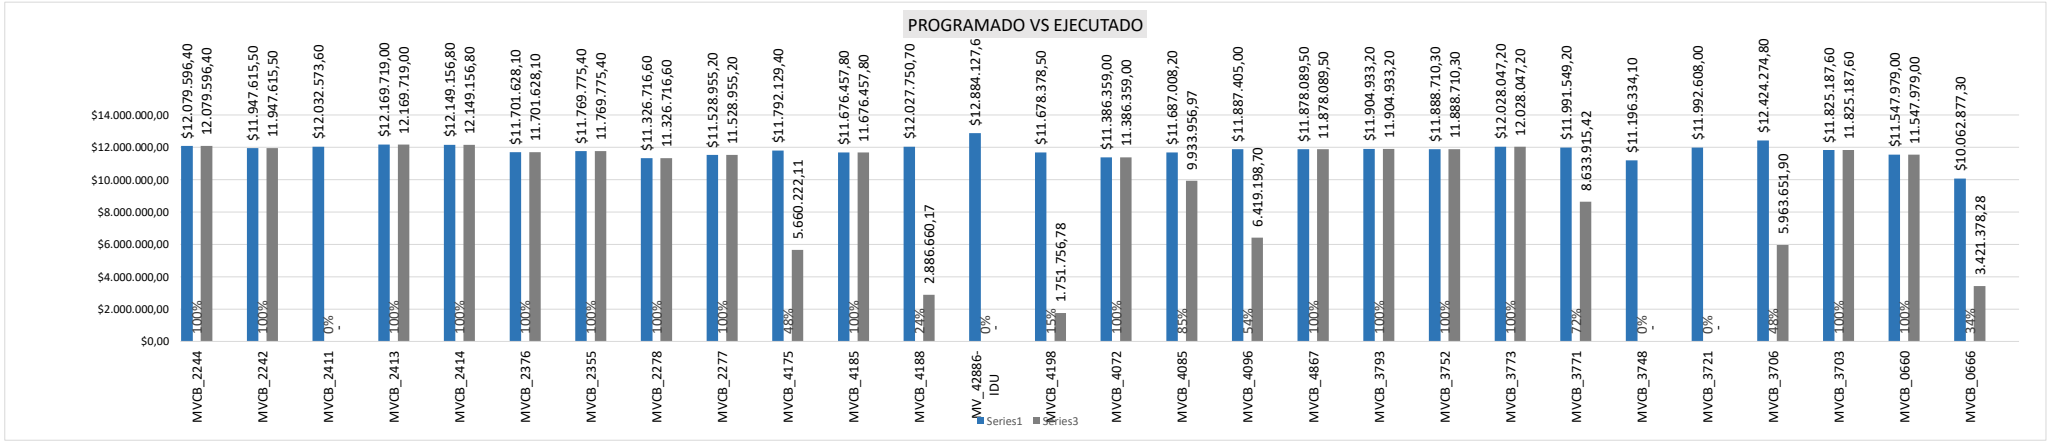

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II			
1	MVCB_2277	Carmenza Flores Galban	Vivienda entregada.
2	MVCB_2278	Luz amparo Naranjo Aguirre	Vivienda entregada.
3	MVCB_2414	Luis Adolfo Torres Sanchez	Vivienda entregada.
4	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
5	MVCB_2242	Aura Nelly Figueroa	Vivienda entregada.
6	MVCB_2244	Carmen Concepción Lopez García	Vivienda entregada.
7	MVCB_2413	María Concepción Lombana Jimenez	Vivienda entregada.
8	MVCB_2376	Aura Elena Ramos Restrepo	Vivienda entregada.
9	MVCB_2355	Ana Otilia Barreto León	Vivienda entregada.
10	MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Vivienda entregada.
11	MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Vivienda entregada.
12	MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Vivienda entregada.
13	MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día lunes 25 de octubre de 2021.
14	MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	Vivienda entregada.
15	MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra:enchape de pisos de alcobas y patio con su respectivo guardaescobas, estuco de muros y enchape de muro de zona de lavamanos. Se detuvieron actividades de obra desde el martes 26 de octubre debido a accidente del beneficiario, por lo tanto los maestros no han ido a la vivienda.
16	MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Se retoman actividades de obra y hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de piso en hall y alcoba 2, alistado de piso de comedor, poyo para meson de cocina y puntos hidrosanitarios en cocina y baño.
17	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
18	MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Se hace visita de apertura el día viernes 29 de octubre. Debido a que se realizarán actividades en cubierta, se iniciarán las obras de mejoramiento el próximo martes 2 de noviembre debido a falta de personal.
19	MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día viernes 29 de octubre de 2021.
20	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Se retoman actividades de obra y hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco y pintura en muros de primer piso, Estructura para cielo raso en segundo piso y enchape de piso en patio.
21	MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistado de piso de patio. Enchapes de piso y muros en cocina 2, baño 2 y patio, puntos hidrosanitarios de estas mismas áreas y demolicion y desmonte de aparatos sanitarios en baño 1.
22	MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de muros en cocina, alistado y enchape de piso en hall, alcoba 1 y patio de ropas. Alistado de piso en baño.

23	MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día lunes 25 de octubre de 2021.
24	MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día viernes 29 de octubre de 2021.
25	MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de todo el área, puntos hidrosanitarios de baño y cocina, alistados de piso de todo el área. Los beneficiarios modificaron área del baño y el día viernes 29 de octubre iniciaron cambio de cubierta sin consentimiento de contratista o interventoría, por lo cual se detuvieron actividades del mejoramiento hasta evidenciar que se haya terminado obras hechas por beneficiarios.
26	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
27	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de baños y alistado en alcoba y cocina.
28	MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de todo el área y se inicia con estuco de los mismos. Enchape de muros de baño y poyo para cocina. La beneficiaria solicita cambiar la actividad de enchape de muros de cocina y a cambio se le realizará pañete en muros de patio.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se realizó entrega de cuatro (4) viviendas del barrio Juan Pablo II. Se realiza visita de apertura en una (1) vivienda del barrio Juan Pablo II. Actualmente se encuentran nueve (9) viviendas en ejecucuión y diesiseís (16) vivienda entregadas.	Residentes de interventoría y de contratista	25/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

No se reporta afectaciones en las obras debido a clima.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha: **31-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 5	Marandu	7	26	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
		Juan Pablo II	13		12	1	1	8	1	4	27,62%	1
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	4	1	4	1	81,67%	4
Subtotal			**26**	**26**	**25**	**1**	10	**9**	**10**	**7**	**60,24%**	**10**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**OCTUBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 25 AL 31
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 11
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.895.402,07	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO	$ 12.548.436,06	$ 11.941.531,50	**8/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO	$ 12.454.097,90	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00	15/10/2021		EN EJECUCION	11,68%	**12,00%**
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30	15/10/2021		EN EJECUCION	13,40%	**48,00%**
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00	13/10/2021		EN EJECUCION	34,82%	**90,00%**
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60	20/10/2021		EN EJECUCION	2,14%	**32,00%**
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40	15/10/2021		EN EJECUCION	3,50%	**4,00%**
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00	21/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**33,00%**
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90	13/10/2021		EN EJECUCION	12,75%	**18,00%**
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29	11/10/2021		EN EJECUCION	21,44%	**22,00%**
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50	**24/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.197.949,00	**4/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	24,65%	**100,00%**
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO		$ 12.940.470,50	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	63,92%	**90,00%**
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO	$ 12.900.000,00	$ 11.528.505,00	**4/10/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	86,75%	**100,00%**
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.926.026,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO	$ 12.900.000,00	$ 11.809.681,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	11	DEL	25/10/2021	AL	31/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

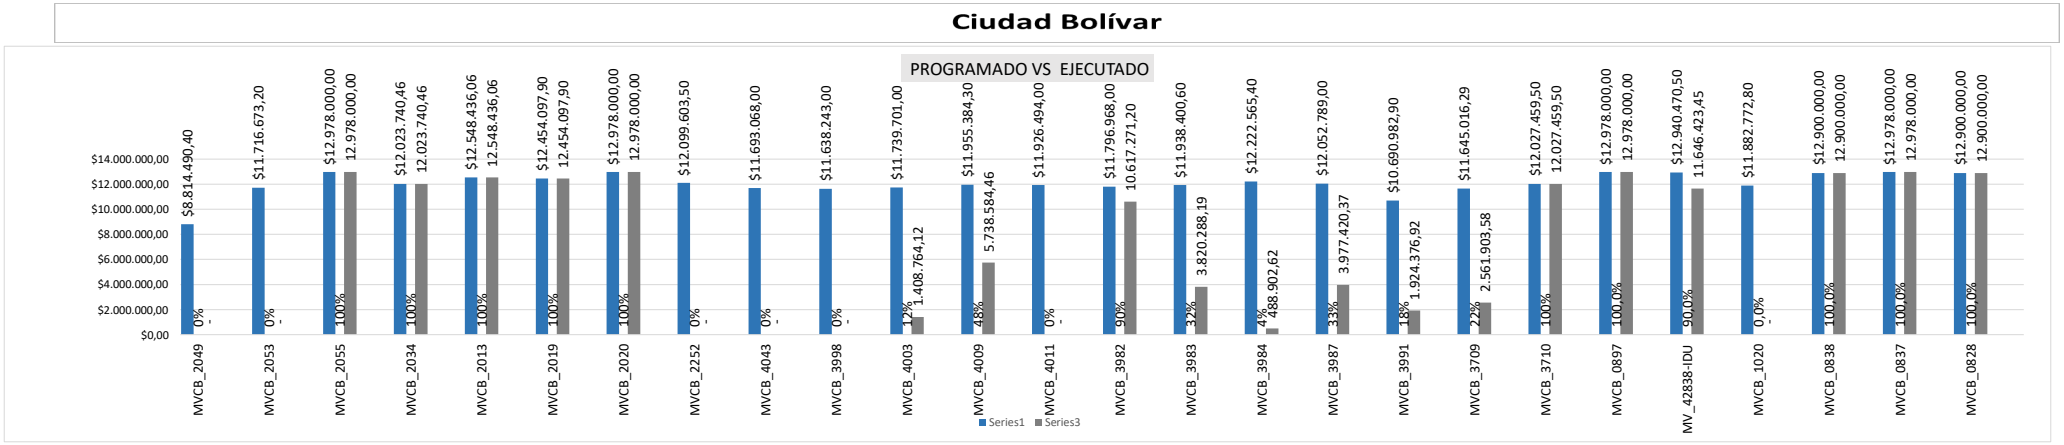

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU			
1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 13 de Octubre de 2021.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
6	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde no se evidencia avance en ejecucion de actividades, el personal operativo no se presento en la vivienda durante la semana, retoman actividades de alistado de piso el dia viernes 29 de octubre.
7	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en actividad de pañete en habitaciones hall y cocina, se realizo alistado de piso general y se inicia con instalacion de enchape de piso. Durante la visita se vuelven a presentar diferentes filtraciones de agua por cubierta a lo que se le reitera a la beneficiaria que estas filtraciones estan afectando las actividades ejecutadas (enchape de piso y pañetes) y de no ser subsanadas lo mas pronto posible se perdera la garantia de estas actividades.
8	MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia instalacion de combo sanitario y lavaplatos, se finaliza instalacion de enchape de piso y pared en baño y cocina.
9	MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia instalacion de enchape de pared en baño y cocina, se realiza instalacion de estructura para cielo raso en PVC, se inicia con instalacion de enchape de piso en hall y sala. Durante la revision de enchape se encuentran varias baldosas cocas por lo tanto se le solicita al Contratista retirarlas.
10	MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde no se evidencia avance en ejecucion de actividades, el personal operativo no se presento en la vivienda durante la semana. El hijo de la beneficiaria manifiesta que quiere que las actividades de la vivienda las continuen unos maestros en especifico, el Contratista le informa que estos maestros podran retomar actividades hasta el dia martes 2 de Noviembre ya que se encuentran finalizando otra vivienda.
11	MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en alistado de piso de habitaciones y hall, se realiza instalacion de muro en super board y se inicia actividad de estuco.
12	MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	Se realiza visita de seguimiento tecnico de la vivienda donde no se evidencia avance en ejecucion de actividades, el personal operativo no se presento en la vivienda durante la semana.
13	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 22 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
14	MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Octubre de 2021.

15	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza seguimiento tecnico de la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en habitacion y sala.
16	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Octubre de 2021.
17	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
18	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

Al presente informe no se presentan conflictos.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante esta semana no se realizaron validaciones.

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana se realizó la siguiente socialización:

El día 26 de octubre de 2021, se realizaron tres socializaciones en el territorio de Jerusalén Ciudad Bolívar, se desarrollaron en los horarios 8:30AM, 10:30 am y 12:30 M. Cada reunión tuvo una convocatoria para un total de 47 beneficiarios.

La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación.

Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés siga igual conforme en tanto se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar, además de la valoración de las condiciones de salud para contrarrestar cualquier tipo de contagio por Covid 19.


Beneficiarios convocados 141

Vía telefónica 113

Correo certificado 28

Asistentes 117

PQR

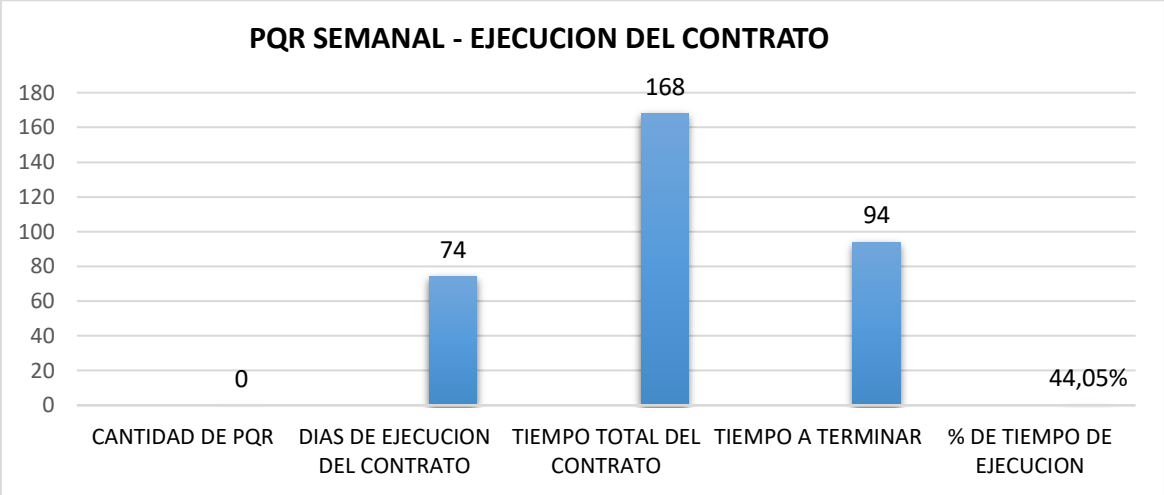

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 74 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA	30/10/2021	**PERIODO No.**	11	DEL	**25/10/2021**	AL	**30/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU

SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE

SOCIALIZACIONES
El día 26 de octubre de 2021, se realizaron tres socializaciones en el territorio de Jerusalén Ciudad Bolívar, se desarrollaron en los horarios 8:30AM, 10:30 am y 12:30 M. Cada reunión tuvo una convocatoria para un total de 47 beneficiarios. La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación. Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés siga igual conforme en tanto se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar, además de la valoración de las condiciones de salud para contrarrestar cualquier tipo de contagio por Covid 19. Beneficiarios convocados 141 Vía telefónica 113 Correo certificado 28 Asistentes 117
VALIDACIONES REALIZADAS
no se presentaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES FALLIDAS
no se presentaron en el transcurso de la semana
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
28/10/2021 **MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ TOQUICA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales.
28/10/2021 **MVCB_ 4475. MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO:** Se realiza la apertura de obra en presencia de contratista e interventoria, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Sin novedades y/o inconformidades. Se presentan maestros de obra encargados.
29/10/2021 - **MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.** Atiende la visita su hermano autorizado YESID SIMBAQUEBA AFRICANO**.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
29/10/2021 **MVCB_2243 HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
25/10/2021 **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Beneficiará expresa inconformidad por demoras en las obras 46 días en ejecución. Falta rematar áreas intervenidas. Se alerta al contratista para dar prioridad y finalizar entrega.
25/10/2021- **MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:** Recibe visita autorizado **EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ.** Se realiza visita social a la obra evidenciando maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto actividades de obra. Manifiesta conformidad con los avances.
25/10/2021 **MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestro en la vivienda. Beneficiarios expresan inconformidad por intermitencia de personal la semana pasada. Se le informa que están dentro del tiempo de ejecución, sin embargo será informado y avanzar de manera significativa en las obras.
25/10/2021 **MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS:** Se realiza visita de seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas. Expresa conformidad con los avances y personal de obra.

25/10/2021 **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES**. Se realiza seguimiento social a la obra por parte interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere inconformidades con los avances, no hay dudas al respecto.
25/10/201 **MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:**Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
25/10/2021 - **MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargado.
25/10/2021 - **MVCB_4185: PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**. Seguimiento se evidencia personal en obra.
25/10/2021 - **MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.** Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
25/10/2021 - **MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.** Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. Atienden la visita la esposa encargada del beneficiario Mary Luis Raba, no indica dudas e inquietudes.
25/10/2021 - **MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad .
25/10/2021 - **MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. S**eguimiento en el cuál no se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria.
25/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** No atienden a la puerta, no se evidencia personal en el predio.
25/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. No se observa personal de obra en el predio.
25/10/2021 - **MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria no atiende a la puerta, los maestros no están laborando y el contratista le había indicado que el día de hoy retomaban labores.
25/10/2021 - **MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.** Nuevamente se procede a la vivienda ya que un familiar tiene dudas sobre una actividad en el baño. El contratista le indica que lo revisara ya que debe hacer un cambio en el presupuesto. Se hace contacto teléfono con la autorizada y se deja registro en bitácora
25/10/2021 - **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ.** Seguimiento en el cuál se evidencia maestros encargados en el predio. El beneficiario indica conformidad y no manifiesta dudas e inquietudes.
25/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria manifiesta que los maestros no han asistido al predio desde el día viernes, pide se aceleren las labores.
25/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance, se realiza verificación de espacios para entrega.
25/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Se realiza seguimiento evidenciando y realizando medición para entrega al predio
27/10/2021 **MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA** Se realiza visita de seguimiento al predio social de obra e interventoría en la cual se evidencia que no cuentan con maestros, los beneficiarios solicitan se establezca una cuadrilla fija para las labores, esto debido a temas de seguridad de los residentes como del jardín que funciona en el hogar.
27/10/2021 **MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL** Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia importante avance en el predio y los beneficiarios manifiestan estar conformes con las labores a la fecha.
27/10/2021 **MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ** Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia importante avance en el predio y los beneficiarios manifiestan estar conformes
27/10/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO** Se realiza visita de seguimiento al predio social de obra e interventoría en la cual se evidencia que no cuentan con maestros, los beneficiarios solicitan se establezca una cuadrilla fija para las labores, esto debido a temas de seguridad de los residentes, Se soolicita dar prioridad a las obras teniendo en cuenta que en la vivivend se encuntra una mujer en estado de gestacion
27/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza visita de seguimiento social de obra e interventoría con revisión de avances, se evidencia aun ausencia de los trabajadores a lo cual se solicita cambio de los mismos o que laboren únicamente en este predio
27/10/2021 - **MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargado**s.**
27/10/2021 - **MVCB_4185: PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento se evidencia personal en obra.
27/10/2021 - **MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.** Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa maestros encargados adelantando actividades.
27/10/2021 - **MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.** Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. Atienden la visita la esposa encargada del beneficiario Mary Luis Raba, no indica dudas e inquietudes.
27/10/2021 - **MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad
27/10/2021 - **MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál no se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria
27/10/2021 - **MVCB_3706:** MARISOL VARGAS RAMÍREZ. Se evidencia maestros en el predio

27/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
27/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se observa personal de obra en el predio.
27/10/2021 **MVCB_ 4498 ELCI RUTH ORTIZ MORENO:** Recibe visita Hijo autorizado **CARLOS TAFUR**. Se evidencian maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto a las obras. No se evidencia inconformidades con el avance de las obras.
27/10/2021 **MVCB_ 4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Recibe visita encargada esposa **MIRIAM LÓPEZ.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de enchapé baño e instalación cielo Razo. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
27/10/2021 **MVCB_ 4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con los avances.
27/10/2021 **MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.** Se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. Se realiza contacto telefónico con beneficiar solicitando ajustar flanches en el techo, debido a que se está filtrando el agua y se evidencia el levantamiento del estuco.
27/10/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
27/10/2021 **MVCB_ 4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO**. Recibe visita autorizada **GLADYS ARIAS,** arrendataria en la vivienda. Se realiza visita social a la obra, se evidencia maestros ejecutando actividades. Autorizada no reporta dudas/inconformidades. Se solicita al contratista avanzar en áreas de cocina y baño, se evidencia poco avance.
27/10/2021 **MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.** Recibe visita nieta autorizada **KAREN PIRACHICAN**. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inquietudes. Se evidencia que beneficiario cumple compromiso de arreglo de canal para continuar con actividades.
27/10/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.** Atiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO**. Se realiza visita de seguimiento social. Se evidencia maestros ejecutando actividades, sin embargo se realiza contacto telefónico con técnico del contratista encargado para solicitar visita y resolver dudas al maestro. Autorizado no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021 **MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:** Se realiza seguimiento social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiaria no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021 **MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.** Se realiza seguimiento social a la obra con interventoria y contratista. No se evidencia avances en las obras. Maestro se encuentra ejecutando actividades. Se resuelven dudas al beneficiario.
28/10/201 **MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:**Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances.
28/10/2021 **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES:** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere inconformidades con los avances, no hay dudas al respecto.
28/10/2021 **MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro en la vivienda. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances.
28/10/2021 **MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS:** Se realiza visita de seguimiento social por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto con actividades reportadas en el presupuesto. Se le recomienda a la famlia, seguir el protocolo de bioseguridad dentro de e la vivienda.
28/10/2021- **MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:** Recibe visita autorizado **EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ.** Se realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas respecto a actividades de obra. No refiere inconformidades.
28/10/2021 **MVCB_ 4811JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Beneficiario no reporta dudas y/o inconformidades.
28/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, se realiza medición por parte del área técnica de los espacios, el beneficiario solicita no se instale la puerta del baño y se le deje debido a los inconvenientes de humedad que se están generando en el predio.
28/10/202**1 MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia progreso en las labores de obra con importante avance, se establece revisión de las actividades realizadas.
28/10/2021 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto frente al presupuesto y actividadesa ejecutar. No refiere inconformidades con lo expuesto.
29/10/2021 - **MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol. Se le recuerda el conducto regular, sooo resolver dudas con contratista e interventoria.
29/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
29/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál se observan los maestros encargados. la Beneficiaria manifiesta gratitud por las labores adelantadas
29/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria indica una inquietud técnica la cual es resuelta por elnarra encargadas.
29/10/2021 - **MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA**. Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario, no indica dudas e inquietudes.
29/10/2021 - **MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.** Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa que la familia se encuentra levantando cubierta, está haciendo actividades simultáneas. Se paran labores constructivas hasta que la beneficia acabe de arreglar cubierta.
29/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se observa personal de obra en el predio
29/10/2021 - **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ.** Seguimiento en el cuál el contratista le indica al beneficiario que el martes los maestros retomarán labores constructivas.

ENTREGAS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
25/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
25/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
27/10/2021 **MVCB_ 3424. GIANNI GIOVANNA REYES:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
29/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADO**. Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
29/10/2021 - **MVCB_4185: PEDRO AVELINO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
29/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
RENUNCIAS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
SEMANA 11 DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
VALIDACIONES FALLIDAS
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
APERTURAS
27/10/2021-**MVUN_588**:**AMIRA PEREZ CORTES,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
27/10/2021**-MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
27/10/2021- **MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
28/10/2021- **MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERANDEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales

APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
28/10/2021- **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario no se encontraba al momento de la visita
25/10/2021-**MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
25/10/2021**- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021**- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021**- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
25/10/2021**- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021**- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
27/10/2021**- MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
25/10/2021**- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se stan ejecutando
28/10/2021**- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se stan ejecutando
25/10/2021**- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
25/10/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades ejecutadas
25/10/2021- **MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
28/10/2021- **MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
28/10/2021- **MVUN_372: JENNY MARCELA GUERRERA**, Se realiza contacto teléfonico con la beneficiaria quién asegura que renuncia al subsidio ya que vendo su predio, se realizaron los respectivos seguimientos del caso y se cuenta confirma de la renuncia y fotocopia de cédula de la beneficiaria.
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC CIUDAD BOLIVAR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m Y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
PAC UNIR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Calle 75 #119-26, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.

HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
BARRIO O TERRITORIO
UNIR
HISTORIAS DE VIDA
21/10/2021- MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO, postulación historia de vida
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

DESARROLLO CIUDAD BOLIVAR

SOCIALIZACIONES

Socialización sector Jerusalén Potosí	Socialización sector Jerusalén Potosí	Socialización sector Jerusalén Potosí
		

VALIDACIONES

APERTURAS DE VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR

apertura de vivienda MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ desarrollo Juan Pablo II	apertura de vivienda MVCB_2243 HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO desarrollo Juan Pablo II	Apertura de obra. MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO. Desarrollo Juan Pablo II
		

APERTURA, MVCB_ 4475 MARÍA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO JUAN PABLO II		
		
SEGUIMIENTOS		
Seguimiento de obra. MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4185 PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGADesarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZDesarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ. Desarrollo Compartir.	**Seguimiento de obra. MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Seguimiento de obra. MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4185: PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYADesarrollo Juan Pablo II**
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	22/10/2021														
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021															
MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															

MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVUN_372	**JENNY MARCELA GUERRERO**	UNIR II	**RENUNCIA**																			RENUNCIA, Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria quién asegura que renuncia al subsidio ya que vendo su predio, se realizaron los respectivos seguimientos del caso y firma de los documentos pertinentes de la renuncia.
MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	UNIR II	X																			
MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	UNIR II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021														
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021														

MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021	14/10/2021															
MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras, vivienda aperturada solo por el contratista(cubierta)	12/10/2021																
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021																
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021																
MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	15/102021															
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	25/10/2021															
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																

MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021																
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021	29/10/2021															
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	19/10/2021															
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/03/2021																
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021															
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																

MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021	23/10/2021															
MVCB_3798	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/10/2021																
MVCB_3809	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021																
MVCB_3863	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021																
MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																

MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021																
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	15/102021															
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021																
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021																

MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19-oct															
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021															
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021															
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	29/10/2021															
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/201																
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021	19/10/2021															
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																

MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021																
MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021																
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	13/10/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															

MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021														
MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021															
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021															
MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	25/10/2021														
MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															

MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021																
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	12/10/2021															
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACIO N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	11/10/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	11/10/2021															
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															

MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021															
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	29/10/2021															
MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19/10/2021															
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	14/10/2021															
MVCB_3822	SORY INES CORTES LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021																
MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	JUAN PABLO II																					
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																

MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	JUAN PABLO II																					
MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																
MVCB_2243	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021																
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	19/10/2021															

MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	27/10/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	15/102021															
MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021																

MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	11/10/2021															
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021																
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	13/10/2021															
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	13/10/2021															

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 11. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras así como de las viviendas que se encuentran en ejecución.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	25/10/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	11
HASTA	31/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de lo realizado

1. Acompañamiento y verificación de la Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Entrega de Kits durante las nuevas aperturas para beneficiario y trabajadores, charlas de Divulgación de protocolo de Bioseguridad con apoyo del personal Social.
3. Se presentaron ingresos durante la semana por lo tanto se realiza inducción al personal operativo.
4. Se realiza revisión de seguridad social correspondiente al personal que ingreso esta semana.
4. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizaron charlas de Compromiso de uso de EPP al personal operativo, dando respuesta a las recomendaciones de la interventoría, sobre el uso por parte de los maestros y ayudantes.
5. Durante las entregas de Viviendas, se deja constancia firmada de recibido sin escombro, por parte del área SST, las cuales hacen parte de los soportes de las viviendas. Así mismo se entrega la Señalética de Bioseguridad, dejando evidencia fotográfica.
6. Se entregan los soportes por MV, del componente ambiental y de Bioseguridad, para informe mensual y entrega de las carpetas de cada MV.
7. Se realiza la Socialización de Beneficiarios en Potosí para inicio de Validaciones en compañía de la secretaria de Hábitat.
8. Se realiza alistamiento de Pac en Unir II, Instalación de Señalética; se alista Kit Ecológico para instalar en UNIR II
9. Entrega de informe Mensual y soportes de Bioseguridad por MV(carpetas)

Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente. Se hace el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas

INTERVENTORIA
Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo. Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre reporte de condiciones de salud, se hace recarga de kit de bioseguridad al personal de interventoría, se programa la reposición de tapabocas para inicio de semana Durante la Socialización realizada en Potosí en compañía de la secretaria de Hábitat. Se hace presencia del personal Social, técnico, y SST de interventoría, se verificó que los protocolos planteados fueran implementados correctamente. Se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, en las que están en ejecución y durante las entregas, se cumple los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. La contratista continua el refuerzo mediante charlas para el correcto uso de EPP. Se verifica que, las viviendas entregadas no presenten escombros en la casa producto de los trabajaos ejecutados y que se realice la entrega de los afiches del correcto lavado de manos y clasificación de residuos con las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde). Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 11 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y cuenta con afiliaciones al día. Existen sectores en donde se ha evidenciado que el riesgo público es muy elevado y se han dado pautas para no realizar desplazamientos aislados, siempre debe hacerse en grupo, situación presentada en CB y en Engativá. Los soportes del informe mensual se vienen organizando, así como los archivos que se deben incluir en las carpetas de los MV desde el área de SST, específicamente Bioseguridad y los soportes de entrega sin escombros.
2. CAPACITACION contratista
Charla de Compromiso de uso de epp y uso adecuado del agua Mantenimiento de equipos y herramientas Divulgacion del protocolo Induccion
2.1 CAPACITACION Interventoría
Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre Reporte de condiciones de salud

3. Gestión Ambiental

La recolección de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombro y se haga entrega de las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde)

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL		**0**		
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**6**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**36**	ESCOMBRERA CEMEX	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

• Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las y Aperturas de Vivienda a los beneficiarios y maestros.
• En las visitas a los MV se realiza charlas de Bioseguridad.
• Se hace seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros.
• Se revisa y se deja constancia en las entregas de Vivienda que estas se encuentran libres de los escombros generados por la intervención, los beneficiarios firman a satisfacción y se deja evidencia fotográfica.
• Seguimiento al uso correcto de EPP, en especial las gafas y guantes, debido al proceso de demolición que provoca material proyectado

• El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**5904**	33,00	3,50	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**9168**	43,00	7,00	**1120**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**32448**	178,60	40,17	**6752**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico

CHARLA DE SEGURIDAD Y RECARGA DE KIT INTERVENTORIA



MVUN 469



MVUN 099

VVIENDA LIBRE DE ESCOMBROS PARA ENTREGA	CHARLAS DE SEGURIDAD -JUAN PABLO
	
MVCB 3710	**MVCB 3803**
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT TRABAJADOR MVUN 464	**ENTREGA KIT TRABAJADOR MVUN 099**

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVUN 469	**SEÑALIZACION BIOSEGURIDAD PAC UNIR II**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	102	5904	6,0	0,0		0,00	0,00	33,00	0,00	33,00			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	3,50			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
				116	**6576**	**6**	**0**	**0,0**	**3,50**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**36,50**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				

ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	6.576
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	10.288
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	39.200
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	36,50
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	50,00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	218,77

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	6
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	6
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	36
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CHARLA COMPROMISO DE USO DE EPP Y CUIDADO DEL AGUA CHARLA DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
	MVCB 3803	**MVCB 4900**	**MVCB 0481**	**MVCB 4791**
La interventoría recibió información sobre Reporte de condiciones de salud				
	CHARLA DE SEGURIDAD			

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
106	ANDRES COBA	3.734.768	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	25/10/2021	26/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	25/10/2021	26/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	110	0	0	0	123	3	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**110**	**126**	**0**	**123**	**3**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓ		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓ		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓ		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓ		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓ		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**110**	**126**	**0**	**123**	**3**	

SEMANA DEL SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021					
	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**31 DE OCTUBRE 2021**	**PERIODO**	**MES 3**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E	E			E											
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E	E			E											
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E			E											
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Verificacion diaria de los elementos de bioseguridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E											
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E				E												
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E											
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E											
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E				E												
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS							FECHA	31 DE OCTUBRE 2021										PERIODO	MES 3				
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E				E												
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E			E												
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E		E	E	E	E											
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E		E	E	E	E	E	E											
diligenciamiento del formato recogida de escombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
											E		E												
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
								E	E	E	E	E	E	E											
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista																								
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista					P																			
						E																			
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	12	19	14	14	13	20	13	13	13	20	13	13	13	20	12	12	12	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	11	17	13	14	10	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	89,47%	92,86%	100,00%	76,92%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		90,32%		96,43%		75,76%		50,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				94,12%				85,25%				22,03%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	41,92%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	DEMARCACION DE SILLETERIA SALON COMUNAL POTOSI



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	SILLAS MARACADAS



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	SEÑALIZACION BIOSEGURIDAD



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	TOMA DE TEMPERATURA BENEFICIARIOS REUNION POTOSI



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	APLICACIÓN DE ALCOHOL BENEFICIARIOS REUNION POTOSI



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	TOMA DE CONDICIONES DE SALUD REUNION POTOSI



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	REFRIGERIOS REUNION POTOSI



PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y FECHA: 26 DE OCTUBRE 2021	DESINFECCION DE SILLETERIA REUNION POTOSI

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
474		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
481		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3703		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3876		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
3880		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
4351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2021
4351		
