INFORME MENSUAL 2

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

GRUPO 1 - 2021



DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

Desarrollo	Camila Giraldo y Diana Mora	
Aprueba	Edgar E. Roa C.	

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

2. INTRODUCCIÓN

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

3.3 Relación estado programación de los MV al informe mensual No. 2

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.

4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES

6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

7. INFORME SISO

8. BIOSEGURIDAD

9. **ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA**
10. **ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA**
11. **ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA**
12. **ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA**

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Contrato de interventoría número: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

1.2 Contrato de obra número: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTÁ D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	


2. INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general y por vivienda.

En el desarrollo de las actividades en el mes de SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2021, se presentaron los siguientes indicadores que muestral el comportamiento en la validación y avance de obra.

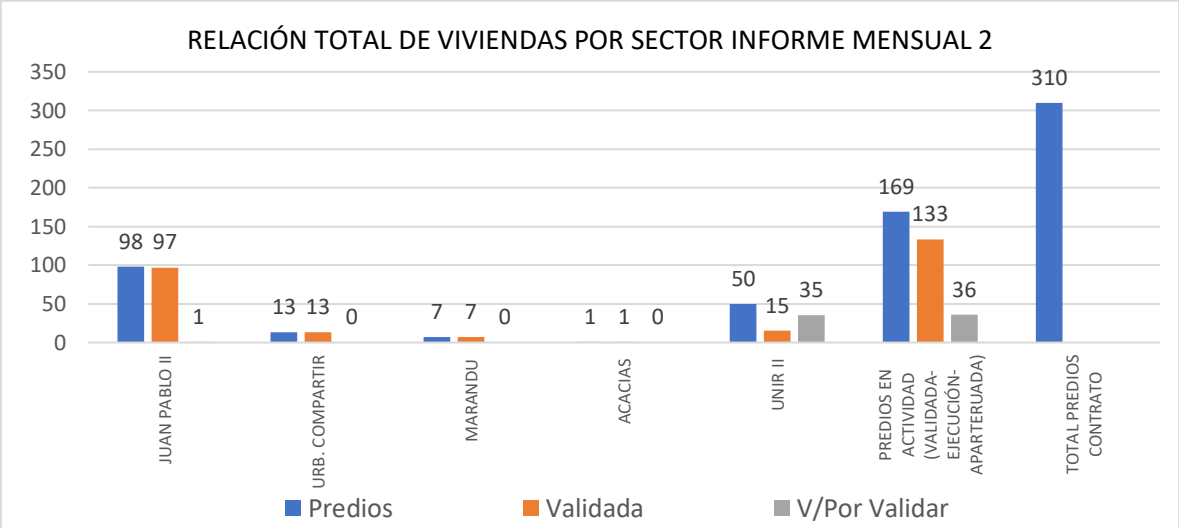

Para el informe mensual 02, el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020, se encuentra en cumplimiento** de las actividades de validación según la programación de obra; ya que presentan 133 validaciones ejecutadas frente a 134 relacionadas en la programación de obra al 21-10-2021. Esto indica que esta pendiente 1 validación para el próximo informe.

A continuación, se muestran las viviendas según la programación de obra. Aquí se exponen los siguientes resultados: De los 134 MV correspondientes a la programación de obra al 21 de octubre de 2021, 123 ya finalizaron su proceso de validación y 11 que aún no han desarrollado esta actividad, lo anterior es consecuencia de que existen algunas viviendas que por ajustes para el desarrollo de las actividades de cubierta no han podido iniciar este proceso.


De acuerdo con lo anterior, se presentan 10 viviendas que se encuentran con fecha límite hasta el 17-12-2021 para finalizar la validación y que son el remplazo de las viviendas anteriormente expuestas. Esto nos da un total de 133 viviendas validadas.

MV	Comienzo	Fin		VALIDADA SI	VALIDADA NO	
MVCB_4629	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2244	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2411	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2413	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2414	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4929	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4407	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4561	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4791	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2277	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3706	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3773	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3984	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4043	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4198	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3991	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3998	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4185	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2615	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4003	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4365	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4366	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4011	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2053	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2055	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4401	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2252	lun 30/08/21	mié 15/09/21			1	PROGRAMACIÓN
MVCB_2242	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3669	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3710	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3798	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3809	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3863	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3880	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3983	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4009	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4438	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4498	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4754	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4811	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4867	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0005	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0213	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0474	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0481	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0660	lun 30/08/21	mié 15/09/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0828	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0837	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0838	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN


MVCB_0897	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_1072	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3410	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3433	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3876	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3888	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4351	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4363	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4475	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4751	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4900	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2013	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2019	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2020	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2034	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2049	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4968	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3721	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3982	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3987	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4072	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4096	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4219	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MV_42838-IDU	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MV_42886-IDU	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3803	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3839	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_1020	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2355	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4644	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_0666	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2278	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2376	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3191	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3329	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3396	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3650	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3703	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3709	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3748	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3752	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3793	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3822	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3885	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4175	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4628	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4694	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4732	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4744	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4801	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4838	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN

MVCB_4842	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4843	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4892	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2243	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_2621	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3327	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3311	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3424	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3425	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4085	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4188	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4689	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3771	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4233	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3353	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4152	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_4272	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3351	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVCB_3360	mié 22/09/21	vie 8/10/21		1		PROGRAMACIÓN
UNIR	**lun 4/10/21**	**lun 29/11/21**				PROGRAMACIÓN
MVUN_017	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_099	lun 4/10/21	jue 21/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVUN_115	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_128	lun 4/10/21	jue 21/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVUN_132	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_146	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_151	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_160	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_171	lun 4/10/21	jue 21/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVUN_173	lun 4/10/21	jue 21/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVUN_174	lun 4/10/21	jue 21/10/21		1		PROGRAMACIÓN
MVUN_182	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_186	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_196	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_205	lun 4/10/21	jue 21/10/21			1	PROGRAMACIÓN
MVUN_290	jue 21/10/21	mié 10/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_299	jue 21/10/21	mié 10/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_332	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_334	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_372	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_374	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_379	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_391	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_397	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_398	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_416	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_424	jue 21/10/21	mié 10/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_443	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_464	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_469	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_480	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN

MVUN_484	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_486	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_492	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_588	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_770	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_187	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_218	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_106	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_166	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_201	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_208	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_238	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_241	mié 10/11/21	lun 29/11/21		1		RESTITUCIÓN
MVUN_276	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_366	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVUN_478	mié 10/11/21	lun 29/11/21			1	RESTITUCIÓN
MVJE_405	lun 29/11/21	vie 17/12/21			1	RESTITUCIÓN
MVJE_295	lun 29/11/21	vie 17/12/21		1		RESTITUCIÓN
MVJE_222	lun 29/11/21	vie 17/12/21			1	RESTITUCIÓN

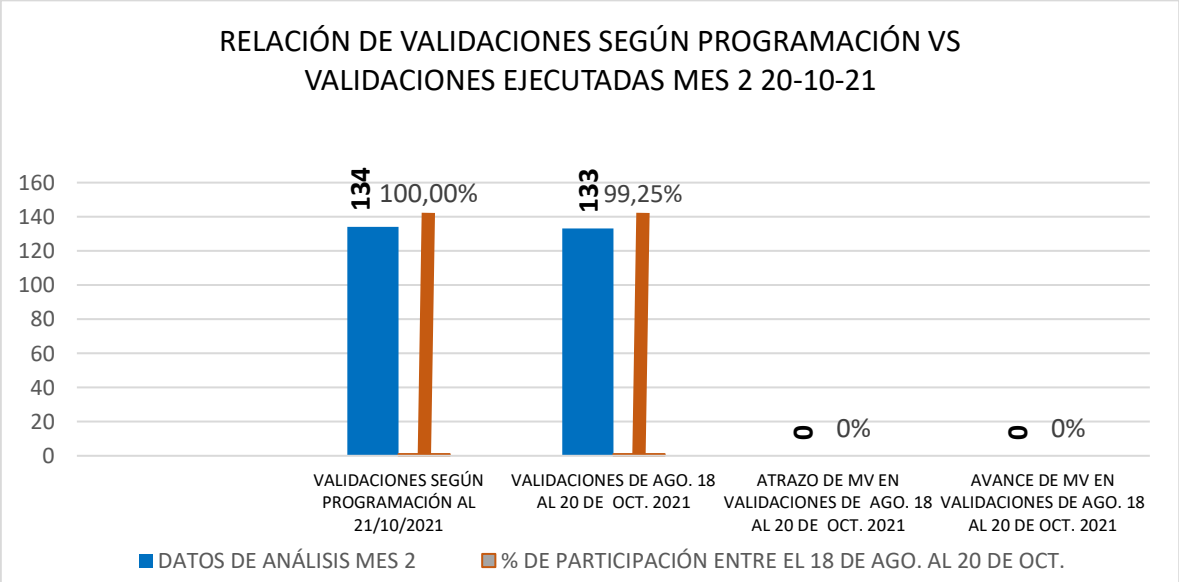

Para cada una de las viviendas durante los meses de septiembre y octubre del presente informe, se registran los siguientes indicadores, estos datos muestran el avance por grupos porcentual de las viviendas.

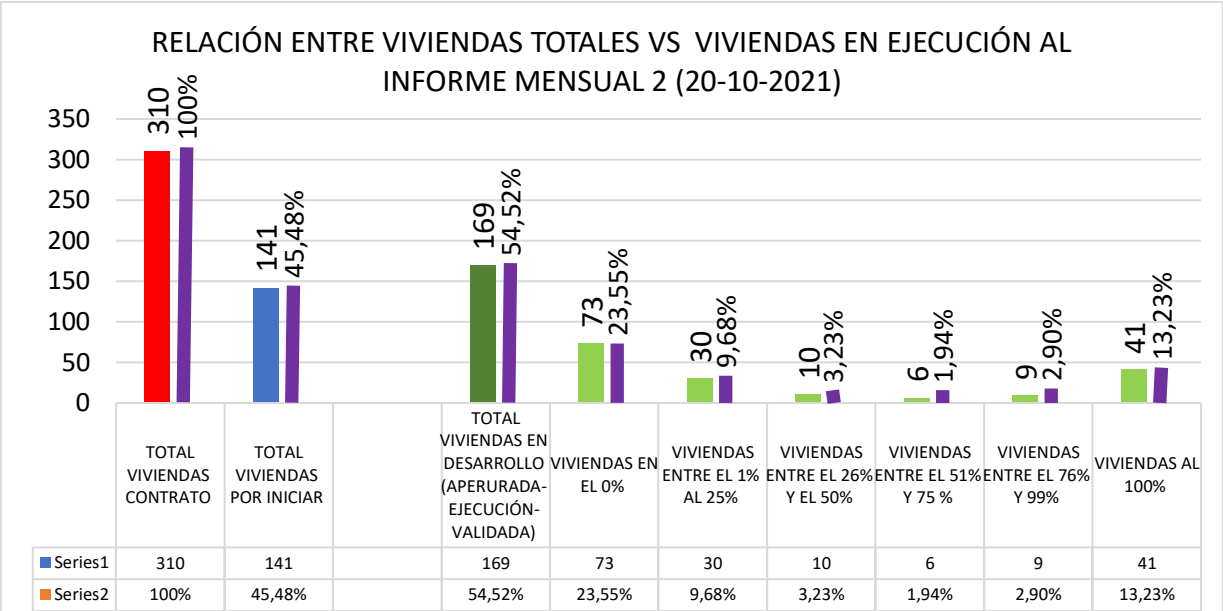
RELACIÓN ENTRE VIVIENDAS TOTALES VS VIVIENDAS EN EJECUCIÓN AL INFORME MENSUAL 2 (20-10-2021)
350
300
250
200
150
100
50
0
310 100%
141 45,48%
169 54,52%
73 23,55%
30 9,68%
10 3,23%
6 1,94%
9 2,90%
41 13,23%
TOTAL VIVIENDAS CONTRATO
TOTAL VIVIENDAS POR INICIAR
TOTAL VIVIENDAS EN DESARROLLO (APERURADA-EJECUCIÓN-VALIDADA)
VIVIENDAS EN EL 0%
VIVIENDAS ENTRE EL 1% AL 25%
VIVIENDAS ENTRE EL 26% Y EL 50%
VIVIENDAS ENTRE EL 51% Y 75 %
VIVIENDAS ENTRE EL 76% Y 99%
VIVIENDAS AL 100%
Series1 310 141 169 73 30 10 6 9 41
Series2 100% 45,48% 54,52% 23,55% 9,68% 3,23% 1,94% 2,90% 13,23%

3.2 Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

(En este caso, el interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo).

Nombre del beneficiario (a): DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA
MVUN_290
Teléfono: 3117788748
Dirección de vivienda: KR 124A 73 09 MJ 1
Desarrollo: UNIR II

Texto/Resumen:

"En la visita de validación se identifica problemática con vecinos, beneficiario informa que la vivienda contigua a su casa afectó la estabilidad de su vivienda, ocasionando diversas afectaciones (fisuras, grietas y desprendimientos de material) Debido a esta problemática la beneficiaria solicita insistentemente a profesionales del área técnica un informe del estado actual de su vivienda para presentarlo en la fiscalía y continuar el proceso que adelanta en contra de su vecino, se le informa que no está dentro del alcance del mejoramiento de vivienda realizar ese tipo de procesos y que se debe dirigir al IDIGER, sin embargo insiste en el tema. La problemática el vecino, ha llegado a tal punto que se ha llevado a las vías de hecho (afectaciones físicas y a la propiedad privada por parte de los involucrados) por esto hecho la beneficiaria realizó la diligencia en la fiscalía para evidenciar la situación, ya que según indica, fue atacada a tiros por parte del vecino y además lanzaron piedras a su vivienda dañando la cubierta.
La beneficiaria, no tiene buenas relaciones con la mayoría de sus vecinos, identificando esta situación en los testimonios de los beneficiarios que viven cerca de ella. En su relato comenta que fue condenada a nueve años de cárcel, de los cuales, tres estuvo privada de su libertad, actualmente vive con sus dos hijas y cinco nietos, ella, se encarga de las labores del hogar y sus hijas, trabajan en la informalidad, presentan una alta vulnerabilidad económica, ya que dependen de un ingreso altamente fluctuante y teniendo en cuenta el número de personas que habitan en la casa, este ingreso es sumamente bajo.
Se desea poner en conocimiento de la interventoría la problemática presentada en la vivienda, ya que se pueden presentar dificultades en la ejecución, Así mismo si así lo consideran, programar una visita de la SDHT para evaluar la situación"[1].

Concertación y respuesta a la inquietud

En visita realizada el 20 de octubre de 2021 al inmueble de la Sr. DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA entre el contratista, la interventoría y la supervisión de la SDHT, se realizó acompañamiento al predio para dar seguimiento a la inquietud presentada por parte del CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020. En esta reunión se acordó lo siguiente:
Alistado de pisos en segundo nivel, cerámica, estuco pintura, guarda escoba, en sala comedor y habitaciones. Demolición de piso cerámico existente, muros de cocina, entrepaño, lavaplatos.
En el Baño se modifican los puntos hidrosanitarios, combo sanitario, enchapes, estuco y pintura y puerta en madera.
En el tercer piso se realizará pañete en habitaciones.

[1] Informe entregado por el CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020



3.3 Relación estado programación de los MV al informe mensual No. 2

Para el informe Mensual No. 2, se presenta la siguiente información por MV que da cuenta del cumplimiento en el desarrollo de las actividades. Así mismo, se aclara que por temas de logística el contratista ajusta las viviendas a ejecutar, ya que por actividades como la instalación de cubiertas, que requiere un manejo especial por la normativa distrital y nacional, adelanta algunas viviendas que están dentro de la programación, pero con fechas diversas para dar cumplimiento a la cantidad de validaciones, así como de entregas. Esto no significa que se encuentre en atraso, sino que modifica el momento de inicio de de actividades.

RELACIÓN ESTADO PROGRAMACIÓN DE LOS MV AL INFORME MENSUAL No. 2

Nombre de tarea	% completado	Duración	Duración restante	Comienzo	Fin	Costo	% físico completado	Texto2
FASE I	**24%**	**140 días**	**107,1 días**	**mié 18/08/21**	**mié 2/02/22**	**$ 5.130.409.981**	**0%**	
Validación	**43%**	**124,25 días**	**71,34 días**	**lun 30/08/21**	**jue 27/01/22**	**$ 0**	**0%**	
COMITÉ DE OBRA	100%	0 días	0 días	mié 8/09/21	mié 8/09/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	100%	0 días	0 días	jue 23/09/21	jue 23/09/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	100%	0 días	0 días	jue 7/10/21	jue 7/10/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 21/10/21	jue 21/10/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 4/11/21	jue 4/11/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 18/11/21	jue 18/11/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 2/12/21	jue 2/12/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 16/12/21	jue 16/12/21	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 13/01/22	jue 13/01/22	$ 0	0%	
COMITÉ DE OBRA	0%	0 días	0 días	jue 27/01/22	jue 27/01/22	$ 0	0%	
MVCB_4629	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	
MVCB_2244	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2411	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2413	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2414	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4929	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4407	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4561	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4791	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2277	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3706	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3773	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3984	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4043	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4198	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3991	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_3998	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4185	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2615	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4003	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4365	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4366	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4011	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2053	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2055	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4401	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2252	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2242	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3669	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3710	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3798	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3809	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3863	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3880	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3983	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4009	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4438	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4498	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4754	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4811	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4867	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0005	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0213	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0474	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0481	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0660	100%	15 días	0 días	lun 30/08/21	mié 15/09/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0828	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0837	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0838	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_0897	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_1072	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3410	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3433	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3876	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3888	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4351	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4363	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4475	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4751	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4900	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2013	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2019	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2020	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2034	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2049	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4968	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3721	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3982	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3987	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4072	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4096	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4219	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MV_42838-IDU	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MV_42886-IDU	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3803	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3839	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_1020	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2355	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4644	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_0666	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2278	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2376	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_3191	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3329	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3396	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3650	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3703	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3709	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3748	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3752	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3793	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3822	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3885	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4175	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4628	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4694	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4732	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4744	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4801	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4838	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4842	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4843	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4892	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2243	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_2621	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3327	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3311	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3424	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3425	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4085	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4188	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4689	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3771	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4233	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3353	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA

MVCB_4152	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_4272	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3351	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
MVCB_3360	100%	15 días	0 días	mié 22/09/21	vie 8/10/21	$ 0	100%	VALIDADA
UNIR	**26%**	**45 días**	**33,3 días**	**lun 4/10/21**	**lun 29/11/21**	**$ 0**	**0%**	
MVUN_017	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_099	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_115	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_128	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_132	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_146	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_151	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_160	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_171	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_173	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_174	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_182	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_186	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_196	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_205	87%	15 días	2 días	lun 4/10/21	jue 21/10/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_222	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	0%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVUN_290	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_295	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_299	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_332	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_334	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_372	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_374	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_379	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_391	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_397	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_398	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_405	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	0%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_416	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_424	0%	15 días	15 días	jue 21/10/21	mié 10/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_443	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_464	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_469	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_480	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_484	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVUN_486	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_492	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_588	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_770	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_187	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_218	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_106	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_166	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_201	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_208	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_238	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_241	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_276	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_366	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVUN_478	0%	15 días	15 días	mié 10/11/21	lun 29/11/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
JERUSALEN	**0%**	**30 días**	**30 días**	**lun 29/11/21**	**mar 4/01/22**	**$ 0**	**0%**	
MVJE_009	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_010	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_022	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_030	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_032	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_058	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_062	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	

MVJE_066	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_077	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_079	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_081	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_133	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_149	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_164	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_180	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_184	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_204	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_224	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_275	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_293	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_323	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_341	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_346	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_356	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_359	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_380	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_405	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_431	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_457	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_011	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_050	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_065	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_136	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_174	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_233	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_244	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_247	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_264	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_295	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_343	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	

MVJE_345	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_360	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_402	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_434	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_435	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_441	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_489	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_545	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_573	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_593	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_251	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_452	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_358	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_453	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_557	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_429	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_546	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_572	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_162	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_243	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_254	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_319	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_400	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_574	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_581	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_559	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_179	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_241	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_321	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_440	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_561	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_110	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1006	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	

MVJE_1007	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1009	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1015	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1016	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1017	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1028	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1042	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1043	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1045	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1049	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1056	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1058	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1063	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1067	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_1068	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_222	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	100%	VALIDACIÓN ADELANTADA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVJE_326	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_881	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_882	0%	15 días	15 días	lun 29/11/21	vie 17/12/21	$ 0	0%	
MVJE_889	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_892	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_901	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_907	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_909	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_916	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_920	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_923	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_928	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_929	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_941	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_942	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_950	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_953	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	

MVJE_957	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_959	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_962	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_968	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_991	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_992	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_999	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1137	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1139	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1024	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_868	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_880	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_989	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1000	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1035	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1078	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1095	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_767	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_885	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_937	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_938	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_946	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_948	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_973	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_984	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_985	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1084	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1087	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1104	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1118	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1125	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_1148	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_351	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	

MVJE_624	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
MVJE_604	0%	15 días	15 días	vie 17/12/21	mar 4/01/22	$ 0	0%	
FASE 2	**14%**	**115 días**	**99,07 días**	**mié 15/09/21**	**mié 2/02/22**	**$ 5.130.409.981**	**0%**	
EJECUCION OBRA	**14%**	**115 días**	**99,07 días**	**mié 15/09/21**	**mié 2/02/22**	**$ 5.130.409.981**	**0%**	
HABITARTE	**36%**	**35 días**	**22,37 días**	**lun 4/10/21**	**mié 17/11/21**	**$ 1.745.113.122**	**0%**	
MVCB_4629	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.772.909	98%	EN EJECUCIÓN DENTRO DE PROGRAMACIÓN
MVCB_2244	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.220.291	100%	ENTREGADA
MVCB_2411	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.161.043	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2413	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.333.846	100%	ENTREGADA
MVCB_2414	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.307.938	100%	ENTREGADA
MVCB_4929	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.309.372	15%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4407	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.185.678	85%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4561	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.123.232	25%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4791	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.240.673	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2277	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.526.483	100%	ENTREGADA
MVCB_3706	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.654.587	40%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3773	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.155.339	88%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3984	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.400.432	2%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4043	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.733.266	0%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4198	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.714.758	5%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3991	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 13.470.639	10%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3998	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.664.186	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_4185	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.712.337	25%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2615	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.648.857	100%	ENTREGADA
MVCB_4003	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.792.023	5%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVCB_4365	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.169.907	21%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4366	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.982.349	9%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4011	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.027.382	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2053	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.763.008	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2055	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.988.208	100%	ENTREGADA
MVCB_4401	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.216.898	80%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2252	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.245.501	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_2242	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.053.996	100%	ENTREGADA
MVCB_3669	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.050.103	100%	ENTREGADA
MVCB_3710	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.154.600	90%	EN EJECUCIÓN DENTRO DE PROGRAMACIÓN
MVCB_3798	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.378.630	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_3809	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.370.111	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_3863	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.097.047	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_3880	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.829.239	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_3983	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.042.385	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_4009	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.063.784	10%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4438	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.978.389	32%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4498	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.949.109	10%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4754	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.052.384	100%	ENTREGADA
MVCB_4811	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 13.886.751	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_4867	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.966.393	100%	ENTREGADA
MVCB_0005	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.060.815	13%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0213	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 15.315.241	10%	EN EJECUCIÓN- ATRAZO SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0474	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.854.542	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_0481	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.631.393	0%	SIN EJECUTAR
MVCB_0660	93%	30 días	2 días	mié 15/09/21	jue 21/10/21	$ 14.550.454	100%	ENTREGADA

MVCB_0828	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.880.198	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0837	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.026.793	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0838	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.525.916	87%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_0897	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.109.416	36%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_1072	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.479.082	15%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3410	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.398.820	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3433	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.362.664	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3876	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 11.792.829	2%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3888	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.606.867	1%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4351	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.864.573	34%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4363	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.476.620	16%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4475	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.274.749	0%	
MVCB_4751	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.126.351	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4900	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.629.730	0%	
MVCB_2013	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.046.330	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2019	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.294.500	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2020	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.975.065	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2034	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.882.006	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2049	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 11.106.257	0%	
MVCB_4968	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.005.724	0%	
MVCB_3721	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.110.686	0%	

MVCB_3982	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.864.180	10%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3987	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.186.514	0%	
MVCB_4072	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.346.812	80%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4096	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.978.130	12%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4219	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.422.674	87%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MV_42838-IDU	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 16.304.994	68%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MV_42886-IDU	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 16.234.000	0%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3803	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.936.279	5%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3839	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.607.166	25%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_1020	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.972.294	0%	
MVCB_2355	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.829.917	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4644	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.217.199	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_0666	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.679.225	10%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_2278	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.271.663	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_2376	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.744.051	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3191	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.195.359	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3329	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.200.411	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3396	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.378.252	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3650	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.626.654	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3703	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.899.737	75%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN

MVCB_3709	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.672.720	23%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3748	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.107.381	0%	
MVCB_3752	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.979.775	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3793	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.000.216	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3822	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.109.359	0%	
MVCB_3885	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.060.350	0%	
MVCB_4175	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.858.083	15%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4628	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.420.470	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4694	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.570.393	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4732	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.124.540	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4744	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.150.957	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4801	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.747.423	0%	
MVCB_4838	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.624.409	25%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4842	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.037.669	0%	
MVCB_4843	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.118.172	35%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4892	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.431.341	0%	
MVCB_2243	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.023.018	0%	
MVCB_2621	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.095.120	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3327	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.083.334	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3311	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.028.726	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3424	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.736.586	77%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3425	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.491.918	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN

MVCB_4085	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.725.630	25%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4188	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.154.965	5%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4689	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.741.686	0%	
MVCB_3771	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.109.352	65%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_4233	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.919.921	75%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3353	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.229.626	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_4152	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.479.335	0%	
MVCB_4272	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.019.571	75%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVCB_3351	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 15.485.112	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
MVCB_3360	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.098.772	100%	ADELANTADA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN
UNIR	**0%**	**35 días**	**35 días**	**jue 21/10/21**	**vie 3/12/21**	**$ 707.169.629**	**0%**	
MVUN_017	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.886.179	0%	
MVUN_099	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.823.540	28%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_115	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.827.754	0%	
MVUN_128	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 12.437.445	7%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_132	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.586.448	0%	
MVUN_146	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.912.999	0%	
MVUN_151	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.905.222	0%	
MVUN_160	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.879.655	0%	
MVUN_171	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.050.033	58%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_173	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.495.972	0%	
MVUN_174	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 13.809.097	0%	
MVUN_182	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 11.550.891	0%	
MVUN_186	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.856.926	0%	
MVUN_196	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.845.751	0%	
MVUN_205	0%	30 días	30 días	jue 21/10/21	lun 29/11/21	$ 14.785.713	0%	

MVUN_222	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.359.954	0%	
MVUN_290	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.259.638	0%	
MVUN_295	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.903.415	8%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_299	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.732.725	5%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_332	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.875.753	0%	
MVUN_334	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.704.974	0%	
MVUN_372	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.745.643	0%	
MVUN_374	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.905.741	0%	
MVUN_379	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 12.732.757	0%	
MVUN_391	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 11.278.168	0%	
MVUN_397	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 11.312.669	0%	
MVUN_398	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.781.556	0%	
MVUN_405	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 13.916.798	0%	
MVUN_416	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 14.657.790	0%	
MVUN_424	0%	30 días	30 días	lun 29/11/21	mar 4/01/22	$ 12.304.478	0%	
MVUN_443	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.835.929	0%	
MVUN_464	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 13.625.717	50%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_469	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.391.733	28%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_480	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 13.955.235	0%	
MVUN_484	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 12.231.105	3%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_486	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.135.421	0%	
MVUN_492	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.893.414	0%	
MVUN_588	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.202.574	0%	
MVUN_770	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.896.848	0%	
MVUN_187	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 11.955.282	0%	
MVUN_218	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 13.548.492	0%	
MVUN_106	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.797.976	0%	
MVUN_166	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.036.113	0%	
MVUN_201	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.932.402	0%	
MVUN_208	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.049.204	0%	

MVUN_238	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 13.983.398	0%	
MVUN_241	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.039.192	6%	ADELANTADA EN EJECUCIÓN
MVUN_276	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.514.793	0%	
MVUN_366	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.710.968	0%	
MVUN_478	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.308.148	0%	
JERUSALEN	**0%**	**30 días**	**30 días**	**jue 9/12/21**	**jue 13/01/22**	**$ 2.678.127.231**	**0%**	
MVJE_009	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.498.766	0%	
MVJE_010	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.849.110	0%	
MVJE_022	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.842.430	0%	
MVJE_030	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.214.554	0%	
MVJE_032	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.563.995	0%	
MVJE_058	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.247.104	0%	
MVJE_062	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.123.130	0%	
MVJE_066	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.090.065	0%	
MVJE_077	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.193.866	0%	
MVJE_079	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.299.881	0%	
MVJE_081	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.110.444	0%	
MVJE_133	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.499.698	0%	
MVJE_149	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.074.219	0%	
MVJE_164	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.936.491	0%	
MVJE_180	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.167.154	0%	
MVJE_184	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.188.744	0%	
MVJE_204	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.285.799	0%	
MVJE_224	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.039.766	0%	
MVJE_275	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.469.150	0%	
MVJE_293	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.123.020	0%	
MVJE_323	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.162.643	0%	
MVJE_341	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.001.944	0%	
MVJE_346	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.220.890	0%	
MVJE_356	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.092.498	0%	
MVJE_359	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.150.913	0%	
MVJE_380	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.133.296	0%	
MVJE_405	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.234.268	0%	

MVJE_431	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.095.101	0%	
MVJE_457	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.194.460	0%	
MVJE_011	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.168.826	0%	
MVJE_050	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.020.546	0%	
MVJE_065	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.385.690	0%	
MVJE_136	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.454.385	0%	
MVJE_174	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.397.753	0%	
MVJE_233	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.378.699	0%	
MVJE_244	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.958.552	0%	
MVJE_247	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.491.786	0%	
MVJE_264	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.076.494	0%	
MVJE_295	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.359.361	0%	
MVJE_343	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.228.380	0%	
MVJE_345	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.372.636	0%	
MVJE_360	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.361.272	0%	
MVJE_402	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.471.955	0%	
MVJE_434	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.422.379	0%	
MVJE_435	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.320.092	0%	
MVJE_441	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.103.250	0%	
MVJE_489	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.419.743	0%	
MVJE_545	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.407.693	0%	
MVJE_573	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.389.813	0%	
MVJE_593	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.167.643	0%	
MVJE_251	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.149.213	0%	
MVJE_452	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.040.864	0%	
MVJE_358	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.211.303	0%	
MVJE_453	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.036.741	0%	
MVJE_557	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.268.536	0%	
MVJE_429	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 13.937.847	0%	
MVJE_546	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.439.003	0%	
MVJE_572	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.047.191	0%	
MVJE_162	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.493.578	0%	
MVJE_243	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.402.012	0%	

MVJE_254	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.389.459	0%	
MVJE_319	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.105.073	0%	
MVJE_400	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.110.119	0%	
MVJE_574	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.160.217	0%	
MVJE_581	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.215.872	0%	
MVJE_559	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.455.505	0%	
MVJE_179	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.164.944	0%	
MVJE_241	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.138.199	0%	
MVJE_321	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.039.244	0%	
MVJE_440	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.282.202	0%	
MVJE_561	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.362.117	0%	
MVJE_110	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.337.355	0%	
MVJE_1006	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.093.691	0%	
MVJE_1007	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.910.468	0%	
MVJE_1009	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.171.366	0%	
MVJE_1015	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.019.107	0%	
MVJE_1016	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.676.193	0%	
MVJE_1017	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.092.575	0%	
MVJE_1028	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.083.189	0%	
MVJE_1042	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.389.603	0%	
MVJE_1043	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.896.020	0%	
MVJE_1045	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.373.688	0%	
MVJE_1049	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.024.624	0%	
MVJE_1056	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.920.066	0%	
MVJE_1058	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.077.888	0%	
MVJE_1063	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.111.734	0%	
MVJE_1067	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.938.178	0%	
MVJE_1068	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.949.048	0%	
MVJE_222	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.461.524	0%	
MVJE_326	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 15.070.584	0%	
MVJE_881	0%	30 días	30 días	vie 17/12/21	vie 21/01/22	$ 14.912.807	0%	
MVJE_882	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.956.659	0%	
MVJE_889	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.709.876	0%	

MVJE_892	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.243.146	0%	
MVJE_901	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.156.773	0%	
MVJE_907	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.845.651	0%	
MVJE_909	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.018.449	0%	
MVJE_916	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.960.386	0%	
MVJE_920	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.766.071	0%	
MVJE_923	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.745.662	0%	
MVJE_928	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.899.021	0%	
MVJE_929	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.857.760	0%	
MVJE_941	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.200.298	0%	
MVJE_942	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.025.933	0%	
MVJE_950	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.977.626	0%	
MVJE_953	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.603.840	0%	
MVJE_957	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.934.728	0%	
MVJE_959	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.164.415	0%	
MVJE_962	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.024.624	0%	
MVJE_968	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.116.274	0%	
MVJE_991	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.011.440	0%	
MVJE_992	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.926.773	0%	
MVJE_999	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.859.709	0%	
MVJE_1137	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.040.203	0%	
MVJE_1139	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.970.535	0%	
MVJE_1024	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.823.008	0%	
MVJE_868	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.117.877	0%	
MVJE_880	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.113.157	0%	
MVJE_989	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.777.145	0%	
MVJE_1000	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.106.668	0%	
MVJE_1035	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.088.452	0%	
MVJE_1078	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.922.421	0%	
MVJE_1095	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.918.312	0%	
MVJE_767	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.950.466	0%	
MVJE_885	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.077.502	0%	
MVJE_937	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.043.535	0%	

MVJE_938	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.911.519	0%	
MVJE_946	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.350.170	0%	
MVJE_948	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.528.770	0%	
MVJE_973	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.995.903	0%	
MVJE_984	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.933.342	0%	
MVJE_985	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.117.764	0%	
MVJE_1084	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.697.027	0%	
MVJE_1087	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.114.257	0%	
MVJE_1104	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.652.797	0%	
MVJE_1118	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.976.203	0%	
MVJE_1125	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.003.071	0%	
MVJE_1148	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.485.537	0%	
MVJE_351	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.460.868	0%	
MVJE_624	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 14.875.797	0%	
MVJE_604	0%	30 días	30 días	mié 29/12/21	mié 2/02/22	$ 15.238.026	0%	
BIOSEGURIDAD	0%	0 días	0 días	mié 2/02/22	mié 2/02/22	$ 60.834.901	0%	
SALDO CONTRATO	0%	0 días	0 días	mié 2/02/22	mié 2/02/22	$ 500.577.590	0%	
FIN	0%	0 días	0 días	mié 2/02/22	mié 2/02/22	$ 0	0%	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL

Fecha: **20-oct-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	MENSUAL 2	JUAN PABLO II	98	169	97	1	31	43	33	22	48,13%	33
		URB. COMPARTIR	13		13	0	3	9	3	1	41,47%	3
Técnico Responsable		MARANDU	7		7	0	0	0	5	2	71,43%	5
		ACACIAS	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
		UNIR II	50		15	35	0	10	0	40	3,84%	0
Subtotal			**169**	**169**	**133**	**36**	**34**	**62**	**41**	**66**	**32,97%**	**41**

AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL										**% DE EJECUCION MENSUAL N° 2**	**OCTUBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				SEMANA DEL 18 AL 20
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 10**
BARRIO O TERRITORIO - JUAN PABLO II											
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	**7/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI NO	$ 12.020.042,0	$ 11.427.635,0	**14/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	**10/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI NO	$ 12.897.510,0	$ 11.186.603,0	**9/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI NO	$ 12.894.063,0	$ 11.626.077,0	**13/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	**9/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI NO		$ 10.902.052,0	9/09/2021		EN EJECUCION	76,67%	**76,67%**
10	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI NO		$ 11.864.372,0	12/10/2021		EN EJECUCION	10,45%	**10,45%**
11	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI NO		$ 11.329.166,0			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
12	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI NO		$ 11.797.280,0	7/10/2021		EN EJECUCION	33,86%	**33,86%**
13	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI NO		$ 12.002.565,2	7/10/2021		EN EJECUCION	25,05%	**25,05%**
14	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI NO		$ 11.887.610,4	6/10/2021		EN EJECUCION	32,37%	**32,37%**
15	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI NO		$ 11.489.381,0	6/10/2012		EN EJECUCION	15,68%	**15,68%**
16	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI NO		$ 11.245.957,8	12/10/2021		EN EJECUCION	20,68%	**20,68%**
17	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI NO		$ 11.890.753,3	11/10/2021		EN EJECUCION	9,27%	**9,27%**
18	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI NO		$ 10.023.595,0	20/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
19	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI NO		$ 9.359.388,0	14/10/2021		EN EJECUCION	1,50%	**1,50%**
20	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI NO		$ 10.799.101,0	14/10/2021		EN EJECUCION	1,00%	**1,00%**
21	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.769.237,4	15/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
22	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
23	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI NO		$ 11.021.230,8			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI NO		$ 11.704.303,9			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
25	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI NO		$ 12.095.771,5	20/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
26	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
27	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI NO	$ 12.503.233,00	$ 12.077.142,10	**14/09/2021**	**12/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
28	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI NO		$ 11.724.531,40	8/09/2021		EN EJECUCION	98,00%	**98,00%**
29	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI NO	$ 12.124.137,00	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
30	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI NO		$ 11.377.892,80	24/09/2021		EN EJECUCION	75,00%	**75,00%**

31	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
32	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
33	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,00	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
34	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI / NO	$ 12.388.424,00	$ 12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
35	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI / NO	$ 12.169.139,00	$ 12.003.602,50	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
36	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI / NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021		EN EJECUCION	75,00%	**75,00%**
37	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI / NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021		EN EJECUCION	87,00%	**87,00%**
38	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI / NO		$ 12.076.903,30	6/10/2021		EN EJECUCION	80,00%	**80,00%**
39	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI / NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021		EN EJECUCION	85,00%	**85,00%**
40	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI / NO		$ 12.150.294,90	12/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**15,00%**
41	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI / NO		$ 11.998.548,50	13/10/2021		EN EJECUCION	35,00%	**35,00%**
42	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI / NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
43	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI / NO	$ 12.890.215,00	$ 11.606.673,70	14/10/2021		EN EJECUCION	25,00%	**25,00%**
44	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI / NO		$ 11.923.030,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
45	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI / NO		$ 11.592.989,00	12/10/2021		EN EJECUCION	25,00%	**25,00%**
46	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI / NO		$ 11.981.782,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
47	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI / NO		$ 12.198.500,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
48	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI / NO		$ 11.854.190,20	15/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**5,00%**
49	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI / NO		$ 12.205.262,30			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
50	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI / NO		$ 11.991.555,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
51	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
52	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO	$ 12.975.027,15	$ 11.211.390,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
53	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI / NO	$ 12.978.940,00	$ 11.927.560,50	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
54	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI / NO	$ 12.616.698,91	$ 12.087.004,90	**8/09/2021**	**11/10/20211**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
55	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI / NO	$ 12.978.942,00	$ 12.289.771,00	**10/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
56	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI / NO		$ 11.970.900,00	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
57	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI / NO		$ 12.063.817,50	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
58	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI / NO	$ 12.086.766,49	$ 12.059.809,40	**10/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
59	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI / NO	$ 9.725.095,00	$ 9.602.199,70	**9/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
60	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO	$ 12.978.390,83	$ 12.079.596,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
61	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO	$ 12.460.609,40	$ 11.947.615,50	**8/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

62	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
63	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI NO	$ 12.636.225,99	$ 12.169.719,00	**8/09/2021**	**5/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
64	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI NO	$ 12.978.434,15	$ 12.149.156,80	**27/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
65	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI NO	$ 12.516.986,46	$ 11.701.628,10	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
66	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI NO	$ 12.253.349,05	$ 11.769.775,40	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
67	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI NO	$ 12.978.808,77	$ 11.326.716,60	**7/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
68	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI NO	$ 11.473.441,66	$ 11.528.955,20	**7/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
69	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.792.129,40	11/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**15,00%**
70	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.676.457,80	5/10/2021		EN EJECUCION	25,00%	**25,00%**
71	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI NO			11/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**5,00%**
72	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
73	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI NO		$ 11.678.378,50	12/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**5,00%**
74	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI NO		$ 11.386.359,00	30/09/2021		EN EJECUCION	80,00%	**80,00%**
75	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI NO			11/10/2021		EN EJECUCION	25,06%	**25,06%**
76	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI NO		$ 11.887.405,00	11/10/2021		EN EJECUCION	12,00%	**12,00%**
77	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI NO	$ 12.978.495,17	$ 11.878.089,50	**20/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
78	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI NO	$ 12.978.659,81	$ 11.904.933,20	**20/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
79	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI NO	$ 12.978.826,00		**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
80	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI NO		$ 12.028.047,20	29/09/2021		EN EJECUCION	88,00%	**88,00%**
81	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021		EN EJECUCION	65,00%	**65,00%**
82	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI NO		$ 11.196.334,10			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
83	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI NO		$ 11.992.608,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
84	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI NO		$ 12.424.274,80	6/10/2021		EN EJECUCION	40,00%	**40,00%**
85	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI NO		$ 11.825.187,60	29/09/2021		EN EJECUCION	75,00%	**75,00%**
86	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI NO		$ 12.099.603,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
87	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
88	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI NO		$ 11.638.243,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
89	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI NO		$ 11.739.701,00	15/10/2021		EN EJECUCION	5,00%	**5,00%**
90	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI NO		$ 11.955.384,30	15/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	**10,00%**

91	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI NO		$ 11.926.494,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
92	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI NO		$ 11.796.968,00	13/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	**10,00%**
93	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI NO		$ 11.938.400,60	20/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
94	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI NO		$ 12.222.565,40	15/10/2021		EN EJECUCION	2,00%	**2,00%**
95	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI NO		$ 12.052.789,00	21/10/2021		VALIDADA	0,00%	**0,00%**
96	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI NO		$ 10.690.982,90	13/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	**10,00%**
97	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI NO		$ 11.645.016,29	11/10/2021		EN EJECUCION	23,00%	**23,00%**
98	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI NO		$ 12.027.459,50	24/09/2021		EN EJECUCION	90,00%	**90,00%**

BARRIO O TERRITORIO - URBANIZACION COMPARTIR											
1	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI NO		$ 11.953.028,00	8/10/2021		EN EJECUCION	13,05%	**13,05%**
2	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI NO		$ 11.612.217,00	15/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
3	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI NO		$ 11.789.319,00	15/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
4	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI NO		$ 12.284.986,00	12/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**15,00%**
5	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI NO		$ 12.154.953,00	6/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	**10,00%**
6	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI NO	$ 12.978.809,00	$ 11.547.979,00	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI NO		$ 10.062.877,30	14/10/2021		EN EJECUCION	10,00%	**10,00%**
8	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI NO		$ 11.197.949,00	4/10/2021		EN EJECUCION	36,00%	**36,00%**
9	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI NO		$ 12.940.470,50	4/10/2021		EN EJECUCION	68,00%	**68,00%**
10	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
11	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI NO		$ 11.528.505,00	4/10/2021	3/11/2021	EN EJECUCION	87,00%	**87,00%**
12	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.926.026,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
13	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI NO	$ 12.900.000,00	$ 11.809.681,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

BARRIO O TERRITORIO - MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.895.402,07	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI NO	$ 12.548.436,06	$ 11.941.531,50	**8/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI NO	$ 12.454.097,90	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI NO	$ 12.978.000,00	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

BARRIO O TERRITORIO - ACACIAS											
1	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI NO		$ 10.994.502,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

BARRIO O TERRITORIO - UNIR II											
1	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
2	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO		$ 9.707.226,00	15/10/2021		EN EJECUCION	2,62%	**2,62%**
3	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
4	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
5	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO		$ 10.814.060,70	7/10/2021		EN EJECUCION	49,82%	**49,82%**
6	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO		$ 9.765.458,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
7	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO		$ 11.422.010,10	7/10/2021		EN EJECUCION	27,77%	**27,77%**
8	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO		$ 11.764.713,90	13/10/2021		EN EJECUCION	28,16%	**28,16%**
9	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
10	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO		$ 11.150.820,20	7/10/2021		EN EJECUCION	57,53%	**57,53%**
11	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO		$ 11.271.883,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
12	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
13	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
14	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO		$ 11.935.867,00	14/10/2021		EN EJECUCION	5,74%	**5,74%**
15	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
16	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO		$ 9.870.988,30	14/10/2021		EN EJECUCION	7,44%	**7,44%**
17	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
18	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
19	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60	15/10/2021		EN EJECUCION	5,19%	**5,19%**
20	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30	14/10/2021		EN EJECUCION	7,69%	**7,69%**
21	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00	15/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
22	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20	15/10/2021		VALIDADA	0,00%	**0,00%**
23	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90	15/10/2021		VALIDADA	0,00%	**0,00%**
24	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
25	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
26	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

27	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
28	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
29	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
30	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
31	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
32	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
33	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
34	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
35	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
36	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
37	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
38	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
39	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
40	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
41	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
42	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
43	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
44	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
45	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
46	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
47	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
48	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
49	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
50	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		PERIODO No.	2	DEL	21/09/2021	AL	20/10/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

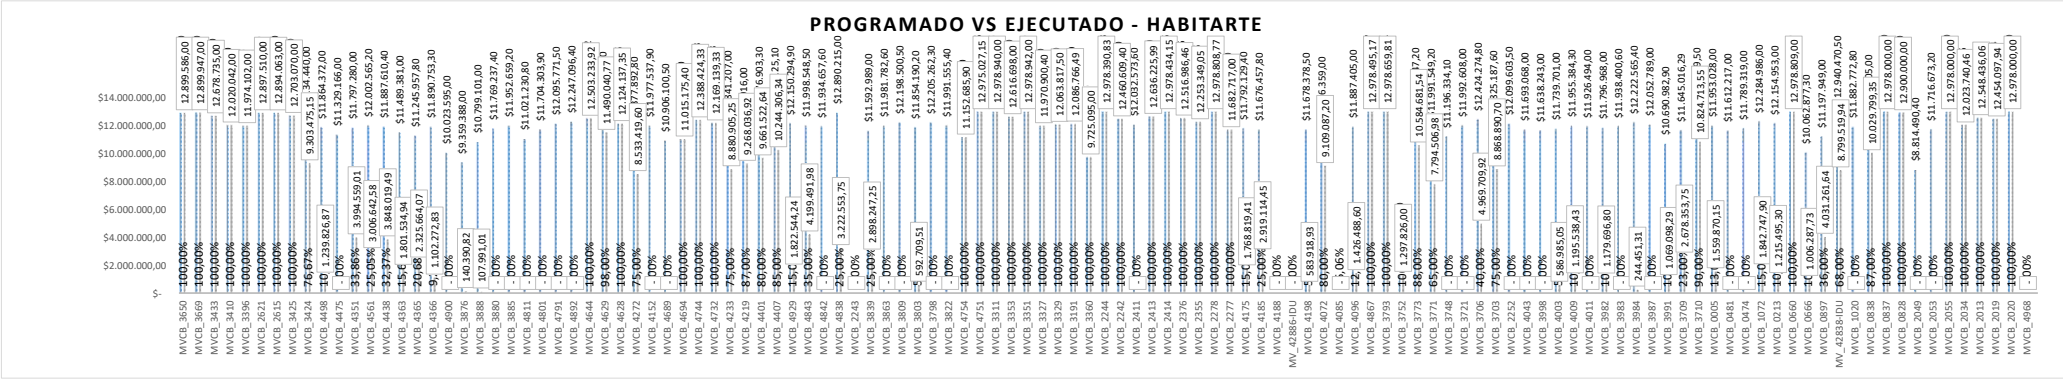

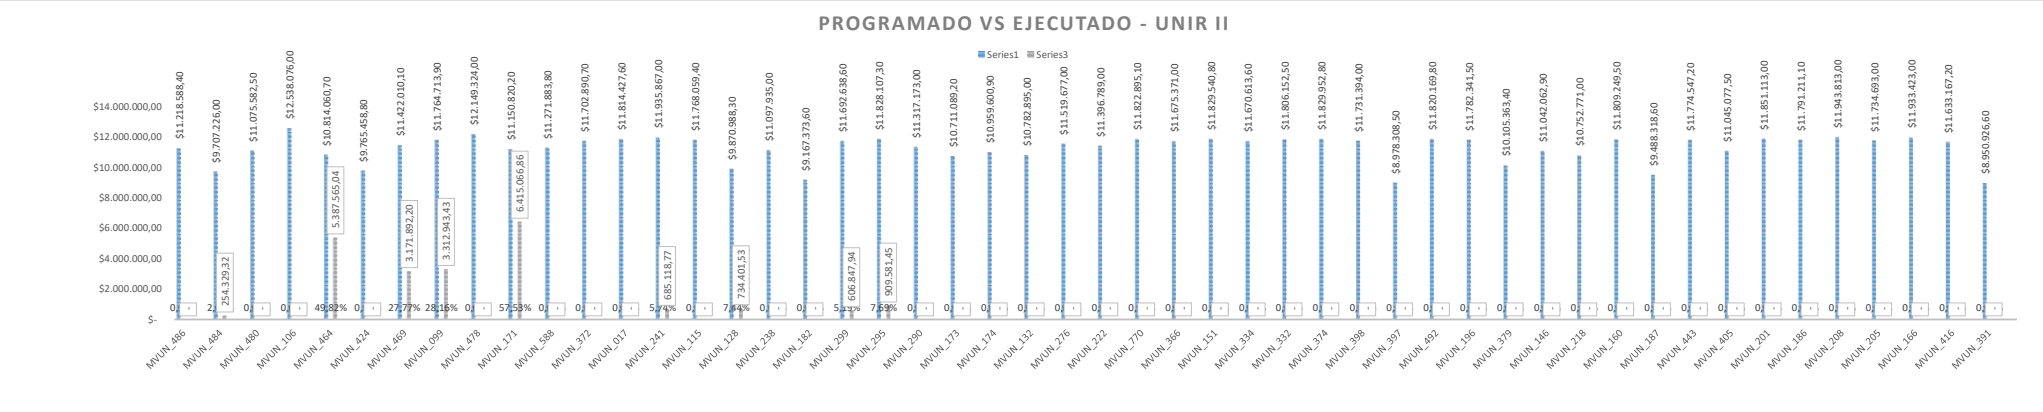

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES N° 2 - ESTADO DE AVANCE MENSUAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - HABITARTE			
1	**MVCB_3650**	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	**MVCB_3669**	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	**MVCB_3433**	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	**MVCB_3410**	OCTAVIO VALENCIA LLANO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
5	**MVCB_3396**	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	**MVCB_2621**	ALIX ANGULO AMADO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
7	**MVCB_2615**	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
8	**MVCB_3425**	PABLO ANTONIO CUERVO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
9	**MVCB_3424**	GIANNI GIOVANNA REYES	Esta vivienda presenta atraso en su ejecución. Se instaló cerámica de piso en áreas de sala y cocina. Se avanza en enchape de piso de la alcoba 1. Se enchapó pared de la cocina 1.
10	**MVCB_4498**	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	Se avanzó en actividades de alistado de pisos en área de lavandería y en la alcoba 2. Se panetan muros en lavandería. Se prepara superficie para aplicación de enchapes en lavandería.
11	**MVCB_4475**	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
12	**MVCB_4351**	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	Se termina panetes en área de cocina, alcoba 2 y se inician actividades de aplicación de estuco acrílico. En la cocina se arma refuerzo para fundir mesones. En el bano se instaló cerámica de piso y pared, se elabora bordillo de ducha. Se enchapó piso y pared de lavandería. Se instaló cerámica de piso en la alcoba 1.
13	**MVCB_4561**	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	Se terminaron panetes en sala , bano y cocina. Se fundió meson de cocina y se enchapa los muros.
14	**MVCB_4438**	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	Se instaló cerámica de piso en halla de entrada, hall de alcobas, en alcobas 2 y 3. Se avanza en enchape cerámico del piso de la zona de lavandería. Se demolió enchape de mesón de cocina. Se avanza en aplicación de pintura vinilo en corredores, alcobas 2 y 3, en lavandería.

15	**MVCB_4363**	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	Se fundió alistado de piso en sala comedor, alcoba 1, hall de alcobas. Se prepara superficie para alistado en la alcoba 2 y cocina. Continúa aplicación de estuco acrílico en sala comedor y alcoba 1.
16	**MVCB_4365**	OLGA BLANCO DE RIAÑO	Se elaboró alistado de pisos en áreas de sala comedor, hall de acceso, patio interior, bano, cocina y alcobas 1 y 2. Se demolicó enchape antiguo en áreas de bano y cocina. Se inicia instalación de cerámica de piso en área de alcoba 2.
17	**MVCB_4366**	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	Se levantaron mochetas en bloque en hall de escaleras. Se avanza en panete de muros de punto fijo, hall de alcobas y bano. Se alisto piso en la alcoba 4.
18	**MVCB_4900**	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	El día 20 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
19	**MVCB_3876**	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se acopia material arena y cemento para panete y alistado de pisos.
20	**MVCB_3888**	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	Se avanza en picado de piso y preparación de superficie de la sala comedor para instalar alistado.
21	**MVCB_3880**	FIDELIGNO RODRIGUEZ	Se acopia material arena y cemento para panete y alistado de pisos.
22	**MVCB_3885**	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
23	**MVCB_4811**	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR.
24	**MVCB_4801**	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
25	**MVCB_4791**	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	El día 20 de octubre de 2021 se hicieron presentes personal técnico y social del contratista e interventoría para realizar el protocolo de **apertura de actividades** en la vivienda, explicando al beneficiario las actividades a ejecutar de acuerdo con los presupuestos aprobados. Se abren las bitácoras con anotación y firma de personal técnico, social y beneficiario. No se han iniciado actividades de obra.
26	**MVCB4892**	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
27	**MVCB4272**	Nieves Lizarazo Valbuena	En el predio trabajaron todo el puente dejando en enchape de piso terminado en alcobas, hall y cocina. El día 19 de octubre no se presenta personal a realizar actividades la beneficiaria, manifiesta su inconformidad y solicita cumplimiento con las actividades. El día 20 de octubre se retoman las actividades y se inicia instalación de guarda escobas y enchape de muros en cocina
28	**MVCB 4628**	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
29	**MVCB 4152**	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
30	**MVCB 4694**	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
31	**MVCB 4689**	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
32	**MVCB 4744**	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de octubre se**
33	**MVCB 4732**	Doris Galvis Patarroyo	El día 19 de octubre se instala puerta de baño y se realiza boquilla de mesón en cocina e instalación de lavaplatos. **El día 20 de octubre se entrega predio a la beneficiaria**.
34	**MVCB 4629**	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 19 de octubre, en espera de llegada de puesta y detalles de acabados en baño y cocina . El día 20 de octubre, en espera de llegada de puesta.
35	**MVCB 4644**	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. **El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario**.
36	**MVCB 4219**	Mauricio Martin Beltrán	El día 19 de octubre, continua actividad de enchape muros y mesón cocina . El día 20 de octubre, se realiza instalación de cielo raso en alcoba.

37	**MVCB 4407**	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 19 de octubre se realiza enchape de piso en cocina se solicita al constructor los materiales para iniciar actividad de mesón cocina. El día 20 de octubre, se inicia actividad de armando de mesón cocina. .
38	**MVCB 4401**	Gustavo Martínez Prieto	El día 19 de octubre, se inicia enchape de pared en zona de lavado. El día 20 de octubre, alistado de piso en alcoba y hall del segundo piso .
39	**MVCB 4929**	Pedro Pablo Salamanca	El día 19 de octubre predio parado sin realizar actividades. El día 20 de octubre se retoman actividades en el predio en el área de la cocina, realizando alistado de piso
40	**MVCB 4233**	Beatriz Corredor Runsique	El día 19 de octubre, se realiza enchapé de muros en cocina, la beneficiaria solicita que no se coloque cenefa en esta área. El día 20 de octubre enchape de mesón cocina.
41	**MVCB 4843**	Marisol Palacios Andrade	El día 19 de octubre se realiza demolición mesón cocina, demolición bordillo baño, desmonte de puerta El día 20 de octubre se inicia actividad de enchape de pisos en alcobas posteriores
42	**MVCB 2243**	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 21 de septiembre se realiza validación del predio.
43	**MVCB 4842**	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 de septiembre se realiza validación del predio
44	**MVCB 4838**	Yenny Arlet Arévalo	El fin de semana trabajaron dejando todo el alistado de piso del segundo piso realizado. El día 19 de octubre, inician actividad de enchape de piso, en la alcoba 1. El día 20 de octubre continua la actividad de enchape en el segundo piso
45	**MVCB 3839**	José Olivo Cuadrado	El día 19 de octubre se realiza alistado de piso en alcoba 1 El día 20 de octubre se inicia enchape de piso en sala.
46	**MVCB 3863**	Fabio Rodríguez	El día 11 de octubre se realiza validación del predio
47	**MVCB 3809**	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 11 de octubre se realiza validación del predio
48	**MVCB 3803**	Luz Dary Sáenz Capera	La beneficiaria realiza el cambio de las tejas, que era un compromiso para la instalación del cielo raso, El día 19 de octubre, se presenta el ayudante del maestro realizando demolición del lavadero y retiro de enchape en zona de lavandería, se retira en horas de la mañana. El día 20 de octubre, no se presentan maestros a realizar actividades
49	**MVCB 3798**	María Aliria Medina de Beltrán	El día 12 de octubre se realiza validación del predio
50	**MVCB 3822**	Sory Inés Costes López	El día 12 de octubre se realiza validación del predio
51	**MVCB_4754**	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
52	**MVCB_4751**	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
53	**MVCB_3311**	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
54	**MVCB_3353**	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
55	**MVCB_3351**	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
56	**MVCB_3327**	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
57	**MVCB_3329**	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
58	**MVCB_3191**	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
59	**MVCB_3360**	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
60	**MVCB_0005**	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	Se avanza en panete de muros en áreas de zaguán, alcoba 1, muros perimetrales de patio interno. Se demolió mesón y enchape antiguo de cocina. Se demolió enchape existente en área de bano.
61	**MVCB_0481**	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.
62	**MVCB_0474**	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	Se acopia material arena y cemento para alistado de pisos.
63	**MVCB 1072**	Florinda Cadena Niño	Se realiza acta de inicio el día 12 de octubre El día 19 de octubre, se inicia actividad de pañetes muros en alcoba 1 El día 20 de octubre continua actividad de pañete muros en las actividades del día anterior y se inicia pañete en área de demolición en la alcoba 2
64	**MVCB 0213**	José Leonardo Serrano	El día 19 de octubre, continua el predio sin actividades, se informa a la oficina de interventoría. El día 20 de octubre se realiza pañete de muros en cocina y alistado de piso

65	**MVCB_2277**	Carmenza Flores Galban	Vivienda entregada.
66	**MVCB_2278**	Luz amparo Naranjo Aguirre	Vivienda entregada.
67	**MVCB_2414**	Luis Adolfo Torres Sanchez	Vivienda entregada.
68	**MVCB_2411**	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
69	**MVCB_2242**	Aura Nelly Figueroa	Vivienda entregada.
70	**MVCB_2244**	Carmen Concepción Lopez García	Vivienda entregada.
71	**MVCB_2413**	María Concepción Lombana Jimenez	Vivienda entregada.
72	**MVCB_2376**	Aura Elena Ramos Restrepo	Vivienda entregada.
73	**MVCB_2355**	Ana Otilia Barreto León	Vivienda entregada.
74	**MVCB_3793**	WILSON REINEL MORA CAICEDO	Vivienda entregada.
75	**MVCB_4867**	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	Vivienda entregada.
76	**MVCB_0660**	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día martes 19 de octubre de 2021.
77	**MVCB_3773**	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes en área de cocina y baño, pintura en alcobas. Los beneficiarios instalaron cielo raso en alcobas por su cuenta.
78	**MVCB_3752**	JESUS ANTONIO LOPEZ	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega al propietario el día martes 19 de octubre de 2021.
79	**MVCB_0666**	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Se hace visita de apertura e inicio de actividades de obra el día jueves 14 de octubre de 2021. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchape de pisos de alcobas y estuco de muros.
80	**MVCB_3771**	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de piso en todo el área, estuco y pintura en muros.
81	**MVCB_3748**	ANA CECILIA CAMACHO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
82	**MVCB_3721**	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
83	**MVCB_3703**	HILDA VARGAS GRANADOS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchape de muros de baño. Alistado de piso en baño y lavadero.
84	**MVCB_3706**	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchape de piso de patio y estructura para cielo raso en primer nivel.
85	**MVCB_4096**	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Alistado de piso de patio. Puntos hidraulicos de lavadero y lavadoras.
86	**MVCB_4085**	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco de muros en alcobas piso 1. Estuco de muros de alcobas y enchapes de pisos.
87	**MVCB_4072**	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Fundición de mesón de cocina, enchapes de muros y piso de cocina. Enchape de piso de alcoba 1.
88	**MVCB_4185**	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchape de piso y estuco en antepecho de terraza piso 4.
89	**MVCB_4188**	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de mesón de cocina, alistados de piso en alcobas.
90	**MV_42886 IDU**	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
91	**MVCB_4198**	LUCIO CIFUENTES VEGA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de pisos en baño, alistados de pisos en sala.
92	**MVCB_4175**	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de todo el área y alistados de piso en alcobas.
93	**MVCB_2055**	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
94	**MVCB_2034**	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
95	**MVCB_2013**	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 13 de Octubre de 2021.
96	**MVCB_2019**	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
97	**MVCB_2020**	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - UNIR II			
98	**MVUN_484**	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
99	**MVUN_106**	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
100	**MVUN_464**	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4 y aplicación de estuco en muros de area Sala-Comedor
101	**MVUN_424**	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
102	**MVUN_171**	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia apliacacion pañete convencional en mamposteria Habitacion 2,
103	**MVUN_469**	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia Alistado de piso en mortero 1:4 Areas de Sala-comedor
104	**MVUN_478**	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	No ha sido posible efectuar visita tecnico-social
105	**MVUN_099**	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
106	**MVUN_588**	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
107	**MVUN_241**	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
108	**MVUN_115**	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
109	**MVUN_128**	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
110	**MVUN_238**	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
111	**MVUN_182**	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
112	**MVUN_299**	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
113	**MVUN_295**	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la apertura de actividades de la vivienda dando conocimiento al beneficiario de las actividades a ejecutar
114	**MVUN_290**	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
115	**MVUN_173**	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial
116	**MVUN_174**	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

A la fecha del presente informe no se presentan por parte del contratista acciones que conlleven a presentar incumplimiento en la ejecución del contrato de obra

4.2 Constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales.
(cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

- VER ANEXO PARAFISCALES OBRA (1)
- VER ANEXO PARAFISCALES INTERVENTORÍA (2)


4.3 Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)
- VER ANEXO OFICIOS INTERVENTORÍA (4)

4.4 Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

4.4.1 Pólizas Contrato de interventoría número: 797-2021

Las pólizas no han tenido modificación alguna a la fecha del informe

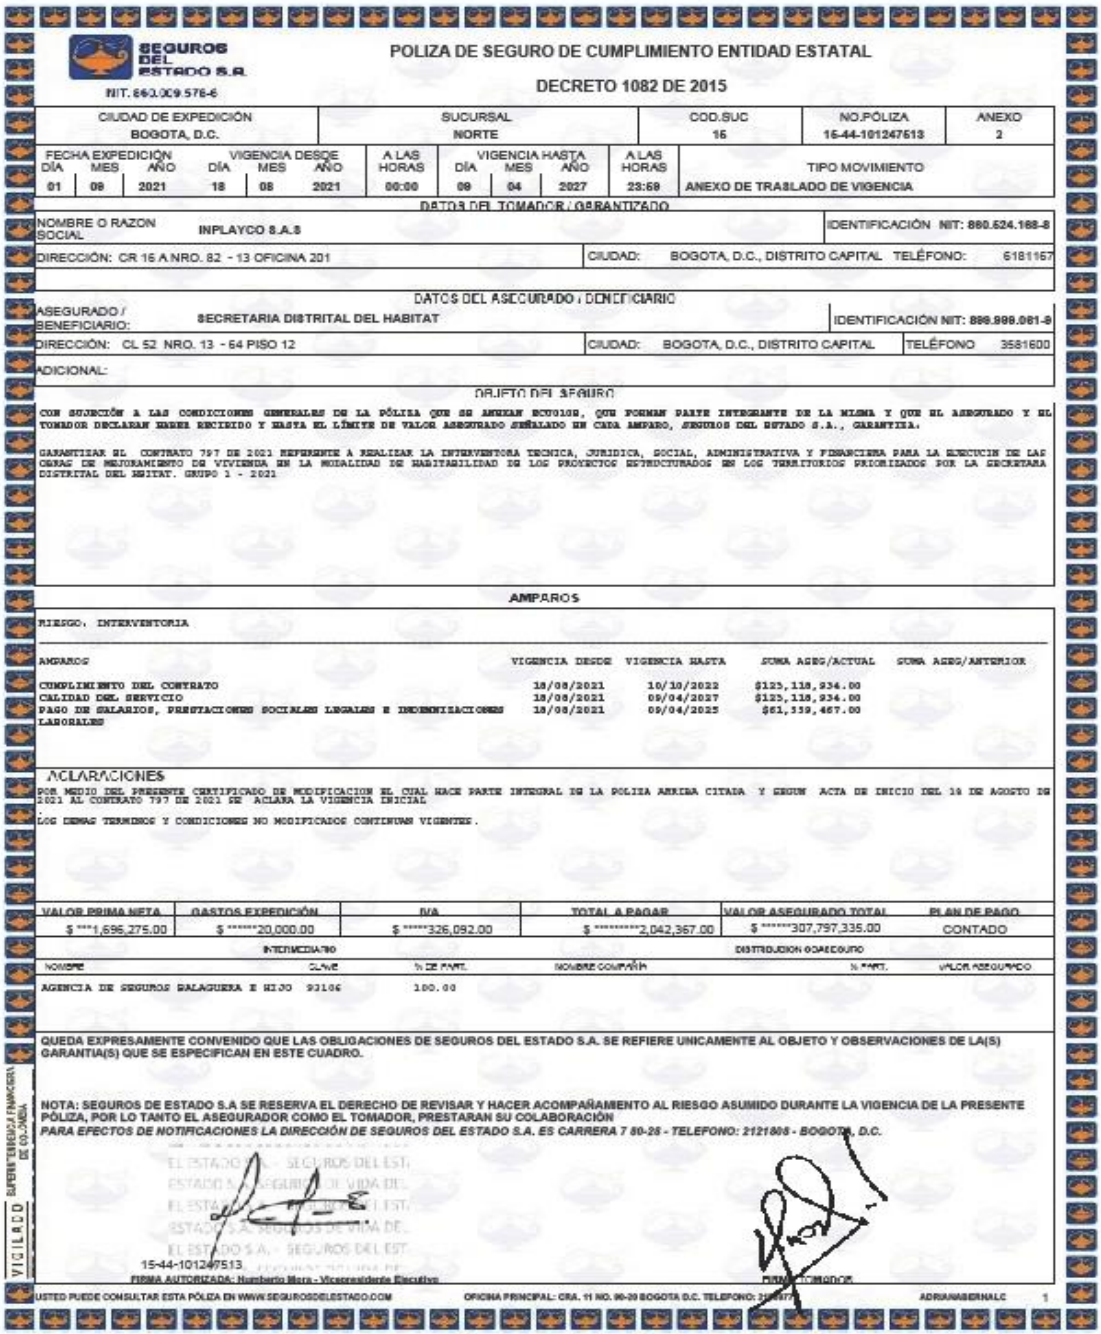

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	16	16-44-101247513	2

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2021	18	08	2021	00:00	09	04	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INPLAYCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN NIT: 860.524.168-8

DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.081-6

DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 PISO 12 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOUOIB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CONTRATO 797 DE 2021 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPO 1 - 2021

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2021	10/10/2022	$125,118,934.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2021	09/04/2027	$125,118,934.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2021	09/04/2025	$61,559,467.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN ACTA DE INICIO DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 AL CONTRATO 797 DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,696,275.00	$ *****20,000.00	$ ****326,092.00	$ *********2,042,367.00	$ ******307,797,335.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS GALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-25 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101247513

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo — FIRMA TOMADOR


USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: [illegible] — ADRIANABERNALC — 1

AMPAROS ASEG/ACTUAL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/08/2021	10/10/2022	$123,118,934.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2021	09/04/2027	$123,118,934.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/08/2021	09/04/2025	$61,559,467.00

Aseguradora Seguros del estado S. A
No. De póliza: 15-44-101247513
Fecha de Expedición: 01/09/2021

4.4.2 Pólizas Contrato de obra número: 794-2020

Las pólizas no han tenido modificación alguna a la fecha del informe

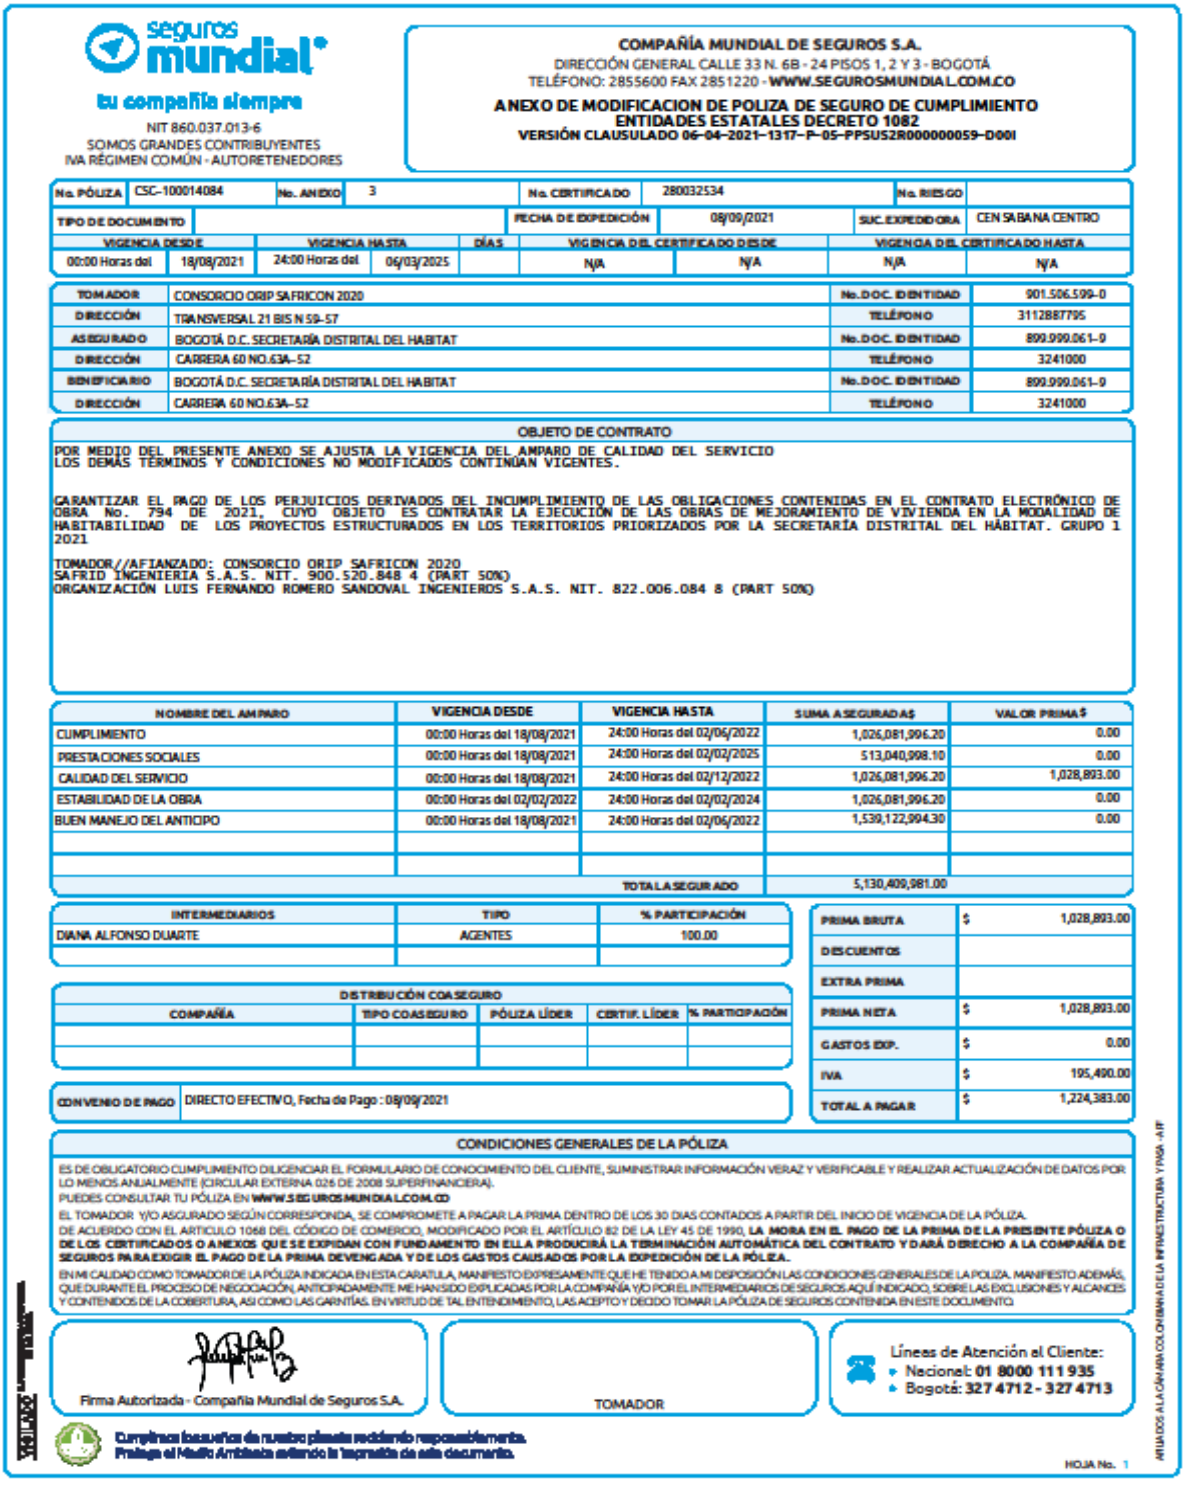

seguros mundial
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CSC-100014084	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	280032534	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	18/08/2021	24:00 Horas del	06/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	No. DOC. IDENTIDAD	901.506.599-0
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 21 BIS N 59-57	TELÉFONO	3112887795
ASEGURADO	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 60 NO.63A-52	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 60 NO.63A-52	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 794 DE 2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 2021

TOMADOR//AFIANZADO: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020
SAFRID INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.520.848 4 (PART 50%)
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. NIT. 822.006.084 8 (PART 50%)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA $	VALOR PRIMA $
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,026,081,996.20	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/02/2025	513,040,998.10	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/12/2022	1,026,081,996.20	1,028,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 02/02/2022	24:00 Horas del 02/02/2024	1,026,081,996.20	0.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,539,122,994.30	0.00
		TOTAL ASEGURADO	5,130,409,981.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DIANA ALFONSO DUARTE	AGENTES	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1,028,893.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1,028,893.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	195,490.00
TOTAL A PAGAR	$	1,224,383.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 08/09/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestros clientes cuidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No. 1

ANULADOS A LA CAÑAVERA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AIF

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,026,081,996.20	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/02/2025	513,040,998.10	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/12/2022	1,026,081,996.20	1,028,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 02/02/2022	24:00 Horas del 02/02/2024	1,026,081,996.20	0.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 18/08/2021	24:00 Horas del 02/06/2022	1,539,122,994.30	0.00
		TOTAL ASEGURADO	5,130,409,981.00	

Aseguradora Compañía Mundial de seguros S. A
No. De póliza: CSC-1000014084
No. De Certificado: 280032534
Fecha de Expedición: 08/09/2021

Con relación a este punto se indica que la interventoría como el contratista se encuentran con las garantías (Pólizas) actualizadas, firmadas y vigentes.

5. ASPECTOS SOCIALES

5.1 Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

Para el periodo de este informe no se registran PQR

5.2 Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

5.3 Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA	20/10/2021	**PERIODO No.**	2	DEL	**20/09/2021**	AL	**21/10/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU

VALIDACIONES REALIZADAS
21/09/2021 **- MVCB_ 4366: GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO,** Validación sin novedad
21/09/2021 **- MVCB_ 4365: OLGA BLANCO DE RIAÑO** Validación sin novedad
21/09/2021 - **MVCB_ 4968:LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO,** Validación sin novedad, Barrio las acacias
21/09/2021 **- MVCB_ 4843, MARISOL PAREDES PALACIOS**Validación -LA SEÑORA Marisol dejo carta de autorizaciòn a su hijo y coorobora informaciòn de la caracterizaciòn via telefonica
21/09/2021 - **MVCB_ 2243, HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO-** Se realiza valinadaciòn sin ninguna observaciòn por parte del beneficiario
21/09/2021 - **MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
21/09/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Atiende la visita su padre RAFAEL REYES VANEGAS TOVAR, se hace contacto teléfonico con la beneficiaria ya que no dejo carta de autorización. Permite que su papá reciba la visita y se compromete a enviar la carta de autorización junto a las cédulas de identidad.
21/09/2021 **MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO** Autorización al hijo Edison Humberto Camelo para atender la visita.
21/09/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO CAMPOS** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
21/09/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
21/09/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Se realiza proceso de validación y caracterización social, autorizado JHON JAIRO LLANOS CUELLAR.
21/09/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS** Se realiza proceso de validación y caracterización social. Tiende visita ANGIE PINTO autorizada por el beneficiario
22/09/2021 - **MVCB_ 3839 JOSE OLIVO CUADRADO,** VALIDACIÒN SIN NINGUNA OBSERVACIÒN POR PARTE DEL BENEFICIARIO
22/09/2021 - **MVCB_ 4838 YENY ARLEY AREVALO PACHON ,** VALIDACIÒN ,SIN NINGUNA OBSERVACIÒN POR PARTE DEL BENEFICIARIO
22/09/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
22/09/2021 **MVCB_3984 BÁRBARA ORTIZ RUEDA** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
22/09/2021 **MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZÁBAL** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
23/09/2021 - **MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
23/09/2021 - **MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
23/09/2021 - **MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
23/09/2021 - **MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO** Se realiza proceso de validación y caracterización social.
23/09/2021 - **MVCB_ 4842, GILLERMO VALENCIA OYOLA** VALIDACIÒN SIN NINGUNA OBSERVACIÒN POR PARTE DEL BENEFICIARIO
24/09/2021 - **MVCB_4072: SAIRA RAMIREZ.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
24/09/2021 - **MVCB_4185: PEDRO JIMENEZ.** Validación. Atiende la visita el beneficiario en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
24/09/2021 - **MVCB_4188. GUMERCINDA MONDRAGON.** Validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.

28/09/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** URBANIZACIÓN COMPARTIR Se realiza proceso de validación y caracterización social
28/09/2021 - **MV_42886_IDU. MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
28/09/2021 - **MVCB_4198. LUCIO CIFUENTES VEGA,** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
29/09/2021 - **MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.** Atiende la visita su hermano autorizado YESID SIMBAQUEBA AFRICANO, entrega fotocopias de documentos de identidad y carta de autorización.
30/09/2021 - **MVCB_4175. MARÍA ELSY MAYORCA RODRÍGUEZ.** validación. Atiende la visita la beneficiaria en la cuál se realiza la catacterización social y medición técnica al predio.
30/09/2021- **MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
30/09/2021 **MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ** Se realiza proceso de validación y caracterización social
30/09/2021- **MVCB_0474: MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
30/09/2021- **MVCB_4900: MARTHA TERESA MEJIA CASTRO**, Se realiza visita de validación social y tecnica. recibe visita Cuñada Autorizada **NUBIA NANCY CARRETO.** Se brinda la información pertienete al proyecto, autorizada no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ.** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
1/10/2021- **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES** Se realiza visita de validación social y tecnica. Se brinda la información pertienete al proyecto, beneficiario no expresa dudas y/o inconformidades.
04/10/201 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ** Se realiza validación social en la vivienda se diligencia formato de caracterización social.
11/10/2021 - **MVCB_ 3863:FABIO RODRIGUEZ TOQUICA,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
11/10/2021 - **MVCB_ 3809: ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ ,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
12/10/2021 - **MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA,** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
12/10/2021 - **MVCB_ 3822 SORY INES CORTES LOPEZ** , ES LA HIJA DE LA PROPIETARIA QUIEN APARECE BENEFICIARIA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, REGISTRA DISCPACIDAD DESDE EL NACIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL, QUIEN QUEDA ACARGO DE LA OBRA ES LA SEÑORA CLARA INES LOPEZ
12/10/2021 - **MVCB_ 3798: MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,** SIN NINGUNA NOVEDAD
13/10/2021 **MVCB_4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ:** Se realiza validacion tecnica y social sin ninguna novedad.
13/10/2021 **MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:** Se realiza validación a esposa **CINDY MARCELA GUEVARA** con carte de autorizacion. Se realizco contacto telefonico con el beneficiario ya que numero telefonico estaba errado en base de datos y no habia sido posibile la comunicación para concertar validación.
VALIDACIONES FALLIDAS
23/09/2021 - **MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.** Validación fallida. Atiende la visita su hermano autorizado YESID SIMBAQUEBA AFRICANO, entrega fotocopias de documentos de identidad y carta de autorización. Se solicitará acompañamiento con secretaria del habitat por estructua de la vivienda.
23/09/2021 - **MVCB_4072: SAIRA RAMIREZ .Validación fallida.** No es posible realizar la validación ya que no atienden a la puerta y los número están errados. Se deja nota bajo puerta notificando la visita y dejando contacto teléfonico**.**
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
21/09/2021 - **MVCB_ 4407 GLORIA ALARCON BAUTISTA ,**se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario

21/09/2021 - **MVCB_ 0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO,** se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario
21/09/2021 - **MVCB_ 0828 AMANDA UTELIA APONTE,**se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario
23/09/2021 - **MVCB_ 4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN ,**se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario
23/09/2021 - **MVCB_ 4233 BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE ,**se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario, QUIEN DEJA AUTORIZACIÒN A SU NIETA
24/09/2021 - **MVCB_ 4272 , NIEVES LIZARAZO VALBUENA** se realiza la socializaciòn de las actividades de obra con el presupuesto inicial a conformidad con el beneficiario,

24/09/202 **- MVCB_3710, JORGE EDUARDO MORENO;** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. No se reportan novedades.
27/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
29/09/202 **- MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS:** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
29/09/2021- **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Recibe visita autorizado (padre) **RAFAEL REYES VANEGAS TOVAR**, Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y reco
29/09/2021- **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales.
30/09/2021 - **MVCB_3752: Jesús ANTONIO LÓPEZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
30/09/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
30/09/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA.** Se hace contacto teléfonico con su hijo JOSE MARTÍNEZ para darle a conocer las recomendaciones ya que la beneficiaria es una persona de la tercera edad. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
4/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
4/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
4/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
05/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
06/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
06/10/2021 **MVCB_4363 LUZ FABIOLA VIRGUZ PINILLA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
06/10/2021 **MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
06/10/2021 **MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO ,** Se realiza la apertura el beneficiario ya habia realizado los arreglos acordanos en la tuberia.
06/10/2021 **MVCB_4401 GUSTAVO MARTINEZ PRIETO,**Se realiza apertura sin ninguna novedad
07/10/202 **- MVCB_4561: ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Recibe visita autorizado **MIRYAN LOPEZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
07/10/2021- **MVCB_4351 JENIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
08/10/2021- **MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO:** Recibe visita autorizado hijo **EDIXON CAMELO** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.
11/10/2021-**MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO**,Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
11/10/2021 - **MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
11/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
11/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Se hace apertura ; con su hija autorizada GLORIA LILIANA AMAYA con carta de autorización en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados

11/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**. Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
11/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
12/10/2021 - **MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
12/10/2021 - **MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA ,** APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD.
12/10/2021 - **MVCB_ 3839: JOSE CUADRADO CUADRADO ,** APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD
12/10/2021 - **MVCB_ 4929: PEDRO PABLO SALAMANCA ,**SE REALIZA APERTURA DE VIVIENDA SIN ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA **(cubierta)**

12/10/202 **- MVCB_4498: ELCI RUTH ORTIZ MORENO:** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, se entrega kit y se brindan indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de

12/10/2021- **MVCB_4365: OLGA BLANCO DE RIAÑO.** Se realiza Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros de obra encargados.

13/10/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
13/10/2021 **MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.

13/10/2021 - **MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE.** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados.
14/10/2021 - **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales. Se presentan maestros encargados
14/10/2021 **MVCB_ 4838 YENNY ARLET AREVALO PACHON:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentar
14/10/2021 **MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES: S**e realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresenta
14/10/2021 **MVCB_ 3888 GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan m
15/10/2021 **MVCB_0481 MARCO JULIO MARTINEZ** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros
15/10/2021 **MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros enc
15/10/2021 **MVCB_ 3880 FIDELGNO RODRGUEZ:** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Sepresentan maestros en
15/10/2021 - **MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA ,**APERTURA SIN NINGUNA NOVEDAD
15/10/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
15/10/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA S**e hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
15/10/2021 **MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA** Se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones.
20/10/2021 **MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO,** recibe visita Cuñada Autorizada NUBIA NANCY CARRETO.Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria, brindando claridad sobre el área que se intervendrá, ya que el predio está dividido, pero el subsidio y planos están definidos en un área definida.
20/10/2021 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, SISO y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la beneficiaria. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad. Se presentan maestros encargados de la obra.
20/10/2021 **MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL** se hace apertura de obra, beneficiario firma documentos necesarios, se brinda información social y se dan recomendaciones
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
30/09/2021 **MV-42838-IDU DECIDERIO MAYORGA** el beneficiario refiere que no puede estar pendiente el fin de semana de las obras por lo cual solicita se aperture desde el dia lunes 4 de octubre de 2020
12/10/2021- **MVCB_4475 MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO:** No es posible realizar apertura, debido a que la beneficiaria se encuentra realizando obras en el 3 piso y tiene material en el area que se intervendrá.
SEGUIMIENTOS SOCIALES
21/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se observa avance de obra y satisfacción de la familia.
21/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** Se evidencia que iniciaron labores constructivas y tranquila por parte de la beneficiaria. Se observa personal de obra en el predio.
21/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Felix Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra en la casa.
21/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes
21/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes.
21/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra, la beneficiaria no indica dudas en inquietudes, los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
21/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente. Se hace entrega parcial de habitaciones, sala y cocina a conformidad de la familia. Se transmite información a la beneficiaria.
21/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad ya que la ejecución del baño avanzo y el sanitario se encuentra funcionando.
21/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio

21/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ, seguimiento a vivienda aún no aperturada-** Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Se hace acercamiento al predio para informarle a la familia que el día lunes se hará la apertura ya que es cubierta
21/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE AVELINO LEON,** Se explica al beneficiario que la actividad de pañete en pecho exterior no se encuentra dentro del preesupuesto.
22/09/2021 - **MVCB_ 2621 : ALIX ÁNGULO AMADO**, Se realiza seguimiento de obra, encargado del predio atiende la visita .**STIVEN HERREÑO ANGULO**, Refiere conformidad con los avances de obra.
22/09/2021 - **MVCB_ 2615 : CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
22/09/2021-M**VVB_4629 JORGE ANDRES JIMENEZ**, Se paran actividades de instalacion de piso por inconformidad del color del enchape por parte del beneficiario.
22/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,No se presenta ninguna novedad por parte del beneficiario, se evidencia avance en obra.
22/09/2021- **MVCB_3191: DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se levanta acta de compromisos debido a situación de consumo al interiror de la vivienda por parte del hijo de la beneficiara . Se presentan maestro de obra y se realiza compromiso de desalojar habitaciones.
22/09/2021- **MVCB_3351: YAMILETH MARTINEZ CORTEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende hijo autorizado **DUVAN BARRIO**S. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inquietudes. Conformidad con los avances.
22/09/2021- **MVCB_3327: JESIKA LORENA TELLEZ CASTRO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita abuela Autorizada **ANA MARÍA** Se evidencia personal de obra ejecutando actividades.No reportan dudas y/o inquietudes frente a las actividades. se realiza entrega parcial de habitaciín 1 para lograr dar continuidaden mejoras en otras areas de la vivienda.
22/09/2021**- MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita **RUBIELA GOMEZ.** Se evidencia maestro de obra ejecutando actividades. No reportan dudas y/o inquietudes
22/09/2021**- MVCB_3311: MIYO FIGUEROA ROJAS:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se envide fía maestros ejecutando actividades. Beneficio no se encuentra en la vivienda, se realiza contacto telefónico, reiterando la importancia de permanecer durante la ejecución de obras en la vivienda.
22/09/2021- **MVCB_4751: MARIA LIGIA SOTO AVILA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría.Se evidencia personal de obra ejecutando actividades en baño. Beneficiaria expresa conformidad con los avances.
22/09/2021- **MVCB_4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Atiende visita hija autorizada **CRISTINA HUESO.** Se evidencia maestros ejecutando actividades. Se concreta actividades de cielo Raso en habitación en 4 zonas. Conformidad con el avance.
22/09/2021- **MVCB_3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZÓN,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales de interventoría. Beneficiaria no se encuentra en la vivienda, se realiza contacto telefónico reiterando la importancia de permanecer en la vivienda durante la ejecución de obras
22/09/2021- **MVCB_3360: MYRIAM YACELY JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales de interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades, beneficiaria no reporta dudas y/o inquietudes.
22/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO,** Se evidencia maestros y avance en obra
22/09/2021 - **MVCB_ 3424 : GIANNI GIOVANNA REYES MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde donde se resuelven dudas e inquietudes tecnicas de obra.
22/09/2021- **MVCB_ 3425 : PABLO ANTONIO CUERVO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
22/09/2021 - **MVCB_ 3650 : MARTHA NUBIA POSADA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita se deja anotacin en bitacora.
22/09/2021 - **MVCB_ 3410:OCTAVIO VALENCIA LLANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
22 /09/2021 - **MVCB_ 3433 :ELENA MOJICA DE GUTIERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
22/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **NGRID PAOLA GARAVITO.** La encargada del predio no se encontraba al momento de la visita se deja anotacion en bitacora.
22/09/2021 - **MVCB_ 3396 : ANGEL ESTELA MENDOZA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
23/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes, se le recuerda cuidar la bitácora ya que se encontraba sucia.
23/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad por las labores constructivas, no indica dudas e inquietudes. Se observa personal de obra en el predio.

23/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes.
23/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad por las labores constructivas, indica dudas técnica la cual se resuelve por los técnico. Se observa personal de obra en el predio.
23/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra, atiende la visita su esposo Felix Gaona autorizado. Manifiesta conformidad con los avances de obra. Se observa personal de obra en la casa
23/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes.
23/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes.
23/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Se le hace aclaración al hijo de la beneficiaria sobre el piso de una habitación, los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
23/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad ya que la ejecución del baño avanzo y el sanitario se encuentra funcionando
23/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ**. Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente.
23/09/2021 - **MVCB_ 3669 : GABRIELA MUÑOZ,** Se realiza seguimiento de obra, arrendataria atiende la visita la sra. **NGRID PAOLA GARAVITO. L**a encargada del predio no se encontraba al momento de la visita se deja anotacion en bitacora.
23/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,El beneficiario acepta la injstalacion del enchape teniendo en cuenta que el actual mente instalado en habitaciones es de un lote diferente se deja observaciones en la bitacora.
24/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE AVELINO LEON,** Se evidencia avance en obra
24/09/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ, SEGUMIENTO ,** Se evidencia avance en obra
24/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO**, Avance en obras, ni se presenta ninguna observacion por parte del beneficiario.
24/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** Se evidencia maestros y avance en obra
24/09/2021 - **MVCB_ 4407 GLORIA STELLLA ALARCON,** Se evidencia maestros y avance en obra
24/09/2021- **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales de interventorí**a.** Atiende la visita la autorizado **STIVEN HERREÑO**. Se realiza seguimiento de obra, el encargado del predio refiere conformidad con las actividades que se están ejecutando.
24/09/2021- **MVCB_ 3396 ÁNGEL ESTELA MENDOZA.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando. No se evidencia maestro, sin embargo beneficiaria afirma que se encuentran recogiendo material.
24/09/2021- **MVCB_ 3425. PABLO ANTONIO CUERVO:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando. Se evidencian maestros en obra.
24/09/2021- **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando. Se evidencian maestros en obra
24/09/2021- **MVCB_2615. CARMEN CECILIA BLANCO:** Se realiza visita social y técnico de seguimiento a la obra. La beneficiaria refiere conformidad con los avances de obra, se resuelven dudas al respecto frente algunas actividades. Personal de obra ejecutando actividades.
24/09/2021- **MVCB_ 3650. MARTHA NUBIA POSADA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Donde se observa que la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita, se toma control en bitácora.
24/09/2021- **MVCB_ 3433. ELENA MOJICA DE GUTIÉRREZ:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando. Se evidencian maestros en obra.
24/09/2021**- MVCB_ 3410 OCTAVIO VALENCIA LLANO:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. No se reportando dudas y/o inquietudes. Conformes con los avances en la obra.
27/09/2021- **MVCB_0828 AMPARO UTELIA APONTE.** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiaria no se encuentra al momento de la visita, maestro reporta que la beneficiaria tiene dudas sobre algunas actividades de obra, se realiza claridad que escaleras no se intervienen.
27/09/2021- **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se resuelven dudas al beneficiario sobre actividad de estuco y pintura en areas de la vivienda, via telefonica con el tecnico encargado de la vivieda.

27/01/2021- **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMIDIO,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiario se encuentra conforme con las obras no presenta dudas,
27/09/2021- **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se observa personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria no refiere dudas y/o inconformidades con el avance.
27/09/2021- **MVCB_2019 CLARA MARÍA RESURRECCIÓN LOPEZ,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área socia, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL** TORRES Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Sin novedad desde el área social, Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra en la vivienda, Beneficiaria expresa conformidad con los avances. No refiere dudas.
27/09/2021- **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiario solicita dar prioridad en obras en 2 piso. No refiere dudas. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades.
27/09/2021- **MVCB_2034: AMINTA SABOGAL,** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiara reporta tener un altercado el dia sabado 25/09/2021 con uno maestro, se escala situación para dar seguimiento y llamado de atención al personal.
28/09/2021- **MVCB_3669: GABRIELA MUÑOZ:** Se realiza visita de seguimiento a la obra social y técnica. Atiende la visita la autorizada **ÍNGRID PAOLA GARAVITO** Refiere conformidad con los avances de obra, solicita dar prioridad a las obras de debido a que arrendataria se encuentra en dieta por maternidad.
28/09/2021- **MVCB_ 3650. MARTHA NUBIA POSADA:** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria manifiesta inconformidad con la instalación del mesón existente en cocina ya que falta asegurarlo y rematar actividades en el área.
28/09/2021- MVCB_ 3433. ELENA MOJICA DE GUTIÉRREZ: Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se resuelven dudas a beneficiaria, quien muestra conformidad con los avances en las obras. Se evidencian maestros ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_ 3396 ÁNGEL ESTELA MENDOZA.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades. Se evidencia maestros ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_2615 CARMEN CECILIA BLANCO:** Se realiza visita social y técnico de seguimiento a la obra. Beneficiaria se encuentra en cita médica, no reportó dudas y/o inquietudes. Personal de obra ejecutando actividades.
28/09/2021- **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Atiende la visita social y tecnica decontratista e interventoria el autorizado **STIVEN HERREÑO.** Se realiza seguimiento de obra, el encargado del predio refiere conformidad con las actividades que se están ejecutando. Pendiente compromiso re ubicar puntos de gas y corte de puerta
28/09/2021- **MVCB_ 3425. PABLO ANTONIO CUERVO.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades, se solicita priorizar zona de baño. Se evidencian maestros en obra.
28/09/2021- **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES**. Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Beneficiaria expresa inconformidad por demoras en la obra. Se solicita al contratista priorizar obras.
28/09/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Seguimiento de obra. Se observa personal de obra en la casa.
28/09/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Seguimiento de obra. La beneficiaria manifiesta tranquilidad por los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio. Doña Ana no indica dudas e inquietudes.

28/09/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra. El hijo de la beneficiaria refleja felicidad por las labores constructivas; los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia
28/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Seguimiento. Atiende la visita la autorizada Sandra Ojeda. Refiere que los maestros están laborando continuamente.
28/09/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra en compañía de la secretaria del hábitat, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
28/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad.
28/09/2021 - **MVCB_3329: HECTOR ZAMBRANO.** Se realiza visita de seguimiento, Beneficiario indicaciones conformidad con los avances constructivos. No manifiesta dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_3191 DORA ALBA RUBIO.** Seguimiento en el cuál se evidencia maestros ejecutando actividades de obra, beneficiaria expresa conformidad con el rendimiento de los maestros. No refiere dudas y/o inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad por las labores constructivas, indica dudas técnica la cual se resuelve por los técnico. Se observa personal de obra en el predio.
28/09/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes.
28/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA
28/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,SEGUIMIENTO , SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA.
28/09/2021 - **MVCB_ 4629: JORGE ANDRES JIMENEZ,** SEGUIMIENTO, SE EXPLICA AL BENEFICIARIO NUEVAMENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO , EL BENEFICIARIO MUESTRA INCONFORMIDAD POR NO TENER GARANTIAS DE LOS PISOS , POR ESTADO DE CUBIERTA.
29/09/2021-M**VVB_4233:BEATRZ CORREDOR:** LA BENEFICIARIA MANIFIESTA AL AREA TECNICA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA ACTIVIDAD DEL PVC POR POSIBLRES GTERASEN LA CUBIERTA
29/09/2021-M**VVB_4219: MAURCIO MARTIN** ,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO.
29/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA
29/09/2021 - **MVCB_ 4407 GLORIA STELLLA ALARCON,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, LA BENEFICIARIA SE ENCUENTRA CONFORME CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO
29/09/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad.
29/09/2021- **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, se evidencia maestro, sin embargo no se refleja mayor avance en las obras.
29/09/2021-**MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, La beneficiaria indica conformidad con el avance. Se observa personal de obra en el predio.
29/09/2021- **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, se realiza recomendación frente a remates en muro, pendiente puerta para entrega de vivienda

29/09/2021**- MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora **LAURA SÁNCHEZ**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria, Se observa maestros en ejecutando actividades. No se reportan dudas.
29/09/2021- **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO**. Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria,Se evidencia terminación de actividades, pendiente puerta para entrega.
29/09/2021- **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia terminación de obras, pendiente puerta para entrega de vivienda.
29/09/2021- **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. Se observa avance de obra y satisfacción de la familia. El señor Wilson no indica dudas e inquietudes
29/09/2021- **MVCB_2278: LUZ AMPARO NARANJO.** Se realiza seguimiento social y tecnico a la obra por parte de contratista e interventoria. no se evidencia avances en las obras. Beneficiario no se encuentra en la vivienda.
29/09/2021 - **MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
29/09/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
29/09/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
29/09/2021 - **MVCB_ 3191** :**DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando
29/01/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS**
29/09/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
29/09/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
29/09/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
29/09/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION** LOPEZ RODRIGUEZ Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Sin novedad desde el área social con visita acompañamiento desde Secretaria de Hábitat
30/09/2021- **MVCB_ 4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ:** se realiza visita de seguimiento a la obra con técnicos y sociales del contratista e interventoría, beneficiario se encuentra despejando áreas para interveni demas areas de la vivienda. No refiere dudas y/o inconformidades.
30/09/2021- **MVCB_ 3433. ELENA MOJICA DE GUTIÉRREZ**. Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencia personal ejecutando actividades. Beneficiaria satisfecha con avances.
30/09/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,EL BENEFICIARIO AVANCES EN OBRA
30/09/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA
30/09/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ, SEGUMIENTO ,** SE EVIDENCIA ANVANCE EN OBRAS
30/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN DE ACABADOS

30/09/2021_**MVCB_4272: NIEVES LIZARAZO** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
30/09/2021_**MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** SE EVIDENCIAS AVANCES EN OBRA
01/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_2244: CARMEN LÓPEZ GARCÍA.** Seguimiento de obra, se evidencia maestros en el predio, la señora Carmen indica conformidad y alegría por las labores adelantadas
01/10/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Seguimiento de obra, la señora Aura refleja tranquilidad con los avances de la obra. No indica dudas e inquietudes. Se evidencia personal de obra en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Seguimiento de obra. El hijo de la beneficiaria refleja felicidad por las labores constructivas; los trabajadores están laborarando en el predio y se observan buenas relaciones con la familia.
01/10/2021 - **MVCB_4072:** La encargada indica que solo hay un maestro y no han traído material
01/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta conformidad y gratitud por las labores adelantadas. Se observa personal de obra en el predio.
01/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Recibe visita autorizado (padre) RAFAEL REYES VANEGAS TOVAR, se observa personal de obra en el predio y conformidad por parte de la familia.
01/10/2021-M**VVB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** ,SEGUIMIENTO , SE EVIDENCIA AVANCES EN OBRA.
01/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** SE REALIZA ENTREGA DE ESPACIOS: COCINA , BAÑO , HABITACIONES.
01/10/2021_**MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** SE EVIDENCIAS AVANCES EN OBRA
01/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
01/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
01/10/2021 - **MVCB_ 4754: ALBERTO HUESO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
01/10/2021 - **MVCB_ 4751: MARIA LIGIA SOTO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda, atiende la visita hijo **DIEGO SOTO.**
01/10/2021 - **MVCB_ 3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario no se encontraba al momento de la visita se deja anotacion en la bitacora de las actividades de obra ejecutadas.
01/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **LETICIA CASTRO.**
01/10/2021 - **MVCB_ 3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **RUBIELA GOMEZ.**
01/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, el hijo encargado del predio **DUVAN BARRIOS** no se encontraba al momento de la visita se dejan anotación en bitacora de las actividades que se estan ejecutando

04/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** Segimiento, se evidencia avances en la obra
04/10/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ, SEGUMIENTO ,** Se evidencia avances en acabado de obra.
04/10/2021**_MVCB_4272: JOSE ALIARIO TORRES:** Se evidencia avances en acabado de obra, sin novedad
04/10/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** se encuentra en terminacion de acabados, vivienda sin novedad
05/10/2021-M**VCB_4744 : ALVARO ZUBIETA TUNJANO** , Se realiza acta con compromisos para acabados de la obra (PINTURA EN HOLL ,MURO DE LA HABITACIÓN LATERAL 4 ESPACIO DONDE SE EVIDENCIA HUMEDAD O GRASA.)
05/10/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN** , Se presenta observacion por parte del beneficiario el piso se encuentra en desnivel.
05/10/2021**_MVCB_4233 BEATRIZ CORREDOR** : Se evidencia avances obra.
05/10/2021**_MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : Se evidencia avances obra.
05/10/2021 - **MVCB_ 3410: OCTAVIO VALENCIA LLANO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados.
05/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando.
05/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que el beneficiario está conforme con las actividades qué se están ejecutando, se evidencian espacios de obra terminados para entrega de vivienda
05/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **LETICIA CASTRO.**
05/10/2021 - **MVCB_ 3353: ALCIRA MONGUI OCHOA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende la visita la encargada del predio **RUBIELA GOMEZ.**
05/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, el encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS** no se encontraba al momento de la visita
5/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** se realiza seguimiento social, el beneficiario se encuentra de acuerdo con las actividades ejecutadas en la vivienda no presenta dudas referente a la ejecución de las obras
5/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA** la beneficiaria está de acuerdo con las actividades realizadas en la vivienda: sin novedad desde el área social
5/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se adiciona actividad de enchape de escaleras, la beneficiariua se encuentra conforme con las actividades.
5/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** Se adiciona actividad de enchape de escaleras.
5/10/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** vivienda Sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN** , Se presenta observaciones por parte del beneficiario,(afectación en el emchape de techo de cocina primer piso);el director de obra por parte del contratista se acerca a la vivienda dando solución, a los requerimientos del Beneficiario de la siguiente manera: 1. Desmonte de emchape de cocina del techo . 2. Se hará cambio del personal, 3. El beneficiario se compromete a habilitar el espacio de la cocina para realizar las obras ya mencionadas.
6/10/2021 **MVCB_0828 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_0837 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario

06/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGA**L En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_2019CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, sin novedad desde el área social
06/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario
06/10/2021 **MVCB_4639 JORGE ANDRES JIMENEZ** RODRIGUEZ En visita social se evidencia avance de obras, sin dudas u observaciones por parte del beneficiario, refiere estar satisfecho en cuanto a la ejecucion de la obra
07/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** Sin novedad desde el área social
07/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** Se evidencia avances obra.
07/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Sin novedad desde el área social
08/10/2021 - **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, atiende visita el encargado del predio hijo **DUVAN BARRIOS,** proxima semana entrega de vivienda
08/10/2021- **MVCB_2615 CARMEN CECILIA BLANCO:** Se realiza visita social y técnico de seguimiento a la obra. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Beneficiaria no reporta dudas y/o inconformidades.
08/10/2021- **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **DIANA HERREÑO.** Se realiza seguimiento de obra, se evidencia maestros ejecutando actividades. Se resuelven dudas al respecto. Encargada expresa conformidad con los avances.
08/10/2021- **MVCB_ 3410 OCTAVIO VALENCIA LLANO.** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros en obra, se resuelven dudas e inquietudes. Expresan conformidad con los avances.
08/10/2021 - **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, donde se observa que la beneficiaria está conforme con las actividades qué se están ejecutando, proxima semana entrega de vivienda
08/102021 - **MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, no atendieron a la puerta para revisar las actividades pendientes para la entrega ya qué de la parte técnica se ajustaron actividades del presupuesto por esta razón no se ha realizado entrega de la vivienda.

08/10/201 -**MVCB_GUSTAVO MARTINEZ**: Se evidencia avances obra.
11/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál se hace entrega de kit ecológico al beneficiario y a los trabajadores. El señor Pedro no indica dudas e inquietudes
11/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS** La encargada manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
11/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
11/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas
11/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observan maestros encargados.
11/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora Hilda manifiesta dudas e inquietudes sobre un área a intervenir a lo cual el contratista le resuelve dicha duda. Se observa personal de obra en el predio.
11/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se evidencia personal de obra en el predio ya que está desocupada y los maestros tienen las llaves para poder ingresar.
11/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa
11/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad con el avance. No sé observa personal de obra en el predio.
11/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Se realiza seguimiento y se evidencia avance importante en las labores de obra, se despejan dudas.
11/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra y se resuelven dudas de los beneficiarios
11/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra y se resuelven dudas de los beneficiarios
12/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra
12/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra
12/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio estableciendo compromisos con la beneficiaria para el inicio de las labores de obra
12/10/2021- **MVCB_4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **MIRIAM LOPEZ.** Se realiza visita de seguimiento social y técnico, contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejercitando actividades. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
12/10/2021- **MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades, se resuelven dudas a la propietaria quien expresa conformidad con los avances.
12/10/2021- **MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.** Se realiza visita de seguimiento a la obra social. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. No se reportan dudas y/o inconformidades
12/10/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no se encuentra en el momento. Se deja recomendación frente a los compromisos de estar al tanto de la obra y dejar bitácora en un lugar visible y fácil acceso.
12/10/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO. A**tiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO.** Se realiza visita de seguimiento social para resolver dudas técnicas al propietario e hijo autorizado y dar continuidad a la obra. Se les reitera la importacia que frente a cualquier duda y/o inconformidad, se debe seguir el conducto regular con el contratista/ interventoria. Los maestros no resuelven dudas al respecto.
12/10/2021 **MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMÉNEZ** se realiza visita de seguimiento con los técnicos y sociales del contratista e interventoría. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiario no refiere dudas y/o inconformidades.
12/10/2021 **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES.** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Obras se encuentran en pausa debido a que la beneficiaria no ha solucionado el punto de gas en la vivienda para poder trasladarse de espacio y dar continuidad a las obras. Se le reitera que no tocamos puntos de gas y eléctricos y que ha sido una instrucción que se dio desde el inicio del proyecto. Se compromete a dar pronta solución para continuar con las obras.
12/10/2021 **MVCB_2621 ALIX ÁNGULO AMADO.** Se realiza seguimiento social de obra. No se encuentra beneficiario ni autorizado en la vivienda. Se reitera la importancia de permanecer un adulto durante la ejecución de las obras y dejar la bitácora en un lugar visible y de fácil acceso.
13/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ,** fallecido. Persona autorizada es la esposa de uno de los herederos, la señora LAURA SÁNCHEZ. Indica conformidad con los avances constructivos, no indica dudas e inquietudes. Se observa maestros en el predio.
13/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN. S**eguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas
13/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observan maestros encargados.

13/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se evidencia personal de obra en el predio ya que está desocupada y los maestros tienen las llaves para poder ingresar.
13/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
13/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
13/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA.** La beneficiaria indica conformidad con el avance. No sé observa personal de obra en el predio.
13/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
14/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Seguimiento, la familia manifiesta conformidad por las labores constructivas; se observa personal de obra en el predio. La señora Carmenza no indica dudas e inquietudes. Sin embargo se solicita celeridad en las labores constitutivas.
14/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS** La encargada manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio
14/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál mi se observan a los maestros encargados.
14/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad
14/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.
14/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál el contratista le indica a la beneficiaria que hay un cambio en el presupuesto. Se evidencia maestros encargados
14/10/2021 - **MVCB_ 4732: DORIS GALVIS PATARROYO ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, SIN NOVEDAD POR PARTE DE LA BENEFICIARIA
14/10/2021 - **MVCB_ 4272: NIEVES LIZARAZO ,** SEGUIMIENTO, NO SE EVIDENCIA MAESTROS EN OBRA .
14/10/2021 - **MVCB_ 4233: BEATRIZ RUSINQUE ,** SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIA AVANCES EN LA OBRA, SIN NOVEDAD POR PARTE DE LA BENEFICIARIA
14/10/2021_MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN , SE REALIZA ACLARACIONES AL BENEFICIARIO EN CUANTO AL EMCHAPE DE COCINA Y BAÑO CON LAS MEMORIAS POR PAETE DEL PROFESIONAL TECNICO.
14/10/2021_MVCB_4401 GUSTAVO MARTINEZ , SE PRESENTA OBERVACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO
14/10/2021_**MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
14/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Sin novedad desde el área social
14/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio vivienda sin novedad social
14/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** Se realiza seguimiento y se evidencia avance importante en las labores de obra, el benefivciario manifiesta conformidad en la ejecucion.
14/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** no se encontraba la persona autorizada por el beneficiario
14/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se realiza seguimiento de actividades, el beneficiario muestra inconformidad con los maestros ya que fuman cigarrillo dentro de la viviebndaa se hace el respectivio llamado de atencion al contratista
14/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** Se realiza seguimiento al predio y se evidencia avance importante a las labores de obra, sin novedades desde el area social.
14/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** Se realiza verificación de actividades en el predio y se replantearon temas técnicos, la señora solicita verificación de presupuesto para saber si se podían realizar las escaleras
14/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** Se realiza seguimiento evidenciando importante avance de obra.
14/10/2021_**MVCB_3839**: **JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO** SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA

14/10/2021_**MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON** : SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
15/10/2021_**MVCB_4843 MARISOL PALACIOS : NO SE** SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA - NO HAY MAESTROS EN OBRA
15/10/2021_**MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANCA :**SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA
15/10/201 -MVCB_ **0213 JOSE LEONARDO SERRANO:** : NO SE SE EVICENCIA AVANCES EN OBRA - NO HAY MAESTROS EN OBRA
15/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.
15/10/2021 - **MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cual el señor Pedro no indica dudas e inquietudes, se evidencia personal en obra.
15/10/2021 - **MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál el contratista le indica a la beneficiaria que hay un cambio en el presupuesto. Se evidencia maestros encargados
15/10/2021 - **MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál se observan maestros encargados y la beneficiaria refleja conformidad con dudas en la instalación de un enchape en cuál no está en el presupuesto, se le explica que el recurso no alcanza y se deja registro en bitácora.
15/10/2021 - **MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál se observan nuevamente a los maestros encargados.
15/10/2021 - **MVCB_4072: SAIRA RAMÍREZ VARGAS .** La encargada MIRIAM SÁNCHEZ manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observa personal de obra en el predio .
15/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora manifiesta que desde el día lunes no hay personal de obra en el predio, el contratista indica que hará reasignación de personal.
15/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ.** Seguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
15/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
15/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta conformidad por las labores adelantadas. Se evidencia personal de obra en la casa.
19/10/2021 - **MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA,** Se evidencia avances en obra
19/10/2021_**MVCB_4843 MARISOL PALACIOS : SE** Se evidencia avances en obra, sin novedad por parte de la encargada de la beneficiaria.
19/10/2021_**MVCB_3839**: **JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO** Se evidencia avances en obra
19/10/2021 - **MVCB_ 4233: BEATRIZ RUSINQUE ,** Se evidencia avances en obra , sin novedade por parte de la beneficiaria.
19/10/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN,** Se presenta observacion por parte del beneficiario en cuanto al enchape en la totalidad de la cocina, se brinda informacion al arquitecto contratista.
19/10/2021_**MVCB_4272 NIEVES LIZARAZO,** No se evidencian maestros en obra
19/10/2021- **MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **EFRAIN GONZALEZ TELLEZ.** Se realiza visita de seguimiento social y técnico, contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejercitando actividades. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
19/10/2021 **MVCB_ 4498 ELCI RUTH ORTIZ MORENO:** Recibe visita Hija autorizada **JERALDIN GARAVITO.** Se evidencian maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades hasta el avance de las obras.
19/10/2021- **MVCB_4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Atiende la visita social y tecnica de interventoria la autorizada **MIRIAM LOPEZ.** Se realiza visita de seguimiento social y técnico, contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Autorizada no refiere dudas y/o inconformidades con los avances.
19/10/2021- **MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. Beneficiaria no expresa dudas y/o inconformidades con los avances en obra.
19/10/2021- **MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.** Se realiza visita social de seguimiento a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades de obra. Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria quien no reporta dudas y/o inconformidades con los avances en la obra. Se reitera compromisos realizados el día de la apertura para asegurar techo y dar continuidad a las actividades programadas de cielo raso.
19/10/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades con los avances en las obras.

19/10/2021 **MVCB_ 4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO**. Se realiza visita social a la obra, se evidencias maestros ejecutando actividades. No hay reporte de dudas/inconformidades al respecto con las obras avanzadas.
19/10/2021 **MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia avances en las obras. Se reitera compromiso de permanecer un mayor de edad beneficiarlo/autorizado en la vivienda para estar al tanto de las obras
19/10/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO. A**tiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO.** Se realiza visita de seguimiento social. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Se le reitera al autorizado la importancia de seguir el conducto regular para las quejas o solicitudes. Se brinda claridad sobre la ausencia de uno de los maestros, que por discrepancias con el autorizado, se retira de la vivienda, se cambia personal quien se encuentra ejecutando las actividades.
19/10/2021 **MVCB_ 3424 GIANNI GIOVANNA REYES.** Se realiza visita de seguimiento social del contratista e interventoría. Beneficiaria expresa inconformidad, debido a que durante traslado de objetos en la vivienda para despejar área, se percataron la falta un "taladro y pistola de soldadura", sin embargo no puede asegurar que haya sido por parte de los maestros, por tal razón decide no instaurar PQRS, resaltando que prefiere evitar inconvenientes. Se le reitera que al no instaurar pqrs, SDHT, contratos e interventoria, no se hará responsable de la pérdida de los objetos. Igualmente reitera su inconformidad por demoras en la obra, apertura realizada el 09/09/2021, se alerta al contratista para dar prioridad.
19/10/2021 **MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA** se realiza seguimiento al predio y se evidencia inconvenientes de cubierta, razón por la cual se informa al encargado que se adicionara un flanche para la zona de cocina, así mismo se informa que no se dara garantía sobre las actividades desarrolladas en la zona de baño ni ropas, debido a la importante filtración de agua.
19/10/2021 **MVCB_0838 LIGIA LOMBANA DE NUPIA** se realiza seguimiento al predio y se evidencia un avance importante de las labores, la hija de la beneficiaria manifiesta estar muy conforme con las labores desarrolladas por el maestro hasta la fecha
19/10/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** se realiza seguimiento de actividades el beneficiario solicita se realice claridad de algunos temas específicos sobre las actividades a realizar, se llama la atención a los maestros con respecto al tema del cigarrillo
19/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO** se realiza seguimiento evidenciando importante avance, los beneficiarios manifiestan conformidad con las labores, sin embargo informan que en la cocina y el baño o se realizó instalación de la cenefa decorativa a lo cual se solicita a los maestros llevar a cabo la actividad
19/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE BLANCO** se realiza seguimiento evidenciando importante avance, la beneficiaria pregunta si en su predio se instalara cielo-raso debido a que esta actividad la ha visto en otros predios, se informa que actualmente el presupuesto del predio se encuentra al tope razón por la cual esta labor no está contemplada
19/10/2021 **MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO** se realiza seguimiento y se evidencia avance importante en las labores, el beneficiario refiere no tener inquietudes, solicita se colabore al maestro con el pvc para el cielo-raso con el fin de ver los espacios culminados
19/10/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria solicita se le colabore con demolición de dintel de cocina a patio debido a que con las labores el mismo quedara muy bajo, se solicita al maestro realizar este corte con pulidora.
19/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ.** Seguimiento. La familia manifiesta inconformidad por qué los maestros no son constantes con las actividades
20/10/2021 - **MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** La beneficiaria manifiesta conformidad con los avances constructivos. Se observan maestros encargados
20/10/2021 - **MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS.** seguimiento de obra, la señora manifiesta que el día de ayer laboró el personal de obra en el predio, el día de hoy no se evidencia personal
20/10/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se evidencia personal de obra en el predio ya que está desocupada y los maestros tienen las llaves para poder ingresar.
20/10/2021 - **MVCB_3773: MARÍA NELLY TORRES RODRÍGUEZ. S**eguimiento en el cuál la familiar manifiesta conformidad con los avances constitutivos. Se observa personal en la vivienda.
20/10/2021**_MVCB_4272 NIEVES LIZARAZO** : Se evidencia avances en obra el espo9so de loa beneficiaria manhifie4seta inconformidad por inasistencia de los maestros, ya que esto retraza las obras.
20/10/2021 - **MVCB_ 4233: BEATRIZ RUSINQUE ,** Se evidencia avances en obra , sin novedade por parte de la beneficiaria.
20/10/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA** se realiza seguimiento al predio y se establece comunicación telefónica con la beneficiaria quien no se encuentra en el predio, se estipula con la señora que en caso de no poder estar al tanto de las mejoras del proyecto es importante dejar autorización por escrito a alguien en el predio.
20/10/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** se realiza seguimiento social de obra e interventoría, la beneficiaria refiere dudas referentes al pañete a lo cual se le informa que se irá completando en altura en habitaciones, sin embargo en el hall se dejara al corte de la viga
20/10/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS** se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría y se evidencia avance en la demolición de pisos, la hija del beneficiario manifiesta no tener dudas con respecto al proceso, el beneficiario no se encuentra en el predio.
20/10/2021 **MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA** se realiza visita de seguimiento al predio social de obra e interventoría en la cual se evidencia que se iniciaron las labores en un periodo corto, los menores de edad cuidados en el predio ya se encuentran en un espacio aparte y se desocuparon los espacios en su totalidad
20/10/2021**_MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO :** Se evidencia mmaesrosn en la obgrak,m se realiza carta acloaratoria de las dificultades de la continuidd de la obra por parte del equjipo social.

ENTREGAS
05/10/2021 - **MVCB_2413: MARÍA CONCEPCIÓN LOMBANA JIMÉNEZ.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_2376: AURA ELENA RAMOS RESTREPO.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_2242: AURA NELLY FIGUEROA.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_2355: ANA OTILIA BARRETO LEÓN.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_ 3329: HECTOR JOSE ZAMBRANO** ,Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/10/2021 - **MVCB_ 4754: ALBERTO HUESO**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/09/2021 - **MVCB_ 4628: JOSE ABELINO LEON,** Se entrega la vivienda a conformidad en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
06/10/2021 - **MVCB_ 4694: HORACIO DE JESUS TORRES HERNANDEZ,** Se entrega la vivienda a conformidad de la persona encargada (hija del beneficiario YESICA TORRES, en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
06/10/2021 - **MVCB_ 4751: MARIA LIGIA SOTO,**Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, recibe las obras de mejoramiento el encargado del predio el hijo **DIEGO SOTO**, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
06/10/2021 **MVCB_3433 ELENA MOJICA DE GUTIERREZ** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
06/10/2021 - **MVCB_ 3311: MIYO FIGUEROA ROJAS,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, recibe las obras de mejoramiento la encargada del predio **YADIRA RAMÍREZ** se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
07/10/2021 - **MVCB_ 4744:,ALVARO ZUBIETA TUNJANO,** Se entrega la vivienda a conformidad en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social, se entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y se hace entrega de kit ecológico
07/10/2021 **MVCB_3650 MARTHA NUBIA POSADA:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
07/10/2021 **MVCB 3669 GABRIELA MUÑOZ:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 - **MVCB_ 3327: JESIKA LORENA TELLEZ,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 **MVCB_3396 ANGEL ESTELA MENDOZA:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
08/10/2021 - **MVCB_2244: CARMEN CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
08/10/2021 **MVCB_2020 BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico , vivienda libre de escombros.
08/10/2021 **MVCB_2019 CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico, vivienda libre de escombros .
08/10/2021 **MVCB_2034 AMINTA SABOGAL** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: Atas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico, vivienda libre de escombros.

11/10/2021 - **MVCB_2278: LUZ AMPARO NAVARRO AGUIRRE .** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
11/10/2021-**MVCB_3353: ALCIRA MONGUI OCHOA**,Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
11/10/2021- **MVCB_ 3191 : DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
12/10/2021 - **MVCB_ 4694, JOSE ALIRIO TORRES** SE REALIZA ENTREGA DE LA VIVIENDA-Se entrega la vivienda a conformidad del benficiario , en el cuál se firman los siguientes documentos: Actas de entrega técnica, Acta de cierre social. Entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad. Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. Entrega de kit ecológico
13/10/2021- **MVCB_ 3351: YAMILETH MARTINEZ**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
13/10/2021 **MVCB_2013 RENE MIGUEL FISCAL TORRES S**e realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
13/10/2021-**MVCB_ 3360: MYRIAM JIMENEZ**, Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras, kit ecológico y volante adhesivo de bioseguridad.
14/10/2021 - **MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO .** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos:en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
14/10/2021 - **MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SÁNCHEZ.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos:en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 - **MVCB_2277: CARMENZA FLORES GALBAN.** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 - **MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA** Se entrega vivienda a conformidad de la beneficiaria y su familia, en el cuál se firman los siguientes documentos: en el cuál se firman los siguientes documentos: - Actas de entrega técnicas, Acta de cierre social, Entrega de adhesivo con señalética de bioseguridad, Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento y Entrega de kit ecológico.
15/10/2021 **MVCB_3425 PABLO ANTONIO CUERVO:** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidades.
19/10/2021 **MVCB_2615. CARMEN CECILIA BLANCO.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
19/10/2021 - **MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LOPEZ .** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos, acta de entrega técnica,acta de cierre social, se entrega de volante adhesivo de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento y entrega de kit ecológico.
19/10/2021 - **MVCB_ 4732 DORIS GALVISPATARROYO,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos, acta de entrega técnica,acta de cierre social, se entrega de volante adhesivo de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento y entrega de kit ecológico.
19/10/2021 - **MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA .** Se realiza entrega de vivienda a conformidad del beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos, acta de entrega técnica,acta de cierre social, se entrega de volante adhesivo de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento y entrega de kit ecológico.
19/10/2021 **MVCB_2055 FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombro. Sin novedades,
19/10/2021 **MVCB_2621: ALIX ÁNGULO AMADO.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
19/10/2021 **MVCB_0828 AMANDA UTELIA APONTE.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
19/10/2021 **MVCB_0837 RAMIRO QUINTERO.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
19/10/2021 **MVCB_ 3410 OCTAVIO VALENCIA LLANO.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. - Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
RENUNCIAS
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.

ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
Durante el periodo definido se realizó la convocatoria de los 50 beneficiarios del territorio UNIR II. Las llamadas fueron realizadas por los profesionales sociales, la presidenta de la JAL Marlen Pérez, facilitó la información de aquellas personas que los números se encontraban desactualizados en la base de datos. El día 24 de septiembre de 2021, se realizaron dos reuniones de socialización en los horarios 8:30AM y 10:30 am, con el fin de mantener la distancia social entre los asistentes y además haciendo más cercano el proceso a cada beneficiario, de esta manera cada reunión tuvo una convocatoria para un total de 25 beneficiarios. La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas y la colaboración de los líderes comunitarios del territorio. Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés siga igual conforme se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar, además de la valoración de las condiciones de salud para contrarrestar cualquier tipo de contagio por Covid 19. Se convocaron 50 beneficiarios, de los cuales asistieron 45 beneficiarios.
VALIDACIONES REALIZADAS
28/09/2021 **- MVUN_ 106: CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 464: TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIS HENAO,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 484: PEDRO IGNACIO PLAZAS,**Validación sin novedad
28/09/2021 **- MVUN_ 171: DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 469:JUVENAL MELO PINZON,**Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 099: FERNANDO MORENO MARIÑO,**Validación sin novedad
30/09/2021 **- MVUN_ 588: AMIRA PEREZ CORTES,**Validación sin novedad, atendio visita **JUAN CARLOS CASTILLO** hijo de beneficiaria se cuenta con carta de autorización
30/09/2021 **- MVUN_ 241:MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ,** Validación social realizada, pendiente validación componente tecnico.
12/10/2021-**MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** validación sin novedad
12/10/2021-**MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ**, validación sin novedad
14/10/2021- **MVUN_299 LUZ MARÍNA CASTAÑEDA MONTENEGRO,**validación sin novedad
14/10/2021-**MVUN_182 NYDIA BUSTOS LÓPEZ,** validación sin novedad
15/10/2021- **MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ,** validación sin novedad
15/10/2021- **MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO,**validación sin novedad
15/10/2021-**MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA,** validación realizada la vivienda presenta problematicas socioeconómicas, familiares, que se ve reflejado en su entorno social
12/10/2021- **MVUN_241 : MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ,** acompañemiento de realización de validación tecnica
1910/2021-**MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES** , validación sin novedad
1910/2021-**MVUN_379:CAROLINA MALDONADO BELTRÁN,** encargada del mejoramiento y propietaria del predio **NOHORA NELLY BELTRÁN DÍAZ,** validación sin novedad
21/10/2021-**MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN,** validación sin novedad
21/10/2021-**MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ,** validación sin novedad

VALIDACIONES FALLIDAS
12/10/2021-**MVUN_478 HÉCTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA,** validación fallida se realizó contacto teléfono con el beneficiario pero no atendió la puerta.
14/10/2021-**MVUN_238 ALIRIO CONTRERAS,** validación fallida se evidencia que las condiciones técnicas de la vivienda requieren verificaciones adicionales de la parte técnica.
19/10/2021-**MVUN_276 GONZALO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,** el beneficiario realizará actividades constructivas antes del mejoramiento pornesta razon no se efectuo la validación
APERTURAS
07/10/2021 - **MVUN_464: TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIS HENAO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
07/10/2021 - **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,**Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
07/10/2021 - **MVUN_171: DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
12/10/2021**- MVUN_099 FERNANDO MORENO MARIÑO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021- **MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTIÉRREZ** , Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021**-MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
14/10/2021- **MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/10/2021- **MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
15/10/2021- **MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales
20/10/2021**- MVUN_290 DORIR ALCIRA CARILLO,** Apertura de vivienda en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial,indicaciones de bioseguridad y recomendaciones sociales, se conto con el acompañaminto de la secretaria para la apertura.
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
13/10/2021- **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
14/10/2021-**MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
14/10/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
15/10/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
14/10/2021- **MVUN_099 FERNANDO MORENO MARIÑO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
15/10/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
20/10/2021- **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
20/10/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
20/10/2021- **MVUN_099 FERNANDO MORENO MARIÑO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
20/10/2021**- MVUN_290 DORIR ALCIRA CARILLO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando

20/10/2021**- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
20/10/2021**- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
20/10/2021**- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se stan ejecutando
20/10/2021**- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
20/10/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
21/10/2021- **MVUN_1241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las aftividades que se estan ejecututando
ENTREGAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON
PQRS
No se realizaron en el transcurso de la semana
PAC
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm, Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
09/10/2021: **PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**: Se da apertura en horario de 8:30am a 12:00m. Se acerca la Señora **Luz Mila Vasquez** para solicitar información sobre el proyecto de Mejoramiento de vivienda, se le brinda orientación para iniciar proceso. **Desarrollo:** Juan Pablo II.
09/10/2021: **PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**: Se da apertura en horario de 8:30am a 12:00m. Se acerca el Señor **FELIX ANTONIO GAONA CALLEJAS,** Propietario de la vivienda **MVCB_2278**, para solicitar información sobre la entrega de su vivienda, se le informa que la profesional social encargada se comunicara con un dia de antelación para programar dicha entrega de la vivienda.
HISTORIAS DE VIDA
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
MVCB_4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR: El 07/10/2021 se firma el consentimiento para la grabación y registro fotográfico durante las tres etapas de ejecución, por parte de la beneficiaria. NOTA: La SDHT este mismo con el área de comunicación realizó visita a la vivienda para tomar evidencia fotográfica a la beneficiaria, el cual esta vivienda tendrá seguimiento fílmico y fotográfico en las tres etapas de ejecución.
MVCB_3793: WILSON MORACAICEDO: Postulada historia de vida.

En espera de la selección de la historia de vida del territorio Habitarte por parte de la entidad, estas fueron enviadas el día 12/10/2021. MVCB_4351, MVCB_3793, MVCB_4744, MVCB_2055, MVCB_2020.

BARRIO O TERRITORIO

HISTORIAS DE VIDA

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

MVCB_4629 JORGE ANDRES JIMENEZ bajo acta se acuerda con beneficiario las siguientes actividades: enchape de pisos en todas las zonas de la vivienda, cambio de combo sanitario y puerta de baño, con respectivo enchape en paredes, construcción de mesón nuevo enchapado y enchape de paredes de esta, adecuación de puntos hidráulicos y enchape de salpicadero en zona de lavado, actividad de pintura en zona de cocina, baño, patio y alcoba #4, dejando claro que esta última actividad se ejecutará siempre y cuando los muros no tengan humedad. El beneficiario adquiere el compromiso de tener los espacios en que se ejecutarán las obras disponibles.

MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN Se presenta observaciones por parte del beneficiario (afectación en el enchape de techo de cocina primer piso), el director de obra por parte del contratista se acerca a la vivienda dando solución, a los requerimientos del Beneficiario de la siguiente manera: 1) Desmonte de enchape de cocina del techo . 2) Se hará cambio del personal, 3) El beneficiario se compromete a habilitar el espacio de la cocina para realizar las obras ya mencionadas

MVUN_290 DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA, Se observa que en la vivienda existe un problema socioeconómico, familiar, y de entorno con los vecinos (De tipo social qué puede afectar el desarrollo de la obra) el contratista presentará informe puntual del caso.(en visita de validación se identifica problemática con vecinos, beneficiario informa que la vivienda contigua a su casa afecto la estabilidad de su vivienda, ocasionando diversas afectaciones (fisuras, grietas y desprendimientos de material) por esta razón ha tenido diferentes inconvenientes con el vecino, llegando a las vías de hecho (afectaciones físicas y a la propiedad privada por parte de los involucrados) por este hecho la beneficiaria realizo diligencia en la fiscalía para evidenciar la situación, , la beneficiaria, no tiene buenas relaciones con ninguno de sus vecinos, en su relato comenta que fue condenada por nueve años, de los cuales tres estuvo privada de la libertad, vive con sus dos hijas y cinco nietos, la beneficiaria se encarga de las labores del hogar y sus hijas, trabajan en la informalidad)

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Imagen

SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE		
VALIDACIONES		
Validación. MVCB_3752: JESÚS ANTONIO LÓPEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_0666: ALFONSO SÁENS FERNÁNDEZ. Desarrollo Urbanización compartir**	**Validación. MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Validación. MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación fallida. MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANOx. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_3703: HILDA VARGAS GRANADOS. Desarrollo Juan Pablo II**
		

Validación. MVCB_4072: SAIRA RAMIREZ. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_4185: PEDRO JIMENEZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_4188. GUMERCINDA MONDRAGON.. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Validación. MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MVCB_4085. GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación fallida . MVCB_4072. SAIRA RAMIREZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		

VALIDACIÒN 21/09/2021 - MVCB_ 4843, MARISOL PAREDES PALACIOS. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación.21/09/2021 - MVCB_ 2243, HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación.22/09/2021 - MVCB_ 4838 YENY ARLEY AREVALO PACHON . Desarrollo Juan Pablo II**
		
Validación. 22/09/2021 - MVCB_ 3839 JOSE OLIVO CUADRADO, Desarrollo COMPARTIR	**Validación.23/09/2021 - MVCB_ 4842, WILLERMO VALENCIA OYOLA . Desarrollo Juan Pablo II**	**Validacion 21/09/2021 MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO CAMPOS DESAROOLLO JUAN PABLO II**
		

Validación. MVCB_3710 JORGE EDUARDO MORENO Desarrollo Juan Pablo II	Validación. MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA Desarrollo Compartir.	Validación. MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS Desarrollo juan pablo II
		
Validación. MVCB_ 4366 : GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO. Desarrollo Juan Pablo III sector	**Validación. MVCB_ 4365 : OLGA BLANCO DE RIAÑO Desarrollo Juan Pablo III sector**	**ATENCIÓN PAC: Solicitud de información acerca del proyecto beneficiaria Ana Graciela Beltrán**
		

Validación. MVCB_ 4366 : GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO. Desarrollo Urbanizacion compartir	Validación. MVCB_ 4968 : LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO. Desarrollo Acacias	Validación. MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ. Desarrollo Juan Pablo II
		
Validacion MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZÁBAL Desarrollo Juan Pablo II	**Validacion MVCB_3984 BÁRBARA ORTIZ RUEDA Desarrollo Juan Pablo II**	**Validacion MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO Desarrollo juan pablo II**
		


Validación. MVCB__4175. MARÍA ELSY MAYORCA RODRÍGUEZ Desarrollo Juan Pablo II	VALIDACIÓN, MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO, COMPARTIR	VALIDACION MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMANTE DESARROLLO JUAN PABLO ll
		
Validación. MVCB_3721: ANA LUCIA VEGA AFRICANO.. Desarrollo Juan Pablo II	**Validación. MV_42886_IDU. MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO. Desarrollo Juan Pablo II**	**Validación. MVCB_4198. LUCIO CIFUENTES VEGA. Desarrollo Juan Pablo II**
		

VALIDACIÓN, MVCB_0474: MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ. COMPARTIR	VALIDACIÓN, MVCB_4900: MARTHA TERESA MEJIA CASTRO. COMPARTIR	VALIDACIÓN, MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS, JUAN PABLO II
		
VALIDACIÓN, MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ., JUAN PABLO II	VALIDACION, MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES, JUAN PABLO II	VALIDACIÓN, MVCB_3885: LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS, JUAN PABLO II
		

Validaciòn 11/10/2021 - MVCB_ 3863:FABIO RODRIGUEZ TOQUICA . Desarrollo Juan Pablo II	VALIDACIÒN 11/10/2021 - MVCB_ 3809: ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ ,,Desarrollo Juan Pablo II	VALIDCIÒN 12/10/2021 - MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA , Desarrollo Juan Pablo II
		
VALIDACIÒN 12/10/2021 - MVCB_ 3822 SORY INES CORTES LOPEZ , Desarrollo Juan Pablo II	**VALIDACIÒN 12/10/2021 - MVCB_ 3798: MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN ,Desarrollo Juan Pablo II**	**VALIDACIÓN MVCB_4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO: JUAN PABLO II**
		

VALIDACIÓN, MVCB_4801 LUIS HERNANDO MARTINEZ, JUAN PABLO II	VALIDACION MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ, DESARROLLO JUAN PABLO II	
		
APERTURAS DE VIVIENDA CIUDAD BOLIVAR		
Apertura de obra. MVCB_3793: WILSON REINEL MORA CAICEDO Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4867: LUZ MARINA MEJIA CARMONA. Desarrollo Juan Pablo II**	**APERTURA. 21/09/2021 - MVCB_ 4407 GLORIA ALARCON BAUTISTA Desarrollo Juan Pablo II**
		

APERTURA. 23/09/2021 - MVCB_ 4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN Desarrollo Juan Pablo II	APERTURA. 23/09/2021 - MVCB_ 4233 BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE Desarrollo Juan Pablo II	APERTURA. 24/09/2021 - MVCB_ 4272 , NIEVES LIZARAZO VALBUENA Desarrollo Juan Pablo II
		
APERTURA MVCB_ 0837 RAMIRO QUINTERO GUERRERO DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR	**APERTURA MVCB_ 0828 AMANDA UTELIA APONTE DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR**	
		

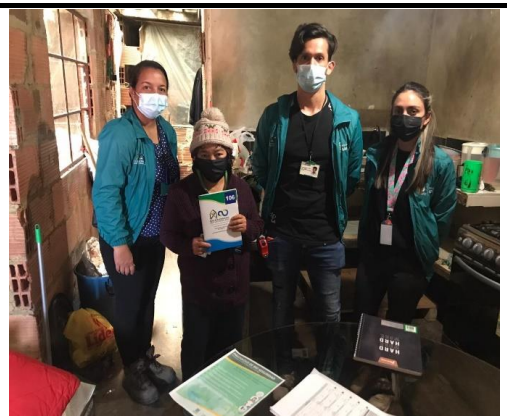APERTURA, MVCB_3703 HILDA VARGAS, JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3773 MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ, JUAN PABLO II	APERTURA, MVCB_3771 ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ, JUAN PABLO II
		
Apertura de obra. MVCB_2414: LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4072: SAIRA JAZMIN RAMÍREZ VARGAS. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_0660: MARÍA ETELVINA ATUESTA ARIZA. Desarrollo Compartir**
		

Apertura de obra. MVCB_3752: Jesús ANTONIO LÓPEZ. Desarrollo Juan Pablo II		
		
APERTURA 06/10/2021 MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO. Desarrollo Juan Pablo II	**APERTURA 06/10/2021 MVCB_4401 GUSTAVO MARTINEZ PRIETO, Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ. Desarrollo Juan Pablo II**
		

APERTURA,MVCB_4561: ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO, JUAN PABLO II	APERTURA,MVCB_4351 ANDREA SALAZAR MUÑOZ, JUAN PABLO II	APERTURA,MVCB_0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO,COMPARTIR
		
Apertura de obra. MVCB_4185. PEDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4363. LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de oobra MVCB_4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO desarrollo juan pablo II**
		

	Apertura MV_42838-IDU, DESIDERIO MAYORGA DESARROLLO URBANIZACION COMPARTITR	**Apertura MVCB_0897 CESARIO BONILLA VERA, DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR**
		
Apertura MVCB_0838, LIGIA LOMBANA DE NUPIA DESARROLLO URBANIZACION COMPARTIR		
		

APERTURA DE VIVIENDA 12/10/2021 - MVCB_ 1072 : FLORINDA CADENA , Desarrollo Juan Pablo II- APARECE EN BASE COMPARTIR	APERTURA DE VIVIENDA 12/10/2021 - MVCB_ 3839: JOSE CUADRADO CUADRADO ,Desarrollo Juan Pablo II	APERTURA DE VIVIENDA 15/10/2021 - MVCB_ 3803: LUZ DARY SAENZ CAPERA Desarrollo Juan Pablo II
		
Apertura de obra MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO, Desarrollo Juan Pablo II	**Apertura de obra. MVCB_4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE. Desarrollo Juan Pablo II**	**Apertura de obra. MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ Desarrollo Compartir**
		

APERTURA,MVCB_3880 FIDELIGNO RODRIGUEZ ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_3876 HERNANDO CALDERON CIFUENTES ,JUAN PABLO
		
APERTURA,MVCB_3888 GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS ,JUAN PABLO	APERTURA,MVCB_0481 MARCO JULIO MARTÍNEZ MADER ,COMPARTIR	APERTURA,MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ, COMPARTIR
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIÓN
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021															
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021														
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021														

MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021	14/10/2021															
MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras, vivienda aperturada solo por el contratista(cubierta)	12/10/2021																
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021																
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021																
MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	15/102021															
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021																
MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021																
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																

MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021															
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	19/10/2021														
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/03/2021															
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021														
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021														
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021														

MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															
MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	15/102021														
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021															
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021															

MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19-oct														
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021														
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021														
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓ N COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/201															
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021	19/10/2021														
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021															

MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021																
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021																
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	13/10/2021															
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021																

MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021															
MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	12/10/2021														
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															

MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	11/10/2021															
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	11/10/2021															
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021															
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021															
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021															
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021																
MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19/10/2021															

MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	14/10/2021															
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021															
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021															
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021															
MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021																

MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	19/10/2021														
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021														
MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021														
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021															
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	15/102021														
MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	11/10/2021														
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021															

6. ASPECTOS PRESUPUESTALES


6.1 Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se están ejecutando actividades de validación, de socialización, así como actividades de obra;

RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 2


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT					Fase 2: Ejecución de obras							
					Validación			Ejecución				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolivar	Barrios	Predios	Total Predios	Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	MENSUAL 2	JUAN PABLO II	98	169	97	1	31	43	33	22	48,13%	33
		URB. COMPARTIR	13		13	0	3	9	3	1	41,47%	3
Técnico Responsable		MARANDU	7		7	0	0	0	5	2	71,43%	5
		ACACIAS	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
		UNIRII	50		15	35	0	10	0	40	3,84%	0
Subtotal			169	169	133	36	34	62	41	66	32,97%	41

Para el informe mensual No. 2 entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre, y según la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2021,** se encuentra en **cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que la fecha de entrega de las primeras 46 viviendas es para el 21 de octubre de 2021.

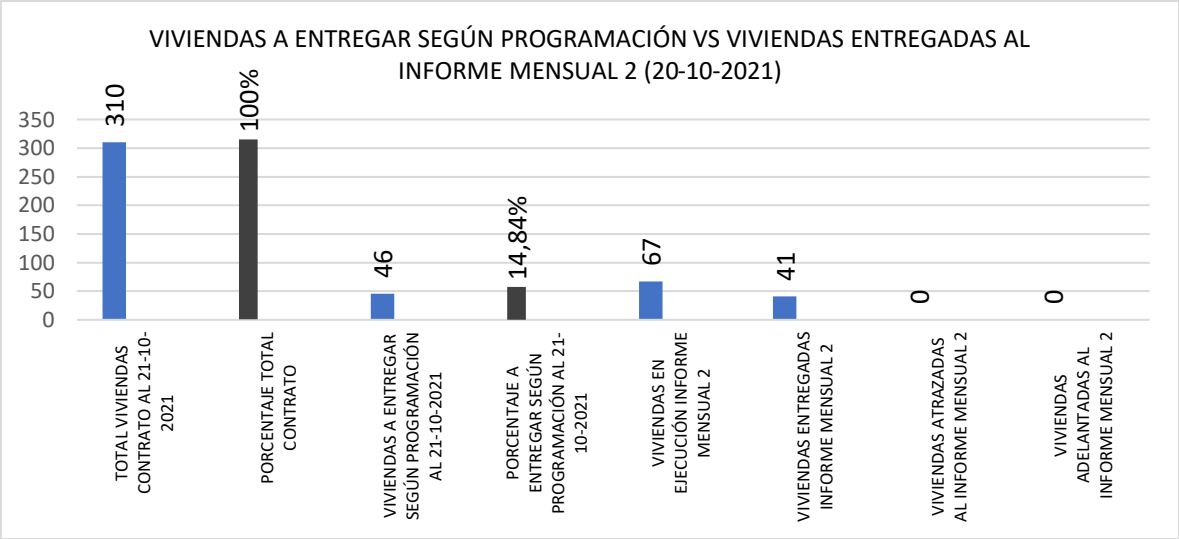


RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 2 DEL 21 DE SEP. AL 20 DE OCT.


Para el mes 2, el Consorcio ORIP SAFRICON 2020 se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

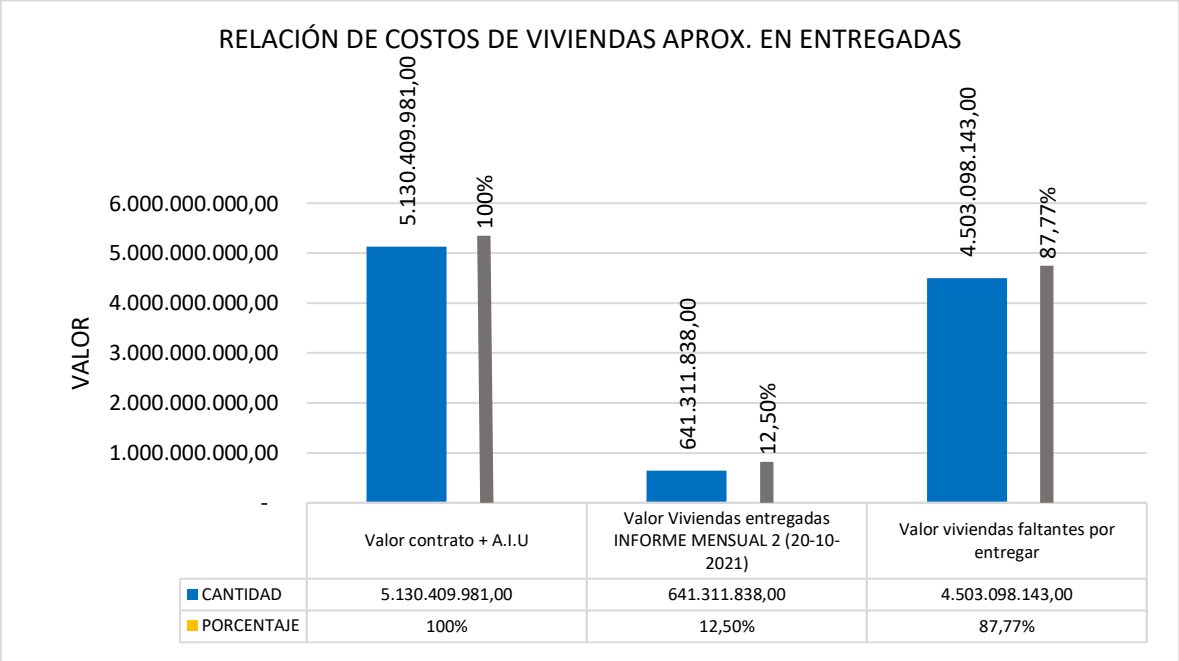


así mismo, el contratista presenta un porcentaje en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para el informe mensual 2 del 12.50%. Aprox. En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 105 días para finalizar el contrato con 278 viviendas por entregar.269

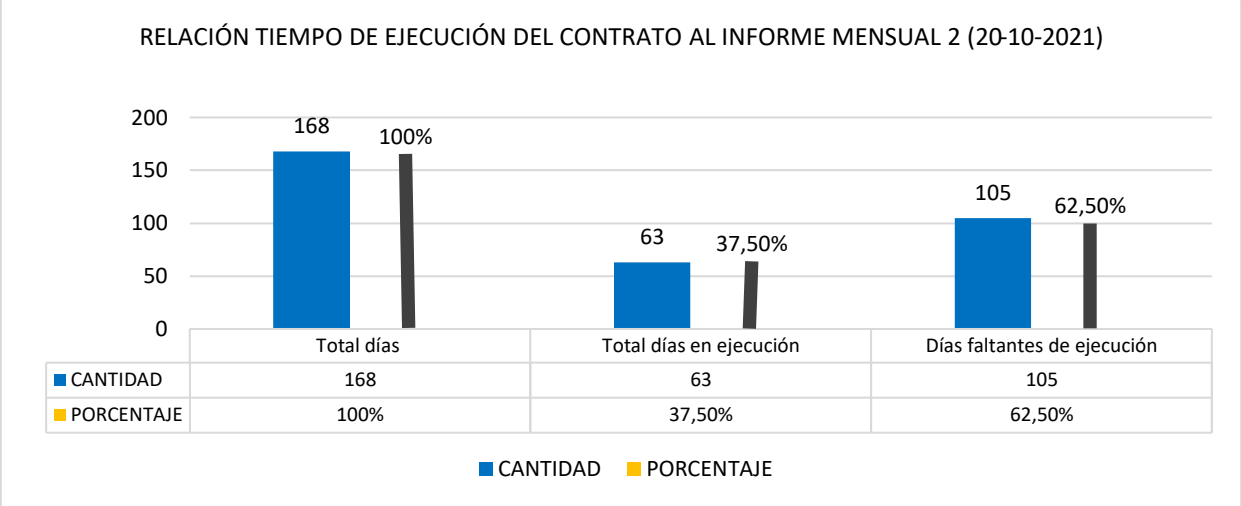

Finalmente, en este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio ORIP SAFRICON 2020 se encuentra en cumplimiento de las viviendas a entregar, ya que para el día 21 de octubre de 2021 entregará 46 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 41 viviendas, faltado 5 viviendas por entregar para el próximo informe, de igual manera, se encuentran en ejecución de 62 viviendas.

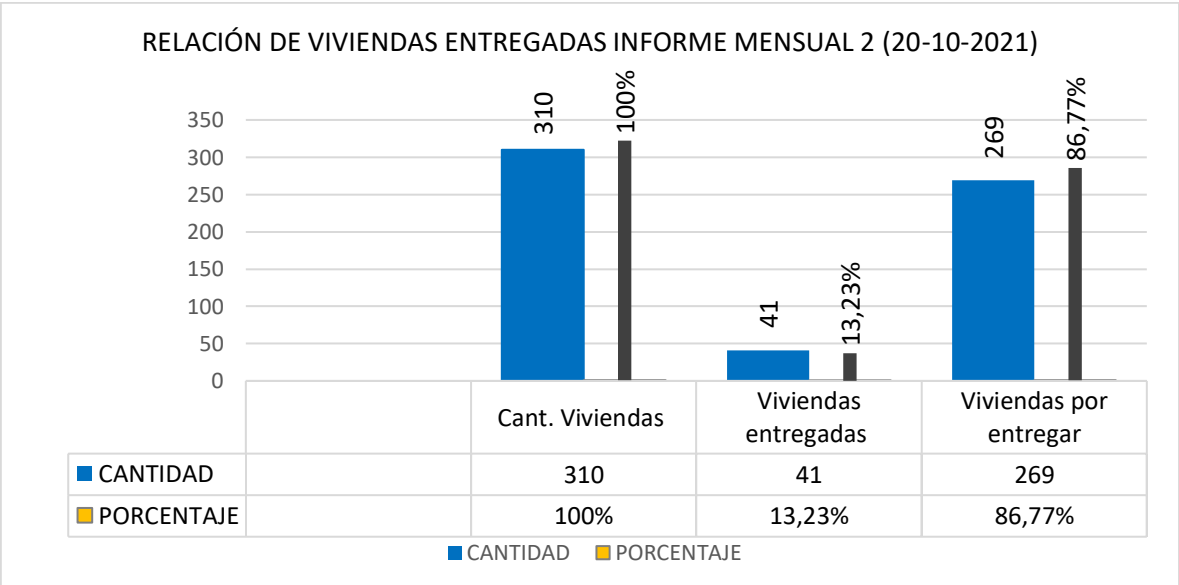

De acuerdo con la ejecución que está realizando el contratista, a continuación, se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que al informe mensual 2 se encuentran activas.

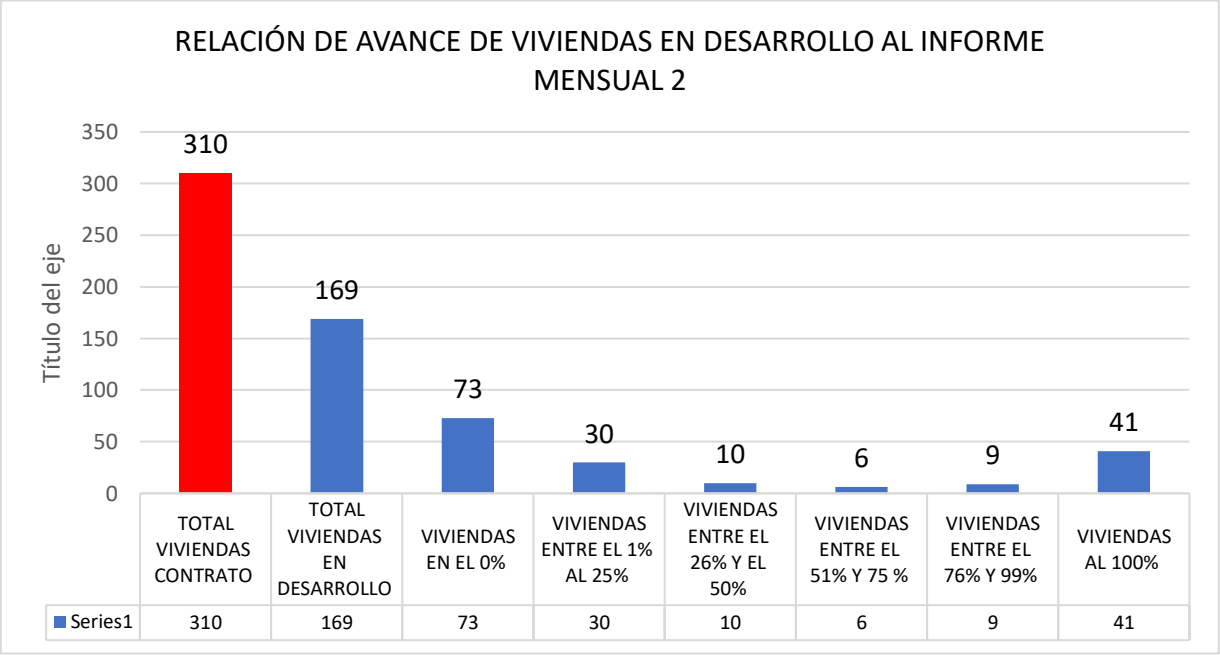

6.2 Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

A la fecha del presente informe se ha gestionado dos cuentas para ordenes de giro de anticipos del contrato, en lo referente a cortes, se registra 1 pago en el presente informe para 40 Mv.

Costos generales Corte 1

TOTALES		**$ 4.023.472.286,00**		**$497.866.538,00**
AIU		$ 1.046.102.794,00		**$129.445.300,00**
COSTO TOTAL		**$ 5.069.575.080,00**		**$627.311.838,00**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$ 60.834.901,00		
COSTO TOTAL		$ 5.130.409.981,00		**$627.311.838,00**
VALOR DEL ANTICIPO	**$1.539.122.994,00**			
AMORTIZACION ANTICIPO	**$188.193.551,00**			**$188.193.551,00**
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	**$1.350.929.443,00**			
SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA	**$3.591.286.987,00**			**$439.118.287,00**

6.3 Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

Al presente informe se han gestionado dos ordenes de giro para el anticipo, Estas ordenes contemplan la adquisición de los siguientes insumos.

ORDEN DE GIRO No. 1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CEMENTO	9.809
ARENA DE RIO	1.860
ARENA DE PEÑA	1.240
COMBO DE BAÑO CORONA	310

ORDEN DE GIRO No. 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ENCHAPE DE PISO CORONA CAJA POR 1,62 M2	3.312
ENCHAPE DE PISO ALFA CAJA POR 1,62 M2	3.200
ENCHAPE DE PISO ITALIA CAJA POR 1,62 M2	5.100

6.4 Información relativa al manejo del anticipo.

ORDEN DE GIRO No. 1

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Bogotá	13	9	2021	1	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 744.368.302,00	$ 0,00	$ 744.368.302,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
14298	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	No.96600001659	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900540320-3	NIT	AHIME CONSTRUCCIONES SAS	083233583	Corriente	AV Villas	$ 744.368.302,00		$ 744.368.302,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Bogota	Bogota D.C	CRA 22 A No 67-03 SUR	ahmeconstrucciones@gmail.com	8307130	3126546358	4663	Bogota	Bogota D.C

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.*
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física en los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

ORDEN DE GIRO No. 2

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DD/MM/AAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Bogotá	27	9	2021	2	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 484.786.892,00	$ 0,00	$ 484.786.892,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
14289	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	No.96600001659	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900640320-3	NIT	AHME CONSTRUCCIONES SAS	083233583	Corriente	AV Villas	$ 484.786.892,00		$ 484.786.892,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Bogota	Bogota D.C	CRA 22 A No 67-33 SUR	ahmeconstruccionessas@gmail.com	8307130	3128645368	4663	Bogota	Bogota D.C

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia.
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

2. Cuando el formato sea diligenciado de manera física en los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventor con la firma de este formato certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

3. Cuando el formato es diligenciado por la sucursal virtual: En los casos que el fideicomiso tenga la figura de Interventor con la confirmación telefónica certifica que ha revisado que los pagos aquí ordenados corresponden a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y que se están ejecutando para el desarrollo del proyecto.

4. Las órdenes de operación radicadas por centro de mensajes o gestor de solicitudes no requieren firmas autorizadas. En los caso que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

7.INFORME SISO

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME MENSUAL SST** **Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO G1 - CONTRATO 797 DE 2021

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME MENSUAL
DESDE	21/09/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	2
HASTA	20/10/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

1.1 CONTRATISTA

Se Implementan protocolos de Bioseguridad para Socializaciones en UNIR II, para las actividades de validación y protocolo de Bioseguridad general el cual se implementan en la ejecución de las viviendas con alcance Beneficiarios y Trabajadores.

• Se asistió a Comité de Seguimiento de obra con secretaria del Hábitat.

• Revisión de Planilla de Seguridad Social Personal operativo. El personal de obra viene ingresando gradualmente y se verifica que las afiliaciones sean correctas y que cuenten con el certificado médico de aptitud, se ha realizado la inducción de manera casi personalizada, por el manejo de reuniones.

• Se les realiza charlas al Personal Administrativo cada 15 Días.

• Implementación de protocolo de bioseguridad en las visitas de seguimiento, por parte del personal administrativo., contratista e interventoría y operativo y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.

• Se realizan entregas de Vivienda cumpliendo con el acta de entrega a Satisfacción de vivienda sin escombros e la obra, firmada por el beneficiario.

• Acompañamiento en visitas de la secretaria del Hábitat en seguimiento en el sector de Juan Pablo II, Unir II.

• Inducción al personal operativo que viene ingresando gradualmente, se diligenciaron los formatos de estadísticas de salud, reporte de síntomas y se dictó la inducción, y divulgación del protocolo de bioseguridad se está en la revisión de afiliaciones sal SGSS y otra documentación pertinente del personal operativo proyectado para ingresar.

• Entrega kit de Bioseguridad a trabajadores y a los beneficiarios cubriendo las casas que están en ejecución al momento.

• Revisión de personal extranjero expidiendo sus certificados de Migración enviados a interventoría.

• Acompañamiento en la socialización a beneficiarios de la localidad UNIR II, se implementa protocolo de bioseguridad para socializaciones.

• Se actualiza protocolo de bioseguridad el cual se enviará en oficio digital a interventoría.

• Se envía borrador a interventoría de procedimiento para cambio de cubiertas, se realiza pruebas y ajustes al documento.
• Entrega de la señalética a los beneficiarios, durante las entregas de Viviendas
• Divulgación de protocolo de bioseguridad a Beneficiario, en compañía de la interventoría.
• Se organiza lo referente a la Socialización para el día 26 de octubre 2021 en el Barrio Potosí.
• Inspecciones de pulidoras usadas en las viviendas en ejecución y se le hace charla sobre la importancia del uso de la guarda de la pulidora.
• Charla de Sensibilización de uso de guantes al personal operativo.
• Adicional a esto se lleva el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas, también se hace el alistamiento e instalación en cuanto a señalización para la Oficina del PAC UINIR II, envasado y distribución de los Kit para beneficiario y Kit para pareja de trabajadores, estos kits son ubicados en cada una de las casas. Se ha dado respuesta a los requerimientos que la interventoría realiza a través de oficios.
• En relación a los aspectos ambientales se instalará un punto ecológico en el PAC de Unir II, y se continúa la recolección de escombros para la disposición en la Escombrera Cemex, que está autorizada por la SDA.
• Elaboración de Informes acuerdo a los tiempos contemplados.
• El plan de trabajo tiene actividades planteadas que no se desarrollan semanalmente, entre ellas el ingreso de personal y por lo tanto las inducciones de ingreso, por esta razón se ve disminuido el porcentaje de cumplimiento, las actividades se llevan en un porcentaje alto de ejecución

1.2 INTERVENTORIA

Se continúa con el diligenciamiento de la encuesta mensual de salud de la interventoría

Se asiste a la jornada de Socialización programada para el día el 24 de septiembre en UNIR II, se verificó el cumplimiento de lo planteado en el protocolo de socialización. Se verificó el distanciamiento social, la limpieza de áreas, señalización, información para el correcto lavado de manos.

Se hizo recarga permanente de los kits de bioseguridad al personal de interventoría, frasco de alcohol, frasco de gel antibacterial y tapabocas. Algunas de las charlas a interventoría han sido vía WA y otras en campo, los temas han sido variados y se describen en el cuerpo del informe.

Se continua el acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios, se hizo acompañamiento en la instalación de cubierta previo a los ajustes del procedimiento entregado por l contratista, se verificó que no alcanza la altura mínima para entrar en el rango de la legislación, sin embargo hay casos especiales que requieren ajustes del procedimiento.

Durante las visitas de seguimiento se acompaña al personal SISO del contratista en la entrega de KIT a los maestros, brindando la información de uso y reforzando con el beneficiario también sobre el uso del kit entregado a ellos; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, recién ingresado: Tomando en cuenta que no es prudente las reuniones, se hace refuerzo de la inducción y uso de EPP durante las visitas.

La entrega de los kits fue verificada las casas que tienen obra activa, encontrando que se hace uso y se cumplió cabalmente con las entregas y cantidades propuestas, así mismo se aprovecha para verificar el cumplimiento de trabajos seguros, uso de EPP, y aplicación de protocolos. Durante las entregas se evidencia que las casa no estén con escombros producto de las obras realizadas, dejando el respectivo soporte.

El Seguimiento al plan de trabajo presentado por el consorcio se hace semanalmente y hasta la fecha se ha cumplido en un valor superior al 85% en promedio, la disminución de porcentaje obedece a la programación de actividades que no se llevaron a cabo, por la misma logística del proyecto por ejemplo se programan inducciones y revisión de afiliaciones pero esa semana no hubo ingresos lo que hace que el porcentaje baje en dos o tres actividades; sin embargo de las 291 actividades planeadas para el proyecto se han completado 94 lo que tendría un porcentaje de 32,30% para el proyecto.

Se reciben soportes de ingreso y pagos de la seguridad social, a la fecha de corte se cuenta con 13 extranjeros de los cuales 2 han renunciado, se enviaron soportes de los permisos del ministerio entregados por el contratista y las afiliaciones al día.

2 CAPACITACION	
2 .1 CAPACITACION CONTRATISTA	
Inducción al personal operativo que ingresa - sobre temas de SISO, aplicables al contrato. Divulgación de Protocolos de bioseguridad Charla sobre sensibilización de uso de pulidora con el protector de disco Sensibilización de uso de guantes de seguridad. Sensibilización de protocolo de bioseguridad Recolección adecuada de residuos(punto ecológico). Charlas sobre posturas adecuadas,uso permanente de tapabocas Distanciamiento social. Charlas sobre Orden y aseo. Charla de lavado de manos Charla de uso de tapabocas	La charlas se realizaron de acuerdo al plan de trabajo

2.2 CAPACITACION INTERVENTORIA	
La interventoría recibió información sobre la forma de detener la propagación del COVID y se envió enlace para descarga digital del certificado de vacunación. La interventoría recibió información sobre "Tres factores que te ayudaran a tomar decisiones mas seguras" Ubicación, proximidad, Tiempo. Se envió información vía WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS. Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social de interventoría en terreno sobre Riesgo público (Riesgos de la zona como robos, raponazo entre otros)	Charlas realizadas de manera presencial y virtual con apoyo de videos por W.A

3 Gestión Ambiental
La recogida de escombros se priorizó en los predios que fueron entregados, en campo se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombro y se haga entrega los afiches del correcto lavado de manos y las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde) Se mantiene el punto ecológico del PAC de Juan Pablo II y los recursos de prevención de COVID, como el dispensador de Gel al ingresar. Los escombros generados a la fecha de corte, se han Retirado gradualmente, se anexa recibo de la escombrera. se completaron 30 metros cubicos en el mes y 36 en total del proyecto

3.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos				
Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
MENSUAL	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	24	CEMEX	Se recibe copia de vale de disposición
PROYECTO	ESCOMBRO DEMOLICIÓN	30	CEMEX	Se recibe copia de vale de disposición

4. Gestión en SST (Seguridad Y Salud en el trabajo)

4.1 CONTRATISTA

Implementación de protocolos de Bioseguridad para Socializaciones UNIR II y el protocolo de Bioseguridad general el cual es desarrollado en el proyecto;

Se hace alistamiento de los elementos para dotación del PAC en cuanto a mobiliario y lo correspondiente a Bioseguridad.

Entega del kit de Bioseguridad a Beneficiarios y Trabajadores, se ralizan capacitaciones personal operativo y Administrativo,

El personal operativo recibe sus elementos de proteccion personal.

Se realizan inpecciones de pulidoras en los mv que se estan ejecutando.

No se han presentado Incidentes, ni accidentes en el proyecto.

4.2 INTERVENTORIA

Entrega de Kit Bioseguridad a Profesionales de Interventoría y reposición de los elementos utilizados

Seguimiento al plan de Trabajo del contratista,

Verificación de uso de elementos de protección, reportando condiciones y actos insguros para su corrección.

No se han presentado incidentes o accidentes en el tiempo del proyecto.

El personal hace buen manejo de cargas al omento de descargar materiales y cargar los escombros que vienen empacadps en lonas.

4.3. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Mensual	**18824**	**90,19**	**14,00**	**2912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**21648**	**135,6**	**33,17**	**5408**	**0**	**0**	**0**	**0**


4.3.1.Incidendentalidad												
	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4. Condiciones y Acciones Substandar

4.4.1 Condición Substandar

No	Descripción	Acción Tomada	La Condición Continua?
1	Disposición de escombros para recolección	Se informa al contratista para su prota recolección	NO
2	Se evidencia el uso de pulidoras sin la guarda de seguridad	Teniendo en referencia que esta situación ya se había informado al personal y se sigue presentando, se genera oficio al contratista, para que tome las acciones necesarias.	SI

5. Registro Fotográfico	
	
RECARGA DE KIT INTERVENTORIA	**CHARLA INTERVENTORÍA**
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT TRABAJADOR MVCB 4838	**ENTREGA KIT TRABAJADOR MVCB 3839**

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVCB 3876	ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVCB 3888
CHARLA INTERVENTORIA	CHARLA INTERVENTORIA
	
CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR

RECARGAS KIT DE BIOSEGURIDAD	
	
MVCB 4628	MVCB 4744
RECARGAS KIT DE BIOSEGURIDAD	
	
MVCB 4628	MVCB 3424

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 2021.	104	18824	0,0	0,0		6,52	0,00	83,67	0,00	90,19			0	0						
				14	2912				14,00	0,00	0,00	0,00	14,00			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0						
				118	**21736**	**0**	**0**	**0,0**	**20,52**	**0,00**	**83,67**	**0,00**	**104,19**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				

ELABORO: ROBERT ROJAS TORRES -PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No.794 - 797 DE 2021	
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO %	32,30%
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO EN EL MES %	93%
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	21.736
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	27.056
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. CASOS COVID	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD POR COVID	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	104,19
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	168,77

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	24
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proyecto)	30
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas proyecto)	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Proyecto	0

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS DIARIAS CAPACITACIONES SIMULACROS LECCIONES APRENDIAS (Fechas)	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO, CHARLAS SOBRE USO DE TAPABOCAS, POSTURAS ADECUADAS, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SENSIBILIZACION DE PROTOCOLO				
	MV 2414	MV 4744	MV 3410	MV 2020
La interventoría recibió información sobre "Tres factores que te ayudaran a tomar decisiones mas seguras" Ubicación, proximidad, Tiempo. Se envió información via WA sobre la variante delta, la cual fue recibida por EPS.				

INFORME SISO

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDAR

No.	DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	ACCIÓN CONTINÚA		FECHAS		RESPONSABLE	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			ABIERTA	CERRADA	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE		
1	SST	Personal no usa EPP adecuado y falta reposición de guantes	1	1	24/09/2021	25/09/2021	PROFESIONAL SST CONTRATISTA	 
2	SST	Personal trabajando sobre los perfiles de la cubierta, durante la prueba de instalación, no cuenta con medidas de control, ni EPP para altura superior a 1.50, coordinador de altura no exige cumplimiento.	1	1	1/10/2021	1/10/2021	Coordinador de altura y SST del contratista	  

TOTAL ACCIONES ABIERTAS	**2,00**
TOTAL ACCIONES CERRADAS	**2,00**

INFORME SISO

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												

INFORME SISO

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021		SI	SI		SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021		SI	SI		SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021		SI	SI		SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021		SI	SI		SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021		SI	SI		SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021		SI	SI		SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021		SI	SI		SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021		SI	SI		SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021		SI	SI		SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021		SI	SI		SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021		SI	SI		SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021		SI	SI		SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021		SI	SI		SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021		SI	SI		SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021		SI	SI		SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020		SI	SI		SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021		SI	SI		SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021		SI	SI		SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021		SI	SI		SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
106											
174											
175											
176											
RESULTADOS:					**13**	**91**	**105**	**0**	**104**	**1**	

INFORME SISO COVID

Fecha: 18 de agosto 2021 al 20 septiembre 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI		SI		SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI		SI		SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI		SI		SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI		SI		SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI		SI		SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI		SI		SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI		SI		SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020			SI			SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI		SI		SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI		SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI		SI		SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021		SI	SI		SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021		SI	SI		SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021		SI	SI		SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021		SI	SI		SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021		SI	SI		SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021		SI	SI		SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI		SI		SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021		SI	SI		SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021		SI	SI		SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021		SI	SI		SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021		SI	SI		SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021		SI	SI		SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021		SI	SI		SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021		SI	SI		SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021		SI	SI		SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021		SI	SI		SI		
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021		SI	SI		SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021		SI	SI		SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021		SI	SI		SI		
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020		SI	SI		SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021		SI	SI		SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021		SI	SI		SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021		SI	SI		SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021		SI	SI		SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021		SI	SI		SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021		SI	SI		SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020		SI	SI		SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021		SI	SI		SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020		SI	SI		SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021		SI	SI		SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021		SI	SI		SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021		SI	SI		SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021		SI	SI		SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021		SI	SI		SI		
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		IMPLEMENTACIÓN PROTOCÓL		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021		SI	SI		SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020		SI	SI		SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021		SI	SI		SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021		SI	SI		SI		
RESULTADOS:					**#¡REF!**	**#¡REF!**	**105**	**0**	**104**	**1**	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**20 septiembre de 2021**	**PERIODO**	**MES 1**

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E	E														
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E	E														
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E														
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E													
Verificacion diaria de los elementos de bioseguiridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E													
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E													
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E													
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E																
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E													
Entrega de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E													
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E													
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS						FECHA		20 septiembre de 2021								PERIODO			MES 1				
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E																
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E															
Inspeción camilla	Contratista								P				p				p				p				p
Inspección Extintores	Contratista								P				P				P				P				P
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E		E	E													
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
							E		E	E	E	E													
diligenciamiento del formato recogida de escoombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
											E														
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
								E	E	E	E	E													
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista																								
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista					P																			
						E																			
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									

P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	12	19	14	14	13	20	13	13	13	20	13	13	13	20	12	12	12	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	11	17	13	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	89,47%	92,86%	100,00%	76,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		90,32%		96,43%		30,30%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				94,12%				60,66%				0,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	32,30%																							

SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2021					
	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3839		



MV CB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4838		



MV CB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3803		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
4096		




MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KITS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3803		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REFUERZO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3839		





MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VIVIENDA SIN ESCOMBROS SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3425		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA DE VIVIENDA, ENTREGA DE KIT BENEFICIARIO SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2021
3880		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	APERTURA DE VIVIENDA UNIR II SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
171		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
660		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTRWGA DE KIT TRABAJADORES SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
828		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
838		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
897		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE VOLANTE DE BIOSEGURIDAD SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021
4072		

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEMANA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3425		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2278		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3424		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2615		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD TRABAJADOR SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021
4694		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INDUCCION SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021
3327		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021
3360		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INSPECCION DE PULIDORA SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021
2621		



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SOCIALIZACION UNIR II SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SOCIALIZACION UNIR II SEMANA 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4628		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3327		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3351		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
3410		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4272		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	REPOSICION DE TAPABOCAS SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
4629		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN PRUEBA DE CUBIERTA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		





MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CORRECCIÓN ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN PRUEBA DE CUBIERTA SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021
2414		

8. BIOSEGURIDAD

1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD MES 2

1.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

El CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 entrega protocolo de Bioseguridad general y de socializaciones para revisión por parte de la interventoría, se evidencia que cumple con lo solicitado dentro de la resolución 777 de junio de 2021 la cual está vigente.

En la reunión de socialización realizada el 24 de septiembre en UNIR II, se aplica el protocolo y se verifica que se cumpla lo establecido dentro de la documentación enviada, así mismo se evidencia que aplican las siguientes actividades

- Encuesta de condiciones salud para los beneficiarios asistentes a la reunión.
- Aun cuando no es solicitado dentro de la resolución 777 optaron por hacer toma de Temperatura a Beneficiario, teniendo en cuenta que muchos de los participantes en la reunión son de edad avanzada.
- Desinfección de Sillas al inicio e intermedios de Reuniones.
- Marcado de Silletería y Piso.
- Aplicación de alcohol para los beneficiarios a la entrada a la reunión.
- Distanciamiento social.
- Elementos de Bioseguridad.
- Entrega de Refrigerios empacados.
- Instalación de afiches de prevención.

Realizan el proceso de aseo y desinfección en el PAC de Juan Pablo e inicia el proceso para la apertura del PAC en Unir II, este último presenta algunos inconvenientes respecto al riesgo público los cuales han sido notificados por los mismos habitantes del sector.

En cuanto a Bioseguridad y SST se refiere, se conserva las áreas en Juan pablo como son, área de desinfección dispensador de pedal para Gel antibacterial y los afiches alusivos a distanciamiento, lavado de manos, jabón, toallas de papel, y el punto ecológico.

El contratista registra los elementos utilizados y los kits entregados a beneficiarios y obreros, en los formatos que fueron entregados por el hábitat, de igual manera lo hace la interventoría, en los formatos pertinentes a su alcance.

1.2 POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La empresa Inplayco SAS, dentro de sus obligaciones contractuales y su compromiso con la seguridad del personal y los temas relacionados con Bioseguridad, hizo entrega a la Secretaría del Hábitat del protocolo de Bioseguridad que va a ser aplicado en el periodo del contrato 797 de 2021.


Dentro del documento se describen las actividades a realizar además del seguimiento de la aplicación del protocolo del contratista de las cuales se ha diligenciado el respectivo registro para el control de las partes interesadas.

Las siguientes son las actividades realizadas en el periodo comprendido del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2021.

- Entrega de Kits al personal de la interventoría que estará en el proyecto.
- Charlas informativas semanales. Las cuales por tema de evitar reuniones se realizan ocasionalmente presencial y otras son referidas a través de medios electrónicos recogiendo las firmas entre los compañeros durante la semana.
- Seguimiento a las entregas de Kits a beneficiario, obreros, personal administrativo por parte del contratista y cumplimento al plan de trabajo presentado.
- Suministro y reposición de elementos del Kit para los profesionales de interventoría.

1.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

De las 291actividades programadas para el proyecto se han ejecutado 94 lo que equivale al 32.30%.

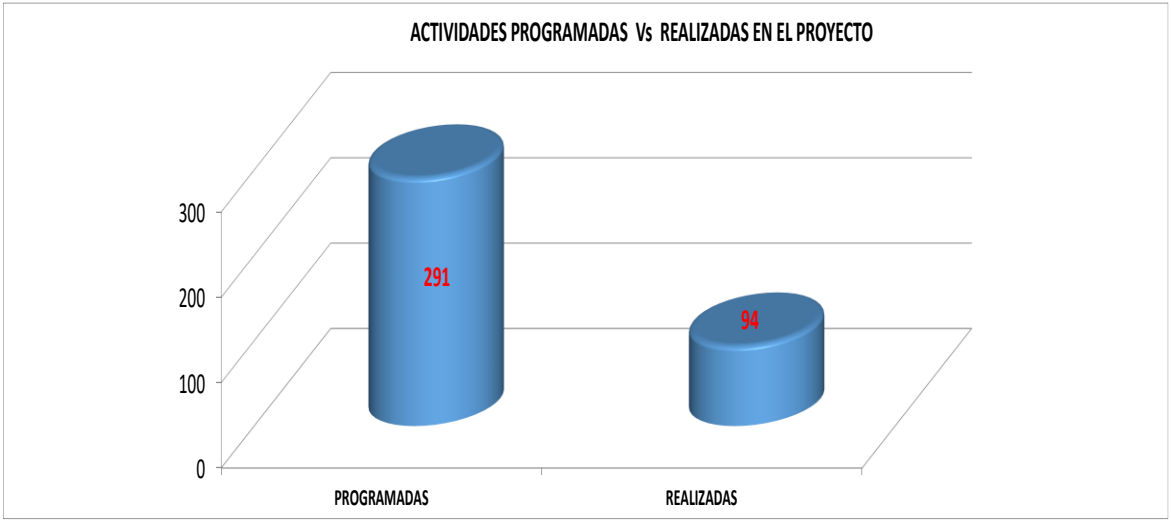


Fuente: SST interventoría


% de cumplimiento del número de actividades del plan de trabajo			
Periodo		**proyecto**	**Porcentaje (%)**
N° de actividades programadas	**PROGRAMADAS**	**291**	**32.30%**
N° de actividades realizadas	**REALIZADAS**	**94**	
META	100%		

Fuente: SST interventoría

La distribución de estas actividades por semana se muestra a continuación:
El periodo inicia en la semana 3 del mes de agosto, cumplidas las actividades al 100%

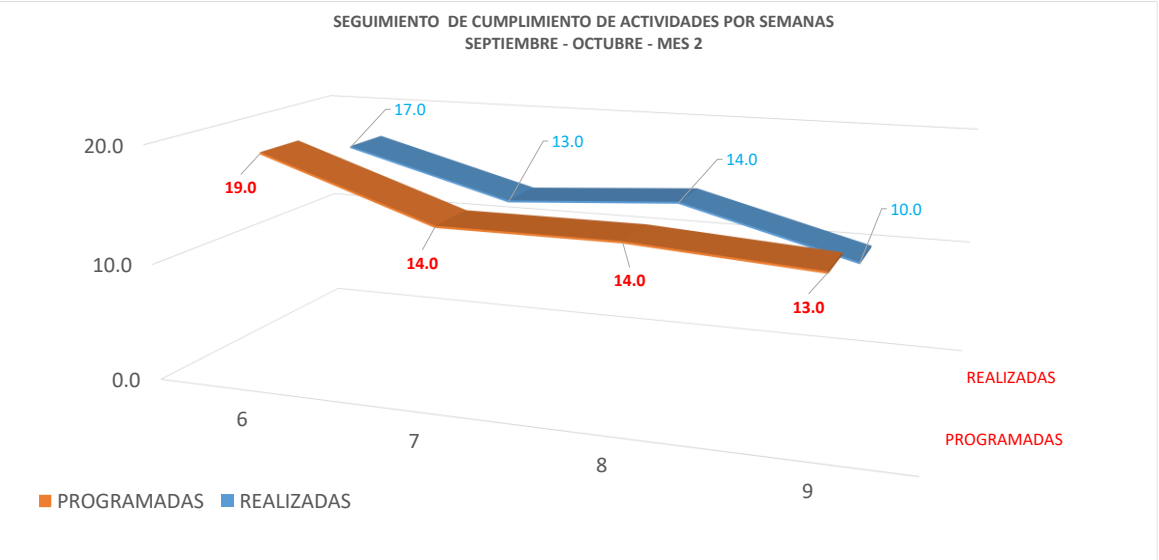

Fuente: SST Interventoría

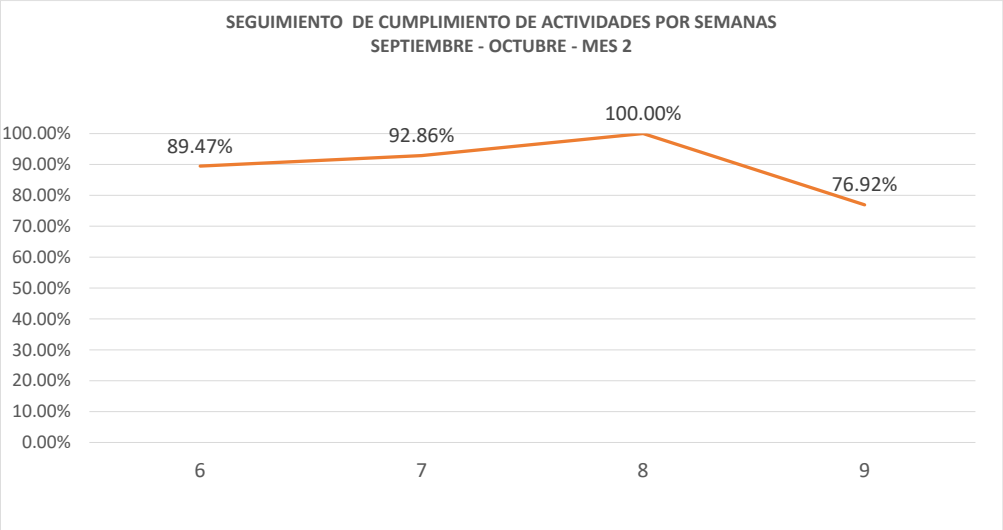

Fuente: SST Interventoría

Para este corte corresponde las semanas 6,7,8,9 del mes de septiembre y octubre de 2021.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO
SEGUIMIENTO AL KIT DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

1. INFROMACIÓN INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	797 -2021	KIT DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD QUE GARANTICE LOS ELEMENTOS NECESARIOS	Frasco plástico tapa spray 150 ml - alcohol Frasco plástico tapa crema 150 ml - gel Tapaboca empaque individual - 30/mes
Fecha de entrega KIT:	24/9/2021	**Fecha de reposición del KIT:**	4/10/2021

2. ENTREGA Y REPOSICIÓN DEL KIT DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

1



FOTO 1 - REPOSICIÓN DE CONTENIDOS KIT

2



FOTO 2 - REPOSICIÓN DE CONTENIDOS KIT

3



FOTO 3 -REPOSICIÓN DE CONTENIDOS KIT

4



FOTO 4 - REPOSICIÓN DE CONTENIDOS KIT

5



FOTO 5 -USO PERMANENTE DE TAPABOCAS

6



FOTO 6 - REPOSICIÓN DE CONTENIDOS KIT

Observaciones Generales evidenciadas
Se hace recarga permanente, ya que cada uno puede reargar su recipiente con los litros de alcohol y gel que se tienen en el área.

ROBERT ROJAS TORRES
Firma de Interventoria (Aprobación)

9. ANEXO 1 PARAFISCALES OBRA

10. ANEXO 2 PARAFISCALES INTERVENTORÍA

11. ANEXO 3 OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA

12. ANEXO 4 OFICIOS INTERVENTORÍA
