INFORME MENSUAL

2021

Contrato Obra Pública No. 1787 9 de Julio de 2021 "CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA DEMARCACIÓN VIAL E INSTALACIÓN DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO, EN LAS VÍAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
N° DE CONTRATO:	1787 con fecha de 9 de Julio de 2021
N° PROCESO SECOP II	AI-SAMC-1456-2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA
CONTRATISTA:	V&M INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN No	900.062.688-7
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA A MONTO AGOTABLE PARA LA DEMARCACIÓN VIAL E INSTALACIÓN DE SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO, EN LAS VÍAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ."
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
ÁREA RESPONSABLE	SECRETARIA DE MOVILIDAD
FECHA DE INICIACIÓN:	9 JULIO 2021

PRESENTACION

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA iniciando desde el día 1 de agosto del 2021 hasta 27 de agosto 2021, dando cumplimiento y desarrollo al Contrato de obra pública No.1787-2021 suscrito con el MUNICIPIO DE IBAGUE.

Se hace una descripción técnica del proyecto mencionando la forma en que se ejecutaron los diferentes ítems contratados, así como el seguimiento que se le realizó a cada uno de los procesos implementados en su ejecución, especificando los materiales utilizados para el normal desarrollo de las diferentes actividades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto, la demarcación vial e instalación de señales y dispositivos de tránsito, en las vías y puntos críticos de la ciudad de Ibagué.

Se firma un acta parcial el día 27 de Agosto del 2021.

PERSONAL

Previo al inicio de las actividades en campo, se realizó la respectiva vinculación del personal a trabajar en obra al sistema obligatorio de seguridad social y aportes parafiscales, por medio de la empresa “V&M INGENIERIA S.A.S” en cada una de las entidades de salud, aseguradora de riesgos laborales y caja de compensación. Se contrató la empresa de señalización “GRUPO DELVA S.A.S” para la ejecución del contrato.

CONTROL DE CALIDAD

El contratista ha solicitado los respectivos certificados de calidad de la pintura amarilla, blanca, imprimante y micro esferas a la empresa “PINTUCO COLOMBIA S.A” productos aprobados por Personal de Calidad. Métodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC para la demarcación vial. Así mismo certificados de calidad de la cinta reflectiva por parte de “AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.S”, lámina galvanizada por parte de “ACESCO COLOMBIA S.A.S”, y ángulo por parte de “GERDAU DIACO S.A” para la señalización vertical.

Las actividades se han desarrollado según los parámetros establecidos y se han desarrollado con acompañamiento y supervisión de la secretaria de movilidad, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades que se desarrollaron hasta la fecha son:

ACTIVIDADES SEÑALIZACION

6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para líneas de carril de 12 cm de ancho
7	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos SIN microesferas de vidrio para marcas viales
8	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para marcas viales
9	Suministro y aplicación de base imprimante para pintura acrílica sobre pavimentos
10	Suministro e instalación de señal reglamentaria, preventiva e informativa de 60 cm x 60 cm, reflectivo alta intensidad Tipo IV, en lámina galvanizada pedestal en ángulo (SR-SP-SI)
11	Retiro de señales verticales de pedestales (incluye señales sencillas y dúplex)

ESTADO DE LA OBRA:

- ✓ SUSPENDIDA ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADA ( )

DIFICULTADES PRESENTADAS

El principal inconveniente hasta el momento ha sido la lluvia que en varias ocasiones ha ocasionado la interrupción y aplazamiento de actividades de señalización horizontal.

Sin embargo, se han equilibrado estas actividades con la instalación de señalización vertical.

INFORMACIÓN GARANTÍAS – PÓLIZAS

El contrato está respaldado por la garantía única de seguros de cumplimiento a favor del MUNICIPIO DE IBAGUE, con Póliza de Cumplimiento NV–100046288 y Responsabilidad Civil NV–100008008 de la Compañía Mundial de Seguros S.A

PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
DESCRIPCIÓN	**Desde**	**Hasta**	**Suma Asegurada**
Cumplimiento	09/07/2021	09/04/2022	$ 100.000.000
Prestaciones Sociales	09/07/2021	09/10/2024	$ 100.000.000
Estabilidad y Calidad de la obra	09/10/2021	09/10/2026	$ 125.000.000

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL			
DESCRIPCIÓN	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**Suma Asegurada**
Amparo Basico – Predios, Labores Y Operaciones	90,852,600.00	181,705,200.00	181,705,200.00
Patronal	54,511,560.00	54,511,560.00	54,511,560.00
Contratistas Y Subcontratistas	54,511,560.00	54,511,560.00	54,511,560.00
Vehiculos Propios Y No Propios	54,511,560.00	54,511,560.00	54,511,560.00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO - ACTAS SUSCRITAS

Durante el desarrollo de los compromisos contractuales y buscando el cumplimiento del objeto adquirido, se han suscrito las siguientes actas:

ACTIVIDAD	FECHA
Iniciación	19 JULIO 2021
Acta parcial 01	27 AGOSTO 2021


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante el desarrollo de las actividades contractuales realizadas se han revisado en conjunto con la entidad contratante, los procesos constructivos, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y controlando la calidad de los materiales.

Así mismo se ha revisado que la cantidad del personal relacionado en las diferentes labores fuese acorde con los rendimientos y las cantidades de obra a realizar de acuerdo a lo programado.

OBSERVACIONES

Las actividades contractuales se han desarrollado de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, logrando avanzar hacia el cumplimiento del objeto contractual.

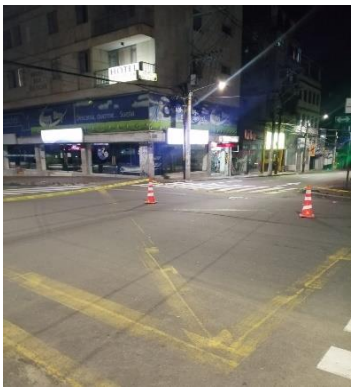
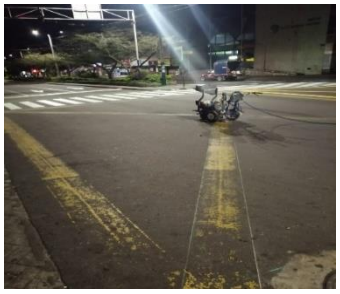
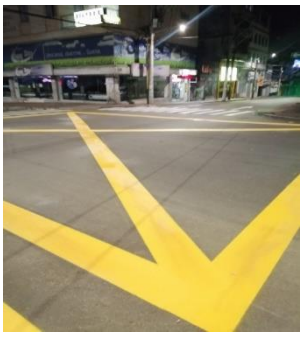
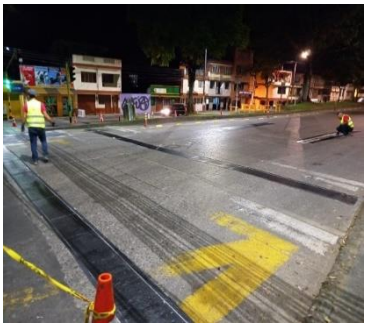


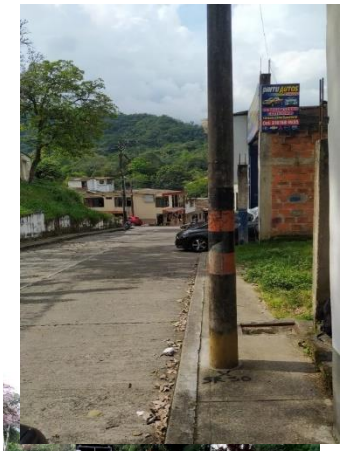
V&M INGENIERIA S.A.S
R/L YERSON FERNANDO CAMACHO L.
CONTRATISTA

ANEXO No. 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM	DESCRIPCION	ANTES	DESPUES
6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para líneas de carril de 12 cm de ancho	  	  
7	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos SIN microesferas de vidrio para marcas viales	 	 

8	Suministro y aplicación de pintura acrílica para pavimentos CON microesferas de vidrio para marcas viales	  	  
9	Suministro y aplicación de base imprimante para pintura acrílica sobre pavimentos		

10	Suministro e instalación de señal reglamentaria, preventiva e informativa de 60 cm x 60 cm, reflectivo alta intensidad Tipo IV, en lámina galvanizada pedestal en ángulo (SR-SP-SI)	  	  
11	Retiro de señales verticales de pedestales (incluye señales sencillas y dúplex)		
