

INFORME SEMANAL 12





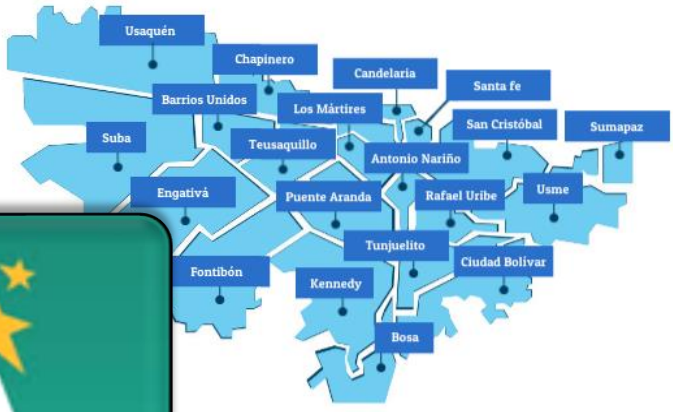

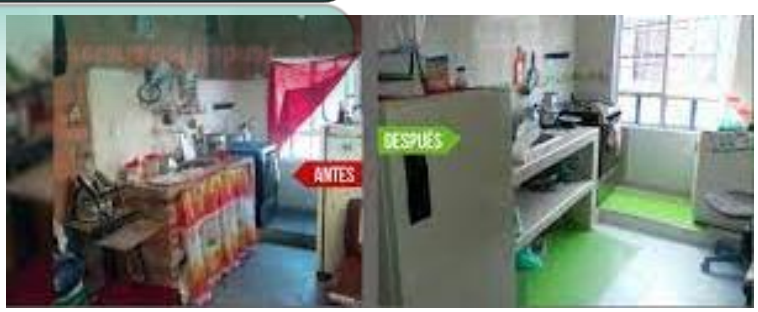

GRUPO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021

SEMANA 12 DEL 01 DE NOV. AL 07 DE NOV. DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NÚMERO: 797-2021

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	**INPLAYCO S.A.S**	
IDENTIFICACIÓN:	**N.I.T.: 860.524.168- 8**	
REPRESENTANTE LEGAL:	**GONZALO LIÉVANO HOYOS**	
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar La Interventoría Técnica, Jurídica, Social, Administrativa Y Financiera Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Habitabilidad De Los Proyectos Estructurados En Los Territorios Priorizados Por La Secretaría Distrital Del Hábitat. Grupo 1 - 2021	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. Nº 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	inplayco@yahoo.com.mx inplaycocontrato797g1@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE MARZO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL	6 MESES Y 15 DIAS	
VALOR CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 615.594.670	

CONTRATO DE OBRA NÚMERO: 794-2020

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020	
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO:	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 938-07 de abril de 2021	
FIDUCIA No.	BANCOLOMBIA	
DIRECCIÓN:	TV 21 Bis No 59-57 BOGOTA D.C	
TELÉFONOS:	3112887795 (1) 7576146	consorcioorip@gmail.com
Consorciado No. 1.	SAFRID INGENIERÍA S.A.S	
NIT	900.520.848-4	
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	
C.C. R.L.	1.082.774.968	
Consorciado No. 2.	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGE	
NIT	822.006.084-8	
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	
C.C. R.L.	93.123.714	
PARTICIPACIÓN		
SAFRID INGENIERÍA S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S	50% / MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE FINALIZACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5 MESES Y 15 DÍAS	
VALOR CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA ADICIÓN No. 1	------	
VALOR ADICIÓN No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	
FECHA PRÓRROGA No. 1	------	
VALOR PRÓRROGA No. 1	$0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.130.409.981	

INTRODUCCIÓN

El presente informe, busca por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantar las obras encaminadas al mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios de Ciudad Bolívar y Engativá; de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco del contrato por parte del contratista y la interventoría, y atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Construcción Sostenible, se ofreció a las familias favorecidas la mejora de sus ambientes habitacionales y de vida., para lograr este alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el No 797 de 2021 con la empresa INPLAYCO S.A.S, para su correcta ejecución con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios mencionados anteriormente.

1. AVANCE DE EJECUCIÓN EN LA FASE I. DE VALIDACIÓN (CUANDO APLIQUE).


ETAPA DE VALIDACIÓN

En este informe ejecutivo, comprendido del 01 de Nov. al 07 de Nov. del 2021, periodo en el cual se desarrollaron en la semana Doce, las actividades de inicio de obra en las viviendas ya validadas, así como continuar con aperturas y actividades de obra en general en los territorios de *Marandu: Juan Pablo II: Urbanización Compartir: Potosí: Las Brisas: Jerusalén: acacias: Unir.*


Se continúa las actividades de obra en las viviendas en el sector de Habitarte por parte el contratista **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** así mismo se continua con la validación en el sector de UNIR (50 viviendas) y demás sectores al igual que la apertura e inicio de actividades de obra en cada una de ellas.

Existe un punto de atención a la comunidad (PAC) localizado en la Cra18Q# 69-22 sur (HABITARTE), y en (UNIR) se está localizado en una bodega, Calle 75 #119-26, ya que por razones de localización y seguridad el contratista expone que es complejo su adquisición en arriendo.

Avance de Validaciones.

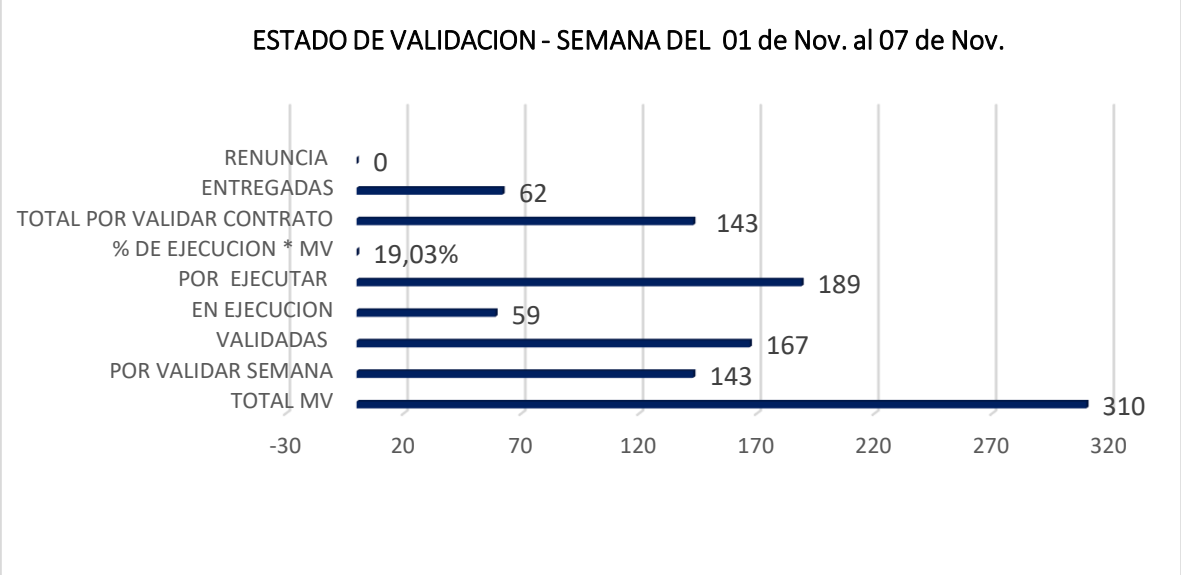

Avance de validaciones realizadas al 07 de Noviembre 2021: **Total 167**
Mv que se encuentran en ejecución: **Total 59**
Validaciones por realizar: **143 en total** de 310 Viviendas
Renuncia del subsidio: **1**
Entregadas**: 62**

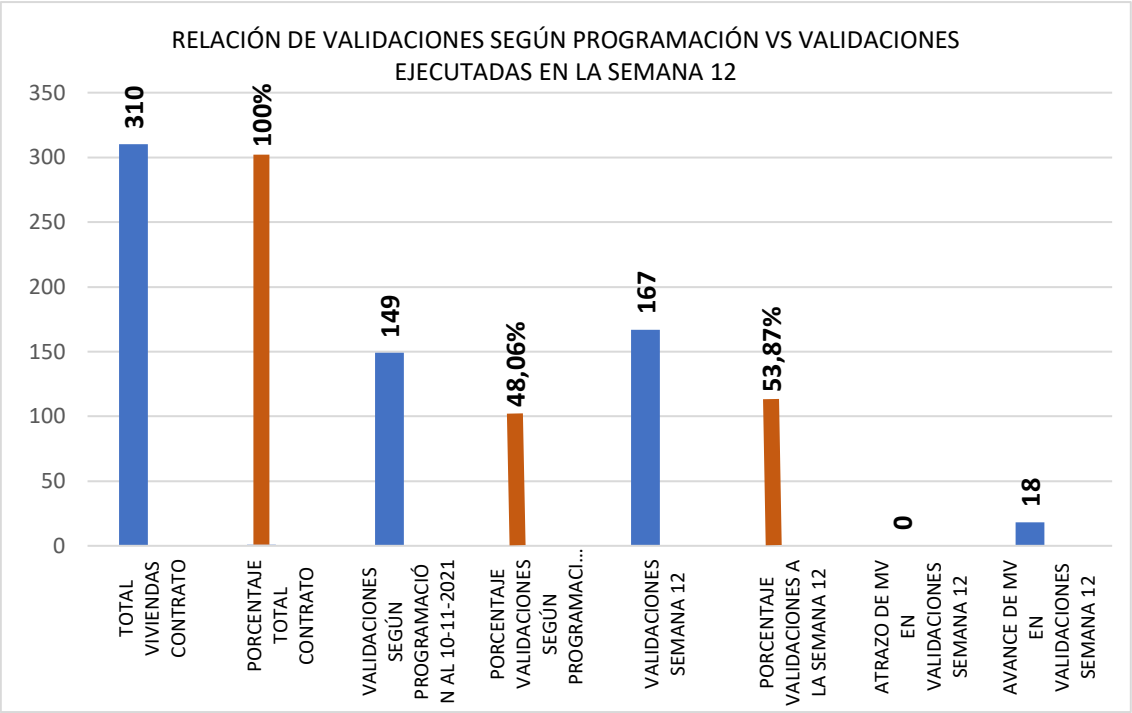

Para el presente informe (semana 12) el contratista: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020,** se **encuentra en cumplimiento** de las actividades de validaciones según la programación de obra. Esto a razón que para el 10 de Noviembre del 2021 deberá finalizar con 149 validaciones y a la fecha posee 167 validaciones terminadas, lo que indica que presenta un avance de 18 validación a la fecha de este informe.

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Valida	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	63	25	0	12	11	12	2	74,00%	12
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	38,60%	0
Técnico Responsable		POTOSI	35		6	29	0	0	0	35	0,00%	0
Subtotal			63	63	34	29	12	14	12	37	37,53%	12

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Valida	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	63	25	0	10	12	9	4	68,60%	9
		nizacion Comp	2		2	0	0	2	0	0	42,50%	0
Técnico Responsable		Acacias	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
		Potosi	31		3	28	0	0	0	31	0,00%	0
		Jerusalen	4		0	4	0	0	0	4	0,00%	0
Subtotal			63	63	31	32	10	14	9	40	37,03%	9

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Valida	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable		UAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		21	29	0	13	3	34	15,11%	3
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			59	59	30	29	0	13	12	34	57,56%	12

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Valida	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	64	26	0	11	8	16	2	77,58%	16
		nización comp	2		2	0	1	1	1	0	92,50%	1
Técnico Responsable		Jerusalén	13		4	9	0	0	0	13	0,00%	0
		Potosí	23		6	17	0	0	0	23	0,00%	0
Subtotal			64	64	38	26	12	9	17	38	42,52%	17


Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Valida	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a
Arq. o Ing. Responsable	grupo 5	Marandu	7	61	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
		Juan Pablo II	13		13	0	2	9	2	2	41,08%	2
Técnico Responsable		nizacion Comp	6		6	0	5	0	5	1	83,33%	5
		Potosi	33		8	25	0	0	0	33	0,00%	0
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		Jerusalen	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			61	61	34	27	12	9	12	40	32,64%	12

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	grupo 5	Marandu	7	310	7	0	5	0	5	2	71,4%	5
		Juan Pablo II	98		98	0	41	40	48	10	72,3%	48
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	13		13	0	6	6	6	1	64,2%	6
		Potosi	122		23	99	0	0	0	122	0,0%	0
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,0%	0
		Jerusalen	18		4	14	0	0	0	18	0,0%	0
		acacias	1		1	0	0	0	0	1	0,0%	0
		Unir	50		21	29	0	13	3	34	15,1%	3
Subtotal			310		167	143	52	59	62	189	27,88%	62

2. ESTADO DE AVANCE SEMANAL CONFORME A LO PROGRAMADO GENERAL Y POR CADA VIVIENDA INTERVENIDA


RELACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEMANA 12 DEL 01 de Nov. al 07 de Nov.

Para la semana 12, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se encuentra ejecutando actividades de obra con los siguientes valores:

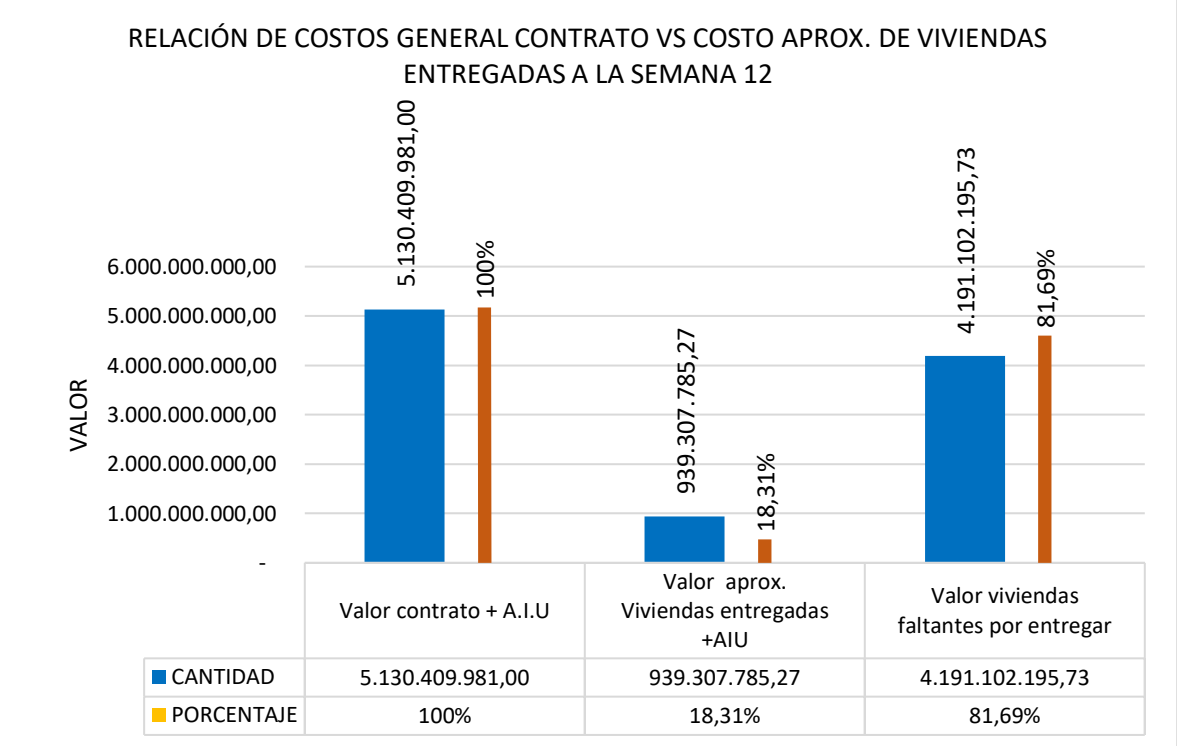


así mismo, el contratista presenta un porcentaje aprox. en la ejecución de obra en el costo total del proyecto para la semana (12), del 18.31%.


En relación con tiempo de ejecución, el contratista tiene un periodo de 87 días para finalizar el contrato con 248 viviendas por entregar.

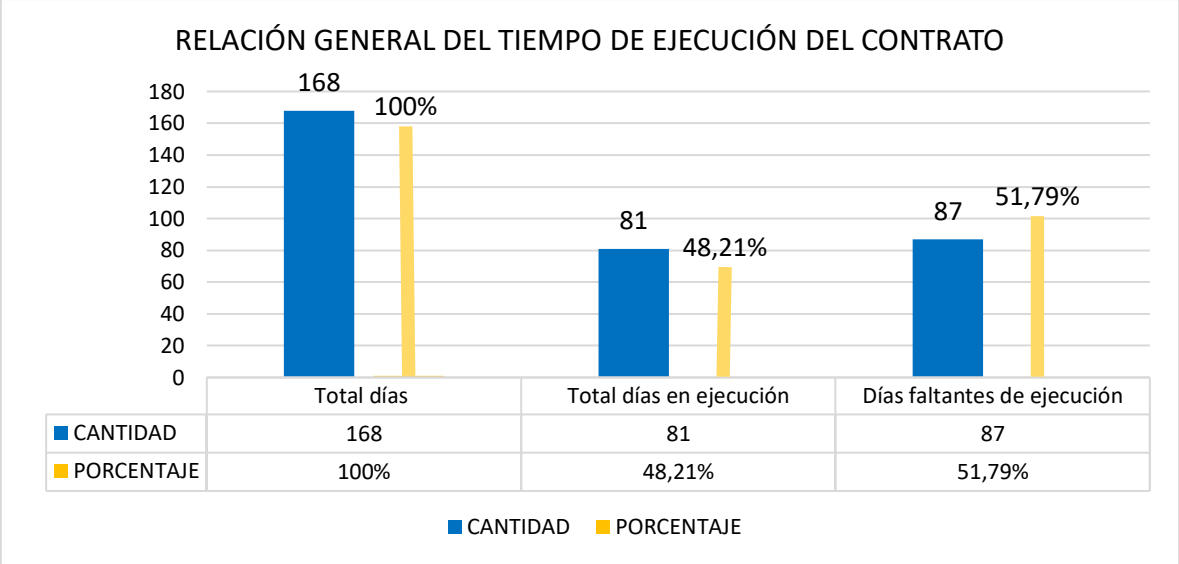

Finalmente, en este periodo y de acuerdo con la programación de obra, el Consorcio **ORIP SAFRICON 2020** se **encuentra en cumplimiento** de las viviendas a entregar, ya que para el día 29 de noviembre de 2021 entregara 134 viviendas, y a la fecha de este informe se encuentran entregadas 62 viviendas, de igual manera se encuentran en ejecución de 59 viviendas.

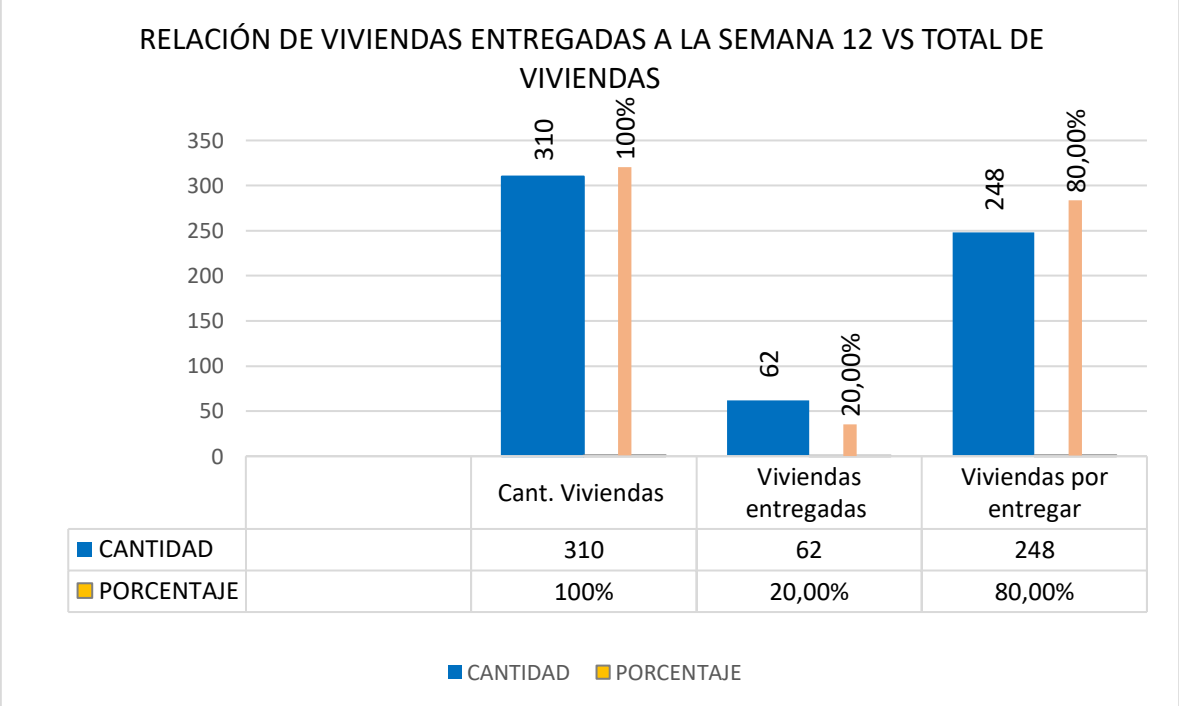

De acuerdo con la ejecución que esta realizando el contratista, a continuación, se muestran los porcentajes en desarrollo de las viviendas que a la semana 10 se encuentran activas.

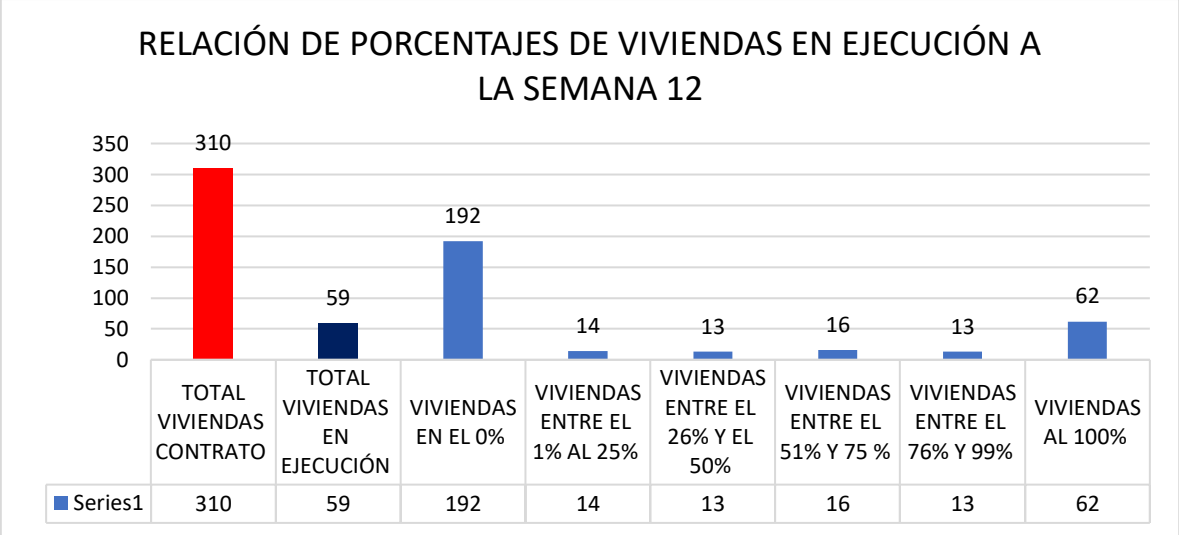

3. AVANCE DE EJECUCIÓN
INFORME TÉCNICO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE II. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA ANTERIOR CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, ESTE AVANCE DEBE SER SEMANAL Y ACUMULATIVO SEMANA TRAS SEMANA.

Subsecretaria de Coordinación Operativa

Subdirección de Barrios

Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **7-nov-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 días
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 días
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 1	JUAN PABLO II	25	63	25	0	12	11	12	2	74,00%	12
		URB. COMPARTIR	3		3	0	0	3	0	0	38,60%	0
Técnico Responsable		POTOSI	35		6	29	0	0	0	35	0,00%	0
Subtotal			**63**	**63**	**34**	**29**	12	**14**	**12**	**37**	**37,53%**	**12**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**NOVIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 1 AL 7**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 12**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_3650	DG 69A SUR 18M 30	MARTHA NUBIA POSADA	SI / NO	$ 12.899.586,0	$ 10.814.804,0	**7/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

2	MVCB_3669	DG 69 SUR 18M 39	GABRIELA MUÑOZ	SI / NO	$ 12.899.947,0	$ 11.944.526,0	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
3	MVCB_3433	DG 69A SUR 18P 34	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	SI / NO	$ 12.678.735,0	$ 11.398.939,0	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_3410	DG 69 SUR 18N 86	OCTAVIO VALENCIA LLANO	SI / NO	$ 12.020.042,0	$ 11.427.635,0	**14/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_3396	DG 69 SUR 18N 30	ANGEL ESTELA MENDOZA	SI / NO	$ 11.974.102,0	$ 12.204.961,0	**10/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_2621	DG 68 B SUR 18 M 39	ALIX ANGULO AMADO	SI / NO	$ 12.897.510,0	$ 11.186.603,0	**9/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2615	DG 68B SUR 18M 63	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	SI / NO	$ 12.894.063,0	$ 11.626.077,0	**13/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_3425	DG 68 B SUR 18 N 35	PABLO ANTONIO CUERVO	SI / NO	$ 12.703.070,0	$ 10.707.871,0	**9/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_3424	DG 68B SUR 18N 39	GIANNI GIOVANNA REYES	SI / NO	$ 12.972.425,0	$ 10.902.052,0	**9/09/2021**	**27/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
46	MVCB_4498	KR 18M 66D 47 SUR	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	SI / NO		$ 11.864.372,0	12/10/2021		EN EJECUCION	52,98%	**73,75%**
47	MVCB_4475	KR 18M BIS 66D 35 SUR	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	SI / NO		$ 11.329.166,0	28/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**23,01%**
48	MVCB_4351	CL 66D SUR 18M 63	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	SI / NO	$ 11.514.588,0	$ 11.797.280,0	**7/10/2021**	**3/11/2021**	ENTREGADA	95,12%	**100,00%**
49	MVCB_4561	KR 18M 66A 34 SUR	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	SI / NO	$ 11.674.878,0	$ 12.002.565,2	**7/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	80,32%	**100,00%**
50	MVCB_4438	KR 18M BIS 66 49 SUR	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	SI / NO	$ 12.167.134,0	$ 11.887.610,4	**6/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	88,96%	**100,00%**
51	MVCB_4363	KR 18N 66A 22 SUR	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	SI / NO		$ 11.489.381,0	6/10/2012		EN EJECUCION	69,77%	**83,33%**
52	MVCB_4365	KR 18N 66A 08 SUR	OLGA BLANCO DE RIAÑO	SI / NO		$ 11.245.957,8	12/10/2021		EN EJECUCION	53,17%	**65,90%**
53	MVCB_4366	KR 18N 66A 02 SUR	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	SI / NO		$ 11.890.753,3	11/10/2021		EN EJECUCION	61,58%	**94,10%**
83	MVCB_4900	CL 66B SUR 18R 24 MJ	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	SI / NO		$ 10.023.595,0	20/10/2021		EN EJECUCION	23,00%	**41,44%**
84	MVCB_3876	KR 18T BIS 66B 23 SUR	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	SI / NO		$ 9.359.388,0	14/10/2021		EN EJECUCION	8,95%	**20,60%**
85	MVCB_3888	CL 66D SUR 18R 16	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	SI / NO		$ 10.799.101,0	14/10/2021		EN EJECUCION	53,97%	**97,80%**
86	MVCB_3880	KR 18T BIS 66C 27 SUR	FIDELIGNO RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.769.237,4	15/10/2021		EN EJECUCION	25,62%	**53,52%**
87	MVCB_3885	KR 18T BIS 67 03 SUR	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	SI / NO		$ 11.952.659,2			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
88	MVCB_4811	KR 18T 67C 22 SUR	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	SI / NO		$ 11.021.230,8	21/10/2021		EN EJECUCION	22,38%	**54,60%**
89	MVCB_4801	CL 67C BIS SUR 18Q 85	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	SI / NO		$ 11.704.303,9			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
90	MVCB_4791	CL 68 SUR 18R 08	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	SI / NO		$ 12.095.771,5	20/10/2021		EN EJECUCION	26,33%	**42,06%**

URBANIZACION COMPARTIR											
54	MVCB_0005	CL 66 SUR 18N 23	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	SI / NO		$ 11.953.028,0	8/10/2021		EN EJECUCION	40,11%	**72,10%**
81	MVCB_0481	DG 65 BIS A SUR 18Q 63	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	SI / NO		$ 11.612.217,0	15/10/2021		EN EJECUCION	6,00%	**23,08%**
82	MVCB_0474	DG 65A SUR 18Q 54	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	SI / NO		$ 11.789.319,0	15/10/2021		EN EJECUCION	12,16%	**20,62%**

POTOSI												
188	MVJE_1068	DG 81 SUR 45B -59	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	SI NO		$ 11.864.323,53			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
189	MVJE_251	DG 81 SUR 45B 53	LUZ AMANDA BUITRAGO	SI NO		$ 12.023.184,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
190	MVJE_380	DG 81 SUR 45B 41	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	SI NO		$ 12.010.552,10			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
191	MVJE_928	DG 81 A SUR 45 B 26	JUAN CARLOS NAVA SALCEDO	SI NO		$ 11.824.619,83			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
192	MVJE_133	KR 45B 81 15 SUR	LIGIA INÉS SALAZAR DE PRADA	SI NO		$ 11.507.697,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
193	MVJE_359	KR 45B 81 09 SUR	CARMEN ELISA PRADA ABELLO	SI NO		$ 12.024.533,70			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
194	MVJE_022	DG 81 SUR 45B 52	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	SI NO		$ 11.779.705,70			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
195	MVJE_1042	DG 81 SUR 45B 46	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	SI NO		$ 11.420.319,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
196	MVJE_174	DG 81 SUR 45B 34	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	SI NO		$ 12.220.439,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
197	MVJE_941	DG 81 SUR 45B 28	EDGAR ELI SANHEZ GOMEZ	SI NO		$ 11.270.077,90			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
198	MVJE_457	DG 81 SUR 45B 16	HILDA MERY PALOMO GUARÍN	SI NO		$ 12.059.095,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
199	MVJE_942	DG 80A SUR 45 63	JESUS ANTONIO GARAVITO BELTRAN	SI NO		$ 11.131.692,91			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
200	MVJE_077	DG 80A SUR 45 59	MARIA MAGNOLIA ARIAS CARDONA	SI NO		$ 12.058.623,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
201	MVJE_1016	DG 80A SUR 45 45	LUZ DARY GARCÍA MORALES	SI NO		$ 11.647.771,89			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
202	MVJE_1017	DG 80 A SUR 45 39	OSWALDO HERNANDEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.184.582,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
203	MVJE_907	DG 80 SUR 45 33	ANA ISABEL GONZALEZ	SI NO		$ 11.782.262,83			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
204	MVJE_1045	DG 80 SUR 45 81	ALBERTO EFRAÍN CORREA HERNANDEZ	SI NO		$ 11.407.689,27			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
205	MVJE_079	DG 80 SUR 45 86	JORGE HUMBERTO TELLEZ PEÑA	SI NO		$ 12.142.762,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
260	MVJE_1028	CL 82B SUR 45-10	ARSENIO PARDO VELANDIA	SI NO		$ 11.970.784,90			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
261	MVJE_1063	CR 45 82A 09 SUR	MIGUÉL ÁNGEL GARCÍA	SI NO		$ 11.993.439,91			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
262	MVJE_916	KR 45 A 82 34 SUR	AMANDA LOZANO TAPIERO	SI NO		$ 11.873.322,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
263	MVJE_920	KR 45 82 23 SUR	BLANCA LILIA RAMIREZ	SI NO		$ 11.719.103,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
264	MVJE_1056	KR 45 82 09 SUR	BLANCA CECILIA SANABRIA	SI NO		$ 11.841.322,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
265	MVJE_992	KR 45 82 05 SUR	JORGE LUIS RODRIGUEZ NIETO	SI NO		$ 11.846.644,70			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
266	MVJE_179	KR 45A 82 06 SUR	BUENAVENTURA BECERRA FUQUENE	SI NO		$ 12.035.670,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
267	MVJE_341	KR 45 82 03 SUR MJ 1	OLGA PATRICIA RAMOS SUAREZ	SI NO		$ 11.906.305,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
268	MVJE_1095	CL 81 SUR 45 15	ANA CECILIA GONZALEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.839.930,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

269	MVJE_346	CL 81 SUR 45 38	HECTOR BERNAL PINTO	SI NO		$ 12.080.070,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
270	MVJE_345	CL 81 SUR 45 16	DELIO ALAPE CONDE	SI NO		$ 12.200.505,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
271	MVJE_991	KR 45 81 18 SUR	BENJAMIN BALLESTROS BALLESTEROS	SI NO		$ 11.913.840,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
272	MVJE_989	CL 82 SUR 44A 77	ANA JUDITH BERMUDEZ VARGAS	SI NO		$ 11.727.893,18			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
273	MVJE_1078	CL 82A SUR 44A 74 MJ 1	OSTILIO PABON GAMEZ	SI NO		$ 11.843.190,46			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
274	MVJE_1125	CL 82C BIS 44B 04	ROSA MARIA VARGAS	SI NO		$ 11.907.198,72			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
275	MVJE_946	CL 82C BIS SUR 44A 59	SOLANGEL AMAYA	SI NO		$ 11.389.023,87			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
276	MVJE_885	CL 82 SUR 44A 43	JOSE RAMIRO LEON ARISMENDY	SI NO		$ 11.966.271,34			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	12	DEL	1/11/2021	AL	7/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 días	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 días
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

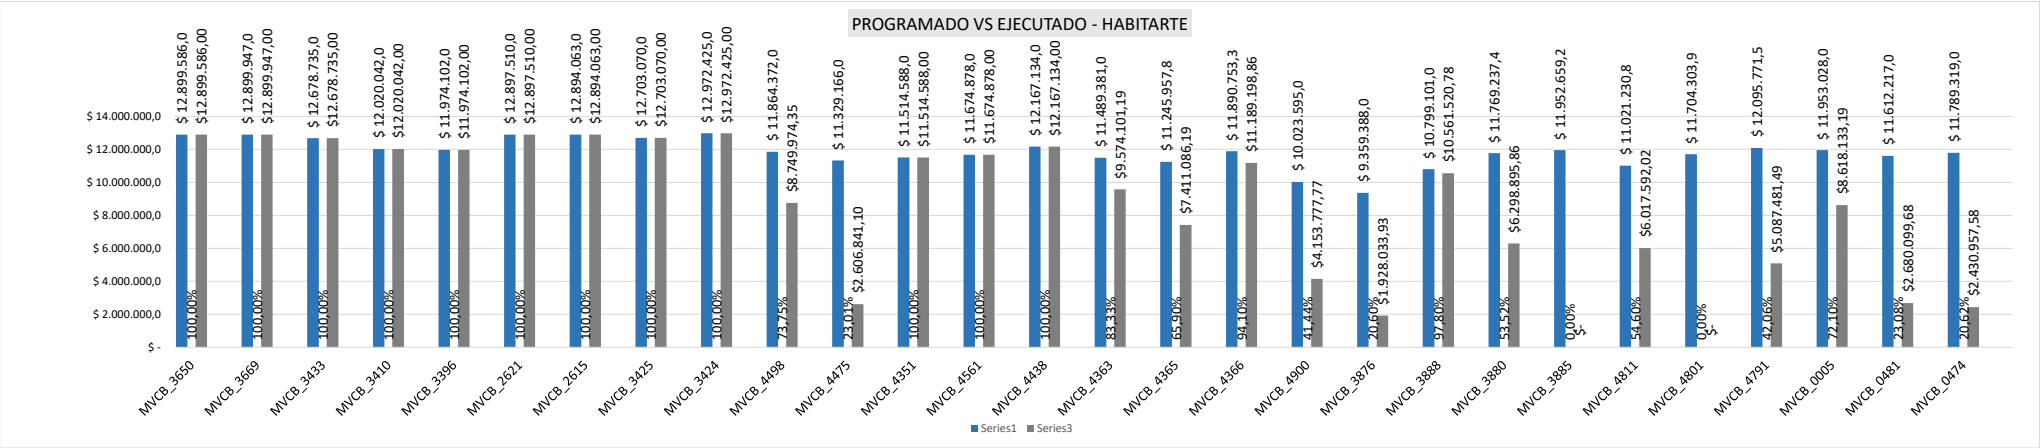

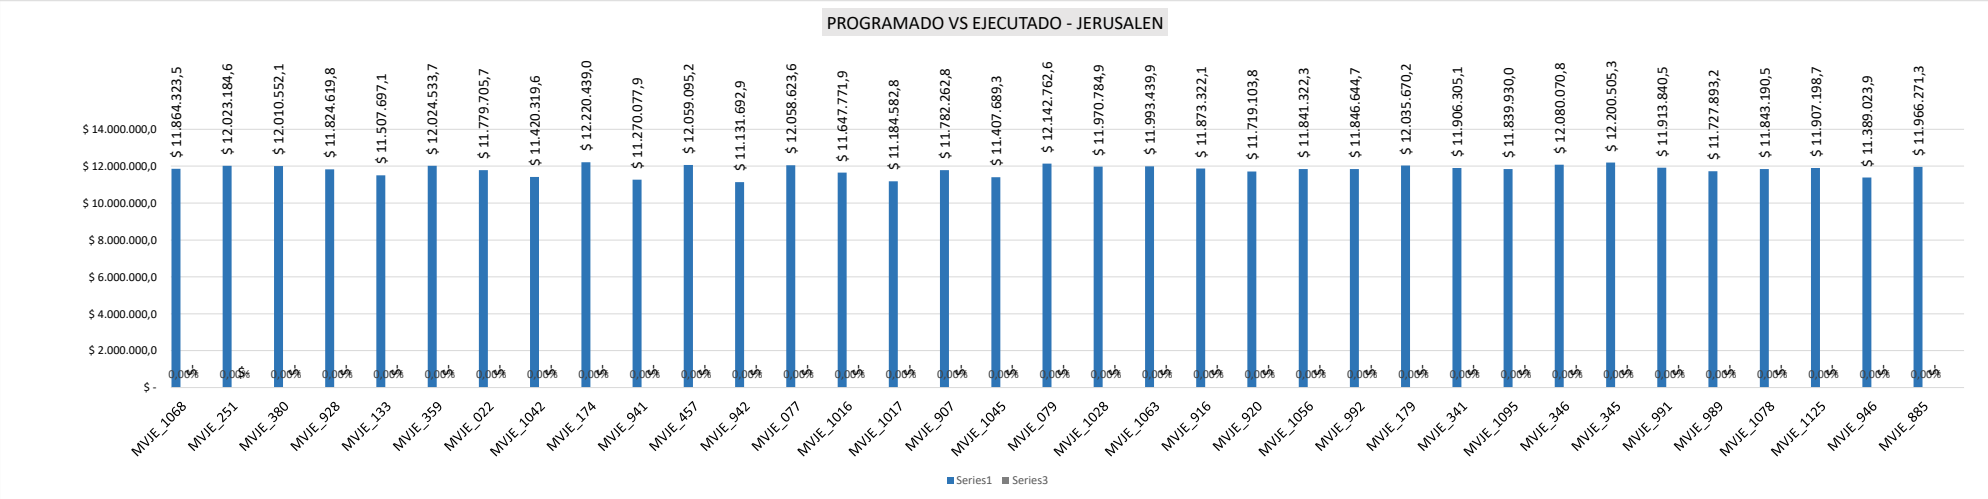

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

Personal técnico y social de la interventoría y el contratista realizaron visitas de seguimiento al avance de obras. Se proyectaron actividades y aprobaron presupuestos para la ejecución de las obras de mejoramiento en las viviendas validadas. Durante el presente período se entregaron tres (3) viviendas en el barrio Juan Pablo II. Se dio inicio a la validación de viviendas en el sector de Jerusalén, Barrio Potosí; se validaron seis (6) viviendas en este sector.

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II

1	MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
2	MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
3	MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
4	MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
5	MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
6	MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA

7	MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
8	MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
9	MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	VIVIENDA TERMINADA Y ENTREGADA
46	MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	Se instaló estructura de cielo raso en áreas de alcoba 2, lavandería, baño, cocina, hall de acceso. Se terminaron enchapes de pared, mesones y piso de la cocina. Se instaló cerámica de piso en la sala y hall de acceso a la vivienda.
47	MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	Se dio inicio a actividades en la vivienda. Se trabajó en pañetes de muros de alcoba 1, sala comedor y cocina.
48	MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
49	MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
50	MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	Se terminaron las actividades proyectadas en esta vivienda, se protocolizan los documentos y se hace **entrega de obras al beneficiario**. Se efectuó registro fotográfico del estado final de la obras proyectadas.
51	MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	Se termina la aplicación de pintura vinilo en muros de sala comedor, alcobas 1 y 2, corredor de alcobas, cocina y baño. En el área del baño se instaló la puerta con su marco y el combo sanitario. En el área de lavandería se levantó mampostería, se hicieron pañetes, se enchaparon paredes y piso, quedando instalado el lavadero.
52	MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	Se demolió el enchape antiguo de cocina y baño. Se termina la pintura vinilo en alcobas 1, 2, corredor de alcobas, patio interior y hall de acceso. Se inician enchapes de pared en el baño.
53	MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	Se aplicó pintura vinilo en muros de punto fijo, hall de alcobas, área superior sobre enchapes de baño y cocina. Se terminan enchapes de pisos de las alcobas 1, 2 y 3 y se aplica pintura vinilo en muros de la alcoba 1. Se instaló la canal en lámina contigua a cubierta de fachada principal. En el área de baño se instaló el combo sanitario y la puerta. En la cocina quedaron instalados el lavaplatos y grifería. La vivienda presenta un avance del 94.10 %.
83	MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	En el área de alcoba 1 se estucaron muros y se instaló cerámica de piso. Se instaló guardaescoba cerámico en sala comedor y alcoba 1. Se aplica pintura vinilo en muros de sala comedor.
84	MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	Se pañetaron los muros de la alcoba 3Se elaboran alistados de pisos en áreas de ducha, lavandería, sanitario y cocina.
85	MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	Se instaló el lavadero. Se instaló el cielo raso pvc en áreas de sala comedor, baños, cocina, corredor de alcobas y alcobas 1, 2, 3. Se aplicó pintura vinilo sobre muros. Vivienda con avance del 97.8%.
86	MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	Se fundió mesón de cocina, se levantaron mochetas y se instaló lavadero. Se avanza en estuco de paredes de alcobas y hall de acceso. Se inició actividad de enchapes de pisos de hall de acceso y alcobas 1 y 2.

87	MVCB_3885	LILIANA NAYIBE GARZON CARDENAS	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
88	MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	Se terminan las actividades de estuco, pintura vinilo e instalación de cielo raso pvc en alcobas 1 y 2. En el área de cocina, se demolió el mesón y los enchapes antiguos; se funde entrepaño y se avanza en instalación de enchapes en piso y pared. En el baño se inician actividades de enchape de pared. Se desmontó el lavadero existente.
89	MVCB_4801	LUIS HERNANDO MARTINEZ LOZANO	VIVIENDA VALIDADA SIN APERTURAR. Beneficiario solicita intervención de cubierta.
90	MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	Se hicieron actividades de pintura vinilo sobre muros de alcobas 1, 2 y en sala comedor. En cocina se fundió área faltante de mesón y se avanza en actividades de enchapes. Se termina instalación de cerámica de piso en alcobas 1 y 2.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
54	MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	En el área de cocina se fundió el mesón, se enchaparon el piso y paredes. Se terminó el enchape de pisos en área de patio interior, alcoba 1 y hall de acceso. En el área del baño se adecuaron puntos hidrosanitarios, se elaboró el bordillo de ducha y se avanza en enchape de pisos y pared. Se afinan pañetes en muros de zona de patio interior.
81	MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	Se terminaron los pañetes de muros de la alcoba 4, comedor, cocina y lavandería. Se estucan muros de la alcoba 4. Se avanza en enchape de piso del comedor. Esta vivienda presenta atraso considerable en la ejecución de actividades.
82	MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	Se avanzó en pañete de hall de alcobas y filos de pañetes. Se inició pañete de hall de acceso. Se alista piso de sala. Se evidenció un mínimo avance en ejecución de actividades. Esta vivienda presenta un gran atraso.
BARRIO O TERRITORIO: JERUSALEN - POTOSI			
188	MVJE_1068	GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 3 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
189	MVJE_251	LUZ AMANDA BUITRAGO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 3 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
190	MVJE_380	JOSE JOAQUIN ZAMORA LEÓN	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 3 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
194	MVJE_022	PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 4 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
195	MVJE_1042	MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 4 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.
196	MVJE_174	LUZ STELLA SANCHEZ CORTES	VALIDACION DE LA VIVIENDA: El día 4 de noviembre de 2021, se efectuó visita por parte de personal técnico y social de la interventoría y del contratista con el fin de efectuar la validación de las actividades a priorizar en el inmueble. Se efectuaron mediciones de las diferentes áreas de la vivienda y se dejó registro fotográfico del estado inicial de las posibles áreas a intervenir. Se elaborará el presupuesto de acuerdo con las actividades priorizadas.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
En conjunto, residentes técnicos del contratista y la interventoría ajustaron presupuestos para validar nuevas actividades de mejoramiento necesarias para llevar a buen termino la terminación de las áreas proyectadas en las viviendas aperturadas y validadas.	Equipo técnico interventoría y contratista	8/11/2021
Se realizarán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas para efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras que se están ejecutando.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	8/11/2021
Estructurar presupuestos, aperturar viviendas validadas y continuar con la validación de viviendas en el barrio Potosí, sector Jerusalén.	Equipo técnico y social de interventoría y contratista	8/11/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Con el objeto que las áreas que se están interviniendo queden debidamente terminadas, se ajustaron los presupuestos de las viviendas que se encuentran en ejecución, sin sobrepasar los topes autorizados por la Entidad contratante.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

A la fecha se han entregado doce (12) viviendas en el barrio Juan Pablo II.

Durante este período se inició la validación de viviendas en el sector de Jerusalén, barrio Potosí; en el cual se hizo validación de seis (6) viviendas. Se tienen a la fecha un total de 34 viviendas validadas, de las cuales se han entregado doce (12). Se encuentran en ejecución catorce (14) viviendas: once (11) en el barrio Juan Pablo II y tres (3) en la urbanización Compartir. Hay dos (2) viviendas validadas que aún no se han aperturado, corresponden a mejoramiento de cubierta.

Los días 3 y 4 de noviembre se presentaron lluvias intensas en horas de la tarde en el sector de Jerusalén. En el barrio Juan Pablo II se presentó tiempo nublado.


Continúa el avance de las actividades proyectadas. Se estructuran presupuestos y se proyectaron actividades de mejoramiento en las viviendas validadas. Continúa el acopio de materiales para alistado de pisos y pañetes (arena y cemento), baldosa cerámica para enchapes de paredes y pisos, cielo raso de pvc.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVJE_1042 BARRIO POTOSI - JERUSALEN - VALIDACION

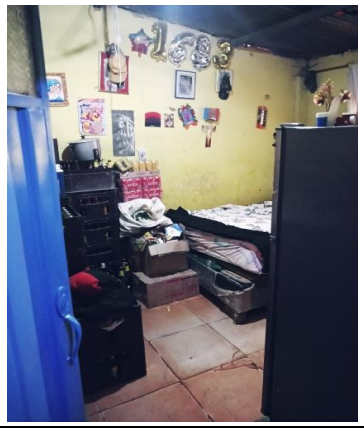


FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual alcoba 1	

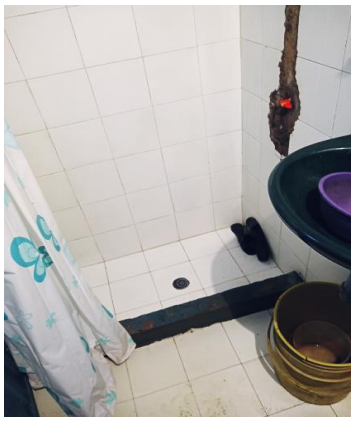


FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del baño	



FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la sala	

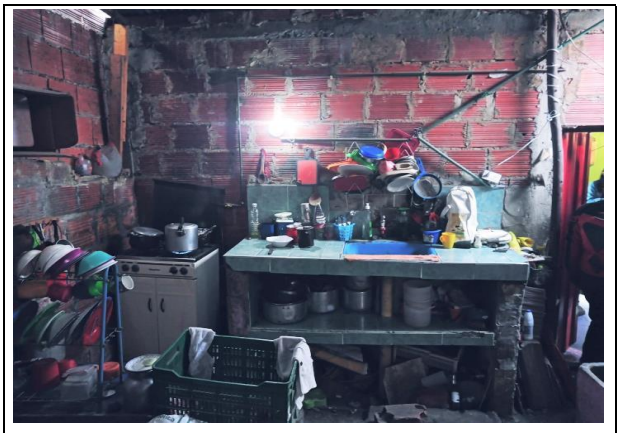

FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
Estado actual de la cocina	

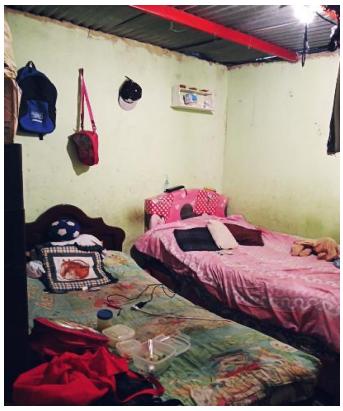


FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la alcoba 2	




FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual del corredor de alcobas	

REGISTRO FOTOGRAFICO


MVJE_022 BARRIO POTOSI - JERUSALEN - VALIDACION

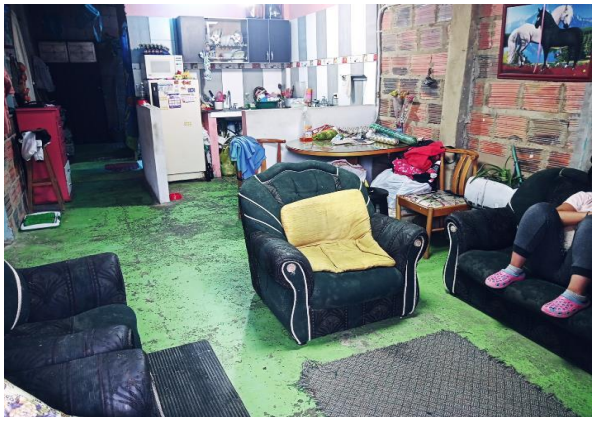

FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la sala comedor	

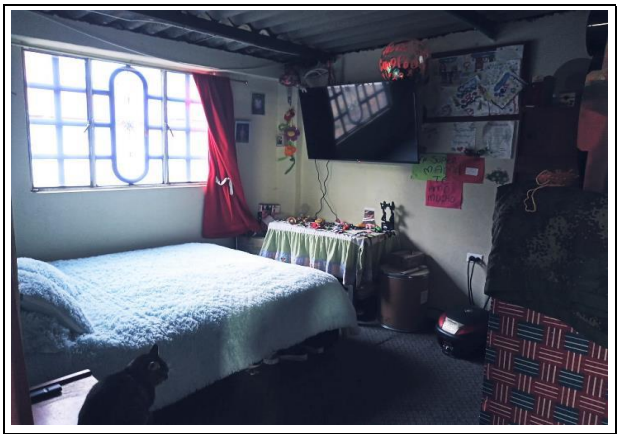


FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la alcoba 1	

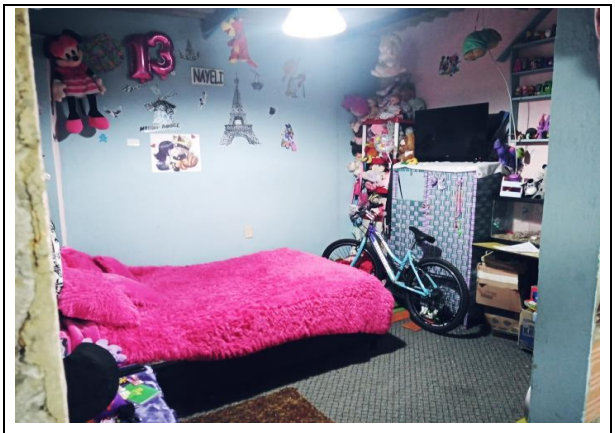

FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la alcoba 2	



FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
Estado actual de la alcoba 3	

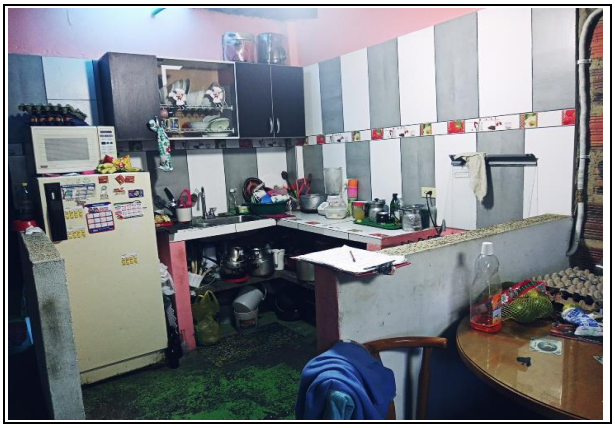

FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la cocina	



FECHA	jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCION	
Estado actual de la zona de lavandería	

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	7-nov-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 2	Juan Pablo II	25	63	25	0	10	12	9	4	68,60%	9
		Urbanizacion Compartir	2		2	0	0	2	0	0	42,50%	0
Técnico Responsable		Acacias	1		1	0	0	0	0	1	0,00%	0
		Potosi	31		3	28	0	0	0	31	0,00%	0
		Jerusalen	4		0	4	0	0	0	4	0,00%	0
Subtotal			**63**	**63**	**31**	**32**	10	**14**	**9**	**40**	**37,03%**	**9**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**NOVIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 1 AL7**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 12**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4892	KR 18N 68 04 SUR	JOSE VICTORIANO MORENO VELANDIA	SI / NO		$ 12.247.096,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

2	MVCB_4644	KR 18N BIS A 67C 41 SUR	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	SI / NO	$ 12.503.233,92	$ 12.077.142,10	**14/09/2021**	**12/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
3	MVCB_4629	CL 67C SUR 18N 25	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	SI / NO	$ 12.940.220,00	$ 11.724.531,40	**8/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_4628	CL 67C SUR 18N 29	JOSE ABELINO LEON	SI / NO	$ 12.124.137,35	$ 12.238.468,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_4272	CL 67C SUR 18N 28	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	SI / NO	$ 12.038.543,45	$ 11.377.892,80	**24/09/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	90,00%	**100,00%**
6	MVCB_4152	CL 67A SUR 18N 77	BEATRIZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.977.537,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
7	MVCB_4689	DG 68A SUR 18N 64	GLADYS ARIELA NIÑO UMAÑA	SI / NO		$ 10.906.100,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
8	MVCB_4694	KR 18P 67C 58 SUR	HORACIO DE JESUS TORRES	SI / NO	$ 11.015.175,4	$ 10.770.153,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_4744	KR 18P BIS 67C 33 SUR	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	SI / NO	$ 12.388.424,33	$ 12.024.568,50	**8/09/2021**	**7/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
10	MVCB_4732	CL 68 SUR 18P 70	DORIS GALVIS PATARROYO	SI / NO	$ 12.169.139,33	$ 12.003.602,50	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
11	MVCB_4233	KR 18 N BIS B 67 12 SUR	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	SI / NO		$ 11.841.207,00	21/09/2021		EN EJECUCION	90,00%	**96,00%**
12	MVCB_4219	KR 18N BIS A 66A 31 SUR	MAURICIO MARTIN BELTRAN	SI / NO		$ 10.652.916,00	21/09/2021		EN EJECUCION	99,00%	**99,00%**
13	MVCB_4401	KR 18N 65B 26 SUR	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	SI / NO	$ 12.302.471,90	$ 12.076.903,30	**6/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	99,00%	**100,00%**
14	MVCB_4407	KR 18M BIS A 65B 17 SUR	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	SI / NO		$ 12.052.125,10	21/09/2021		EN EJECUCION	90,00%	**95,00%**
15	MVCB_4929	KR 18N 65A 46 SUR	PEDRO PABLO SALAMANCA	SI / NO		$ 12.150.294,90	12/10/2021		EN EJECUCION	40,00%	**70,00%**
16	MVCB_4843	KR 18U 67C 56 SUR	MARISOL PALACIOS ANDRADE	SI / NO		$ 11.998.548,50	13/10/2021		EN EJECUCION	65,00%	**80,00%**
17	MVCB_4842	KR 18U 67C 41 SUR	GUILLERMO VALENCIA OYOLA	SI / NO		$ 11.934.657,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
18	MVCB_4838	CL 67C SUR 18U 05	YENNY ARLET AREVALO PACHON	SI / NO	$ 12.890.215	$ 11.606.673,70	14/10/2021		EN EJECUCION	75,00%	**90,00%**
19	MVCB_2243	KR 18 U 66 B 91 SUR	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	SI / NO			29/11/2021		EN EJECUCION	5,00%	**15,00%**
20	MVCB_3839	KR 18U 66B 87 SUR	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	SI / NO		$ 11.592.989,00	12/10/2021		EN EJECUCION	65,00%	**80,00%**
21	MVCB_3863	KR 18U 66B 58 SUR	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	SI / NO		$ 11.981.782,60	28/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**25,00%**
22	MVCB_3809	TV 18U BIS 66B 78 SUR	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	SI / NO	$ 12.140.338,03	$ 12.198.500,50	**21/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	60,00%	**100,00%**
23	MVCB_3803	TV 18U BIS 66B 83 SUR MJ	LUZ DARY SAENZ CAPERA	SI / NO		$ 11.854.190,20	15/10/2021		EN EJECUCION	40,00%	**55,00%**
24	MVCB_3798	TV 18U BIS 66B 53 SUR MJ	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	SI / NO		$ 12.205.262,30	22/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**40,00%**
25	MVCB_3822	TV 18U BIS 66B 12 SUR	SORY INES CORTES LOPEZ	SI / NO		$ 11.991.555,40	21/10/2021		EN EJECUCION	50,00%	**70,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
26	MVCB_1072	CL 65B BIS SUR 18N 62	FLORINDA CADENA NINO	SI / NO		$ 12.284.986,00	12/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**35,00%**
27	MVCB_0213	CL 65A BIS SUR 18N 75	JOSE LEONARDO SERRANO	SI / NO		$ 12.154.953,00	6/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**50,00%**
ACACIAS											
28	MVCB_4968	KR 18Q BIS 64B 20 SUR	LUCAS RAUL BELTRAN PRIETO	SI / NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**

POTOSI											
207	MVJE_065	Dg.79D SUR 45B 33	RASALBA TELLEZ	SI NO		$ 12.210.865,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
208	MVJE_184	DG 80 SUR 45 56	BLANCA ROCIO CASTIBLANCO	SI NO		$ 12.054.559,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
209	MVJE_545	CL 78A SUR 45-90	LADY ESPERANZA ACOSTA	SI NO		$ 12.228.327,90			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
210	MVJE_110	TV 44B 78A 55 SUR	RIGOBERTO OSMA ARMERO	SI NO		$ 12.172.503,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
211	MVJE_247	TV 44A 78A 93 SUR	WILLIAM HUMBERTO ARIAS	SI NO		$ 12.295.067,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
212	MVJE_233	CL 78A BIS SUR 44A 15	ODALINA ARDILA	SI NO		$ 11.411.665,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
213	MVJE_889	CL 80 SUR 44A 55	LUZ FANNY GARAY RAMOS	SI NO		$ 11.674.504,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
214	MVJE_402	CL 80A SUR 44A 72	LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS	SI NO		$ 12.279.329,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
215	MVJE_892	KRA 45 80 22 SUR	RUTH EDITH LEAL CRUZ	SI NO		$ 12.097.735,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
216	MVJE_136	CL 80A SUR 44A 43	JAIRO CORTEZ PINZON	SI NO		$ 12.265.385,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
217	MVJE_962	CL 80B 44A 43 SUR	RAUL MUÑOZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.924.304,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
218	MVJE_1148	CL 80B SUR 44A 57	LUIS EDUARDO JIMENEZ VERA	SI NO		$ 11.496.457,94			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
219	MVJE_985	CL 80B SUR 44A 63	ANGELA SUAREZ RAMOS	SI NO		$ 11.998.224,71			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
220	MVJE_295	CL 80B SUR 44A 69	HENRY GIRALDO	SI NO		$ 12.189.969,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
221	MVJE_1006	CL 81 SUR 44A 50	CAMPO ELIAS CUBIDES BALLEN	SI NO		$ 11.979.120,22			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
224	MVJE_957	CL 81 SUR 44A 63	LUZ STELLA AGUILERA	SI NO		$ 11.852.958,52			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
277	MVJE_1043	CL 82 SUR 44A 44	JOSE DE JESUS PEÑA	SI NO		$ 11.822.238,37			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
278	MVJE_984	CL 81A SUR 44A 49	CELMIRA BENITEZ CASTRO	SI NO		$ 11.851.859,29			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
279	MVJE_959	CL 82 SUR 44A 38	GLORIA AZUCENA DIAZ PINEDA	SI NO		$ 12.035.249,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
280	MVJE_968	CL 82 SUR 44A 25	OFELIA PUERTA ARIAS	SI NO		$ 11.997.042,97			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
281	MVJE_923	KR 44A 81A 17 SUR	DEICY PUERTAS ARIAS	SI NO		$ 11.702.906,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
282	MVJE_973	KR 44A 81A 03 SUR	MARGARITA CRUZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.901.509,52			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
283	MVJE_950	KR 44A 81A 26 SUR	ANA LUCIA BELTRAN	SI NO		$ 11.887.004,73			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
284	MVJE_953	CL 82 42 76 SUR	HERMELINDA AGUIAR DE GUTIERREZ	SI NO		$ 11.590.349,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
285	MVJE_948	CL 81A SUR 42 89	ERALDO PEÑA	SI NO		$ 11.530.769,53			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
286	MVJE_1015	KR 44A 80B 04 SUR	MARCO AURELIO GARCIA SALAZAR	SI NO		$ 11.919.926,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

287	MVJE_489	CL 79B SUR 42 81	LUIS ALBERTO CASTELLANOS	SI NO		$ 12.237.890,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
288	MVJE_440	CL 80 SUR 42-27	MARIA REINA DEL CARMEN ROMERO	SI NO		$ 12.128.732,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
289	MVJE_343	CL 80 SUR 42 45	ADOLFO SABOGAL HERNANDEZ	SI NO		$ 12.086.016,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
290	MVJE_204	CL 80B SUR 42 17	MARIA BLANCA AZUCENA SAENZ MONTAÑO	SI NO		$ 11.337.936,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
292	MVJE_441	CL 80 SUR 41 45	MARIA ALCIRA ZARATE	SI NO		$ 11.986.706,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

JERUSALEN											
206	MVJE_546	TV 45 # 77 - 36 SUR	RAMIRO GUZMAN BETANCOURT	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
222	MVJE_254	CL 81 SUR 44A 26	MARIA HILDA GUAQUETA GONZALEZ	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
223	MVJE_243	CL 81 SUR 44A 49	MARIA DE JESUS GARAVITO GARCIA	SI NO					SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
291	MVJE_222	CL 80 B SUR 42 10	MARIELA RODRIGUEZ BELTRAN	SI NO		$ 12.271.051,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	12	DEL	1/11/2021	AL	7/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

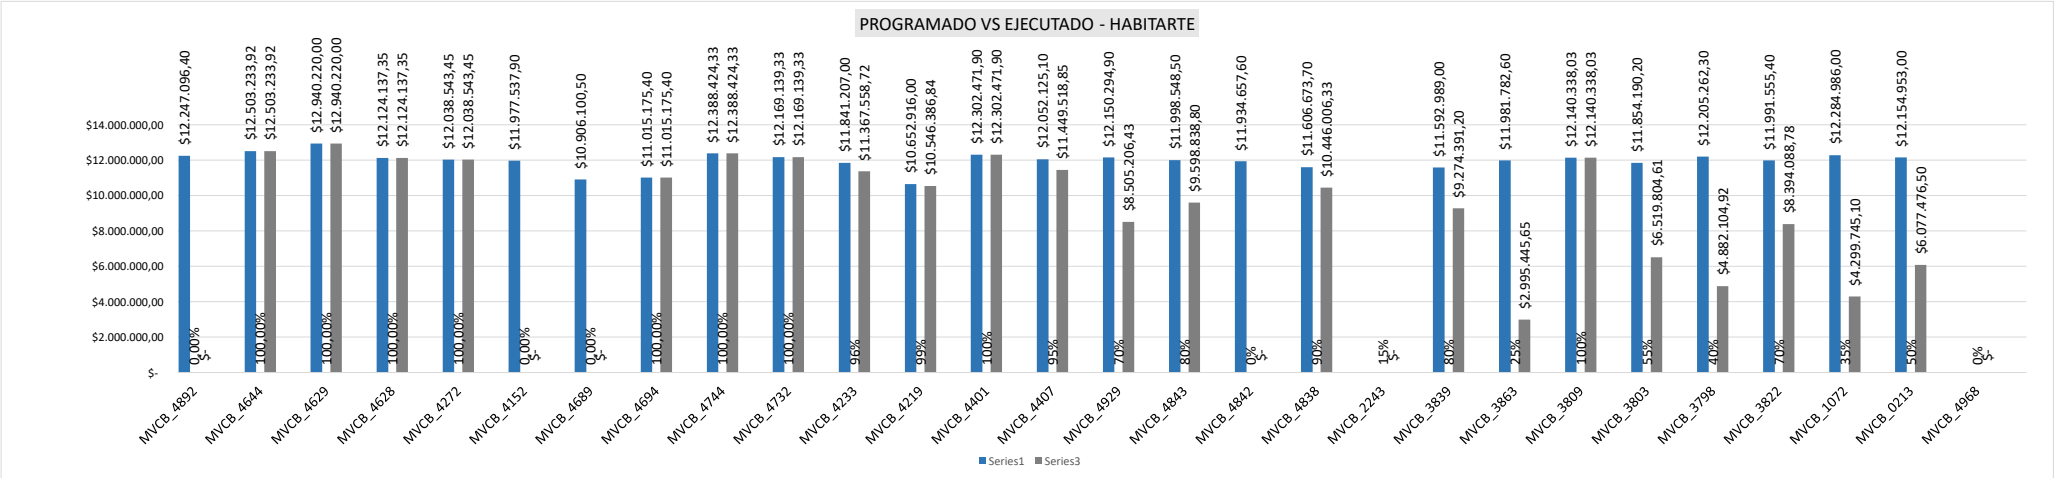

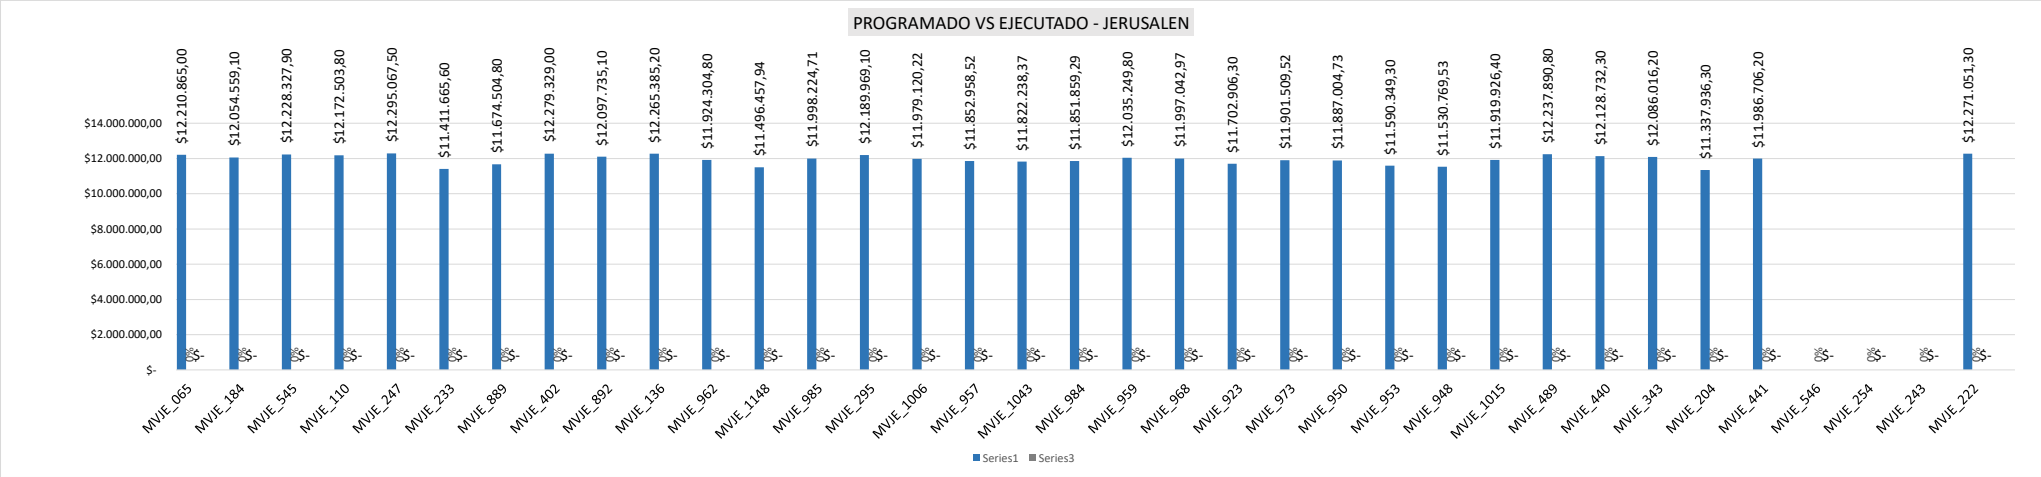

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB4892	Jose Victoriano Moreno Velandia	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
2	MVCB4272	Nieves Lizarazo Valbuena	El día 2 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado. El día 4 de noviembre, se realiza visita para ver si ya terminaron las observaciones realizadas para la entrega y no se han realizado **El día 5 de noviembre, se realiza entrega del predio a beneficiaria**
3	MVCB 4628	José Ebelio León	El día 4 de octubre se revisa el predio y falta instalar la puerta y detallar la cocina y cambiar pieza coca en mesón cocina. El día 5 de octubre se revisa el predio y se notifica al beneficiario que se realizara entrega el día siguiente. **Se realiza entrega del predio el 6 de octubre del 2021**
4	MVCB 4152	Beatriz Rodríguez	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
5	MVCB 4694	Horacio Jesús Torres	El día 4 de octubre se visita predio falta la llegada de la puerta, ducha y es necesario realizar unos remates en cocina, zona de ropas y alcoba de hija de beneficiario. El día 5 de octubre se realiza la instalación de puerta y se detallan las partes solicitadas. **El día 6 de octubre se realiza entrega del predio a hija del beneficiario.**
6	MVCB 4689	Gladys Ariela Niño Umaña	Predio de intervención de cubierta esperando aprobación del Hábitat
7	MVCB 4744	Álvaro Zubieta Tunjano	El día 4 de octubre se revisa el predio y se realizan unos requerimientos al contratista para dar por terminadas las actividades. El día 5 de octubre se realiza visita al predio con el director de la interventoría para solicitar calidad en los terminados de la obra ya que el contratista no cumple con los requerimientos del residente de interventoría El día 6 de octubre se inician las reparaciones solicitadas al constructor por parte de interventoría. **El día 7 de octubre se realiza entrega del predio a la hija del beneficiario**
8	MVCB 4732	Doris Galvis Patarroyo	El día 19 de octubre se instala puerta de baño y se realiza boquilla de mesón en cocina e instalación de lavaplatos. **El día 19 de octubre se entrega predio a la beneficiaria**.

9	MVCB 4629	José Andrés Jiménez Rodríguez	El día 19 de octubre, en espera de llegada de puerta y detalles de acabados en baño y cocina . El día 20 de octubre, en espera de llegada de puerta. El día 21 llega la puerta y se instala **El día 22 de octubre se entrega el predio a beneficiario**
10	MVCB 4644	José Alirio Torres Ávila	El día 11 de octubre se visita el predio para mirar los remates de cocina; se evidencian dos piezas de enchape de mesón cocas, acero que se ve en la parte inferior del mesón, se solicita realizar pañete en esa área y ajuste de puerta ya que esta muy forzada para cerrarla. **El día 12 de octubre se realiza entrega del predio al beneficiario**.
ETAPA II			
11	MVCB 4219	Mauricio Martin Beltrán	El día 2 de noviembre, se realiza visita al predio pero no se encuentra el beneficiario. El día 4 de noviembre, nos recibe el beneficiario manifestando su inconformidad con respecto a la poceta de la ducha que el piso no quedo con pendiente y de que la silicona del platero ya se despego y se le esta filtrando el agua del mesón por todo el borde del platero. Manifiesta su inconformidad con el maestro y con los residentes de la constructora e interventoría; se le informa que los residentes no pueden estar 100% en un predio y además que no pueden todo el tiempo pendientes de los niveles de piso, que se le coloco en el predio uno de los mejores maestros con los que cuenta este proyecto y que las fallas son humanas y se realizaran las correcciones necesarias. El día 5 de noviembre, se regresa con el maestro para realizar el cambio de piso en poceta ducha y arreglo de platero en cocina. Se solicita al Director de interventoría los requisitos para la entrega unilateral ya el beneficiario continua manifestando su descontento con el maestro, residentes de constructora e interventoría.
12	MVCB 1072	Florinda Cadena Niño	El día 2 de Noviembre, se realiza visita al predio y no se encuentra maestro realizando actividades. El día 3 de noviembre se retoman actividades en el predio, realizando alistado de piso en baño, zona de ropas y alcoba segundo nivel El día 4 de noviembre se realiza alistado de piso en las dos alcobas del primer nivel de la casa.
13	MVCB 4407	Gloria Stella Alarcón Bautista	El día 2 de noviembre se solicita al constructor terminar con pintura y estuco la parte del fondo del mesón cocina lo mismo que las paredes, adicionalmente se informa que la residente de interventoría no acepta la puerta ya que llego mas pequeña para el vano. El día 5 de noviembre llega al predio la nueva puerta y se solicita arreglo en el cielo raso de la alcoba de la mamá de la beneficiaria.
14	MVCB 4401	Gustavo Martínez Prieto	**El dia 2 de Noviembre se realiza acta de entrega del predio al beneficiario**
15	MVCB 4929	Pedro Pablo Salamanca	El día 2 de noviembre se realiza revisión del enchape de la cocina y zona de ropas solicitando arreglo de win en mesón cocina y piso de zona de ropas. Continua la actividad de pañete muros en área de sala segundo piso. El día 4 de Noviembre se recuerda el compromiso del cambio del win mesón de cocina y zona de ropas y se solicita al constructor instalar los pedazos de teja de asbesto cemento quitadas ya que si llueve de occidente a oriente se va entrar el agua a la alcoba del beneficiario. El día 5 de noviembre se solicita no amarrar las tejas solo con el alambre sino colocar el tapón de la gotera, continua alistado de piso en cocina del segundo piso e inicia la actividad de enchape muros, El beneficiario informa que la puerta no cierra. Se solicita limpieza en ella, para ver si es a causa de alguna partícula de cemento que le impide que cierre . .
16	MVCB 0213	José Leonardo Serrano	El día 2 de noviembre se termina enchape de piso en alcoba y enchape de piso de paredes en cocina. Se inicia enchape de piso en sala. El día 4 de noviembre enchape de piso en área de taller y se define la boca puerta para la entrada del taller. El día 5 de noviembre se realiza el alistado de piso en zona de ropas y mesón cocina entrepaño inferior
17	MVCB 4233	Beatriz Corredor Runsique	El día 2 de noviembre se instala incrustaciones de baño y puerta de baño. El día 4 de noviembre se realiza estucado muros de baño y alcoba principal y balcón. El día 5 de noviembre se inicia actividad de lija de muros estucados.
18	MVCB 4843	Marisol Palacios Andrade	El día 2 de noviembre, se realiza estuco muros alcoba 2 y alistado de piso en alcoba 1. El día 4 de noviembre se inicia actividad de enchape piso en alcoba y se presentan serios problemas de filtración de aguas lluvias de la placa, adicionalmente la beneficiaria empieza intervención de cubierta en el segundo piso
19	MVCB 2243	Héctor Eustagio López Cuadrado	El día 2 de noviembre continua actividad de pañete muros en alcoba. El día 4 de noviembre, inicia pañete muros en el hall
20	MVCB 4842	Guillermo Valencia Oyola	El día 23 de septiembre se realiza validación del predio

21	MVCB 4838	Yenny Arlet Arévalo	El día 2 de noviembre, se terminan actividades de enchape y se inicia cielo raso en el primer piso. El día 4 de noviembre continua actividad de cielo raso en primer piso y falta que llegue la puerta
22	MVCB 3839	José Olivo Cuadrado	El día 2 de Noviembre se realiza actividad de estuco muros en alcoba 2 y se realiza alistado de piso en hall, que faltaba. El día 4 de noviembre se inicia enchape de piso en alcoba 1 y estructura del cielo raso para techo.
23	MVCB 3863	Fabio Rodríguez	El día 2 de noviembre, se realiza rayado de piso y estuco de muros. El día 4 de noviembre se inicia actividad de alistado de piso
24	MVCB 3809	Isabel Ibáñez Álvarez	El día 2 de noviembre se termina la actividad de enchape de piso y se esta instalando cielo raso en hall y comedor. Continua la actividad de estuco de muros todo el predio. El día 4 de noviembre se terminan las actividades y en espera de la llegada de la puerta y acabados con silicona en el cielo raso **El día 5 de noviembre se realiza acta de entrega**
25	MVCB 3803	Luz Dary Sáenz Capera	El día 2 de noviembre no se realizan actividades en el predio. El día 4 de noviembre se termina actividad de enchape piso en sala y se inicia la mampostería de mochetas de lavadero
26	MVCB 3798	María Aliria Medina de Beltrán	El día 2 de noviembre se realiza estuco de muros en alcoba 1 y cocina. El día 4 de noviembre, se termina enchape de piso en cocina de alcoba, alcoba y hall.
27	MVCB 3822	Sory Inés Costes López	El día 2 de noviembre se termina enchape de piso en cocina, zona de ropas, cocina y comedor. Se solicita arreglos del win de mesón de cocina. El día 4 de noviembre se inicia alistado de piso en la sala
28	MVCB 4968	Lucas Raúl Beltrán Prieto	El 21 de Septiembre se realiza validación del predio
POTOSI			
29	MVJE 545	Lady Esperanza Acosta	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio
30	MVJE402	Lenis Guimar Giraldo Lancheros	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio
31	MVJE 233	Odalina Ardila	El día 3 de Noviembre, se realiza validación del predio

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La actividad de la alcaldía programada para el 6 de noviembre queda suspendida, por parte de la alcaldía	Hábitat, constructora e interventoría	11/06/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Barrio o Territorio estado del Tiempo :

El día Martes 2 de noviembre día , no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Miércoles 3 de noviembre mañana nublada, lluvias 10:30am 11:00am y tarde sin lluvias. No reporta actividades paralizadas por estado de tiempo .

El día Jueves 4 de noviembre día soleado en la mañana tarde de lluvias, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

El día viernes 5 de Noviembre mañana de lluvias y tarde despejada, no reporta actividades paralizadas por estado de tiempo

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	**7-nov-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020					
Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.					
Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validación**			**Ejecución**				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable		JUAN PABLO II	9	59	9	0	6	0	9	0	100,00%	9
		UNIR	50		21	29	0	13	3	34	15,11%	3
Técnico Responsable	GRUPO 3											
Subtotal			**59**	**59**	**30**	**29**	0	**13**	**12**	**34**	**57,56%**	**12**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	**NOVIEMBRE**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 1 AL 7**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 12**
BARRIO JUAN PABLO II											
1	MVCB_4754	KR 18Q 67C 14 SUR	ALBERTO HUESO	SI / NO		$ 11.152.685,90	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
2	MVCB_4751	KR 18Q 67C 34 SUR	MARIA LIGIA SOTO AVILA	SI / NO	$ 12.975.027,15	$ 11.211.390,00	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

3	MVCB_3311	DG 68A SUR 18Q 18	MIYO FIGUEROA ROJAS	SI NO	$ 12.978.940,00	$ 11.927.560,50	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_3353	KR 18Q 68B 07 SUR	ALCIRA MONGUI OCHOA	SI NO	$ 12.616.698,00	$ 12.087.004,90	**8/09/2021**	**11/10/20211**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_3351	DG 68B SUR 18Q 37	YAMILETH MARTINEZ	SI NO	$ 12.978.942,00	$ 12.289.771,00	**10/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_3327	DG 68 B SUR 18 Q 36	YESIKA LORENA TELLEZ	SI NO		$ 11.970.900,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_3329	KR 18Q BIS B 68A 44 SUR	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	SI NO		$ 12.063.817,50	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_3191	KR 18Q BIS B 68A 23 SUR	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	SI NO	$ 12.086.766,49	$ 12.059.809,40	**10/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_3360	KR 18Q BIS B 69 34 SUR	MYRIAM JIMENEZ	SI NO	$ 9.725.095,00	$ 9.602.199,70	**9/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
BARRIO UNIR II											
10	MVUN_486	CL 76 117 02	EDUARDO MELO ESPITIA	SI NO		$ 11.218.588,40			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
11	MVUN_484	KR 118 76A 23	PEDRO IGNACIO PLAZAS	SI NO		$ 9.707.226,00	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	49,63%	**57,06%**
12	MVUN_480	KR 118 76 23	PETER STEFANN PEREZ ROBERTO	SI NO		$ 11.075.582,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
13	MVUN_106	KR 118 76 15	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	SI NO		$ 12.538.076,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVUN_464	KR 119 76A 02	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	SI NO		$ 10.814.060,70	7/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	64,83%	**67,98%**
15	MVUN_424	CL 76A 119- 07	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	SI NO		$ 9.765.458,80	27/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	1,84%	**24,30%**
16	MVUN_469	CL 75 119 26	JUVENAL MELO PINZON	SI NO		$ 11.422.010,10	**7/10/2021**	**4/11/2021**	ENTREGADA	80,38%	**100,00%**
17	MVUN_099	CL 75 119 30	FERNANDO MORENO MARIÑO	SI NO		$ 11.764.713,90	**13/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	80,82%	**100,00%**
18	MVUN_478	KR 119C 76A 04	HECTOR ORLANDO TOCA BAUTISTA	SI NO		$ 12.149.324,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
19	MVUN_171	CL 74 A 119 C 02	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	SI NO		$ 11.150.820,20	**7/10/2021**	**4/11/2021**	ENTREGADA	90,49%	**100,00%**
20	MVUN_588	KR 120B 76 12	AMIRA PEREZ CORTES	SI NO		$ 11.271.883,80	27/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	2,04%	**14,90%**
21	MVUN_372	CL 74 B 120A 26	JENNY MARCELA GUERRERO	SI NO		$ 11.702.890,70			RENUNCIA	0,00%	**0,00%**
22	MVUN_017	CL 76 B 120 A 65 MJ 1	DORIS RAMOS TORRES	SI NO		$ 11.814.427,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
23	MVUN_241	KR 121 76 11	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	SI NO		$ 11.935.867,00	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	25,00%	**27,44%**
24	MVUN_115	KR 122 76 30	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	SI NO		$ 11.768.059,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
25	MVUN_128	KR 123 76 21 MJ 1	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	SI NO		$ 9.870.988,30	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	27,89%	**36,73%**
26	MVUN_238	KR 124A 76 18 MJ 1	ALIRIO CONTRERAS	SI NO		$ 11.097.935,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
27	MVUN_182	CL 76 127 06 MJ	NYDIA BUSTOS LOPEZ	SI NO		$ 9.167.373,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
28	MVUN_299	KR 125A 73 44	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	SI NO		$ 11.692.638,60	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	44,56%	**49,94%**
29	MVUN_295	KR 125 73 27	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	SI NO		$ 11.828.107,30	14/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	45,09%	**59,86%**

30	MVUN_290	KR 124A 73 09 MJ 1	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	SI NO		$ 11.317.173,00	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	17,61%	**29,38%**
31	MVUN_173	KR 124A 73 16 MJ 1	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	SI NO		$ 10.711.089,20	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	15,05%	**19,27%**
32	MVUN_174	KR 124A 73 32 MJ 1	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	SI NO		$ 10.959.600,90	15/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	15,00%	**39,50%**
33	MVUN_132	KR 124 73 04 MJ 1	GRACIELA ESPITIA MORALES	SI NO		$ 10.782.895,00	27/10/2021	0/01/1900	EN EJECUCION	1,89%	**9,45%**
34	MVUN_276	KR 123A 73 48	GONZALO MARTINEZ GONZALEZ	SI NO		$ 11.519.677,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
35	MVUN_222	KR 122B 73 65	RAFAEL ANTONIO MOYA MORENO	SI NO		$ 11.396.789,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
36	MVUN_770	KR 122 73A 37	JOSE YECID LAVERDE NIETO	SI NO		$ 11.822.895,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
37	MVUN_366	KR 122 73A 14 MJ 1	JANNETTE ESQUIVIA CORTES	SI NO		$ 11.675.371,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
38	MVUN_151	KR 122 73 - 08 MJ 1	SANDRA VIRGINIA CARDENAS CONTRERAS	SI NO		$ 11.829.540,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
39	MVUN_334	KR 121 73 26	JULIO DIAZ TORRES	SI NO		$ 11.670.613,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
40	MVUN_332	KR 120 D 73 21	PATRICIA POSSO PORTOCARRERO	SI NO		$ 11.806.152,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
41	MVUN_374	KR 120C 73 11	MARIA DEL CARMEN PALACIO LOPEZ	SI NO		$ 11.829.952,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
42	MVUN_398	KR 120C 73 23 MJ 1	TIOVANIS NAVARRO PALLARES	SI NO		$ 11.731.394,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
43	MVUN_397	KR 120B 73 35	GEMA ISABEL TOCASUCHE LEON	SI NO		$ 8.978.308,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
44	MVUN_492	CL 73A 120B 10	MARIA CRISTINA HURTADO MOSQUERA	SI NO		$ 11.820.169,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
45	MVUN_196	KR 120C 73A 10	FRANCY ALIETH CUBILLOS QUEVEDO	SI NO		$ 11.782.341,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
46	MVUN_379	KR 120 B 73A 38	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	SI NO		$ 10.105.363,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
47	MVUN_146	KR 120A 73A 36	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	SI NO		$ 11.042.062,90			EN EJECUCION	1,88%	**19,84%**
48	MVUN_218	CL 74 119C 36	ALBA RORY MURCIA CASTIBLANCO	SI NO		$ 10.752.771,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
49	MVUN_160	CL 74 119 C 15	HERNANDO ROJAS RINCON	SI NO		$ 11.809.249,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
50	MVUN_187	CL 73A 120 19 MJ 1	DAVID ESTIBEN GUEVARA CEPEDA	SI NO		$ 9.488.318,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
51	MVUN_443	KR 120 BIS 73 06 MJ 1	JORGE ELIECER MORENO SALAMANCA	SI NO		$ 11.774.547,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
52	MVUN_405	KR 120 73A 10	NELSON ERNESTO ALFONSO RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.045.077,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
53	MVUN_201	KR 119B BIS 73 07 MJ 1	PEDRO PABLO MARTINEZ SANCHEZ	SI NO		$ 11.851.113,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
54	MVUN_186	KR 119 A 73 05 MJ 1	MARGARITA ALFONSO MORENO	SI NO		$ 11.791.211,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
55	MVUN_208	KR 119C 73A 06 MJ 1	ROSALBA COTRINA CAÑAS	SI NO		$ 11.943.813,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
56	MVUN_205	KR 119B 73C 19	MARIA DELIA GUAPO VANEGAS	SI NO		$ 11.734.693,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
57	MVUN_166	KR 119B 73C 35	OLGA LUCIA VEGA RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.933.423,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
58	MVUN_416	CL 74 A 119 11 MJ 1	RICARDO CARDENAS GARCIA	SI NO		$ 11.633.167,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
59	MVUN_391	CL 75 118 21	IMELDA RODRIGUEZ	SI NO		$ 8.950.926,60			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**	INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

FECHA		**PERIODO No.**	12	DEL	**1/11/2021**	AL	**7/11/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

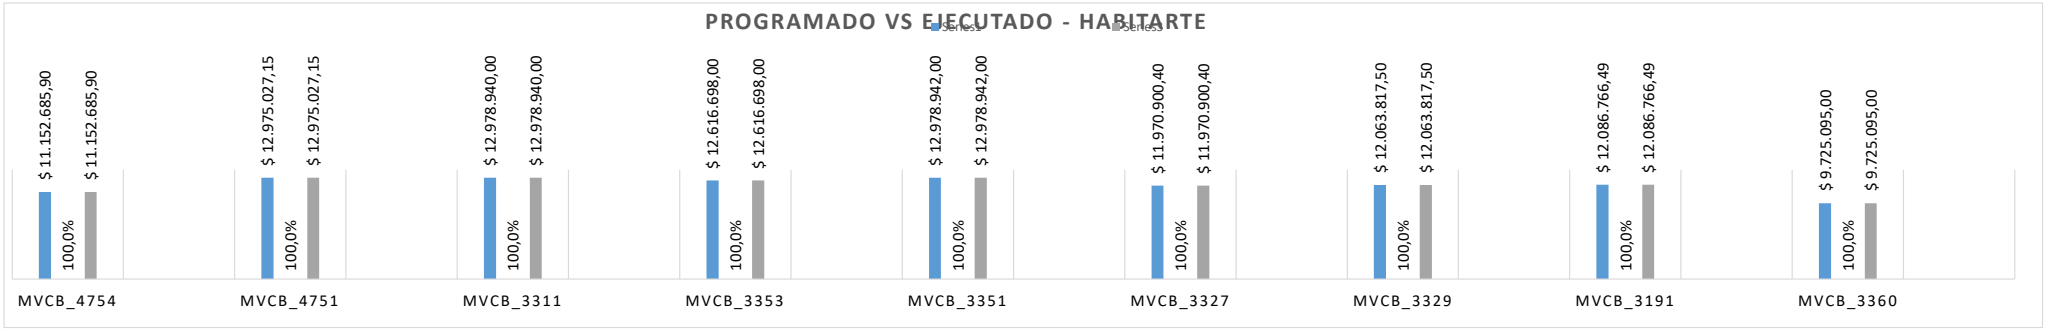

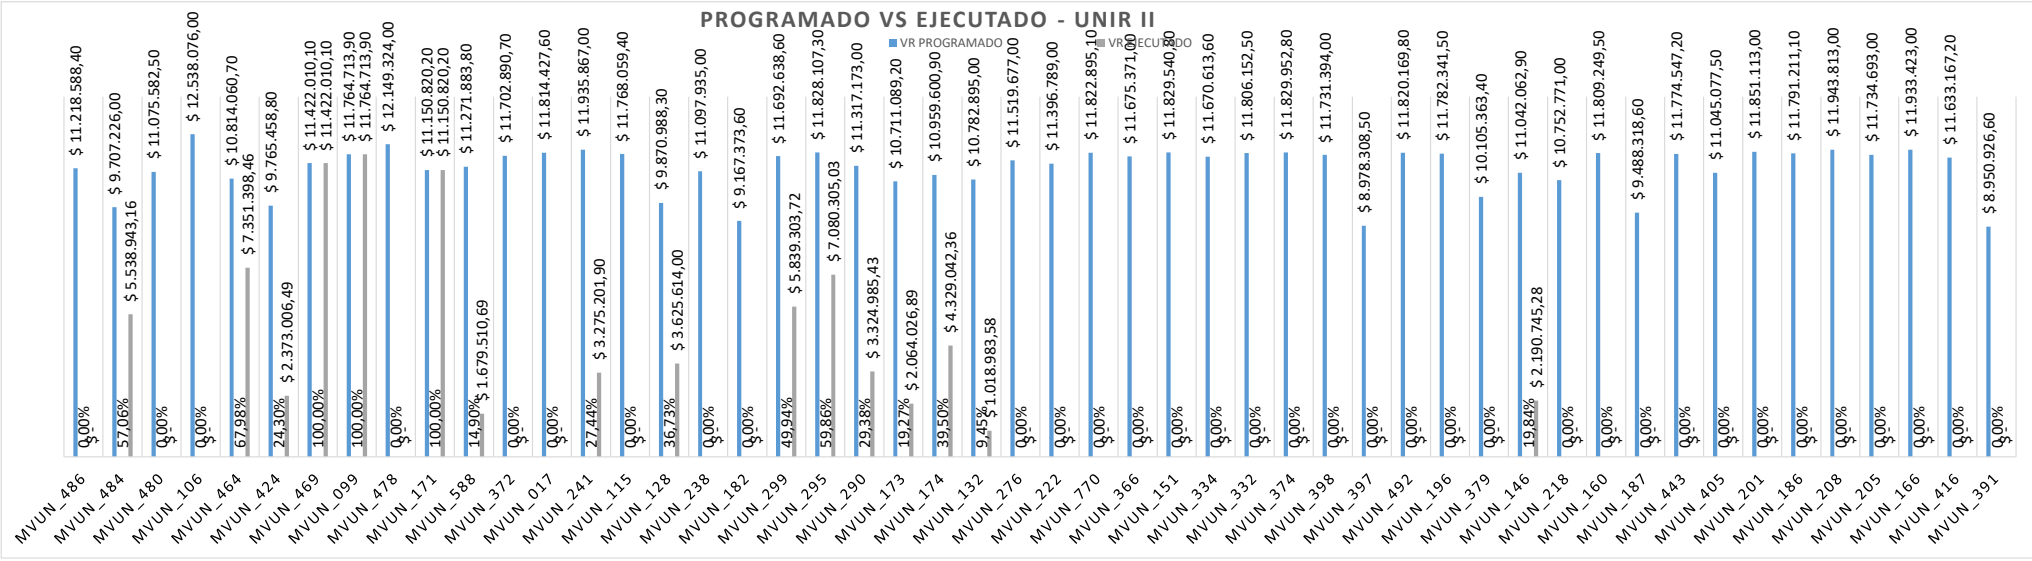

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR			
1	MVCB_4754	ALBERTO HUESO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
2	MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
3	MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
4	MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
5	MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.

6	MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
7	MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
8	MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
9	MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
BARRIO O TERRITORIO: UNIR II			
10	MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para Area de cocina y Meson formato 20 x 30 o similar.Se inicia con la instalacion de Cieloraso en PVC,Enchape de piso ceramico trafico Formato 60 x 60 o similar
11	MVUN_106	CANDE DE JESUS ESPITIA LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
12	MVUN_464	TERESITA DEL NIÑO JESUS GALVIZ HENAO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Enchape pared en ceramica rectificada para Area de cocina y Meson formato 20 x 30 o similar asi mismo en Area de Baño ,aplicación de Estuco y Pintura en Habitaciones,
13	MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	Se realiza visita Tecnica-Social en la cual se evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4 y Estuco sobre pañete muros.
14	MVUN_171	JUVENAL MELO PINZON	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
15	MVUN_469	FERNANDO MORENO MARIÑO	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
16	MVUN_099	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	Se realiza visita Tecnica-Social Se realiza Entrega de Vivienda a conformidad del Beneficiario ejecutando en su totalidad las actividades dadas en el Presupuesto de Obra.
17	MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se Evidencia actividades de Estuco sobre pañete muros.
18	MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda

19	MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria
20	MVUN_115	TERESA DE JESUS CHACON SANCHEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
21	MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4.Estuco sobre pañete muros
22	MVUN_238	ALIRIO CONTRERAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para posible ejecucion de Cubierta.
23	MVUN_182	NYDIA BUSTOS LOPEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
24	MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Alistado de piso en mortero 1:4.Estuco sobre pañete muros
25	MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria,Estuco sobre pañete muros
26	MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Estuco sobre pañete muros Area Social y Habitaciones,
27	MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	Se realiza visita Tecnica-Social para apertura de las actividades y se da a conocer el PPTO
28	MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia las actividades de Estuco sobre pañete en Habitaciones,Alistado de piso en mortero 1:4
29	MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	Se realiza visita Tecnica-Social en al cual se evidencia actividades de Demolicion de Piso ceramico Area Cocina,
30	MVUN_379	CAROLINA MALDONADO BELTRAN	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la conciliacion con el beneficiario para actividades previas a la ejecucion.
31	MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se evidencia actividades de Pañete sobre mamposteria

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
En conjunto con el contratista y la interventoría se elaborarán los respectivos presupuestos iniciales de obra de las vivienda que se validen. Se harán visitas de seguimiento a las viviendas aperturadas, para inspeccionar y efectuar el control y seguimiento al avance y calidad de las obras proyectadas.	Residentes de interventoría y de contratista	29/10/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se realiza visita Tecnica-Social para Realizar Renuncia formal al Programa de Mejoramiento de Vivienda .Esta renuncia se presenta en el MVUN_372
Se a determinado en conjunto con el Contratista cada una de las actividades priorizando areas terminadas y viabiliazando areas Primarias
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
En cada validación ejecutada en la semana es de vital importancia determinar condiciones de vulnerabilidad como hacinamiento, ausencia de servicios públicos, problemas de salud asociados a carencias en saneamiento básico, carencias de pisos, cubiertas, deficiencias constructivas, entre otras que permitan justificar y fijar una línea base del problema a abordar a través del proyecto de Mejoramiento de Vivienda
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha	7-nov-21

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	13301160101000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución				
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	GRUPO 4	Juan Pablo II	26	64	26	0	11	8	16	2	77,58%	16
		Urbanización compartir	2		2	0	1	1	1	0	92,50%	1
Técnico Responsable		Jerusalén	13		4	9	0	0	0	13	0,00%	0
		Potosí	23		6	17	0	0	0	23	0,00%	0
Subtotal			**64**	**64**	**38**	**26**	**12**	**9**	**17**	**38**	**42,52%**	**17**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL

Proyecto Ciudad Bolívar				FASE I			Tiempo Programación			ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES	NOVIEMBRE
											SEMANA DEL 1 AL 7
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 12**
BARRIO JUAN PABLO II ETAPA 1											
1	MVCB_2244	TV 18R BIS A 69 76 SUR	Carmen Concepción Lopez García	SI / NO	$ 12.978.390,83	$ 12.079.596,40	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
2	MVCB_2242	TV 18R BIS A 69 92 SUR	Aura Nelly Figueroa	SI / NO	$ 12.460.609,4	$ 11.947.615,50	**8/09/2021**	**5/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
3	MVCB_2411	TV 18R BIS A 69 33 SUR	María del Carmen Lopez	SI / NO		$ 12.032.573,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

4	MVCB_2413	TV 18R BIS A 69 41 SUR	María Concepción Lombana Jimenez	SI / NO	$ 12.636.225,99	$ 12.169.719,00	**8/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_2414	TV 18R BIS A 69 47 SUR	Luis Adolfo Torres Sanchez	SI / NO	$ 12.978.434,15	$ 12.149.156,80	**27/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	68,00%	**100,00%**
6	MVCB_2376	TV 18T BIS A 68 70 SUR	Aura Elena Ramos Restrepo	SI / NO	$ 12.516.986,46	$ 11.701.628,10	**9/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2355	TV 18U 68 21 SUR	Ana Otilia Barreto León	SI / NO	$ 12.253.349,05	$ 11.769.775,40	**7/09/2021**	**6/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
8	MVCB_2278	KR 18V BIS 68 30 SUR	Luz amparo Naranjo Aguirre	SI / NO	$ 12.978.808,77	$ 11.326.716,60	**7/09/2021**	**11/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
9	MVCB_2277	KR 18V BIS 68 38 SUR	Carmenza Flores Galban	SI / NO	$ 11.473.441,99	$ 11.528.955,20	**7/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
10	MVCB_4175	CL 67 SUR 18N 76	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.792.129,40	11/10/2021		EN EJECUCION	48,00%	**78,00%**
11	MVCB_4185	TV 18N BIS B 66D 05 SUR	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.676.457,80	**5/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
12	MVCB_4188	CL 66 D SUR 18N 70	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	SI / NO		$ 12.027.750,70	11/10/2021		EN EJECUCION	24,00%	**43,00%**
13	MV_42886-IDU	KR 18P BIS A 66A 28 SUR	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	SI / NO		$ 12.884.127,60			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
14	MVCB_4198	KR 18P BIS A 66A 10 SUR MJ	LUCIO CIFUENTES VEGA	SI / NO		$ 11.678.378,50	12/10/2021		EN EJECUCION	15,00%	**50,00%**
15	MVCB_4072	KR 18Q BIS 66B 62 SUR	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	SI / NO		$ 11.386.359,00	**30/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
16	MVCB_4085	KR 18 Q 66 D 13SUR	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	SI / NO		$ 11.687.008,20	**11/10/2021**	**5/11/2021**	ENTREGADA	85,00%	**100,00%**
17	MVCB_4096	KR 18Q 66A 24 SUR	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	SI / NO		$ 11.887.405,00	11/10/2021		EN EJECUCION	54,00%	**71,00%**
18	MVCB_4867	CL 67C SUR 18U 73	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	SI / NO	$ 12.978.495,17	$ 11.878.089,50	**20/09/2021**	**15/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
19	MVCB_3793	KR 18V 66B 58 SUR	WILSON REINEL MORA CAICEDO	SI / NO	$ 12.978.659,81	$ 11.904.933,20	**20/09/2021**	**14/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
20	MVCB_3752	KR 18V 66B 17 SUR	JESUS ANTONIO LOPEZ	SI / NO	$ 1.297.826,00	$ 11.888.710,30	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
21	MVCB_3773	KR 18V BIS 66B 30 SUR	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	SI / NO		$ 12.028.047,20	**29/09/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
22	MVCB_3771	CRA 18 V BIS 66 B 42 SUR	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	SI / NO		$ 11.991.549,20	29/09/2021		EN EJECUCION	72,00%	**90,00%**
23	MVCB_3748	KR 18V BIS 66B 47 SUR	ANA CECILIA CAMACHO	SI / NO		$ 11.196.334,10	2/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_3721	KR 18W 66A 32 SUR MJ	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	SI / NO		$ 11.992.608,00	29/10/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
25	MVCB_3706	KR 18V BIS 66C 11 SUR	MARISOL VARGAS RAMIREZ	SI / NO		$ 12.424.274,80	6/10/2021		EN EJECUCION	48,00%	**85,00%**
26	MVCB_3703	KR 18W 66C 12 SUR	HILDA VARGAS GRANADOS	SI / NO		$ 11.825.187,60	**29/09/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

URBANIZACION COMPARTIR											
27	MVCB_0660	CL 65B BIS SUR 18V 40	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	SI / NO	$ 12.978.809	$ 11.547.979,00	**30/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
28	MVCB_0666	CL 65B BIS SUR 18V 76	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	SI / NO		$ 10.062.877,30	14/10/2021		EN EJECUCION	34,00%	**85,00%**

BARRIO JERUSALÉN											
233	MVJE_572	KR 44 78 72 SUR	FABIOLA GARCIA DURAN	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
235	MVJE_358	KR 43 78 SUR 48 CASA 1	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
236	MVJE_604	KR 43 78 46 SUR CASA 2	VIVIANA BOHORQUEZ	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
238	MVJE_429	CRA 43 # 78 - 15 sur	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
240	MVJE_574	CR 44 77 37 SUR	LUÍS ARMANDO SANABRIA	SI NO						0,00%	**0,00%**
294	MVJE_319	CL 80 B SUR 41 03	MANUEL FONSECA ALVAREZ	SI NO						0,00%	**0,00%**
300	MVJE_559	DG 79A SUR 40-50	DORIS ROCIO GUAYACAN BERNAL	SI NO						0,00%	**0,00%**
301	MVJE_557	DIAG 79 SUR- # 40-21	JOSE JULIAN ROJAS	SI NO						0,00%	**0,00%**
302	MVJE_561	DG 79 A SUR 40 08	MARIA GLORIA CASTAÑEDA	SI NO						0,00%	**0,00%**
304	MVJE_162	CRA 40 78 B 03 SUR	ELIAS OSPINA FRANCO	SI NO						0,00%	**0,00%**
306	MVJE_400	CL 79A SUR 38 10	MARIA FLORALBA DAVID ERAZO	SI NO						0,00%	**0,00%**
308	MVJE_453	CL 78A SUR 38 44	MERLY BELTRAN AGUDELO	SI NO						0,00%	**0,00%**
310	MVJE_581	CALLE 78 SUR 39 40	JAIME DONCEL CASILIMAS	SI NO						0,00%	**0,00%**

BARRIO POTOSÍ											
225	MVJE_275	TV 44A 78A 34 SUR	DIANA BELEN HERNANDEZ	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
226	MVJE_032	TV 44 BIS 78 53 SUR	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
227	MVJE_011	TV 44 BIS 79-17 SUR	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
228	MVJE_010	TV 44 BIS 79 23 SUR	YOLANDA MENESES	SI NO						0,00%	**0,00%**
229	MVJE_050	CL 79A SUR 42-51	HERSILIA PARRA PEÑA	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
230	MVJE_351	TV 44 BIS 78-52 SUR	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
231	MVJE_356	KR 44A 78 43 SUR	ANA ROSA SOSA	SI NO						0,00%	**0,00%**
232	MVJE_573	KR 44 -78 59 SUR	SANDRA MILENA PRECIADO	SI NO						0,00%	**0,00%**
234	MVJE_452	CL 79 SUR 42 10	PEDRO JULIO UREÑA	SI NO					VALIDADA	0,00%	**0,00%**
237	MVJE_405	KR 44A 78 16 SUR MJ	DIANA BEATRIZ AVELLANEDA	SI NO						0,00%	**0,00%**
239	MVJE_149	CL 78 SUR 42 05	LUIS GUILLERMO CIPRIAN VERGARA	SI NO						0,00%	**0,00%**
241	MVJE_624	KR 43 77 37 SUR	DORIS IMELDA QUIROGA QUIROGA	SI NO						0,00%	**0,00%**
242	MVJE_293	KR 42 77 15 SUR	ELSA MARIA MARTINEZ	SI NO						0,00%	**0,00%**

293	MVJE_241	CALLE 80 SUR # 42-24	RUBY STELLA JAIMES	SI NO						0,00%	**0,00%**
295	MVJE_164	CL 80B SUR 40 03	SARA RODRIGUEZ RAMOS	SI NO						0,00%	**0,00%**
296	MVJE_009	CL 80B SUR 39 24	MARIA MERY VARGAS LOPEZ	SI NO						0,00%	**0,00%**
297	MVJE_360	CL 80B SUR #40-18	ARTURO FLOREZ BARAJAS	SI NO						0,00%	**0,00%**
298	MVJE_434	CL 80 SUR#40-34	NOHEMI MORALES ORTIZ	SI NO						0,00%	**0,00%**
299	MVJE_435	CL 80 SUR # 41-04	JUVENAL ESPINOSA MUR	SI NO						0,00%	**0,00%**
303	MVJE_1139	CL 79 SUR 40 05	OSCAR ALIRIO GAITAN MOLINA	SI NO						0,00%	**0,00%**
305	MVJE_321	CALLE 79 SUR 39 40	JOSE MIGUEL MORENO ROBAYO	SI NO						0,00%	**0,00%**
307	MVJE_868	CL 79 SUR 37 46	MARIA IDALINA PALOMINO MENDOZA	SI NO						0,00%	**0,00%**
309	MVJE_030	KR 40 78 06 SUR	NUBIA LUCERO NEIRA JERENA	SI NO						0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	12	DEL	1/11/2021	AL	7/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .


CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.


** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.
Fase de validación y apropiación.

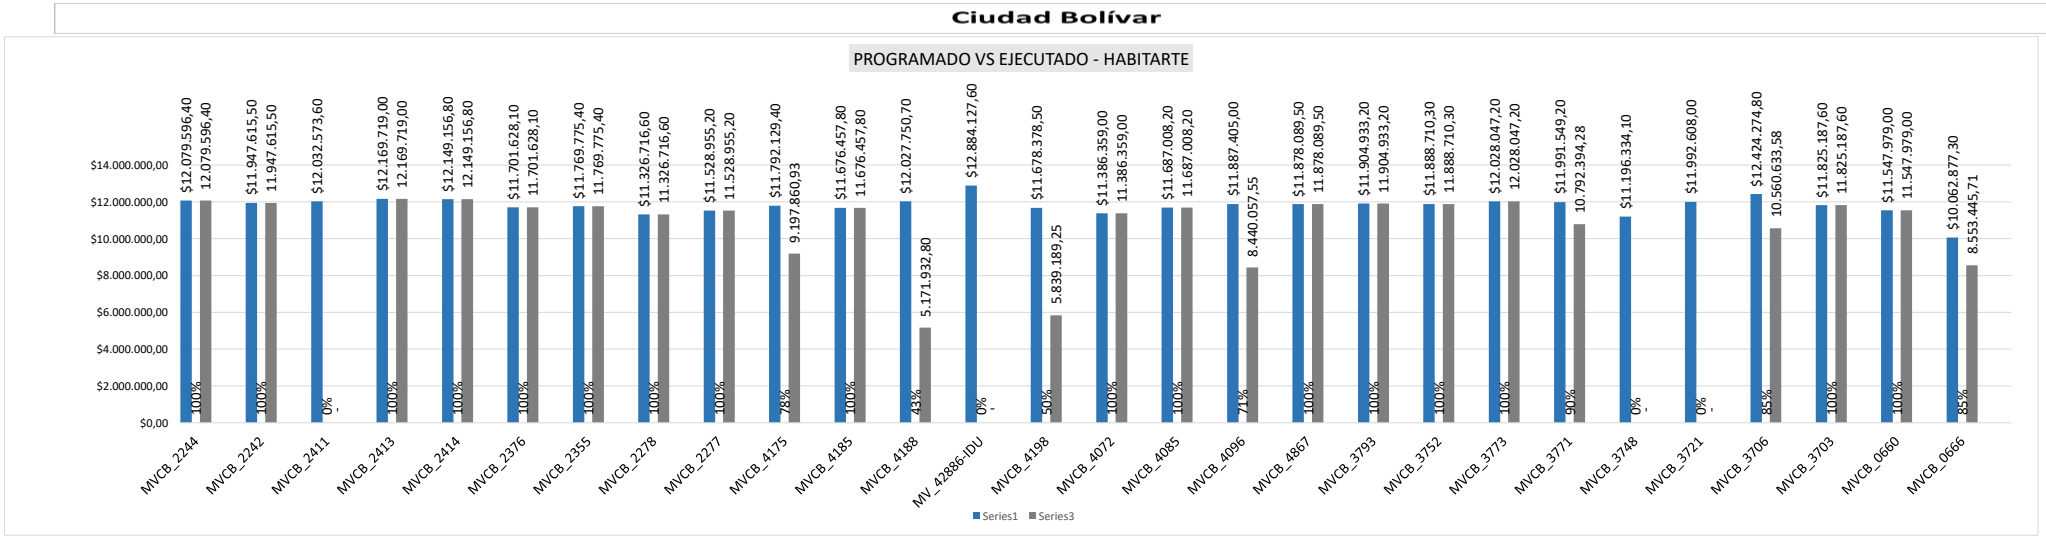

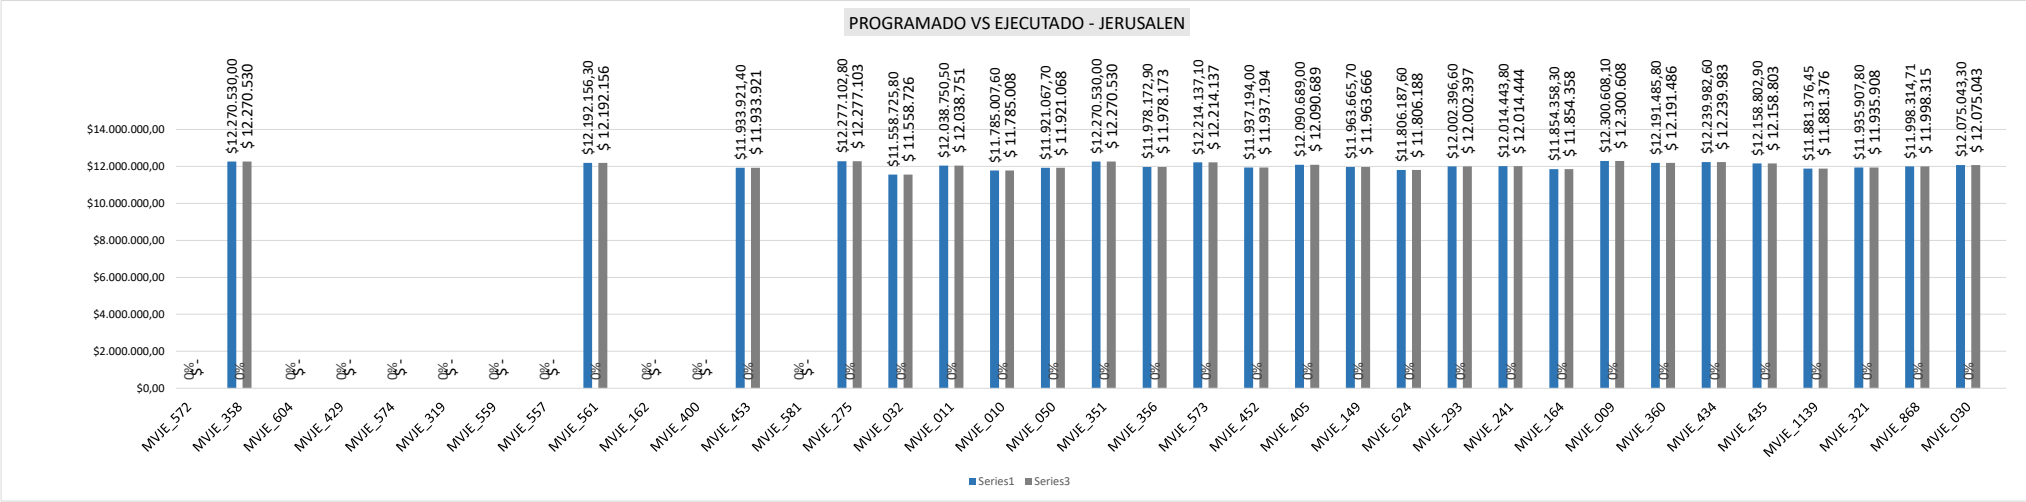

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JUAN PABLO II

1	MVCB_2411	María del Carmen Lopez	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
2	MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	Se retoman actividades de obra el día miercoles 3 de noviembre. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Desmonte de cubierta y estrucutura de la misma de zona de sala y cocina, instalación de cubierta nueva con su respectiva estructura metálica, flanches y bajante de agua lluvia.
3	MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de piso en cocina, boquilla para enchapes, estuco y pintura de muros. Se evidencia poco avance de obra y se sobrepasa el tiempo de ejecución.
4	MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	Por falta de personal se atrasa inicio de obras de mejoramiento en la vivienda. Se inician actividades de obra el día viernes 5 de noviembre.
5	MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	Se hace visita de apertura el día martes 2 de noviembre. Por falta de personal se atrasa inicio de obras de mejoramiento en la vivienda, por lo tanto, no se inician actividades de obra.
6	MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Estuco y pintura en muros de todo el área, instalación de cielo raso en segundo piso.
7	MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Demolición de enchapes y mesón de cocina 1, instalación de aparatos sanitariso y lavaplatos, remates y boquillas de enchape en cocina 2, baños y patio.

8	MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	Se terminan actividades de obra en la vivienda, se revisa las actividades realizadas y se verifica memorias y presupuesto final. Se entrega a la propietaria el día viernes 5 de noviembre de 2021.
9	MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	Los beneficiarios terminaron actividades en cubierta y se retoma obra de mejoramiento sin inconvenientes. Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Pañete de muros de todo el área, Enchapes de piso de alcobas, escalones de cocina, preparación para pintura de muros.
10	MV_42886 IDU	MARÍA FRANCELINA GRANADA CASTAÑO	Vivienda validada. No se ha realizado apertura.
11	MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de baños Demolición de cocina y fundición de mesón nuevo, enchapes de cocina y patio.
12	MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	Hasta la fecha del presente informe se han adelantado las siguientes actividades de obra: Enchapes de piso de todo el área, pañete de muros de patio, estuco de muros. La beneficiaria está instalando por su cuenta filos plásticos en los bordes de los muros.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR JERUSALÉN			
13	MVJE_572	FABIOLA GARCIA DURAN	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad zona de primer nivel, cocina y baño. Patio a la interperie.
14	MVJE_358	ANABELI ORTIZ DE BOHORQUEZ	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad cocina y alcobas. Vivienda en obra gris y baño con enchapes.
15	MVJE_604	VIVIANA BOHORQUEZ	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad baño, cocina y alcobas, vivienda en obra negra.
16	MVJE_429	MARÍA MYRIAM CASTELLANOS	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad baño y alcobas. Los beneficiarios manifiestan que no quieren intervención en algunas zonas debido a que cambiarán la espacialidad de la vivienda a futuro.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR POTOSÍ			
17	MVJE_011	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad cocina, baño sala y alcobas. La vivienda tiene enchapes en cocina y baño, los pisos son en esmalte en alcobas y de cemento en las demás áreas, patio a la interperie.
18	MVJE_032	MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad cocina, baño y alcoba principal. La placa presenta deformidades y se encuentra incompleta en zona de patio.
19	MVJE_275	DIANA BELEN HERNANDEZ	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad área de segundo piso ya que se encuentra en obra negra.
20	MVJE_351	JOSE VICENTE ROMERO CASTRO	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad cocina, baño y pisos de todo el área.
21	MVJE_050	HERSILIA PARRA PEÑA	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad la cubierta debido a que presenta humedad. Baño con enchape nuevo y pisos con baldosa.
22	MVJE_452	PEDRO JULIO UREÑA	Se hace visita de validación, se mide el predio y se realiza presupuesto con listado de actividades de obra. Se evidencia como prioridad reorganizar área de baño y cocina. Vivienda en muy mal estado.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Se realizó entrega de una (1) vivienda del barrio Juan Pablo II. Se realiza visita de apertura en una (1) vivienda del barrio Juan Pablo II. Actualmente se encuentran nueve (9) viviendas en ejecucuión y diesisiete (17) vivienda entregadas.Se inicia intervención en sector de Jerusalén y Potosí, se realizó visita de validación en seis (6) viviendas del barrio Potosí y cuatro (4) del barrio Jerusalén.	Residentes de interventoría y de contratista	1/11/2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.
7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :
No se reporta afectaciones en las obras debido a clima.
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL

Fecha **7-nov-21**

CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

Contrato de obra	**794 DE 2021**			**Plazo**	Cinco (5) meses 15 dias
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021.			**Acta de inicio**	18 de Agosto de 2021
CDP No.	**938-07 de abril de 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**CINCO MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($5.130.409.981) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**797-2021**			**Plazo**	Seis (6) meses 15 dias
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"			**Acta de inicio**	18 de Agosto 2021
CDP No	**969 ABRIL 16 DE 2021**	**CRP No.**	133011601010000007715	**Valor del contrato**	**Seiscientos quince millones quinientos noventa y cuatro mil seis cientos setenta pesos ($615.594.670) M/Cte.**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								**Fase 2: Ejecución de obras**				
					Validación			**Ejecución**				
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	grupo 5	Marandu	7	61	7	0	5	0	5	2	71,43%	5
		Juan Pablo II	13		13	0	2	9	2	2	41,08%	2
Técnico Responsable		Urbanizacion Compartir	6		6	0	5	0	5	1	83,33%	5
		Potosi	33		8	25	0	0	0	33	0,00%	0
		Las Brisas	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
		Jerusalen	1		0	1	0	0	0	1	0,00%	0
Subtotal			**61**	**61**	**34**	**27**	12	**9**	**12**	**40**	**32,64%**	**12**

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										**ACUMULADO SEMANAS ANTERIORES**	NOVIEMBRE
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**			**Tiempo Programación**				**SEMANA DEL 1 AL 7**
No.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	V/ Validada	V/ Modificada	V/Inicial	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 12**
MARANDU											
1	MVCB_2049	KR 18X 68C 05 SUR	MARGENEDT GONZALEZ QUINTERO	SI / NO		$ 8.814.490,40			VALIDADA	0,00%	**0,00%**

2	MVCB_2053	KR 18X 68C 15 SUR	EDWIN ARMANDO VANEGAS ESCOBAR	SI / NO		$ 11.716.673,20			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
3	MVCB_2055	KR 18X 68C 21 SUR	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.895.402,07	**7/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
4	MVCB_2034	KR 18Y 68D 08 SUR	AMINTA SABOGAL	SI / NO	$ 12.023.740,46	$ 11.811.116,20	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
5	MVCB_2013	KR 18Y 68D 27 SUR	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	SI / NO	$ 12.548.436,06	$ 11.941.531,50	**8/09/2021**	**13/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
6	MVCB_2019	KR 18Y 69B 09 SUR	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	SI / NO	$ 12.454.097,90	$ 9.757.539,80	**8/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
7	MVCB_2020	KR 18Y 69B 13 SUR	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.884.972,10	**7/09/2021**	**8/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
JUAN PABLO II											
8	MVCB_2252	KR 18V BIS 68A 42 SUR	CAMPO ELIAS GIL PARDO	SI / NO		$ 12.099.603,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
9	MVCB_4043	KR 18Q BIS A 66A 26 SUR	SANDRA PATRICIA SANCHEZ TOBON	SI / NO		$ 11.693.068,00			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
10	MVCB_3998	KR 18Q BIS A 66A 05 SUR	ETELVINA PUERTAS POVEDA	SI / NO		$ 11.638.243,00	3/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	**0,00%**
11	MVCB_4003	KR 18Q BIS A 66A 33 SUR	MARIELA HOYOS VALENCIA	SI / NO		$ 11.739.701,00	15/10/2021		EN EJECUCION	12,00%	**23,00%**
12	MVCB_4009	KR 18Q BIS A 66A 67 SUR	FLORALBA CORTES	SI / NO		$ 11.955.384,30	15/10/2021		EN EJECUCION	48,00%	**60,00%**
13	MVCB_4011	KR 18Q BIS A 66A 79 SUR	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	SI / NO		$ 11.926.494,00	2/11/2021		EN EJECUCION	0,00%	**4,00%**
14	MVCB_3982	KR 18Q BIS B 66A 74 SUR	JULIA DEL CARMEN CASTRO	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.796.968,00	**13/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	90,00%	**100,00%**
15	MVCB_3983	KR 18Q BIS B 66A 70 SUR	MARTHA JANETH LANZABAL	SI / NO		$ 11.938.400,60	20/10/2021		EN EJECUCION	32,00%	**70,00%**
16	MVCB_3984	KR 18Q BIS B 66A 66 SUR	BARBARA ORTIZ RUEDA	SI / NO		$ 12.222.565,40	15/10/2021		EN EJECUCION	4,00%	**12,00%**
17	MVCB_3987	KR 18Q BIS B 66A 54 SUR	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	SI / NO		$ 12.052.789,00	21/10/2021		EN EJECUCION	33,00%	**75,00%**
18	MVCB_3991	KR 18Q BIS B 66A 30 SUR	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	SI / NO		$ 10.690.982,90	13/10/2021		EN EJECUCION	18,00%	**55,00%**
19	MVCB_3709	KR 18V BIS 67C 03 SUR	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	SI / NO		$ 11.645.016,29	11/10/2021		EN EJECUCION	22,00%	**35,00%**
20	MVCB_3710	KR 18V BIS 67C 07 SUR	JORGE EDUARDO MORENO	SI / NO	$ 12.160.207,60	$ 12.027.459,50	**24/09/2021**	**22/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
URBANIZACION COMPARTIR											
21	MVCB_0897	KR 18X 67D 09 SUR	CESARIO BONILLA VERA	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.197.949,00	**4/10/2021**	**29/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
22	MV_42838-IDU	CL 68A SUR 18X 49	DESIDERIO MAYORGA	SI / NO	$ 12.816.618,27	$ 12.940.470,50	**4/10/2021**	**2/11/2021**	ENTREGADA	90,00%	**100,00%**
23	MVCB_1020	CL 68B SUR 19 51 MJ 6	ALIX MAYORGA CAGUA	SI / NO		$ 11.882.772,80			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
24	MVCB_0838	KR 19 BIS 68 29 SUR	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	SI / NO	$ 12.900.000,00	$ 11.528.505,00	**4/10/2021**	**25/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
25	MVCB_0837	KR 19 BIS 68 23 SUR	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	SI / NO	$ 12.978.000,00	$ 11.926.026,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**
26	MVCB_0828	KR 19A 67D 04 SUR	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	SI / NO	$ 12.900.000,00	$ 11.809.681,00	**21/09/2021**	**19/10/2021**	ENTREGADA	100,00%	**100,00%**

POTOSI											
27	MVJE_058	CL 82A BIS SUR 46A 37	DILMA MARIA DEL CARMEN RIVERA CELIS	SI NO		$ 12.100.875,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
28	MVJE_1000	KR 46A 82A 35 SUR	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA	SI NO		$ 11.989.418,73			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
29	MVJE_326	CL 82 SUR 46A 49	LUZ MARINA SIERRA SIERRA	SI NO		$ 11.960.780,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
30	MVJE_1087	CR 46A 82A 09 SUR	ALONSO OIDOR	SI NO		$ 11.995.442,12			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
31	MVJE_909	KR 46A 82A 22 SUR	JOSE GREGORIO BELTRAN	SI NO		$ 11.919.403,50			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
32	MVJE_880	KR 46 82A 25 SUR	RAQUEL GARCIA	SI NO		$ 11.994.568,91			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
33	MVJE_1007	CR 46 82 15 SUR	ANA LEONOR CELIS DE MARTINEZ	SI NO		$ 11.833.705,04			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
34	MVJE_244	DG 82 SUR 46 15	JAIRO BERNAL	SI NO		$ 11.871.866,90			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
35	MVJE_224	KR 46A 82 04 SUR	ALEXANDRA MOLINA RINCON	SI NO		$ 11.936.322,20			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
36	MVJE_1049	CL 82 SUR 46A 24	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	SI NO		$ 11.924.304,70			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
37	MVJE_066	CL 82 SUR 46A 30	ERNESTO CARDENAS	SI NO		$ 11.976.242,30			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
38	MVJE_1058	CRA 46A 81 B 09 SUR	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	SI NO		$ 11.966.578,10			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
39	MVJE_323	KR 46A 81A 10 SUR	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	SI NO		$ 12.033.843,70			VALIDADA	0,00%	**0,00%**
40	MVJE_882	CL 81 A SUR 46 A 10	DUMAR ESTIVEN SASTOQUE	SI NO		$ 11.870.363,71			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
41	MVJE_431	CL 81A SUR 46A 24 MJ	MARIA BELLANID MENDEZ BUSTOS	SI NO		$ 11.980.238,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
42	MVJE_062	CL 81 SUR 46A 37	PEDRO CLAVER SIERRA DE LA HOZ	SI NO		$ 12.002.483,80			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
43	MVJE_264	CL 80A SUR 46A 17	ALCIRA TEATINO GARCIA	SI NO		$ 11.965.471,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
44	MVJE_180	CL 80A SUR 46A 36	DAISSY GARZON TAFUR	SI NO		$ 12.037.424,00			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
45	MVJE_1084	KR 46 82A 26 SUR	MARIA DEL TRANSITO ALFONSO ORTIZ	SI NO		$ 11.664.307,10			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
46	MVJE_938	KR 45C 82 45 SUR	NIEVES DURAN IBATA	SI NO		$ 11.834.538,91			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
47	MVJE_081	KR 45C 82 21 SUR	ESTRELLA WILCHES	SI NO		$ 11.992.416,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
48	MVJE_1009	DG 81 B SUR 45 B 35	FELIPE DUARTE VARGAS	SI NO		$ 12.040.766,50			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
49	MVJE_901	KR 45C 82B 22 SUR	JORGE GERENA TORRALBA	SI NO		$ 12.029.185,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
50	MVJE_1104	KR 45C 82B 10 SUR	MARIA ALICIA LOPEZ CASTILLO	SI NO		$ 11.629.204,37			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
51	MVJE_1067	CR 45C 82 60 SUR	UBALDINA PALACIOS CASTRO	SI NO		$ 11.855.696,69			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
52	MVJE_881	KR 45C 82 34 SUR	GLORIA LUZ BLANCO BELLO	SI NO		$ 11.835.560,70			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
53	MVJE_929	DG 81A SUR 45B 17 MJ	WILLIAM MARTINEZ CUBILLOS	SI NO		$ 11.791.873,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
54	MVJE_593	DG 81B SUR 45B 03 MJ	YESID VILLAMIL	SI NO		$ 12.037.811,90			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

55	MVJE_999	KR 45B 82 05 SUR	MARÍA JUDITH QUIÑONEZ ORTEGA	SI NO		$ 11.793.420,30			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
56	MVJE_937	KR 45B 82B 09 SUR	RAQUEL VARGAS MORALES	SI NO		$ 11.145.662,84			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
57	MVJE_1024	KR 45B 82B 10 SUR	ALVARO BAEZ RODRIGUEZ	SI NO		$ 11.764.292,15			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
58	MVJE_1035	KR 45B 82B 04 SUR	DIGNA MARIA ROJAS DE DIAZ	SI NO		$ 11.974.961,85			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
59	MVJE_1118	KR 45 A 82 51 SUR	NANCY OLIVERO	SI NO		$ 11.885.874,64			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
LAS BRISAS											
60	MVJE_767	DG 81A SUR 45B 35	MARIA GENOVEVA AMELINES OCAMPO	SI NO		$ 11.865.448,45			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**
JERUSALEN											
61	MVJE_1137	CR 45B 82C 04 SUR	LUZ SILENIA PAN MALDONADO	SI NO		$ 11.936.669,20			SIN VALIDAR	0,00%	**0,00%**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA		PERIODO No.	12	DEL	1/11/2021	AL	7/11/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y GRUPO 2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1 a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN , UNIR II , TT JERUSALEN , HABITARTE .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794--2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELAEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.


3. ASPECTOS GENERALES INFORME TÉCNICO

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación.

Ciudad Bolívar

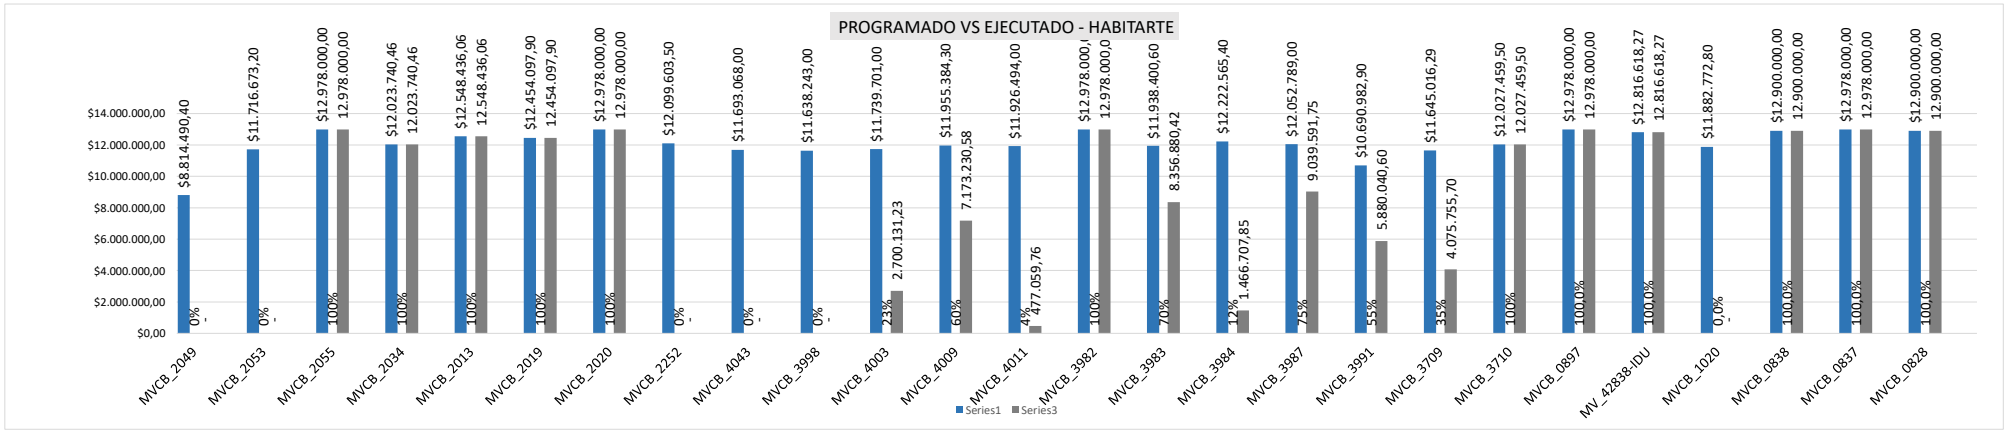

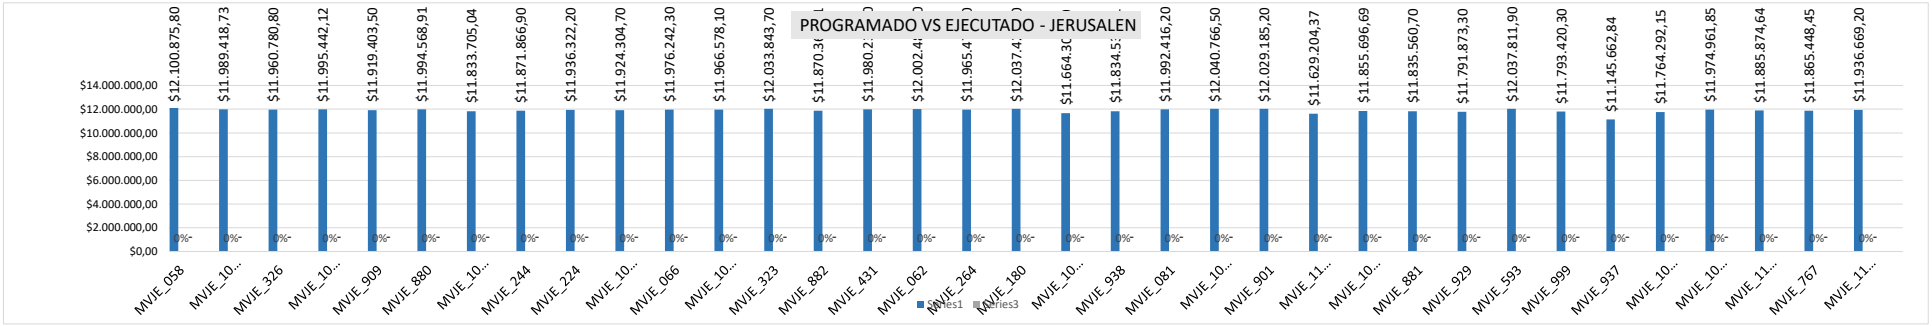

4- COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA			
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - MARANDU			
1	MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
2	MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
3	MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 13 de Octubre de 2021.
4	MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
5	MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 8 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - JUAN PABLO II			
6	MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	Se realiza apertura de la vivienda en la cual se realiza socializacion de actividades a ejecutar y presupuesto inicial a la beneficiaria la cual esta de acuerdo con las intervenciones.
7	MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en construccion de entrepaño de meson de cocina; demolicion, alistado e instalacion de enchape de piso en habitacion 1.
8	MVCB_4009	FLORALBA CORTES	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en construccion de meson de cocina y se finaliza actividad de enchape de piso.
9	MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	Se realiza apertura de la vivienda en la cual se realiza socializacion de actividades a ejecutar y presupuesto inicial a la beneficiaria la cual esta de acuerdo con las intervenciones.

10	MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 2 de Noviembre de 2021.
11	MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia que se finaliza actividad de enchape de piso y se inicia con instalacion de cielo raso en PVC.
13	MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en habitaciones, zonas comunes y cocina, Se inicia instalacion de enchape de pared en cocina.
14	MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia que se continua con la instalacion de enchape de piso, se realizo demolicion de enchape de pared, se realiza preparacion para instalacion de enchape de muro y se inicia instalacion de enchape de pared.
15	MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	Se realiza visita de seguimiento tecnico a la vivienda donde se evidencia avance en instalacion de enchape de piso en habitaciones y aplicación de pintura.
16	MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 22 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - URBANIZACION COMPARTIR			
17	MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	Se realiza entrega de la vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion el dia 29 de Octubre de 2021.
18	MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 02 de Noviembre de 2021.
19	MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 25 de Octubre de 2021.
20	MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
21	MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	Se realiza entrega de la vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion el dia 19 de Octubre de 2021.
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - POTOSI			
22	MVJE_909	JOSE GREGORIO BELTRAN	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en cubierta.
23	MVJE_880	RAQUEL GARCIA	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en baños, cocina, zona de lavado y habitaciones.
24	MVJE_1007	ANA LEONOR CELIS DE MARTINEZ	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en cubierta.
26	MVJE_224	ALEXANDRA MOLINA RINCON	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado y habitaciones. La vivienda se encuentra en bloque y sin ningun enchape de pisos.
27	MVJE_1049	JOSÉ LEONIDAS ZUÑIGA HURTADO	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado y habitaciones. La parte lateral de la vivienda es prefabricada, por solicitud del beneficiario quien indica que va a demoler esta zona no se hara ningun tipo de intervencion.
28	MVJE_066	ERNESTO CARDENAS	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado y habitaciones. En el baño se evidencia bastante humedad en muros, el beneficiario indica que es debido al vecino.

29	MVJE_1058	LIGIA YINETH RODRIGUEZ CONTRERAS	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia que la vivienda esta dividida en dos partes, en una se da prioridad a intervencion en cocina, zona de lavado y habitaciones y en la zona 2 se realizara intervencion en alistado, enchape de pisos y aplicacion de pintura del primer piso.
30	MVJE_323	SANDRO ESTEBAN LEYTON MORENO	Se realiza validacion de la vivienda. Se evidencia como prioridad intervencion en baño, cocina, zona de lavado y habitaciones. La vivienda se encuentra en bloque y sin ningun enchape de pisos.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se ajustarán, en caso de ser necesario, los ítems y cantidades de obra de las diferentes actividades que se desarrollan en las viviendas, velando porque se invierta el presupuesto proyectado.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
Barrio o Territorio estado del Tiempo :

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
(SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO)

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_4003



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape de piso y se inicia con aplicación de estuco.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza construccion de entrepaño de meson de cocina.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MVCB_3982



FECHA: 2/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza intervencion en baño, donde se realizo cambio de enchape de piso y pared, instalacion de combo sanitario nuevo y remates en pintura.



FECHA: 2/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza intervencion en cocina en la cual se realizo construccion de meson nuevo, cambio de enchape de piso y pared, instalacion de lavaplatos, terminacion de construccion de muro lateral y remates en pintura.





FECHA: 2/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realizo intervencion en habitaciones, sala y hall de acceso donde se realizo preparacion, alistado e instalacion de enchape de pisos, pañete general y aplicación de pintura.





FECHA: 02/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de las actividades ejcutadas en el mejoramiento de vivienda a la beneficiaria la cual recibe a satisfaccion.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3983



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape de piso y pared en baño y se realiza instalacion de combo sanitario.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape de pared.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de cielo raso en PVC de hall y zona de acceso.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se inicia aplicación de pintura sobre pañete en zona de lavado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3987





FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de enchape de pared en zona de lavado y cocina.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se finaliza instalacion de enchape de piso en hall.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se continua con instalacion de enchape de piso en habitaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3991



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza demolicion de enchape de piso existente, se realiza toma de niveles y se inicia alistado de piso.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realizo demolicion de enchape de cocina existente y se inicia instalacion de enchape de pared.





FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza instalacion de enchape de pisos en habitaciones y se realizo aplicación de estuco.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVCB_3709



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de lavadero y demolicion de poyo.



FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza finaliza instalacion de enchape de piso, pendiente aplicación de boquilla.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA - MV_42838-IDU














FECHA: 02/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de las actividades ejecutadas en el mejoramiento de vivienda al beneficiario el cual recibe a satisfaccion. Intervenion en cocina, zona de lavado, habitaciones, sala, hall de acceso e instalacion de baranda para escalera.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_909



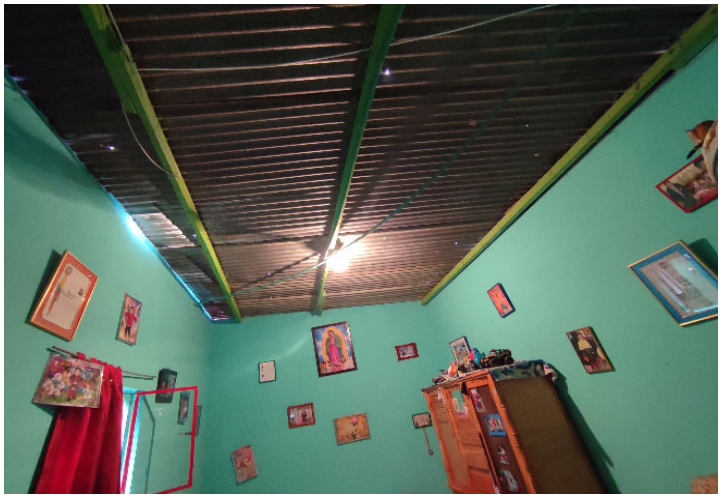





FECHA: 4/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad el cambio de la cubierta.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_880









FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad adecuacion en baños, cocina, zona de lavado y habitaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_1007





FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad el cambio de la cubierta.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_244









FECHA: 4/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad adecuacion en baño, cocina, zona de lavado y habitaciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_1049









FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad adecuacion en baño, cocina, zona de lavado, habitaciones y sala.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VALIDACION - MVJE_066









FECHA: 5/11/2021

DESCRIPCIÓN: Se realiza validacion de la vivienda donde se evidencia como primera necesidad adecuacion en baño, cocina, habitaciones y sala.

4. INFORME SOCIAL

Conflictos y anomalías que impidan el normal desarrollo de las obras.

Al presente informe no se presentan conflictos.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU, COMPARTIR, POTOSÍ Y JERUSALÉN


02/11/2021 - MVJE_011: JUAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.
02/11/2021 - MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN.
02/11/2021 - MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ.
02/11/2021 - MVJE_572: FABIOLA GARCÍA DURAN .
02/11/2021 - MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO.
02/11/2021 - MVJE_050: HERSILIA PARRA PEÑA .
2/11/2021 MVCB_2252 CAMPO ELÍAS GIL PARDO
03/11/2021 MVJE_1068 GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN.
03/11/2021 MVJE_251 LUZ AMANDA BUITRAGO
03/11/2021 MVJE_380 JOSE JOAQUÍN ZAMORA LEÓN
03/11/2021 MVJE_174 LUZ ESTELA SANCHEZ CORTES:
03/11/2021 MVJE_1042 MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO:
03/11/2021 MVJE_545 LADY ESPERANZA ACOSTA SANDOVAL ,
03/11/2021 MVJE_233 ODALINA ARDILA ,
03/11/2021 MVJE_402 LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS,
03/11/2021 MVJE_022 PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO:
04/11/2021 MVJE_909 JOSE GREGORIO BELTRAN
04/11/2021 MVJE_224 ALEXANDRA MOLINA RIKNCON
04/11/2021 MVJE_1058 LIGIA YINETH RODRIGUEZ
04/11/2021 MVJE_323 SANDRO ESTEBAN LEYTON
05/11/2021 MVJE_880 RAQUEL GARCIA
05/11/2021 MVJE_1007 ANA LEONOR CELIS DE MATINEZ
05/11/2021 MVJE_1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA
05/11/2021 MVJE_066 ERNESTO CARDENAS
05/11/2021 - MVJE_452: PEDRO JULIO UREÑA .
05/11/2021 - MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ
05/11/2021 - MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.
05/11/2021 - MVJE_429: MARÍA MYRIAM CASTELLANOS MORALES .

5. ACTAS DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD Y LISTADOS DE ASISTENCIA O SOPORTE DE LAS DIFERENTES ACCIONES SEGÚN CORRESPONDA (CUANDO APLIQUE).

SOCIALIZACIONES

Durante el transcurso de esta semana NO se realizó socialización.

PQR

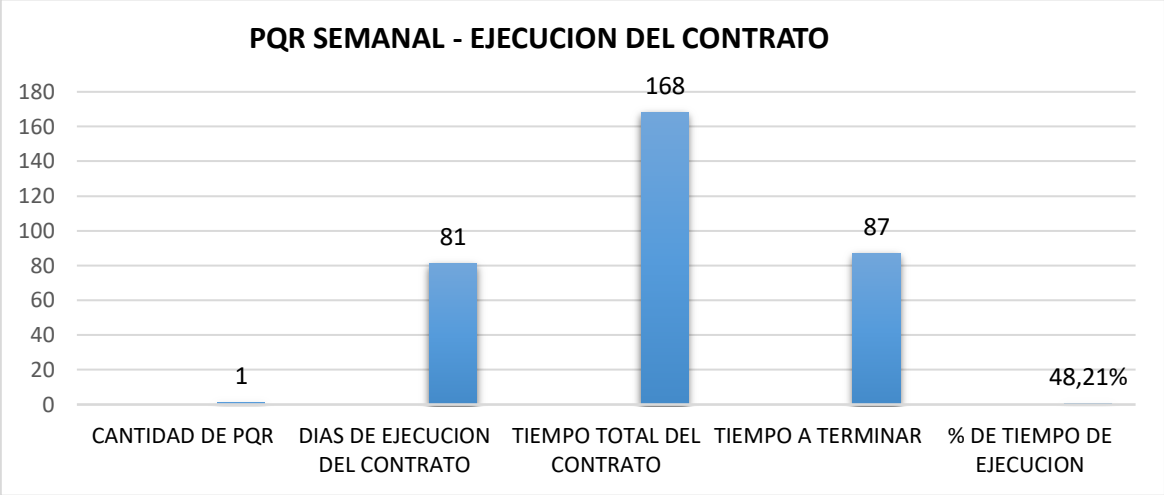

El contrato cuenta con 168 días para su ejecución, de los cuales han transcurrido a la fecha 814 días después de la firma del acta de inicio por el contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

FECHA	7/11/2021	**PERIODO No.**	12	DEL	**1/11/2021**	AL	**6/11/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA 797-2021 REALIZAR LA INTERVENTORÍAS TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Corresponde al Grupo 1, a la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en TPM JERUSALEN, UNIR II, TT JERUSALEN, HABITARTE localidades: CIUDAD BOLIVAR Y ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	797-2021	CONTRATO No.:	794-2021
PLAZO INICIAL:	6 meses 15 dias	PLAZO INICIAL:	5 meses 15 dias
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 de marzo 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de febrero 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 615.594.670,00	VALOR INICIAL :	$ 5.130.409.981,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	$ -
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO	INTERVENTOR:	Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA

CIUDAD BOLIVAR
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II, MARANDU, COMPARTIR, POTOSI Y JERUSALEN
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
SOCIALIZACIONES
no se presentaron en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS
02/11/2021 - **MVJE_011:** J**UAN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ**. Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - **MVJE_032: MERCEDEZ ACEVEDO DE ESTUPIÑAN.** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
02/11/2021 - **MVJE_275: DIANA BELEN HERNÁNDEZ.** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - **MVJE_572: FABIOLA GARCÍA DURAN .** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica reaqliza la medición al predio.
02/11/2021 - **MVJE_351: JOSÉ VICENTE ROMERO CASTRO.** Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
02/11/2021 - **MVJE_050: HERSILIA PARRA PEÑA .** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
2/11/2021 **MVCB_2252 CAMPO ELÍAS GIL PARDO** Se realiza visita de validación al predio se realiza formato de caracterización de los dos predios con la información de los beneficiarios, Es importante resaltar que se solicita a la SDHT realizar acompañamiento para establecer las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta que sobra presupuesto
03/11/2021 **MVJE_1068 GERARDO ANTONIO ALFONSO BELTRAN**. Se realiza validación técnica y social. Recibe visita con carta de autorización esposa **FABIENNE GAONA.** Sin novedades.

03/11/2021 **MVJE_251 LUZ AMANDA BUITRAGO** Se realiza validación técnica y social.Recibe visita con carta de autorización hija **LEIDY VANNESA HURTADO.** Sin novedades.

03/11/2021 **MVJE_380 JOSE JOAQUÍN ZAMORA LEÓN** Se realiza validación técnica y social.Recibe visita con carta de autorización hija **ADELAIDA ZAMORA.** Sin novedades.

03/11/2021 **MVJE_174 LUZ ESTELA SANCHEZ CORTES:** Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.

03/11/2021 **MVJE_1042 MARIA LUISA HERNANDEZ MONTERO:** Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.

03/11/2021 **MVJE_545 LADY ESPERANZA ACOSTA SANDOVAL ,**SIN NOVEDAD NUMERO DE EJECUCIÓN 209
03/11/2021 **MVJE_233 ODALINA ARDILA** , SIN NOVEDAD
03/11/2021 **MVJE_402 LENIS GUIOMAR GIRALDO LANCHEROS**, SIN NOVEDAD

03/11/2021 **MVJE_022 PLACIDIA HERNANDEZ MONTERO:** Se realiza validacion tecnica y social. Se resuelven dudas frente a la ejecución del proyecto, No se reportan dudas y/o inconformidades.

04/11/2021 **MVJE_909 JOSE GREGORIO BELTRAN** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
04/11/2021 **MVJE_224 ALEXANDRA MOLINA RIKNCON** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio,se realizara intervencion en el segundo piso se llega a compromiso con la beneficiaria que para la fecha de inicio de obra la beneficiaria debera realizar el cambio ded cubierta.

04/11/2021 **MVJE_1058 LIGIA YINETH RODRIGUEZ** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio, la vivienda se encuentra divivida en 2 por lo cual se realizara intervencion en las 2 areas.
04/11/2021 **MVJE_323 SANDRO ESTEBAN LEYTON** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio, se realizara intervencion al sugundo piso
05/11/2021 **MVJE_880 RAQUEL GARCIA** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 **MVJE_1007 ANA LEONOR CELIS DE MATINEZ** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 **MVJE_1049 JOSE LEONIDAS ZUÑIGA** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 **MVJE_066 ERNESTO CARDENAS** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 - **MVJE_452: PEDRO JULIO UREÑA .** Se hace validación tecnica y social con el beneficiario en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 - **MVJE_358: ANABELI ORTIZ DE BOHÓRQUEZ** Se hace validación tecnica y social con la beneficiaria en la cuál se diligencia la caratrización social y la parte técnica realiza la medición al predio.
05/11/2021 - **MVJE_604: NADIA VIVIANA BOHÓRQUEZ ORTIZ.** Atiendebla visita su esposo CARLOS ALBERTO RIVAS, no tiene carta de autorización, se hace contacto teléfonico con la beneficiaria quien autoriza al señor, la social del contratista le indica que debe hacer carta de autorización.
05/11/2021 - **MVJE_429: MARÍA MYRIAM CASTELLANOS MORALES .** Atiende la visita su hijo BORWMAN ALEXÁNDER GONZÁLEZ CASTELLANOS ya que la beneficiaria tiene discapacidad cognitiva; se adjunta carta de autorización y fotocopias de las cédulas.
VALIDACIONES FALLIDAS
02/11/2021 - **MVJE_010: YOLANDA MENESES. VALIDACIÓN FALLIDA.** No se logra hacer la validación ya que la vivienda presenta varios inconvenientes estructurales; se solicitará acompañamiento de la entidad.
02/11/2021 - **MVJE_356: ANA ROSA SOSA DIAZ DE GONZÁLEZ.VALIDACIÓN FALLIDA.** No se logra hacer válidacion ya que la familia se encuentran haciendo obras en la vivienda, se hace contacto teléfonico con uno de los hijos y se agenda la validación para la semana entrante.
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
02/11/2021 - **MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO.** Se realiza la apertura de obra, se firman actas técnicas, y sociales respecto al inicio de obras junto con la socialización de presupuesto a satisfacción de la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
2/11/2021 **MVCB_4011 MARÍA SILVERIA SIGUA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria, indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
3/11/2021 **MVCB_3998 ETELVINA PUERTAS POVEDA** Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad de la beneficiaria indicación de bioseguridad y recomendaciones sociales
BARRIO O TERRITORIO: JUAN PABLO II
APERTURAS FALLIDAS
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
no se presentaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
02/11/2021 **MVCB_ 4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO**. Recibe visita autorizada **GLADYS ARIAS,** arrendataria en la vivienda.e realiza visita social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades en cocina. Autorizada no reporta dudas/inconformidades.
02/11/2021 **MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO.** Recibe visita nieta autorizada **KAREN PIRACHICAN**. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inquietudes.

02/11/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades en zona lavandería. No se reportan dudas y/o inconformidades.
02/11/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.** Atiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO**. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas frente a zonas que serán intervenidas con vinilo. Expresa Conformidad con la respuesta. y avances en las obras.
02/11/2021- **MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:** Recibe visita autorizado **EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ.** e realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de enchapé piso cerámico. No reporta dudas y/o inconformidades.
02/11/2021 **MVCB_ 4811 JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO:** Autoriza a **CINDY GUEVARA** para estar al tanto de las obras. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades en cocina. Se resuelven dudas al respecto, expresa conformidad con los avances.
02/11/2021 **MVCB_4791 ANA GRACIELA BELTRÁN GONZALEZ.** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. No reporta dudas y/o inconformidades. Expresa conformidad con los avances.
2/11/2021 **MVCB_4233 BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE** , Se evidencia avances en obra, avances en acabados, vivienda sin novedad.
2/11/2021 **MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021 **MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANCA,**SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA NO SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA.
2/11/2021 **MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON,** SE REALIZA VISITA DE SEGUMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA SE EVIDENCIA AVANCES DE ACABADOS, SE HACEN RECOMENDACIONES POR PARTE TÉCNICA. (LA HOJA ES MÁS CORTA QUE EL VANO DE LA PUERTA).
2/11/2021**MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO ,S**E REALIZA VISISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA EL SEÑOR LEONARDO MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO POR FRENTE A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN
2/11/2021 **MVCB_3822 SORY INES CORTES LOPEZ ,**SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA
2/11/2021 **MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN,** Se realiza seguimiento social. Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021 **MCVB_3809 ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ ,** SE REALLIZA SEGUIMIENTO SE EVICENCIAN ACABADO EN OBRAS
2/11/2021 **MCVB_ 2243 HECTOR EUSTORGIO LOPEZ ,** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021 **MCVB_ 3839 JOSE OLIVO CUADRADO ,** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
2/11/2021**MCVB_ 4272 , NIEVES LIZARAZO VALBUENA** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
02/11/2021 **MVCB_ 4438 FLOR ALICIA SALCEDO CANO:** SSe realiza visita social de seguimiento a la obra, para verificar posible entrega. Se evidencia falta de remates en área de cocina y zona de lavandería.
03/11/2021 **MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES** Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La señora manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.
03/11/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA** Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa solicito a los maestros redistribuir el mesón, el área técnica verifica y realiza redistribución del espacio.
03/11/2021 **MVCB_3983 MARTHA JANETH LANDAZABAL** Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el avance de las obras, se realizan recomendaciones técnicas a los maestros.
03/11/2021 **MVCB_3984 BARBARA ORTIZ RUEDA** Se realiza seguimiento al predio y se habla con la beneficiaria quien informa estar conforme con el inicio de labores de los maestros en el predio, se explican actividades técnicas a los nuevos maestros
03/11/2021 **MVCB_3987 AURA MARIA BUSTAMENTE DE LOPEZ** Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría no se encuentra a la beneficiaria en el predio, se evidencia importante avance de obra.
03/11/2021 **MVCB_3991 OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS** Se realiza seguimiento social al predio por parte de obra e interventoría y la hija del beneficiario realiza consultas sobre temas relacionados con la pintura de techos, si es necesario mover la estufa y referente al lavaplatos del predio, se da claridad a las dudas por parte del área técnica
03/11/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria informa que se está cumpliendo con el compromiso de mejoramiento de cubierta por parte de ella, los maestros se encuentran trabajando en el predio
04/11/2021- **MVCB_4838 YENY ARLET AREVALO PACHON:** Recibe visita autorizado **EFRAIN GONZALEZ TÉLLEZ.** Se realiza visita social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de cielo raso. Falta instalación de puerta y remates para finalizar entrega. No reporta inconformidades con los avances en obra
04/11/2021 **MVCB_3880: FIDELIGNO RODRIGUEZ:** se realiza visita social de seguimiento a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro en la vivienda. No se reportan dudas y/o inconformidades.
04/11/2021 **MVCB_3888: GLADYS RODRÍGUEZ PALACIOS:** Se realiza visita de seguimiento social por parte de interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No reporta dudas. Expresa conformidad con los avances y personal de obra.

04/11/2021 **MVCB_3876: HERNANDO CALDERON CIFUENTES**. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades de sobrepeso. Se resuelven dudas frente actividades a desarrollar en cocina, se realiza orientación técnica, sin embargo se realizara mesón conforme a su solicitud. Se deja anotación en bitácora.
04/11/2021 - **MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados
04/11/2021 - **MVCB_4188: GURMENCINDA MONDRAGON.** Seguimiento, la vivienda se encuentra desocupada, se observa que la familia se encuentra levantando cubierta, está haciendo actividades simultáneas. Se paran labores constructivas hasta que la beneficia acabe de arreglar cubierta.
04/11/2021 - **MVCB_4198: LUCIO CIFUENTES VEGA.** Seguimiento. Se evidencia maestros encargados en la vivienda. El beneficiario no se encontraba en el momento de la visita.
04/11/2021 - **MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál la beneficiaria indica conformidad, se observan maestros en el predio .
04/11/2021 - **MVCB_4096: MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA.** Seguimiento en el cuál se observan a los maestros encargados. No sé encuentra la Beneficiaria.
04/11/2021 - **MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO.** La vivienda se Aperturo el 2 de noviembre y no se han presentado los maestros en el predio. El contratista indica que el lunes iniciaran labores. No se encuentra la beneficiaria en el predio. Se le solicita a la social hacer contacto teléfonico con la familia. Se realiza entrega de Kit de bioseguridad.
04/11/2021 - **MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ.** Se observa personal de obra en el predio.
04/11/2021 - **MVCB_3706: MARISOL VARGAS RAMÍREZ.** Se evidencia maestros en el predio y conformidad por parte de la señora Marisol.
04/11/2021 **MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ.** Seguimiento en el cuál el contratista le indica al beneficiario que el día de ayer los maestros retomarán labores constructivas.
04/11/2021 **MVCB_1072 , FLORINDA CADENA NINO,**SE REALIZA VISITA DE SEGUIMIENTO CON LOS TÉCNICOS Y SOCIALES DE INTERVENTORÍA ,Y CONTRATISTA SE EVIDENCIAN AVANCES EN OBRA .SE RETOMA OBRA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE
04/11/2021 **MVCB_3803,LUZ DARY SAENZ CAPERA** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021 **MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ TOQUICA,** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021 **MVCB_ 4843 MARISOL PALACIOS ANDRADE,** Se evidencia avances en obra, vivienda sin novedad.
04/11/2021 **MVCB_4900 MARTHA TERESA MEJIA CASTRO:** Se realiza seguimiento social a la obra por parte de interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades de estuco. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra. Se evidencia maestros ejecutando actividades en zona lavandería. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021 **MVCB_ 4475 MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARILLO.** Se realiza seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia personal de obra ejecutando actividades. Se resuelven dudas a la beneficiará frente algunas actividades en presupuesto. No expresa inconformidades con los avances
05/11/2021 **MVCB_ 4363 LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA.** Se realiza visita de seguimiento social a la obra en presencia de contratista e interventoria. Se evidencia maestros ejecutando actividades. No se reportan dudas y/o inconformidades.
05/11/2021 **MVCB_ 4365 OLGA BLANCO DE RIAÑO**. Recibe visita autorizada **GLADYS ARIAS,** arrendataria en la vivienda.Se realiza visita social a la obra,No se evidencia maestros en la vivienda. Poco avance en las obras, se alerta al contratista para dar continuidad a la obras.
05/11/2021 **MVCB_ 4366 GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO**. Se realiza seguimiento social a la obra por parte de contratista e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades de remates para finalizar las obras. No se reportan dudas y/o inquietudes.
05/11/2021 **MVCB_ 0005 GERARDO HUMBERTO CAMELO.** Atiende visita hijo autorizado **EDIXSON GERARDO CAMELO**. Se realiza visita de seguimiento social a la obra, se evidencia maestro ejecutando actividades. Se resuelven dudas frente actividades de remate. No reporta inconformidades con las obras ejecutadas.
05/11/2021 **MVCB_0474 MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ:** e realiza seguimiento social y técnica a la obra, en presencia de contratos e interventoria. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiaria expresa inconformidad con los maestros, debido a que no se evidencia mayor avances en las obras.
05/11/2021 **MVCB_0481: MARCO JULIO MARTÍNEZ MADERO.** e realiza seguimiento social a la obra con interventoria y contratista. Se evidencia maestro ejecutando actividades. Beneficiario expresa inconformidades con la intermitencia y poco avance en las obras.
05/11/2021 **MVCB_4085: GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.** Seguimiento en el cuál la beneficiaria indica conformidad, se observan maestros en el predio culminado labores para realizar la entrega.
05/11/2021 **MVCB_4175: MARIA ELCY MAYORGA.** Seguimiento de obra en el cuál la beneficiaria manifiesta conformidad con las obras. Se evidencia maestros encargados.
05/11/2021 **MVCB_4219 MAURICIO MARTIN BELTRAN** SE REALIZA SEGUIMIENTO PROFESIONAL TÉCNICO Y SOCIAL DE INTERVENTORÍA,Y DIRECTOR DE OBRA, SE EVIDENCIAN MAESTROS EN OBRA EN EJECUCIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL BENEFICIARIO,

05/11/2021 **MVCB_4401 , GLORIA STELLA ALARCON ,**SE EVIDENCIAN AVANCES EN ACABADOS EN OBRA , INSTALACIÓN DE LA PUERTA
05/11/2021 **MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO ,** SE EVICENCIAN AVANCES EN OBRA
05/11/2021 **MVCB_4003 MARIELA HOYOS VALENCIA** Se realiza visita de seguimiento social, se evidencia importante avance en habitación y cocina, la beneficiaria está conforme con las labores
05/11/2021 **MVCB_3709 GRACIELA QUINTERO** Se realiza seguimiento al predio, la beneficiaria informa que tan pronto le entreguen las dos habitaciones ella se moverá hacia estos espacios debido a la necesidad de reubicarse.
ENTREGAS
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
2/11/2021 **MVCB_3982 JULIA DEL CARMEN CASTRO** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
2/11/2021 **MV_42838-IDU DESIDERIO MAYORGA** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
2/11/2021 **MVCB _4401 GUSTAVO MARTINEZ PRIETO,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
03/11/2021 **MVCB_ 4351 JENNIFER ANDREA SALAZAR.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
05/11/2021 **MVCB_ 4561 ÁLVARO ANTONIO DAZA GALINDO:** Se realiza entrega a esposa autorizada **MIRIAM LÓPEZ**. de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
05/11/2021 **MVCB_ 4438. FLOR ALICIA SALCEDO CANO.** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
05/11/2021 - **MVCB_4085: GLORIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ..** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
5/11/2021 **MVCB_3809_ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
5/11/2021 **MVCB_4272_NIEVES LIZARAZO VALBUENA,** Se realiza entrega de vivienda a conformidad la beneficiario, en el cuál se firman los siguientes documentos: - Acta de entrega técnica. - Acta de cierre social. - Entrega de volante adhesivo de bioseguridad. - Socialización y entrega del manual de uso y mantenimiento. -Entrega de kit ecológico. -Vivienda libre de escombro. Sin novedades y/o inconformidadas.
RENUNCIAS
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
No se presentaron renuncias en el transcurso de la semana
PQRS
SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
no se presentaron renuncias en el transcurso de la semana.
ENGATIVA
BARRIO O TERRITORIO: UNIR
SOCIALIZACIONES
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
VALIDACIONES REALIZADAS

SEMANA 12 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana

VALIDACIONES FALLIDAS
NO se llevaron a cabo en el transcurso de la semana
APERTURAS
APERTURAS FALLIDAS
No se realizaron en el transcurso de la semana
SEGUIMIENTOS SOCIALES
02/11/2021- **MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario no se encontraba al momento de la visita
02//11/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
02/11/2021**- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
02/11/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades ejecutadas
02/11/2021- **MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
02/11/2021**- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
02/11/2021-**MVUN_099:FERNANDO MORENO MARIÑO,** ,Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
03/11/2021- **MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERANDEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la encargada del predio **MARILINDA HERNANDEZ** esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
03/11/2021-**MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
03/11/2021**- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
03/11/2021**- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
03/11/2021**-MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando

03/11/2021**- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
04/11/2021**- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, realizamos seguimiento debido a la problemática presentada con los maestros ya que el hijo del beneficiario no permitió el ingreso a la vivienda se deja acta de constancia de la visita y se aclara al beneficiario qué solo nos entenderemos con el para el proceso de mejoramiento
04/11/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
05/11/2021**-MVUN_464 TERESITA DEL NIÑO JESÚS GALVIS HENAO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita
05/11/2021**- MVUN_128 BLANCA STELLA ACUÑA LARA,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el esposo de la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021**- MVUN_290 DORIS ALCIRA CARILLO,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- **MVUN_241 MARTHA LUCIA LEYVA GUTERREZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, la beneficiaria no atendió a la puerta no hay maestros ejecutando actividades de obra.
05/11/2021**- MVUN_484 PEDRO IGNACIO PLAZAS,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, seguimiento de obra con maestro para ejecutar compromisos pactados el día de ayer donde no atienden a la puerta y el beneficiario no contesta el celular.
05/11/2021**- MVUN_299 LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO**, Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
05/11/2021**- MVUN_295 MIRIAM HAYDEE MORA MARTÍNEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021**- MVUN_174 MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO,**Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021-**MVUN_588**:**AMIRA PEREZ CORTES,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el encargado del predio **JUAN CARLOS CASTILLO** esta conforme con las actividades ejecutadas.
05/11/2021**-MVUN_132:GRACIELA ESPITIA MORALES,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021- **MVUN_424:MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCÓN,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la beneficiaria no se encontraba al momento de la visita.
05/11/2021- **MVUN_146: FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERANDEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, la encargada del predio **MARILINDA HERNANDEZ** esta conforme con las actividades que se estan ejecutando
05/11/2021-**MVUN_173 LILIA ADRIANA BELTRÁN RODRÍGUEZ,** Se realiza visita de seguimiento en compañia de los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría, se evidencian maestros realizando actividades de obra, el beneficiario esta conforme con las actividades ejecutadas.
ENTREGAS
04/11/2021- **MVUN_171 DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS,** Se hace entrega de vivienda a conformidad de la beneficiaria en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
04/11/2021**-MVUN_469:JUVENAL MELO PINZON,** Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
05/11/2021**-MVUN_099:FERNANDO MORENO MARIÑO,** Se hace entrega de vivienda a conformidad del beneficiario en el cuál se firman los siguientes documentos actas de entrega técnica, acta de cierre social, entrega de adhesivo con lavado de manos e informacion de bioseguridad, entrega del manual de uso y mantenimiento. y entrega de kit ecológico
RENUNCIAS

PQRS
03/11/2021 MVCB_4009 FLOR ALBA CORTES Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La señora manifiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.
PAC CIUDAD BOLIVAR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Carrera 18Q # 69-22 sur, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m Y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
PAC UNIR
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Durante este periodo se realizo atencion a la comunidad,en el punto de atención al ciudadano el cual se encuetra ubicado en la Calle 75 #119-26, el horario para la atención al ciudadano es el siguiente:Martes: 8:30 am a 12:00 p.m, y Sábados: 8:30 a 12:00 p.m.
HISTORIAS DE VIDA
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE
BARRIO O TERRITORIO
UNIR
HISTORIAS DE VIDA
21/10/2021- MVUN_174 MARÍA GLORIA ARDILA HERREÑO, postulación historia de vida
BARRIO O TERRITORIO
HISTORIAS DE VIDA
5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS
SEMANA 9 DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
N.A		

7. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
Imagen

VALIDACIONES		
SEGUIMIENTOS		
Seguimiento de obra. MVCB_4175 MARIA ELCY MAYORGA Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4188. GURMENCINDA MONDRAGON Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_4198 LUCIO CIFUENTES VEGA. Desarrollo Juan Pablo II**
		
Seguimiento de obra. MVCB_4085 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_4096 MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_0666 ALFONSO SAENZ FERNANDEZ. Desarrollo Compartir**
		

Seguimiento de obra. MVCB_3748: ANA CECILIA CAMACHO. Desarrollo Juan Pablo II	**Seguimiento de obra. MVCB_3771: ANDREA VANEGAS RODRÍGUEZ. Desarrollo Juan Pablo II**	**Seguimiento de obra. MVCB_3706. MARISOL VARGAS RAMÍREZ.. Desarrollo Juan Pablo II**
		
SEGUIMIENTO DE OBRA _2-11-2021 MVCB_4233 BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE Desarrollo Juan Pablo II	**SEGUIMIENTO DE OBRA _ 02-11 -2021 MVCB_3798 MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN Desarrollo Juan Pablo II**	**SEGUIMIENTO DE OBRA02-11-2021 MVCB_4929 PEDRO PABLO SALAMANCA, Desarrollo Juan Pablo II**
		

SEGUIMIENTO DE OBRA _02-11-2021 MVCB_4407 GLORIA STELLA ALARCON, Desarrollo Juan Pablo II	**SEGUIMIENTO DE OBRA _02-11-2021 MVCB_0213 JOSE LEONARDO SERRANO Desarrollo Juan Pablo II**	**SEGUIMIENTO DE OBRA _ 02-11-2021 MVCB_3822 SORY INES CORTES LOPEZ , Desarrollo Juan Pablo II**
		
SEGUIMIENTO DE OBRA _02-11-2021 MCVB_3809 ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ , Desarrollo Juan Pablo II	**SEGUIMIENTO DE OBRA _ 2-11-2021 MCVB_ 2243 HECTOR EUSTORGIO LOPEZ , Desarrollo Juan Pablo II**	**SEGUIMIENTO DE OBRA _ 2-11-2021 MCVB_ 3839 JOSE OLIVO CUADRADO , Desarrollo Juan Pablo II**
		

SEGUIMIENTO DE OBRA _ 2-11-2021 MCVB_ 4272 , NIEVES LIZARAZO VALBUENA Desarrollo Juan Pablo II	SEGUIMIENTO DE OBRA _04-11.2021 MVCB_1072 , FLORINDA CADENA NINO, Desarrollo Juan Pablo II	SEGUIMIENTO DE OBRA _ 04-11-2021 MVCB_3863 FABIO RODRIGUEZ TOQUICA, Desarrollo Juan Pablo II
		

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS				
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MVCB_4629	JORGE ANDRES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	22/10/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_099	FERNANDO MORENO MARIÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_128	BLANCA STELLA ACUÑA LARA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_132	GRACIELA ESPITIA MORALES	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVUN_146	FRANCISCO LUIS RAMIREZ HERNANDEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021															
MVUN_171	DEYSI CAROLINA BARBOSA MATEUS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	4/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_173	LILIA ADRIANA BELTRAN RODRIGUEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVUN_174	MARIA GLORIA ARDILA HERREÑO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVUN_290	DORIS ALCIRA CARRILLO MOYA	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVUN_295	MIRIAM HAYDEE MORA MARTINEZ	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVUN_299	LUZ MARINA CASTAÑEDA MONTENEGRO	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															

MVUN_372	JENNY MARCELA GUERRERO	UNIR II	RENUNCIA																			RENUNCIA, Se realiza contacto telefónico con la beneficiaria quién asegura que renuncia al subsidio ya que vendo su predio, se realizaron los respectivos seguimientos del caso y firma de los documentos pertinentes de la renuncia.
MVUN_424	MARIA ETELBINA CASTIBLANCO RINCON	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVUN_469	JUVENAL MELO PINZON	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	O4/11/2021	SI	SI	X			X								
MVUN_484	PEDRO IGNACIO PLAZAS	UNIR II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVUN_588	AMIRA PEREZ CORTES	UNIR II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/10/2021															
MVCB_2244	CARMEN CONCEPCION LOPEZ GARCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2413	MARIA CONCEPCION LOMBANA JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	5/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2414	LUIS ADOLFO TORRES SANCHEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	27/09/2021	14/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4929	PEDRO PABLO SALAMANCA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras, vivienda aperturada solo por el contratista(cubierta)	12/10/2021															
MVCB_4407	GLORIA STELLA ALARCON BAUTISTA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021															
MVCB_4561	ALVARO ANTONIO DAZA GALINDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_4791	ANA GRACIELA BELTRAN GONZALEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_2277	CARMENZA FLOREZ GALBAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	15/102021	SI	SI	X			X								
MVCB_3706	MARISOL VARGAS RAMIREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_3773	MARIA NELLY TORRES RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	25/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3984	BARBARA ORTIZ RUEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_4198	LUCIO CIFUENTES VEGA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_3991	OSCAR MANUEL PINTO PIÑEROS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021															
MVCB_3998	ETELVINA PUERTAS POVEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	3/11/2021															
MVCB_4185	PEDRO AVELINO JIMENEZ RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2615	CARMEN CECILIA BLANCO VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4003	MARIELA HOYOS VALENCIA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															

MVCB_4365	OLGA BLANCO DE RIAÑO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/03/2021																
MVCB_4366	GABRIEL BUITRAGO CASTIBLANCO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021																
MVCB_4011	MARIA SILVERIA SIGUA GUALDRON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/11/2021																
MVCB_2055	FELIX ALBERTO ZAMUDIO BERNAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_4401	GUSTAVO MARTINEZ PRIETO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_2242	AURA NELLY FIGUEROA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3669	GABRIELA MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Carta de autorización arrendataria INGRID PAOLA GARAVITO	8/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3710	JORGE EDUARDO MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021	23/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3798	MARIA ALIRIA MEDINA DE BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	22/10/2021																
MVCB_3809	ISABEL IBAÑEZ ALVAREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3863	FABIO RODRIGUEZ TOQUICA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021																

MVCB_3880	FIDELIGNO RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_3983	MARTHA JANETH LANZABAL	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_4009	FLORALBA CORTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021				X							Se realiza seguimiento social de obra e interventoría, La beneficiaria manfiesta que se perdió del predio un teléfono celular mientras se realizaban las labores de obra, no sabe exactamente el día, ni referencia del mismo, ni datos de valor del mismo, se abre PQRS.				
MVCB_4438	FLOR ALICIA SALCEDO CANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4498	ELCY RUTH ORTIZ MORENO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_4754	ALBERTO HUESO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4811	JAVIER HERNANDO SANCHEZ CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_4867	LUZ MARINA MEJIA CARMONA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	15/102021	SI	SI	X			X								
MVCB_0005	GERARDO HUMBERTO CAMELO HERNANDEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/10/2021															
MVCB_0213	JOSE LEONARDO SERRANO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_0474	MABEL ASTRID LOPEZ GAMEZ	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															

MVCB_0481	MARCO JULIO MARTINEZ MADERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	5/10/2021																
MVCB_0660	MARIA ETELVINA ATUESTA ARIZA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19-oct	SI	SI	X			X									
MVCB_0828	AMANDA UTELIA APONTE BLANCO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_0837	RAMIRO QUINTERO GUERRERO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_0838	LIGIA LOMBANA DE NUPIA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021																
MVCB_0897	CESARIO BONILLA VERA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_1072	FLORINDA CADENA NINO	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/201																
MVCB_3410	OCTAVIO VALENCIA LLANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	16/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3433	ELENA MOJICA DE GUTIERREZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X									
MVCB_3876	HERNANDO CALDERON CIFUENTES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																
MVCB_3888	GLADYS RODRIGUEZ PALACIOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021																

MVCB_4351	JENNIFER ANDREA SALAZAR MUÑOZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/10/2021	3/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4363	LUZ FABIOLA VIRGUEZ PINILLA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	6/10/2021															
MVCB_4475	MARIA SUSANA PIRAGAUTA CARRILLO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	28/10/2021															
MVCB_4751	MARIA LIGIA SOTO AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4900	MARTHA TERESA MEJIA CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/10/2021															
MVCB_2013	RENE MIGUEL FISCAL TORRES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2019	CLARA MARIA RESURRECCION LOPEZ RODRIGUEZ	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2020	BLANCA CUSTODIA MORENO DE MORALES	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X		SI									
MVCB_2034	AMINTA SABOGAL	MARANDU	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3721	ANA LUCIA VEGA AFRICANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021															
MVCB_3982	JULIA DEL CARMEN CASTRO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3987	AURA MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVCB_4072	SAIRA JAZMIN RAMIREZ VARGAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	25/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4096	MARIELA CASTAÑEDA DE AMAYA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4219	MAURICIO MARTIN BELTRAN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															
MVUN_241	MARTHA LUCIA LEYVA GUTIERREZ	Unir II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MV_42838-IDU	DESIDERIO MAYORGA	URBANIZACIÓN COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	4/10/2021	2/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3803	LUZ DARY SAENZ CAPERA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	15/10/2021															
MVCB_3839	JOSE OLIVO CUADRADO CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	12/10/2021															
MVCB_2355	ANA OTILIA BARRETO LEÓN	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4644	JOSE ALIRIO TORRES AVILA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/09/2021	12/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_0666	ALFONSO SAENZ FERNANDEZ	URBANIZACION COMPARTIR	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															

MVCB_2278	LUZ AMPARO NARANJO AGUIRRE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_2376	AURA ELENA RAMOS RESTREPO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3191	DORA ALBA RUBIO AVELLANEDA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3329	HECTOR JOSE ZAMBRANO GARZON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3396	ANGEL ESTELA MENDOZA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3650	MARTHA NUBIA POSADA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3703	HILDA VARGAS GRANADOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021	29/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3709	GRACIELA QUINTERO CAMPOS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_3748	ANA CECILIA CAMACHO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	2/11/2021															
MVCB_3752	JESUS ANTONIO LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	30/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3793	WILSON REINEL MORA CAICEDO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	20/09/2021	14/10/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3822	SORY INES CORTES LOPEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	21/10/2021															
MVCB_4175	MARIA ELSY MAYORGA RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_4628	JOSE ABELINO LEON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4694	HORACIO DE JESUS TORRES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4732	DORIS GALVIS PATARROYO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4744	ALVARO ZUBIETA TUNJANO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	7/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4838	YENNY ARLET AREVALO PACHON	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	14/10/2021															
MVCB_4843	MARISOL PALACIOS ANDRADE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	13/10/2021															
MVCB_2243	HÉCTOR EUSTORGIO LÓPEZ CUADRADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/10/2021															
MVCB_2621	ALIX ANGULO AMADO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	19/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3327	YESIKA LORENA TELLEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	8/10/2021	SI	SI	X			X								

MVCB_3311	MIYO FIGUEROA ROJAS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	7/09/2021	6/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3424	GIANNI GIOVANNA REYES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	27/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3425	PABLO ANTONIO CUERVO	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	15/102021	SI	SI	X			X								
MVCB_4085	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ JIMENES	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4188	GURMECINDA MONDRAGON DE MATEUS	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	11/10/2021															
MVCB_3771	ANDREA VANEGAS RODRIGUEZ	JUAN PABLO II	x		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	29/09/2021															
MVCB_4233	BEATRIZ CORREDOR RUSINQUE	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	23/09/2021															

MVCB_3353	ALCIRA MONGUI OCHOA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	8/09/2021	11/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_4272	NIEVES LIZARAZO VALBUENA	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	24/09/2021	5/11/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3351	YAMILETH MARTINEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	10/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								
MVCB_3360	MYRIAM JIMENEZ	JUAN PABLO II	X		SI	Visita de apertura de obra. Se presenta trabajadores y se deja bitacora en la vivienda, para allí reportar todos los avances de obra, material, como medio de comunicación, entre otras	9/09/2021	13/10/2021	SI	SI	X			X								

6 INFORME SISO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES EN DONDE SE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE.

INFORMACIÓN HSE

Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 11. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Así mismo, se realiza acompañamiento en las aperturas las cuales iniciaran obras así como de las viviendas que se encuentran en ejecución.

En este proceso se verifica el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Los escombros se están recogiendo de cada vivienda directo a volqueta para llevar a disposición final.

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME HSE** **SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/11/2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2021.	12
HASTA	7/11/2021		

1. Descripción de las Actividades Realizadas durante la semana

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de lo realizado

1. Acompañamiento y verificación de la Implementación de protocolo de bioseguridad en las Aperturas de vivienda, y durante la ejecución de los trabajos iniciados por parte de los maestros.
2. Entrega de Kits durante las nuevas aperturas para beneficiario y trabajadores, charlas de Divulgación de protocolo de Bioseguridad con apoyo del personal Social.
3. Se presentaron ingresos durante la semana por lo tanto se realiza inducción al personal operativo. Se realiza revisión de seguridad social correspondiente al personal que ingreso esta semana.
4. En las visitas de seguimiento de los MV, se realizaron charlas de Contaminación por aerosoles al personal operativo y al personal administrativo Uso adecuado del agua realizada vía wasap.
5. En visitas de seguimiento Bioseguridad se realiza recarga de Kit de personal Operativo, las que fuesen necesarias.
6. Durante las entregas de Viviendas, se deja constancia firmada de recibido sin escombro, por parte del área SST, las cuales hacen parte de los soportes de las viviendas. Así mismo se entrega la Señalética de Bioseguridad, dejando evidencia fotográfica.
7. Se Realiza Actualización del protocolo de Bioseguridad según Normatividad vigente la cual se basa en la Resolución No. 1687 Del 25 de octubre 2021, que modifica la anterior 777 emitida en 2021 y “Decreto 1408 del 3 Nov de 2021.
8. Se realiza la Instalación del Punto Ecológico de Localidad UNIR II dejando evidencia fotográfica.
9. Se realiza Verificación de Pin de Volqueta de vales entregados.
10. Entrega de informe Semanal.
11. En Visita de Seguimiento SST, en el MVBC 0666 se verifica el procedimiento de instalación de cubierta, se evidencia las respectivas inspecciones (taladro, pulidora, EPP y andamio) charla de seguridad y Acompañamiento de Coordinador de altura.

Las actividades de Bioseguridad, SST, Ambiente se han realizado puntualmente. Se hace el seguimiento en el formato Excel de las actividades planteadas y realizadas.

INTERVENTORIA
Durante las visitas se acompaña al personal SISO del contratista a las viviendas en ejecución y los seguimientos a uso correcto de los kits y el cumplimiento de protocolo, se refuerza la información suministrada a los maestros y el beneficiario; se verifica también el uso de uniforme y la entrega de EPP al personal activo, se verifica que se haga la recarga del kit de bioseguridad de los trabajadores en las casas que ya se agotó y se deja evidencia del mismo. Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre Riesgo publico refuerzo con el tema de robo y raponazo en la zona y como mitigarlo, se hace recarga de kit de bioseguridad al personal de interventoría. Se completo la información de Bioseguridad de las carpetas del primer corte para un total de 40 viviendas. Se hizo acompañamiento y verificación de kit y aplicación de protocolos en las casas que fueron validadas, en las que están en ejecución y durante las entregas, se cumple los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. La contratista continua el refuerzo mediante charlas para el correcto uso de EPP. Se verifica que, las viviendas entregadas no presenten escombros en la casa producto de los trabajaos ejecutados y que se realice la entrega de los afiches del correcto lavado de manos y clasificación de residuos con las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde). Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se verificaron los soportes entregados de afiliación a seguridad social, hasta la fecha van 11 extranjeros laborando, con su respectivo permiso del ministerio y cuenta con afiliaciones al día. Existen sectores en donde se ha evidenciado que el riesgo público es muy elevado y se han dado pautas para no realizar desplazamientos aislados, siempre debe hacerse en grupo, situación presentada en CB y en Engativá. Se revisa nuevamente el procedimeito para ttrabajar las cubiertas cuando se alcancen alturas superiores a 1.50 en el plano de trabajo, se emite oficio con correcciones.
2. CAPACITACION contratista
Charla contaminacion por aerosoles Uso adecuado del agua Trabajos en alturas Divulgacion del protocolo de Bioseguridad Inducción
2.1 CAPACITACION Interventoría
Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre Riesgo publico refuerzo con el tema de robo y raponazo en la zona y como mitigarlo.

3. Gestión Ambiental

Se verifica que en las entregas de MV se haya recogido el escombro y se haga entrega de las correspondientes canecas (Negra, Blanca, Verde).
En la semana hubo disposicion de escombros, se revisan pin de Volquetas de Vales entregados e instalacion del punto ecologico UNIR II.
Se utiliza la escombrera San Antonio y Cemex para disposición de residuos.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**12**	Escombrera Cemex- san Antonio	Se recibe copia de vale
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**18**	Escombrera Cemex- san Antonio	Se recibe copia de vale
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**48**	Escombrera Cemex- san Antonio	Se recibe copia de vale

4. Gestión en SST

• Se implementaron protocolos de Bioseguridad en las Aperturas de Vivienda, se hace el seguimiento a los beneficiarios y maestros.
• En las visitas a los MV se realiza charlas de Bioseguridad.
• Seguimiento al uso adecuado del kit de Bioseguridad que se ha entregado a los maestros y recargas si fuese necesario.
• Se refuerza al personal operativo con las charlas de seguridad de contaminación por aerosoles, uso adecuado del agua, trabajos en altura y Administrativo Uso adecuado del agua.
• Actualmente se cuenta con 11 personas extranjeras activas
• En las entregas programadas se verifica, que las viviendas estén libres de escombros
• Realización de inducciones al personal operativo.
• Se hace actualización de la legislación en el protocolo de Bioseguridad según normatividad actualizada el cual se enviará en informe mensual.
• El personal que ingreso cuenta con el overol correspondiente, botas, casco, gafas y guantes, se deja registro en las carpetas de cada persona.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semanal	**6720**	28,50	3,50	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total Mensual	**15888**	71,50	10,50	**1792**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Proyecto	**39168**	207,10	43,67	**7424**	**3**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico

CHARLAS DE SEGURIDAD	**INDUCCIONES SST**
	
MVCB 4233	**MVCB 3771**

ADECUACIONES DE ZONA DE REUNION INTERVENTORIA EN CB				
				
BIOSEGURIDAD INTERVENTORIA				
REGCARGA DE KIT INTERVENTORIA				
				

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	
	
ENTREGA KIT BENEFICIARIO MVCB 4003	**PUNTO ECOLOGICO PAC UNIR II**

INFORME SISO
INPLAYCO SAS

Fecha: SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA INPLAYCO SAS **797 - 2021** CONTRATISTA: **CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020 CONTRATO 794-2021**			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2- 2021.	140	6720	12,0	0,0		3,00	0,00	25,50	0,00	28,50			0	0						
				14	672				3,50	0,00	0,00	0,00	3,50			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0			0	0						
				154	**7392**	**12**	**0**	**0,0**	**6,50**	**0,00**	**25,50**	**0,00**	**32,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**				


ELABORO: ROBERT ROJAS - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 794 y 797 de 2021	
HORAS HOMBRE SEMANAL	7.392
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	17.680
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	46.592
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0,00
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0,00
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	32,00
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	82,00
HORAS CAPACITACIONES ACOMULADO TOTAL	250,77

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	12
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	18
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	48
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

Uso de agua de cada vivienda, incluyendo agua lluvia, no se ha adquirido agua adicional

INFORME SISO
INPLAYCO SAS
Fecha: SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CHARLA CONTAMINACION POR AEROSOLES CHARLA USO ADECUADO DEL AGUA CHARLA TRABAJOS EN ALTURAS				
	MVCB 3803	**MVCB 4900**	**MVCB 0481**	**MVCB 4791**
Se realiza charla de seguridad al personal Técnico y social en terreno sobre Riesgo publico refuerzo con el tema de robo y raponazo en la zona y como mitigarlo.				
	CHARLA DE SEGURIDAD			



INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021



CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	SI		
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	SI		
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	19/08/2021	SI		SURA	PORVENIR	SURA	SI		
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	19/08/2021	SI		SANITAS	PROTECCION	SURA	SI		
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	19/08/2021	SI		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	SI		
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	19/08/2021			FAMISANAR	PROTECCION	SURA		SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	19/08/2021	SI		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	SI		
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	28/08/2021	3/09/2021	SI		FAMISANAR	PROTECCION	SURA	SI		
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	7/09/2021	SI		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	SI		
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	11/09/2021		0	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA		SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	11/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	3/09/2021	8/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	10/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	11/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	3/09/2021	8/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	10/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	3/09/2021	10/09/2021		SI	ASMET SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	9/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	9/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	10/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
28	DAVID PEREZ	4.058.788	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	3/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	4/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	9/09/2021	10/09/2021		SI	COOSALUD	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	9/09/2021	10/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	10/09/2021		SI	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	10/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	22/08/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	14/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	15/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	15/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	15/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	15/09/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	15/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	15/09/2021		SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	15/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	14/09/2021	16/09/2021	SI		SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	16/09/2021	20/09/2021		SI	COOSALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	16/09/2021	20/09/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	16/09/2021	20/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	16/09/2021	20/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	16/09/2021	20/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	16/09/2021	20/09/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	16/09/2021	20/09/2021		0	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA		SI	
61	ALFONSO GIL	11.331.142	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	23/09/2021	25/09/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	23/09/2021	25/09/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	23/09/2021	25/09/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	23/09/2021	25/09/2021		SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	23/09/2021	25/09/2021		SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	23/09/2021	25/09/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	23/09/2021	25/09/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	30/09/2021	4/10/2021		SI	MEDIMAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	30/09/2021	4/10/2021		SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	SI		
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	30/09/2021	4/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	SI		
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	30/09/2021	4/10/2021		SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	30/09/2021	4/10/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	30/09/2021	4/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	30/09/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	30/09/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	1/10/2021	4/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	1/10/2021	4/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	1/10/2021	4/10/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
106	ANDRES COBA	3.734.768	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	25/10/2021	26/10/2021		SI	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	25/10/2021	26/10/2021		SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
115	DAVID PUENTES	804.533.177	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	25/10/2021	26/10/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	25/10/2021	26/10/2021		SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	25/10/2021	26/10/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	25/10/2021	26/10/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	30/10/2021	2/11/2021		SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	30/10/2021	2/11/2021		SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	30/10/2021	2/11/2021		SI	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	30/10/2021	2/11/2021		SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	30/10/2021	2/11/2021		SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	30/10/2021	2/11/2021		SI	EPS SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	30/10/2021	2/11/2021		SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	30/10/2021	2/11/2021		SI	PORVENIR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					13	127	0	0	0	140	3	

INFORME SISO

Fecha: SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	29/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	27/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	13/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	29/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**127**	**143**	**0**	**140**	**3**	

INFORME SISO COVID

Fecha: SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO: 794-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ORIP SAFRICON 2020

RELACIÓN PERSONAL 7. Relación de actividades generales en donde se evidencie el cumplimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad, así mismo, el interventor deberá informar sobre el cumplimiento o incumplimiento de este.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
1	NANCY ALEJANDRA CHARRY AVILA	1.015.413.551	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
2	JUAN ANDRES CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358	19/08/2021	24/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
3	DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	1.068.972.008	19/08/2021	12/08/2021	SI	0	SI		SI	0	0
4	JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579	19/08/2021	27/04/2021	SI	0	SI		SI	0	0
5	JOSE DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	19/08/2021	1/12/2020	SI	0	SI		SI	0	0
6	LEDA LUZ LAMBIS CASTRO	22.732.637	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
7	NATALIA TORRES	1.014.195.383	19/08/2021	21/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
8	ROBERT ANDREY BENAVIDEZ NOVOA	1.019.026.005	19/08/2021	11/11/2021	SI	0	SI		SI	0	0
9	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	64.583.890	19/08/2021	10/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
10	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883	19/08/2021	23/11/2020	0	0	SI		0	SI	PAZ Y SALVO OK
11	YULY ANDREA CASAS MERCHAN	103.238.457	19/08/2021	23/11/2020	SI	0	SI		SI	0	0
12	MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1.019.004.481	3/09/2021	1/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
13	VALENTINA ANDRADE	1.004.232.601	7/09/2021	8/09/2021	SI	0	SI		SI	0	0
14	ANTONIO JOSE OSORIO HERNANDEZ	79.656.535	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
15	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	11/09/2021	2/04/2021	0	0	SI		0	SI	PERMISO DE TRABAJO
16	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
17	JHONATAN DIAZ	1.033.690.704	8/09/2021	1/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
18	JOEL FLOREZ JUSAYU	1.124.508.730	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
19	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	11/09/2021	2/04/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
20	WUILLIAM JOSE ZAVALA ALVAREZ	916.866.813.041.981	8/09/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
21	MARCO OSORIO	80.096.384	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
22	OSWALDO RINCON VIZCAINO	1.047.512.742	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
23	VICTOR RIZO	1.066.097.223	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
24	WILLIANS JOSE MERIÑO	1.032.510.255	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
25	ANGEL ESCOBAR	8.500.059	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
26	DAIRO CARDENAS	1.043.606.888	9/09/2021	30/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
27	YEISON TOVAR	1.023.022.436	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
28	DAVID PEREZ	4.058.788	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
29	WILLY HERAZO	11.511.469.840	10/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
30	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	10/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
31	JULIO RAMON ESPINOZA ALVARADO	958.208.515.031.988	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
32	NELSON BARRAZA	1.127.956.602	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
33	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	10/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
34	OMAR CIFUENTES	1.124.827.805	10/09/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
35	EDWIN RODRIGUEZ VIDAL	93.394.589	10/09/2021	20/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
36	BRAYAN ESTIVEN LOPEZ MOLINA	1.024.602.801	15/09/2021	1/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
37	DALADIER CUELLAR GONGORA	79.637.053	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
38	RONETT TORRES CORREDOR	1.010.244.181	15/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
39	MICHAEL SALAS CELIS	1.033.766.212	15/09/2021	15/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
40	OSCAR BEJARANO CORREAL	1.031.138.124	15/09/2021	10/05/2021	0	SI	SI		SI	0	0
41	RAFAEL ORTIZ OSPINO	72.124.768	15/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
42	EMILIO TIQUE WEPA	6.716.720	15/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
43	GUILLERMO BERMUDEZ ECHEVERRY	16.833.656	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
44	JAISON ACERO DE LA ROSA	1.044.391.694	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
45	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	15/09/2021	7/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
46	ROBINSON JIMENEZ FAJARDO	1.000.695.768	15/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
47	LUIS CARLOS MENDOZA GAMEZ	17.971.346	15/09/2021	23/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
48	YOEDINSON VENENCIA MORENO	1.101.879.446	15/09/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
49	LORENA PINILLA GALINDO	1.018.409.894	16/09/2021	20/03/2021	SI	0	SI		SI	0	0
50	EDINSON JOSE VENENCIA SARABIA	72.120.789	20/09/2021	21/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
51	EDWIN BERMUDEZ SANCHEZ	1.033.776.296	20/09/2021	22/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
52	HECTOR JOSE MUÑOZ ORTIZ	15.950.399	20/09/2021	23/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
53	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	20/09/2021	24/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
54	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	20/09/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
55	JEISSON ARTURO MORENO VALERO	1.023.919.433	20/09/2021	26/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
56	KEVIN ALEXIS MONTILLA CASTILLO	1.000.933.504	20/09/2021	27/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
57	LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	20/09/2021	28/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
58	LUIS ALFONSO TELLEZ MEDINA	3.166.236	20/09/2021	29/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
59	ORANGEL NAVARRO CHICA	19.769.448	20/09/2021	30/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
60	WILSON BERNAL GUASCA	1.033.707.175	20/09/2021	31/03/2021	0	0	SI		0	SI	0
61	ALFONSO GIL	11.331.142	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
62	DUVAN GALEON	1.001.274.099	25/09/2021	9/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
63	EDILBERTO VEGA	3.254.832	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
64	EDWIN MARTINEZ	1.033.797.144	25/09/2021	19/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
65	EVELIO RODRIGUEZ	74.327.696	25/09/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
66	FABIAN TORRES GARCIA	79.808.126	25/09/2021	17/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
67	FREDY TOVAR ALVAREZ	80.894.735	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
68	GABRIEL RINCON MUÑOZ	1.023.024.542	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
69	GUSTAVO VILLA MONTES	16.112.729	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
70	HELI RAMIREZ PERALTA	79.734.766	25/09/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
71	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	25/09/2021	16/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
72	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	25/09/2021	4/02/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
73	YEFERSON VENENCIA ESCAMILLA	1.045.168.773	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
74	JORGE VILLEGAS CEBALLOS	1.033.718.988	25/09/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
75	JOSE CORTEZ PEÑA	3.214.339	25/09/2021	25/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
76	JOSE CRUZ LOPEZ	5.873.025	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
77	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
78	LUIS ESCOBAR OJEDA	1.065.858.270	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
79	LUIS OSPINO OJEDA	1.192.910.231	25/09/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
80	MIGUEL BERMUDEZ NIETO	79.886.043	25/09/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
81	OSCAR YAGARI YAGARI	15.532.551	25/09/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
82	RAFAEL ORTIZ OSPÌNO	72.124.768	25/09/2021	28/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
83	SILVIO OROZCO CARRILLO	79.550.691	25/09/2021	9/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
84	WILLIAM ARCOS PINZON	79.721.373	25/09/2021	13/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
85	ANDRES BARAHONA	80.256.059	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
86	CARLOS BOLAÑOS	94.500.918	4/10/2021	14/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
87	DELIO ALVAREZ NINCO	1.075.794.157	4/10/2021	15/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
88	FABIO LOPEZ	80.124.049	4/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
89	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	4/10/2021	15/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
90	FERNEY CUADRADO RODRIGUEZ	1.024.478.878	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
91	FRANCISCO DUQUE ARIZTIZABAL	16.045.057	4/10/2021	21/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
92	HILDER MORENO RIAÑO	1.070.004.477	4/10/2021	16712/2020	0	SI	SI		SI	0	0
93	JHON RAMOS YAGUARA	80.748.603	4/10/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
94	JHONATAN MAZA MOSQUERA	1.030.659.050	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
95	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	PERMISO DE TRABAJO
96	JOSE VIZCAINO VENENCIA	72.158.125	4/10/2021	22/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
97	JOSE CONDE AMARIS	1.051.678.837	4/10/2021	24/06/2021	0	SI	SI		SI	0	0
98	JUAN TAPIA	1.042.444.303	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
99	LUIS CASTELLANOS CASTAÑEDA	79.063.927	4/10/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
100	LUIS TRUJILLO LAGUNA	11.226.859	4/10/2021	27/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
101	MICHAEL RODRIGUEZ ACOSTA	1.000.781.120	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
102	OSCAR ZAQUE NOVA	80.250.455	4/10/2021	9/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
103	RAUL OSORIO RINCON	79.669.250	4/10/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
104	RICARDO NOVA GOMEZ	80.441.388	4/10/2021	14/01/2021	0	SI	SI		SI	0	0
105	YEFERSON GUALTEROS	1.024.552.631	4/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
106	ANDRES COBA	3.734.768	26/10/2021	6/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
107	CRISTIAN TANGARIFE	1.013.682.148	26/10/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
108	CRISTIAN HOYOS	1.033.807.092	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
109	DANIEL MARTINEZ	1.048.291.059	26/10/2021	12/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
110	DIEGO FORERO	1.024.499.971	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
111	GUILLERMO MOSQUERA	11.636.053	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
112	WILMAR RODRIGUEZ	1.033.769.134	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
113	CARLOS LOPEZ VALENCIA	1.031.170.297	26/10/2021	25/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
114	CRISTIAN CASAS	1.030.525.271	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
115	DAVID PUENTES	804.533.177	26/10/2021	4/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
116	EDGAR ALARCON	1.032.448.252	26/10/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
117	FABIO LOPEZ	80.124.049	26/10/2021	11/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
118	MISAEL PERDOMO	1.033.730.393	26/10/2021	21/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
119	JUAN GOMEZ	79.663.473	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
120	JAISON MOSQUERA	11.706.561	26/10/2021	20/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
121	JHONATAN MAZA	1.030.659.050	26/10/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
122	JOSE BEJARANO	1.106.712.934	26/10/2021	14/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
123	JOSE GONZALEZ	79.419.331	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
124	WILMER GARZON	1.033.686.597	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
125	MICHAEL CAMACHO	1.033.730.393	26/10/2021	11/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
126	LUZ MOLINA	1.023.861.680	26/10/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		DIVULGACIÓN PROTOCÓLO		ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	SI	NO	ACTIVO	RETIRADO	
127	FERNANDO GUERRERO	5.996.412	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
128	GIAN CARLO PIRACOCA	1.000.952.382	2/11/2021	2/12/2020	0	SI	SI		SI	0	0
129	MILTON GONZALEZ	1.024.545.737	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
130	MOISES MARTINEZ	1.065.664.331	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
131	NICOL ESQUIVEL	1.033.680.587	2/11/2021	19/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
132	VICTOR DIAZ	79.924.141	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
133	VICTOR MOSQUERA	73.007.787	2/11/2021	29/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
134	WILLIAM CUESTA	79.978.299	2/11/2021	28/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
135	WILMER TORRES	1.012.426.714	2/11/2021	25/03/2021	0	SI	SI		SI	0	0
136	YIMMY GONZALEZ	73.551.742	2/11/2021	21/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
137	RICHEL FERNANDEZ	1.140.371.927	2/11/2021	5/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
138	WILLIAM PARRAGA	79.599.287	2/11/2021	8/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
139	LUIS ROMERO	1.065.855.982	2/11/2021	20/09/2021	0	SI	SI		SI	0	0
140	DUBAN MOLINA	1.233.913.852	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
141	EDSON ROMERO	1.024.604.236	2/11/2021	27/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
142	FABIAN CHAVEZ	80.110.636	2/11/2021	14/04/2021	0	SI	SI		SI	0	0
143	FERNANDO MORENO	3.199.429	2/11/2021	13/10/2021	0	SI	SI		SI	0	0
RESULTADOS:					**13**	**127**	**143**	**0**	**140**	**3**	

SEMANA DEL SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021					
	NOMBRE	PERMISO DE TRABAJO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	ESTADO
1	ALEXIS MENDEZ GARCIA	961.936.803.121.980	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
2	GABRIEL FERNANDEZ	773.439.426.021.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
3	JULIO ESPINOZA	958.208.515.031.988	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
4	WUILLIAM ZABALA	916.866.813.041.981	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
5	ROBERT SALAZAR	835.913.327.071.985	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
6	JUNIOR BRACHO GONZALEZ	831.775.706.081.987	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
7	HECTOR CHOURIO	723.480.411.071.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
8	RICHARD RODRIGUEZ MARQUEZ	836.225.801.071.979	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
9	HENRY JOSE MALDONADO PERAZA	97.876.913.101	JUAN PABLO	VENEZOLANO	RETIRADO
10	JAVIER PAREDES BRICEÑO	917.402.620.121.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
11	JUAN PEROZO ROMERO	832.140.302.061.977	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
12	FELIX VELAZQUEZ VELAZQUEZ	737.035.804.021.982	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
13	JOHAN ZERPA	922.650.031.121.978	JUAN PABLO	VENEZOLANO	ACTIVO
14					
15					
16					
17					
18					
19					

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 794 DE 2021**

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021				
REALIZADO POR	**ROBERT ROJAS**	**FECHA**	**7 DE NOVIEMBRE 2021**	**PERIODO**	**MES 3**

PLAN DE TRABAJO SG SST		**AÑO 2021**																							
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**Agosto**				**Septiembre**				**Octubre**				**Noviembre**				**Diciembre**				**Enero**			
		0	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**5**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
				E		E	E	E	E	E	E			E	E										
Verificacion de afiliación y/o pagos al Sistema General de Riesgos Laborales	Contratista			P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				E		E	E	E	E	E	E			E	E										
Elaboración de protocolo general	Contratista			P																					
				E																					
Elaboración de protocolo de socializacion	Contratista			P																					
				E																					
Implementacion de protocolo de socializacion a la comunidad (beneficiarios) sobre el proyecto	Contratista				P																				
					E																				
Inducción a personal administrativo	Contratista				P																				
					E																				
Divulgación protocolo personal administrativo	Contratista				p																				
					E																				
Inducción a personal Operativo	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
							E	E	E	E	E			E	E										
Charlas informativas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Verificacion diaria de los elementos de bioseguridad - Protocolo de Bioseguridad	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP (trabajadores)	Contratista						p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Seguimiento del protocolo de bioseguridad (PAC)	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Diligenciamiento de encuesta de enfermedades	Contratista					P			p				p				p				p				p
						E			E				E												
Diligenciamiento de formatos de encuesta de salud y reporte de sintomas	Contratista					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
						E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Entrega y seguimiento de kits a trabajadores y beneficiarios	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Informes semanales	Contratista			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E										
Informes Mensuales	Contratista								P				P				P				P				P
									E				E												
Diligenciamiento de permiso de trabajo en alturas	Contratista																								

OBJETIVO:	Hacer el seguimiento a las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realizarán durante el proyecto de mejoramiento de vivienda contrato 794 de 2021																							
REALIZADO POR	ROBERT ROJAS							FECHA	7 DE NOVIEMBRE 2021										PERIODO				MES 3			
PLAN DE TRABAJO SG SST	AÑO 2021																							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
		0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22
Inspección pulidoras	Contratista								P				P				P				P				P
									E				E												
Inspección botiquin	Contratista								P	P			P				P				P				P
									E	E			E												
Recogida de escombros	Contratista								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
									E		E	E	E	E	E										
Revision de vales de escombro y pin de volqueta	Contratista						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
							E		E	E	E	E	E	E	E										
diligenciamiento del formato recogida de escombro(final entrega de vivivenda)	Contratista										p		p				p				p				p
											E		E												
Recarga de elementos de bioseguridad si fuese necesario	Contratista							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
								E	E	E	E	E	E	E	E										
Seguimiento incidentes y accidentes laborales(cuando ocurra el evento)	Contratista																								
Actualizaciones de protocolo de bioseguridad, según la normatividad vigente.	Contratista					P									P										
						E									E										
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL																									
P	Programado	Actividades programadas	0	0	5	4	9	11	12	19	14	14	13	20	13	14	13	20	13	13	13	20	12	12	12	16
E	Ejecutado	Actividades ejecutadas	0	0	5	4	9	11	11	17	13	14	10	15	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	89,47%	92,86%	100,00%	76,92%	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% CUMPLIMIENTO PROGRAMA QUINCENAL	0,00%		100,00%		100,00%		90,32%		96,43%		75,76%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
		PROMEDIO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	100,00%				94,12%				85,25%				45,00%				0,00%				0,00%			
		% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA PROYECTO	46,58%																							

REGISTRO FOTOGRAFICO



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLAS DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
4009		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	INDUCCIONES PERSONAL OPERATIVO INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
3991		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	VIVIENDAS LIBRES DE ESCOMBROS INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
660		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE EPP INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD TRABAJADORES INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
838		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE BIOSEGURIDAD BENEFICIARIO INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
4003		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	DIVULGACION PROTOCOLO BIOSEGURIDAD INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
4085		



MVCB	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECARGA DE KIT TRABAJADORES INFORME SEMANAL DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
213		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3822		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3863		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4407		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ENTREGA DE KIT DE TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4929		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEGUMIENTO DE KIT DE BENEFICIARIO SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
4475		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACION POR AEROSOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
3822		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACION POR AEROSOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
3863		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CHARLA DE SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES DE CONTAMINACION POR AEROSOLES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE
4233		

REGISTRO FOTOGRAFICO



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
213		




MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
424		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
464		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3798		

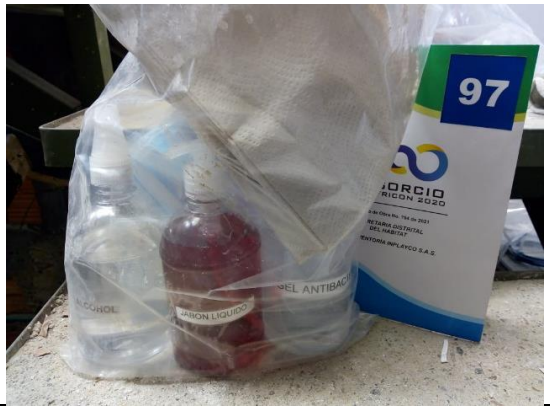

MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3809		



MV	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SE VERIFICA KIT DE LOS TRABAJADORES SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2021
3822		
