Granada	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1520 de 2020**, MUNICIPIO DE GRANADA - **META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE DE 2021**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Granada-Meta.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta.			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DEL META			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$ 1.250.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-12-2020			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30-08-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-08-2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JUAN PABLO NEIRA CALDERON		**DESDE:** 09-02-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	Ing. FREDY HERNAN PEREZ (alcalde- Supervisor)		24-12-2020	08-02-2021
	Arq. Iván Dario González Cuellar		24-12-2020	16-02-2021
	Ing. José Andrés Reales		17-03-2021	15/03/2021
	Arq. Iván Dario González Cuellar		16-03-2021	30-06-2021
	Doc. Laura Cristina Quintero		01-07-2021	12-07-2021
	Ing. Remberto Martinez		13-07-2021	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	Ing. NELSON LOAIZA GUTIÉRREZ (Secretario de Planeación- Apoyo a la supervisión)		24-12-2020	08-02-2021
	Ing. Diego Fernando Poveda Castañeda (Profesional Universitario Alcaldía de Granada Meta)		09-02-2021	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO (OBRA)	No. 720.19.0292		10-02-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO (OBRA)	No. 720.89.0601		10-05-2021	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO (INTERVENTORÍA)	No. 720.19.0291		10-02-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO (INTERVENTORÍA)	No. 720.89.0603		10-05-2021	

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000518	30-12-2020	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-12-2020		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 31/10/2021	
		FECHA:	
		FECHA:	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)		**FECHA:**	
		FECHA:	
		FECHA:	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** 01/05/2022 (CUMPLIMIENTO)		
	FECHA: 01/05/2022 (CALIDAD DEL SERVICIO)		
	FECHA:		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0,00		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0,00		

2. **ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**
   - ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	NO APLICA	05/02/2021	$ 125.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO				
TERCER DESEMBOLSO				

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

CUARTO DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				

3. **PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO**

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

POLIZA INICIAL

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000518	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	24/12/2020	01/03/2022
	Calidad del servicio	$ 250.000.000,00	24/12/2020	01/03/2022

ACTUALIZACION SEGÚN PRORROGA 01

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000518	Cumplimiento	$ 250.000.000,00	01/03/2022	01/05/2022
	Calidad del servicio	$ 250.000.000,00	01/03/2022	01/05/2022

4. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**
   - ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA	VALOR
No. del contrato	**Detalle del Proceso Número: LP-001-2021 - Contrato de Obra No. 210.29.03.05 del 10 de mayo de 2021**	$ 1.124.999.994,69
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-1-215107&g-recaptcha-response=03AGdBq27-FmcXQjuPFKNpCmhi-IX0Mc8-04FsbGUwqDqPIXHS42KKjm8mVTupmITZUTbLOxwvv1h_HpnGJnQleBobDHWWeDqnfw9Im00sffHjKo8ZK9ZcAs7aydA_D7aRQITReeJperYVUdNvvCiQmdq-vNdwptfSV3oyG76muOSaodjw5-eO5e26GlPph47I-UsQFckVKYr-fuhhxQaUdJGflsRh4lNAvvmxIRsVppy1VgXsgSARWv9k-mlYvmVbzltsmpvdCIBmW5d9IO9St_rtFK8liWx-QM40bc6jHLre86RdMxrqGLFvuOBgVv4k8vx3DWEiPm0xxMDhnneopHWSG4QBrY_dC_3nbCDk5vK1isk5C-joRXWyW8oLJx42OttOazAzfnldlg1Fj5kUscdwsGvZd4a_F9e6DbhYtZZdkiSE63JmGM_g93s6vN2B4Y3w6fy135jCpYCL4NqPMJVLj2E-9dt75g	

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE R/L ESMERALDA LOPEZ PINEDA		NIT. 901481871-1 C.C. 1.007.168.155
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/05/2021		6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION 01	19/07/2021 – 02/08/2021	
Fecha Inicial de terminación del contrato	12/11/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	27/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1,124.999.994,69
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA No.	No. CBC-100003608 **Aprobada:** 13/05/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/05/2021 – 10/03/2022		
	Prestaciones sociales: 10/05/2021 – 10/11/2024		
	Calidad del Servicio: 10/11/2021 – 10/03/2022		
	Estabilidad de la Obra: 10/11/2021 – 10/11/2026		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**"INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA"**		**VALOR**
No. del contrato	**Detalle del Proceso Número: CM-001-2021 - Contrato de Interventoría No. 210.29.11.04 del 10 de mayo de 2021**		$ 125,000,000
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-11791396&g-recaptcha-response=03AGdBq26KdXbvylBaYy15iNTRTaFw9SR9AT9q9t0K-ASAzDxybVuKTvIa7yEi4u-9lRAqrU5W7ndRj4lC2cXsqOleS1lejOlG8Sv267clbClIVktkUV1Xe0fnRV962nMJpbtyUZLKOj1lcEb7YxRiFEWn0RIKwnqnH-Q7G66UANaS9cTK8b5wa0BI-itferLPjBflWUMQUBGe97R6njt_qcFoBtH94CloWu_Z_pGRtFpetoyhCHzPaTGiLzcJqPzqmq6l1PO-504AaK7NFsiw_V--PbldeJrD1XghAajrDVnrgrDqPilP5yc_e-pcmzbm3VbL1Qia7rlfkDELqBopwHlzlmilYlucZh6lBzx_-N-i7oaH26C2eZ1ozhRUHvnRVhT01vrdU7BlC94c03Z-ErRq5H7ALc9CADh0PWvhkQyIy6tZEuo8_rzq5dWCdAK2GBXQd_9N7_YgTVxGjlKankwKf-LbGiPksw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)			
Nombre contratista	EDISON FABIAN PIRANEQUE R/L EDISON FABIAN PIRANEQUE		NIT. 1049602593-9 C.C. 1.049.602593
Fecha de Acta de inicio del contrato	13/05/2021		6 meses
	SUSPENSION 01	19/07/2021 – 02/08/2021	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)			
Fecha Inicial de terminación del contrato	12/11/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	27/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125,000,000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	No.63-44-101011150 Aprobada: 13/05/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/05/2021 – 10/03/2022		

5. INFORME TÉCNICO

INTRODUCCION	El SACÚDETE AL PARQUE, es un proyecto de infraestructura, que contempla espacios que permiten el desarrollo de actividades al aire libre como auditorio abierto para actividades de interés social y cultural, un gym biosaludable, para actividad fisica moderada, una cancha de césped sintético, para actividades deportivas específicamente futbol, espacios con juegos infantiles para actividades de recreación, una sala comunitaria para múltiples actividades, espacio para desarrollar una cafeteria, y los demás espacios de complementación tales como baños, parqueaderos de bicicletas, guía táctil para invidentes y elementos de espacio público y zonas verdes. Ubicado en el predio con cedula catastral No. 503130100000004080001000000000 identificado jurídicamente con Folio de Matricula inmobiliaria No. 236-25584, sobre la Calle 4 con Carrera 17 en el barrio Palma Real del Municipio de Granada Meta. Estos espacios fueron pensados y diseñados acorde a la indole del proyecto y su enfoque social, cultural, deportivo y recreativo, dentro del esquema básico anexado se pueden contemplar cada uno de estos espacios mencionados y como se vinculan los unos con otros, a la vez su armonía y desarrollo con el entorno existente, logrando una articulación adecuada que no genera grandes impactos, con el que se benefician 70.577 habitantes del municipio. El convenio fue suscrito por la plataforma SECOP II el dia 24 de diciembre del 2020, con numero de proceso CD-1537-2020, con el título "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - GRANADA - SUBDIRECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA" con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META". Posteriormente se realiza mesa técnica virtual con el apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, para adelantar documentación para el primer desembolso; se dio acta de inicio el 30 de diciembre de 2020. Finalmente se envió la documentación pertinente para el desarrollo de las actividades contempladas ya mencionadas. Se realiza visita técnica al predio designado para el proyecto, donde se realizan labores de descapote, nivelación y compactación del mismo, se lleva a cabo registro fotográfico y se visualizan los puntos de conexión a servicios públicos, vías aledañas y demás aspectos del terreno.

	Se lleva a cabo comité virtual el día 26 de enero de 2021 con el apoyo a la supervisión para la revisión del cumplimiento de los compromisos del convenio y solicitud de los informes mensuales. El día 05 del mes de febrero de 2021 se recibe el primer desembolso por parte del ministerio correspondiente a CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 125.000.000,00) M/cte y se adelanta el procedimiento para el lanzamiento del proceso precontractual del "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA" y la "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA". Además, se inician trabajos de gestión para la instalación de la valla informativa en el lugar del proyecto. Se lleva a cabo comité virtual el dia 04 de marzo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con la publicación del proceso precontractual de los contratos derivados al convenio, la instalación de la valla informativa en el sitio del proyecto, el reenvió de los informes mensuales y realizar la publicación del proceso precontractual en el SECOP II, este último no se pudo ejecutar a la fecha establecida teniendo en cuenta que se presentaron inconvenientes con la plataforma. Posteriormente se les da cumplimiento a los compromisos, enviando la información requerida y dando agilidad al inicio de los procesos derivados del convenio y se realiza la instalación de la valla informativa. El dia 13 de abril de 2021, se realiza visita técnica de inspección ocular al predio objeto del proyecto, en compañia de la supervisión del ministerio del interior, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos correspondientes al alistado del predio, acceso de servicios públicos y colocación de la valla informativa. Se lleva a cabo comité virtual el dia 30 de abril de 2021, donde se realiza seguimiento de los compromisos adquiridos en anteriores comités, revisión de alistamiento del terreno, colocación de la valla informativa y seguimiento al proceso de la solicitud de la prorroga 01. Se lleva a cabo comité virtual el dia 03 de mayo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con la continuación del trámite y documentos para la solicitud de la prorroga 01 al convenio. Se lleva a cabo revisión de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de los escombros del predio donde se desarrollará el proyecto, la supervisión designada de la Secretaria de Infraestructura del municipio, hace énfasis en el cumplimiento de dichas actividades, como se evidencia en el informe 02 correspondiente al mes de enero. Se lleva a cabo comité virtual el día 11 de mayo del 2021, donde se asumen compromisos relacionados con dar inicio a los contratos derivados del convenio, y citar reunión a dichos contratistas la siguiente semana para verificación de las actividades adelantadas, según etapa de estudios y diseños. Nuevamente se lleva a cabo revisión de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de los escombros del predio donde se desarrollara el proyecto, a lo cual la supervisión del MININTERIOR, hace un llamado de atención por posible incumplimiento; la supervisión designada de la Secretaria de Infraestructura del municipio, hace énfasis nuevamente en el cumplimiento de dichas actividades, como se evidencia en el informe 02 correspondiente al mes de enero; sin embargo, atiende el llamado de la supervisión designada del ministerio, para hacer corrección de las actividades y nivelar nuevamente a la cota correspondiente según los lineamientos de la urbanización.

	Los contratos derivados del convenio en mención se fueron adjudicados y posteriormente suscritas las minutas correspondientes el dia 10 de mayo de 2021. Posteriormente se dan actas de inicio el dia 13 de mayo de 2021. Se lleva a cabo comité virtual el dia 18 de mayo del 2021, donde se revisan compromisos según anterior comité, además, de acuerdo a los trabajos realizados por la consultoria supervisada por la interventoria, derivados del proyecto, se da a conocer en el comité virtual, la existencia de una tuberia subterránea, perteneciente a un colector de un sistema pluvial de la urbanización, la cual pasa al costado del lote; por ende la supervisión del Ministerio del Interior designada para el proyecto, ve impertinente la construcción del proyecto en esta zona, por lo cual hacen necesaria la evaluación por parte del Municipio para la reimplantación del proyecto hacia el costado derecho del mismo, en donde no se presenten inconvenientes con redes subterráneas, que a largo o corto plazo, impliquen trabajos y/o daños en la nueva construcción. A lo que el Municipio dentro de sus facultades, Evaluando la situación presentada y revisando el diseño urbanístico de la zona, da aval para dicha modificación en la implantación del proyecto dentro del mismo predio en mención en las coordenadas 3°31'42"N, 73°42'13"W, siempre y cuando se respeten los lineamientos urbanísticos determinados, o dado el caso de necesitarse un ajuste, rediseñar los espacios del mismo, respetando las áreas determinadas y notificando a la Secretaria de Planeación, con los respectivos ajustes para tener en cuenta en el expediente del urbanismo. Además, la consultoria, presenta la primera implantación y diseño arquitectónico, al cual se le hicieron observaciones, mencionando también que ya elaboraron estudios topográficos y de suelos; debido a la posible reimplantación, se hace necesario desde el municipio el descapote y nivelación del resto del área del predio, y de tal modo la elaboración de nuevos estudios topográficos, de suelos y diseño arquitectónico. Se lleva a cabo comité virtual el dia 25 de mayo del 2021, donde, se realiza la revisión de la realización de los estudios topográficos y de suelos, según reimplantación, a lo cual la supervisión designada del MINITERIOR, hace el llamado para complementar según los lineamientos de los entregables minimos, se lleva a cabo revisión del diseño arquitectónico según distribución de áreas, al cual se le solicitan correcciones; se pacta reunión para el dia 28 de mayo de 2021 donde se de cumplimiento a dichas correcciones y solicitudes. El dia 27 de mayo, se acepta la prorroga 01 a través de la plataforma SECOP II, y se inicia trámite para actualización de pólizas. El dia 28 de mayo se realiza comité virtual, donde se aprueba diseño arquitectónico en planta, según observaciones anteriores y se aprueban entregables de los estudios topográficos y de suelos, se pacta como compromiso dar celeridad a la elaboración del resto de estudios y diseños, para poder cumplir con el cronograma pactado. El dia 1 de junio de 2021 se realiza comité virtual, con el fin de evaluar el cumplimiento de las actividades y avance de los estudios y diseños, en compañía de la supervisión del convenio, se aprueban los diseños arquitectónicos, urbano espacio público y estructural, se revisan los estudios hidrosanitarios y de redes eléctricas, a los cuales se le realizan las observaciones pertinentes. Posteriormente mediante comité virtual del dia 21 de junio de 2021, se realiza el seguimiento a las observaciones dadas en el comité anterior, mediante el cual, en compañía de la supervisión designada del ministerio del interior, se aprueban los diseños hidrosanitarios, red de gas y eléctrico e iluminación; se lleva a cabo la revisión del presupuesto realizado y se realizan observaciones al mismo. Posteriormente se suben a la plataforma SECOP II el dia 28 de junio para aprobación por parte del ministerio del interior; este mismo dia se lleva a cabo comité virtual con el fin de realizar seguimiento al proceso de los estudios y diseños, en el cual se realizan observaciones al presupuesto propuesto por el contratista.

	Se lleva a cabo reunión virtual el dia 6 de julio para realizar seguimiento a los estudios y diseños, donde se habla sobre la posibilidad de la adición de un recurso por parte de la alcaldía de Granada, que permita dar un completo alcance al proyecto. Posteriormente en reunión virtual del dia 9 de julio, se evalúan aspectos del presupuesto de obra, y se valida la posibilidad de adicionar $150.000.000,00 millones de pesos por parte del municipio de granada, ya que el presupuesto actual limita el alcance del proyecto. El día 15 de julio se lleva a cabo reunión virtual, donde se realiza revisión del convenio, revisión de los estudios y diseños, y revisión del trámite del CDP por parte del municipio, a lo que la administración municipal explica que esta en el trámite correspondiente, el cual conlleva algo de tiempo, a esto el contratista de obra enfatiza la posibilidad de una suspensión mientras se realizan los trámites correspondientes, teniendo en cuenta que este tiempo genera retirados considerables en el cronograma de obra; siendo así la supervisión por parte del ministerio avala dicha solicitud y solicita desarrollar estas actividades en la mayor brevedad posible. En reunión virtual del dia 22 de julio, se presenta y revisa la suspensión de 15 dias que van desde el dia 19 de julio al 2 de agosto de 2021, se revisan los avances en los trámites correspondientes a al traslado necesario para la adición presupuestal, la evaluación por parte del banco de programas y proyectos del municipio y la expedición del CDP correspondiente. Se lleva a cabo reunión virtual el dia 30 de julio para revisión del avance correspondiente a la adición presupuestal al proyecto por parte de la alcaldía de granada, se revisa la entrega final de los estudios y diseños, la licencia de construcción y se pacta como compromiso la entrega del CDP correspondiente a la adición presupuestal el dia 3 de agosto de 2021. Se lleva a cabo reunión virtual el dia 3 de agosto para dar reinicio a los contratos de obra e interventoría derivados del proyecto, se realiza entrega de CDP y revisión del avance correspondiente a de los estudios y diseños. Se lleva a cabo reunión virtual el dia 13 de agosto para revisión del avance correspondiente a los estudios y diseños, se da permiso de inicio de actividades en obra a partir del dia 16 de agosto. Se lleva a cabo reunión virtual el dia 18 de agosto para revisión del avance correspondiente a las actividades de obra y se da explicación de los informes semanales a entregar. Además, teniendo en cuenta los diferentes inconvenientes presentados durante el desarrollo del convenio y los contratos derivados, donde no se ha podido cumplir cabalmente el cronograma debido a cambios, suspensión, cierre financiero del proyecto, y planeación en los tiempos que se deberán destinar para el proceso que se está llevando a cabo en cuanto a la adición presupuestal planeada para el contrato de obra, y los tiempos necesarios para los procesos que conllevan las certificaciones de RETIE Y RETILAP del mismo, se entabla la posibilidad de solicitar una adición en tiempo al convenio por un plazo no mayor a 4 meses a partir del dia 31 de octubre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022, condición la cual es evaluada desde la supervisión del ministerio, con el fin de cumplir cabalmente con la planeación de los recursos. Se realiza comité virtual el dia 6 de septiembre de 2021 para revisión de avance de las obra, revisión de la solicitud de prorroga teniendo en cuenta los aspectos mencionados en los demás comités realizados, se solicitan correcciones por parte del ministerio y se comunica también visita a realizar el dia 28 de septiembre de 2021.

	Se radica solicitud de prorroga 02 ante el ministerio del interior el dia 24 de septiembre de 2021. El 28 de septiembre del 2021 se realizo visita al proyecto SACUDETE tipo 1 en el Municipio de Granada – Meta, en el primer parte de la visita se realiza la visita a la obra en compañia del Municipio, contratista e interventoría, donde se evidencia lo siguiente: 1.La obra se encuentra en un avance del 22% de ejecuciòn y programado del 15.25%, en la obra se encuentra 11 trabajadores en las actividades estructura para el teatro abierto, mejoramiento del suelo y cerramiento de la cancha sintética, instalaciones hidrosanitarias de los baños, entre otras. 2.Se recomienda por parte del Ministerio iniciar los procesos de conexiones definitivas y conexión RETIE 3.Se recomienda al contratista por medio del Municipio el inicio de la contratación de los juegos infantiles, ya que estos son importados y requieren cierto tiempo para la llegada a la obra y de parte del Ministerio se a evidenciado como una de las rutas criticas. 4.Se evidenció la valla informativa publica en la obra. 5.Se le recuerda al Municipio los requisitos para el desembolso del 30%, para que asi mismo cuando se llegue a dicho avance sea enviada la documentación para el trámite de dicho desembolso. 6.De acuerdo al cronograma ejecución la obra y debe entregar el 30 de noviembre del 2021, asi mismo se le recuerda que el Municipio y el Ministerio esta en tramite de una prorroga para el siguiente año. 7.La interventoria, contratistas y Municipio manifiesta que el rendimiento ha bajado un poco en la obra debido a las lluvias presentada en el Municipio. En la segunda parte de la reunión se verifica compromiso con respecto al convenio, donde se evidencia que el Municipio se encuentra al dia con los informes, asi mismo se le recuerda que se debe que los informes semanales de interventoria se deben entregar el sábado en la tarde o a más tardar el lunes a primera hora, asi mismo se hace entrega del último informe de interventoria con corte al 26 de septiembre del 2021, asi mismo los pendientes de los estudios y diseños.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

CONTRATO DE OBRA N° 210.29.03.05 DEL 10 DE MAYO DE 2021	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	19.76 %
AVANCE FISICO EJECUTADO:	25.19 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 222.343.986,84
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 283.339.830,31
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoria Estudios, Diseños y Obra***

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 210.29.11.04 DEL 10 DE MAYO DE 2021	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	85.19%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	75.76 %

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 106.481.555,56
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 94.697.090,91
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
28/12/2020	Mesa técnica virtual para revisar documentación para el primer desembolso	Se realiza mesa técnica virtual para revisar la documentación requerida para el primer desembolso
26/01/2021	Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informe mensual y estado del proceso de desembolso N°1
04/03/2021	Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales y estado de los procesos derivados al convenio	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales y estado de los procesos derivados al convenio y se asumen compromisos
13/04/2021	Visita técnica de inspección ocular al predio del proyecto	Se realiza visita técnica de inspección ocular por parte de la supervisión del ministerio del interior al predio seleccionado para a ejecución del proyecto.
30/04/2021	Mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales, estado de los procesos derivados al convenio y estado del proceso de la solicitud de la prorroga 01	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, informes mensuales, estado de los procesos derivados al convenio y estado del proceso de la prorroga 01, de este modo se asumen compromisos para agilizar todos los procesos.

3/05/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, trámite y documentos para la solicitud de la prorroga 01 al convenio
11/05/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, dar inicio a los contratos derivados del convenio, y citar reunión a dichos contratistas la siguiente semana para verificación de las actividades adelantadas, según etapa de estudios y diseños
18/05/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, trabajos realizados por la consultoria supervisada por la interventoria, derivados del convenio reimplantación del proyecto en el mismo predio
25/05/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, revisión de la realización de los estudios topográficos y de suelos, según reimplantación
28/05/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, se aprueba diseño arquitectónico en planta, según observaciones anteriores y se aprueban entregables de los estudios topográficos y de suelos, se pacta como compromiso dar celeridad a la elaboración del resto de estudios y diseños, para poder cumplir con el cronograma pactado.
01/06/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual para revisión de compromisos, se aprueban los diseños arquitectónicos, urbano espacio público y estructural, se revisan los estudios hidrosanitarios y de redes eléctricas, a los cuales se le realizan las observaciones pertinentes.
21/06/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual, se realiza el seguimiento a las observaciones dadas en el comité anterior, mediante el cual, en compañia de la supervisión designada del ministerio del interior, se aprueban los diseños hidrosanitarios, red de gas y eléctrico e iluminación; se lleva a cabo la revisión del presupuesto realizado y se realizan observaciones al mismo.
28/06/2021	Mesa técnica virtual	Se realiza mesa técnica virtual, para aprobación por parte del ministerio del interior; este mismo dia se lleva a cabo comité virtual con el fin de realizar seguimiento al proceso de los estudios y diseños, en el cual se realizan observaciones al presupuesto propuesto por el contratista.
06/07/2021	Mesa técnica virtual	Realizar seguimiento a los estudios y diseños, donde se habla sobre la posibilidad de la adición de un recurso por parte de la alcaldia de Granada, que permita dar un completo alcance al proyecto.
09/07/2021	Mesa técnica virtual	Se evalúan aspectos del presupuesto de obra, y se valida la posibilidad de adicionar $150.000.000,00 millones de pesos por parte del municipio de granada, ya que el presupuesto actual limita el alcance del proyecto.
15/07/2021	Mesa técnica virtual	Revisión del convenio, revisión de los estudios y diseños, y revisión del trámite del CDP por parte del municipio, evaluación de suspensión.
22/07/2021	Mesa técnica virtual	Presenta y revisa la suspensión de 15 dias que van desde el dia 19 de julio al 2 de agosto de 2021, se revisan los avances en los trámites correspondientes a al traslado de recursos para la adicional.
30/07/2021	Mesa técnica virtual	Revisión del avance correspondiente a la adición presupuestal al proyecto por parte de la alcaldia de granada, se revisa la entrega final de los estudios y diseños, la licencia de construcción y se pacta como compromiso la entrega del CDP correspondiente a la adición presupuestal el dia 3 de agosto de 2021.

3/08/2021	Mesa técnica virtual	Reinicio a los contratos de obra e interventoria derivados del proyecto, se realiza entrega de CDP y revisión del avance correspondiente a de los estudios y diseños.
13/08/2021	Mesa técnica virtual	Revisión del avance correspondiente a los estudios y diseños, se da permiso de inicio de actividades en obra a partir del dia 16 de agosto.
18/08/2021	Mesa técnica virtual	Revisión del avance correspondiente a las actividades de obra y se da explicación de los informes semanales a entregar.
06/09/2021	Mesa técnica virtual	Revisión del avance correspondiente a las actividades de obra y revisión de la solicitud de prorroga 2
28/09/2021	Comité en obra	Comité en obra, revisión de avance de la obra, y documentación pertinente.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
30/12/2020	mié, 30 dic 2020 a las 15:04 A juanministerio2020@gmail.com	Documentos Sacúdete Granada	PROFESIONAL UNIVERSITARIA	APOYO A LA SUPERVISIÓN
26/02/2021	Estado de cuenta- primer desembolso.	Estado de cuenta	N/A	N/A
04/03/2021	Compromisos convenio 1520-20- el 4 de marzo de 2021 a las 14:14 a , secretariainfraestructura@gmanada-meta.gov.co	Compromisos convenio 1520-20	arqcruzc@gmail.com apoyo a la supervisión	secretariainfraestructura@gmanada-meta.gov.co
20/05/2021	Re: Posible incumplimiento Convenio No. 1520-2020 - 20 de Mayo de 2021 11:33 - gina.cruz@mininterior.gov.co	Re: Posible incumplimiento Convenio No. 1520-2020	"Secretaria Infraestructura" <secretariainfraestructura@granada-meta.gov.co>; supervisión	"gina cruz" <gina.cruz@mininterior.gov.co>;
21/05/2021	Re: Compromisos establecidos Convenio No. 1520 - 2020 Municipio de Granada Meta - 21 de Mayo de 2021 15:02 - gina.cruz@mininterior.gov.co	Re: Compromisos establecidos Convenio No. 1520 - 2020 Municipio de Granada Meta	"Secretaria Infraestructura" <secretariainfraestructura@granada-meta.gov.co>; supervisión	"gina cruz" <gina.cruz@mininterior.gov.co>;
31/05/2021	INFORMACION SACUDETE AL PARQUE ENTREGABLES MINIMOS Y AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO - 31 de Mayo de 2021 17:32 - gina.cruz@mininterior.gov.co	INFORMACION SACUDETE AL PARQUE ENTREGABLES MINIMOS Y AJUSTES AL DISEÑO ARQUITECTONICO	"utsacudetealparque" <utsacudetealparque@gmail.com>;	"gina cruz" <gina.cruz@mininterior.gov.co>; "piraneke" <piraneke@gmail.com>; "Secretaria Infraestructura" <secretariainfraestructura@granada-meta.gov.co>; "harry manrique" <Harry.manrique@mininterior.gov.co>; "jonathan garcia"

				<jonathan.garcia@mininterior.gov.co>; "remberto martinez" <remberto.martinez@mininterior.gov.co>


- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
JUAN PABLO NEIRA CALDERON	Secretario de Infraestructura (Supervisor)
DIEGO FERNANDO POVEDA CASTAÑEDA	Profesional universitario (Apoyo a la Supervisión)

- ***Informacion Avance Fisico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

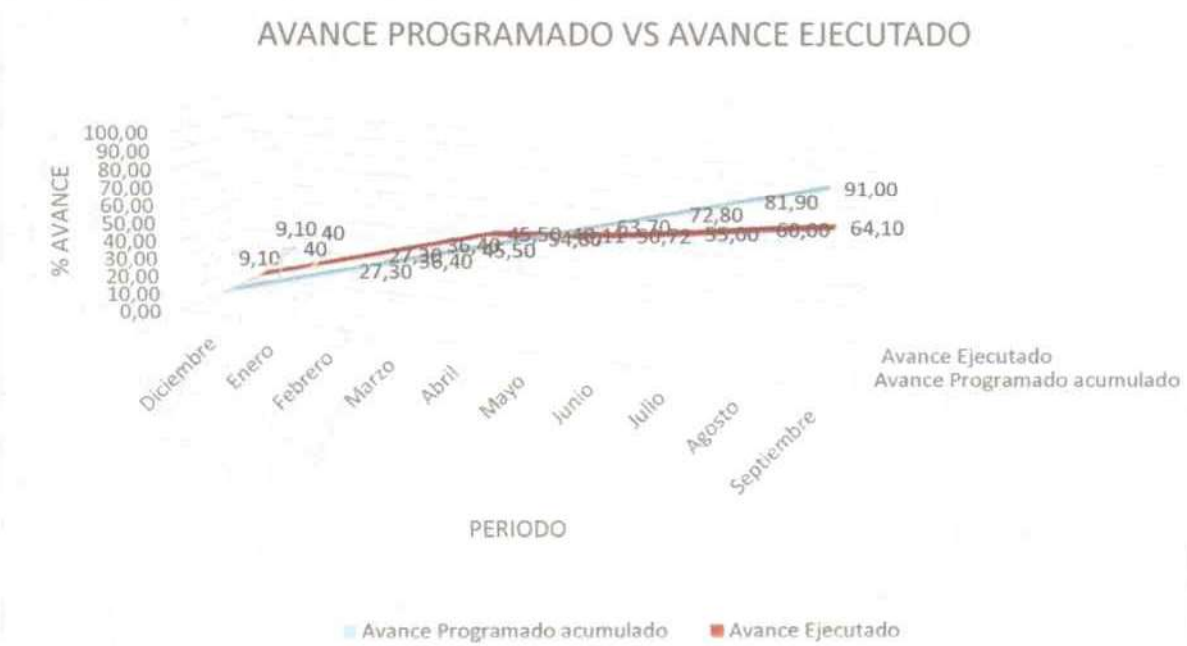

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**%**
	Durante el mes de septiembre la secretaria en compañia de la supervisión del Ministerio realizo visitas de inspección ocular, a través de las cuales se corroboro la correcta ejecución del proyecto.	**$ 378.036.921,22**	**64.10%**

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la obra:



1. Valla informativa del proyecto



2. Elementos recolectores de basura



3. Campamento dl proyecto



4. Cerramiento y equipo de bioseguridad



5. Zona de Baños



6. Zona de teatro abierto



7 Zona de teatro abierto




8. Zona de teatro abierto



9. Zona de cancha sintética



10. Zona de cancha sintética

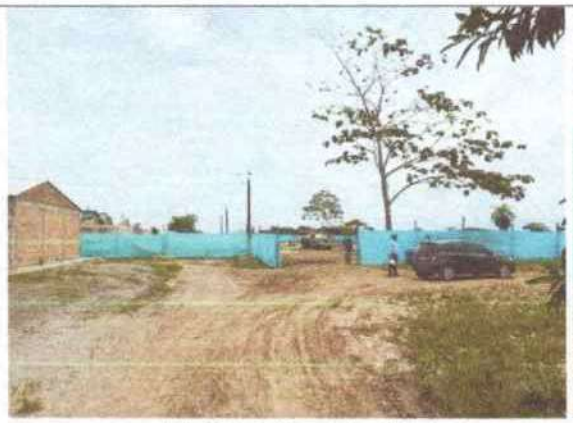

11. Cerramiento de obra



12. visita en obra



13. visita en obra



14. visita en obra

OBSERVACIONES:

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

13/04/2021	28/09/2021				

8. SUPERVISOR

JUAN PABLO NEIRA CALDERON Supervisor del Convenio Secretario de Infraestructura	Diego Poveda. **DIEGO FERNANDO POVEDA CASTAÑEDA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Profesional Universitario

CONVENIO 1520 DE 2020

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.

INFORME FINANCIERO DE SEPTIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE GRANADA - META

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA-META.

CUENTA (AHORROS) No. 714-80430-9 — DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	5/02/2021	GIRO 1	$ 125.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 125.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 714-80430-9 A LA FECHA (31/08/2021)			**$ 125.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CONTRATO DE OBRA 210.29.03-05 del 10 de mayo de 2021	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE R/L ESMERALDA LOPEZ PINEDA	$ 1.124.999.994,69	$ 0,00	$ 1.124.999.994,69
CONTRATO DE INTERVENTORIA 210.29.11-04 del 10 de mayo de 2021	EDISON FABIAN PIRANEQUE R/L EDISON FABIAN PIRANEQUE	$ 125.000.000,00	$ 0,00	$ 125.000.000,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.999.994,69**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
						$ 0,00	$ -
						$ 0,00	$ -
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
28/02/2021	$ 2.465,76
31/03/2021	$ 3.184,94
30/04/2021	$ 3.082,42
31/05/2021	$ 3.185,25
30/06/2021	$ 3.082,50
30/07/2021	$ 3.185,25
31/08/2021	$ 3.185,52
30/09/2021	$ 3.082,80
TOTAL (3)	**$ 24.454,44**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ————————

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 125.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 24.454,44
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 24.454,44**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 125.000.000,00**
SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS	**$ 125.024.454,44**

OBSERVACIONES EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA EN CURSO Y AL MUNICIPIO HA SIDO ENTREGADO EL PRIMER DESEMBOLSO

FIRMA

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
C.c. 1.120.352.757
CONTADORA MUNICIPIO GRANADA - META

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS DESEMBOLSO

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO
CL 15 # 14 - 07 ESQ CENTRO
GRANADA - META

EMT089944

1/1

CUENTA No. 714-80430-9
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,05%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.20%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	125,021,371.64
+ 30 CREDITOS	3,082.80
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	125,024,454.44
SALDO PROMEDIO	125,022,823.98

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: wwww.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A583345	0.00	102.76	125,021,474.40
03	INTERESES LIQUIDADOS	A653153	0.00	102.76	125,021,577.16
06	INTERESES LIQUIDADOS	A591454	0.00	102.76	125,021,679.92
06	INTERESES LIQUIDADOS	A591482	0.00	102.76	125,021,782.68
06	INTERESES LIQUIDADOS	A591510	0.00	102.76	125,021,885.44
07	INTERESES LIQUIDADOS	A472412	0.00	102.76	125,021,988.20
08	INTERESES LIQUIDADOS	A334570	0.00	102.76	125,022,090.96
09	INTERESES LIQUIDADOS	A959383	0.00	102.76	125,022,193.72
10	INTERESES LIQUIDADOS	A781516	0.00	102.76	125,022,296.48
13	INTERESES LIQUIDADOS	A877626	0.00	102.76	125,022,399.24
13	INTERESES LIQUIDADOS	A877610	0.00	102.76	125,022,502.00
13	INTERESES LIQUIDADOS	A877617	0.00	102.76	125,022,604.76
14	INTERESES LIQUIDADOS	A752003	0.00	102.76	125,022,707.52
15	INTERESES LIQUIDADOS	A329701	0.00	102.76	125,022,810.28
16	INTERESES LIQUIDADOS	A236489	0.00	102.76	125,022,913.04
17	INTERESES LIQUIDADOS	A845766	0.00	102.76	125,023,015.80
20	INTERESES LIQUIDADOS	A862542	0.00	102.76	125,023,118.56
20	INTERESES LIQUIDADOS	A862536	0.00	102.76	125,023,221.32
20	INTERESES LIQUIDADOS	A862512	0.00	102.76	125,023,324.08
21	INTERESES LIQUIDADOS	A846360	0.00	102.76	125,023,426.84
22	INTERESES LIQUIDADOS	A494537	0.00	102.76	125,023,529.60
23	INTERESES LIQUIDADOS	A063192	0.00	102.76	125,023,632.36
24	INTERESES LIQUIDADOS	A680053	0.00	102.76	125,023,735.12
27	INTERESES LIQUIDADOS	A463513	0.00	102.76	125,023,837.88
27	INTERESES LIQUIDADOS	A463521	0.00	102.76	125,023,940.64
27	INTERESES LIQUIDADOS	A463517	0.00	102.76	125,024,043.40
28	INTERESES LIQUIDADOS	A736614	0.00	102.76	125,024,146.16
29	INTERESES LIQUIDADOS	A291004	0.00	102.76	125,024,248.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A090407	0.00	102.76	125,024,351.68
30	INTERESES LIQUIDADOS	A469283	0.00	102.76	125,024,454.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

1000.57.264

Granada – Meta, septiembre 24 de 2021

Señores
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION PLAZO CONVENIO N°1520 DE 2020

Referencia: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GRANADA (META).

Cordial Saludo,

agradeciendo de antemano la diligencia y celeridad que han tenido para con el Municipio de Granada –Meta, nos dirigimos a ustedes, con el objetivo de solicitar de manera atenta, una solicitud de prorroga y/o ampliación del tiempo del mismo, ante el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1520 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GRANADA (META), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El municipio de Granada realizó la suscripción del convenio del asunto el 24 de diciembre de 2020 por valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.250.000.000), cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Granada-Meta".

2. Que el 30 de diciembre de 2020 se dio inicio al convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1520 de 2020.

3. Que el plazo de ejecución del b convenio de nueve (09) meses es decir hasta el 30 de agosto de 2021, la cual se puede constatar en el "ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)", en la **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.**

4. El municipio el 24 de diciembre de 2020 realizó una incorporación de recursos de cofinanciación provenientes de la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al presupuesto de la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, por medio del decreto 176 de 2020.

5. El día 28 de diciembre de 2020 se participó en "MESA DE TRABAJO VIRTUAL PARA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PRIMER DESEMBOLSO", siendo de este modo hasta el 30 de diciembre de 2020 la realización de la solicitud del mismo de acuerdo al **NUMERAL 1). (...)** de la **CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO,** cumpliendo con toda la documentación requerida.

6. Debido al principio de anualidad y finalización de la vigencia fiscal 2020 el municipio no adelantó el proceso pre – contractual en el periodo programado, en el mes de enero el municipio realizó el cierre de la vigencia presupuestal 2020 e inicio a la estructuración del presupuesto conforme a la nueva estructura presupuestal definida por el Ministerio de Hacienda mediante **RESOLUCIÓN 3832 del 18 de octubre de 2019.**

7. El municipio el 21 de enero de 2021 por medio del decreto 049 de 2021 realiza una adición de recursos de cofinanciación provenientes de la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana al presupuesto de la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

8. El 26 de enero de 2021 se participó en "MESA TÉCNICA DE TRABAJO VIRTUAL PARA REVISIÓN DE COMPROMISOS, INFORME MENSUAL Y ESTADO DEL PROCESO DEL DESEMBOLSO N° 1" realizada por parte del

Ministerio del Interior – FONSECON con el fin de conocer realizar el debido seguimiento al proceso.

9. El día 05 de febrero de 2021, el municipio recibe en sus cuentas el valor de $125.000.000,00 correspondiente al primer desembolso tramitado y anteriormente descrito.

10. Se realiza el proceso administrativo para llevar a cabo la contratación derivada del convenio en mención, y se realizan otras acciones dando cumplimiento a los compromisos como lo fueron el descapote, nivelación y compactación del terreno.

11. De acuerdo con lo anterior el 15 de marzo de 2021 el municipio inicio el proceso precontractual en la plataforma del SECOP I de obra para el "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA", proceso LP-001-2021, por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 1.125.000.000,00) el cual tuvo lugar para el cierre del proceso el día 08 de abril de 2021, y fijando como fecha de adjudicación el 22 de abril de 2021 y fecha de inicio del contrato el día 13 de mayo de 2021.

12. Que el municipio adelantó el concurso de méritos el 15 de marzo de 2021 para llevar a cabo el proceso de interventoría, en la plataforma SECOP I denominado CMA 03-2021 cuyo objeto obedece a "INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA". Por un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 125.000.000,00), según cronología del proceso tiene lugar al cierre del proceso el 09 de abril de 2021 y resolución de adjudicación el 20 de abril de 2021 y fecha de inicio del contrato el día 13 de mayo de 2021.

13. Que teniendo en cuenta la trazabilidad del convenio, el día 14 de abril de 2021 se solicitud prorroga 01, aprobada por el ministerio, ajustando y ampliando el plazo del convenio a partir del día 30 de agosto de 2021, al 30 de octubre de 2021.

14. Que de acuerdo a esto la ejecución de los estudios y diseños, se encontraba programada para un tiempo de duración de hasta 01 mes, desde el 13 de mayo

hasta el 13 de junio; sin embargo, se presentaron contratiempos a raíz de cambios en la implantación del proyecto y aspectos como correcciones de los diseños del mismo.

15. Que debido a la necesidad planteada durante la ejecución de los estudios y diseños, donde se enfatiza principalmente al alcance del proyecto respecto al alza de los precios de aceros en el mercado, mediante comité del 15 de julio se informa la realización de una suspensión al contrato de obra e interventoría, teniendo en cuenta la necesidad de una adición presupuestal al proyecto por parte del Municipio de Granada, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MT/CE ($150.000.000,00); suspensión la cual tuvo un tiempo de duración de quince (15) días calendario desde el 19 de julio de 2021 hasta el 2 de agosto de 2021, tiempo en el cual se realizan los procesos de traslado de recursos, ajustes al proyecto y demás procesos administrativos que pudieron garantizar el actual Certificado de Disponibilidad Presupuestal con N°720.19.0683 del 2 de agosto de 2021, que garantiza el destino de este dinero para la Construcción del Proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 Opción 1en el Municipio De Granada.

16. Que se realizó la entrega de los estudios y diseños, en el mes de agosto de 2021 y se da inicio de ejecución de obras a partir del día 16 de agosto de 2021, sin embargo, se ha presentado una ejecución lenta debido a la intensidad de las precipitaciones en el municipio durante este periodo. La ejecución de la obra deriva en 4 meses hasta el 16 de noviembre de 2021 y el convenio tiene fecha de terminación el día 30 de octubre de 2021, por lo cual no se podrán ejecutar en su totalidad las actividades propuestas, ya que se requieren 4 meses para la etapa de construcción estimando la entrega de la obra en el mes de noviembre de 2021, y tres meses más para detallar la obra, puesta a punto del proyecto, conexión de servicios públicos definitivos, trámites de certificación RETIE/RETILAP los cuales conllevan aumentar los tiempos de ejecución en tres meses, teniendo en cuenta que una vez ejecutadas las actividades se debe subcontratar al certificador y realizar las respectivas visitas, solicitudes de maniobras en línea viva, certificaciones y matricula, ya que sin haber realizado estas actividades no se podrá continuar con la etapa de recibo del proyecto, por lo anterior se estima que el plazo final del convenio sea para el 28 de febrero de 2022.

17. Que de acuerdo al numeral 26 de la cláusula segunda del Convenio, es obligación del Municipio: "26) Solicitar al MINISTERIO-FONSECON con una antelación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha en que se pretenda dar aplicación a cualquiera de las modificaciones que se requieran, ya sea prórrogas, modificaciones, suspensiones y/o adiciones, indicando detalladamente los motivos de hecho, o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del Ministerio".

18. Que como se puede evidenciar el Municipio de Granada Meta ha podido adelantar los procesos derivados del convenio y ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos.

19. Teniendo en cuenta la trazabilidad del convenio 1520 de 2020 y los aspectos ya mencionados, es necesario que se extienda el plazo, con la finalidad de que los contratos derivados puedan quedar dentro del plazo estipulado, con el fin de cumplir a cabalidad con el mismo.

20. Acorde con lo anterior se sirva conceder una prórroga al convenio por el término de cuatro (04) meses calendario. Este plazo requerido de prorroga es necesario para dar cumplimiento al objeto contractual del convenio interadministrativo de acuerdo a los tiempos estimados según la ruta crítica de la programación y los plazos establecidos inicialmente en el proyecto.

21. Acorde con lo sustentado se adjunta el cronograma, ajustando y ampliando el plazo del convenio a partir del día 31 de octubre de 2021, al 28 de febrero de 2022.

22. Que a continuación se presenta el cronograma del convenio, ajustado a la sustitución solicitada representando el desarrollo financiero de los pagos en los años 2021 y 2022:

VIGENCIA	2020	2021		2022
MES	DICIEMBRE	OCTUBRE	DICIEMBRE	FEBRERO
PAGOS	$125.000.000 1ER DESEMBOLSO ANTICIPO	$750.000.000 2DO DESEMBOLSO 30% DE EJECUCIÓN DE OBRA	$250.000.000 3ER DESEMBOLSO 60% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	$125.000.000 4TO DESEMBOLSO 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA

Por las consideraciones antes expuestas, solicitamos que se analice la viabilidad de adelantar la solicitud aquí contenida.

Agradeciendo la atención prestada.
Cordialmente,


JUAN PABLO NEIRA CALDERÓN
Secretario de Infraestructura

FREDY HERNÁN PÉREZ
Alcalde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GRANADA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO N° 1620 DE 2020

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META

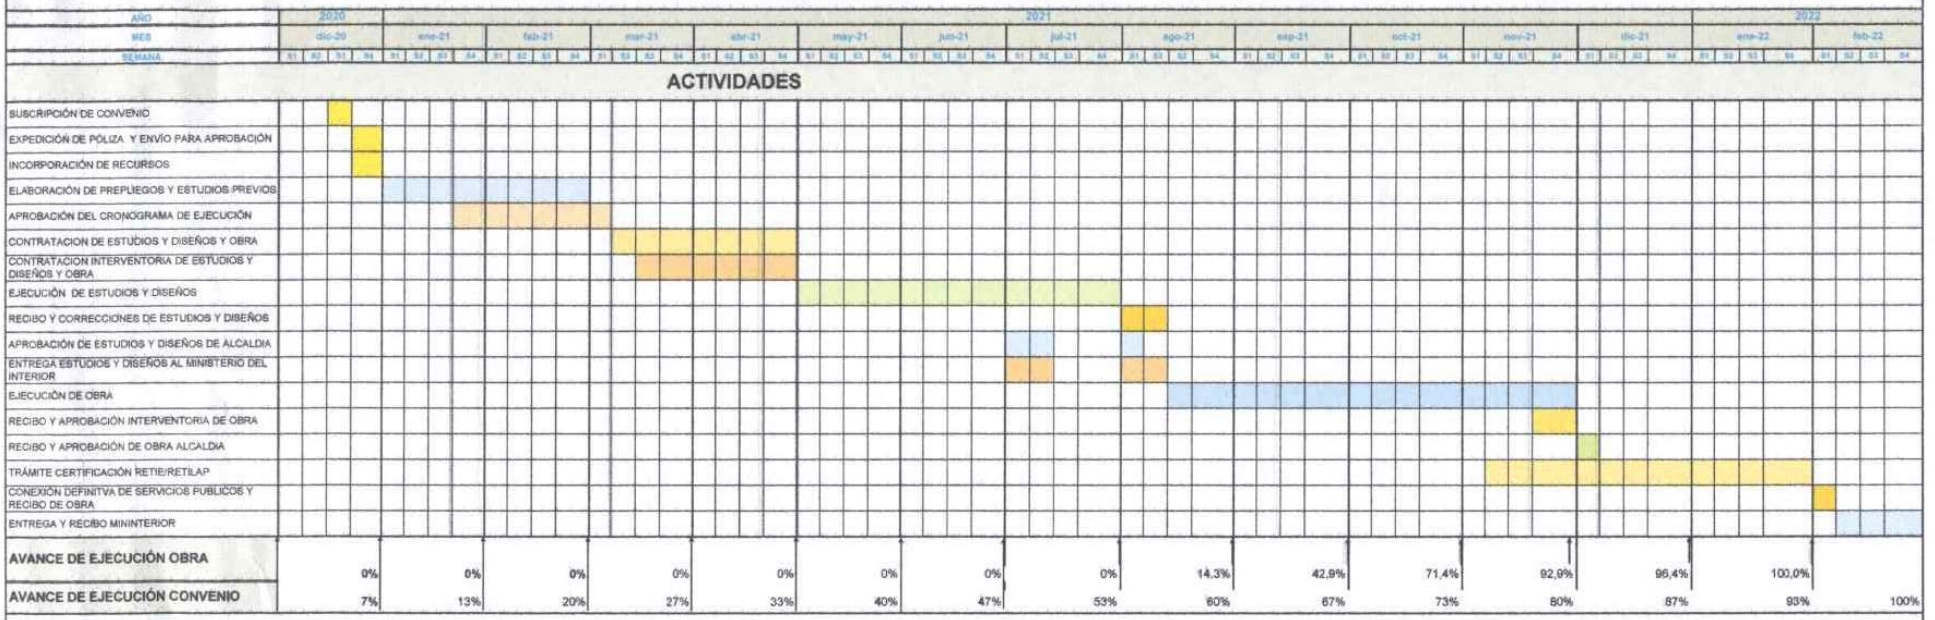

| | | |

UT SACÚDETE AL PARQUE

UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Granada- Meta 09 de Septiembre de 2021

Ingeniero
EDINSON FABIAN PIRANEQUE MOTIVAR
Interventor

REFERENCIA: Contrato de obra No. 210.29.03.05 de 2021 cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA".**

ASUNTO: Solicitud Prórroga

Recibí
9/09/2021
Interventoría

Cordial saludo:

De manera formal me permito hacer la solicitud de prórroga y/o ampliación del contrato en referencia ya que debido a que los tiempos contemplados inicialmente se modificaron por los trámites pertinentes para la adición presupuestal, por esto la entrega de los estudios y diseños se llevó a cabo el día 13 de agosto de 2021 y a partir de esto se pudo iniciar con las actividades en obra el día 16 de agosto de 2021.

Sin embargo debido a la intensidad de las precipitaciones en el municipio durante este periodo ha conllevado a que se genere un retraso de la obra con respecto a la programación de obra.

Es por esto y teniendo en cuenta que la conexión de servicios públicos definitivos, trámites de certificación RETIE/RETILAP los cuales conllevan aumentar los tiempos de ejecución y recibo del mismo, se solicita una prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 tiempo en el cual se espera hacer la entrega final de las actividades contempladas en el contrato.

Agradeciendo la atención prestada y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

Esmeralda López

ANGIE ESMERALADA LOPEZ PINEDA
R/L UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE
CONTRATISTA

Granada- Meta 09 de septiembre de 2021

Ingeniero
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRANADA - META
JUAN PABLO NEIRA CALDERON
Secretario de Infraestructura – Supervisor Designado
Calle 15 No. 14 – 07 Segundo Piso Barrio El Centro

REFERENCIA: Contrato de obra No. 210.29.03.05 de 2021 cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA".**

ASUNTO: Solicitud de Prórroga contrato de obra e interventoría.

Comedidamente me permito darle mi parte de viabilidad, ante la solicitud de prórroga y/o ampliación hecha por el contratista de la **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE,** del contrato en referencia ya que debido a los trámites pertinentes que se realizaron para la adición presupuestal, lo cual conllevo a unos cambios en los tiempos estipulados inicialmente, es por esto que el día 13 de agosto de 2021 se llevó a cabo la entrega de los estudios y diseños y apartir del día 16 de agosto de 2021 se pudo dar inicio a las actividades de obra.

También debido a la intensidad de las precipitaciones en el municipio durante el periodo mencionado, ha conllevado a que se generen retrasos en la obra lo cual afecta el cumplimiento de los tiempos contemplados, además que una vez finalizadas las labores en obra se requiere contar con los tramites de legalización y entrega de redes ante las empresas de servicios públicos, junto con los trámites previos de certificación RETIE/RETILAP que dependen de la disponibilidad de tiempo de las entidades certificadoras.

CONTACTENOS
Dir. Calle 27 No 13-25 Mz D Casa 20
Cel 320 2741223
Email. piraneke@hotmail.com
GRANADA - META

Es por esto que con esta prórroga se espera que el contrato en referencia pueda realizar la entrega final para el día 28 de febrero de 2022.

De igual forma se solicita la prorroga y/o ampliación hasta el día 28 de febrero de 2022 del contrato de interventoría No.210.29.11.04 de 2021, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA"** tiempo en el cual se espera poder hacer la entrega final de las actividades ejecutadas al 100%.

Agradezco su amable atención y diligencia.

Cordialmente,

EDISON FABIAN PIRANEQUE MOTIVAR
Representante Legal

CONTACTENOS
Dir. Calle 27 No 13-25 Mz D Casa 20
Cel 320 2741223
Email. piranche@hotmail.com
GRANADA - META

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 6/09/2021

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 15 Del: 30/08/2021 Al: 5/09/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 102 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,13%	10,27%		
Obra Física Ejecutada (%)			0,57%	11,41%
Valor de la Obra	$ 12.753.939,07	$ 115.496.974,13	$ 6.392.040,53	$ 128.393.227,97

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	9,13%	10,84%	1,15%
Durante el periodo	1,13%	0,57%	
Acumulado actual	10,27%	11,41%	



REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



FRENTE 1 CERRAMIENTO

Se perfilan y toman niveles en las excavaciones manuales para las zapatas del cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

FRENTE 2 GRADERIAS EN CONCRETO

Se realiza amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentacion y muros de concreto.

Se funde la viga de la cimentacion de los muros de graderias en concreto.

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 6/09/2021

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 15 Del: 30/08/2021 Al: 5/09/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 102 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRENTE 3 AUDITORIO ABIERTO

Se realiza amarre de acero de refuerzo para muro de contencion y zarpa de cimentacion.

Se funde el solado de limpieza y la zarpa de cimentacion del muro de contencion derecho.

FRENTE 4 CANCHA SINTETICA 15,0 m X 25,0 m

Se realiza compactacion de material de relleno seleccionado de rio de 2"

FRENTE 5 BLOQUE CAFETERÍA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

Se realiza excavacion manual de zapatas y viga de cimentacion

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**

CC 1.016.035.874 Bogota

INTERVENTOR

Nombre **EDISON FABIAN PIRANQUE MOTIVAR**

CC 1.049.602.593 Tunja

CONTRATISTA OBRA Esmeralda López

Nombre **R/L ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**

UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO GRANADA META
NIT 892099243-5
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA

FECHA
13/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 16 Del: 6/09/21 Al: 12/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 109 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,37%	11,64%
Valor de la Obra	$ 15.403.586,86	$ 130.900.560,99

	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,70%	14,11%
Valor de la Obra	$ 30.351.072,21	$ 158.744.300,18

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	10,27%	11,41%	2,47%
Durante el periodo	1,37%	2,70%	
Acumulado actual	11,64%	14,11%	



REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



FRENTE 1 CERRAMIENTO

Se realiza amarre y figurado de acero de refuerzo para las vigas de cimentacion dell cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

FRENTE 2 GRADERIAS EN CONCRETO

Se realiza amarre de acero de refuerzo para vigas de cimentacion y muros de concreto.

Se funden lo muros de apoyo de placa de graderias en concreto.

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 13/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 16 Del: 6/09/21 Al: 12/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 109 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRENTE 3 AUDITORIO ABIERTO

Se continua realizando amarre de acero de refuerzo para muro de contencion y zarpa de cimentacion.

Se continua fundiendo el solado de limpieza y la zarpa de cimentacion del muro de contencion derecho.

FRENTE 4 CANCHA SINTETICA 15,0 m X 25,0 m

Se realiza humedecimiento de la capa material de relleno seleccionado de rio de 2"

FRENTE 5 BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

Se instalacion de acero de refuerzo y fundida en concreto de las zapatas y vigas de cimentacion.

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**

CC 1.016.036.874 Bogota

INTERVENTOR

Nombre **EDISON FABIAN PIRANQUE MOTIVAR**

CC 1.049.602.593 Tunja

CONTRATISTA OBRA Esmeralda López

Nombre **R/L ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**

UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 20/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 17 Del: 13/09/21 Al: 19/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 116 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,86%	13,50%
Valor de la Obra	$ 20.936.723,01	$ 151.837.284,00

	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,69%	18,80%
Valor de la Obra	$ 52.733.446,31	$ 211.477.746,49

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	11,64%	14,11%	5,30%
Durante el periodo	1,86%	4,69%	
Acumulado actual	13,50%	18,80%	



REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



FRENTE 1 CERRAMIENTO

Se realiza amarre y figurado de acero de refuerzo para las vigas de cimentacion dell cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza fundida de zapatas y vigas de cimentacion del cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza instalacion de tuberia de acero galvanizado para los modulos de malla eslabonada para el cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

FRENTE 2 GRADERIAS EN CONCRETO

Se realiza la instalacion de acero de refuerzo placas de graderias de concreto.

Se funden las placas de graderias en concreto.

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 20/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE	Objeto	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA
Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021		
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69		
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69		
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES		
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES		
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021		
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021		
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021		
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021		
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021		

Semana Número: 17 Del: 13/09/21 Al: 19/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 116 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRENTE 3 AUDITORIO ABIERTO

Se realiza la instalacion de tuberia de alcantarillado para el desague de las aguas lluvias en el sector del Auditorio Abierto

FRENTE 4 CANCHA SINTÉTICA 15,0 m X 25,0 m

Se realiza humedecimiento de la capa material de relleno seleccionado de rio de 2"

FRENTE 5 BLOQUE CAFETERÍA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

Se icontinua fundiendo concreto de zapatas y vigas de cimentacion en el sector del bloque de cafereteia, baños y sala comunitaria.

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**
CC 1.016.035.874 Bogota

INTERVENTOR
Nombre **EDISON FABIAN PIRANQUE MOTIVAR**
CC 1.049.602.593 Tunja

CONTRATISTA OBRA Esmeralda López
Nombre **R/L ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**
UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 27/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 18 Del: 20/09/21 Al: 26/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 123 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,84%	17,34%
Valor de la Obra	$ 43.204.154,98	$ 195.041.438,97


	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,13%	20,92%
Valor de la Obra	$ 23.917.577,57	$ 235.395.324,07

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	13,50%	18,80%	3,59%
Durante el periodo	3,84%	2,13%	
Acumulado actual	17,34%	20,92%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

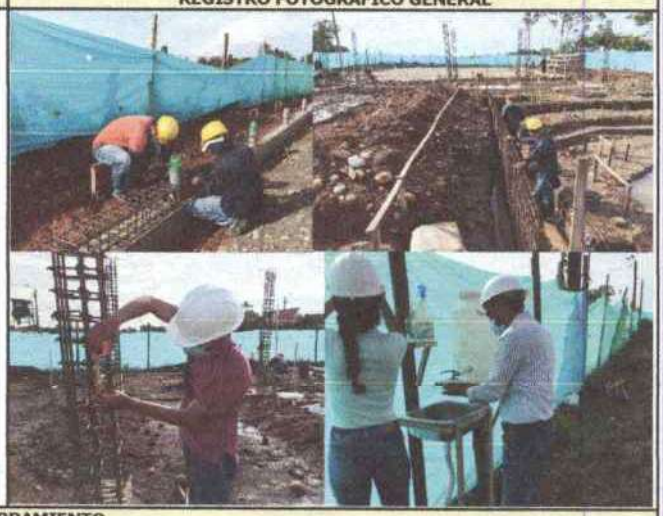

FRENTE 1 CERRAMIENTO

Se realiza amarre y figurado de acero de refuerzo para las vigas de cimentacion dell cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza fundida de zapatas y vigas de cimentacion del cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza instalacion de tuberia de acero galvanizado para los modulos de malla eslabonada para el cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

FRENTE 2 GRADERIAS EN CONCRETO

Se hidratan las placas de graderias de concreto para su respectivo curado.

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 27/09/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 18 Del: 20/09/21 Al: 26/09/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 123 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRENTE 3 AUDITORIO ABIERTO

Se realiza la instalacion de tuberia de alcantarillado para el desague de las aguas lluvias en el sector del Auditorio Abierto

Se realiza bombeos con motobomba para evacuar los excesos de agua en la zanja.

FRENTE 4 CANCHA SINTÉTICA 15,0 m X 25,0 m

Se realiza humedecimiento de la capa material de relleno seleccionado de rio de 2"

FRENTE 5 BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

Se continua fundiendo concreto de zapatas y vigas de cimentacion en el sector del bloque de caferetia, baños y sala comunitaria.

Se realiza amarre de acero de vigas y columnas.

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**

CC 1.016.035.874 Bogota

INTERVENTOR

Nombre **EDISON FABIAN PIRANQUE MOTIVAR**

CC 1.049.602.593 Tunja

CONTRATISTA OBRA Esmeralda López

Nombre **R/L ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**

UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 4/10/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Contrato No.	210.29.03.05 DE 2021
Valor Inicial:	$ 1.124.999.994,69
Valor Actualizado:	$ 1.124.999.994,69
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	13 de mayo de 2021
Fecha de Terminación 1:	12 de noviembre de 2021
Fecha de Suspención:	19 de julio de 2021
Fecha de Reinicio:	3 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento:	27 de noviembre de 2021

Semana Número: 19 Del: 27/09/21 Al: 3/10/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 130 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,43%	19,76%	Obra Física Ejecutada (%) 4,26%	25,19%
Valor de la Obra	$ 27.302.547,87	$ 222.343.986,84	Valor de la Obra $ 47.944.506,25	$ 283.339.830,31

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	17,34%	20,92%	5,42%
Durante el periodo	2,43%	4,26%	
Acumulado actual	19,76%	25,19%	



REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



FRENTE 1 CERRAMIENTO

Se realiza amarre y figurado de acero de refuerzo para las vigas de cimentacion dell cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza fundida de vigas de cimentacion del cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

Se realiza instalacion de tuberia de acero galvanizado para los modulos de malla eslabonada para el cerramiento perimetral de la cancha sintetica.

FRENTE 2 GRADERIAS EN CONCRETO

Se hidratan las placas de graderias de concreto para su respectivo curado.

Granada	**DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO GRANADA META** **NIT 892099243-5** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA		FECHA 4/10/21

CONTRATO DE OBRA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE AL PARQUE

Contrato No. 210.29.03.05 DE 2021

Valor Inicial: $ 1.124.999.994,69

Valor Actualizado: $ 1.124.999.994,69

Plazo Inicial: SEIS (6) MESES

Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES

Fecha de Iniciación: 13 de mayo de 2021

Fecha de Terminación 1: 12 de noviembre de 2021

Fecha de Suspención: 19 de julio de 2021

Fecha de Reinicio: 3 de agosto de 2021

Fecha de Vencimiento: 27 de noviembre de 2021

Objeto ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 DEL MUNICIPIO DE GRANADA

Semana Número: 19 Del: 27/09/21 Al: 3/10/21 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 130 días

Nombre del Supervisor JUAN PABLO NEIRA CALDERON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FRENTE 3 AUDITORIO ABIERTO

Se realiza la instalacion de tuberia de alcantarillado para el desague de las aguas lluvias en el sector del Auditorio Abierto

Se realiza bombeos con motobomba para evacuar los excesos de agua en la zanja.

Se realiza fundida deconcretos ciclopeos para contecion de escalones en graderias del auditorio abierto

FRENTE 4 CANCHA SINTÈTICA 15,0 m X 25,0 m

Se realiza suministro e instalacion de segunda capa material de relleno seleccionado de rio de 2"

FRENTE 5 BLOQUE CAFETERIA, BAÑOS Y SALA COMUNITARIA

Se continua fundiendo concreto de zapatas y vigas de cimentacion en el sector del bloque de caferetia, baños y sala comunitaria.

Se realiza amarre de acero de vigas y columnas.

Se instalacion de redes de desgue sanitarias en en el sector del bloque de caferetia, baños y sala comunitaria.

Observaciones: Se realizo visita de seguimiento a la ejecucion del proyecto SACUDETE tipo 1 en el Municipio de Granada – Meta, el ING HARRY MANRIQUE hizo recorrido la obra por parte de la supervision del convenio del ministerio del interior.

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre **JUAN PABLO NEIRA CALDERON**

CC 1.016.035.874 Bogota

INTERVENTOR

Nombre **EDISON FABIAN PIRANQUE MOTIVAR**

CC 1.049.602.593 Tunja

CONTRATISTA OBRA Esmeralda López

Nombre **R/L ANGIE ESMERALDA LOPEZ PINEDA**

UNION TEMPORAL SACUDETE AL PARQUE
