
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14 |
|---|---|---|
| Grupo Social y Empresarial de la Defensa | OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad) | FECHA DE EMISION: 19-02-2021 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN | VERSIÓN: 04 |
| | | Página 1 de 2 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | |

| | | |
|---|---|---|
| TEMA: Comite técnico - contrato Nº 270-2021 | | REUNIÓN |
| ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Infraestructura | FECHA: 08/10/2021 | Virtual ____ Presen. X |
| LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: U A L | HORA INICIO: 1100am | HORA FINAL: 11:30am |

| PARTICIPANTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | DOC. IDENTIDAD | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
| 1. Mg CEA Helson Mosso | 79'442.936 | | U.A.P.C | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

- Se inicia reunión de comite Técnico a la fecha y hora señaladas.
- Avance de obra del 5%
- La Entidad manifiesta que no se ha cumplido con el compromiso de la presentación del Render. (compromiso para el lunes 11 oct.)
- La entidad manifiesta la preocupación por el atraso de los entregables. No les va autorizar prorroga.
- La Entidad solicita al contratista que envie una propuesta de Cronograma de trabajo a partir del próximo miercoles 13 de octubre.
- La Entidad Solicita, la muestra del Policarbonato que será instalado en la entrada del Edificio Fe en la causa.
- La entidad manifiesta que se autoriza la camacemento que se instalará en la Plazoleta Principal del Hosmil

- La entidad manifiesta que el adoquin de trafico que se debe instalar debe ser de color azul.
  El contratista manifiesta que no existe en el mercado
- El contratista manifiesta otra opción de la instalación de instalación de Adoquin en concreto azul, (Placa maziza) Para evitar las solicitudes por garantia en Pintura y realizar la rampa. (Paso peatonal)
- La Entidad Aprueba el cronograma para el cerramiento de la via del 19 -al 27 de octubre de 2021.

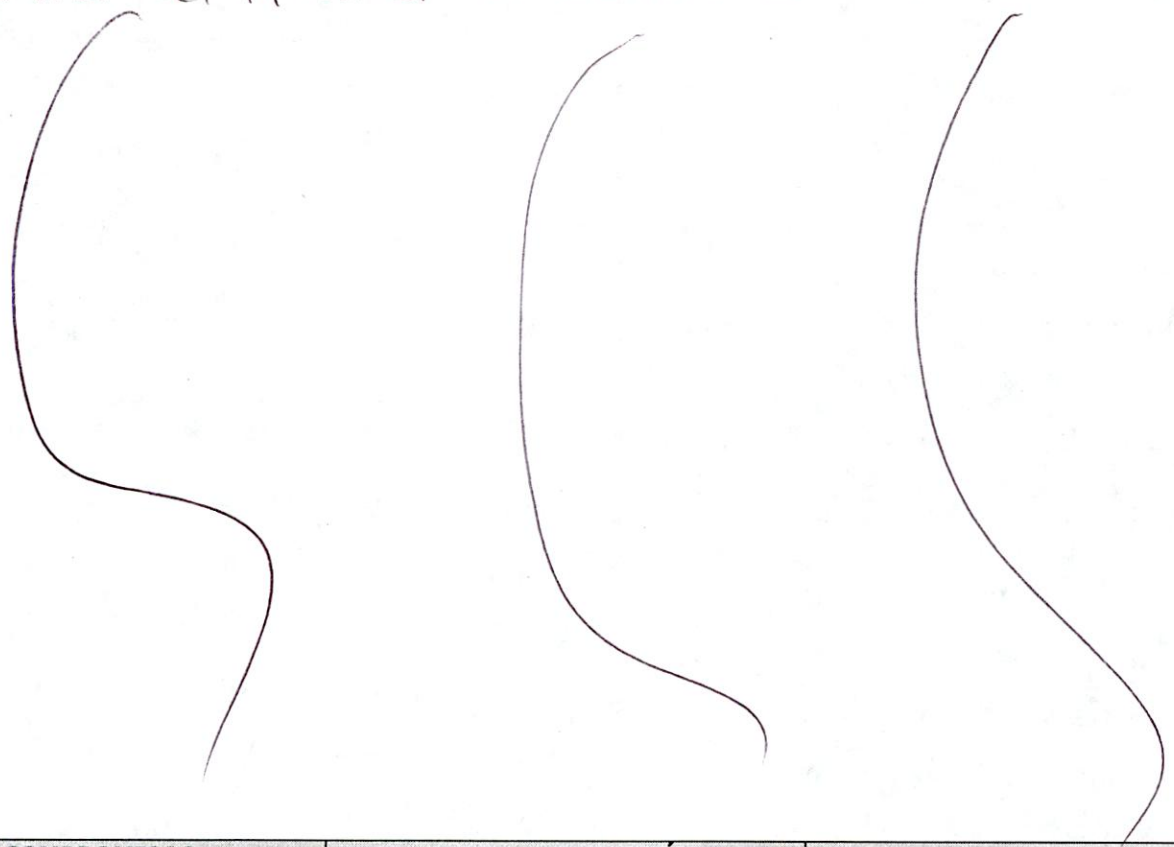


| COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |

| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | LISTA DE ASISTENCIA | CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-13 |
|---|---|---|
| Grupo Social y Empresarial de la Defensa | OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad) | FECHA DE EMISION: 19-02-2021 |
| | PROCESO: PLANEACIÓN | VERSIÓN: 04 |
| | | Página 1 de 2 |
| | TEMA DE REUNIÓN: cte técnico - cto 270-2021 GRUPO O ÁREA: Infraestructura | |
| | FECHA: 08/10/2021 HORA: 11:00 - 11:30 am. LUGAR: Oficina UAL | |
| | CONFERENCISTA: | |
| | CAPACITACION:____ INTENSIDAD HORARIA:_____ | |
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | | |

| No. | NOMBRE | DOC. IDENTIDAD | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Alejandro Ceballos Prieto | 1071179114 | Ing. Residente | INTEC | Sergio Ceballos |
| 2 | Marlon Gutierrez | 1016021807 | Ing Director | INTEC | |
| 3 | My(ex) Nolson Mosso) | 17 447.930 | | U.A.P.C | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **MANTEMINEO Y ADECUACION DE POLICARBONATO, PLAZOLETA Y CUBIERTA** | **30 días** | **jue 30/09/21** | **mié 10/11/21** |
| 2 | | **IMPERMEABILIZACION PLAZOLETA** | **21 días** | **jue 30/09/21** | **jue 28/10/21** |
| 3 | | Desmonte de adoquin | 4 días | jue 30/09/21 | mar 5/10/21 |
| 4 | | Retiro de base | 2 días | mié 6/10/21 | jue 7/10/21 |
| 5 | | Desmote de impermeabilizacion | 2 días | vie 8/10/21 | lun 11/10/21 |
| 6 | | Limpieza de placa | 2 días | mar 12/10/2 | mié 13/10/2 |
| 7 | | Impermeabilizacion fiber Gl | 4 días | jue 14/10/21 | mar 19/10/2 |
| 8 | | Cama de arena de peña | 3 días | mié 20/10/2 | vie 22/10/21 |
| 9 | | Instalacion de adoquin | 4 días | lun 25/10/21 | jue 28/10/21 |
| 10 | | Confinamineto externo e interno | 2 días | lun 25/10/21 | mar 26/10/21 |
| 11 | | Arena para sello o emboquillada | 2 días | mié 27/10/21 | jue 28/10/21 |
| 12 | | Escarificacion de placa | 1 día | mié 20/10/2 | mié 20/10/2 |
| 13 | | Parrilla de acero | 1 día | jue 21/10/21 | jue 21/10/21 |
| 14 | | Placa de concreto de 3.000p | 2 días | vie 22/10/21 | lun 25/10/21 |
| 15 | | Adoquin trafico pesado vehicular | 1 día | mar 26/10/21 | mar 26/10/21 |
| 16 | | **CUBIERTA POLICARBONATO** | **10 días** | **lun 11/10/21** | **vie 22/10/21** |
| 17 | | Mantenimiento de estructura metalica | 4 días | lun 11/10/21 | jue 14/10/21 |
| 18 | | Desmonte de policarbonato | 1 día | vie 15/10/21 | vie 15/10/21 |
| 19 | | Pintura de estructura metali | 3 días | lun 18/10/21 | mié 20/10/2 |
| 20 | | Instalacion de policarbonato | 2 días | jue 21/10/21 | vie 22/10/21 |
| 21 | | **CUBIERTA PRINCIPAL EN VIDR** | **11 días** | **mié 27/10/2** | **mié 10/11/2** |
| 22 | | Estructura metalica para cubierta en vidrio | 5 días | mié 27/10/21 | mar 2/11/21 |
| 23 | | Pintura de estructura metali | 2 días | mié 3/11/21 | jue 4/11/21 |
| 24 | | Suministro e instalacion de vidrio para cubierta | 4 días | vie 5/11/21 | mié 10/11/21 |

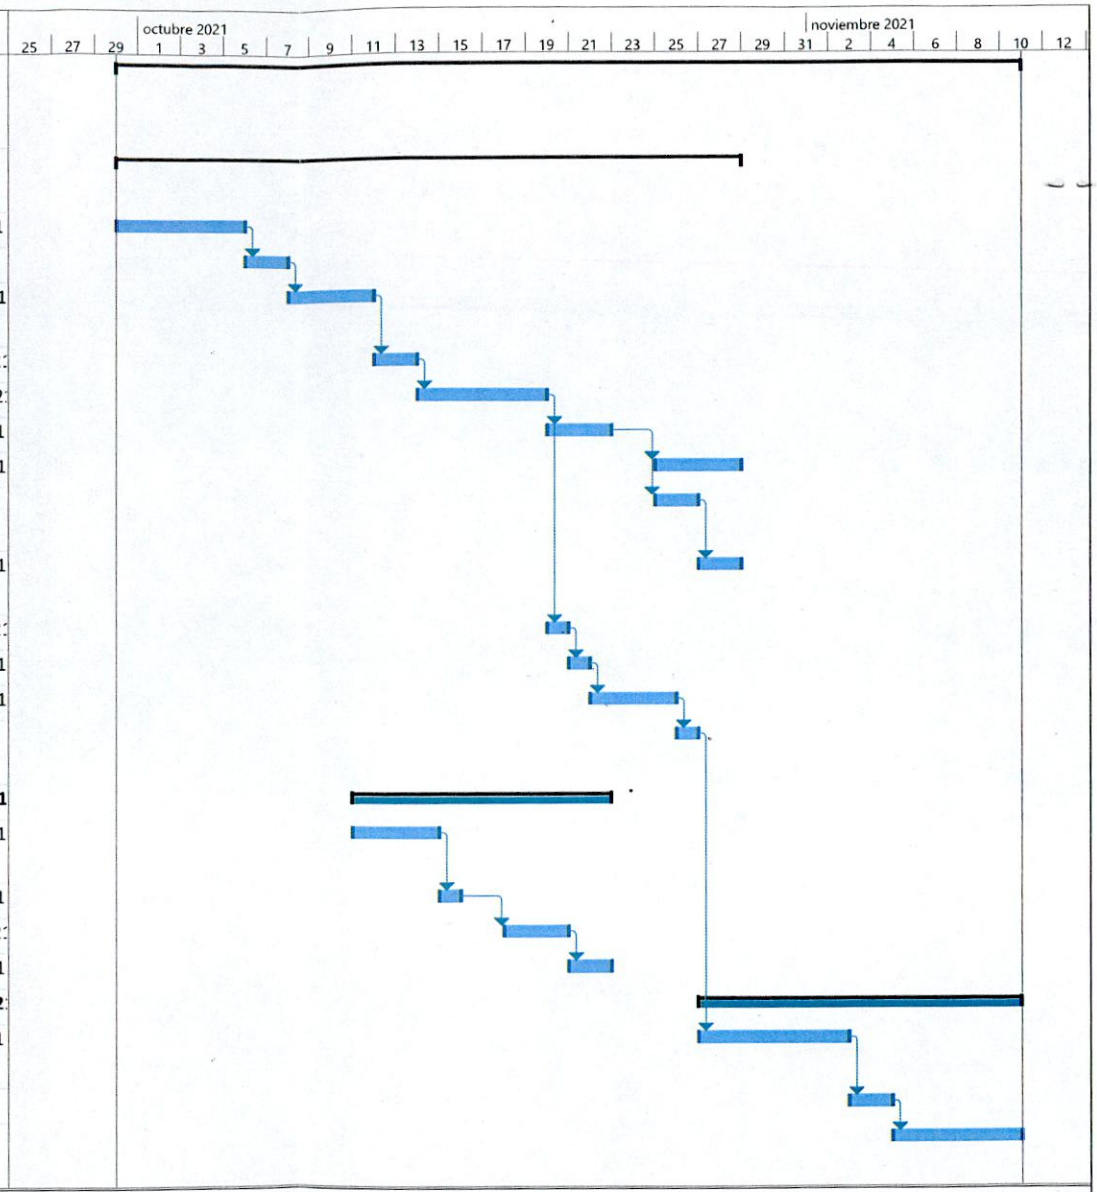


Proyecto: MARQUESINA CRON
Fecha: vie 8/10/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
