HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL
AREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N° 2 **DEL:** 08/10/2021 (dd/mm/yyyy) **AL:** 14/10/2021 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 270-2021 **CONTRATISTA:** INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 01/10/2021 (dd/mm/yyyy) **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/11/2021 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	x	Prorroga		Aclaraciones técnicas	
Suspendido		Adición		Cambio de especificación	

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		arena de peña	5 m3	equipo de compactacion	1	Ingeniero	1
		cemento	25 bultos	equipo de impermeabilizacion	1	Mestro de Obra	1
				herramienta menor	5	Obreros	2
						Instalador	1
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-)	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
30,00%	35,00%	8,00%	13,00%	22,00%	13	$ 30.913.344


GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	14	46

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

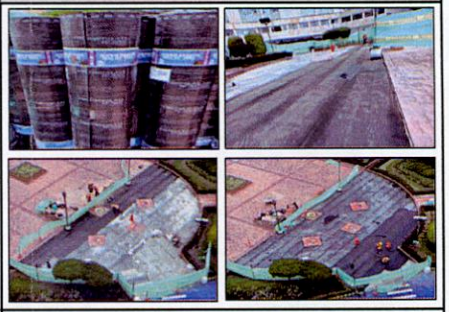

6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER. INSTALACION CAMA DE ARENA Y ADOQUIN

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?	
	SI	NO

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:



9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	
	INICIAL	ACTUAL
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00
Obras Adicionales		
TOTAL		$140.515.200,00

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Programa de salud ocupacional	
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICAS DE MEDIANA INTENSIDAD LOS DÍAS 11 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021.

Elaboró:
JUAN MANUEL NOVOA
Representante Legal
Firma y posfirma

Revisó:
MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ
Supervisor HOMI/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO
Firma y posfirma
