	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	3
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/10/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/10/2021	**AL:**	31/10/2021
CONTRATO Nº	036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021	**CONTRATISTA**	MARCAS INGENIERÍA S.A.S.		
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"				
FECHA DE INICIO	23/08/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	19/11/2021		
VALOR INICIAL	$ 472.727.561,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	N/A	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 472.727.561,00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

El contrato se firmó el día 29 de julio del 2021, acta de inicio 23 de agosto del 2021. El mismo se encuentra perfeccionado, así:

Pólizas Garantía contractual

*Póliza de Seguros No: 14-44- 101132072 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

• Cumplimiento de contrato. Vigencia: 28/07/2021 hasta el 19/05/2022. Valor: $ 94.545.512,20.
• Calidad del servicio. Vigencia: 28/07/2021 hasta el 19/11/2022. Valor: $ 141.818.268,30.
• Estabilidad y calidad de la obra. Vigencia: 19/11/2021 hasta el 19/11/2026. Valor: $141.818.268,30.
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Vigencia 29/17/2021 hasta el 19/11/2024. Valor: $ 23.636.378,05.

Pólizas Responsabilidad civil extracontractual:

*Póliza de Seguros No: 14-40- 101037314 SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS

• Predios, labores y operaciones - Deducible 10% de la pérdida, mínino: 1.00 SMMLV - Vigencia desde 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: $ 181.705.200,00.
• Daño emergente y lucro cesante - Deducible 10% de la pérdida, mínino: 1.00 SMMLV - Vigencia desde 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: $ 181.705.200,00.
• Perjucicios extrapatrimoniales - Deducible 10% de la pérdida, mínino: 1.00 SMMLV - Vigencia desde 29/07/2021 hasta el 19/11/2021. Valor: $ 181.705.200,00.

El contratista radicó ante la alcaldía de Madrid el protocolo de bioseguridad, el cual se encuentra publicado como anexo del acta de inicio.

Con fecha 20 de octubre, se aprobó modificatorio 01 al contrato, para la adición de ítems no previstos, los cuales eran necesarios para llevar a cabo el objeto contractual.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	Viaje Mixto	24 mts	Palas	3	Director de obra	1	30	30	SI	El Señor Director de obra Juan Carlos Marín Herrera, se ha presentado en l unidad de acuerdo al porcentaje establecido en el contrato, 30%.
N/A	N/A	Viaje arena	24 mts	Carretillas	1	Residente de obra	1	100	100	SI	La señora Jessica Natalia Duarte Fierro, Residente de obra, se ha presentado en la unidad de acuerdo al porcentaje establecido en el contrato, 100%.
N/A	N/A	Malla Electrosoldada	200 mts	Pulidora	1	Residente SST	1	100	100	SI	La señora Luz Stella Paez Santoyo, Residente SISO, se ha presentado en la unidad de acuerdo al porcentaje establecido en el contrato, 100%.
N/A	N/A	Varilla	120 mts	Cortadora	1	Obra civil	6				
N/A	N/A	Cemento	150 bultos	Trompo mezclador	1	Soldadores	5				
N/A	N/A	Perfileria metalica	5000 KL	Equipo para soldadura	1						
N/A	N/A	Soldadura	20 kilos	Equipo para soldadura	1						
N/A	N/A	Pintura	20 galones	Compresor	1						
N/A	N/A	Tuberia electrica MT	30 tubos	Taladro percutor	2						
N/A	N/A	Cable electrico	6 rollos	Destornillador	3						
N/A	N/A	Lamparas de Incrustar	40	Multimetro	2						
N/A	N/A	Polisombra	60 mts	Puntillas	7 cajas						
N/A	N/A	Pegacor	180 bultos	Valdes	3						
		Enchape Fortezza Marfil	59 metros cuadrados	Palustres	3						
		Bateria sanitaria	2 griferia lavamanos	Llaves de tubos	1						
		Enchape Laja Negro	24 metros	Boquillera	2						
		Pegante gris	10 bultos de 25kg	Palustres	2						
						TOTAL	14				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN











PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA











EJECUCIÓN SEMANAL OCTUBRE		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 6	6,07%	**50,28%**	**50,40%**	**-0,12%**
Semana 7	0,71%			
Semana 8	28,95%			
Semana 9	1,69%			




















GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA






















AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**52,00%**
EJECUTADO		**50,28%**










GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
ALOJAMIENTO NÚCLEO DE SEGURIDAD			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
17. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		**50,00%**
	EJECUTADO		**20,00%**
19. APARATOS SANITARIOS	PROGRAMADO		**60,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

MISCELÁNEOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**50,00%**
	EJECUTADO		**50,00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**50,00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. PINTURAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ESTADO MAYOR			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		**40,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		**40,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
13. PINTURAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		**80,00%**
	EJECUTADO		**80,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
PLANTA PTAP - CUARTO DE QUÍMICOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. PINTURAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		100,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
EDIFICIO DE AULAS - RAMPAS Y BAÑOS PMR			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
MANTENIMIENTO VIGA CANALES			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
KIOSCO DE MÚSICOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
KIOSCO PARA ASADOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		20,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		30,00%
	EJECUTADO		0,00%
CETIA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		50,00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

21. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
24. ASEO GENERAL	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES MODIFICATORIO 01 - NO PREVISTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. CARPINTERÍA ALUMINIO / VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SALA DE VIDEOCONFERENCIAS - ESUFA			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		50,00%
	EJECUTADO		50,00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO - N/A			
30	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	89	70	19
Proyección	89	70	19

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS









7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
70	-1	20/11/2021

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ALOJAMIENTO NÚCLEO DE SEGURIDAD: De acuerdo a la aprobación de ítems no previstos, se realiza relleno compactado con el fin de subir nivel de baños y dar solución a inundación por aguas negras que se devuelven por la red sanitaria, se funde placa de piso, se realiza mantenimiento y reforzamiento de estructura de cubierta existente, se realiza instalación de cubierta, se realiza enchapes de piso y muros de baño, se realiza instalación de cielo falso y luminarias, e instalación de aparatos sanitarios y accesorios, se realiza instalación de red eléctrica (interruptores y tomacorrientes), se realiza mampostería y se funde mesón en concreto, se construye caja de inspección necesaria también para dar solución al problema sanitario, se realiza instalación de puntos de gas y red de agua caliente.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
ALOJAMIENTO DE SOLDADOS: Se presenta atraso por fabricación de divisiones en acero inoxidable.			NO	
ESTADO MAYOR: Pendiente instalación cielo raso y piso archivo. Se presenta atraso por no consecución de material.			NO	

MISCELÁNEOS: Se ha ejecutado el 100% de actividades preliminares, se realiza instalación de contravientos. De acuerdo a la aprobación de ítems no previstos, se realiza mantenimiento y reforzamiento de estructura de cubierta, se realiza instalación de cubierta tipo sandwich, se realiza instalación de canal galvanizada y bajantes, se realiza instalación de cielo raso y puntos para luminarias. **ESTADO MAYOR:** Se funde y deja fraguar losa de contrapiso con malla electrosoldada, se realiza alistado y afinado de piso, se realiza demolición de piso monumentos y se alista piso. Se realiza demolición de acabado de piso y paredes de archivo, se realiza demolición de cielo falso, pañete, estuco y pintura archivo. De acuerdo a aprobación de no previstos, se realiza relleno con recebo, se realiza enchape de exteriores. **PLANTA PTAP - CUARTO DE QUÍMICOS:** Se realiza afinado de piso. De acuerdo a aprobación de no previstos se realiza mantenimiento de malla eslabonada, se realiza armado de columnas de confinamiento muro, se realiza fundición de rampas, se realiza reforzamiento de estructura de cubierta e instalación de cubierta eternit, se fabrica puerta metálica corrediza y pintura. **CETIA:** De acuerdo a aprobación de no previstos, se realiza reforzamiento estructural. **EDIFICIO DE AULAS:** Construcción de rampa. Se aclara que se decide no ejecutar la construcción de baños PMR en el edificio de aulas Morales, ya que se corrobora que en el nuevo comedor, se construirán el total de 04 baños con estas características. **SALA DE VIDEOCONFERENCIAS:** De acuerdo a análisis estructural del edificio donde se encuentra ubicado el CETIA, fue necesario realizar refuerzo estructural en el primer piso, lo anterior con el fin de hacer el edificio seguro, y poder continuar con las actividades de mantenimiento. Además teniendo en cuenta que las aulas de laboratorios albergarán maquinas de gran tañano y peso en el segundo nivel. Por lo anterior, se crea frente de obra sala de videoconferencias, ya que es la zona del primer piso que más afectada se encuentra por este imprevisto. Se adjunta reprogramación de todos los frentes de obra al presente informe, ya que fue necesario realizar inclusión de actividades no previstas, que fueron aprobadas con el modificatorio N.01 el día 20 de octubre del 2021. Se aclara que hay una diferencia de actividades respecto a los primeros informes, ya que algunas contractuales no fueron necesarias debido a la inclusión de no previstos, que en algunos casos las complementan. Algunos no previstos solo sugieren cambio de material, sin embargo que consideran como N-P. Se presenta incremento de porcentaje de avance en la semana del 18 al 23 de octubre, debido a que corresponde a la semana de aprobación de no previstos, situación que limitó significativamente el avance de todos los frentes. Realizándose previamente actividades de apoyo, a la espera de respuesta positiva de aprobación por parte de los comités. De esta forma se evidencia la necesidad y oportunidad del mencionado modificatorio.	**KIOSCO PARA ASADOS:** Pendiente completar cimentación y estructura. Debido al invierno, no es posible ingresar material con fluidez a la unidad, porque la humedad genera que el suelo esté blando y los vehículos se entierren.			NO	

OBSERVACIONES:
Se presenta un atraso en algunas actividades por lluvias constantes;
Alojamiento núcleo de seguridad: Se realizaron todas las actividades previstas contractualmente y no previstos aprobados sin novedad.
CETIA: Se realiza parte de reforzamiento estructural en sala de video conferencias ESUFA y primer piso del edificio. Esta actividad condiciona la realización de las demás actividades, ya que continuar intervención sin finalizar esta, conlleva a riesgos para el personal que convive en el edificio y personal contratista que realiza los trabajos. Lo anterior, justifica el atraso que se presenta.
Misceláneos: Se ejecutam actividades contractuales e ítems no previstos sin novedad.
Planta PTAP- Químicos: Se ejecutan actividades contractuales y no previstos sin novedad.
Estado Mayor: Se ejecutan actividades contractuales y no previstos sin novedad. A la fecha se tienen pendientes actividades en el archivo de contratos debido a consecución de material.
Viga Canales: Sin novedad.
Kiosco para asados: Se presenta atraso de actividades por lluvias.
Kiosco de músicos: Sin novedad.
GENERAL: Debido a modificatorio del contrato, aprobación de ítems no previstos el día 20 de octubre de 2021, se debió realizar reprogramación de obra, quitando actividades que finalmente no se ejecutarán y adicionando las que finalmente quedaron contempladas en el presupuesto. Lo anterior, con el fin de ejecutar cada frente de la manera más óptima, en pro de entregar instalaciones seguras y funcionales.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 472.727.561,00	$ 472.727.561,00	$ 228.498.343,00	50,28%	$ 244.229.218,00	50%
Adiciones	N/A	N/A				
Reducciones	N/A	N/A				
TOTAL	$ 472.727.561,00	$ 472.727.561,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 472.727.561,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	N/A	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 472.727.561,00	
ANTICIPO (Si aplica)	N/A	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE	$ 4.287.721,00	
SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE	N/A	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 4.287.721,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	SI	SI	SI	
PRESENTACIÓN A.P.U.	SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan recomendaciones generales al personal contratista como; llevar a cabo protocolos de bioseguridad, utilizar elementos de protección personal, desarrollar actividades en altura con seguridad, y mantener la debida distancia con el personal de alumnos de la Escuela.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Días generalmente de lluvias. Se han visto afectadas varias actividades por motivo de las lluvias.

ELABORÓ:	REVISÓ:
Maritza Fernández ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza Supervisor Contrato Firma y Posfirma	N/A Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS

ESTATALES ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto a contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan.

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

- La presente lista de chequeo es una **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que deben realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto Administrativo designación de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planes, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en material de seguridad social, salud ocupacional, planes de			

	contingencia, normas ambientales y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		De acuerdo al presente informe de supervisión.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		
10	Informe de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo con la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			NO APLICA. El contrato se encuentra en ejecución

Maritza Fernández

Subteniente FERNÁNDEZ MAZABUEL DELIA MARITZA

Supervisor del Contrato N.º 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021

MARCAS INGENIERIA SAS
Asesoría, Consultoría y construcción de obras civiles
NIT: 900313415-1

Chía Cundinamarca, 19 de octubre de 2021

ST .
MARITZA FERNANDEZ
Supervisor Contrato
La ciudad

Oficio No CE-ES-077-2021 contrato de obra pública No. 036-00-K-ESUFA-GRUAL- 2021

Ref.: Programación ESUFA y CETIA con No previstos


Cordial saludo:
Por medio de la presente me permito enviar la programación de 9 frentes de trabajo descritos en la siguiente tabla.

ZONA/ FRENTE	**FECHA DE INICIO**
Alojamiento Núcleo de seguridad	23 de agosto 2021
Mantenimiento Kiosco para asados	30 de septiembre 2021
Mantenimiento Kiosco para músicos	10 de noviembre 2021
Estado Mayor	15 de septiembre 2021
Misceláneos	6 de septiembre 2021
Planta PTAP - Cuarto de químicos	13 de septiembre 2021
Ed de aulas-rampas y baños	1 de noviembre 2021
Mantenimiento Viga Canales	10 de noviembre 2021
CETIA	23 de agosto 2021

Agradeciendo la atención prestada,
Atentamente,

JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ
Representante Legàl MARCAS
INGENIERIA SAS

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		INICIO	1 día?	lun 23/08/21	mar 24/08/21	
2		**1. PRELIMINARES**		**lun 23/08/21**		
3		DEMOLICION (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISOS Y PAREDES.	2 días	mar 24/08/21	jue 26/08/21	5
4		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE/ LADRILLO / DRY WALL INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	2 días	jue 26/08/21	sáb 28/08/21	3
5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	1 día	lun 23/08/21	mar 24/08/21	
6		DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0.15	3 días	sáb 28/08/21	mié 1/09/21	4
7		DESMONTE DE CIELORRASO	1 día	lun 11/10/21	mar 12/10/21	38
8		DEMOLICIÓN DE CUBIERTA	2 días	mié 13/10/21	vie 15/10/21	10
9		DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	1 día	vie 15/10/21	sáb 16/10/21	8
10		DESMONTE DE LUMINARIAS	1 día	mar 12/10/21	mié 13/10/21	7
11		**6. MAMPOSTERIA**		**lun 23/08/21**		
12		MURO EN BLOQUE DE CEMENTO H.E. (140 10MTS) (0.330/0.115/40 20) MTS	3 días	sáb 11/09/21	mié 15/09/21	22
13		MESON EN CONCRETO	2 días	mié 6/10/21	vie 8/10/21	36
14		**8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		**mar 24/08/21**		
15		RESATA PARA INSTALACION DE TUBERIA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	2 días	mié 1/09/21	vie 3/09/21	8
16		PUNTO SANITARIO Ø 2"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
17		PUNTO SANITARIO Ø 4"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
18		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
19		TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2"	6 días	vie 3/09/21	vie 10/09/21	15
20		TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
21		PUNTO DE AGUA CALIENTE TUBERIA ULTRAT EMP Ø 1/2"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
22		TUBERIA PVC PRESION PIDE 13.5 Ø 1/2"	7 días	vie 3/09/21	sáb 11/09/21	15
23		**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**		**lun 23/08/21**		
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 10W, INCLUYE	2 días	sáb 23/10/21	mar 26/10/21	49
25		**10. PARETES**		**lun 23/08/21**		
26		PAREJE IMPERMEABLE(MUROS 1.3 - 6)= 17.4M. INCLUYE SU APLICACIÓN EN JUNTAS, CARTERAS Y DILATACIONES"	6 días	mié 15/09/21	mié 22/09/21	12
27		**11. CIELORRASO**		**lun 23/08/21**		
28		CIELO RASO PVC 1.8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPLEMENTOS PARA INSPECCION)	1 día	sáb 23/10/21	lun 25/10/21	49
29		**12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIO**		**lun 23/08/21**		
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF 30X60 CM (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PEGANTE EN COLOR BLANCO EN LOS PILOS) (EN BAÑOS A INTERVENIR.)	9 días	mié 22/09/21	sáb 2/10/21	26
31		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA VALDIVIA MENGUE REF: 9070 (77 CM (EN BAÑOS A INTERVENIR.)	1 día	sáb 23/10/21	lun 25/10/21	49
32		**17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**		**lun 23/08/21**		
33		DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H=1.80 INCLUYE PUERTA 0.50 MT CON PISO CALIBRO SOCOBA A TODO COSTO.	9,75 días?	mar 26/10/21	sáb 6/11/21	
34		**18. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		**lun 23/08/21**		
35		LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO INCLUYE CON POCETA	1 día	sáb 2/10/21	lun 4/10/21	30
36		GRIFERIA DUCHA	2 días	lun 4/10/21	mié 6/10/21	35
37		**20. VIDRIOS Y ESPEJOS**		**lun 23/08/21**		
38		ESPEJO BISELADO 4 mm (FLOTADO EN MURO)	2 días	vie 8/10/21	lun 11/10/21	33
39		**24. ASEO GENERAL**		**lun 23/08/21**		
40		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	73,75 días?	lun 23/08/21	vie 26/11/21	
41		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	73,75 días?	lun 23/08/21	vie 26/11/21	
42		**ITEM CONTRACTUAL DE PLANTA PTAP - QUIMICOS EJECUTADO EN ALCHAMBUYO NUCLEO DE SEGURIDAD**		**lun 23/08/21**		
43		CONCRETO DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS INCLUYE MANO DE OBRA FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS EN SITIO	1 día	mar 19/10/21	mié 20/10/21	53
44		**ITEM CONTRACTUAL DE ESTADO MAYOR EJECUTADO EN ALCHAMBUYO NUCLEO DE SEGURIDAD**		**lun 23/08/21**		
45		MALLA ELECTROSOLDA	1 día	mar 19/10/21	mié 20/10/21	53

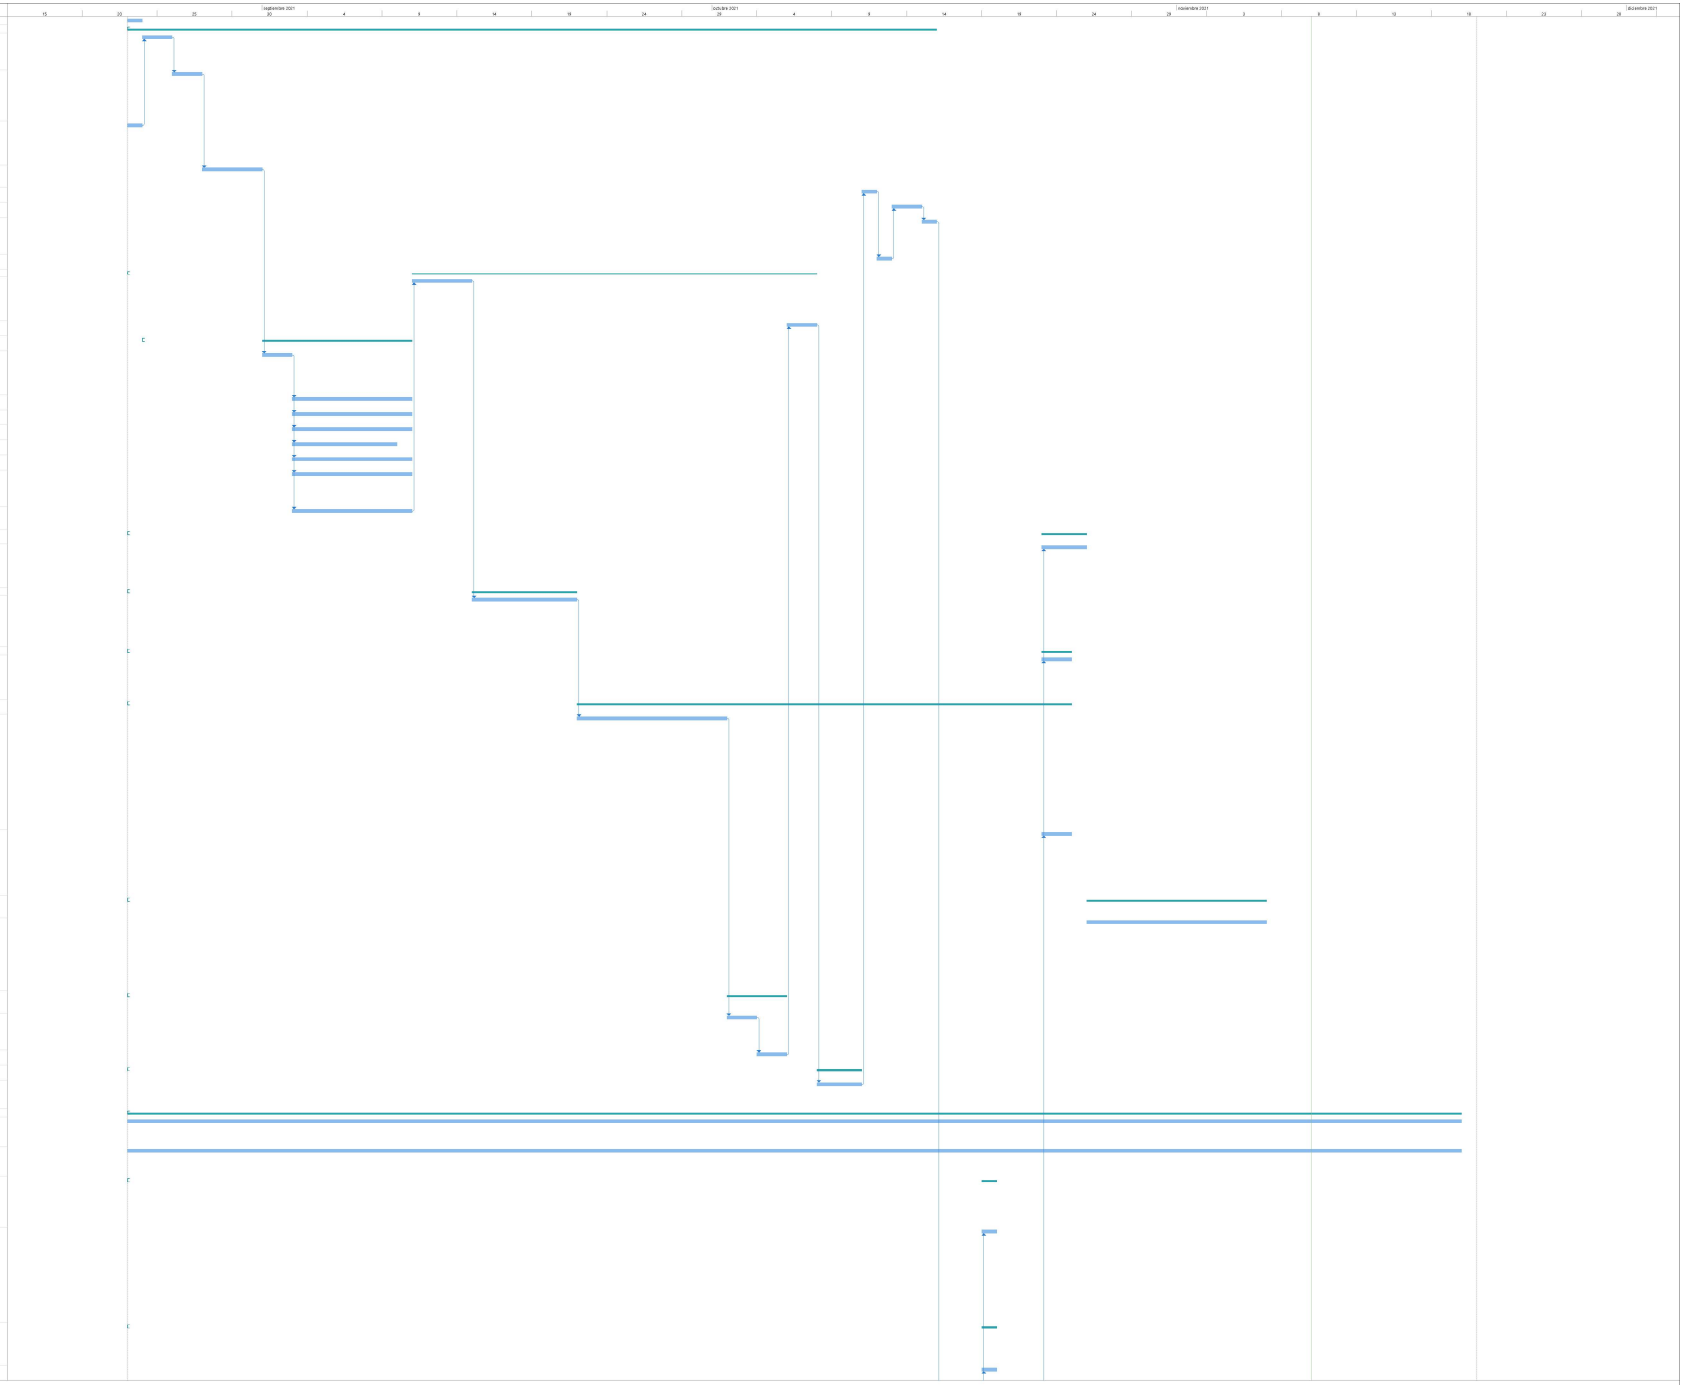

Proyecto: EBJFA
Fecha: mié 10/11/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Resumen inactivo
Hito inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
46		**ITEM CONTRACTUAL DE OTRA EJECUTADO EN ALOJAMIENTO NUCLEO DE SEGURIDAD**		**lun 23/08/21**		
47		SUMINISTRO, E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125V 1 TEMPT/1 RED NORMAL INCLUYE SALIDA DE CABLEADO(PE+F DE HALOGENOS), CANALIZACION A	0,75 días?	mié 20/10/21	mié 20/10/21	
48		**NO PREVISTOS**		**lun 23/08/21**		
49		SEÑALIZACION ARQUITECTONICA ACCESOS 0,75X0,95MTS COLOR GRIS/GRIS MAUAL UNA	2 días	jue 21/10/21	sáb 23/10/21	50
50		MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA INCLUYE SOLDADURA, ANTIOXIDRONVO Y PINTURA EN ESMALTE	2 días	mar 19/10/21	jue 21/10/21	53
51		SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR COMBILTABLE INCLUYE SALIDA DE CABLEADO (FF, NF, I.S, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS) TUBERIA PS PVC(SPITOLA TOTAL) LISA, TERMINALES, UNIONES, GAN SADO Y ACCESORI	0,75 días?	mié 20/10/21	mié 20/10/21	
52		SEMILLERO EN PERFILARIA PARA ESTRUCTURA EXISTENTE	1 día	mar 19/10/21	mié 20/10/21	53
53		SELLADO, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO B 200	1 día	sáb 16/10/21	mar 19/10/21	9
54		CAJA DE INSPECCION CLB240.80 MT CON MARCO Y	1 día	mié 20/10/21	mié 20/10/21	
55		GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLO MODAL, INCLUYE SISTEMA TIPO BOTELLA CON DESAGUE SENCILLO HIDRAULI	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	
56		GRIFO PARA ORINAL TIPO PUSH EDIN REGULADOR DE CONSUMO	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 3/4" AGUA CALIENTE (250) DE SUMINISTROS, INCLUYE ACCESORIOS, FIGATA Y REPARACION.	25,75 días?	mié 20/10/21	sáb 20/11/21	
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 1/2 Agua CALIENTE (250) DE SUMINISTROS, INCLUYE ACCESORIOS, FIGATA Y REPARACION.	1 día	sáb 23/10/21	sáb 23/10/21	
59		SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS DE 76 LITROS TIRO NATURAL CON POTENCIA REGULABLE, REFERENCIA CALEMIZOSAVAL ENCENDIDO ELECTRONICO, REGULADOR DE GAS, SELECCION DE TEMPERATURA, SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA, VALVULA DE ALIVIO DE S	0,75 días?	vie 22/10/21	vie 22/10/21	
60		EMPRADIZACION DE JARDINES ZONAS EXTERIORES ENTORNO DEL EDIFICIO, INCLUYE PASTO ENRAIZ, TIERRA NEGRA,	73,75 días?	lun 23/08/21	vie 19/11/21	

Proyecto: EDIFA
Fecha: mié 10/11/21

Página 2


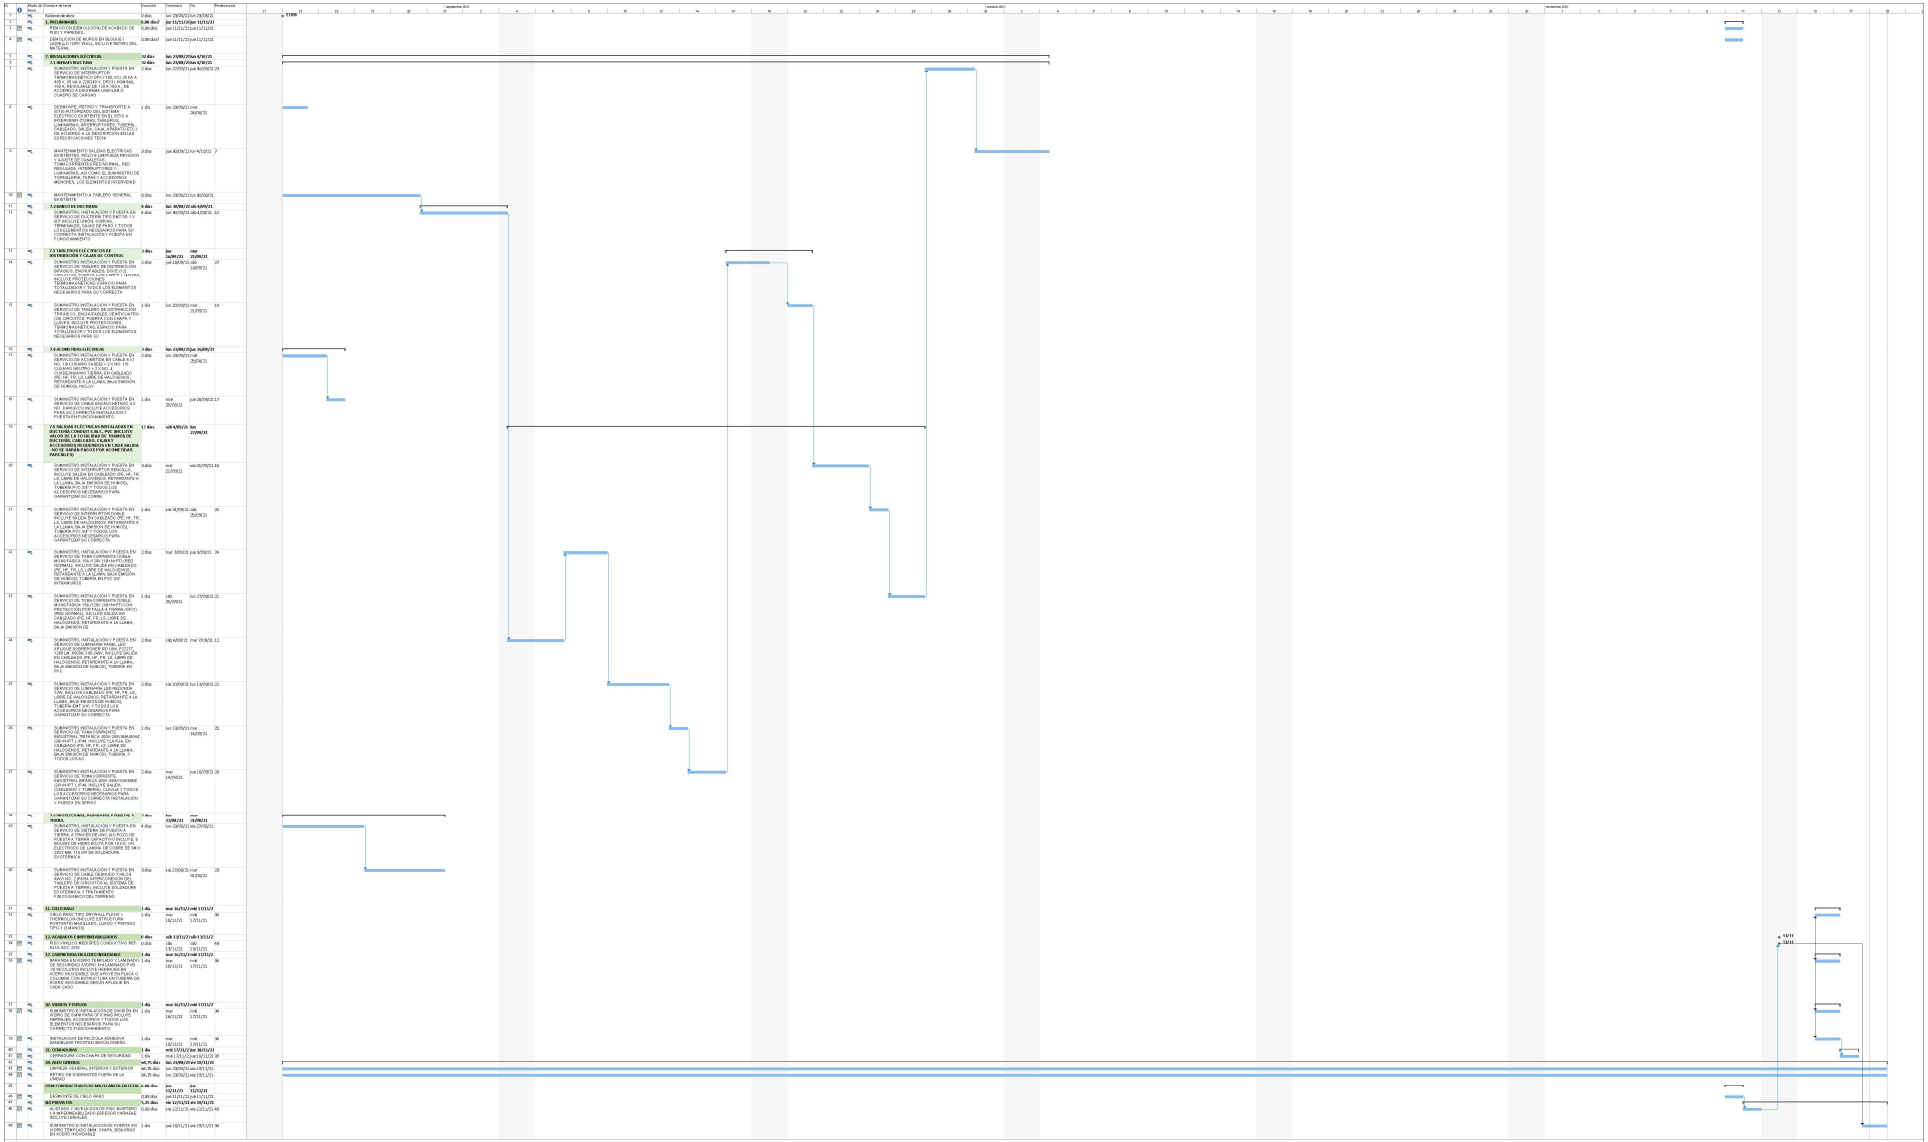

septiembre 2021
octubre 2021
noviembre 2021
21/09
03/11
12/11

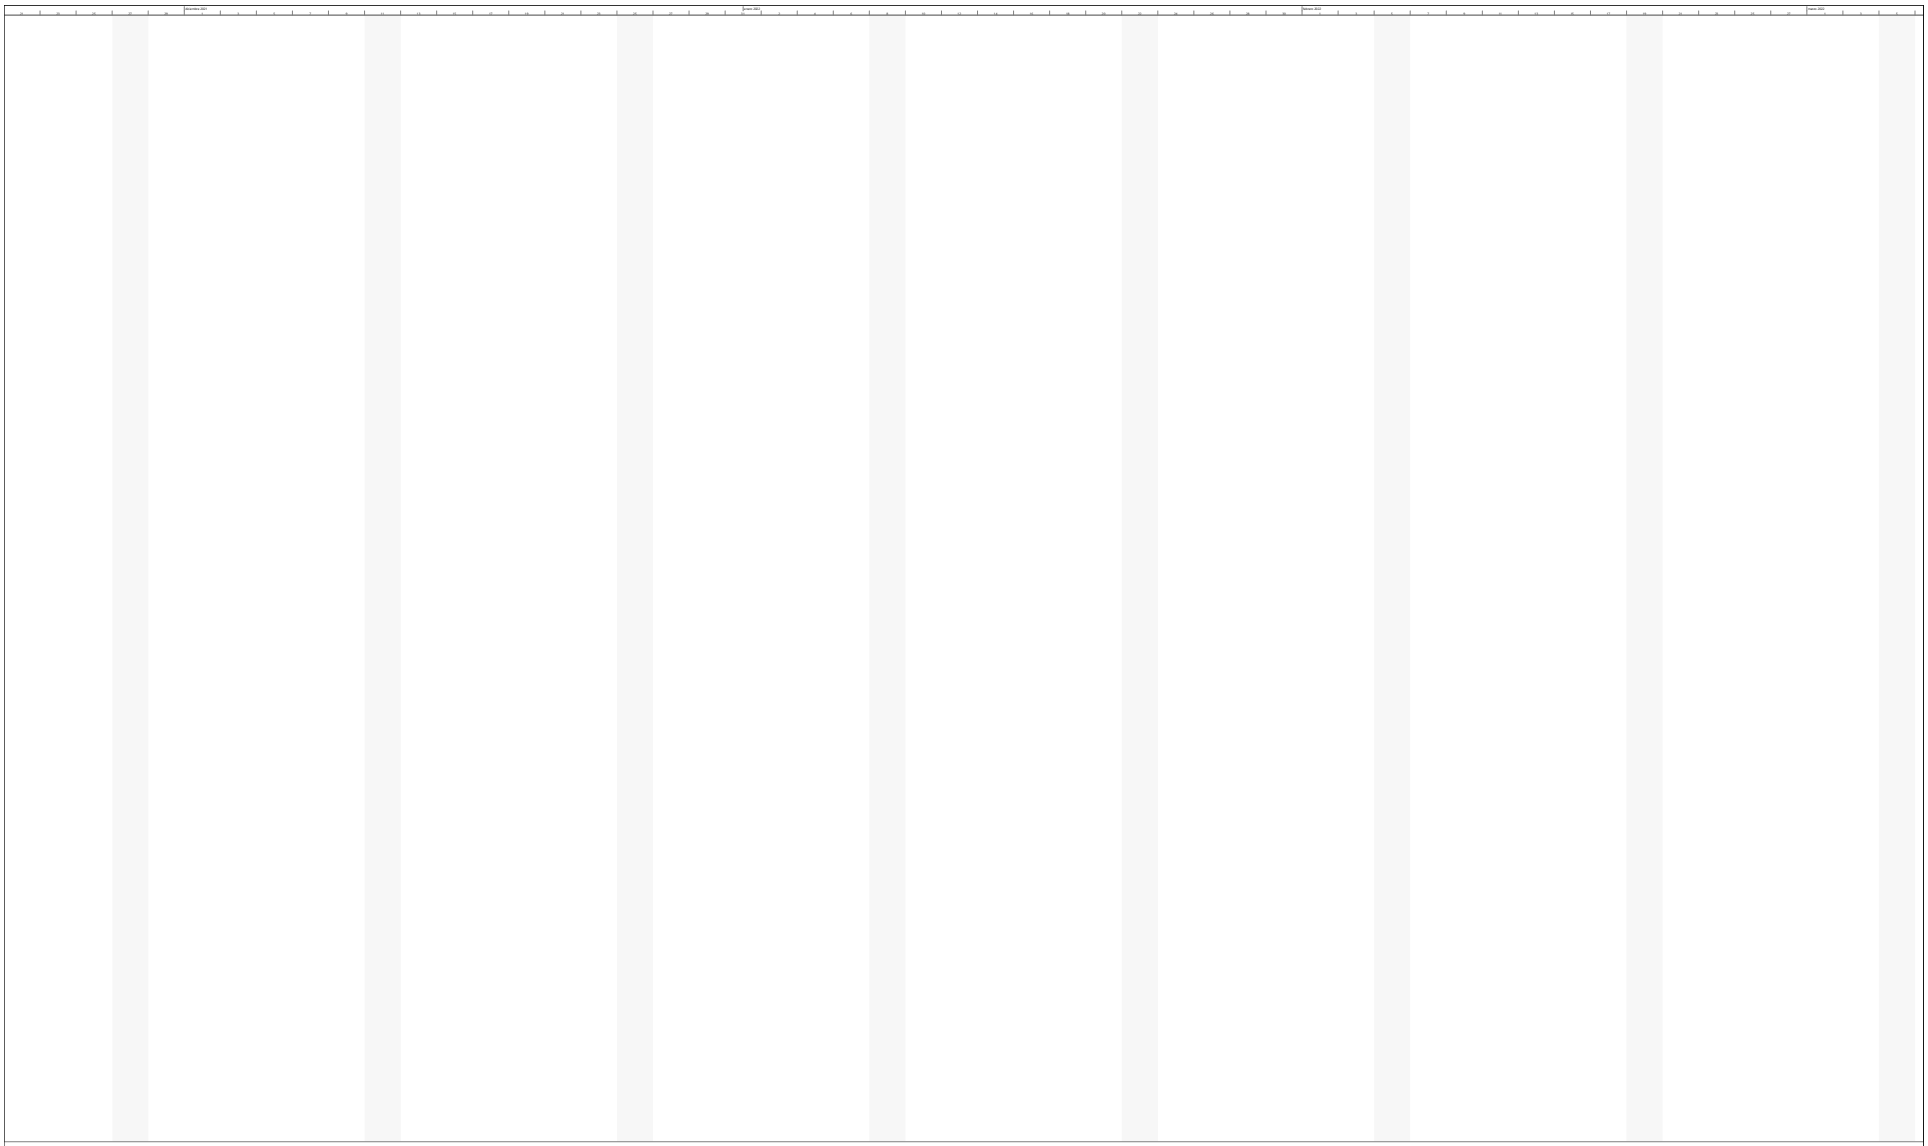
Figura 1



Proyecto: CETIS mediBuscAr
Fecha: vie 10/12/21


Tarea
Duración
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		PRESUPUESTO EDIFICIO DE AULAS - RAMPAS Y BAÑOS PMR	0 días	lun 1/11/21	lun 1/11/21	
2		**4. ESTRUCTURA**	**6 días**	**lun 1/11/21**	**lun 8/11/21**	
3		RAMPA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZAI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	6 días	lun 1/11/21	lun 8/11/21	
4		MALLA ELECTRO SOLDADA	6 días	lun 1/11/21	lun 8/11/21	
5		**24. ASEO GENERAL**	**6 días?**	**lun 1/11/21**	**lun 8/11/21**	
6		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	6 días?	lun 1/11/21	lun 8/11/21	
7		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	6 días?	lun 1/11/21	lun 8/11/21	

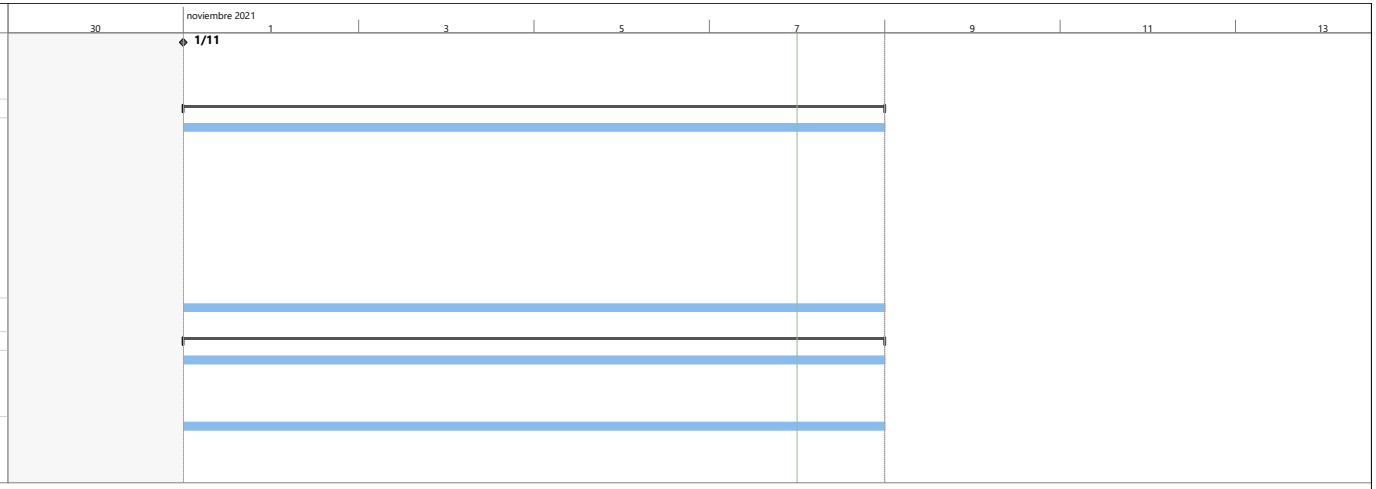


Proyecto: PRESUPUESTO EDIFIC
Fecha: lun 8/11/21

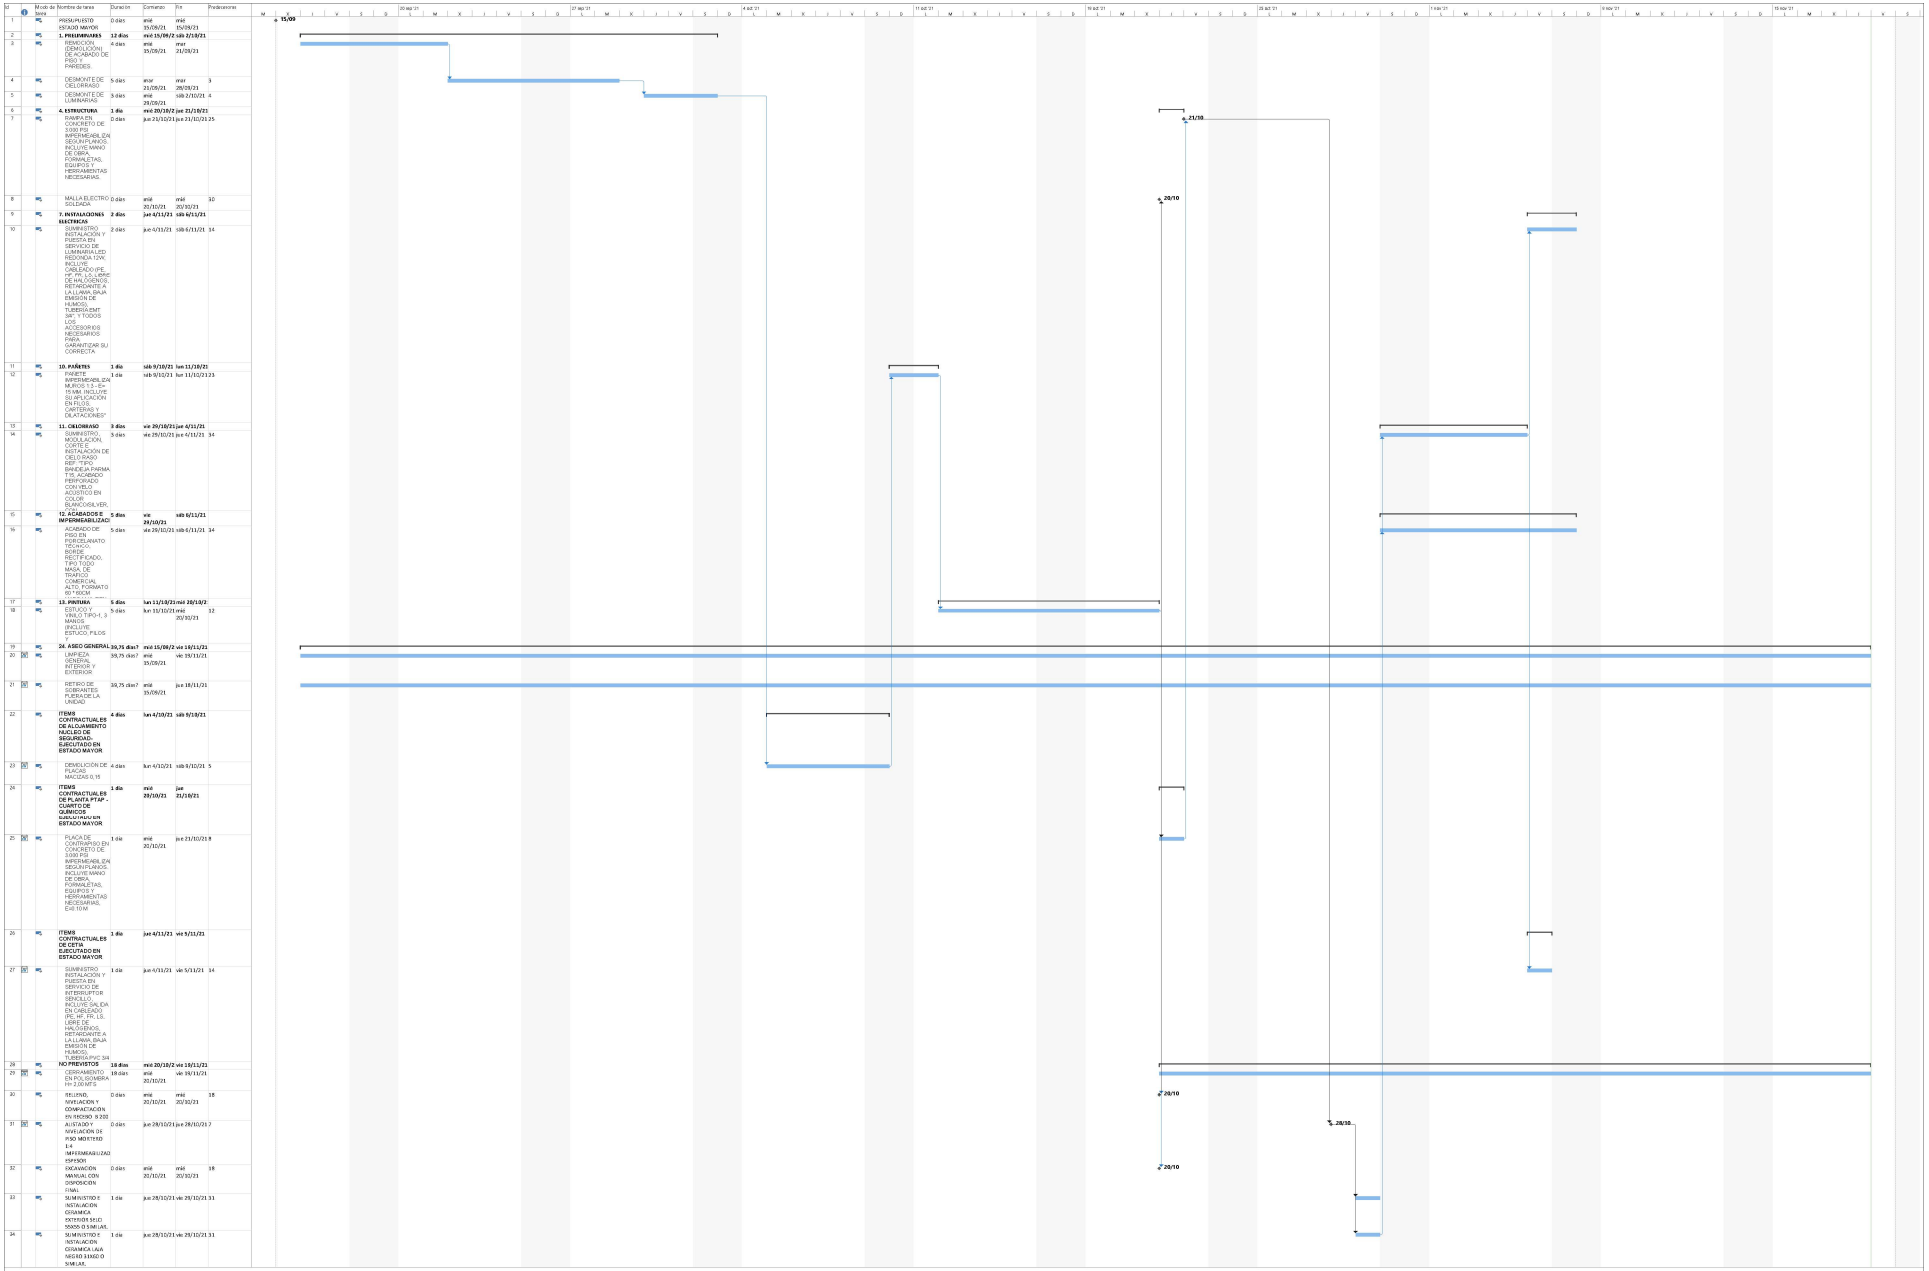Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		PRESUPUESTO ESTADO MAYOR	0 días	mié 15/09/21	mié 15/09/21	
2		**1. PRELIMINARES**	**12 días**	**mié 15/09/2**	**sáb 2/10/21**	
3		DEMOLICIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISOS, PAREDES.	4 días	mié 15/09/21	mar 21/09/21	
4		DESMONTE DE CIELORRASO	5 días	mar 21/09/21	mié 29/09/21	3
5		DESMONTE DE LUMINARIAS	3 días	mié 29/09/21	sáb 2/10/21	4
6		**4. ESTRUCTURA**	**1 día**	**mié 20/10/2**	**jue 21/10/21**	
7		RAMPA EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADA SIKA/PLANKO, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	0 días	jue 21/10/21	jue 21/10/21	25
8		MALLA ELECTRO SOLDADA	0 días	mié 20/10/21	mié 20/10/21	10
9		**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2 días**	**jue 4/11/21**	**sáb 6/11/21**	
10		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, CON CABLEADO VIPE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	2 días	jue 4/11/21	sáb 6/11/21	34
11		**10. PAÑETES**	**1 día**	**sáb 9/10/21**	**lun 11/10/21**	
12		PAÑETE IMPERMEABILIZA MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN CANTERAS Y DILATACIONES"	1 día	sáb 9/10/21	lun 11/10/21	23
13		**11. CIELORRASO**	**3 días**	**vie 29/10/21**	**jue 4/11/21**	
14		SUMINISTRO, MODULACIÓN, INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO REF: "TIPO BANDEJA PARMA TRS ACABADO PERFORADO PERFIL 0.60 ACÚSTICO EN COLOR BLANCO/SILVER,	5 días	vie 29/10/21	jue 4/11/21	34
15		**12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACI**	**5 días**	**vie 29/10/21**	**sáb 6/11/21**	
16		ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TECNICO, BORDE RECTIFICADO, TIPO TODO MASA, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM,	5 días	vie 29/10/21	sáb 6/11/21	34
17		**13. PINTURA**	**5 días**	**lun 11/10/21**	**mié 20/10/2**	
18		ESTUCO Y VINILO TIPO 1, 3 MANOS (VER ESTUCO) "FILOS Y	5 días	lun 11/10/21	mié 20/10/21	12
19		**24. ASEO GENERAL**	**39,75 días?**	**mié 15/09/2**	**vie 19/11/21**	
20		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	39,75 días?	mié 15/09/21	vie 19/11/21	
21		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	39,75 días?	mié 15/09/21	jue 18/11/21	
22		**ITEMS CONTRACTUALES DEMOLAMIENTO NUCLEO DE SEGURIDAD. EJECUTADO EN ESTADO MAYOR**	**4 días**	**lun 4/10/21**	**sáb 9/10/21**	
23		DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15	4 días	lun 4/10/21	sáb 9/10/21	5
24		**ITEMS CONTRACTUALES DE PLANTA PTAP - CUARTO DE QUIMICOS EJECUTADOS EN ESTADO MAYOR**	**1 día**	**mié 20/10/21**	**jue 21/10/21**	
25		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADA SIKA/PLANKO, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	8
26		**ITEMS CONTRACTUALES DE CETIA EJECUTADO EN ESTADO MAYOR**	**1 día**	**jue 4/11/21**	**vie 5/11/21**	
27		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCLUYE: SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4	1 día	jue 4/11/21	vie 5/11/21	34
28		**NO PREVISTOS**	**18 días**	**mié 20/10/2**	**vie 19/11/21**	
29		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	18 días	mié 20/10/21	vie 19/11/21	
30		SELLADO, NIVELACION Y COMPACTACION 5% RIESGO 9.200	0 días	mié 20/10/21	mié 20/10/21	18
31		AUSTADO Y NIVELACIÓN DE PISO MOLTENO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR	0 días	jue 28/10/21	jue 28/10/21	7
32		EXCAVACION MANUAL CON DISPOSICION FINAL	0 días	mié 20/10/21	mié 20/10/21	18
33		SUMINISTRO E INSTALACION GRANICA EXTERIOR SELO SIMILAR.	1 día	jue 28/10/21	vie 29/10/21	31
34		SUMINISTRO E INSTALACION GRANICA LAVA NEGRO 31X60 O SIMILAR.	1 día	jue 28/10/21	vie 29/10/21	31

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MANTENIMIENTO KIOSO PARA ASADOS**			
2		**1. PRELIMINARES**		**jue 30/09/21**	
3		DESCAPOTE H= 0.20 MTS.	10 días	jue 30/09/21	mié 13/10/21
4		**4. ESTRUCTURA**		**mar 24/08/2**	
5		ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY' 60,000 PSI	5 días	mié 3/11/21	mar 9/11/21
6		**6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		**mar 24/08/2**	
7		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2"	2 días	mié 10/11/21	jue 11/11/21
8		PUNTO SANITARIO Ø 2"	2 días	mié 10/11/21	jue 11/11/21
9		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	2 días	mié 10/11/21	jue 11/11/21
10		**24. ASEO GENERAL**		**vie 27/08/21**	
11		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	30 días?	jue 30/09/21	vie 12/11/21
12		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	30 días?	jue 30/09/21	vie 12/11/21
13		**NO PREVISTOS**		**mar 24/08/2**	
14		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	17 días?	mié 20/10/21	vie 12/11/21
15		RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION EN RECEBO B 200	6 días	vie 15/10/21	lun 25/10/21
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO DE 1 X 4 MTS.	1 día	jue 14/10/21	jue 14/10/21
17		REFORZAMIENTO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 0,20 MT X 0,20 MT.	5 días	mar 26/10/21	mar 2/11/21
18		PLACA EN CONCRETO 0,15MT 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-2.1 4 mm	1 día	vie 12/11/21	vie 12/11/21

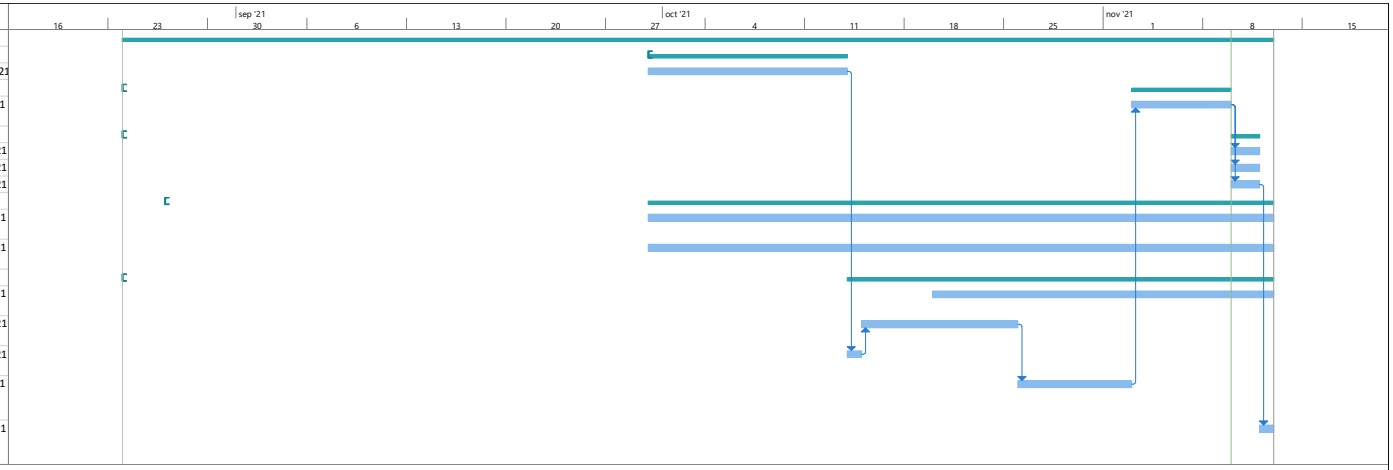

Proyecto: MANTENIMIENTO KIO
Fecha: mié 10/11/21

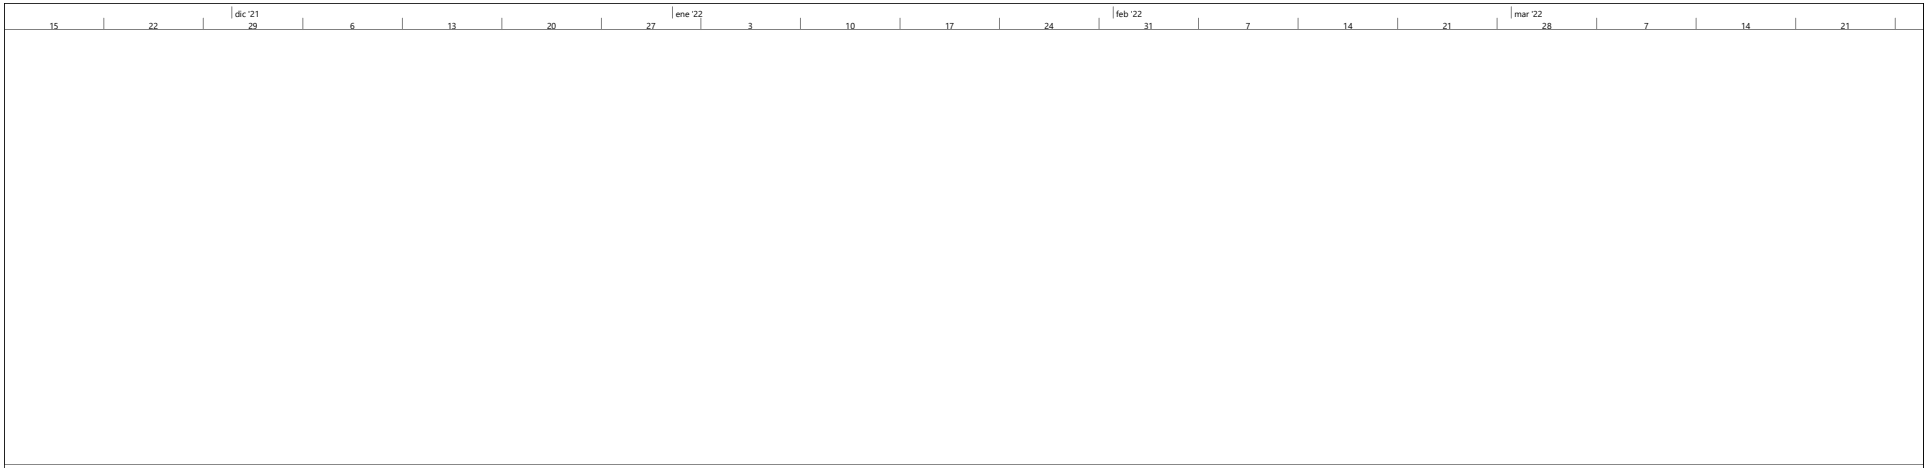
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual



Proyecto: MANTENIMIENTO KIO
Fecha: mié 10/11/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		MANTENIMIENTO VIGAS CANALES	0 días	mié 10/11/21	mié 10/11/21	
2		**1. PRELIMINARES**	**7,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	1
3		REMOCIÓN DE MATERIAL DE VIGA CANAL	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
4		DEMOLICIÓN ALFAJÍAS EN CONCRETO	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
5		**5. MAMPOSTERIA**	**7,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	
6		ALFAJÍA EN CONCRETO 2.500 PSI, A=0.25 O DE ACUERDO CON DIMENSIONES EN SITIO.	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
7		**12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACI**	**7,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	
8		MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
9		**24. ASEO GENERAL**	**7,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	
10		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
11		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	7,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	

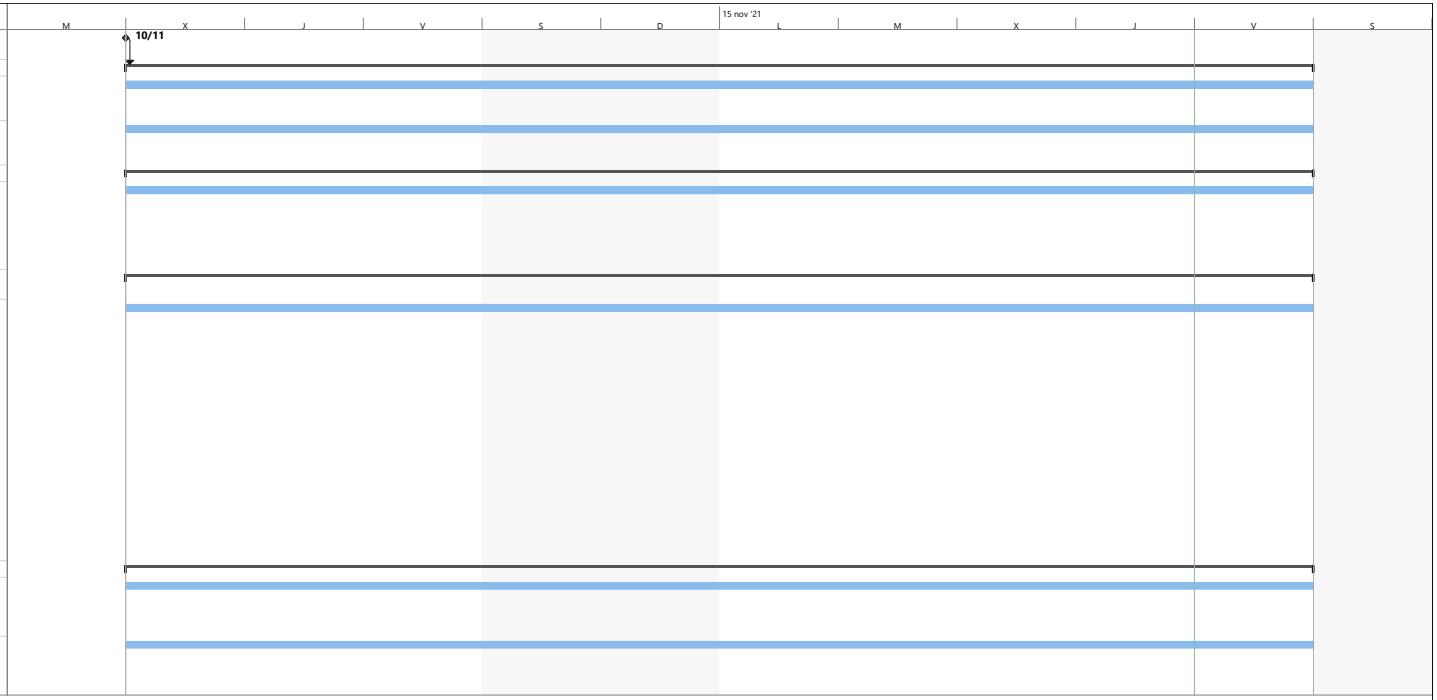

Proyecto: MANTENIMIENTO VI
Fecha: lun 8/11/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	MANTENIMIENTO KIOSCO DE MÚSICOS	0 días	mié 10/11/21	mié 10/11/21	
2	**1. PRELIMINARES**	**2 días**	**mié 10/11/21**	**jue 11/11/21**	
3	DEMOLICIÓN DE CUBIERTA	1 día	mié 10/11/21	jue 11/11/21	
4	DESMONTE DE LUMINARIAS	1 día	jue 11/11/21	jue 11/11/21	3
5	**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**	**1 día**	**mié 17/11/21**	**jue 18/11/21**	
6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W,	1 día	mié 17/11/21	jue 18/11/21	15
7	**11. CIELORRASO**	**1 día**	**mié 17/11/21**	**jue 18/11/21**	
8	INSTALACIÓN DE PANEL ACÚSTICO	1 día	mié 17/11/21	jue 18/11/21	15
9	**24. ASEO GENERAL**	**8,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	
10	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	8,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
11	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	8,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
12	**NO PREVISTOS**	**8,75 días?**	**mié 10/11/21**	**vie 19/11/21**	
13	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H = 2.00 MTS	8,75 días?	mié 10/11/21	vie 19/11/21	
14	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18D/1.45M (SUMINISTRO E INSTALACION CON WASH PRIMER, ESMALT	1 día	sáb 13/11/21	mar 16/11/21	16
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA SEVILLANA ETERNIT 134X91CM O SIMILAR, INCLUYE PINTURA INFERIORO COLOR A PREFERENCIA, TRABAJO EN ALTURAS (CONTEMPLA ANDAMIOS, KIT COMPLETO	1 día	mar 16/11/21	mié 17/11/21	14
16	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE: LIMPIEZA, CAMBIO DE PIEZA EN MAL ESTADO.	2 días	vie 12/11/21	sáb 13/11/21	4
17	BAJANTE 3" CADENA	1 día?	mié 10/11/21	jue 11/11/21	

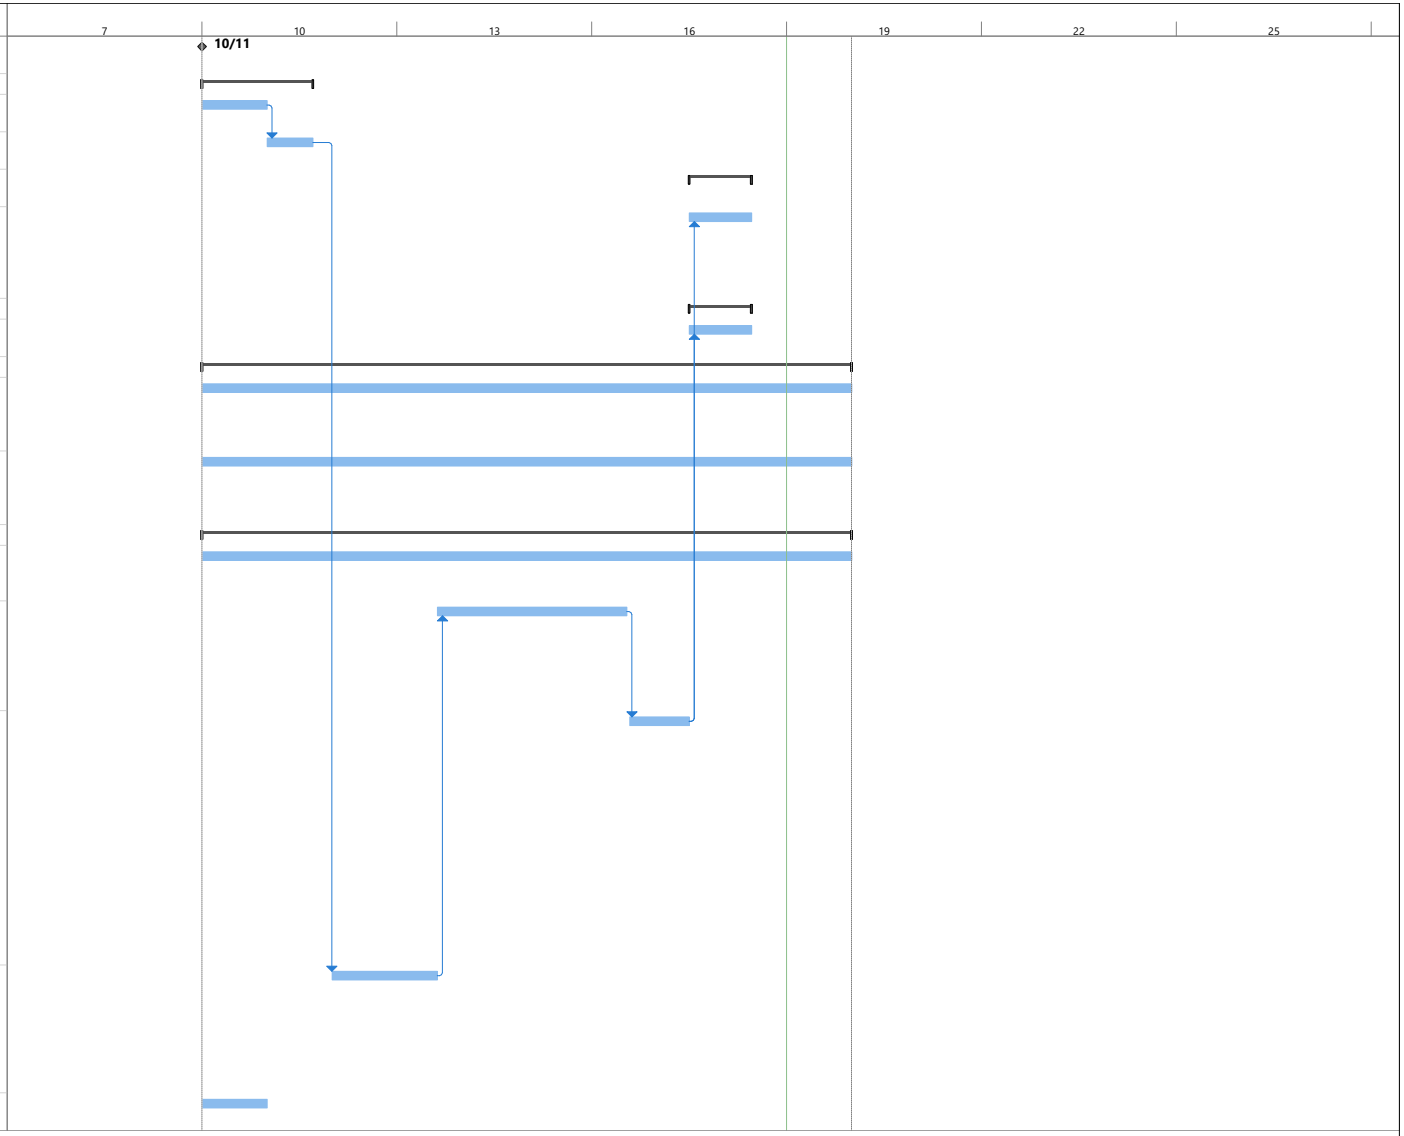

Proyecto: MANTENIMIENTOS K
Fecha: lun 8/11/21


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		PRESUPUESTO MISCELÁNEOS	0 días	lun 6/09/21	lun 6/09/21	
2		**1. PRELIMINARES**	**15 días**	**lun 6/09/21**	**jue 23/09/21**	
3		DEMOLICIÓN DE CUBIERTA	6 días	lun 6/09/21	lun 13/09/21	
4		DESMONTE DE CIELORRASO	7 días	lun 13/09/21	mar 21/09/21	3
5		DESMONTE DE LUMINARIAS	2 días	mar 21/09/21	jue 23/09/21	4
6		**7. INSTALACIONES ELECTRICAS**	**5 días**	**mar 2/11/21**	**lun 8/11/21**	
7		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W.	5 días	mar 2/11/21	lun 8/11/21	9
8		**11. CIELO RASO**	**5 días**	**mar 26/10/2**	**mar 2/11/21**	
9		CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	5 días	mar 26/10/21	mar 2/11/21	17
10		**18. CUBIERTAS**	**26 días**	**jue 23/09/21**	**lun 25/10/21**	
11		TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR AZUL EXTERIOR O SIMILAR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL CAL 26 (INCLUYE STANDING S 0.61XML.26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX S-10-16 X3/4), RELLENO CON	2 días	vie 22/10/21	lun 25/10/21	22
12		ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO CORREAS, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	22 días	jue 23/09/21	mié 20/10/21	5
13		**24. ASEO GENERAL**	**58,38 días?**	**lun 6/09/21**	**vie 19/11/21**	
14		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	58,38 días?	lun 6/09/21	vie 19/11/21	
15		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	58,38 días?	lun 6/09/21	vie 19/11/21	
16		**ITEMS CONTRACTUALES DE ALOJAMIENTOS EJECUTADO EN MISCELANEOS**	**1 día**	**lun 25/10/21**	**mar 26/10/21**	
17		TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4	1 día	lun 25/10/21	mar 26/10/21	11
18		**NO PREVISTOS**	**22,38 días?**	**mié 20/10/2**	**mar 23/11/2**	
19		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	21,38 días?	jue 21/10/21	mar 23/11/21	20
20		MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	12
21		REFUERZO EN PERFIL HR PARA ESTRUCTURA EXISTENTE.	1 día	mié 20/10/21	jue 21/10/21	12
22		CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .18 d/ 1.45 m. (SUMINISTRO E INSTALACION CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX 1A)	1 día	jue 21/10/21	vie 22/10/21	21

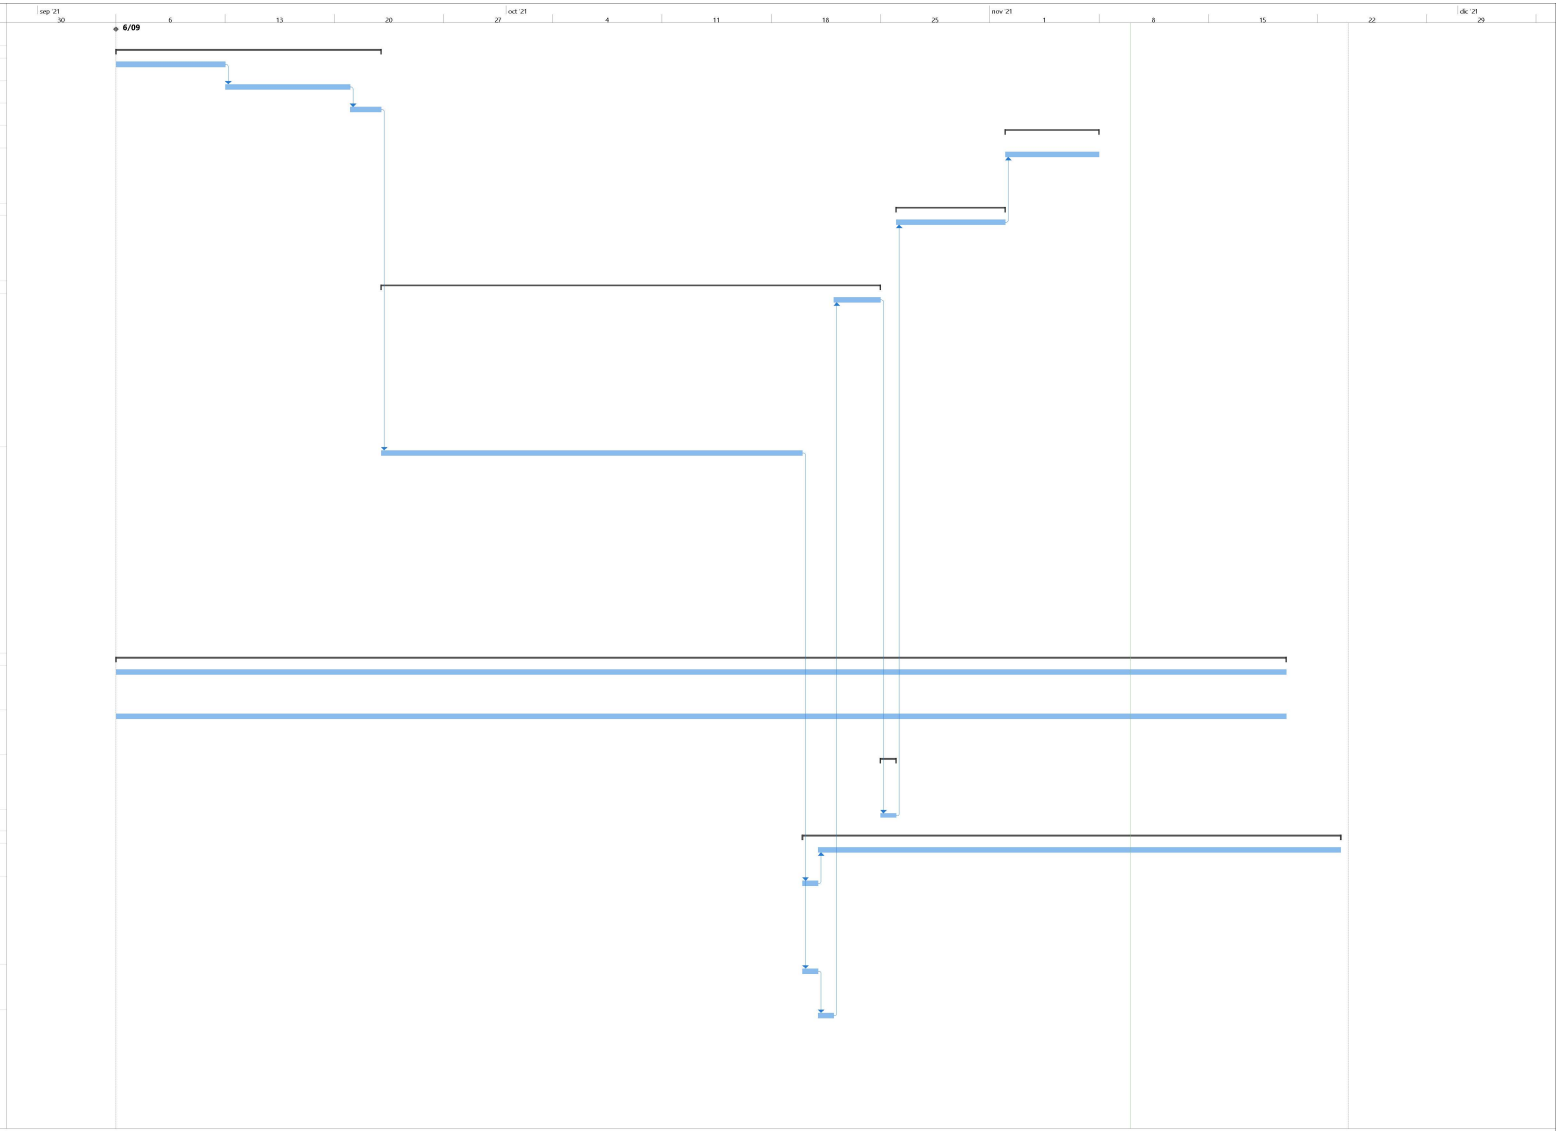

Proyecto: PRESUPUESTO MISCE
Fecha: mié 10/11/21

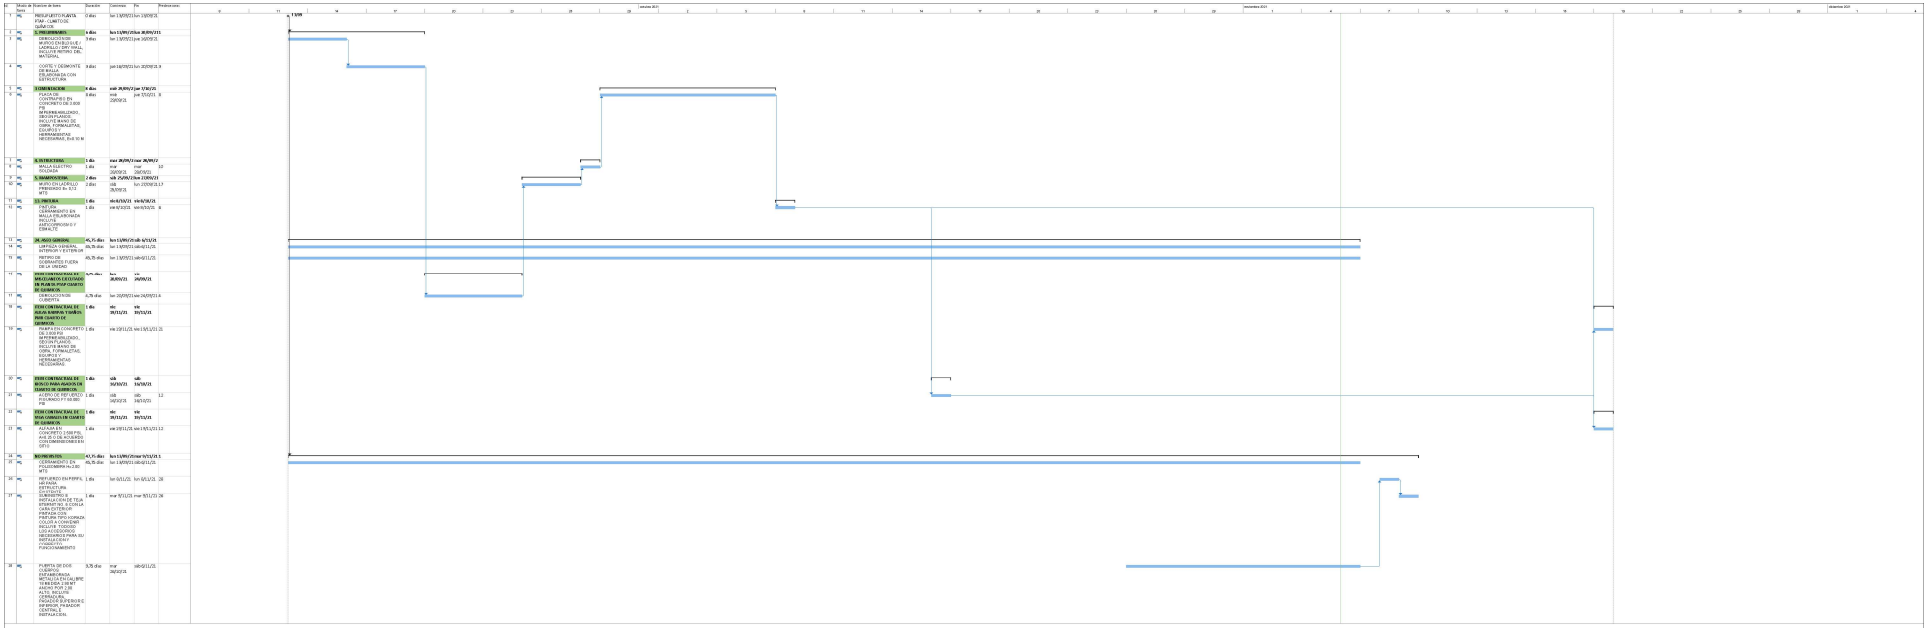Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso




Nº	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		PRESUPUESTO PLANTA PTAR - LLANTO DE CUBAS	0 días	lun 1/3/21	lun 1/3/21	
2		1. DEMOLICIONES	4 días	lun 1/3/21	lun 8/3/21	
3		DEMOLICION DE MURO DE BLOCK Y LADRILLO, DAÑADO, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	3 días	lun 1/3/21	mié 3/3/21	
4		CORTE Y DESMONTE DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ESTRUCTURA	3 días	jue 4/3/21	lun 8/3/21	3
5		2. EXCAVACIONES	4 días	mié 28/4/21	jue 1/6/21	
6		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, INCLUYE MEZCLADO, VACIADO, ACABADO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. Ancho 10 M	3 días	mié 28/04/21	jue 27/05/21	9
7		3. INSTALACIONES	1 día	vier 28/05/21	vier 28/05/21	
8		TUBERIA ELECTRO SOLDADA	1 día	vier 28/05/21	vier 28/05/21	22
9		4. MAMPOSTERIA	2 días	sáb 29/05/21	lun 31/05/21	
10		MURO EN LADRILLO PRENSADO de 6.5 cm	2 días	sáb 29/05/21	lun 31/05/21	2,17
11		5. PINTURA	1 día	mié 8/12/21	mié 8/12/21	
12		PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA ELABORADA EN TUBO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	1 día	mié 8/12/21	mié 8/12/21	11
13		10. ASEO GENERAL	45,75 días	lun 1/3/21	vie 30/4/21	
14		LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	45,75 días	lun 1/3/21	sáb 8/11/21	
15		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	45,75 días	lun 1/3/21	sáb 8/11/21	
16		ITEM CONTRACTUAL DE MURO PARA PLACA DE CUBIERTA DE PLANTA PVP CUARTO DE QUIMICOS	4,75 días	lun 26/4/21	vie 30/4/21	
17		DEMOLICION MURO CUBIERTA	4,75 días	lun 26/4/21	vie 30/4/21	6
18		ITEM CONTRACTUAL DE PISO PARA PLACA DE CUBIERTA PARA CUARTO DE QUIMICOS	1 día	vie 30/11/21	vie 30/11/21	
19		PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, INCLUYE MEZCLADO, VACIADO, ACABADO, CURADO, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	1 día	vie 23/11/23	vie 23/11/23	25
20		ITEM CONTRACTUAL DE MURO PARA PLACA DE CUBIERTA DE QUIMICOS	1 día	sáb 30/10/21	sáb 13/11/21	
21		MURO DE REFUGIO PISO CELDA PARA PVP 60	1 día	sáb 14/02/23	vie 24/03/23	3,2
22		ITEM CONTRACTUAL DE PISO PARA PLACA DE CUBIERTA DE QUIMICOS	1 día	vie 30/11/21	vie 30/11/21	
23		ALFAJIA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, AVE 20 CON ACABADO CON DIMENSIONES EN OBTU	1 día	vie 23/11/23	vie 23/11/23	3,2
24		10.1 RED HIDRAULICA	47,75 días	lun 1/3/21	vie 7/5/21	3
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4 MT	46,75 días	lun 1/3/21	sáb 8/11/21	
26		REFUERZO EN PERFIL METÁLICO	1 día	lun 6/11/23	lun 6/11/23	28
27		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEA STRAIGHT AL 0 CHICA PARA TUBERIA PRINCIPAL CON CONEXIONES INCLUYE TODOSO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	1 día	mar 9/11/21	mar 9/11/21	26
28		PUENTE DE DOS CUERPOS EN ESTABILIDAD CONSTRUIDO EN TUBO DE 3" CED 40 TEMPERA 2 METROS ANCHO, PISO DE 2.00 METROS DE ANCHO, CERRADURA ANTIPANICO REFORZADA EN HIERRO, PASADOR CENTRAL E INSTALACIONES	3,75 días	mar 24/2/21	sáb 6/11/21	

Proyecto: PRESUPUESTO PLANT
Fecha: lun 8/11/21

Tarea | Duración | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | Solo el comienzo | Solo el | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso | Progreso manual


Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		SALA DE CONFERENCIAS ESUFA	0 días	mié 20/10/21	mié 20/10/21	
2		**4. ESTRUCTURA**	**16 días**	**mié 20/10/2**	**mié 10/11/2**	
3		CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.00 MTS	16 días	mié 20/10/21	mié 10/11/21	
4		REFUERZO ESTRUCTURAL PLACA MEZANINE SALA DE CONFERENCIAS	16 días	mié 20/10/21	mié 10/11/21	

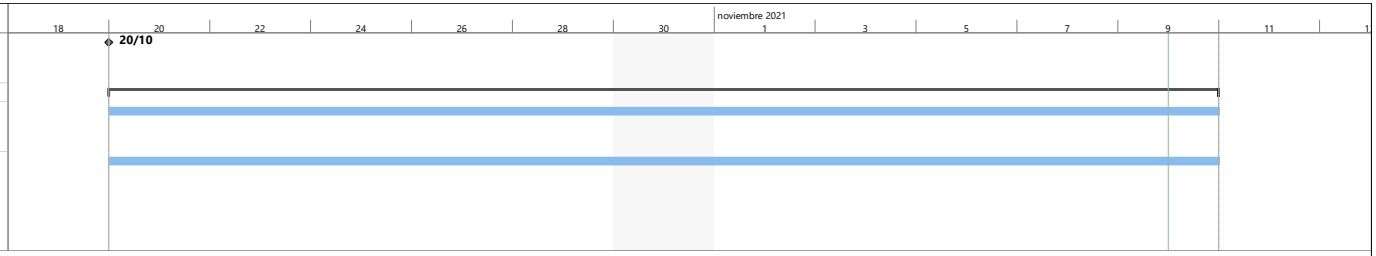

Proyecto: PRESUPUESTO EDIFIC
Fecha: lun 8/11/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite				
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso				



Proyecto: PRESUPUESTO EDIFIC
Fecha: lun 8/11/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite				
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso				

30/sept/2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de Seguridad y salud ocupacional. 2 oficiales 2 auxil No se ejecuta actividad a Espera de Aprobacion de No previstos. ST. Fernandez Mantilla
1/octubre/2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra. Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud ocupacional. 2 Oficiales, 3 Auxiliares. No se ejecuta actividad en frente de Trabajo a Espera de aprobacion de No Previstos. ST. Fernandez Mantilla
2/oct/2021	No ejecuta actividad
3/oct/2021	No ejecuta Actividad.
4/oct/2021	Estado del Clima seco. - lluvia Tarde. Personal de Obra. Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud ocupacional. 2 Auxiliares 1 Oficial. Ingreso de Material. Ceramica Muro, y Ceramica Piso. Se Inspeccona la obra junto con supervisora del Contrato, Se evidencia movimiento de unos Puntos Sanitarios e hidraulicos. Inicio actividad. Enchape de Muros Item ST. Fernandez Mantilla

Escaneado con CamScanner

5 Octubre/2021	Estado del Clima: Seco. - lluvia tarde. Personal de Obra: 1 Oficial 1 Ayudante. Actividades, Enchape Muro. Baño. 3pm en adelante no acenta con servicio de energía la Unidad. ST. Fernandez Maritza
6 Octubre 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de obra: 1 Oficial 1 Ayudante. Residente Obra, Residente SST Actividades: Enchape Muro Baño: No cuenta con servicio de energía. la unidad. ST. Fernandez Maritza
7 Octubre 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: 1 Oficial 1 ayudante, Residente de Obra y SST. Actividad: Enchape Muro Baño. ST: Fernández Maritza
8 octubre 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud. Ocupacional. 1 oficial y Ayudante. Actividad: Enchape muro. Baño. ST. Fernández Maritza
9 Octubre 2021	No se ejecuto actividad.
10 Octubre 2021	No se ejecuto actividad.
11 Octubre/21	Estado del Clima: Seco. - lluvia tarde. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de Seguridad y salud ocupacional. 1 Oficial 1 Ayudante. Enchape Muro terminado con Boquilla.

Escaneado con CamScanner

	ST. Fernandez Maritza
12 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Oficial 1 Ayudante. Actividad: (S-) La supervisión solicita la adecuación de punto para lavadora (Hidraulico y Desague). Se decide Ubicar lavadero con sus puntos en el exterior, de la edificación y Lavadora en el interior. Se realiza esta Actividad ST. Fernández Maritza
13 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y Salud en el trabajo. 1 Oficial y 1 Ayudante). Actividad: Levanta mamposteria para mesón. se. pañetán. ST. Fernández Maritza
14 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial 1 Ayudante. Actividad: Funde Mesón. ST. Fernandez Maritza
15 OCT 2021.	Estado del Clima.: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial 1 Ayudante Actividad.: Enchape Mesón. ST. Fernández Maritza

Escaneado con CamScanner

16 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Seguridad y salud Ocupacional. 1 Oficial 1 Auxiliar.
	Actividad. Instalación lavadero. Tubería Desague 2" Instalación de lavamanos.
	ST. Fernandez Maritza
17 OCT 2021	Estado del Clima: NO SE EJECUTÓ ACTIVIDAD.
18 OCT 2021	Estado del Clima. NO SE EJECUTO ACTIVIDAD.
19 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Oficial 1 Auxiliar.
	Desmonte de Cubierta.
	ST. Fernandez Maritza
20 OCT 2021.	Estado del Clima: lluvia tarde.
	Personal de Obra. Residente Seguridad y Salud en el trabajo.
	Residente de Obra. 1 Oficial 2 Ayudantes 1 Soldador.
	Relleno B200. compactado, Fundida Placa. Mantenimiento y Reforzamiento de Estructura Cubierta. Aprobación no Previstos.
	ST. Fernández Maritza
21 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia tarde.
	Personal de Obra. Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Oficial. 2 Ayudantes 1 Soldador.
	Instalación cubierta Arquitectónica, Enchape piso Baño.
	ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

20 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud ocupación. 1 Oficial 3 Ayudantes (1 soldador.). Actividad: Instalación Cielo Raso, con luminarias, Instalación Combos sanitarios con accesorios ST. Fernández Maritza
23 OCT 2021	Estado del Clima: (Sec) Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud ocupacional. Instalación de Interruptores y tomas eléctricas ST. Fernández Maritza
24 OCT 2021	NO SE EJECUTO ACTIVIDAD.
5 OCT 2021.	Estado del Clima. lluvia. Personal ole Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial No se ejecuta actividad Se llegan a Instalaciones se encuentran Inundadas por Fuertes lluvias. agua que ingresa De exteriores a Alojamiento Por niveles. ST. Fernández Maritza
26 OCT 2021	ESTADO DEL CLIMA Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo 1 Oficial, No se ejecuta actividad. se llegan a instalaciones. Se encuentran Inundadas por fuertes lluvias. ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

27 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y salud en el Trabajo, No se ejecutó actividad Por Inundación de la Edificación ST. Fernandez Maritza
28 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra : Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo,. No se ejecutó actividad. ST. Fernandez Maritza
29 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. No se ejecuto actividad. ST. Fernández Maritza
30 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal. de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad. y Salud en Trabajo! No se ejecutó actividad ST. Fernández Maritza
31 OCT 2021	No se ejecutó actividad
1 NOV 2021	No se ejecuto actividad.
2 NOV 2021	Estado del Clima: Personal de Obra: Residente de Obra, Residente

Escaneado con CamScanner

25/Sept/2021	(F) No se ejecuta Obras
26/Sept/2021	No se ejecuta Obras.
27/Sept/2021	Estado del Clima. Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 Auxiliares. Actividades 1.1 Desmonte de Cubierta. Espera aprobacion de no previstos. ST. Fernandez Maritza
28/Sept/2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo 2 Auxiliares. Permisos de Trabajo. en alturas actividad 1.1. ST. Fernandez Maritza
29/Sept/202.	Estado del Clima. Lluvia. Personal de Obra Residente de Obra. Residente de Seguridad y salud en el Trabajo No se ejecuta actividad. Espera aprobación de no previstos. ST. Fernandez Maritza
30/Sept/202	Estado del Clima. Lluvia. Personal de Obra: Residentede Obra, Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se ejecuta actividad Espera aprobación de no previstos. ST. Fernandez Maritza
1/Oct/2021	Estado del Clima. Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y

Escaneado con CamScanner

	salud en el trabajo.
	No se ejecutó actividad a (Espra) Espera de aprobación de no previstos.
	ST. Fernandez Maritza
20ch/2021	No se ejecutó actividad
30ct/2021.	No se ejecuto actividad
4 octubre/2021.	Estado del Clima: Lluvia Tarde.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y salud Ocupacional.
	No se ejecuta actividad. a Espera de aprobación de no previstos.
	ST. Fernandez Maritza
5 Octubre /2021	Estado de Clima: Seco - lluvia. tarde.
	Personal de Obra - Director de Obra, Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud en el trabajo.
	No se ejecuta actividad a Espera de aprobación de no previstos.
	No cuenta Con energía. la Unidad.
	ST. Fernandez Maritza
6 Octubre/2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud ocupacional.
	la Unidad no cuenta con Servicio de energía, no se ejecuta actividades
	ST. Fernandez Maritza




Escaneado con CamScanner

7/oct/2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud en el trabajo. No se ejecuta actividad ST. Fernandez Maritza
8/oct/2021	Estado del Clima: Seca. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Oficial 1 Ayudante (No) se ejecuta actividad. Demarte total de Cubierta. Se realiza demarcación y se desaloja personal para evitar accidentes ST. Fernandez Maritza
9/oct/2021	Estado del Clima: Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Oficial 1 Ayudante Por estado del Clima no se ejecuta actividad. en alturas. Se evidencia en el primer piso áreas ocupadas por oficinas y Personal laborando desde inicio de Obra. Se inunda Misceláneos por fuertes lluvias. ST. Fernandez Maritza
10 oct 2021	No se ejecuta Actividad
11 oct 2021	No se ejecuta Actividad.
12 oct 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Soldador 1 Ayudante Se evidencia Misceláneos Inundado por fuertes lluvias Afectándose mobiliario, Aparatos eléctricos, El personal. que trabajaba en el área Limpian el área y Desocupan optimizando el trabajo del Contratista. Que por seguridad





Escaneado con CamScanner

	en reiteradas ocasiones han solicitado e informado por diferentes medios. Se realiza informe con registro fotográficon con oficio a supervisión del contrato.
	ST. Fernandez Maritza
13 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente segundad y salud ocupacional. 1 Auxiliar. 1 Soldador. 1 Ficual
	Desmonte de luminarios, Instalación de Contraventos
	ST. Fernandez Maritza
14 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Segundad y salud Ocupacional. 1 Auxiliar 1 Soldados.
	Desmonte de Cielo Rasos. Instalación de Contraventos
	ST. Fanandez Maritza
15 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Resiolente Segundad y Salud en el trabajo. 1 Auxiliar 1 Soldador.
	Instalación de Contraventos
	ST. Fernández Maritza
16 OCT 2021.	No se ejecuto actividad
17 OCT 2021	Nose ejecutó actividad.
18 OCT 2021	Estado del Clima: No se ejecutó actividad.

Escaneado con CamScanner

19 OCT 2021	Estado del Clima Seco. Personal de Obra Residente de Obra. Residente Seguridad y Salud Ocupacional. 2 auxiliares Ingreso de material  ST. Fernández Maritza
20 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 2 Soldadores 1 Auxiliar. Actividades: Reforzamiento estructural y Mantenimiento estructura Cubierta. Aprobación de No preuistos.  ST. Fernández Maritza.
21 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra. Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud ocupacional. 2 Soldadores 1 Auxiliar. Actividades: Reforzamiento Estructural y Mantenimiento. estructura Cubierta. (AT)  ST. Fernandez Maritza
22 OCT 2021	Estado del Clima. Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. 2 Oficiales 1 Aydante. Actividades: Instalación Cubierta tipo sandwich.  ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

23 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el trabajo. 1 Soldador 1 Auxiliar. Actividad: Instalacio 1 Canal.  ST. Fernández Maritza
24 OCT 2021	No se ejecutó actividades
25 OCT 2021	(AM) Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente seguridad y salud en el trabajo 1 Soldador 1 auxiliar. Actividad: Instalación 2 Canal  ST. Fernandez Maritza
26 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Soldador. 1 Auxiliar Actividad: Sellan Canales Con Sikaflex, Se Remata Soldaduras y Pintura en Esmalte.  ST. Fernandez Maritza
27 OCT 2021.	Estado del clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. 1 Soldador 1 Ayudante. Actividad Instalación 1 Tramo Canal Galvanizado.  ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

28 OCT 2021	Estado del Clima: Lluia.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 Soldador 1 Auxiliar. 1 OFICIAL 1 Ayudante.
	Actividad: Instalación segundo Tramo de Canales.
	Instalación Estructura de Cielo Raso en PVC. Puntos luminarias
	ST. Fernandez Maritza
29 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo 1 Soldador 2 Auxiliares 1 OFICIAL.
	Actividad: Selle con sikaflex de Canales, Instalación de Bayantes. y Cielo Raso. PVC.
	ST. Fernandez Maritza
30 OCT 2021	Estado del Clima: (N) SECO.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Oficial 1 Ayudante.
	Actividades: Instalación de Cielo Raso PVC.
31 OCT 2021	No se ejecutó actividad.
1 NOV 2021.	Estado del Clima: Lluvia.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Soldador.
	Actividades: Limpiesa Cercha existente. Retoque anticorosivo y Pintura
	ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

	JT. Fernández Maritza
30 SEP 2021.	Estado Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de obra, Residente seguridad y salud en el trabajo. Se deja secar la Fundida, Tiempo de Fraguado.
	JT. Fernández Maritza
01 OCT/2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial. Actividades: Se realiza alistado y afinado del piso despues de la fundida. Se inspeccuona por parte del drea de SST. conforme. al Orden y Aseo.
	JT. Fernandez Maritza
02 OCT 2021	No se ejeuto' actividad
03 OCT 2021	No se ejeutó actividad.
04 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvio Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente. Seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial. 2 Ayudantes Actividades. Se Realizo la demolicuón del piso de la zona de las escaluras o

Escaneado con CamScanner

	monumentos, se alista. el piso para comenzar a enchapar cuando aprueben no previstos.
	ST. Fernández Maritza
(05 SET 2021)	
05 OCT 2021	Estado del Clima: Llovia en la tarde.
	Personal de Obra. Residente de Obra, Residente Seguridad y salud ocupacional 2 Oficiales 1 Ayudantes
	Actividades. Se Retira el enchape de lineal de piso Porcelanato de Escalón de Rampa Principal Estado Mayor. Se realiza Inspección por parte de área de Seguridad y salud en el trabajo.
	ST. Fernández Maritza
06 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra. Residente de Obra. Residente de Seguridad y salud ocupacional. 2 auxiliares 1 Oficial. Se suspende Obra por aprobación de no previstos
	ST. Fernández Maritza
7 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud ocupacional 2 auxiliares 1 Oficial.
	Demolición Placa. y Demoliciones de Tableta en Gres.

Escaneado con CamScanner

08 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra Residente de Seguridad y Salud Ocupacional. 2 Ayudantes y 1. Oficial.
	Actividades: Demolición Placa. Acopio Escombros
	ST. Fernández Maritza
09 OCT 2021	Estado del Clima. Seco.
	Personal de Obra: Residente Obra, Residente de Seguridad y Salud ocupacional, 2 Oficiales. 4 Ayudantes.
	Actividad: Funde Placa de Contrapiso con malla electrosoldada.
	ST. Fernández Maritza
10 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco.
	No se ejecutó actividad.
11 OCT. 2021	Estado del Clima Lluvia
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el Trabajo 1 Auxiliar.
	Actividad: Demolición cerámica piso archivo estado mayor.
	ST. Fernández Maritza
12 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Auxiliar.
	Actividad: Demolición cerámica muro archivo estado Mayor.
	ST. Fernández Maritza




Escaneado con CamScanner

13 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad. y salud en el Trabajo. 1 Auxiliar ole Construcción. Actividad: Demolición Cielo Raso. Archivo. JT. Fernández Maritza
14 OCT 2021.	Estado del Clima: lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Seguridad y salud en el trabajo 1 Oficial 1 Auxiliar Actividad: Pañete Muros Archivo. JT. Fernández Maritza
15 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente seguridad y salud Ocupacional. (1 0) Actividad. No se ejecutó actividad. JT. Fernández Maritza
16 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra Residente Seguridad y salud en el trabajo 1 Oficial 1 Ayudante. Actividad: Estuco Muros Archivo. JT. Fernández Maritza
17 OCT 2021.	Estado del Clima: No se ejecutó actividad. (Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el Trabajo.) JT. Fernández Maritza

Escaneado con CamScanner

19 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 Oficial y 1 Auxiliar. Actividad: Pintura archivo. ST. Fernandez Maritza
11 OCT / 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra Residente seguridad y salud en el Trabajo 1 Auxiliar. Actividad. Pintura Archivo. Ingreso de Material. ST. Fernández Maritza
20 OCT / 2021.	Estado del Clima: Lluvia. leve. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud ocupacional. 1 OFicial 1 Auxiliar. Actividad: Enchape piso zonas exteriores. ST. Fernandez Maritza
21 OCT 2021	Estado del Clima. Lluvia. leve. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud Ocupacional 1 Oficial 1 Auxiliar. Actividad: Enchape piso, zonas exteriores. ST. Fernández Maritza
22 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud Ocupacional, 1 Oficial 1 Auxiliar. Actividad. Enchape piso, 2 onas exteriores ST. Fernández Maritza

Escaneado con CamScanner

23 oct 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Auxiliar Boquilla Estado Mayor TERminada el área.  ST. Fernández Maritza
24 oct 2021	No se ejecutó actividad.
25 oct 2021	No se ejecuta actividad en el Frente Estado Mayor.  ST. Fernandez Maritza
26 oct 2021	Estado del Clima.. Seco. - lluvia tard. Personal de Obra: Residente de Obra y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se ejecuta actividad. en el Frente Estado Mayor  ST. Fernández Maritza
27 oct 2021	Estado del Clima: Lluvia.

Escaneado con CamScanner

29/sept/2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud Ocupacional. Placa fraguando No se ejecuta actividad a espera de aprobación de No previstos. Día 6. Fraguado. ST. Fernandez Maritza
30/sep/2021	Estado del Clima: Lluvias. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de seguridad y Salud Ocupacional. Placa fraguando. No se ejecuta actividad a espera de aprobación de No previstos. Día 7 Fraguado. ST. Fernandez Maritza
1/Oct/2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de Seguridad y salud en el Trabajo. Placa Fraguand. No se ejecuta actividad a espera de aprobación de no previstos. Se Recibe correo con observaciones. Se inicia la correccion de las observaciones del Supervisor de contrato frente a no previstos Dia 8 Fraguado ST. Fernandez Maritza
2Oct/2021	(F) No se ejecutó actividad
3Oct/2021	No se ejecutó actividad.
4/Oct/2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Placa fraguando, No se ejecuta actividad, Se realiza alistado de Piso. Se Trabaja en Observaciones de No previstos Día 11 fraguado.

Escaneado con CamScanner

ST. Fernandez Mantilla

5/oct/2021. Estado del Clima: Seco. - lluvia tarde.
Personal de Obra: Director de Obra. Residente de Obra, Residente de Seguridad y salud ocupacional.
No se ejecuta actividad, por aprobación de no previstos. Día 12 Fraguado.

ST. Fernández Mantilla

5/oct/2021 Estado del Clima: Seco.
Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud ocupacional, 1 Auxiliar
Se inspecciona el área. Día 13 Placa Fraguado.
se evidencia personal de la unidad ingresando canecas. con sustancias químicas con un peso aproximado de 100kg a 200 Kg por unidad. Debido al tiempo de fraguado. y el uso de esta área se recomiendo un tiempo de 28 días para que el concreto adquiera las propiedades de resistencia. adecuadas. Esta información se comunicó a supervisor de contrato. Se ingresa aproximadamente 20 canecas sobre estibas en un área de 7.00 mt x 2.00mt. Se aclara que este frente de trabajo aún no se ha terminado ni entregado. Por tal motivo el área no puede ser ocupada. Se Realiza registro Fotográfico y se envía oficio a la entidad contratante informando la situación presentada; aclarando que no se garantiza el comportamiento que la placa pueda tener con la carga aplicada. Se informa vía telefónica a supervisor de contrato. La unidad no cuenta con energía. Auxiliar Trabajando Malla Eslabonada.

ST. Fernandez Mantilla

Escaneado con CamScanner

7 Octubre 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Ayudante. Se inspecciona el área. se evidencia que la zona. a intervenir se encuentra desocupada sin canecas. Ayudante. Hace mantenimiento Malla eslabonada. Se Pinta Malla eslabonada Item 13.1. Pintura Cerramiento en malla eslabonada incluye anticorrosivo. y Esmalte. ST. Fernandez Maritza
8 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo 1 Oficial. Actividad: Alistado y afinado a placa. ST. Fernández Maritza
9 oct 2021	Estado del Clima: seco. Personal. de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial. Actividad: Alistado y afinado a placa. ST. Fernandez Maritza
10 oct 2021	No se ejecuta actividad.
11 oct 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo 1 auxiliar. Actividad: Armado ole Columnas (Varillas y Flejes) Demolición Abierta ST. Fernández Maritza

Escaneado con CamScanner

12 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el Trabajo, 1 auxiliar. Actividad: Armado. de Columnas (Varillas y Fleyes). JT. Fernández Maritza
13 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 auxiliar 1 Oficial. Actividad: Fundición Rampa Químicos. JT. Fernandez Maritza
14 OCT 2021	Estado del Clima. Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud. en el trabajo, Actividad: Día 1 Fraguado Rampa. JT. Fernández Maritza
15 OCT 2021,	Estado de Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y. Salud en el Trabajo. Actividad: Día 2 fraguado Rampa. JT. Fernandez Maritza
16 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. Actividad: Día 3 Fraguado Rampa JT. Fernández Maritza




Escaneado con CamScanner

17 oct 2021	No se ejecuto actividad.
18 oct 2021	No se ejecutó actividad.
19 oct 2021	Estado de Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de seguridad y salud ocupacional. Actividad: No se ejecuta actividad a espera de aprobación de no previstos. ST. Fernández Maritza
20 oct 2021.	Estado del Clima: Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de seguridad y salud en el trabajo. 1 Oficial 2 Ayudantes. Actividad. Se Funde 3 Columnas Aprobación no previstos. ST. Fernández Maritza
21 oct 2021	Estado del Clima: Lluvia Leve. Persona de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el Trabajo. 1 Soldador 2 Ayudantes Actividad: Instalación de Refuerzo estructural. Pintura Tejas Eternit ST. Fernandez Maritza
22 oct 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Oficial 2 Auxiliares. Actividad: Instalación Cubierta Eternit. ST. Fernández Maritza



Escaneado con CamScanner

23 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 Soldador. Actividad: Unión o empalme Reforzamiento con varilla de Columnas, ST. Fernández Maritza
24 OCT 2021.	No se ejecutó actividad.
24 OCT 2021	No se ejecuta actividad.
26 OCT 2021.	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud en el Trabajo, 1 soldador. Actividad: Ingreso material para Puerta Químicos. ST. Fernandez Maritza
27 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Soldador. Actividad: Corte y armado de Puerta. ST. Fernandez Maritza
28 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo, 1 Soldador. Actividad: Corte y Armado de Puerta ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

29 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. 1 Soldador. Actividad: Armado (Re) De Rieles. Personal de la Unidad Pintan Placa Químicos.  ST. Fernandez Maritza
30 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo 1 Soldador. 1 Auxiliar. Actividad: Instalación Puerta con Rieles.  ST. Fernandez Maritza
31 OCT 2021	No se ejecutó actividad.
1 Nov 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Soldado 1 Auxiliar. Actividad. Instalación y Retoques Puerta  ST. Fernandez Maritza



Escaneado con CamScanner

	Se suspende Obra en frente de Trabajo. a espera de. aprobación de no previstos. para reforzamiento estructural. en sala ole Juntas ESUFA.  ST. Fernández Manilla
29/Sept/2021	Estado del Clima: lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Segundad y salud ocupacional. No se ejecuta actividades en frente de Trabajo. a espera de aprobación de no previstos para reforzamiento estructural en sala de juntas ESUFA.  ST. Fernandez Manilla
30/Sept/2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Segundad y Salud en el Trabajo. A espera de aprobación de no previstos para reforzamiento, estructural en Sala de Juntas ESUFA. No se ejecuta actividad.  ST. Fernandez Manilla
10ct./2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente de Segundad y salud en el Trabajo. A Espera de aprobación de no previstos para reforzamiento estructural en. Sala de Juntas ESUFA. No se ejecuta actividad  ST. Fernandez Manilla



Escaneado con CamScanner

2/Oct/2021	No se ejecuta actividad.
3/Oct/2021	No se ejecata actividad.
4/Oct/2021	Estad del Clima : Lluvia Tarde.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Salud. y Segundad en el trabajo.
	Se Recibe Correo Solicitando y/o haciendo (Obj) observaciones frente a no previstos, contratista inicia correcciones.
	ST. Fernández Martínez
5/Oct/2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra: Residente de Segundad y salud ocupacional.
	No se ejecuta actividad, se envía correcciones de no previstos. A espera de Aprobación.
	ST. Fernandez Martinez
6/Oct/2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente de Segundad y salud ocupacional. No se ejecuta actividad. a Espera. de aprobación de no previstos
	ST. Fernandez Martinez
7/Oct/2021	Estado del Clima Seco.
	Personal de Obra. Residente de Obra. Residente de Segundad y salud Ocupacional. No se ejecuta actividad.
	ST. Fernandez Fernández

Escaneado con CamScanner

8 Oct 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente seguridad y salud ocupacional. No se ejecuta actividad por aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Maritza
9 Oct 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Segundad y salud en el Trabajo. No se ejecuta actividad por. aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Maritza
10 Oct 2021	Estado del Clima: Seco. No se ejecutó actividad.
11 Oct 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra y Residente de Segundad y salud en el Trabajo. No se ejecutó actividad por aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Maritza
12 Oct 2021.	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente ole Obra. Residente Seguridad y salud en el trabajo. No se ejecutó actividad por aprobación de no Previstos.  ST. Fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner

13 OCT 202	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de obra, Residente Seguridad y salud en el trabajo. No se ejecuta actividad por aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Mantilla
14 OCT 2021	Estado del Clima: lluvia. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. NO se ejecuta actividad por aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Mantilla
15 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. No se ejecuta actividad por aprobación de no previstos.  ST. Fernandez Mantilla
16 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. No se ejecuta actividad por aprobación de no previstos  ST. Fernandez Mantilla
17 OCT 2021	No se ejecutó actividad
18 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo No se ejecutó actividad por aprobación de no previstos.

Escaneado con CamScanner

	ST. Fernández Maritza
19 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra. Residente Segundad.
	y Salud Ocupacional.
	Ingreso de Material Reforzamiento estructural.
	ST. Fernandez Maritza
20 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia Tarde.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Segundad
	y Salud Ocupacional. 1 Soldador.
	Inicio Pintura y Reforzamiento estructural Mezzanine.
	Equipo de apuntalamiento
	ST. Fernandez Maritza
21 OCT 2021.	Estado del Clima. Lluvia Tarde.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud
	Ocupacional 1 Soldador 1 Eléctrico.
	Se rematan las actividades eléctricas CETIA 1 y 2 PISO. Se
	trabaja Reforzamiento estructural. Con equipo de apuntalamiento.
	ST. Fernandez Maritza
22 OCT 2021	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud
	Ocupacional 1 Soldador.
	Reforzamiento estructural Mezanine.
	ST. Fernandez Maritza
23 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud
	ocupacional 1 Soldador.
	Reforzamiento estructural Mezanine.

Escaneado con CamScanner

	ST. Fernandez Maritza
24 OCT 2021	No se ejecuta actividad
25 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. No se ejecuta actividad. ST. Fernandez Maritza
26 OCT 2021	Estado del Clima Lluvia tarde. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo No se ejecuta actividad ST. Fernandez Maritza
27 OCT 2021	Estado del Clima Lluvia Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud. en el Trabajo. 1 Soldador 1 Auxiliar. Actividad: Reforzamiento Estructural. ST. Fernandez Maritza
28 OCT 2021	Estado del Clima: Lluvia. Personal de Obra: 1 Soldador 1 Auxiliar, Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el trabajo. Actividad Reforzamiento estructural. ST. Fernández Maritza
29 OCT 2021	Estado del Clima: Seco. Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 Soldador 1 Auxiliar

Escaneado con CamScanner

	Actividad: Reforzamento estructural
	ST. Fernandez Mazabel Maritza
30 OCT 2021.	Estado del Clima: Seco.
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el Trabajo. 1 Soldador 1 auxiliar.
	Actividades: Reforzamento estructural.
	ST. Fernández Maritza
31 OCT 2021	No se ejecuto Obras
31)	
1 NOV 2021	NO se ejecuto. Obras.
2 NOV 2021.	Estado del Clima:
	Personal de Obra: Residente de Obra, Residente Seguridad y salud en el Trabajo. 1 Soldador. 1 auxiliar.
	Actividades: Reforzamiento estructural
	ST. fernandez Maritza

Escaneado con CamScanner
