
# PROGRAMACIÓN DE OBRA - ADICIÓN

Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz”


| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **MAMPOSTERIA** | 3 días? | mié 8/12/21 | vie 10/12/21 |
| 2 | | | MURO EN LADRILLO PRENSADO E=0,12 MTS | 1 día | mar 7/12/21 | mar 7/12/21 |
| 3 | | | MESÓN EN CONCRETO | 1 día | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 4 | | | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | 7 días? | lun 15/11/21 | mar 23/11/21 |
| 5 | | | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 10 CUXAWG FASES) + 1 X NO.10 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 10 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE | 1 día | mar 23/11/21 | mar 23/11/21 |
| 6 | | | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA NEWTOWN REFERENCIA 49972 EGLO COLOMBIA O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARI | 1 día? | lun 15/11/21 | lun 15/11/21 |
| 7 | | | **ACABADOS E IMPERMEABILIZADO** | 2 días? | vie 10/12/21 | lun 13/12/21 |
| 8 | | | PISO EN TABLON DE GRES FORMATO 30 X30 CMS REF ALFA | 2 días | mié 8/12/21 | jue 9/12/21 |
| 9 | | | **CARPINTERIA ACERO** | 1 día? | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 10 | | | CAMBIO Y SUSTITUCION LAVAPLATOS RADIANTE PARA EMPOTRAR UNA POSETA 62 X 48 CM, ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA | 1 día | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 11 | | | **ITEMS CONTRACTUALES DE ALOJAMIENTO NUCLEO DE SEGURIDAD EJECUTADO EN KIOSCO PARA ASADOS** | 1 día? | jue 18/11/21 | jue 18/11/21 |
| 12 | | | TUBERIA PVC PRESION RDE 13,5 | 1 día | jue 18/11/21 | jue 18/11/21 |
| 13 | | | TUBERIA PVC SANITARIA 4" | 1 día | jue 18/11/21 | jue 18/11/21 |
| 14 | | | **INTEMS CONTRACTUALES EN CETIA EJECUTADO KIOSCO PARA ASADOS** | 1 día? | mié 8/12/21 | mié 8/12/21 |
| 15 | | | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A /120V. (1Ø+N+PT CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE | 1 día | mar 7/12/21 | mar 7/12/21 |
| 16 | | | **NO PREVISTOS** | 1 día? | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 17 | | | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLE | 1 día | mar 7/12/21 | mar 7/12/21 |
| 18 | | | RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACION EN RECEBO B 200 | 1 día | vie 19/11/21 | vie 19/11/21 |
| 19 | | | CAJA DE INSPECCION 0,80 X0,80MTS. CON MARCO Y TAPA | 1 día | mié 17/11/21 | mié 17/11/21 |
| 20 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2 | 1 día | jue 18/11/21 | jue 18/11/21 |
| 21 | | | EMPRADIZACION DE JARDINES ZONAS EXTERIORES ENTORNO DEL EDIFICIO. INCLUYE PASTO KIKUYO, TIERRA NEGRA. | 23 días? | lun 15/11/21 | mié 15/12/21 |
| 22 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA SEVILLANA ETERNIT 134x91 CM O SIMILAR. INCLUYE PINTURA INFERIOR COLOR A PREFERENCIA,TRA EN ALTURAS (CONTEMPLA ANDAMIOS, KIT COPLETO CUERPO ENTERO DE TRABAJO, SEGURIDAD EN ALTURAS Y SEÑALIZACIÓN), LINEALES, GANCHOS, AMA | 1 día | lun 6/12/21 | lun 6/12/21 |
| 23 | | | VIGAS DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,20 M X 0,10 M | 3 días | vie 26/11/21 | mar 30/11/21 |
| 24 | | | VIGAS DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,05 M X 0,05 M | 3 días | mié 1/12/21 | vie 3/12/21 |
| 25 | | | COLUMNA DE MADERA PINO CANTEADA, CEPILLADA Y SECA 0,20 M X 0,20 M | 2 días | mié 24/11/21 | jue 25/11/21 |
| 26 | | | SIFON 2" INCLUYE REJILLA E INSTALACIÓN | 1 día | mar 16/11/21 | mar 16/11/21 |
| 27 | | | SIFON 3" INCLUYE REJILLA SIFON DECORATIVA 3 PULGADAS X 2 PULGADAS ALUMINIO TUBERIA 2" E INSTALACIÓN | 1 día | lun 15/11/21 | lun 15/11/21 |
| 28 | | | BUJE SOLDADO PVC SANITARIO 3" X 2" GERFOR INCLUYE INSTALACION. | 1 día | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 29 | | | BUJE SOLDADO 4x3 SANITARIA INCLUYE INSTALACION | 1 día | vie 10/12/21 | vie 10/12/21 |
| 30 | | | MURO EN LADRILLO | 1 día | mar 7/12/21 | mar 7/12/21 |
| 31 | | | PLACA DE CONCRETO 0,15 MT 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA H-084R-2.1 4MM | 1 día | lun 22/11/21 | lun 22/11/21 |

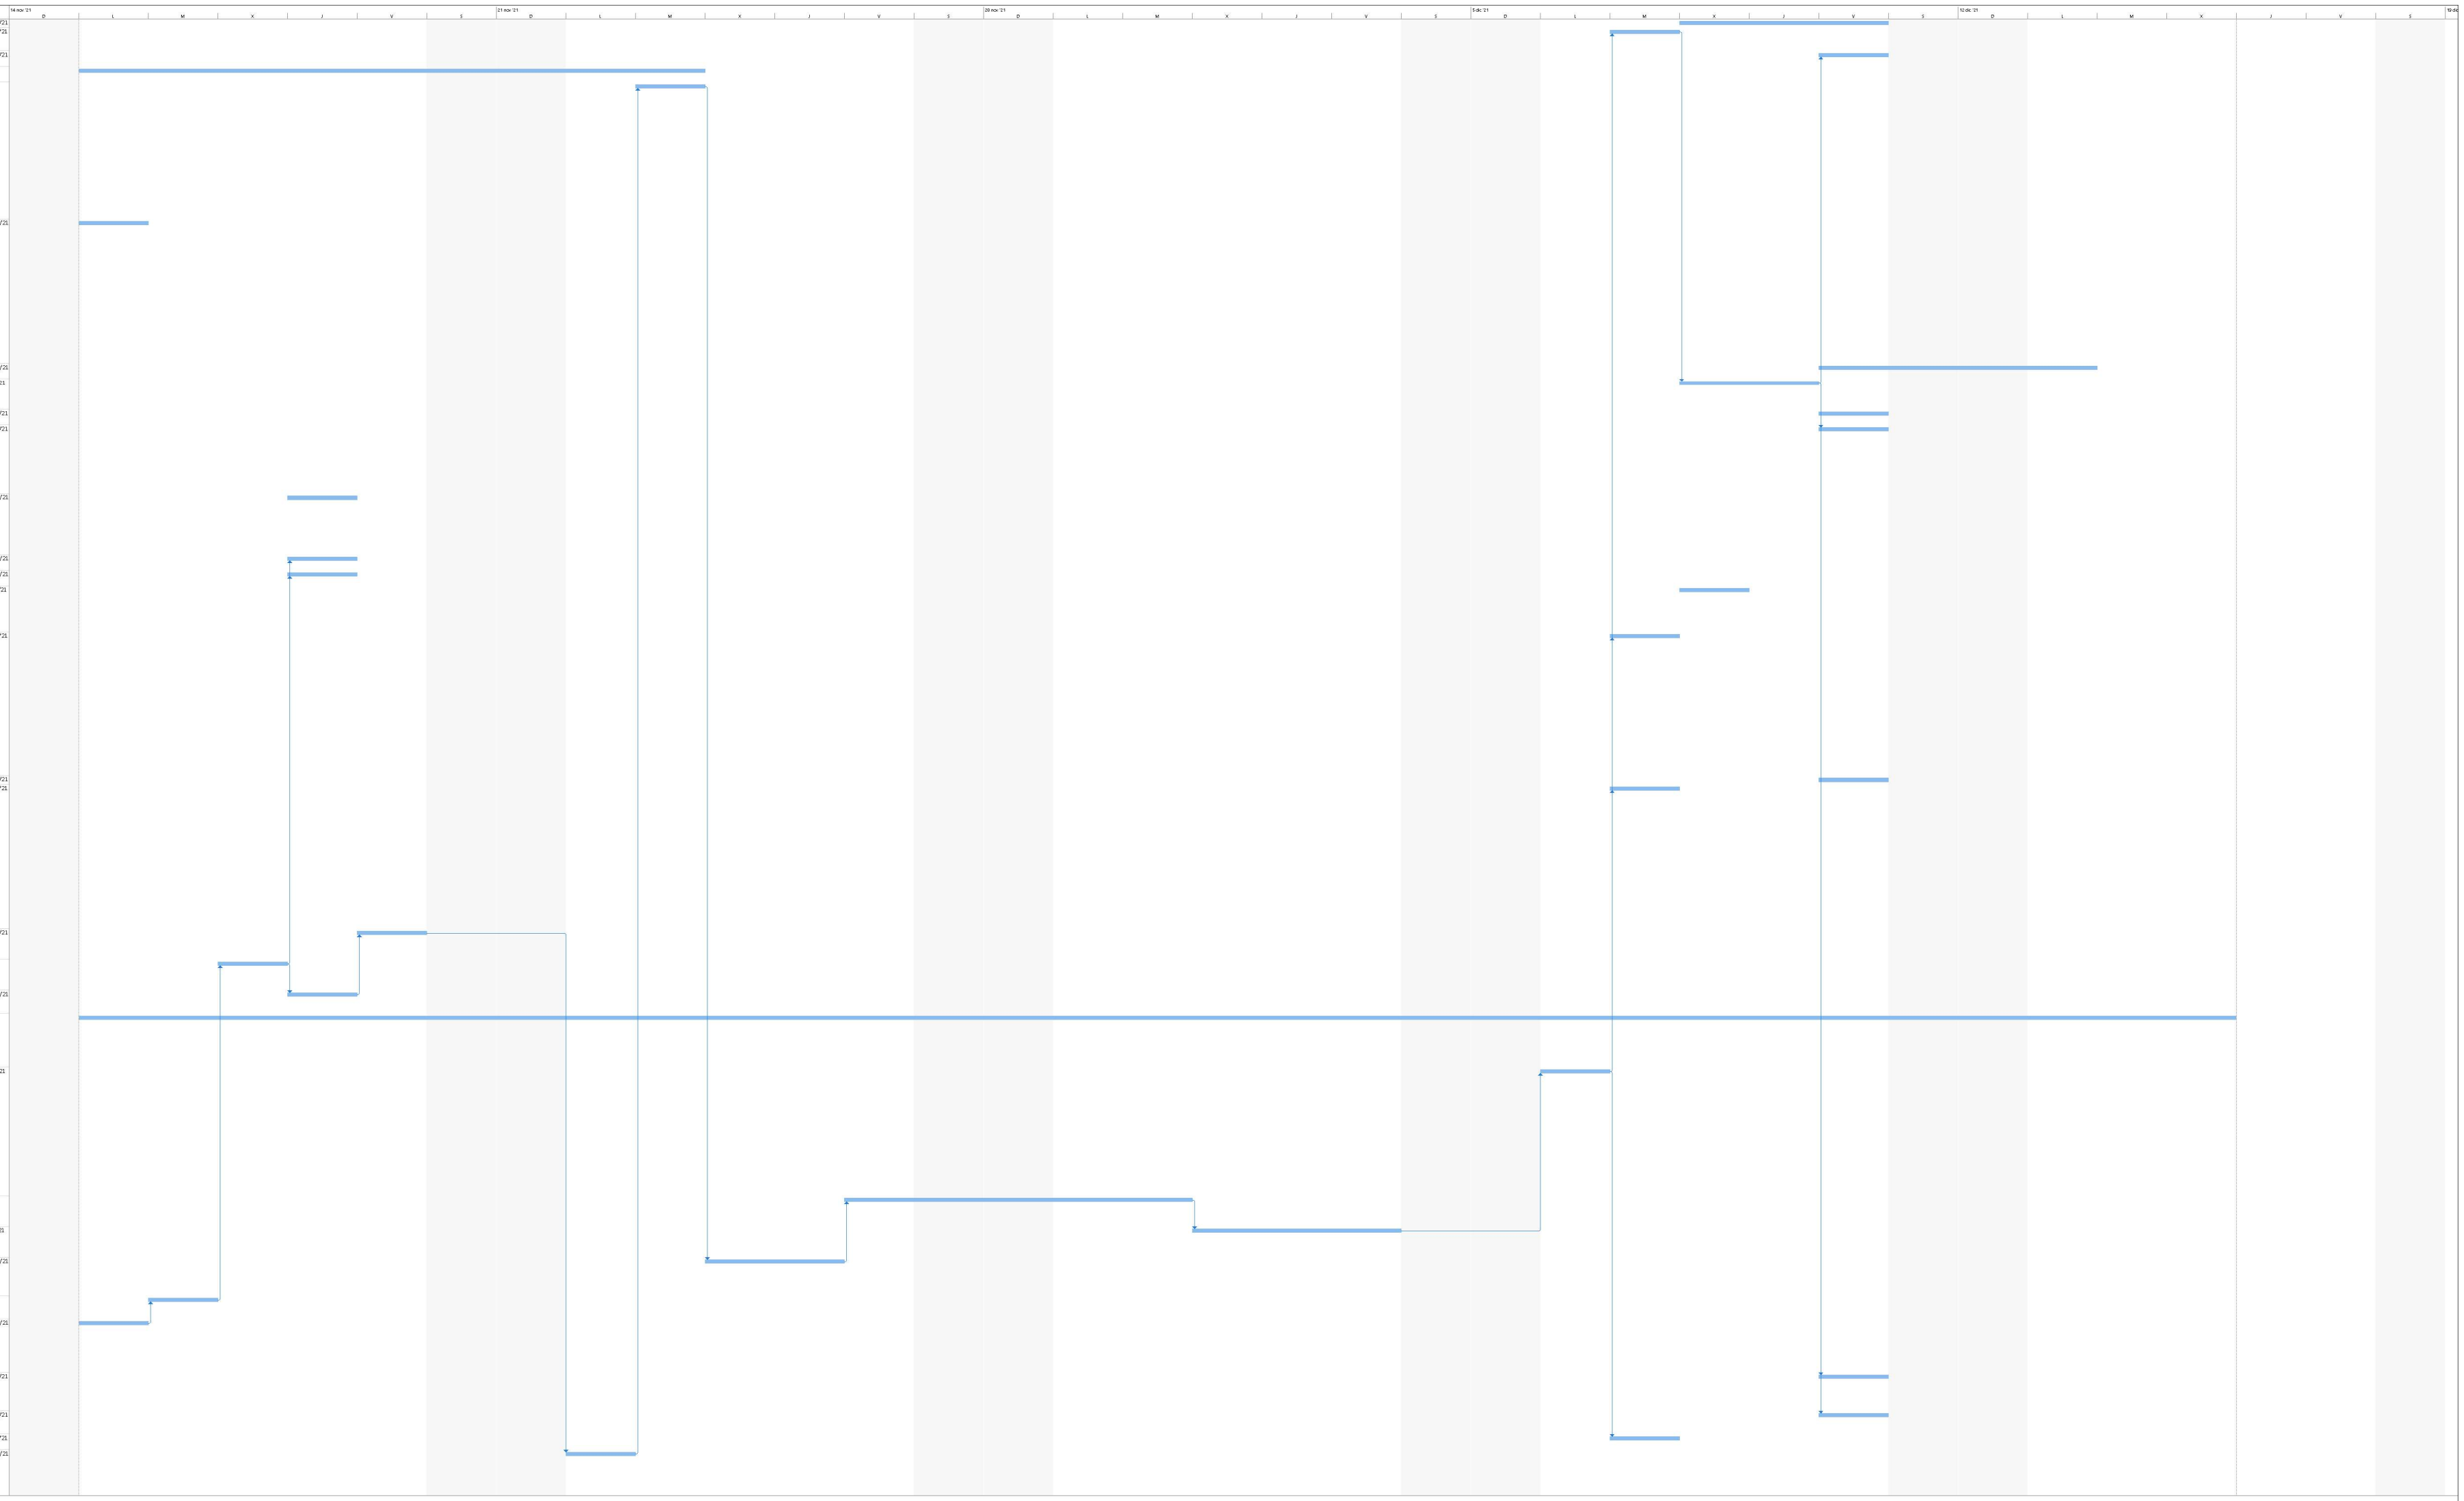


Proyecto: KIOSCO PARA ASADO
Fecha: vie 5/11/21

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Progreso | Progreso manual


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **AUDITORIO ZAMBRANO** | | | |
| 2 | | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | 4 días | mar 16/11/21 | vie 19/11/21 |
| 3 | | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | 20 días | lun 15/11/21 | vie 10/12/21 |
| 4 | | DESMONTE E INSTALACION DE BARANDA METALICA | 1 día | lun 15/11/21 | lun 15/11/21 |
| 5 | | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | 4 días | mié 1/12/21 | lun 6/12/21 |
| 6 | | ALISTADO Y NIVELACION DE PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE INCLUYE LINEALES | 2 días | lun 22/11/21 | mar 23/11/21 |
| 7 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8mm, INCLUYE GUARDAESCOBA Y ACABADOS ESCALERA. | 2 días | jue 9/12/21 | vie 10/12/21 |
| 8 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA VALDIVIA WENGUE REF: 907012771 PARA PASOS ESCALERA CON BORDE ESCALERA EN ALUMINIO | 5 días | mié 24/11/21 | mar 30/11/21 |
| 9 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA VALDIVIA WENGUE REF: 907012771 CM (EN BAÑOS A INTERVENIR.) | 5 días | mié 24/11/21 | mar 30/11/21 |
| 10 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED FLOTANTE EN PISO LAMINADO DE 8mm, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION | 6 días | mié 1/12/21 | mié 8/12/21 |
| 11 | | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO | 4 días | mar 7/12/21 | vie 10/12/21 |
| 12 | | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | 20 días | lun 15/11/21 | vie 10/12/21 |
| 13 | | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | 20 días | lun 15/11/21 | vie 10/12/21 |

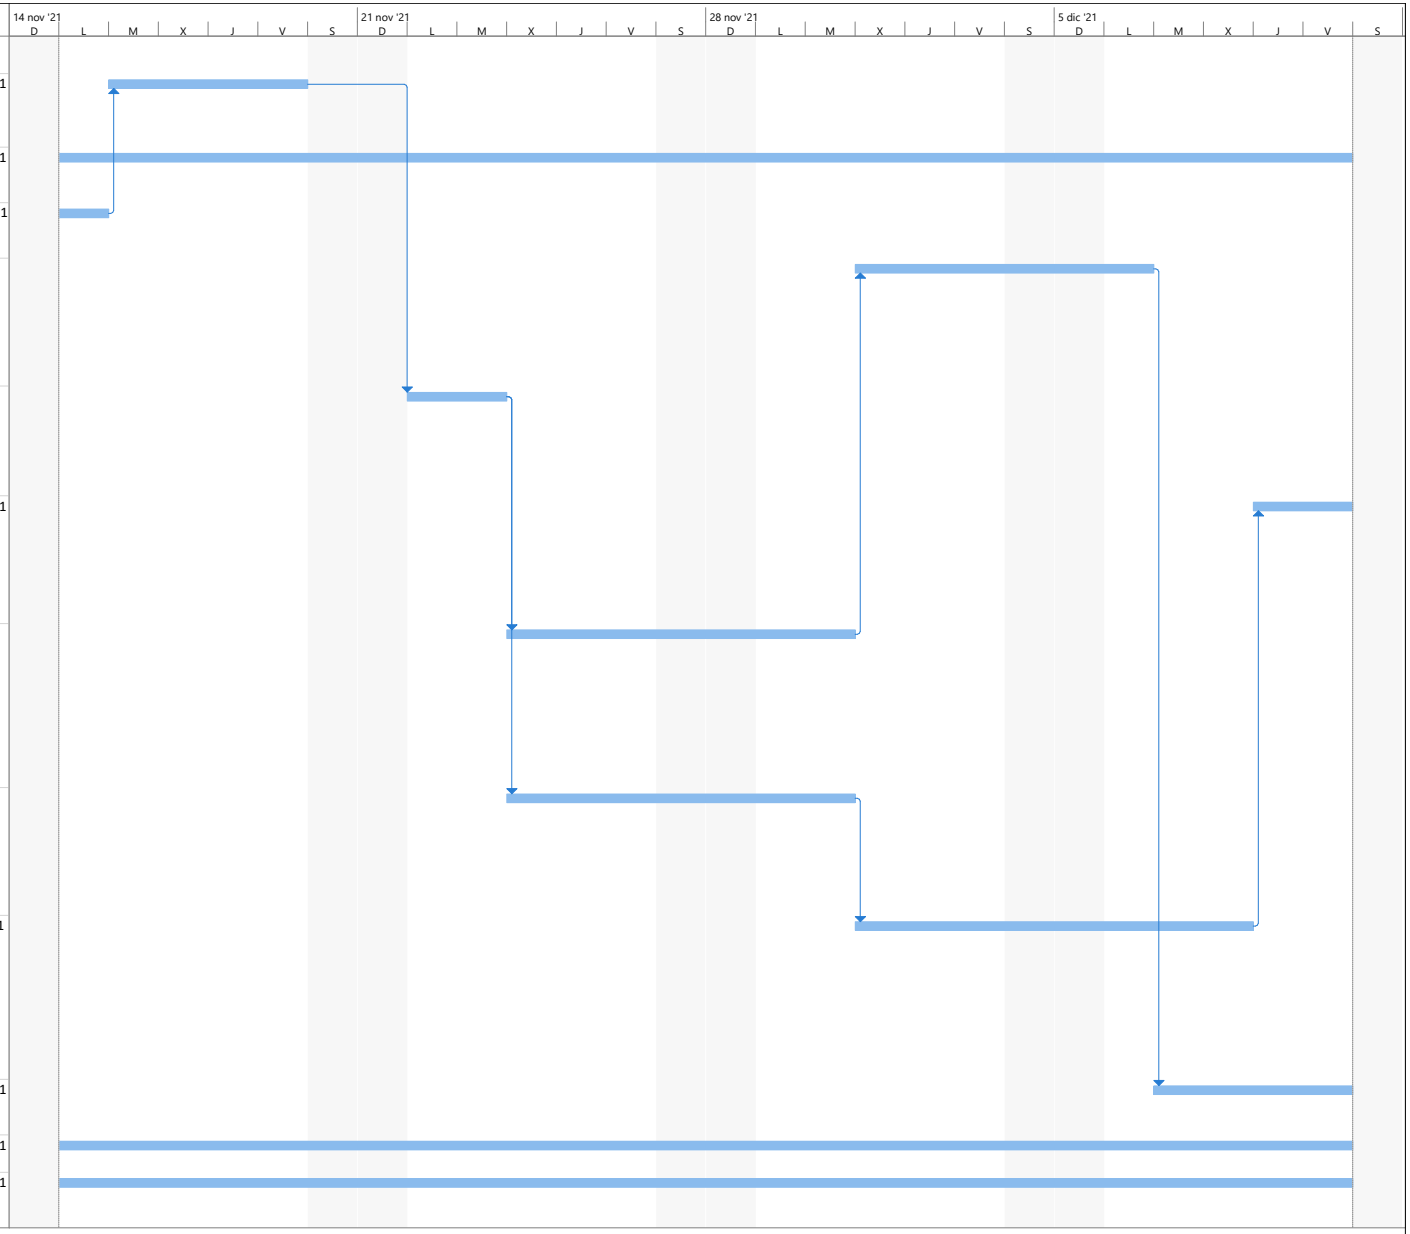


Proyecto: AUDITORIO ZAMBRA
Fecha: vie 5/11/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **EDIFICIO FENIZ** | 1 día? | lun 15/11/21 | lun 15/11/21 |
| 2 | | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | 4 días | lun 22/11/21 | jue 25/11/21 |
| 3 | | ALISTADO Y NIVELACION DE PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE INCLUYE LINEALES | 4 días | vie 26/11/21 | mié 1/12/21 |
| 4 | | SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO PARA PISO 60 X 60 TIPO PIZARRA O SIMILAR COLOR A ELECCION DE SUPERVISION | 6 días | jue 2/12/21 | jue 9/12/21 |
| 5 | | SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO PARA PISO 60 X 60 TIPO PIZARRA O SIMILAR PARA PASOS ESCALERA CON BORDE ESCALERA EN ALUNIMIO COLOR A ELECCION DE SUPERVISION | 5 días | jue 2/12/21 | mié 8/12/21 |
| 6 | | GUARDAESCOBA DE 7 CM DE ALTURA ,EN PORCELANATO PARA PISO 60 X 60 TIPO PIZARRA O SIMILAR COLOR A ELECCION DE SUPERVISION | 2 días | jue 9/12/21 | vie 10/12/21 |
| 7 | | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | 16 días? | vie 19/11/21 | vie 10/12/21 |
| 8 | | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | 16 días? | vie 19/11/21 | vie 10/12/21 |

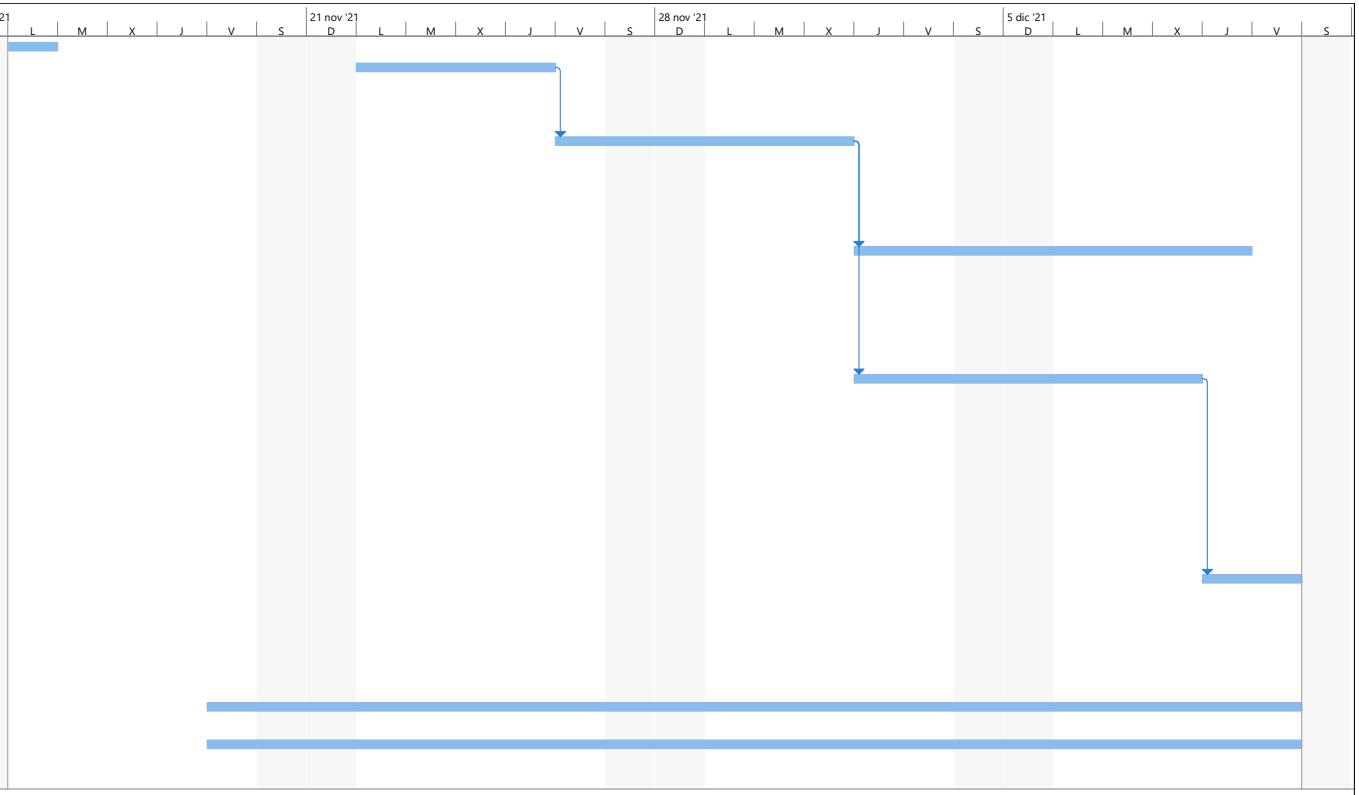


Proyecto: EDIFICIO FENIX
Fecha: vie 5/11/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
