ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2021

N° 1

Señor (a):
Luz Nelly Ortiz Moya
Subdirectora Administrativa
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión al Contrato N° 798 de 2021 - Grupo 2 (Cto. de obra 795 de 2021)

Periodo del Informe: Del 20 al 31 de agosto de 2021
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: CONSTRUMARCA SAS
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN

LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2021

Fecha de Inicio: 20 de agosto de 2021
Fecha de terminación: 4 de febrero de 2022
Plazo de Ejecución: Cinco (5) meses y quince (15) días
Nombre de Supervisora: CAMILA CORTÉS DAZA

Cargo Supervisora: Subdirectora de Barrios
Dependencia: Subsecretaria de Coordinación Operativa

Valor inicial del contrato	$ 615.594.670,00
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	$ 615.594.670,00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	
Prórroga 5	

Suspensiones	Días
Suspensión 1	
Suspensión 2	
Suspensión 3	
Suspensión 4	
Suspensión 5	

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI. X

NO.

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

El contratista de interventoria ha ejecutado sus obligaciones adecuadamente de acuerdo con los informe semanales No. 1 presentado a la Entidad vía correo electrónico comprendidos para el periodo del 20 al 28 de agosto de 2021, correspondiente al avance en la fase correspondiente a la etapa de preconstrucción para el desarrollo del proyecto.

Para este periodo correspondiente a la etapa de preconstrucción, la cual culminará el día 4 de septiembre del presente año, el contratista de obra AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. con Contrato N° 795 de 2021, realizó el día 24 de agosto de 2021, las reuniones de socialización de inicio para los 54 beneficiarios del Territorio Jalisco en la Localidad de Ciudad Bolívar, de los cuales 13 hogares fueron notificados por correo certificado, asistiendo 10 representantes de los Hogares convocados por este medio y de 41 hogares convocados telefónicamente, asistieron 35 hogares, para un total de asistentes de 45 beneficiarios del TPM Transición Jalisco.

Tambien se realizó el día 31 de agosto de 2021 las reuniones de socialización de inicio para los 209 hogares del Territorio Habitarte de la Localidad de Ciudad Bolívar, convocados telefónicamente y/o notificados por correo certificado identificando 23 hogares que No asistiendo pese a ser informados; para un total de 186 Hogares beneficiarios que asistieron a la reunión de socialización de Inicio.

Durante este periodo los contratistas tanto de obra como el de interventoría, se encuentran organizando la logistica y organización de la documentación respectiva para dar inicio a las validaciones de obra durante el mes de septiembre en el Territorio Jalisco de Ciudad Bolívar.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se ha realizado el seguimiento al contrato de acuerdo a las actividades desarrolladas por el contratista de interventoría que dan cumplimiento al objeto y obligaciones contratadas. Se han realizado las respectivas revisiones de la documentación enviada por parte de esta, se realizo el acompañamiento por parte del equipo de mejoramiento de vivienda a las reuniones de socialización de inicio del Territorio Jalisco en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el dia 24 de agosto de 2021 y las reuniones de socialización de inicio del Territorio Habitarte en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el día 31 de agosto de 2021.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Durante el presente periodo el contratista de interventoría se encuentra en la Etapa de Preconstrucción del proyecto, a lo cual se encuentra en la consecución del personal profesional de interventoría, por consiguiente no se generan pagos ni afiliaciones de personal.

9. Requerimientos (cuando aplique)

A la fecha no se han presentado requerimientos relacionadas con la ejecución del contrato.

10. Garantías

Numero de póliza: 96-44-101163830 - Anexo 0 Entidad emisora: Seguros del Estado SA Vigencia desde: 12-08-2021 hasta 24-07-2027	Numero de póliza: 96-40-101058124 - Anexo 0 Entidad emisora: Seguros del Estado SA Vigencia desde: 12-08-2021 hasta 24-03-2022		

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

La SDHT pagará al INTERVENTOR CONSTRUMARCA SAS con contrato N° 798 de 2021 de la siguiente manera

El valor del contrato se pagará por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat mediante pagos parciales por avance de obra y previo recibo a satisfacción de los servicios prestados.
• Se pagará de manera proporcional a la facturación de cada contratista de obra relacionado con las actas parciales hasta llegar al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SDHT. (Solo se tendrá en cuenta las obras terminadas canceladas a cada grupo de obra).
• Un pago final correspondiente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato, contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoria, entrega a satisfacción del contrato de obra como de la interventoria. El último pago queda supeditado a la entrega del 100% de los expedientes de cada vivienda conforme a la obligación 4.3.30 indicada en el anexo técnico y a la firma de las actas de recibo y liquidación finales del contrato.

11.2 Pagos Realizados

A la fecha no se han efectuado pagos en el presente contrato de interventoria.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

El contratista de interventoria realizó la respectiva revisión y aprobación de la documentación para realizar el desembolso del Anticipo al contratista de obra, el cual fue desembolsado a este último en el mes de agosto de 2021 por un valor de $1.539.122.994 M/Cte.

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

No Aplica

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

Durante este periodo los contratistas tanto de obra como el de interventoria, se encuentran organizando la logistica y organización de la documentación para dar inicio a las validaciones de obra durante el mes de septiembre en el Territorio Habitarte.
Cabe mencionar que para el presente periodo no se tiene previsto dar inicio a la fase de validación y aperturas de obras, estas empezaran a ejecutarsen a partir del 8 de septiembre de 2021.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

A la fecha no se han presentado novedades relacionadas con la ejecución del contrato.

13. Anexos

Los soportes y evidencias de este informe se anexan en medio fisico.

. Informe semanal de interventoria componente tecnico No. 1 (20 al 28 de agosto de 2021).

. Acta reuniones de socialización de inicio del Territorio Jalisco en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el dia 24 de agosto de 2021.

. Acta de reunión componente social de fecha 26 de agosto de 2021.

. Informe semanal de interventoria componente social No. 1 (20 al 28 de agosto de 2021).

. Acta reuniones de socialización de inicio del Territorio Habitarte en la localidad de Ciudad Bolívar realizadas el dia 31 de agosto de 2021.

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILA CORTÉS BAZA
Cargo	SUBDIRECTORA DE BARRIOS
Dependencia	SUBSECRETARIA DE COORDINACION OPERATIVA

Elaboró componente técnico: Diana Carolina Posada R - Contratista SB
Elaboró componente social: Maria Isabel Serrano P - Contratista SB
Elaboró componente SISO y Bioseguridad: Lina Sazipa - Contratista SB
Revisó: Stella Acevedo Beltrán - Contratista SB
Aprobó:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	PROCESO: INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA SUBPROCESO: CONSULTORÍA TITULO: INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 2	CONSTRUMARCA

INFORME N°	1		20/08/2021 (dd/mm/yyyy)	**AL:**	28/08/2021 (dd/mm/yyyy)
CONTRATO DE OBRA N°	795 DE 2021	**CONTRATISTA:**	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S		
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	798 DE 2021	**CONTRATISTA:**	CONSTRUMARCA SAS		
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.".				
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA:	20/08/2021 (dd/mm/yyyy)			**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:**	4/02/2022 (dd/mm/yyyy)
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:	20/08/2021 (dd/mm/yyyy)			**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:**	7/03/2022 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LEGAL:

Se suscribieron actas de inicio del contrato de obra e interventoría el día 20 de agosto de 2021 y se remitieron a la entidad contratante, para la debida legalización.

TÉCNICO:

* El componente técnico apoyó al componente social en la reunión de socialización ante la comunidad que se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Jalisco el día 24 de agosto del 2021.
* Se recibieron las hojas de vida del personal del contratista, para la respectiva verificación, dando respuesta el día 27 de agosto de 2021 mediante oficio 798-2021G2-005-2021 con las observaciones realizadas por la interventoría.
* El día 27 de agosto de 2021 se realizó reunión interna con el equipo de interventoría, para implementar un plan de trabajo.
* Se realizó reunión conjunta con el equipo de interventoría y contratista para socializar las observaciones y recomendaciones de interventoría hacia contratista, para el desarrollo de las actividades, objeto del contrato.
* Se realizó el trámite del anticipo del contratista ante la Secretaría Distrital del Habitat- SDHT.
* El contratista radicó el plan de calidad para su respectiva revisión.

SST:

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas. No se han iniciado actividades de campo.

IDENTIFICACION MV	ESTADO	FECHA APERTURA	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE	DÍAS DE ATRASO ENTREGA DE MV	OBSERVACIONES
BLOQUE 8								
CIUDAD BOLIVAR								
MVJA_2830			KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA			
MVCB_5209			DG 69Q SUR 18N 73	HABITARTE 2019-MV	MARCELINDA MURCIA			
MV_04993			CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	ROSALBINA ZABALA MENDOZA			
MVJA_1378			CL 65 SUR 18N 47	TRANSICION - JAUSCO	JOSE GONZALO HILARION PARRA			
MVJA_1460			CL 65B SUR 18M 16	TRANSICION - JAUSCO	WILSON MAURICIO BRICEÑO			
MVJA_3226			KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	CARMEN ROSA ACUNA PEREZ			
MVJA_3228			KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	FRANZ GARRY PARRA ROJAS			
MVJA_3235			KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	FLOR ALBA BUCURU HERRADA			
MVJA_3285			KR 18P BIS B 61A 84 SUR	TRANSICION - JAUSCO	LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA			
MVJA_1786			DG 64 BIS SUR 19 23	TRANSICION - JAUSCO	GEORGINA SALAZAR			
MVJA_2797			KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION - JAUSCO	LUZ MILA VASQUEZ PAEZ			
MVJA_2899			KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION - JAUSCO	JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ			
MVJA_3227			KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO			
MVJA_0571			CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION - JAUSCO	RITO JULIO ROJAS SAENZ			
MVJA_2733			KR 18M 62A 20 SUR	TRANSICION - JAUSCO	MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA			
MVJA_2920			KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION - JAUSCO	FERNANDO CRUZ ORTEGON			
MVJA_3139			KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS			
MVJA_3399			KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION - JAUSCO	PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ			
MVJA_0387			CL 62 SUR 18K 59	TRANSICION - JAUSCO	MARTIN MEDINA BERRIO			
MVJA_0538			CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION - JAUSCO	DORIS VASQUEZ			
MVJA_2721			KR 18M 62 54 SUR	TRANSICION - JAUSCO	MICHAEL STIVEN CAMACHO VEGA			
MVJA_0277			CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION - JAUSCO	DIOSELINA FLOREZ MONTES			
MVJA_0853			CL 63A SUR 18R 13	TRANSICION - JAUSCO	RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO			
MVJA_0964			CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION - JAUSCO	MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA			

MVJA_3328			KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ	TRANSICION - JAUSCO	ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA			
MVJA_4854			TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION - JAUSCO	ALICIA ALMARIO NUNEZ			
MVJA_2340			KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION - JAUSCO	MANUEL ANTONIO ROMERO LEON			
MVJA_2772			KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JAUSCO	ROSA RUBIANO OCHOA			
MVJA_3293			KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION - JAUSCO	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ			
MVJA_3385			KR 18Q 63A 15 SUR	TRANSICION - JAUSCO	SONIA JANETH PAEZ			
MVJA_4378			TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION - JAUSCO	LUZ DARY GUAPACHA LARGO			
MVJA_4328			TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION - JAUSCO	SOR MARIA GOMEZ NARANJO			
MVCB_1762			CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA			
MVCB_1823			CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO			
MVCB_1833			CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO			
MVCB_1834			CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS			
MVCB_5202			DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA			
MVCB_5254			DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO			
MVCB_2431			KR 18M BIS 69A 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA			
MVCB_2474			KR 18L BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CONSUELO RAMIREZ			
MVCB_2597			KR 18L BIS B 69A 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE JESUS SAMACA DE PIRAGAUTA			
MVCB_3012			KR 18M BIS A 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO			
MVCB_3019			KR 18M BIS A 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA SULINDA VILLAMIL CANOM			
MVCB_3032			KR 18M BIS 69A 89 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLENY JARAMILLO ROMERO			
MVCB_5179			CL 69P BIS A SUR 18N 16	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA			
MVCB_2176			CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ			
MVCB_2192			KR 18R BIS 69B 29 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA			
MVCB_5416			CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA			
MVCB_5418			KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR			
MVCB_5419			CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO			
MVCB_5430			CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA			
MVCB_5434			CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO			
MVCB_5435			CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO			
MVCB_2963			DG 69A BIS D SUR 18M 18	TRANSICION HABITARTE 2019	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS			
MVCB_2966			DG 69A BIS D SUR 18M 32	TRANSICION HABITARTE 2019	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR			
MVCB_2968			DG 69A BIS D SUR 18M 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBERTO ANTONIO ISAZA			
MVCB_2971			TV 18M BIS B 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ PATRICIA MORALES			
MVCB_2972			TV 18M BIS B 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ DARY ROBAYO RAMIREZ			
MVCB_2973			TV 18M BIS B 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL			
MVCB_5106			TV 18P BIS 69L 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA MILENA RUIZ VILLAMIL			
MVCB_5117			TV 18P BIS 69N 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY PAOLA RAMIREZ ROMERO			
MVCB_5329			TV 18N BIS 69R 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	HERCILIA SOTELO VEGA			
MVCB_5338			TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SAULINA DEL TRANSITO AREVALO BUITRAGO			
MVCB_5339			TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ANUNCIACION JIMENEZ DE AGREDO			
MVCB_5342			TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ASCENCION MELO FERRUCHO			
MVCB_2465			DG 69A BIS C SUR 18L 85	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY LIZCANO CORNELIO			
MVCB_2471			DG 69A BIS C SUR 18L 51	TRANSICION HABITARTE 2019	AMPARO OSPINA ORTIZ			
MVCB_2599			KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ			
MVCB_2769			KR 18L BIS B 69A 41 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA			
MVCB_2772			DG 69A BIS C SUR 18L 78	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA SANCHEZ ARDILA			
MVCB_2912			DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES			
MVCB_3002			DG 69A BIS B SUR 18M 03	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS			
MVCB_5163			CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO ALEJANDRO AVELLANEDA AVELLANEDA			
MVCB_5270			DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEJANDRINA RODRIGUEZ PALACIO			
MVCB_5279			TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ			
MVCB_5281			TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA			
MVCB_1368			CL 70J SUR 18L 35	TRANSICION HABITARTE 2019	OTILIA PICO BARRERA			
MVCB_1392			CL 70J SUR 18L 70	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ GILMA CUCUNUBA BARRERA			
MVCB_1551			KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ			

MVCB_1552			KR 18N 70I 14 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA			
MVCB_1554			CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS			
MVCB_1557			KR 18M 70I 11 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE JOAQUIN PACHECO QUIROGA			
MVCB_3025			KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES			
MVCB_3479			TV 18P BIS 69A 36 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SARA ELISA PRIETO CASTILLO			
MVCB_3606			TV 18N BIS A 69A 62 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULETA OROZCO			
MVCB_5451			KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA			
MVCB_5453			KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS			
MVCB_5521			CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO			
MVCB_2112			KR 18W 69B 06 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR MIREYA NIVIA CHAVEZ			
MVCB_1627			KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS			
MVCB_1629			KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO			
MVCB_1723			CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT			
MVCB_1769			CL 70J SUR 18N 53	TRANSICION HABITARTE 2019	GERARDO VEGA VICTORIA			
MVCB_2162			KR 18V 68C 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	OLGA CECILIA RUIZ			
MVCB_3266			KR 18U BIS A 68C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCIA SANCHEZ POBLADOR			
MVCB_1497			CL 70H SUR 18J 81	TRANSICION HABITARTE 2019	PABLO VALBUENA			
MVCB_1430			CL 70H SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO			
MVCB_1434			CL 70H SUR 18L 21	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA			
MVCB_1446			CL 70H SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARY MAYORGA MACANA			
MVCB_5204			DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ			
MVCB_5210			DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	NANCY DUARTE CALDERON			
MVCB_5267			TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARBILUZ JAVELA PALOMINO			
MVCB_5553			DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA PALOMINO OSORIO			
MVCB_2838			DG 69C BIS SUR 18M 84	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA			
MVCB_2977			TV 18M BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ			
MVCB_2986			TV 18N 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS GUARIN			
MVCB_3006			KR 18M BIS B 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EMILIO VARGAS			
MVCB_5064			TV 18P BIS 69K 08 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA JIMENEZ FONSECA			
MVCB_5071			TV 18P BIS A 69K 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA VELASCO OVALLE			
MVCB_5086			DG 69L BIS SUR 18P 64 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GERMAN CASTRO HERNANDEZ			
MVCB_5091			CL 69L BIS SUR 18N 42 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO GOMEZ JIMENEZ			
MVCB_5100			CL 69N SUR 18P 20 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MELANIA MANCILLA HERNANDEZ			
MVCB_5101			CL 69N SUR 18P 24 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JULIA GALINDO RANGEL			
MVCB_5103			DG 69L BIS SUR 18P 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LAUREANO RODRIGUEZ VASQUEZ			
MVCB_5116			TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL			
MVCB_5140			CL 69L BIS SUR 18N 59 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	DIANA MATILDE GOMEZJIMENEZ			
MVCB_5160			CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EFRAIN ROMERO RODRIGUEZ			
MVCB_5167			CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS HERNANDO SOSA ACEVEDO			
MVCB_5168			CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	ISABEL PERALTA RUIZ			
MVCB_2876			DG 69C SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDUARDO AREVALO SOSA			
MVCB_2931			TV 18N 69A 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON			
MVCB_2937			TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO			
MVCB_3639			TV 18N BIS 69A 67 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SALOMON TRIANA SALGUERO			
MVCB_2122			KR 18W 68C 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO JEREZ BLANCO			
MVCB_2151			KR 18V 68C 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA STELLA ALARCON MORALES			
MVCB_5217			CL 69Q SUR 18P 12	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA TRIANA DE SOSA			
MVCB_1741			CL 70J SUR 18N 26	TRANSICION HABITARTE 2019	ORLANDO VELASCO ARDILA			
MVCB_1743			CL 70J SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ERNESTO TENORIO SANCHEZ			
MVCB_1744			CL 70J SUR 18N 48	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ			
MVCB_2547			KR 18K 70B 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MERCEDES HUERTAS			
MVCB_2645			CL 70C SUR 18I 95	TRANSICION HABITARTE 2019	NORA TERESA PENAGOS CAYCEDO			
MVCB_2649			CL 70C SUR 18I 79	TRANSICION HABITARTE 2019	MARCO AURELIO BERNAL RIVERA			
MVCB_2663			CL 70D SUR 18I 91	TRANSICION HABITARTE 2019	FREDY ALEXANDER ORDOÑEZ GALINDO			
MVCB_1115			DG 69D SUR 18J 51	TRANSICION HABITARTE 2019	ZORAIDA VERA			
MVCB_1116			DG 69D SUR 18J 47	TRANSICION HABITARTE 2019	JESUS ELIAS AYALA GUZMAN			

MVCB_1152			DG 69D BIS SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA AVILA			
MVCB_1248			CL 70N SUR 18L 84	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA OLIVA BUSTOS			
MVCB_1257			CL 70M SUR 18L 71	TRANSICION HABITARTE 2019	QUERUBIN OSPINA			
MVCB_1353			CL 70K SUR 18L 68	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ PATIÑO ARDILA			
MVCB_1447			TV 18M 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	VITALIA CARDENAS DUCUARA			
MVCB_1536			KR 18M 70M 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO PRECIADO			
MVCB_5079			TV 18R 69K 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ			
MVCB_5325			DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ			
MVCB_5406			CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ			
MVCB_5410			KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ			
MVCB_5556			TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS			
MVCB_2866			DG 69C SUR 18N 59	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO OLAYA CIFUENTES			
MVCB_2965			DG 69A BIS D SUR 18M 28	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA GLADYS LAVERDE			
MVCB_3008			KR 18M BIS B 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS			
MVCB_3013			KR 18M BIS A 69A 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES			
MVCB_3171			KR 18R 69 75 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCICIO ALFONSO FORERO			
MVCB_3580			TV 18N BIS A 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO			
MVCB_3582			TV 18N BIS A 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	AMIRA YANETH VEGA BUITRAGO			
MVCB_5250			TV 18P 69Q 18 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	YHON ALEXANDER PEREZ PULIDO			
MVCB_5399			CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO			
MVCB_5407			CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO			
MVCB_5411			KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ			
MVCB_5414			CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA			
MVCB_5421			CL 70D SUR 19A 16	TRANSICION HABITARTE 2019	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL			
MVCB_5417			CL 70C SUR 18R 17 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ			
MVCB_1612			CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ			
MVCB_1792			KR 18R 70K 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELDA INES CANDELA ZABALA			
MVCB_2976			TV 18M BIS B 69A 73 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCENETH OLAYA TABORDA			
MVJA_2105			DG 64A SUR 19B 39	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL TRANSITO POLANIA CRUZ			
MVJA_0307			CL 62 BIS SUR 18K 10	TRANSICION - JALISCO	DAGOBERTO RODRIGUEZ CANTOR			
MVJA_0369			CL 62 SUR 18J 70	TRANSICION - JALISCO	JOSE LEOPOLDO PEÑALOZA			
MVJA_0917			CL 63C SUR 18P 05	TRANSICION - JALISCO	ERNESTO TIBANA BLANCO			
MVJA_3405			KR 18Q BIS 63A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARY INGRE MILENA			
MVJA_0261			CL 61D SUR 18P 12 IN 11	TRANSICION - JALISCO	MARIA DE LOS ANGELES SILVA DUQUE			
MVJA_2915			KR 18N 62 24 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARIA MAGDALENA GALEANO			
MVJA_4290			TV 18Q BIS 61B 40 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA YANET SABOGAL ARDILA			
MVJA_4299			TV 18Q BIS A 61A 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	DORA CECILIA ACOSTA CASTAÑEDA			
MVJA_2438			KR 18K BIS 61 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA LEONOR AVENDAÑO			
MVJA_2512			KR 18L 61B 26 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALEX ARNULFO OLAYA DURAN			
MVJA_0316			CL 62 BIS SUR 18K 28	TRANSICION - JALISCO	MARIA EBELIA LEAL			
MVJA_0187			CL 61C SUR 18N 09	TRANSICION - JALISCO	OVIDIO GOMEZ VARGAS			
MVJA_3144			KR 18P 62A 39 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CELIA ROMERO DUARTE			
MVJA_1265			CL 64D SUR 18M 20	TRANSICION - JALISCO	DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ			
MVJA_2536			KR 18L 63D 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	GRACIELA CARBONEL DE GUZMAN			
MV_42760-IDU			CALLE 71 I BIS SUR 27A-05	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-	NELSON DARIO GUERRERO CASTEBLANCO			
MV_42764-IDU			CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO			
MV_42802-IDU			CL 71G BIS SUR 27A 33	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-	JOSE RICARDO GARZON MENDEZ			
MV_42803-IDU			CARRERA 27D 71D-58SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-	EDWIN ANDRES CASTRO			
MVCB_1118			DG 69D SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	JOHN RAMIREZ MALDONADO			
MVCB_1119			DG 69D SUR 18J 35	TRANSICION HABITARTE 2019	NOEMI MALDONADO DE RAMIREZ			
MVCB_1163			KR 18J 69F 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO			
MVCB_1216			DG 69G SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	YORMARY GALINDO ORDOÑEZ			
MVCB_1268			CL 70M SUR 18L 50	TRANSICION HABITARTE 2019	MONICA CRISTINA PEREZ BARRIGA			
MVCB_1269			CL 70M SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DORIS SEGURA			
MVCB_1270			CL 70M SUR 18L 58	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIA CUCUNUBA DE CRUZ			
MVCB_1370			CL 70J SUR 18L 27	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO MURILLO RODRIGUEZ			

MVCB_1422			CL 70I SUR 18L 60	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CRUZ RAMIREZ			
MVCB_1444			CL 70H SUR 18L 40	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ			
MVCB_1445			CL 70H SUR 18L 46	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALONSO MORA MEJIA			
MVCB_1569			KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO			
MVCB_1596			CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO			
MVCB_1602			CL 70G SUR 18N 28	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA			
MVCB_1676			CL 70I SUR 18N 08	TRANSICION HABITARTE 2019	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ			
MVCB_1727			KR 18Q 70I 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO			
MVCB_1736			KR 18P 70J 03 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SIXTO ALFONSO LAITON COY			
MVCB_1753			CL 70I SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ			
MVCB_1782			CL 70K SUR 18Q 14 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GLICERIO RODRIGUEZ			
MVCB_1790			KR 18Q 70J 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JULIA BERNAL BELLO			
MVCB_3462			TV 18P BIS 69A 88 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MIGUEL GUZMAN			
MVCB_3505			TV 18P 69A 25 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CHARLIE EDGARDO GARCIA CABALLERO			
MVCB_5115			CL 69N SUR 18P 19	TRANSICION HABITARTE 2019	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ			
MVCB_5119			CL 69P BIS C SUR 18P 52	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ANTONIO VEGA			
MVCB_5126			CL 69N SUR 18N 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	HERNANDO GONZALEZ LOZANO			
MVCB_5145			CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS			
MVCB_5165			TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON			
MVCB_5249			DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO			
MVCB_5316			TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ			
MVCB_5462			CL 70C SUR 19B 27	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO			
MVCB_5477			KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO			
MVCB_2554			CL 70B SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	MARY NATALY BECERRA GOMEZ			
MVCB_2556			CL 70B SUR 18J 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILIA CHACON MORA			
MVCB_5182			TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ISABEL MORENO FONSECA			
MVCB_5290			DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO			
MVCB_5322			TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS			
MVCB_5345			TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES			
MVCB_5347			TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO			
MVCB_5392			CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA			
MVCB_1475			CL 70G SUR 18K 33	TRANSICION HABITARTE 2019	MIGUEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ			
MVCB_1324			CL 70K SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ			
MVCB_1340			CL 70K SUR 18L 16	TRANSICION HABITARTE 2019	YOLANDA VARGAS ESPAÑA			
MVCB_1401			CL 70I SUR 18L 69	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO			
MVCB_1605			CL 70G SUR 18N 44 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA ACOSTA USECHE			
MVCB_1888			KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA			
MVCB_2149			KR 18V 68C 47 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO			
MVCB_2644			CL 70C SUR 18I 99	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA AMPARO TORRES ARIAS			
MVCB_2984			DG 69A BIS D SUR 18M 24	TRANSICION HABITARTE 2019	AURA CECILIA ANTOLINEZ			
MVCB_2975			TV 18M BIS B 69A 69 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO DE ALCANTARA REYES			
MVCB_3162			KR 18R 69 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLARAIBEL MORENO FERRUCHO			
MVCB_3545			TV 18P 69A 46 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTHA VICTORIA MENDEZ			
MVCB_3576			TV 18N BIS A 69A 39 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA FLOR RAMIREZ ESTRADA			
MVCB_3583			TV 18N BIS A 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH LUCILA TOVAR			
MVCB_3590			TV 18N BIS A 69A 87 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ			
MVCB_3617			TV 18N BIS A 69A 26 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EVELIA MORALES GARCIA			
MVCB_5455			KR 19C 70C 42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA JACQUELINE ROJAS			
MVCB_5468			KR 19B 70D 13 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA SIMIJACA CAMACHO			
MVCB_5488			KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ			
MVJA_0091			CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA			
MVJA_1028			CL 63F SUR 18Q 10	TRANSICION - JALISCO	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ			
MVJA_1405			CL 65 SUR 18R 42	TRANSICION - JALISCO	CESAR CRUZ MOLANO			
MVJA_2659			KR 18L BIS A 62A 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS			
MVJA_2714			KR 18M 62 35 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA			
MVJA_3462			KR 18R 61 57 SUR	TRANSICION - JALISCO	REINALDA GAMBOA			

MVJA_3713			KR 19 62A 23 SUR	TRANSICION - JALISCO	ANA ADELINA PARRAGA MOYA			
MVJA_0870			CL 62 SUR 18J 71	TRANSICION - JALISCO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON			
MVCB_1355			CLL 70K # 18L-76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ODILIA PRADA DIAZ			
MVCB_1879			KR 18 P 70 K 36	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA MEDINA NIÑO			
MVCB_1911			CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO			
MVCB_2942			TV 18 N BIS 69 A 72 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CRISTINA GARCIA DE ARDILA			
MVCB_5150			CLL 69 P SUR - 18 P 20	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA NELLY MARTINEZ			
MVCB_1271			CL 70 M SUR 18 L 62	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA			
MVCB_2160			KR 18V 68C 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILBERTO RIVERA SANCHEZ			
MVCB_1845			KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ			
MVCB_1868			KR 18P 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO			
MVCB_2705			TV 18Q 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GUILLERMO MORALES SALINAS			
MVCB_1465			CL 70 H SUR 18J 64	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL			
MVCB_2212			CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO			
MVCB_2387			KR 18K BIS 69T 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO			
MVCB_2803			CL 69 C SUR 18 U 63	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ALEXANDER DIAZ FETIVA			
MVCB_3088			TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ			
MVCB_3117			CL 69B BIS SUR 18U 14	TRANSICION HABITARTE 2019	MARÍA INÉS CÁRDENAS			
MVCB_3118			CL 69B BIS SUR 18U 18	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MYRIAM GÓMEZ ARDILA			
MVCB_5223			CL 69 P BIS C SUR 18P-49	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE GUSTAVO GRAJALES			
MVCB_5398			CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS			
RAFAEL URIBE URIBE								
MV_044			KR 9D 38 24 SUR	LOMAS	ANA BEATRIZ RINCON RAMOS			
MV_113			KR 9H 37 27 SUR	LOMAS	LUZ HELENA OSORIO CASTRO			
MV_115			KR 9H 37 35 SUR	LOMAS	LUIS ANTONIO ROPERO ARDILA			
MV_116			KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN			
MV_124			KR 9H 39 51 SUR	LOMAS	BLANCA INES FIQUE AREVALO			
MV_148			Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE			
MV_152			CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS			
MV_155			CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON			
MV_159			CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO			
MV_162			CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO			
MV_163			CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS			
MV_164			CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA			
MV_202			KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ			
MV_204			KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL			
MV_209			KR 11A 41 28 SUR	LOMAS	CLARA LUCIA TORRES BUITRAGO			
MV_213			KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA			
MV_228			KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ			
MV_282			KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO			
MV_330			Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR			
MV_344			CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA			
MV_361			CL 36F SUR 11C 36	LOMAS	ROSA HERMINDA RODRIGUEZ GOMEZ			
MV_398			CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS			
MV_415			CL 36F SUR 11A 02	LOMAS	DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO			
MV_447			CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO			
MV_462			CL 36 SUR11C 13	LOMAS	AMPARO OLAYA			
MV_483			CL 36G SUR 11C 63	LOMAS	MARIO DELFIN VELASCO			
MV_500			CL 36H SUR 11C 95	LOMAS	ELSA REYES BAQUERO			
MV_506			CL 36H SUR 11C 82	LOMAS	MARIA MARGARITA CRUZ			
MV_507			Cl 36H SUR 11C 81	LOMAS	EDELMIRA RAMIREZ DE ORJUELA			
MV_512			CL 36H SUR 11C 69	LOMAS	MARIA GLADYS BRICEÑO MARTINEZ			
MV_515			CL 36H SUR 11C 63	LOMAS	LEONOR RINCON CORREDOR			
MV_520			CL 36H SUR 11C 51	LOMAS	NUBIA RAMIREZ RUEDA			
MV_530			CL 36H SUR 11C 28	LOMAS	MARIA SORAIDA PARRA LEGUIZAMON			


MV_532			Cl 36H SUR 11C 23	LOMAS	GUSTAVO CUESTA AMAYA			
MV_543			CL 36H SUR 11A 58	LOMAS	VICTOR MANUEL CARDENAS RINCON			
MV_546			CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA			
MV_627			CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO			
MV_748			Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES			
MV_765			Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO			
MV_788			KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO			
MV_091			KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO			
BOSA								
MVBL_1875			CL 66 SUR 89A 77	BOSA LA LIBERTAD	MARIA LUZ BONILLA			

0%

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	ADELANTO / ATRASO
	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
	PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
	TOTAL VALOR VALIDADO FRENTE DE OBRA		0%	

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS APERTURADAS	NUMERO DE VIVIENDAS POR APERTURAR	NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS	NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR	NUMERO DE VIVIENDAS PAGADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
0	0	310	0	310	0	310	0	0

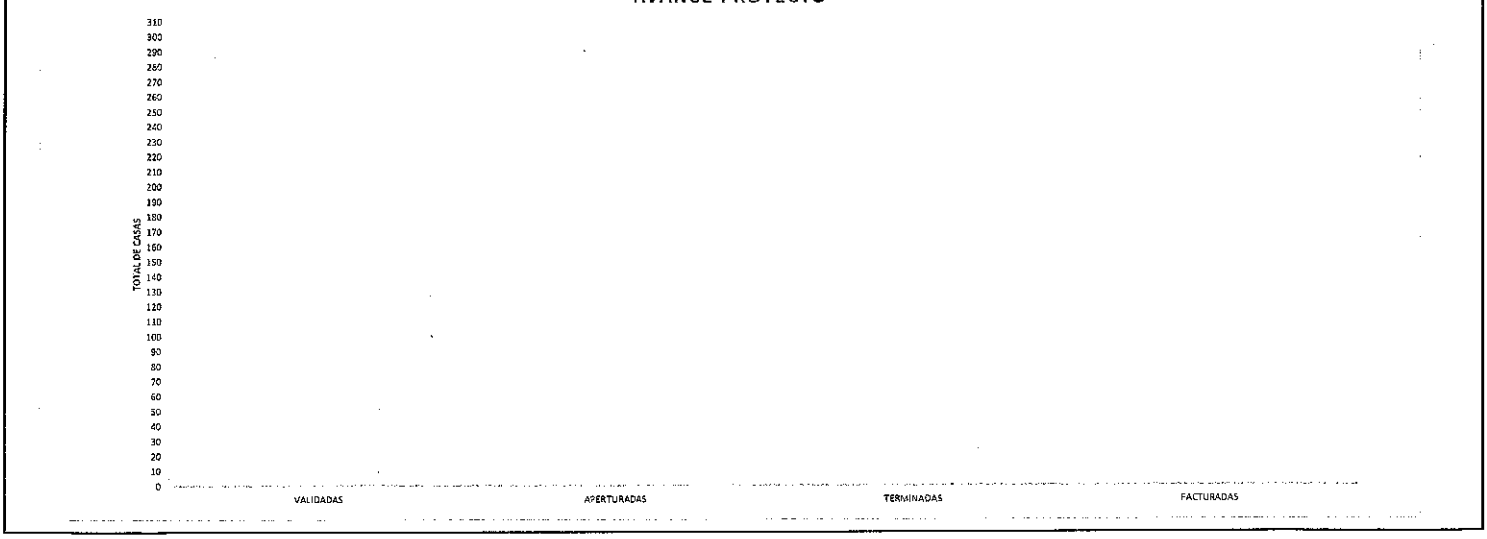

3. PLAZO

Fecha de terminación de ejecución de obra.			4/02/2022
CANT. DÍAS	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	165	8	157
Proyección	165	8	157

4- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	0	4/02/2022	0,00%
Semana Actual	0	4/02/2022	4,85%

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

JUSTIFICACIÓN:

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas.
No se han iniciado actividades en territorio, hasta el momento tanto contratista como interventoria está diseñando los planes de trabajo y la organización logística necesaria para iniciar actividades de manera optima.

6- DESCRIPCIÓN CASOS ESPECIALES

7- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha a Corte		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$		$	%
Directos+AIU+IVA	$ 5.130.409.981,00					
TOTAL	$ 5.130.409.981,00					

8- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

9- ESTADO DEL TIEMPO

Interventoría- GRUPO 2
CONTRUMARCA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
24	Agosto	2021	9:00 am	12:00 pm

CONVOCADO POR: Contratista de Obra Cto 795 de 2021 Ambientalmente Ingeniería SAS.
Contratista de Interventoría Cto 798 de 2021 Construmarca SAS.
Secretaria Distrital del Hábitat -Mejoramiento de Vivienda

DIRECCIÓN: KR 18 M61D 56 SUR Salón Comunal Barrio La Escala
TPM Jalisco - Transición

OBJETIVO:
Informar aspectos generales para el desarrollo de la ejecución de las obras de los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda.

TEMAS A TRATAR:
Desarrollo metodológico agenda.

DESARROLLO:

Se desarrollo reunión de inicio con los Hogares beneficiarios de mejoramiento de vivienda que asistieron desarrollando la siguiente metodología.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INSUMOS
1. ingreso a los beneficiarios 9:00 a 10:00 am.	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
2. saludo y bienvenida 10 a 10:20 am.	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
3. desarrollo de la reunión 10:20 a 11:20 am.	***informar las generalidades y etapas del proyecto.***	SDHT	presentación, video beam, sonido.
4. inquietudes de la comunidad 11:20 a 11:50	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
5. despedida y entrega de refrigerios 11:50 en adelante.	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Durante La reunión la SDHT desarrollo los siguientes puntos como agenda de socialización.

1. Normativa
2. Objetivo programa de Mejoramiento de vivienda
3. Generalidades Subsidio – Modalidad de habitabilidad
4. Etapas metodológicas desarrollo mejoramiento de vivienda
5. Participantes – presentación (contratista de obra, interventoría)
6. TPM priorizado, mejoramientos a ejecutar, población a beneficiar e inversión
7. Proceso de ejecución
8. Reglamento operativo- obligaciones del Hogar
9. Recomendaciones a tener en cuenta – Valores agregado
10. Espacio de interlocución con hogares (preguntas y respuestas)

Observaciones y/o conclusiones:


Contratista de Obra Cto 795 de 2021 desarrollo convocatoria a reunión de inicio de 54 Hogares de los cuales:
13 hogares fueron notificados por correo certificado **asistiendo 10** representantes de los Hogares convocados

41 hogares convocados telefónicamente asistieron realizando convocatoria telefónica **asistiendo 35 hogares.**

Para un **total de 45 Hogares** beneficiarios del TPM Transición Jalisco que asistieron a la reunión de Inicio.

Se publica en redes sociales
socializamos las etapas de las obras de mejoramiento de vivienda que realizaremos en el sector de Jalisco en Ciudad Bolívar. En total, intervendremos 54 viviendas del sector que beneficiarán a 172 ciudadanos. ¡Seguimos haciendo de Bogotá, el mejor hogar!

Registro fotográfico (si aplica):

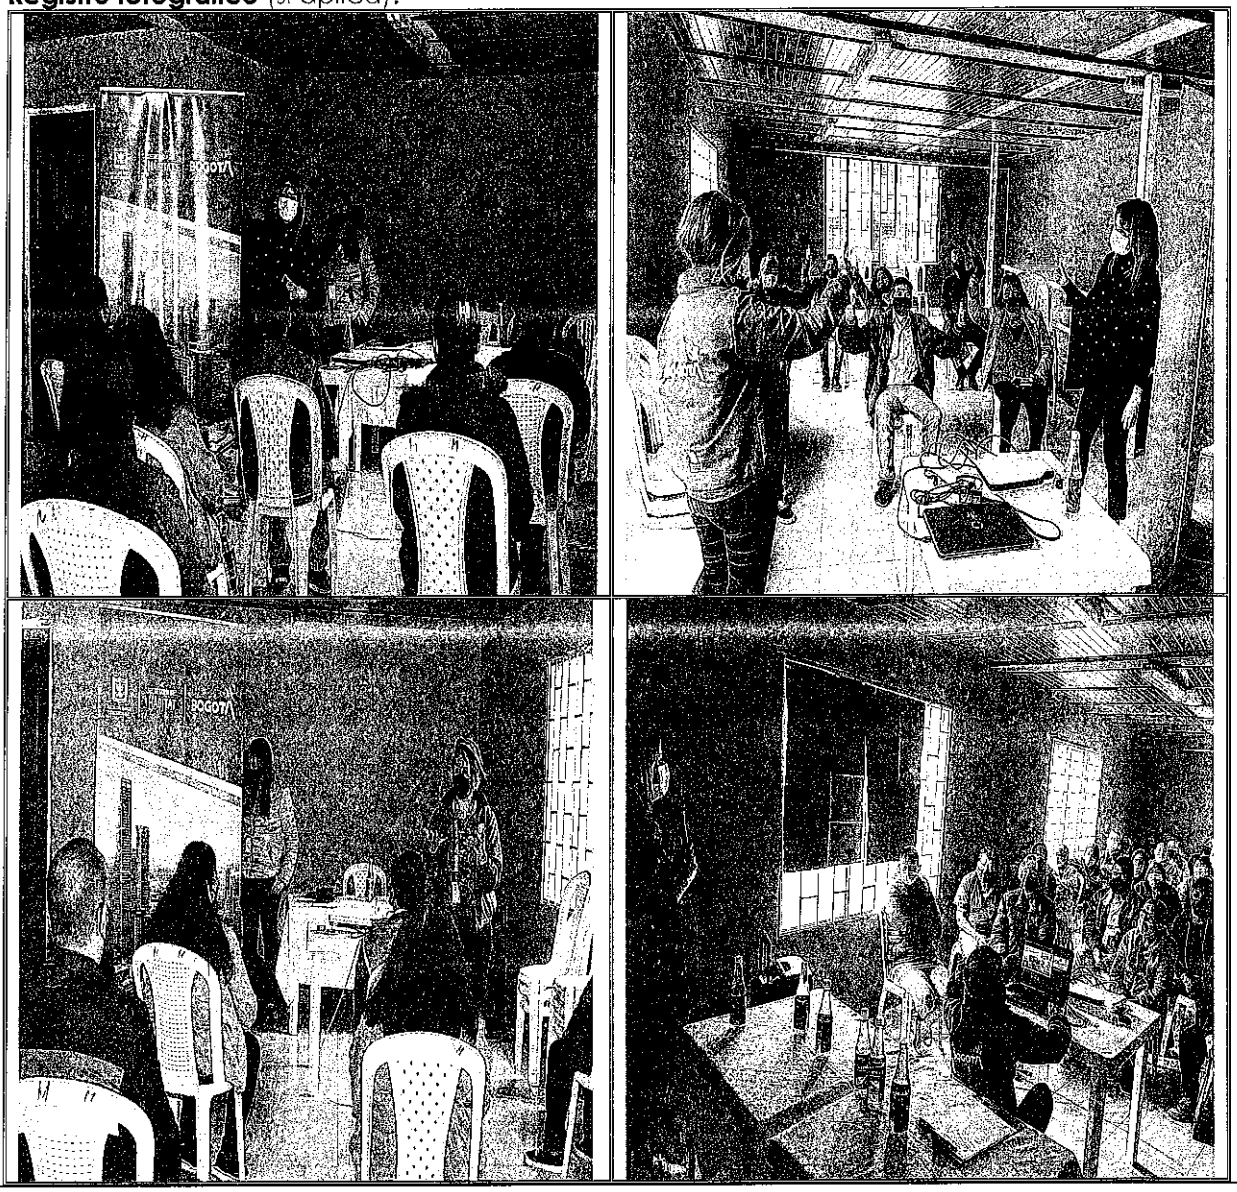

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Desarrollo etapa de Validación	Contratista de Obra Cto 795 de 2021 Ambientalmente Ingeniería SAS. Contratista de Interventoría Cto 798 de 2021 Construmarca SAS	De acuerdo con el cronograma Y programación.

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Stella Acevedo Beltrán	Líder Componente mejoramiento de vivienda Implementación Arquitecta Contratista	stella.acevedo@habitatbogota.gov.co	3114602950	
Carolina Posada	Arquitecta Contratista	diana.posada@habitatbogota.gov.co	3112415755	
Edwin Ulloa	Arquitecto Contratista	edwin.ulloa@habitatbogota.gov.co	3214956267	
Viviana Beltrán	Adm. Publica Contratista	leidy.beltran@habitatbogota.gov.co	3102023597	
Ma Isabel Serrano	T. Social Contratista	María.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	

Anexo:

ELABORÓ: María Isabel Serrano Piraquive
REVISÓ: Stella Acevedo
APROBÓ:

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 001

Fecha: 30 de agosto de 2021.	**Periodo:** Del 20 al 28 de agosto de 2021	**Informe No.:** Semanal No. 001
Proyecto: CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT GRUPO 1 Y 2-2021."		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 798 del 2021

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 del 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT GRUPO 1 Y 2-2021.
CONTRATISTA	Ambientalmente Ingeniería
PLAZO	5 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	20 de agosto del 2021
FECHA FINAL	4 de febrero del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

I. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. El día viernes 20 de agosto de 2021 en el hotel Viaggio ubicado en la calle 61 No. 7 -18 en la ciudad de Bogotá, se realizó la reunión de presentación de los funcionarios de la Secretaria Distrital del Hábitat y del proyecto de mejoramiento de vivienda contrato de obra 795 de 2021 por parte de la (SDHT) a las empresas contratistas y de interventoría que participaron en el proceso de licitación y fueron seleccionadas por la entidad, para realizar el proceso de ejecución de las obras en el caso de la empresa contratista y por parte de la interventoría el proceso de acompañar y garantizar que se cumpla en cada etapa del proyecto y principalmente con las especificaciones técnicas y de calidad que se requieren (contrato 798 de 2021).

   Secretaria Hábitat explica las generalidades del proyecto haciendo énfasis sobre los espacios o áreas priorizadas a intervenir en cada vivienda como lo son la cocina, baños y habitación del beneficiario. En dado caso que el beneficiario haya tenido la oportunidad de mejorar alguna de las áreas priorizadas entonces se revisaran otros espacios como el área social o las escaleras. Se recomendó por parte de la entidad distrital revisar muy bien por parte del área técnica casos donde se considere hacer cambio de cubiertas.

   Seguidamente la Secretaria Distrital del Hábitat, solicita a los asistentes se presenten iniciando por los representantes de los consorcios, directores de interventoría, directores de obra, coordinadores del área social contratista e interventoría y finalmente profesionales técnico y social que estarán en los territorios llevando a cabo las actividades programadas y de vigilancia en la garantía del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas durante el proceso de ejecución de las obras.

Se recuerda por parte de la SDHT a los asistentes el tiempo de ejecución del contrato (cinco meses y quince días), contados a partir del día 20 de agosto del presente año, el total de los predios a intervenir (310) y los territorios donde se ejecutarán las obras de mejoramiento de vivienda. Otro aspecto que se debe tener en cuenta para el proceso de ejecución es el tema de implementación de los protocolos de bioseguridad para las reuniones de inicio con la comunidad, para la fase de validación, fase de ejecución y la entrega a conformidad de las obras.

Finalmente se propone por parte de la SDHT un espacio para preguntas por parte de los asistentes, donde se aclaran dudas a los consorcios contratistas frente a la escases de materiales que se presenta por motivos de la pandemia y del paro que se presentó en Colombia en el primer semestre del año, de igual forma frente a las tonalidades que se van a utilizar para el enchape, la cenefa, el plan de manejo ambiental, las canecas para manejo de residuos sólidos y el manual de uso.

b. El día martes 24 de agosto de 2021 se realizó la reunión de inicio de obra del sector Jalisco en la cual se contó con la participación de 45 beneficiarios.

Se realizó el acercamiento al salón comunal del sector de Jalisco ubicado en el barrio Escala II en la dirección 18 M N° 61D-56 sur, los contratistas Ambientalmente Ingeniería toman listado de asistencia a los participantes de la reunión y son ubicados en las sillas del auditorio recalcando los protocolos de COVID.

Se inicia la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento de vivienda de la SDHT con los habitantes beneficiados del sector de Jalisco en la localidad de Cuidad Bolívar; Secretaria Distrital Hábitat lleva a cabo la presentación formal informando a los beneficiarios del objetivo, lineamientos del programa y de los beneficios, tiempo estimado para realizar las obras a cada vivienda. Se les explica el acompañamiento del contratista de obra e interventoría a la realización de las tres fases como lo son validación y la apropiación, ejecución de obras y el cierre del proyecto.

Se hace el enfoque a los usuarios de como son las normas de la selección en lo cual ellos están haciendo participen del proyecto y de los cuidados que deben tener al momento de recibir las obras por parte del contratista, también se hace la aclaración con respecto a cómo quedan establecidos algunos tonos de colores para los enchapes de pisos y tonos de paredes para no generar mayor especulación en la población y dar unificación al proyecto.

Así mismo se presenta el grupo de trabajo tanto de los contratistas a ejecutar e intervenir, donde cada uno habla con la comunidad y da las respectivas observaciones para lo que se les pide corresponsabilidad, colaboración, y respeto a la comunidad para que la obra no tenga mayor demora al momento de la ejecución.

Se nombra las generalidades del Punto de Atención a la Comunidad PAC, se contará con un espacio para conocer y resolver expectativas, dudas, inquietudes, quejas y demás generalidades para la comunidad, allí estarán el contratista además la interventoría (diferente PAC) para la atención a la población, se les dará a conocer a los habitantes de la comunidad en la primera fase en cada una de las viviendas ya que aún no se ha estipulado un lugar para ello.

Se realizan una ronda de preguntas por parte de la comunidad como lo son la calidad de los materiales, colores de la pintura y de los enchapes, horarios en los cuales se llevarán a cabo las obras, desarrollo de protocolo COVID; La secretaria distrital de hábitat realiza una oportuna respuesta y aclaración de

cada una de ellas.

Cabe resaltar la disposición de la comunidad es positiva, esto a que muchos de ellos manifiestan estar esperando este proyecto y sienten gran agrado por recibir un beneficio para lo cual mejorara la calidad de vida con sus mejoramientos de vivienda.

En este primer encuentro se contó con una asistencia aproximadamente del 90 % entre personas beneficiados; se hace entrega a cada asistente de un refrigerio al salir de la reunión cumpliendo con el protocolo de bioseguridad.

Se envió soportes de la realización de la reunión de inicio Jalisco.

c. Se realiza visita al salón comunal de manitas para la verificación de protocolos de COVID para la reunión que se realizara en Cuidad Bolívar – Habitarte.

d. Se visitó el sector para realizar la consecución del PAC de interventoría.

e. Se realizó el 27 de agosto del 2021, primera reunión de equipo administrativo del proyecto tanto interventoría y contratista.

f. Se envió a la SDHT el Plan de seguimiento y acompañamiento Social, para revisión y aprobación.

a. CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

No se realizaron caracterizaciones durante la semana

VALIDACIONES						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**

b. APERTURAS

No se realizaron aperturas durante la semana

APERTURAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**OBSERVACIONES**
1						
2						
3						

c. ATENCIÓN PQR

No se atendieron PQRS

PQR				
N.°	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1				
2				
3				

d. ENTREGAS

No se realizaron entregas durante el periodo.

ENTREGAS DE OBRA						
N.°	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**	**OBSEVACIONES**
1						
2						
3						
4						
5						
6						

e. HISTORIAS DE VIDA

No se realizaron caracterizaciones durante la semana

f. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

No se presentaron ninguna de las anteriores.

g. CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	0
Caracterizaciones	0
Aperturas	0
Cierres PQR	0
Entregas	0



II. PROGRAMACIÓN SEMANA SIGUIENTE

a. Se radicará el Plan de Acompañamiento Social en físico a la interventoría una vez sea aprobado.
b. Se radicará el Plan de Acompañamiento Social en físico del Contratista una vez sea aprobado.
c. Se enviará la metodología de las historias de vida a la interventoría, para revisión y aprobación.
d. Se realizará las cuatro (4) reuniones de inicio con los grupos de habitarte- Ciudad Bolívar el día 31 de agosto de 2021.
e. Se realizará la revisión para PAC del contratista.
f. Búsqueda de PAC de interventoría.
g. Se enviará la valla con la información actualizada del proyecto y el manual de marca establecida con la aprobación de interventoría.

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

Coordinadora social de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

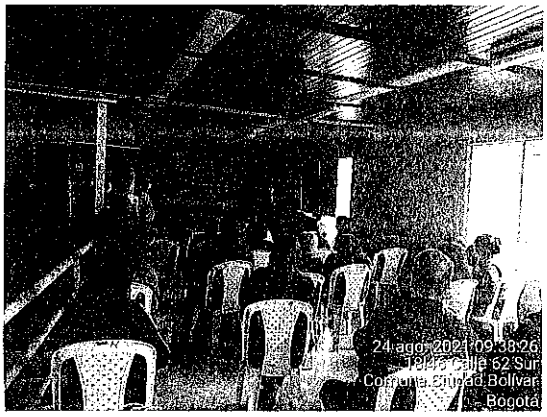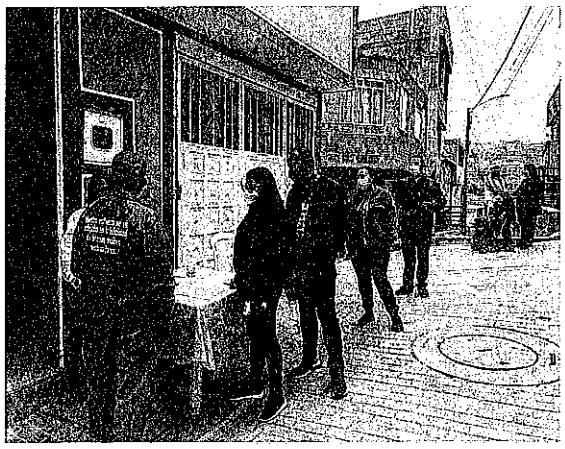	
Reunion de inicio, Jalisco martes 24 de Agosto del 2021	Reunion de inicio Jalisco martes 24 de Agosto del 2021
	
Reunion con contratista Viernes 27 de Agosto del 2021	Reunion de inicio Jalisco martes 24 de Agosto del 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día):	(Mes):	(Año):		
26	08	2021	10:00	12:00

CONVOCADO POR:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJEUCIÓN DE OBRAS - COMPONENTE SOCIAL

DIRECCIÓN: Secretaria Distrital de Hábitat Cl. 52 #13-64

OBJETIVO:

Brindar orientaciones y claridades respecto a la elaboración del Plan de Acompañamiento Social a los profesionales sociales Coordinadores del componente de los equipos de interventoría bajo contratos 797 y 798 de 2021 y contratistas de obra bajo contrato 794 y 795 de 2021.

TEMAS A TRATAR:

Apertura de la reunión
Presentación de las principales observaciones a los documentos remitidos.
Desarrollo de la reunión
Varios

DESARROLLO:

Se realiza la apertura del espacio, dando la bienvenida a los equipos de interventoría y contratistas de obra del contrato 797 y 798 de y 794 y 795 de 2021.

Posteriormente se realiza una retroalimentación de los documentos remitidos por algunos de los equipos; se señala que si bien los documentos se encuentra bien estructurados, y cuentan con un marco referencial robusto, y con un amplio contexto respecto a los principales componentes y fases de ejecución del programa claramente definidas y diferenciadas. Se hace necesario precisar de manera clara y detallada el planteamiento de estrategias de gestión y abordaje social, así como rutas de acción preventivas a posibles escenarios y riesgos que se puedan presentar en la ejecución de las obras.

Por lo que se procede a plantear posibles esenarios que puedan presentarse durante las diferentes etapas del programa, con el animo de identificar estrategias para cada caso, a partir de la experiencia en campo de los profesionales. A continuación, se presentan los principales esenarios identificados a travez de este ejercicio con el fin de generar las estrategias pertinentes para mitigarlas o resolverlas:

Fase de Validación -verificación

- ✓ Inconvenientes al contacto de la familia para informar inicio de obras y concertar fecha de visita de verificación

Fase de ejecución

- ✓ Cuidado de herramientas
- ✓ Materiales que se ingresan a la vivienda
- ✓ Cambio de personal
- ✓ Obstaculos al ingreso de la vivienda para el inicio y realización de la obra
- ✓ El beneficiario insiste en cambiar las obras definidas por los profesionales técnicos
- ✓ Atencion oportuna a las PQRS, se sugiere construir un flujograma con el fin de tener claridad respecto a la ruta de acción para dar respuesta oportuna a las PQRS
- ✓ Inseguridad en el territorio y estrategias de prevención y desarrollo de la ejecución de obras.

Fase de cierre de obras

- ✓ El beneficiario se niega a firmar a satisfacción el cierre de las obras pese a que se cumplió 100%


Se recomienda además de los mencionados el contratista puede añadir y desarrollar en el plan de acompañamiento socia, de los posibles escenarios que considera pertinentes a los anteriormente identificados asi como el desarrollo de la estrategia social a poner en marcha en cada caso.


Encuanto al tema de historias de vida se recomienda que los videos resultantes esten debidamente subtitulados para facilitar su entendimiento y buscando que se manejen un lenguaje inclusivo y manual de Marca del Distrito. Se sugiere enfatizar las historias de vida en territorios no trabajados anteriormente, con el objetivo de evidenciar el desarrollo del programa en otros terriorios.

Observaciones y/o conclusiones:

- ✓ Los documentos de acompañamiento y gestion social seran retroalimentados con las estrategias sociales planteadas para dar solucion a posibles esenarios que puedan desenvolverse durante la ejecución de las obras.

Registro fotográfico (si aplica):

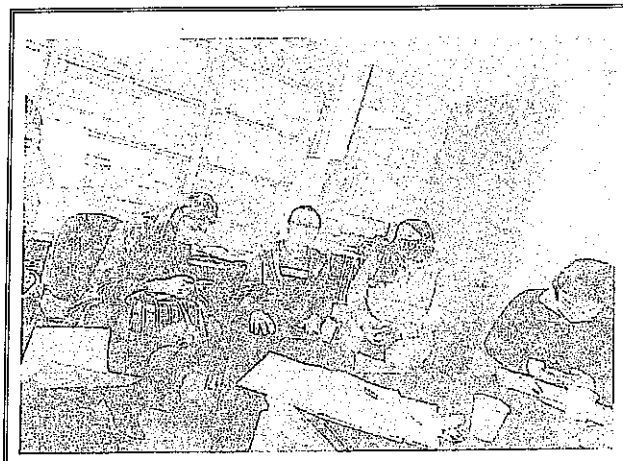

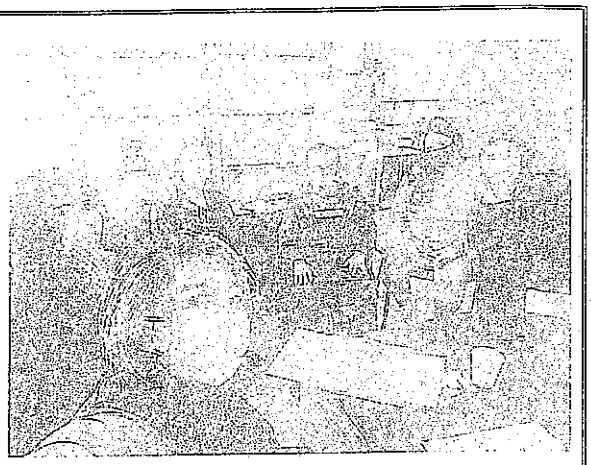

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Enviar listado de control de llamadas y listado de asistencia a la reunión.	Contratista grupo II Ambientalmente	26-08-21

Firman asistentes: Se anexa listado de asistencia

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA

Anexo: N/A

ELABORÓ: Viviana Beltrán
REVISÓ: Stella Avevedo
ABROBÓ: Stella Avevedo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Listado de asistencia

Tema: Reunión Comunidad Social - Contratistas obra - interventoría.
Fecha: 26 de Agosto 2021
Hora: 10:00 a.m.

No.	Nombre	Entidad - Área	Vinculación: Carrera Administrativa	Vinculación: Libre Nombramiento	Vinculación: Provisional	Vinculación: Contratista	Cargo: Director	Cargo: Asesor	Cargo: Profesional	Cargo: Aux Administrativo	Cargo: Técnico	Cargo: Conductor	Cargo: contratista	Genero: Masculino	Genero: Femenino	Genero: Otro	Identidad de Genero y/o orientación sexual: Heterosexual	Identidad de Genero y/o orientación sexual: Bisexual	Identidad de Genero y/o orientación sexual: Lesbiana	Identidad de Genero y/o orientación sexual: Transexual	Identidad de Genero y/o orientación sexual: Otro	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1.	Lina Estefanía Celeta	Construmarco				X			X						X		X					[illegible]	3144106[illegible]	Lina Celeta
2.	Diana Marcela Fraile	MPlanco S.A.S				X			X						X							Marcelafanor@hotmail.com	3142057545	Diana Fraile.
3.	Robert Bernardo Nava	Dr. Sefrico				X								X								[illegible]@gmail.com	3005560060	[illegible]
4.	Diana Lozano	Ambiental				X									X							[illegible] 2021	3208726810	[illegible]
5.	Viviana Beltrán	SDHT-Proy MV.				X			X						X							viviana.beltran@gmail.com / leidy.beltran@habitatbogota.gov.co	3102023599	[illegible]
6.	María Isabel Serrano	SDHT-SB-MV				X			X						X							maria.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	[illegible]

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT- para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
31	Agosto	2021	7:30 am	4:00 pm

CONVOCADO POR:	Contratista de Obra Cto 795 de 2021 Ambientalmente Ingeniería SAS. Contratista de Interventoría Cto 798 de 2021 Construmarca SAS. Secretaria Distrital del Hábitat -Mejoramiento de Vivienda
DIRECCIÓN:	KR 18 M61D 56 SUR Salón Comunal Barrio Nueva Colombia Sur TPM Transición – Habitarte 2019

OBJETIVO:

Informar aspectos generales para el desarrollo de la ejecución de las obras de los hogares beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda.

TEMAS A TRATAR:

Desarrollo metodológico agenda.

DESARROLLO:

Se desarrollo reunión de inicio con los Hogares beneficiarios de mejoramiento de vivienda que asistieron desarrollando la siguiente metodología de acuerdo aforo prevención COVID -19 se desarrolla así:

Desarrollo de actividades reunión N° 1

Actividad	Descripción	Responsable	Insumos
7:50-8:30 am- ingreso a los beneficiarios(as).	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón siguiendo el protocolo COVID.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
8:31- 8:45 am - saludo y bienvenida.	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
8:46-9:20 am desarrollo de la reunión.	***informar las generalidades y etapas del proyecto.***	SDHT	presentación, video beam, sonido.
9:21-9:40 am inquietudes de la comunidad	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
9:41 - 10:00 am despedida y entrega de refrigerios	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Desarrollo de actividades reunión N° 2

actividad	descripción	responsable	insumos
10:00-10:30 am- ingreso a los beneficiarios(as).	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón siguiendo el protocolo COVID.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
10:31- 10:45 am - saludo y bienvenida.	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
10:46-11:20 am -desarrollo de la reunión.	***informar las generalidades y etapas del proyecto.***	SDHT	presentación, video beam, sonido.
11:21-11:40 am -inquietudes de la comunidad	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
11:41 - 12:00 m despedida y entrega de refrigerios	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Desarrollo de actividades reunión N° 3

actividad	descripción	responsable	insumos
12:30-1:00 pm- ingreso a los beneficiarios(as).	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón siguiendo el protocolo COVID.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
1:00 - 1:15 pm - saludo y bienvenida.	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
1:16-1:45 pm -desarrollo de la reunión.	***informar las generalidades y etapas del proyecto.***	SDHT	presentación, video beam, sonido.
1:46-2:15 pm -inquietudes de la comunidad	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
2:16 - 2:30 pm despedida y entrega de refrigerios	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Desarrollo de actividades reunión N° 4

actividad	descripción	responsable	insumos
2:30-3:00 pm- ingreso a los beneficiarios(as).	verificación de datos de los beneficiarios e ingreso al salón siguiendo el protocolo COVID.	contratista con apoyo de interventoría	listados recurso humano
3:00 - 3:15 pm - saludo y bienvenida.	presentar a las entidades participantes y a sus integrantes. dar a conocer el objeto del contrato.	SDHT	presentación, video beam, sonido.

3:16-3:45 pm -desarrollo de la reunión.	***Informar las generalidades y etapas del proyecto.***	SDHT	presentación, video beam, sonido.
3:46-4:15 pm -inquietudes de la comunidad	dar la palabra a los beneficiarios para conocer sus inquietudes y generar respuestas a las mismas.	SDHT	presentación, video beam, sonido.
4:16 - 4:30 pm despedida y entrega de refrigerios	agradecimientos, salida y entrega de refrigerios.	SDHT, contratista e interventoría	recurso humano.

Durante La reunión la SDHT desarrollo los siguientes puntos como agenda de socialización.

1. Normativa
2. Objetivo programa de Mejoramiento de vivienda
3. Generalidades Subsidio – Modalidad de habitabilidad
4. Etapas metodológicas desarrollo mejoramiento de vivienda
5. Participantes – presentación (contratista de obra, interventoría)
6. TPM priorizado, mejoramientos a ejecutar, población a beneficiar e inversión
7. Proceso de ejecución
8. Reglamento operativo- obligaciones del Hogar
9. Recomendaciones a tener en cuenta – Valores agregado
10. Espacio de interlocución con hogares (preguntas y respuestas)

Observaciones y/o conclusiones:

Contratista de Obra Cto 795 de 2021 desarrollo convocatoria a reunión de inicio de 209 Hogares de los cuales:


209 hogares convocados telefónicamente y/o notificados por correo certificado identificando **23 hogares No asistiendo** pese a ser informados.

Para un **total de 186 Hogares** beneficiarios del TPM Transición Habitarte 2019 que asistieron a la reunión de Inicio.

Se publica en redes sociales

Iniciamos la ejecución de 209 subsidios de mejoramiento de vivienda en los barrios: Manitas, Juan Pablo II, Marandú, Mirador Nutivara, Nueva Colombia y Villas del Diamante en Ciudad Bolívar. ¡Haremos una inversión de $3.400 millones que beneficiarán a 668 ciudadanos!

Registro fotográfico (si aplica):

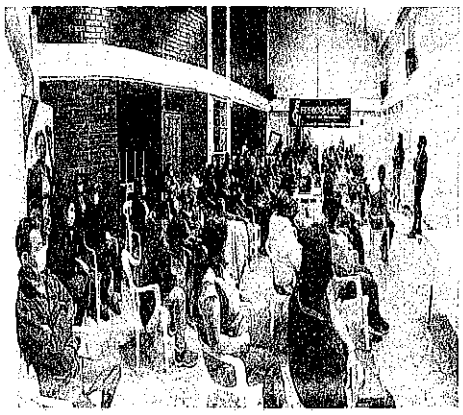







Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Desarrollo etapa de Validación	Contratista de Obra Cto 795 de 2021 Ambientalmente Ingeniería SAS. Contratista de Interventoría Cto 798 de 2021 Construmarca SAS	De acuerdo con el cronograma Y programación.

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Stella Acevedo Beltrán	Lider Componente mejoramiento de vivienda implementación Arquitecta Contratista	stella.acevedo@habitatbogota.gov.co	3114602950	
Carolina Posada	Arquitecta Contratista	diana.posada@habitatbogota.gov.co	3112415755	
Ma Isabel Serrano	Trabajadora. Social Contratista	María.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	

Anexo:

ELABORÓ: María Isabel Serrano Piraquive
REVISÓ: Stella Acevedo
APROBÓ:
