BE CONSTRUYE S.I.E.S.

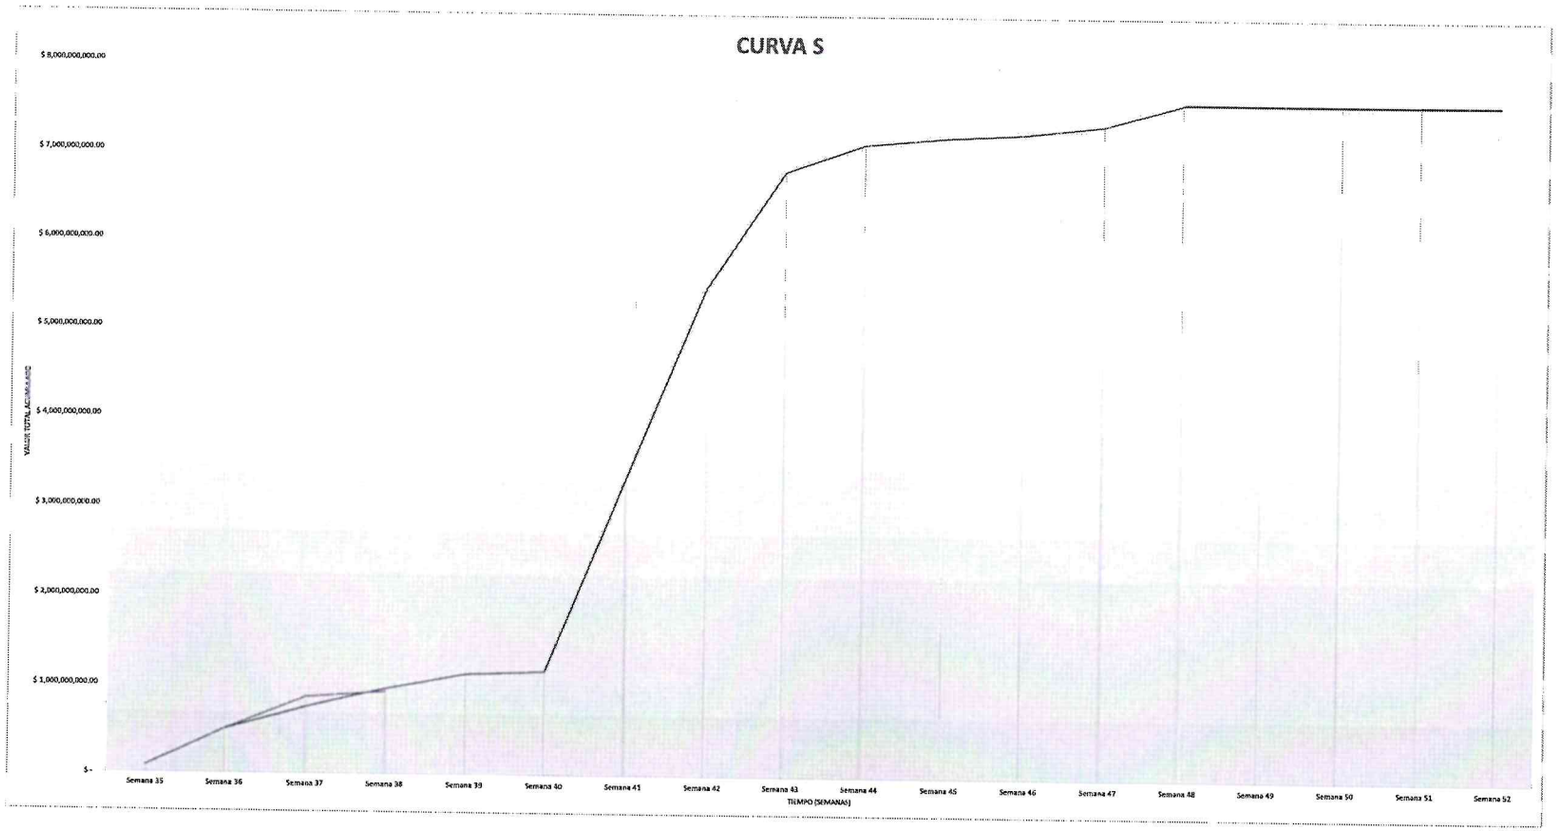
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	2021																		Total general
OBRAS PRELIMINARES	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	
NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	$ 1,522,046.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 7,610,231.25	$ 6,088,185.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,881,850.00
EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	$ 3,719,649.36	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 18,598,246.80	$ 14,878,597.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185,982,468.00
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	$ 1,432,348.87	$ 7,161,744.33	$ 7,161,744.33	$ 5,729,395.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,485,233.00
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO																			
P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	$ 25,977,875.10	$ 129,889,375.50	$ 129,889,375.50	$ 129,889,375.50	$ 103,911,500.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 519,557,502.00
P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,855,633.20	$ 39,278,166.00	$ 39,278,166.00	$ 31,422,532.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 117,834,498.00
BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,996,708.80	$ 3,745,886.00	$ 3,745,886.00	$ 749,177.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,237,658.00
BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,162,953.07	$ 10,203,691.33	$ 10,203,691.33	$ 2,040,738.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,611,074.00
P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS,INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARADOVELAS, JUNTA E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 470,966,126.40	$ 588,707,658.00	$ 588,707,658.00	$ 117,741,531.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,766,122,974.00
PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYEPASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTAEN SILI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,370,666.67	$ 46,713,333.33	$ 46,713,333.33	$ 9,342,666.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140,140,000.00
P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,684,393.87	$ 39,605,492.33	$ 39,605,492.33	$ 7,921,098.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118,816,477.00
P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,694,485.60	$ 75,868,107.00	$ 75,868,107.00	$ 15,173,621.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 227,604,321.00
B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,944,497.33	$ 6,180,621.67	$ 6,180,621.67	$ 1,236,124.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,541,865.00
PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86,159,486.00	$ 107,699,357.50	$ 21,539,871.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 215,398,715.00
PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 492,832,382.40	$ 616,040,478.00	$ 123,208,095.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,232,080,956.00
RELLENO EN MATERIAL DE BASE (E) COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,388,508.40	$ 19,235,635.50	$ 3,847,127.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,471,271.00
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,873,971.20	$ 13,592,464.00	$ 2,718,492.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,184,928.00
P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 276,394,256.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 276,394,256.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,056,830.72	$ 5,284,153.60	$ 5,284,153.60	$ 5,284,153.60	$ 5,284,153.60	$ 4,227,322.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,420,768.00
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 174,658.08	$ 218,322.60	$ 218,322.60	$ 218,322.60	$ 218,322.60	$ 43,664.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,091,613.00
ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204,339.73	$ 255,424.67	$ 255,424.67	$ 51,084.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 766,274.00
P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO ENARENA GRUESA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,272,540.57	$ 9,954,405.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,226,946.00
P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKAPVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,877,800.00	$ 8,597,250.00	$ 8,597,250.00	$ 8,597,250.00	$ 1,719,450.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,389,000.00
P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,539,123.40	$ 8,173,904.25	$ 8,173,904.25	$ 8,173,904.25	$ 1,634,780.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,695,617.00
REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,182,157.71	$ 14,386,618.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,568,776.00
P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,327,271.43	$ 995,453.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,322,725.00
P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300,204.27	$ 375,255.33	$ 375,255.33	$ 75,051.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,125,766.00
P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28,397,926.40	$ 35,497,408.00	$ 35,497,408.00	$ 7,099,481.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106,492,224.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,583,552.00	$ 4,145,888.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,729,440.00
P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERÍA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 845,960.57	$ 634,470.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,480,431.00

BE CONSTRUYE S.I.C.S.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	2021																			Total general
	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52		
TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E =0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCOEN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,391,008.80	$ 847,752.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 4,238,761.00
REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,099,419.20	$ 8,774,854.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 43,874,274.00
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL																				
DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42,649.80	$ 213,249.00	$ 213,249.00	$ 170,599.20	$ -	$ -	$ -	$	$ 639,747.00
SEÑALIZACION INSTITUCIONAL																				
P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	$ 137,028.20	$ 685,141.00	$ 685,141.00	$ 548,112.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 2,055,423.00
P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	$ 78,706.60	$ 393,533.00	$ 393,533.00	$ 314,826.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 1,180,599.00
PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	$ 193,079.53	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$	$ 16,604,839.92
FRENTE DE SEGURIDAD																				
P. B. O SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	$ 2,170,739.57	$ 10,853,697.86	$ 2,170,739.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 15,195,177.00
PROVISIONES																				
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 6,040,915.71	$ 30,204,578.57	$ 6,040,915.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 42,286,409.99
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	$ 6,040,915.71	$ 30,204,578.57	$ 6,040,915.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 42,286,409.99
REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	$ 16,101,103.57	$ 80,505,517.86	$ 16,101,103.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 112,707,725.00
OBRAS (ABA REPOSICION DE TUBERIAS																				
SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,164,796.00	$ 2,911,990.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 4,076,786.00
SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 868,925.43	$ 2,172,313.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 3,041,239.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,897,391.14	$ 24,743,477.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 34,640,869.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,810,829.14	$ 14,527,072.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 20,337,902.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,428,608.86	$ 11,071,522.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 15,500,131.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710,525.43	$ 1,776,313.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 2,486,839.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,364,401.71	$ 13,411,004.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 18,775,406.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,078,664.00	$ 25,196,660.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 35,275,324.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,801,273.71	$ 17,003,184.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 23,804,458.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,528,437.43	$ 13,821,093.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 19,349,531.00
P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13,043,737.43	$ 32,609,343.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 45,653,081.00
P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,997,158.29	$ 17,492,895.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 24,490,054.00
P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,304,661.71	$ 15,761,654.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 22,066,316.00
COSTO DIRECTO	$ 63,414,408.47	$ 317,072,042.41	$ 195,657,344.11	$ 163,655,585.89	$ 131,085,376.12	$ 27,173,875.72	$ 1,658,895,104.34	$ 1,652,907,761.55	$ 1,014,247,557.78	$ 242,546,016.46	$ 63,978,858.16	$ 36,701,567.67	$ 78,178,056.95	$ 193,677,172.39	$ 1,135,996.87	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$ 965,397.67	$	$ 5,843,222,928.00
COSTOS INDIRECTOS (30%)	$ 19,024,323.00	$ 95,121,613.00	$ 58,697,203.00	$ 49,096,676.00	$ 39,325,613.00	$ 8,152,163.00	$ 497,668,531.00	$ 495,872,328.00	$ 304,274,267.00	$ 72,763,805.00	$ 19,193,660.00	$ 11,010,470.00	$ 23,453,417.00	$ 58,103,152.00	$ 340,799.00	$ 289,619.00	$ 289,619.00	$ 289,619.00	$	$ 1,752,966,878.00
COSTO TOTAL	$ 82,438,731.47	$ 412,193,655.41	$ 254,354,547.11	$ 212,752,261.89	$ 170,410,989.12	$ 35,326,038.72	$ 2,156,563,635.34	$ 2,148,780,089.55	$ 1,318,521,824.78	$ 315,309,821.46	$ 83,172,528.16	$ 47,712,037.67	$ 101,631,473.95	$ 251,780,324.39	$ 1,476,795.87	$ 1,255,016.67	$ 1,255,016.67	$ 1,255,016.67	$	$ 7,596,189,806.00
COSTO ACUMULADO	$ 82,438,731.47	$ 494,632,386.88	$ 748,986,933.99	$ 961,739,195.88	$ 1,132,150,185.00	$ 1,167,476,223.72	$ 3,324,039,859.06	$ 5,472,819,948.61	$ 6,791,341,773.39	$ 7,106,651,594.85	$ 7,183,824,123.01	$ 7,237,536,160.68	$ 7,339,167,634.63	$ 7,590,947,959.02	$ 7,592,424,754.89	$ 7,593,679,771.56	$ 7,594,934,788.23	$ 7,596,189,804.90		
EJECUTADO	$ 83,500,731.00	$ 495,030,056.00	$ 861,342,589.00	$ 927,734,267.00																


CURVA S
$ 8,000,000,000.00
$ 7,000,000,000.00
$ 6,000,000,000.00
$ 5,000,000,000.00
$ 4,000,000,000.00
$ 3,000,000,000.00
$ 2,000,000,000.00
$ 1,000,000,000.00
$ -
Semana 35
Semana 36
Semana 37
Semana 38
Semana 39
Semana 40
Semana 41
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Semana 51
Semana 52
TIEMPO (SEMANAS)
