ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORME DE INTERVENTORÍA-ACTA NUMERO N° 2

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA

La Jagua de Ibírico, 16 de noviembre de 2021.

Doctor
OSMAN RAFAEL MARTINEZ MURCIA
Secretario de Tránsito y transporte Municipal
Alcaldía la Jagua de Ibirico.

EL PUEB
PRIMEF
OVELIO JIMÉNEZ MACHA
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDÍA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

CERTIFICACIÓN PORCENTUAL Y FINANCIERO DE LA OBRA


Esta interventoría aprueba un avance acumulado de la obra del 97,75%, del proyecto **OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR,** a la fecha de la presente certificación en actividades: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE, ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS, PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS A TRES MANOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE SISTEMA DETECCIÓN SEDES SEC. TRANSITO YTERMINAL DE TRANSPORTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN ALMUNIO Y VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA LÓGICA DOBLE PARA VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADA. TROQUEL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6 A, SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RU, SUMINISTRO DE SWITCH L3 24 PTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY 6A, S/FTP, LSZH, 2M. TR -VER ANEXO, SUMINISTRO DE SWITCH L2 24 POE 1 GB, SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD RJ45, CATEGORY, 6A, S/FTP, LSZH, 3M. WA -VER ANEXO, SUMINISTRO DE ACCESS POINT, SUMINISTRO DE NVR32CH, SUMINISTRO DE MONITOR 42" - VER ANEXO TECNICO, SUMINISTRO DE CAMARA IP DOMO - VER ANEXO TECNICO, SUMINISTRO DE CÁMARA IP BALA, SUMINISTRO DE PC AIO I5 3,2 GHZ, SUMINISTRO DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE FIRE WALL SEGURIDAD SINCRONIZADA INTEGRADA,

A continuación se anexa cuadro de porcentaje programado y ejecutado para la obra en ejecución.

COMPARACIÓNDE COSTOS ACUMULADOS EN % INCLUYE AIU E IVA				
periodo en ejecución	**programado financiero**	**% programado**	**ejecutado financiero**	**% ejecutado**
sep 14 a sep 21	277.425.461,48	28,78%	336.557.935,87	34,91%
sep 22 a sep 28	476.458.501,50	49,43%	424.268.624,77	44,01%
sep 29 a oct 6	544.930.439,10	56,53%	516.542.288,27	53,58%
oct 6 a oct 13	568.337.396,91	58,96%	540.151.731,14	56,03%
oct 14 a oct 20	589.661.625,89	61,17%	598.183.305,52	62,05%
oct 21 a oct 27	611.869.520,78	63,47%	618.777.494,28	64,19%
oct 28 a nov 3	622.726.330,38	64,60%	633.410.585,48	65,71%
nov 4 a nov 10	646.399.023,58	67,06%	942.290.178,93	97,75%


EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO

ALCALDIA DE
LA JAGUA DE IBIRICO

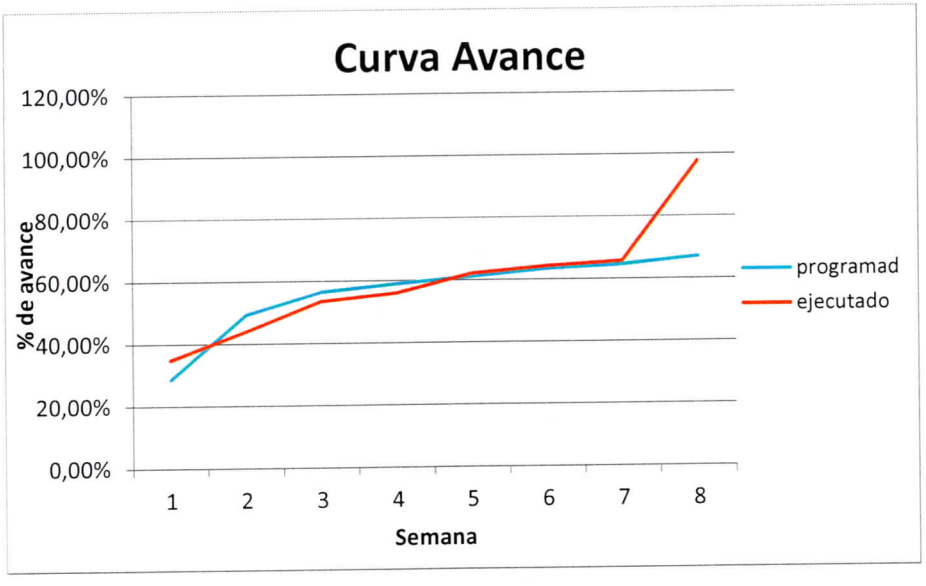

Gráficamente se observa que el contratista ha tenido en la última semana un avance muy significativo, debido a que entrega a totalidad de equipos electrónicos que integran el proyecto, y que están incluidos en el contrato.

AVANCE FIANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA ACTA No. 002

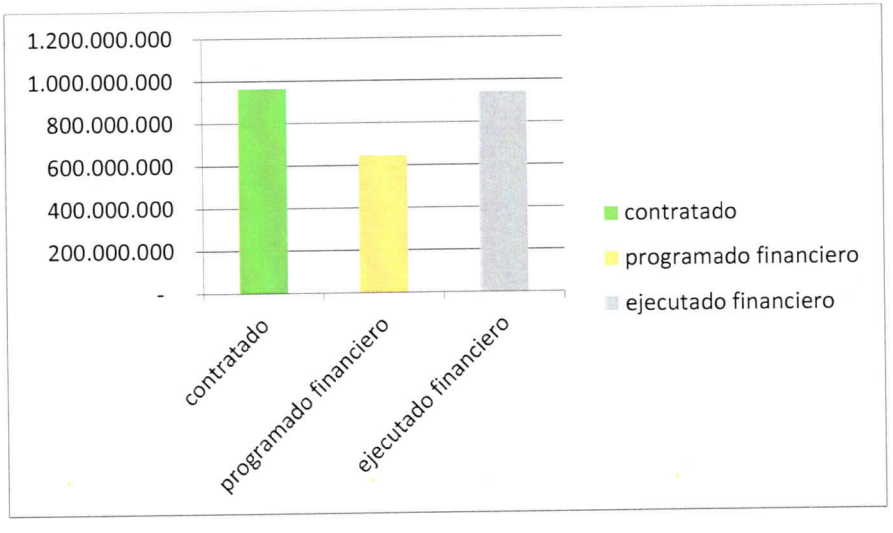

Dado en La Jagua de Ibirico, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2021

MIGUEL ÁNGEL CASTILLA CALVO
Interventor
Representante legal CONSORCO INTER CIS

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
