INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 05 de Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA	CONTRATO No.	270-2021	No. PROCESO EN EL SECOP II	SA -042-2021 HOMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
270-2021	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV-QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS.	**Fecha de suscripción: 27 de agosto de 2021**
		Valor inicial $ 140.515.200.00 M/CTE
		Valor Total $ 140.515.200.00 M/CTE
		Registro Presupuestal SIIF No. 285721 **Fecha: 01-09-2021** **CDP No. 74921**
		Garantía No.: RESP. No. CV-100004060 – CUMPLIMIENTO No. CV-100016027
		Aseguradora: CIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
		Fecha de aprobación de la Garantía: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
		Fecha de la notificación del Supervisor: 14-09-2021
		Fecha del Acta de Inicio 15DE SEPTIEMBRE DE 2021
		Plazo de ejecución del Contrato: El plazo de ejecución será (60) días calendario – contados a partir del perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007).
		Vigencia del contrato: La vigencia será igual al plazo de ejecución y Seis (6) meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		**NIT/C.C.: 900.960.149-1**
		Dirección: CARRERA 25 NO. 37-33 - BOGOTÁ
		Teléfono: 3183696612 – 031-3583967
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S		**Cuenta Bancaria No. 005624432** **Banco: BANCO AV VILLAS** **Clase de Cuenta Ahorros X Corriente**

Forma de pago:

El valor del contrato que llegaré a suscribirse se cancelará mediante dos (2) pagos parciales de la siguiente manera: PRIMER PAGO por el 50% del valor del contrato, contra avance de ejecución del mismo del 50%, previo recibo a satisfacción e informe por parte del supervisor del contrato. SEGUNDO PAGO FINAL por el 50% del valor del contrato, contra avance del 100% de ejecución del mismo, previo recibo a satisfacción e informe por parte del supervisor del contrato. Todos los pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a

satisfacción la obra objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: 1. Factura electrónica validada previamente por la DIAN, cargada en el Sistema SIIF Nación.
2. Certificado de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente 3. Acta de Recibo a parcial y /o informe final del supervisor del contrato, debidamente diligenciado y firmado por las partes, con los debidos soportes técnicos.

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
De acuerdo a las obligaciones del contratista INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS – Contrato 270-2021 se relaciona las actividades ejecutadas dentro del avance a la fecha: La impermeabilización de la plazoleta HOMIL se encuentra en el proceso final que comprende la ejecución de confinamiento externo, para un avance del 95%. La rehabilitación del pompeyano presenta un avance del 20% que corresponde a las actividades de escarificación de placa y colocación de malla electrosoldada anclada con pernos de ¼" y aditivos. En el sector correspondiente a la cubierta de acceso Fe en la Causa se adelantaron actividades de desmonte de la cubierta de policarbonato y se realizó el mantenimiento a la estructura metálica mediante lijado y aplicación de anticorrosivo con un avance 40%. Se presentaron los diseños de la cubierta de la entrada principal siendo aprobados por el supervisor del contrato. El avance contractual es del 50,63%, presentando un retraso del 13,6%, generado por el mayor tiempo empleado en la instalación del adoquín, actividad afectada por las precipitaciones pluviométricas acaecidas durante su ejecución.	INTC - 16	29/10/2021	Certificación de pago parafiscales Planilla de pago Certificación Bancaria Rut Autorización de numeración de Facturación Informe No. 1 de supervisión.	$ 70.257.600.00
Saldo del contrato				**$ 70.257.600,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($ 70.257.600.00) SETENTA MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de octubre de 2021 de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la)

contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

_____

_____

_____

_____

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SARGENTO SEGUNDO REYNEL ESTIVEN MORA ALFONSO
NUMERO DE CÉDULA: 1.106.395.065
FIRMA: 

INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.

NIT: 900960149-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 25 # 37 - 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3583967

Email. intecpys@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764020231067 válida desde 2021-10-27 hasta 2022-10-27 rango desde INTC-16 hasta INTC-500.

Actividad Económica No. 3314/4321/4330/7020 TARIFA ICA 0.69 X 1000

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT:	830040256-0
Dirección:	TV 3 49 02, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	29/11/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**INTC - 16**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:33:41**
FECHA FIRMADO:	**29/10/2021 22:33:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	10	2021	29	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45220000-5	Obras de ingeniería y trabajos de construcción MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA ENPOLICARBONATO DELEDIFICIO FE EN LA CAUSA -ARREGLO DE GOTERAS EIMPERMEABILIZACIÓN ACCESOPARQUEADEROS BAJO PLAZOLETAE INSTALACIÓN DEMARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUECUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS 50%	WSD	1,00	$57.120.000,00		0,00	$57.120.000,00
2	AIU 1	ADMINISTRACION CONTRATO POR SERVICIOS DE AIU PORCONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA ENPOLICARBONATO DELEDIFICIO FE EN LA CAUSA -ARREGLO DE GOTERAS EIMPERMEABILIZACIÓN ACCESOPARQUEADEROS BAJO PLAZOLETAE INSTALACIÓN DEMARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUECUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREASCORRESPONDIENTE AL 17%	EA	1,00	$9.710.400,00		0,00	$9.710.400,00
3	AIU 2	IMPREVISTOS CORRESPONDIENTE AL 1%	EA	1,00	$571.200,00		0,00	$571.200,00
4	AIU 3	UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL 5%	EA	1,00	$2.400.000,00	19,00	0,00	$2.400.000,00

Notas:
#$15-19-00;Contrato270-2021;jchavez@homil.gov.co#$

SON: (setenta millones doscientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos)

CUFE: 5e7481bd52d26e6dbffda0ca7633a3b59f832436d8f9690b36caf29f24f1b33c46ee629ef97726abe146de464ce2946f

Subtotal:	$69.801.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$456.000,00
Total:	$70.257.600,00

1106395065.

5/11/21

Firma Digital: Unqdh0/7OFFt5WEs3ROIPTqdaFsHHv8EqkQNzKiD6e+Jdu1D8U5waif9oySV4yFJEpUITKUMMgpruC4rjORJ7puKJvhXps/YU38bu6/24p+yqv0P3/SCdoNuTR0YbtKLsKyEe5RUtfPV7aHhrKJ++D1/7/DKXiSLWMgkR4YSEloHM83XB60DbLp50gK20CrLLZcny2FITxxbmVZ7uTHmkcSX5i4SlRcdHBcuhtHcfRQwAwi3eZY+tLv/flWHwnvEmosS6t3sAhWkeG23SSwJtvxua0FuVtbKgNt/JBsgeu8pGcTO95VXY8mDy2u20MjDf6NWJ7/GrDWp/fGSD0nA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.400.000,00	19,00%	$456.000,00

Firma Digital: Unqdh0/7OFFt5WEs3POlPTqdaFsHHv8EqkQNzKlD6e+jfdufD8U5waif9oySV4yFJEpUlTKUMMgpruC4rjORJ7puKJvhXps/YU38bu6/24p+yqv0P3/
SCdoNuTR0YbtKLsKyEe5RUtfPV7aHhrKJ++D1/7/DKXiSLWMgjLR4YSE1oHM83XB60DbLp50gK20CrLLZcny2FITxxbmVZ7uTHmkcSX5i4SlRcdHBcu
htHcfRQwAwi3eZY+tLv/flWHwnvEmosS6c3sAhWkeG23SSwJtvxua0FuVtbKgNt/JBsgeu8pGcTO95VXY8mDy2u20iMjDf6NWU7/GrDWp/lGSD0nA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14716505443

(415)7707212489984(8020) 000001471650544 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 0 1 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 25 37 33

42. Correo electrónico intecpys@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 8 3 9 6 7	3 1 8 3 6 9 6 6 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 1 6 0 4 1 4	4 3 2 1	2 0 1 6 0 4 1 4	4 6 6 3 / 3 3 1 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 11 / 19 : 57: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NOVOA TOBON JUAN MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14716505443

(415)7707212489984(8020) 000001471650544 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 0 1 4 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 4 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 4 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 7 5 8 3 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 4 1 3	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 4 1 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14716505443

(415)7707212489984(8020) 000001471650544 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 0 1 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 2 4 9 3 3 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NOVOA	TOBON	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 2 9 4 8 8 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NOVOA	TOBON	ELKIN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 2 1 8 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	REYES	MARLON	ROLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS identificado con el documento No. 900.960.149

posee en la oficina RESTREPO (005) una cuenta de ahorros

No. 005624432 desde el 28 de Abril de 2016

Se expide a los 18 dias del mes de Octubre de 2021

Atentamente,

VISADO

Gerente Oficina Bogota Soledad

Esta certificación tiene un costo de $ 9.500,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP.IM1-119-V1

F-36-403-1

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo Elkin Andrés Novoa Tobón identificado (a) con c.c. 1.022.948.852 de Bogotá D.C. en calidad de Representante Legal de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en Bogotá D.C. a los 29 días del mes de octubre de 2021



Elkin Andrés Novoa Tobón
C.C.1.022.948.852 de Bogotá D.C.
Representante Legal
INTEC Proyectos y Servicios S.A.S
Nit: 900.960.149-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900960149	1	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTEC PYS	Cra 25 # 37-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1192905682	9426763973	E	2021/11/11	2021/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$116,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTEC PYS (2 Afiliados)						$375,700	$60,200			$375,700	$15,200			$375,700	$15,200			$375,700	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: INTEC PYS (2 Afiliados)						$375,700	$60,200			$375,700	$15,200			$375,700	$15,200			$375,700	$26,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$375,700	$60,200			$375,700	$15,200			$375,700	$15,200			$375,700	$26,200		$0	$0
1	CC	1016021807	GUTIERREZ MARLON	231001	6	$187,850	$30,100	EPS005	6	$187,850	$7,600	CCF24	6	$187,850	$7,600	14-11	6	$187,850	$13,100	6	$0	$0
2	CC	1032493382	NOVOA JUAN	230301	6	$187,850	$30,100	EPS002	6	$187,850	$7,600	CCF24	6	$187,850	$7,600	14-11	6	$187,850	$13,100	6	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$375,700	$60,200			$375,700	$15,200			$375,700	$15,200			$375,700	$26,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900960149	1	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTEC PYS	Cra 25 # 37-33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3583967	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1192905682	9426763973	E	2021/11/11	2021/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$116,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$60,200	$0	$0	$60,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$30,100	$0	$0	$30,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$30,100	$0	$0	$30,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$26,200	$0	$0	$26,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$26,200	$0	$0	$26,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,200	$0	$0	$15,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$15,200	$0	$0	$15,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$15,200	$0	$0	$15,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$7,600	$0	$0	$7,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$7,600	$0	$0	$7,600
TOTAL				**2**	**$116,800**	**$0**	**$0**	**$116,800**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S
Nit: 900.960.149-1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02675830
Fecha de matrícula: 14 de abril de 2016
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 25 37 33
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: intecpys@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3583967
Teléfono comercial 2: 3183696612
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 25 37 33
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: intecpys@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3583967
Teléfono para notificación 2: 3183696612
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. SIN NUM del 13 de abril de 2016 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de abril de 2016, con el No. 02093427 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad, consiste en general: a. Prestación de servicios especializados tales como consultoría, interventoría, auditoria, asesoría, desarrollo de estudios técnicos, integración de sistemas, diseño, planeación, instalación, montaje, capacitación, evaluación, organización, gerencia y gestión de proyectos, operación, administración, investigación, construcción, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de sistemas en las aéreas de ingeniería eléctrica, de sistemas, mecánica, civil, ambiental, sanitaria, catastral, geodésica, topográfica, transportes, vial, química, de petróleos, así mismo en las aéreas de arquitectura y urbanismo. B. Diseño, construcción, adecuación, rehabilitación y remodelación de edificios y obras de ingeniería civil, prestación de servicios especializados tales como interventoría, auditoria, desarrollo de estudios técnicos, integración de sistemas, diseño, planeación, instalación, montaje, evaluación, organización, gerencia y gestión de proyectos, operación, administración, investigación, construcción, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de equipos y sistemas en las aéreas de ingeniería electrónica, eléctrica, mecánica, civil, ambiental, sanitaria. C. Construcción, fabricación, alquiler y arrendamiento, remodelación, rehabilitación, mantenimiento, montaje y desarrollo de obras, redes, sistemas o instalaciones de tipo industrial, comercial, residencial, institucional, militar, portuario y de infraestructura. D. Desarrollo, explotación, montaje instalación, mantenimiento,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

comercialización, distribución, importación y exportación, fabricación de parques infantiles, zona de multi juegos, estructuras didácticas, parques acuáticos, parque biosaludables, mobiliario urbano, zonas de recreo, gimnasio al aire libre, equipos de gimnasio, de rehabilitación, de entretenimiento, de deportes y de fisioterapia, sus partes y equipos, y accesorios y de mas estructuras y obras requeridas para su correcto funcionamiento d. Ejecución de proyectos referentes a movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, construcción de terraplenes, vías, pistas, andenes, taludes, demoliciones; transporte y disposición de materiales granulares, pétreos, biosolido, escombro y material proveniente de excavaciones; explotación de minerales y material de cantera, alquiler de maquinaria pesada para el desarrollo de trabajos similares. Mantenimiento, construcción, ampliación, remodelación y rehabilitación de vías urbanas y rurales, con sus obras de urbanismo y obras de arte asociadas. F. Suministro, compra, venta, alquiler, arrendamiento, transporte, exportación, importación, explotación, exploración, manufactura y en general comercialización de todo tipo de equipos, productos, sistemas, elementos didácticos, materiales, minerales, recursos naturales, maquinaria, piezas y partes de usos industrial, comercial, educativo. Residencial, institucional o militar. G. Llevar a cabo la interventoría de carácter técnico, administrativo, financiero, social y/o ambiental, de contratos de obra, contratos de servicio o suministro de orden público o privado en las diferentes aéreas de la ingeniería, arquitectura, así como de proyectos de infraestructura, proyectos sociales, proyectos de gestión social, proyectos productivos, proyectos de suministros. H. Análisis, diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha, mantenimiento de aplicaciones de software a la medida para cualquier solución, sistemas de gestión de información de mantenimiento, sistemas de administración y producción para entidades públicas, privadas, militares y/o educativas; y administración de personal asociado a cualquiera de las anteriores y prestar servicios de administración o outsourcing y/o tercerización para la operación, mantenimiento, producción y explotación de plantas y sistemas industriales tanto en el sector público como privado. J. Consultoría en análisis de calidad de energía y potencia (power quality), uso racional de energía y análisis de redes, asesoría para certificaciones de retie y análisis de riesgo eléctrico, diseño y construcción de sistemas de apantallamiento eléctrico. K. Consultoría, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de seguridad informática, seguridad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

electrónica y barreras físicas control de acceso, cctv, detección y extinción de incendios suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado y cualquier otro relacionado con las aéreas de seguridad informática, física, perimetral e industrial. L. Importación, comercialización, instalación y arrendamiento para equipos de vigilancia y seguridad privada. M. Diseño, planeación y ejecución de programas o proyectos para el manejo de residuos sólidos domiciliarios, comerciales, industriales y peligrosos en cualquier municipio del país y en el exterior, en sus componentes de, recolección, disposición, barrido manual o mecánico, cortes de césped o lavado y limpieza de aéreas publicas y/o privadas. N. Prestación de servicios de aseo, limpieza y actividades complementarias a instalaciones de entidades privadas y estatales suministro, arrendamiento y comercialización de maquinaria, equipos e insumos relacionados con el aseo, la limpieza y sus actividades complementarias. O. Desarrollo, ejecución implementación y monitoreo de estudios de calidad de aire, estudios de calidad de agua, estudios y monitoreo de niveles de ruido, estudios de impacto ambiental; diseño, construcción, montaje, instalación, puesta en servicio, operación, mantenimiento de sistemas y plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual a nivel domestico e industrial. P. Asesoría para la implementación de sistemas de gestión de calidad iso 9001, iso 14000, iso 18000 entre otros. Q. Prestación de servicios logísticos para el desarrollo, organización, seguimiento, montaje, administración de eventos y espectáculos culturales, sociales, recreativos, deportivos, implementación, administración, seguimiento de proyectos de capacitación, educación, investigación, proyectos productivos, proyectos sociales, proyectos de impacto social, proyectos de gestión del riesgo, proyectos de prevención y gestión en control urbano. S. Planificación, gestión, implementación, desarrollo, seguimiento y monitoreo de planes de ordenamiento y desarrollo territorial. T. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá promover y fundar establecimientos, almacenes, depósitos, agencias o puntos de venta en cualquier parte del país o del exterior e igualmente enajenarlos, grabarlos, administrarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones; podrá celebrar todo tipo de acto o contrato relacionado con el fin principal inclusive los de obras publicas y/o privadas y los de agenciamiento y representación comercial de fabricantes, vendedores o distribuidores, nacionales o extranjeros; podrá de igual manera formar parte de otras sociedades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

anónimas o de responsabilidad limitada adquiriendo o suscribiendo acciones o haciendo aportes de cualquier especie, adquirirlas, incorporarlas o fusionarse con ellas; podrá también concurrir a la formación de compañías de cualquier clase, cuyo objeto social coincida con el de la sociedad o lo complemente podrá participar en todo tipo de licitaciones y de concurso de meritos, tanto públicos, como privados bien sea como agente o como representante de otras personas, al igual que en consorcio con cualquier otra figura consagrada por ley vigente o que se llegue a consagrar en las leyes futuras; podrá adquirir y enajenar bienes e inmuebles cuando así convenga a su desarrollo, explotar marcas, nombres comerciales, patentes invenciones o cualquier otro bien conforme con la ley, igualmente podrá girar, aceptar, endosar, garantizar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, celebrar contratos de mutuo, seguro, transportes, contratos con entidades bancarias y financieras y en fin, toda clase de títulos valores. En la ejecución de su objeto social la sociedad puede dar o recibir dinero en mutuo con o sin interés. Se entenderán incluidos en el objeto los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer derechos o cumplir las obligaciones legales derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas de personas naturales o jurídicas, distintas de aquellas persona jurídicas con quienes tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las que sea propietaria de acciones o cuotas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $148.000.000,00
No. de acciones	: 1.480,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $6.000.000,00
No. de acciones	: 60,00
Valor nominal	: $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $6.000.000,00
No. de acciones : 60,00
Valor nominal : $100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Actuará como representante legal de la sociedad el gerente general y el subgerente general en ejercicio del cargo. El representante legal tendrá la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. La sociedad tendrá un Representante Legal Suplente No. 2.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaría o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes. 4. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes,

---

de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos de que trata el artículo 446 de código de comercio a la asamblea general. 6. Designar, promover y remover los empleados de la sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la asamblea general de accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no atribuida a la asamblea general de accionistas y particular. 12. Todas las demás funciones no atribuidas a la asamblea general accionistas y todas las demás que le delegue la ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios. El representante legal no requerirá autorización de la asamblea general de accionista para la celebración de cualquier operación directa o indirectamente relacionada con el objeto social sin limitación de cuantía. El Representante Legal Suplente No. 2 el cual no tendrá limitación alguna en sus facultades, pudiendo comprometer a la compañía y suscribir cualquier obligación en el ejercicio de la actividad comercial.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 13 de abril de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de abril de 2016 con el No. 02093427 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente (Subgerente General)	Novoa Tobon Elkin Andres	C.C. No. 000001022948852

Mediante Acta No. 04 del 12 de marzo de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de

2018 con el No. 02311591 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Novoa Tobon Juan Manuel	C.C. No. 000001032493382

Mediante Acta No. 07 del 13 de abril de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2020 con el No. 02615680 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente No. 02	Gutiérrez Reyes Marlon Rolando	C.C. No. 000001016021807

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 002 del 30 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02196387 del 16 de marzo de 2017 del Libro IX
Acta No. 07 del 13 de abril de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02615679 del 15 de septiembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4330
Actividad secundaria Código CIIU: 4321
Otras actividades Código CIIU: 4663, 3314

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 478.145.883
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4330

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 8 de abril de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de octubre de 2021 Hora: 20:15:33
Recibo No. AB21522793
Valor: $ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B215227935844F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

INTEC
PROYECTOS Y SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA – ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU REHABILITACION Y ACREDITACIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días

Reporte No. 1
Periodo: Octubre 1 de 2021 a Octubre 30 de 2021

CLIENTE:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

1. DATOS GENERALES

Este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E



Adecuar los espacios para las áreas de la entrada principal y acceso principal Edificio Fe en la Causa e impermeabilización de la plazoleta principal del Hospital Militar Central, con lo cual se estima mejorar las condiciones de acceso de los usuarios al hospital y eliminar la percolación de agua a los parqueaderos subterráneos ubicados bajo la plazoleta.

2. *ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR*

La intervención en los sitios mencionados y acorde con el alcance de rehabilitación, consta de tres sectores a saber:

- Cubierta en vidrio entrada principal

La actividad contempla la instalación de una nueva marquesina en vidrio templado para lo cual se utilizará la estructura metálica existente, que será sometida a tratamiento con anticorrosivo y pintura alquídica.

- Cubierta de acceso Fe en la Causa

Para la adecuación del sector, se desmontará la cubierta existente y se realizará mantenimiento a la estructura metálica mediante lijado y pintura anticorrosiva y pintura esmalte con tratamiento final con la instalación de una lamina de policarbonato color opal de 8 mm debidamente adosada a la estructura.

Proyecto MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

- Impermeabilización plazoleta HOMIC

El alcance de ejecución contempla el desmonte de adoquín existente, limpieza de la placa e instalación de manto impermeabilizante Fiber Glass P-3. Una vez impermeabilizado se colocará nuevamente el adoquín sobre una cama de arena cemento, sellándolo con arena.

Dentro del alcance se contempló la rehabilitación del pompeyano de la calle principal de acceso al hospital, para lo cual, se escarificará la placa existente y sobre ella, se colocará una malla electrosoldada asegurada con pernos de ¼".

Instalada la malla, se procera a fundir sardineles de confinamiento en concreto y una vez se alcance una resistencia de fraguado, se procederá a verter concreto de 3000 PSI, previa aplicación de un aditivo puente de adherencia entre la placa actual y la nueva.

3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Para lograr el objeto del contrato, se establecieron las siguientes actividades contractuales:

ITEM	DESCRIPCION
1	**CUBIERTA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL**
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO, PELÍCULA POLARIZADO CON PROTECCIÓN UV 99%, PERFILERÍA DE SOPORTE, SILICONA GOTERO, PEGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y MATERIAL DE SELLO QUE SE REQUIERAPARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN
1.2	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO TIPO ALQUÍDICA EN ESPESOR TOTAL 3MM, ANDAMIOS Y DEMAS EQUIPOS PARA SUINSTALACIÓN
1.3	ANCLAJES ESTRUCTURALES PARA SOPORTE DE PERGOLAS
1.4	BRAZOS NEUMATICOS PARA SOSTENER PERGOLAS
2	**CUBIERTA ACCESO EDIFICIO FE EN LA CAUSA**
2.1	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE EQUIPO DE OXIACETILENO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
2.2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA
2.3	LAMINA MACIZA DE POLICARBONATO DE 8MM COLOR OPAL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASI COMO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE SOBRE MURO.

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

	SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
3	**IMPERMEABILIZACIÓN PLAZOLETA HOMIC**
3.1	DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ADOQUINES Y
3.2	RETIRO BASE Y MATERIAL CONTAMINADOE=10 CM
3.3	DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO
3.4	LIMPIEZA DE PLACA
3.5	IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 con refuerzo en poliester. (Remates, emulsión asfaltica), CON AFINADO DE PISO Y TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACA CON PRODUCTOS EPÓXICOS
3.6	CAMA EN ARENA DE PEÑA Nivelación h=5cm (Extendida, humedecida y compactada)
3.7	CONFINAMIENTO EXTERNO E INTERNO
3.8	DRENES 1/2"
3.9	ARENA DE SELLADO
3.10	ESCARIFICACIÓN DE PLACA (Incluye cargue y retiro de escombros)
3.11	ANCLAJE CON SIKADUR Y VARILLA DE 1/4 PROFUNDIDAD 5CM
3.12	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo, incluye Sikadur 32 Primer)
3.13	RAMPA EN ADOQUIN DE CONCRETO PARA PASO VEHÍCULAR, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS SARDINELES Y ADOQUIN), INCLUYE MORTERO PARA LAADHERENCIA DE LOS ADOQUINES, NO INCLUYE RELLENOS
3.14	ACERO DE REFUERZO
3.15	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA SIMILAR AL EXISTENTE, incluye sello de arena

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

4. PROGRESO CONSTRUCTIVO

Semana 1: Del 1/10/2021 al 7/10/2021

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AERA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N° 1 DEL: 1/10/2021 (dd/mm/yyyy) AL: 7/10/2021 (dd/mm/yyyy)

CONTRATO N° 270-2021 CONTRATISTA: INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 01/10/2021 (dd/mm/yyyy) FECHA DE TERMINACIÓN: 29/11/2021 (dd/mm/yyyy)

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	☐	Prorroga	☐	Aclaraciones técnicas	☐
Suspendido	☐	Adición	☐	Cambio de especificación	☐

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
						Ingeniero	1
						Mestro de Obra	1
						Obreros	2
						TOTAL	4

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,000	$ 0,00

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	7,00	53,00

5- REGISTRO FOTOGRAFICO






6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DESMONTE DE ADOQUINES, RETIRO BASE Y MATERIAL CONTAMINADOS, DESMONTE IMPERMEABILIZACION MANTO Y LIMPIEZA DE PLACA

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:






9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	
	INICIAL	ACTUAL
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00
Obras Adicionales		
TOTAL		$140.515.200,00

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Programa de salud ocupacional	
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Elaboró:

Revisó:

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

Semana 2: Del 8/10/2021 al 14/10/2021

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N°	2	DEL:	8/10/2021 (dd/mm/yyyy)	AL:	14/10/2021 (dd/mm/yyyy)
CONTRATO N°	270-2021	CONTRATISTA:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2021 (dd/mm/yyyy)	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2021 (dd/mm/yyyy)		

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	☐	Prorroga	☐	Aclaraciones técnicas	☐
Suspendido	☐	Adición	☐	Cambio de especificación	☐

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		arena de peña	5 m3	equipo de compactacion	1	Ingeniero	1
		cemento	25 bultos	equipo de impermeabilizacion	1	Mestro de Obra	1
				herramienta menor	5	Obreros	2
						Instalador	1
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
30,00%	35,00%	8,00%	13,00%	22,00%	13	$ 30.913.344

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	14	46

5- REGISTRO FOTOGRAFICO






6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

IMPERMEABILIZACION FIBER GLASS P-3 CON REFUERZO EN POLIESTER.
INSTALACION CAMA DE ARENA Y ADOQUIN

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:






9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		
	INICIAL	ACTUAL	
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00	
Obras Adicionales			
TOTAL		$140.515.200,00	

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Programa de salud ocupacional	
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICAS DE MEDIANA INTENSIDAD LOS DÍAS 11 Y 14 DE OCTUBRE DE 2021.

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

Semana 3: Del 15/10/2021 al 21/10/2021

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL
AREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N° 3 **DEL:** 15/10/2021 dd/mm/yyyy **AL:** 21/10/2021 dd/mm/yyyy

CONTRATO N° 270-2021 **CONTRATISTA:** INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA DE INICIACIÓN: 01/10/2021 dd/mm/yyyy **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/11/2021 dd/mm/yyyy

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	☐	Prorroga	☐	Aclaraciones técnicas	☐
Suspendido	☐	Adición	☐	Cambio de especificación	☐

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
Diseño marquesina		arena de peña	2 m3	equipo de compactacion	1	Ingeniero	1
		cemento	14 bultos	herramienta menor	5	Maestro de Obra	1
						Obreros	2
						TOTAL	4

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
5,00%	40,00%	20,70%	40,00%	0,00%	0	$ 0

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	21	39

5- REGISTRO FOTOGRAFICO






6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

INSTALACION CAMA DE ARENA Y ADOQUIN

REPORTE MENSUAL


Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:

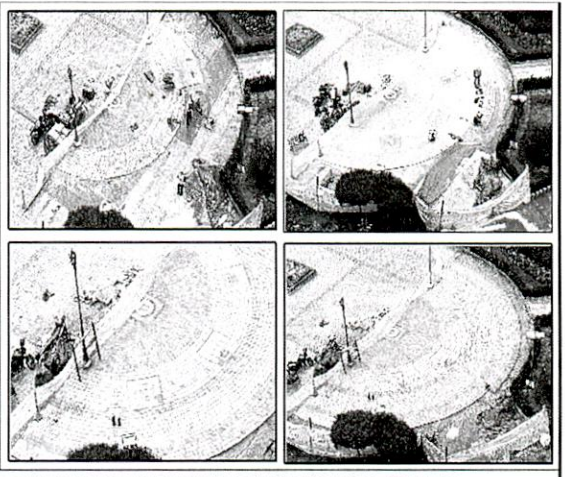

9- CONTROL DE COSTOS			10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA	
Detalle	Presupuesto		Actividad	Observaciones
	INICIAL	ACTUAL	Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00	Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Obras Adicionales			Programa de salud ocupacional	
TOTAL		$140.515.200,00	Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI:	SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICAS DE MEDIANA INTENSIDAD LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2021.

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

Semana 4: Del 22/10/2021 al 28/10/2021

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N°	4	DEL:	22/10/2021 (dd/mm/yyyy)	AL:	28/10/2021 (dd/mm/yyyy)
CONTRATO N°	270-2021	CONTRATISTA:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2021 (dd/mm/yyyy)	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2021 (dd/mm/yyyy)		

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	☐	Prorroga	☐	Aclaraciones técnicas	☐
Suspendido	☐	Adición	☐	Cambio de especificación	☐

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
Diseño marquesina		arena de peña	3 m3	equipo de compactacion	1	Ingeniero	1
		cemento	8 bultos	herramienta menor	5	Maestro de Obra	1
		sikadur	6 kg	pulidora	1	Obreros	3
		malla	50 m2	taladro	1		
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
8,10%	46,10%	15,60%	55,00%	-8,90%	-5	-$ 12.505.853

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	28	32

5- REGISTRO FOTOGRAFICO






6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

TERMINACIÓN DE INSTALACION DE ADOQUIN, CONFINAMIENTO DE ADOQUIN. ESCARIFICACION Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA. DESMONTE DE MARQUESINA, LIJADA DE ESTRUCTURA METALICA

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:






9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Actividad	Observaciones
	INICIAL	ACTUAL	Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00	Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Obras Adicionales			Programa de salud ocupacional	SE REALIZO LA SOCIALIZACION A CADA TRABAJADOR SOBRE EL PROGRAMA 5s ESTIPULADO POR EL HOSPITAL MILITAR
TOTAL		$140.515.200,00	Plan de Calidad	NO APLICA

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE PRESENTARON PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICAS DE MEDIANA INTENSIDAD LOS DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021.

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

Semana 5: Del 29/10/2021 al 4/11/2021

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N°	5	DEL:	29/10/2021 dd/mm/yyyy	AL:	4/11/2021 dd/mm/yyyy
CONTRATO N°	270-2021	CONTRATISTA:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO ENTRADA PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV- QUE CUMPLA EL MARCO NORMATIVO PARA SU HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE DICHAS ÁREAS ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2021 dd/mm/yyyy	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2021 dd/mm/yyyy		

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	☐	Prorroga	☐	Aclaraciones técnicas	☐
Suspendido	☐	Adición	☐	Cambio de especificación	☐

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
Diseño marquesina		arena de peña	3 m3	equipo de compactacion	1	Ingeniero	1
		cemento	8 bultos	herramienta menor	5	Maestro de Obra	1
		sikadur	6 kg	pulidora	1	Obreros	3
		malla	50 m2	taladro	1		
						TOTAL	5

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
4,52%	50,63%	9,11%	64,20%	-13,57%	-8	-$ 19.067.913


GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	30	30

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

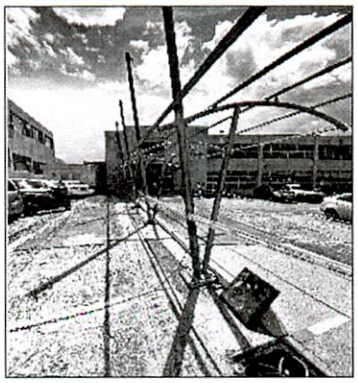

6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SSE AVANZA EN UN 75% EN LA PINTADA DE LA ESTRUCTURA METALICA

REPORTE MENSUAL

Proyecto

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA EN POLICARBONATO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA - ARREGLO DE GOTERAS E IMPERMEABILIZACIÓN ACCESO PARQUEADEROS BAJO PLAZOLETA E

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:



9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	
	INICIAL	ACTUAL
Directos+AIU+IVA	$140.515.200,00	$140.515.200,00
Obras Adicionales		
TOTAL		$140.515.200,00

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACION
Seguridad industrial	SE ESTUDIARON LOS EPPS MATERIALES Y SEÑALIZACION
Programa de salud ocupacional	SE REALIZO LA SOCIALIZACION A CADA TRABAJADOR SOBRE EL PROGRAMA 5s ESTIPULADO POR EL HOSPITAL MILITAR
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
