SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES BOLÍVAR

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 09

PERÍODO: 12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DEL 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: JAIR SIERRA HERNANDEZ	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1.2. OBJETO A CONTRATAR 5
1.3. CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1552323. 5
1.4. LOCALIZACIÓN 5
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.1. FORMA DE PAGO: 7
2.2. ANTICIPO DE OBRA 9
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 10
2.4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 10
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 13
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 14
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 14
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 14
3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.2. FORMA DE PAGO 15
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 17
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 17
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 18
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 18
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 18
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 18
4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 19
5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 19
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 20
6.1 CONCLUSIONES: 20
6.2 RECOMENDACIONES: 21

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de las Zonas del proyecto ..... 7.
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto……..……7

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323. 7
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020. 10
Tabla 3 Control Financiero Contratista.....14
Tabla 4. Relación del personal Contrato 14
Tabla 5. Información general del contrato de interventoría 15
Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 16
Tabla 7. Control financiero interventoría 17
Tabla 8. Relación del personal de Interventoría 17
Tabla 9. Relación de equipos del interventor 17

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría en desarrollo del contrato de obra y seguimiento por parte de la interventoría para **EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE,** Por medio del proceso **CO1.PCCNTR.1552323** del contrato de obra, al contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**, y a su vez a través el contrato **CO1.PCCNTR.1636309**, fue adjudicada la Interventoría a cargo del **CONSORCIO INTER INGECO GNG SAS.**

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas por la Interventoría para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo, de control financiero y ambiental durante la etapa de construcción, con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar en el departamento de BOLIVAR, De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad industrial de la Entidad y la legislación vigente.

Igualmente, contiene todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo comprendido entre el 12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DEL 2021, siguiendo las especificaciones técnicas contempladas en el Contrato de obra y demás normas vigentes e inherentes al proyecto, verificando que las obras se realicen cumpliendo los lineamientos y especificaciones propuestos, el alcance, en las condiciones y en forma integral con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y de apoyo necesarios para el buen desarrollo del contrato.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La formación educativa a través del SENA comprende un aspecto fundamental para el crecimiento y desarrollo de las personas. El buen estado en sus instalaciones hacen parte del buen funcionamiento de forma oportuna y segura.

El SENA como entidad contratante busca invertir recursos para el mejoramiento en sus instalaciones y sedes, buscando brindar las mejores condiciones en cuanto al nivel educativo, razón por la cual se adelantó el proceso de contratación que tiene por objeto para **EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE***”*** para dar respuesta a las necesidades planteadas.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE..

1.3. CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.1552323.

El objeto “**EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE**

1.4. LOCALIZACIÓN

El proyecto donde se realizan las Obras de “**EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”.** ubicado en el departamento de BOLIVAR.



Ilustración 1 *Localización del departamento de BOLIVAR en Colombia. (Fuente: Wikipedia)*

La obra a ejecutar se encuentra ubicada en las siguientes sedes:

- SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).
- SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).
- SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).
- SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).
- SEDE 5. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (KR 41 # 21-54), SAN JACINTO
- SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1552323.

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR.1552323.

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1552323.
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OBJETO:	EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	LOTE NO.1 QUE COMPRENDE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, SAN ANDRÉS, SUCRE
VALOR DEL CONTRATO:	$ 8.777.298.757 OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
VALOR ADICION No. 01	$501.925.456-Correspondiente a la implementación del protocolo.
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACION O PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	3 MESES
PRORROGA No. 03:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DEL 2021

2.1. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. PAGOS PARCIALES: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades **efectivamente ejecutadas en el periodo multiplicadas por los precios unitarios pactados)** con los respetivos Análisis de Precios Unitarios (APUS), debidamente aprobados por la interventoría. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos:

- Cantidad instalada
- Valor
- Destino
- Recibido por
- Fecha de entrega
- Fecha de solicitud
- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.
- Indicadores de gestión
- Certificación suscrita por el contratista en donde conste el correcto equilibrio de la ecuación económica del contrato, a la fecha de la facturación.
- Como anexo de los informes mensuales, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas.

UN ÚLTIMO PAGO: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Suscripción del acta de liquidación entre las partes y acta de recibo final debidamente suscritas por el contratista, la interventoría.
- Informe final consolidado de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos:
- Cantidad instalada

- Valor
- Destino
- Recibido por
- Fecha de entrega
- Fecha de solicitud
- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.
- Indicadores de gestión
- Como anexo del informe final, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas.
- Resolución 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo seguro en alturas · Resolución 2400 (mayo de 1979), capítulo III De escaleras y andamios. · OSHA 1926.500 Subparte X (Escaleras) y demás normativas aplicables para la ejecución y alcance de las actividades del contrato.
- Documento suscrito por el interventor, en donde conste el cumplimiento del ofrecimiento del personal conforme la propuesta presentada.
- Certificación de la interventoría del retiro por parte del contratista, de la totalidad de los escombros producto de las labores.
- Certificado de vigencia y correcta cobertura de las garantías contractuales, suscrita por la interventoría.
- Correcta presentación de la factura o documento equivalente y remisión de la misma a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.
- Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, respecto del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Certificación del cumplimiento de los requisitos contractuales para el desembolso del pago final suscrita por el interventor.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR.1552323no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 2.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	30/12/2020	30/09/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		30/12/2020	31/03/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/03/2021	31/03/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		30/12/2020	30/09/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	31/03/2021

2.4.ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1. Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre **12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DE 2021** el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Semana 34: DEL 12 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Durante la semana se realizaron las ajustes y observaciones de los presupuestos y cronogramas correspondientes a las respectivas sedes

Los porcentajes a continuación están basados con la nueva programación

Los porcentajes mostrados a continuación pertenecen a las actividades anteriores, el cual a la fecha no hay avance de obras.

- **SEDE NAUTICA**

Programado: 0.86%
Ejecutado: 0%

- **SEDE PETROQUIMICA**

Programado: 0.08%
Ejecutado: 0**%**

- **SEDE DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50**).

Programado: 1.44%
Ejecutado: 0%

- **SEDE MOMPOX**

Programado: 5.29%
Ejecutado: 0%

- **SEDE SAN JACINTO**

Programado: 0%%
Ejecutado: 0%

- **SEDE CASA MARQUEZ**

Programado: 0.92%
Ejecutado: 0%

Semana 35: DEL 19 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DEL 2021

Durante la semana se realizaron las ajustes y observaciones de los presupuestos y cronogramas correspondientes a las respectivas sedes

Los porcentajes a continuación están basados con la nueva programación

Los porcentajes mostrados a continuación pertenecen a las actividades anteriores, el cual a la fecha no hay avance de obras.

- **SEDE NAUTICA**

Programado: 1.72%
Ejecutado: 2.42%

- **SEDE PETROQUIMICA**

Programado: 0.16%
Ejecutado: 0**%**

- **SEDE DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50**).

Programado: 2.88%
Ejecutado: 0%

- **SEDE MOMPOX**

Programado: 10.58%
Ejecutado: **14.69%**

- **SEDE SAN JACINTO**

Programado: 0%%
Ejecutado: 0%

- **SEDE CASA MARQUEZ**

Programado: 1.85%
Ejecutado: 0%

Semana 36: DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2021

Durante la semana se realizaron las ajustes y observaciones de los presupuestos y cronogramas

Los porcentajes a continuación están basados con la nueva programación

Los porcentajes mostrados a continuación pertenecen a las actividades anteriores, el cual a la fecha no hay avance de obras.

- **SEDE NAUTICA**

Programado: 2.36%
Ejecutado: 2.42%

- **SEDE PETROQUIMICA**

Programado: 0.30%
Ejecutado: 0**%**

- **SEDE DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50**).

Programado: 9.46%
Ejecutado: 0%

- **SEDE MOMPOX**

Programado: 14.55%
Ejecutado: **14.69%**

- **SEDE SAN JACINTO**

Programado: 0%%
Ejecutado: 0%

- **SEDE CASA MARQUEZ**

Programado: 2.03%
Ejecutado: 0%

Semana 37: DEL 3 DE MAYO AL 9 DE MAYO DEL 2021

Durante la semana se realizaron las ajustes y observaciones de los presupuestos y cronogramas

Los porcentajes a continuación están basados con la nueva programación

Los porcentajes mostrados a continuación pertenecen a las actividades anteriores, el cual a la fecha no hay avance de obras.

- **SEDE NAUTICA**

Programado: 10.24%
Ejecutado: 2.42%

- **SEDE PETROQUIMICA**

Programado: 4.51%
Ejecutado:

- **SEDE DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50**).

Programado: 15.64%
Ejecutado: 0%

- **SEDE MOMPOX**

Programado: 27.14%
Ejecutado: **14.69%**

- **SEDE SAN JACINTO**

Programado: 100%
Ejecutado: 0%

- **SEDE CASA MARQUEZ**

Programado: 2.22%
Ejecutado: 2.03%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra No. 3, 4 y 5 mediante los comunicados *“CINP-BTA-023-0798-2969”. “CINP-BTA-023-0799-2970”* y *“CINP-BTA-023-0800-2971”.* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control Financiero Contratista

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20– 20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20– 20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21– 20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21– 20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21– 20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
TOTALES		**$1.344.806.789**	**$316.029.597,02**	**$1.660.836.385,57**	**$1.660.836.386**	**$7.116.462.371,4**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No.02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	CARLOS OROZCO
4	Profesional SST	SERGIO FERNANDO ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista, no ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el **12 DE ABRIL DEL 2021 AL 11 DE MAYO 2021**, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No.06.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	LOTE NO.1 QUE COMPRENDE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, SAN ANDRÉS, SUCRE
VALOR DEL CONTRATO:	$691.547.950 MCTE
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	15 DÍAS
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato corresponde a la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE $691.547.950**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. PAGOS PARCIALES: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. UN ÚLTIMO PAGO: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del noveno mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 3.

Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	01/03/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	14/07/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	30/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	28/08/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante los comunicados “CINP-BTA-023-0801-2973; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, “CINP-BTA-023-0802-2974; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA” y “CINP-BTA-023-0803-2975; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 3, 4 y 5, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
TOTALES		**$110.008.418**	**$20.901.600**	**$130.910.018**	**$130.910.018**	**$560.637.882**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría conto con el siguiente personal para la ejecución del primer mes comprendido entre el 12 de Abril al 11 de Mayo de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No.8:

Tabla 8. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JAIR SIERRA
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No.10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período se no se realizaron reuniones de comité.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el el **12 DE ABRIL DEL 2021 AL 11 DE MAYO 2021**, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Eelaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista.

TECNICAS:

- Visitas técnicas de reconocimiento inicial, con la participación del SENA, el contratista y la interventoría.
- Seguimiento y control conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Bolívar de $935.200.880.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

REGIONAL BOLIVAR				$	935.200.880,00
AGROEMPRESARIAL - MOMPOX				$	1.072.478,00
CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA				$	145.445.387,65
MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR				$	251.927.637,92
AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO				$	2.650.749,00
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR				$	12.762.841,00
CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134				$	317.043.127,14
COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.				$	88.628.579,23
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ				$	115.670.080,26

De acuerdo al informe semanal N° 37, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

- SEDE NÁUTICA

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 18,385,459	10.24%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 4,354,283.96	2.42%
RETRASO	$ 14,031,174.63	7.81%

- SEDE PETROQUÍMICA

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 17,671,913	4.51%
EJECUTADO ACUMULADO	0	0
RETRASO	$ 17,671,913	4.51%

- SEDE CASA MARQUÉS

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 3,172,461	2.22%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 2,901,148.38	2.03%
RETRASO	$ 271,312.21	0.19%

- SEDE DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 13,260,000	5.86%
EJECUTADO ACUMULADO	0	0
RETRASO	$ 13,260,000	5.86%

- SEDE MOMPOX

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$359,502	27.14%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 194,633.53	14.69%
RETRASO	$164,868.80	12.45%

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

Trascurrido el noveno mes de ejecución de la interventoría, se tiene como conclusión los siguientes puntos:

En el presente informe el contrato de obra **CO1.PCCNTR.1636309** presenta un retraso del 7% teniendo en cuenta que para la semana 37 se estimaba un avance de obra programado de 10% y el avance de obra ejecutado fue del 4%.

- Se evidenció en el período inconsistencia en los presupuestos, retrasos en la programación de obra.
- El estado del tiempo fue favorable durante todo el periodo, se presentó tiempo seco en un 99%.
- Actualmente el contratista empieza a realizar actividades de obra en la regional BOLIVAR, hasta la fecha solo se han ejecutado una parte de mantenimiento de aires en las NAUTICA Y PETROQUIMICA.
- Se le solicitó al contratista mediante comunicado plan de choque para recuperar los atrasos acumulados y poder alcanzar a cumplir con el objeto del contrato en la fecha del

plazo contractual. Se relacionó en el mismo oficio también las actividades que no han sido iniciadas de acuerdo a la programación presentada y aprobada.

- Se solicitó al contratista presentar a la interventoría una revisión de los presupuestos por sedes debido a que las cantidades contractuales presentadas en las Actas de Obra no coinciden con lo presentado anteriormente en los diagnósticos.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista seguir disponiendo los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato.

Se recomienda al contratista agilizar las actividades de establecidas dentro de la programación de obra.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429,047,013.00	$ 100,826,048.69	$ 529,873,061.69	$ 8,247,425,695.31	$ 529,873,061.69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272,113,036.00	$ 63,946,563.88	$ 336,059,599.88	$ 7,911,366,095.43	$ 865,932,661.57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114,077,060.00	$ 26,808,109.07	$ 140,885,169.00	$ 7,770,480,926.43	$ 1,006,817,830.57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193,777,640.00	$ 45,537,746.00	$ 239,315,386.00	$ 7,531,165,540.43	$ 1,246,133,216.57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335,792,040.00	$ 78,911,129.38	$ 414,703,169.00	$ 7,116,462,371.43	$ 1,660,836,385.57
6		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1,344,806,789.00**	**$ 316,029,597.02**	**$ 1,660,836,385.57**	**$ 7,116,462,371**	**$ 1,660,836,386**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA [X]
INTERVENTORIA [ ]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/04/2021 AL 11/05/2021

FECHA / CARGO	ABRIL																			MAYO											OBSERVACIONES	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
RESIDENTE TÉCNICO - **CARLOS ENRIQUE OROZCO**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
PROFESIONAL SOCIAL -																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**81**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DEL 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ABRIL																			MAYO											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	5	8	6	7	8	8		8	8	5	5	8	3		6	6	4	5	8	3		6	5	5		6	5		5	5	148
Nublado	3		2	1						3	3		5		2	2	4	3		5			3	3			3				42
Lluvias intensas																						1				2			3	3	10
Lluvias moderadas																															0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																															10

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	$ 691,547,900.00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35,100,414.00	$ 6,669,079.00	$ 41,769,493			$ 649,778,407.00	$ 41,769,493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22,257,382.00	$ 4,228,903.00	$ 26,486,285			$ 623,292,122.00	$ 68,255,778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9,356,236.00	$ 1,777,685.00	$ 11,133,921			$ 612,158,201.00	$ 79,389,699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15,864,923.00	$ 3,014,335.00	$ 18,879,258			$ 593,278,943.00	$ 98,268,957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27,429,463.00	$ 5,211,598.00	$ 32,641,061			$ 560,637,882.00	$ 130,910,018
6	Ene Feb	$ -	$ -	$ -			$ -	$
TOTALES		**$ 110,008,418.00**	**$ 20,901,600.00**	**$ 130,910,018.00**			**$ 560,637,882.00**	$ 130,910,018.00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 ABRIL AL 11 MAYO 2021

FECHA / CARGO	ABRIL																			MAYO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **JAIR SIERRA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7788086333**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971836771

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	14	$ 5.339.700	$ 0	$ 0	$ 20.100	$ 20.100	$ 0	$ 0	$ 5.379.900	$ 0	$ 5.379.900
230201	230201- PROTECCION	2	$ 785.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	$ 825.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.796.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 1.843.400	$ 0	$ 1.843.400
SUBTOTALES:										**$ 8.048.700**	**$ 0**	**$ 8.048.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 340.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 783.800
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.600	$ 0	$ 0	$ 177.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 168.700
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 76.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 223.400
SUBTOTALES:													**$ 1.959.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.959.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.126.400	$ 2.126.400	$ 0	$ 0	$ 2.126.400
SUBTOTALES:									**$ 2.126.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.126.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 1.327.000	$ 0	$ 1.327.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 273.700	$ 0	$ 273.700
SUBTOTALES:			**$ 1.980.700**	**$ 0**	**$ 1.980.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1013644090	CASTANEDA SUAREZ MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO NOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.958.000	$ 473.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.958.000	$ 118.400	$ 0	$ 118.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.958.000		$ 15.500	30	$ 2.958.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7788086333	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971836771

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD								ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓD.COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
9	CC 1072168255	GARZON RAMIREZ ANA MILENA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	26	$ 3.466.667	$ 554.700	$ 17.400	$ 17.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 589.500	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 3.466.667	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 3.466.667		$ 18.100	26	$ 3.466.667	CCF24-COMPENSAR	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1072168255	GARZON RAMIREZ ANA MILENA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI										01-04							230301-PORVENIR	4	$ 533.334	$ 85.400	$ 2.700	$ 2.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 533.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 533.334		$ 0	4	$ 533.334	CCF24-COMPENSAR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	25	$ 1.583.334	$ 253.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	25	$ 1.583.334	$ 63.400	$ 0	$ 63.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1.583.334		$ 110.300	25	$ 1.583.334	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																05-09	230301-PORVENIR	5	$ 316.667	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	5	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 12.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 316.667		$ 0	5	$ 316.667	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 1.440.000	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.400	EPS016-COOMEVA S.A.	12	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 57.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 1.440.000		$ 100.300	12	$ 1.440.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.115.100

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7788022106**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		971873645

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 128.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7787549968**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	971842237

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.333.400	$ 0	$ 0	$ 155.300	$ 155.300	$ 0	$ 0	$ 5.644.000	$ 0	$ 5.644.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 291.200
SUBTOTALES:										**$ 7.665.000**	**$ 0**	**$ 7.665.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 263.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 3.249.200
SUBTOTALES:													**$ 3.969.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.969.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 452.700	$ 452.700	$ 0	$ 0	$ 452.700
SUBTOTALES:									**$ 452.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 452.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.872.300	$ 0	$ 1.872.300
SUBTOTALES:			**$ 1.872.300**	**$ 0**	**$ 1.872.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.473.680	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.473.680		$ 102.600	$ 30	$ 1.473.680	CCF24-COMPENSAR	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32773848	ROLON AMAYA KUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
3	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
6	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	25	$ 5.801.250	$ 928.200	$ 29.100	$ 29.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 986.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 5.801.250	$ 232.100	$ 0	$ 232.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 5.801.250		$ 30.300	25	$ 5.801.250	CCF24-COMPENSAR	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI												18-22							25-14 COLPENSIONES	5	$ 773.501	$ 123.800	$ 3.900	$ 3.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.600	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 773.501	$ 31.000	$ 0	$ 31.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 773.501		$ 0	5	$ 773.501	CCF24-COMPENSAR	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7787549968	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971842237

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.820.000	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.820.000		$ 126.700	30	$ 1.820.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 15.193.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/04/2021	CINP-BTA-023-0717-2323	Solicitud presupuestos y programaciones actualizadas sedes Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0718-2325	Reiteración de solicitud de respuesta al comunicado DCS-472-CO1.2323; Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0719-2328	Comunicados; DCS-514-CO1. 2323 y DCS-499-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0720-2332	Comunicados DCS-513-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0721-2333	Solicitud de documentación ambiental y SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/04/2021	CINP-BTA-023-0722-2379	Correo electrónico, Solicitud de atención urgente de equipos de bombeo y sistema de refrigeración sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0723-2396	Comunicado DCS-523-CO1.2323; Remisión corte No.03, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0724-2406	Informe mensual No. 7, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0725-2427	Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra No.CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0726-2429	Correo electrónico, Mantenimientos tanques de agua potable y redes sanitarias en las sedes de la Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0727-2439	Oficio NIS 2021-01-101677 Radicado 92021031174, reconocimiento cesión de derechos económicos a favor de Seven Construcciones SAS.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0728-2443	Comunicado DCS-525-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0688-2066, CINP-BTA-023-0718-2325; Comunicado DCS-472-CO1.2323; Relación y Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0729-2444	Oficio sin consecutivo; Solicitud de la respuesta inmediata a los requerimientos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0730-2445	Oficio NIS 2021-02-092319 radicado 9-2021-029279; Solicitud inmediata de respuesta a derecho de petición presentado por Construcciones T&H S.A.S.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0731-2446	Correo electrónico; Solicitud pólizas Contra modificación No. 4, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0732-2453	Correo electrónico y comunicado DCS-526-CO1. 2323, Corte de obra No.02 y No.04.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0733-2459	Informes semanales No. 33, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0734-2464	Oficio NIS 2021-01-135694 radicado 92021030892; Permiso OCCRE, Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0735-2481	Comunicados DCS-523-CO1.2323, DCS-524-CO1.2323 y DCS-526-CO1.2323; Informes mensuales técnicos del No.03 al No.07 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0736-2489	Solicitud de entrega de documentos de personal sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0737-2504	Comunicado DCS-533-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0665-1791; Comunicado DCS-462-CO1.2323; Relación y documentos del personal de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0738-2505	Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0739-2506	Correo electrónico; Mantenimientos Pendientes en las Sedes Córdoba -Lorica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0740-2509	Informes semanales No. 33 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0741-2518	Informes semanales No.32 y 33, San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/04/2021	CINP-BTA-023-0742-2527	Comunicado DCS-538-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0728-2443, Comunicado DCS-525-CO1.2323; Relación y Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/04/2021	CINP-BTA-023-0743-2529	Comunicado DCS-539-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/04/2021	CINP-BTA-023-0744-2558	Oficio NIS 2021-01-137057 radicado 92021032962, Respuesta pago facturas ALFA-0 ALFA-13 Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/04/2021	CINP-BTA-023-0745-2574	Informes semanales No. 34, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/04/2021	CINP-BTA-023-0746-2588	Solicitud aclaración costos contrato de Interventoría por prorroga No.03.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
22/04/2021	CINP-BTA-023-0747-2591	Informes semanales No. 34 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0748-2603	Solicitud de entrega de documentos contrato sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0749-2604	Comunicados DCS-544-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0750-2605	Comunicado DCS-544-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira, San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0751-2618	Informes Mensuales No. 8, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0752-2628	Solicitud de entrega inmediata de permiso OCCRE del personal del archipiélago de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0753-2629	Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0754-2654	Informe Mensual No. 8 San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0755-2657	Correo electrónico, Solicitud información actividades de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0756-2659	Comunicado DCS-552-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0757-2661	Comunicado DCS-552-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0758-2662	Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0759-2663	Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0760-2665	Comunicado DCS-548-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0681-2001, Comunicado DCS-468-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0761-2667	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0762-2669	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0763-2670	Comunicado DCS-550-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0764-2671	Reiteración Actualización de las Programaciones y Presupuestos de las sedes del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0765-2672	Comunicados DCS-540-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0738-2505, Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0766-2702	Comunicado DCS-554-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0757-2661, Comunicado DCS-552-CO1. 2323; Personal de Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0767-2703	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0768-2704	Comunicado DCS-555-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0743-2529, comunicado DCS-539-CO1. 2323 relación y documentos Personal de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0769-2731	Informes semanales No. 35, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/04/2021	CINP-BTA-023-0770-2760	Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/04/2021	CINP-BTA-023-0771-2769	Informes semanales No. 35 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/04/2021	CINP-BTA-023-0772-2782	Informes Mensuales del No. 4 al No. 7 San Andrés y Providencia, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0773-2813	Informe mensual No. 8, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0774-2817	Comunicado DCS-528-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0725-2427; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0775-2819	Comunicados DCS-562-CO1.2323 y DCS-563-CO1.2323; Corte de Obra No. 03 y No. 4.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/05/2021	CINP-BTA-023-0776-2844	Comunicado DCS-561-CO1.2323; Relación y documentos del personal de pintura de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/05/2021	CINP-BTA-023-0777-2845	Comunicado DCS-565-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/05/2021	CINP-BTA-023-0778-2846	Comunicado DCS-560-CO1.2323; Relación y documentos del personal eléctrico de Magdalena - Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0779-2856	Oficio 2021-02-100685 Radicado 92021005749, Reiteración de Condiciones Inseguras en Infraestructura Centro de Formación. Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0780-2859	Comunicado DCS-567-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0781-2874	Solicitud de atención urgente sistema de refrigeración sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0782-2875	Alcance comunicado CINP-BTA-023-0771-2769, Informes semanales No. 35 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0783-2880	Comunicado DCS-559-CO1.2323, Informe mensual No.3, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0784-2881	Comunicado DCS-559-CO1.2323; Informes mensuales No. 4 y 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0785-2892	Comunicado DCS-568-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0786-2893	Comunicado DCS-564-CO1.2323; Corte de Obra No. 05.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0787-2915	Comunicado DCS-573-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0788-2916	Comunicado DCS-572-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0789-2924	Informes semanales No. 36, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0790-2932	Correo electrónico, Informe mensual No.6, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0791-2933	Correo electrónico, Informe mensual No.7, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0792-2934	Correo electrónico, Informe mensual No.8, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0793-2938	Comunicado DCS-571-CO1.2323, Programación ajustada prórroga No.3, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0794-2942	Comunicado DCS-570-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0795-2954	Informes semanales No. 36 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0796-2967	Comunicado DCS-576-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0797-2968	Comunicado DCS-574-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico..	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0798-2969	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.3, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0799-2970	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0800-2971	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0801-2973	Acta de pago parcial No.3, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0802-2974	Acta de pago parcial No.4, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0803-2975	Acta de pago parcial No.5, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0804-2990	Comunicado DCS-577-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0805-2991	Comunicado DCS-580-CO1. 2323; Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0780-2859, DCS- 567-CO1.2323, Relacion de personal Córdoba, Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0806-2993	Comunicado DCS-579-CO1. 2323; Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0787-1915, DCS-573-CO1.2323, Relación de personal córdoba, Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/05/2021	CINP-BTA-023-0807-2994	Comunicado DCS-581-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/05/2021	CINP-BTA-023-0808-3023	Observaciones a las actividades trabajos en altura sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Firma:
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

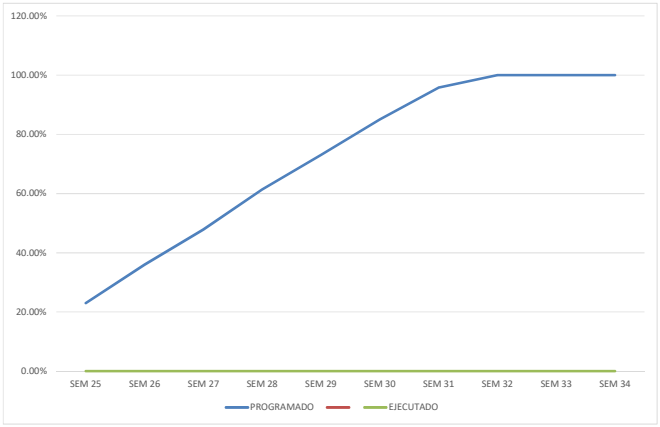

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	23.00%	0.00%	**-23.00%**
SEM 26	35.94%	0.00%	**-35.94%**
SEM 27	47.90%	0.00%	**-47.90%**
SEM 28	61.32%	0.00%	**-61.32%**
SEM 29	73.00%	0.00%	**-73.00%**
SEM 30	84.99%	0.00%	**-84.99%**
SEM 31	95.77%	0.00%	**-95.77%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTA		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

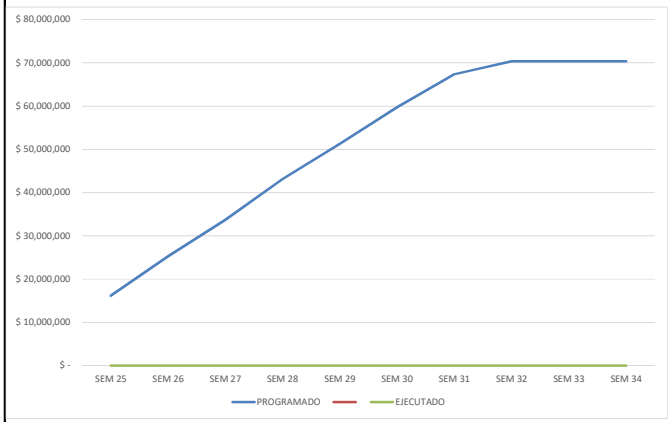

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 16,180,354	$ -	**$ -16,180,353.74**
SEM 26	$ 25,279,576	$ -	**$ -25,279,575.62**
SEM 27	$ 33,692,159	$ -	**$ -33,692,158.50**
SEM 28	$ 43,130,846	$ -	**$ -43,130,846.07**
SEM 29	$ 51,350,628	$ -	**$ -51,350,628.16**
SEM 30	$ 59,782,428	$ -	**$ -59,782,427.64**
SEM 31	$ 67,366,159	$ -	**$ -67,366,158.80**
SEM 32	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 33	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 34	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	30/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	18/03/2021		31/03/2021		**-31.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		15/03/2021		**-59.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	18/02/2021		2/03/2021		**-59.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	18/02/2021		15/03/2021		**-59.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/02/2021		9/02/2021		**-72.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	5/02/2021		31/03/2021		**-72.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		19/02/2021		**-72.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

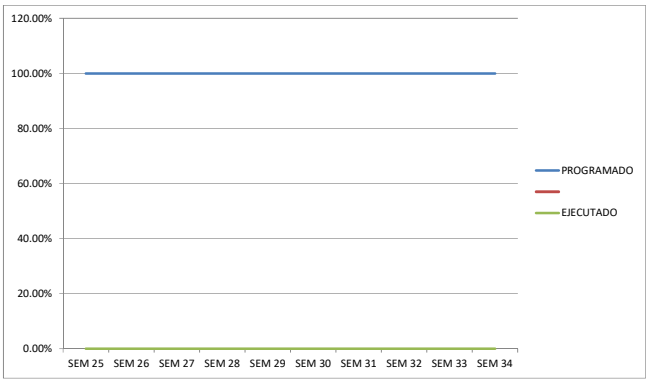

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 26	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 27	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 28	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 29	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 30	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

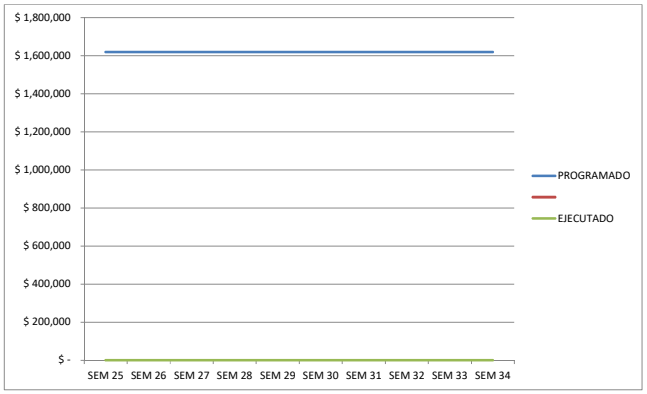

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 26	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 27	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 28	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 29	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 30	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 31	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 32	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 33	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 34	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	7/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	7/12/2020		31/12/2020		-132.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/12/2020		18/12/2020		-130.00	
5	LAVADO DE TANQUES	18/12/2020		24/12/2020		-121.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		18/12/2020		-130.00	
	NO PREVISTAS	9/12/2020		31/12/2020		-130.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

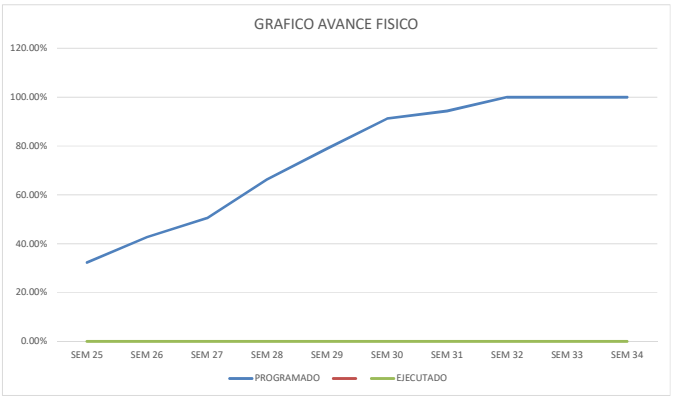

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	32.32%	0.00%	**-32.32%**
SEM 26	42.77%	0.00%	**-42.77%**
SEM 27	50.50%	0.00%	**-50.50%**
SEM 28	66.32%	0.00%	**-66.32%**
SEM 29	78.99%	0.00%	**-78.99%**
SEM 30	91.24%	0.00%	**-91.24%**
SEM 31	94.36%	0.00%	**-94.36%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

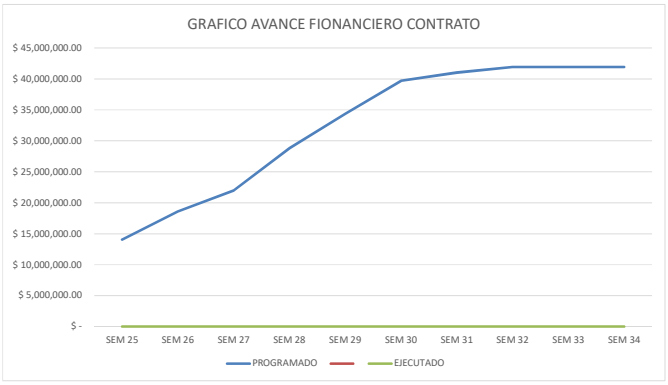

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 14,055,369.51	$ -	**$ -14,055,369.51**
SEM 26	$ 18,602,477.73	$ -	**$ -18,602,477.73**
SEM 27	$ 21,965,276.52	$ -	**$ -21,965,276.52**
SEM 28	$ 28,845,062.61	$ -	**$ -28,845,062.61**
SEM 29	$ 34,353,609.68	$ -	**$ -34,353,609.68**
SEM 30	$ 39,683,320.11	$ -	**$ -39,683,320.11**
SEM 31	$ 41,039,164.86	$ -	**$ -41,039,164.86**
SEM 32	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 33	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 34	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2021		**-152.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/01/2021		31/03/2021		**-85.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
			g		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 26	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 27	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 28	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 29	12.92%	0.00%	**-12.92%**
SEM 30	59.65%	0.00%	**-59.65%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

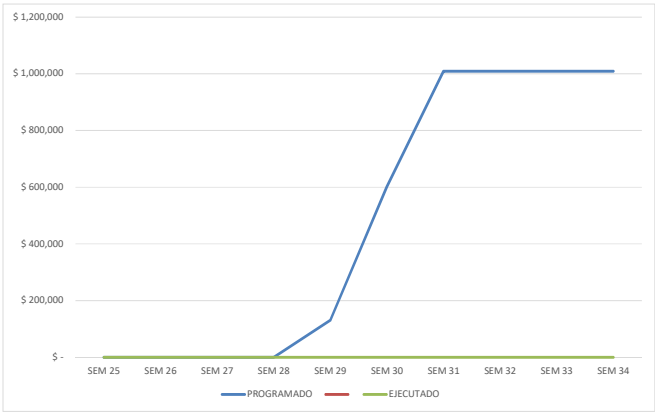

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ -	$ -	$ -
SEM 26	$ -	$ -	$ -
SEM 27	$ -	$ -	$ -
SEM 28	$ -	$ -	$ -
SEM 29	$ 130,405	$ -	$ -130,404.89
SEM 30	$ 601,808	$ -	$ -601,808.09
SEM 31	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 32	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 33	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 34	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	21/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	21/12/2020		22/12/2020		**-118.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	13/03/2021		28/12/2020		**-36.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		2/02/2021		**-102.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	17/03/2021		23/03/2021		**-32.00**	
	NO PREVISTAS	23/03/2021		31/03/2021		**-26.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	28/02/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
9					(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

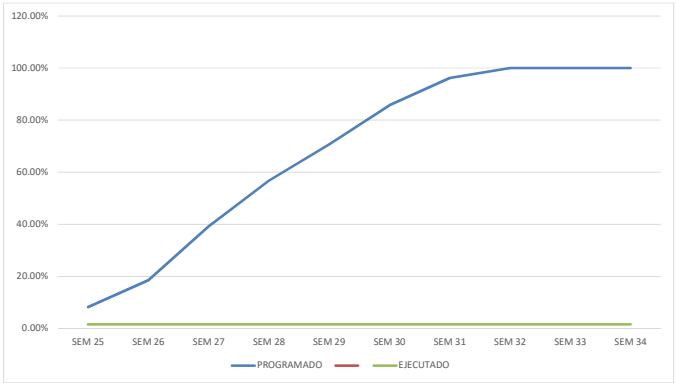

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	8.20%	1.59%	**-6.61%**
SEM 26	18.55%	1.59%	**-16.96%**
SEM 27	39.16%	1.59%	**-37.57%**
SEM 28	56.75%	1.59%	**-55.16%**
SEM 29	70.68%	1.59%	**-69.08%**
SEM 30	85.74%	1.59%	**-84.14%**
SEM 31	96.21%	1.59%	**-94.61%**
SEM 32	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 33	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 34	100.00%	1.59%	**-98.41%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

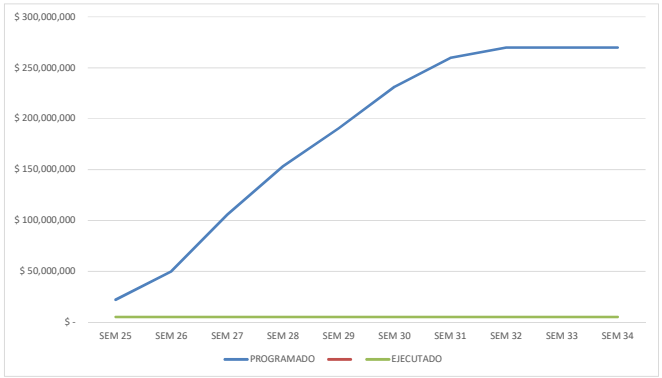

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 22,127,751	$ 5,293,269.28	**$ -16,834,481.37**
SEM 26	$ 50,049,468	$ 5,293,269.28	**$ -44,756,198.70**
SEM 27	$ 105,671,807	$ 5,293,269.28	**$ -100,378,537.48**
SEM 28	$ 153,137,455	$ 5,293,269.28	**$ -147,844,185.39**
SEM 29	$ 190,704,521	$ 5,293,269.28	**$ -185,411,251.48**
SEM 30	$ 231,340,869	$ 5,293,269.28	**$ -226,047,600.09**
SEM 31	$ 259,591,480	$ 5,293,269.28	**$ -254,298,210.27**
SEM 32	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 33	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 34	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	24/11/2020	8/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020	EJECUCION		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	12/02/2021		31/03/2021		**-65.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	23/02/2021		31/03/2021		**-54.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	24/02/2021		31/03/2021		**-53.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	24/02/2021		18/03/2021		**-53.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		6/03/2021		**-135.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	4/12/2020	8/10/2020	6/03/2021	EJECUCION	**57.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	26/01/2021		31/03/2021		**-82.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/02/2021		31/03/2021		**-55.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE REALIZÓ ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENT DE AIRES	0
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

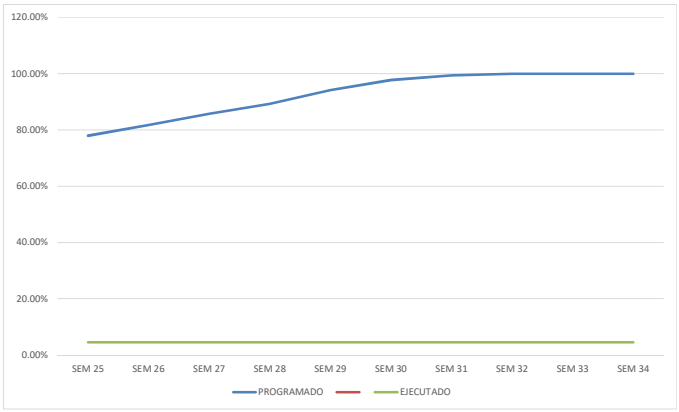

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	77.97%	4.55%	**-73.42%**
SEM 26	81.82%	4.55%	**-77.27%**
SEM 27	85.74%	4.55%	**-81.19%**
SEM 28	89.31%	4.55%	**-84.76%**
SEM 29	94.15%	4.55%	**-89.60%**
SEM 30	97.74%	4.55%	**-93.19%**
SEM 31	99.43%	4.55%	**-94.88%**
SEM 32	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 33	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 34	100.00%	4.55%	**-95.45%**
	ALERTAS		**-95.45%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

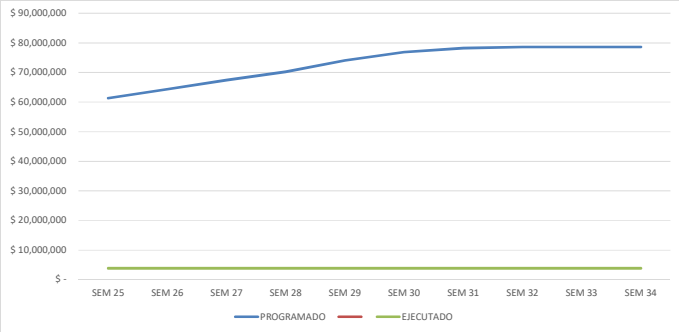

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 61,334,766	$ 3,868,158.32	**$ -57,466,607.51**
SEM 26	$ 64,363,986	$ 3,868,158.32	**$ -60,495,827.86**
SEM 27	$ 67,448,585	$ 3,868,158.32	**$ -63,580,426.85**
SEM 28	$ 70,260,586	$ 3,868,158.32	**$ -66,392,427.99**
SEM 29	$ 74,067,936	$ 3,868,158.32	**$ -70,199,777.38**
SEM 30	$ 76,890,131	$ 3,868,158.32	**$ -73,021,972.21**
SEM 31	$ 78,217,317	$ 3,868,158.32	**$ -74,349,158.78**
SEM 32	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 33	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 34	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020	9/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	EJECUCION		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/11/2020		31/03/2021		-166	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/02/2021		25/03/2021		-67	
5	LAVADO DE TANQUES	29/01/2021		24/02/2021		-79	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	17/02/2021		23/02/2021		-60	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020		23/12/2020		-146	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	23/11/2020	9/10/2020	23/12/2020	EJECUCION	45	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/11/2020		31/03/2021		-146	
	NO PREVISTO	15/01/2021		31/03/2021		-93	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3. SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE NAUTICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	4
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	4

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES.
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

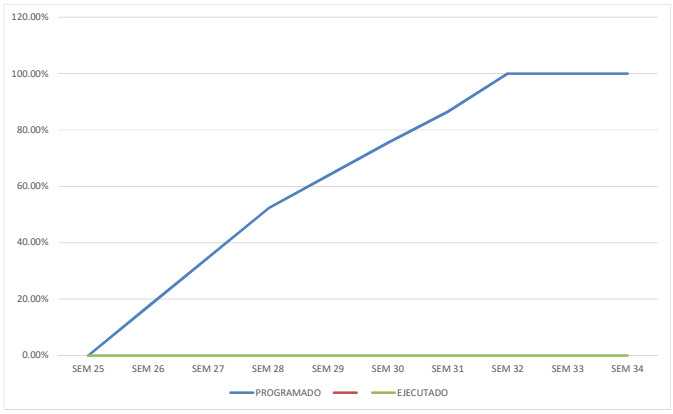

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 26	17.37%	0.00%	**-17.37%**
SEM 27	34.74%	0.00%	**-34.74%**
SEM 28	52.11%	0.00%	**-52.11%**
SEM 29	63.77%	0.00%	**-63.77%**
SEM 30	75.44%	0.00%	**-75.44%**
SEM 31	86.46%	0.00%	**-86.46%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

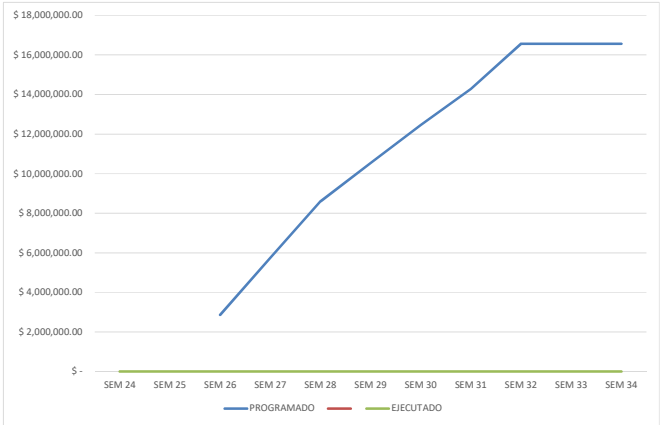

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 24		$ -	$ -
SEM 25		$ -	$ -
SEM 26	$ 2,868,231.93	$ -	$ -2,868,231.93
SEM 27	$ 5,736,463.85	$ -	$ -5,736,463.85
SEM 28	$ 8,604,695.78	$ -	$ -8,604,695.78
SEM 29	$ 10,531,150.05	$ -	$ -10,531,150.05
SEM 30	$ 12,457,604.32	$ -	$ -12,457,604.32
SEM 31	$ 14,277,602.82	$ -	$ -14,277,602.82
SEM 32	$ 16,563,014.78	$ -	$ -16,563,014.78
SEM 33	$ 16,563,014.78	$ -	$ -16,563,014.78
SEM 34	$ 16,563,014.78	$ -	$ -16,563,014.78

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	14/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	16/02/2021		26/03/2021		**-61.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/03/2021		31/03/2021		**-23.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/02/2021		31/03/2021		**-61.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES	16/02/2021		6/03/2021		**-61.00**	
	NO PREVISTAS	13/03/2021		31/03/2021		**-36.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/02/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

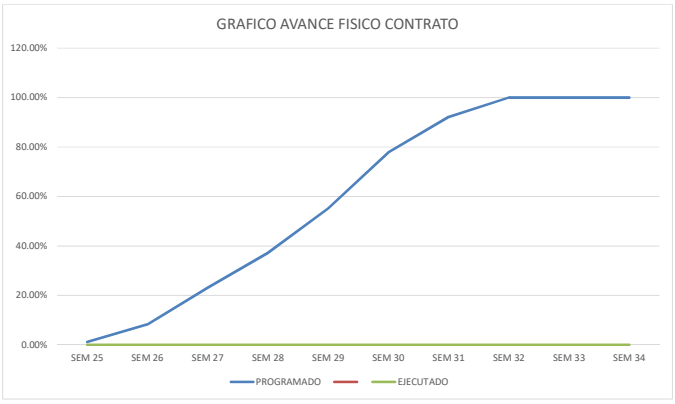

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	1.16%	0.00%	**-1.16%**
SEM 26	8.29%	0.00%	**-8.29%**
SEM 27	23.11%	0.00%	**-23.11%**
SEM 28	37.19%	0.00%	**-37.19%**
SEM 29	55.16%	0.00%	**-55.16%**
SEM 30	77.84%	0.00%	**-77.84%**
SEM 31	92.18%	0.00%	**-92.18%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

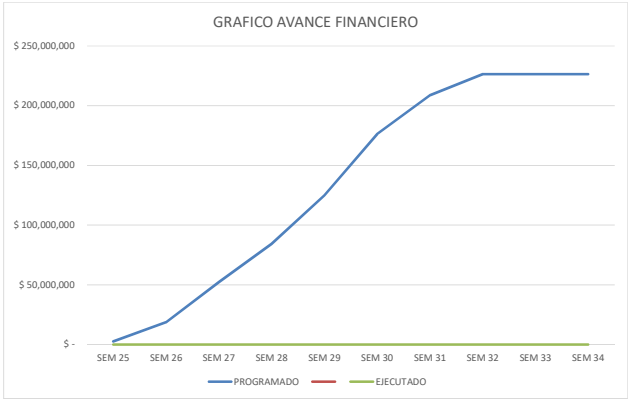

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 25	$ 2,636,188	$ -	**$ -2,636,187.78**
SEM 26	$ 18,781,723	$ -	**$ -18,781,723.16**
SEM 27	$ 52,336,250	$ -	**$ -52,336,249.55**
SEM 28	$ 84,203,036	$ -	**$ -84,203,036.06**
SEM 29	$ 124,906,423	$ -	**$ -124,906,422.94**
SEM 30	$ 176,260,309	$ -	**$ -176,260,309.03**
SEM 31	$ 208,725,076	$ -	**$ -208,725,076.37**
SEM 32	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 33	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 34	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	14/01/2021		31/03/2021		**-94.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	18/03/2021		31/03/2021		**-31.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/02/2021		31/03/2021		**-50.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	16/02/2021		25/02/2021		**-61.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	15/03/2021		23/03/2021		**-34.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18/02/2021		31/03/2021		**-59.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	16/02/2021		31/03/2021		**-61.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		31/03/2021		**-72.00**	
	NO PREVISTOS	5/02/2021		31/03/2021		**-72.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA PRÓRROGA No. 3.
NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
8/01/2021	14/02/2021	SEMANA No. 25	14-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
15/01/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/01/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

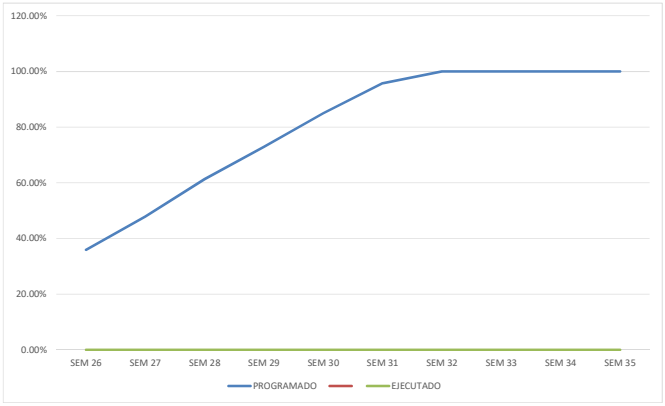

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	35.94%	0.00%	**-35.94%**
SEM 27	47.90%	0.00%	**-47.90%**
SEM 28	61.32%	0.00%	**-61.32%**
SEM 29	73.00%	0.00%	**-73.00%**
SEM 30	84.99%	0.00%	**-84.99%**
SEM 31	95.77%	0.00%	**-95.77%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTA		**-53.18%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

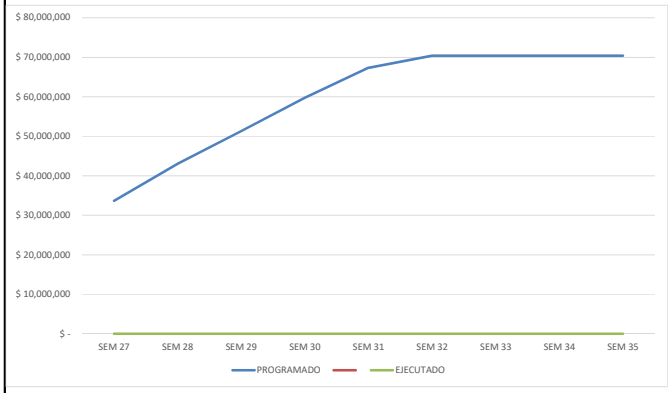

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 33,692,159	$ -	**$ -33,692,158.50**
SEM 28	$ 43,130,846	$ -	**$ -43,130,846.07**
SEM 29	$ 51,350,628	$ -	**$ -51,350,628.16**
SEM 30	$ 59,782,428	$ -	**$ -59,782,427.64**
SEM 31	$ 67,366,159	$ -	**$ -67,366,158.80**
SEM 32	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 33	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 34	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 35	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	30/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	18/03/2021		31/03/2021		**-38.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		15/03/2021		**-66.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	18/02/2021		2/03/2021		**-66.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	18/02/2021		15/03/2021		**-66.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/02/2021		9/02/2021		**-79.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	5/02/2021		31/03/2021		**-79.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		19/02/2021		**-79.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION


SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA





Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS





Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

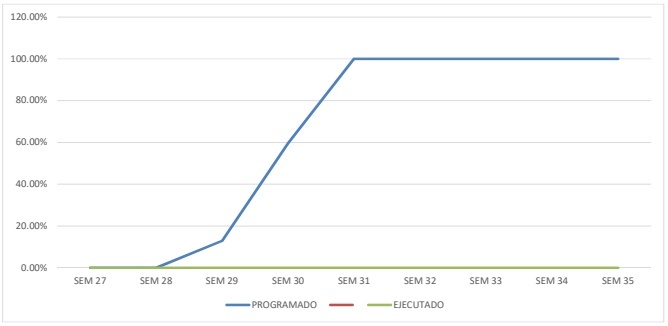

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 28	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 29	12.92%	0.00%	**-12.92%**
SEM 30	59.65%	0.00%	**-59.65%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

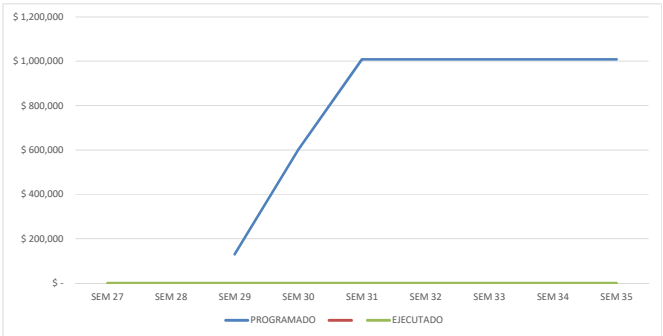

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27		$ -	$ -
SEM 28		$ -	$ -
SEM 29	$ 130,405	$ -	$ -130,404.89
SEM 30	$ 601,808	$ -	$ -601,808.09
SEM 31	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 32	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 33	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 34	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 35	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	21/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	21/12/2020		22/12/2020		**-125.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	13/03/2021		28/12/2020		**-43.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		2/02/2021		**-109.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	17/03/2021		23/03/2021		**-39.00**	
	NO PREVISTAS	23/03/2021		31/03/2021		**-33.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	28/02/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA









Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS			MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

9 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

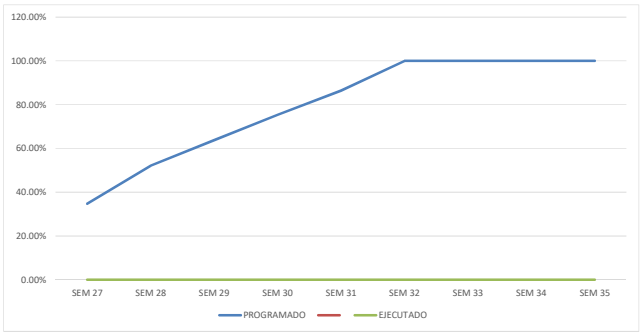

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	34.74%	0.00%	**-34.74%**
SEM 28	52.11%	0.00%	**-52.11%**
SEM 29	63.77%	0.00%	**-63.77%**
SEM 30	75.44%	0.00%	**-75.44%**
SEM 31	86.46%	0.00%	**-86.46%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

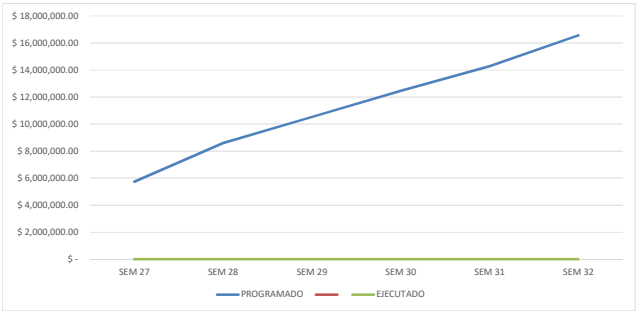

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 5,736,463.85	$ -	**$ -5,736,463.85**
SEM 28	$ 8,604,695.78	$ -	**$ -8,604,695.78**
SEM 29	$ 10,531,150.05	$ -	**$ -10,531,150.05**
SEM 30	$ 12,457,604.32	$ -	**$ -12,457,604.32**
SEM 31	$ 14,277,602.82	$ -	**$ -14,277,602.82**
SEM 32	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 33	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 34	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 35	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	14/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	16/02/2021		26/03/2021		**-68.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/03/2021		31/03/2021		**-30.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/02/2021		31/03/2021		**-68.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES	16/02/2021		6/03/2021		**-68.00**	
	NO PREVISTAS	13/03/2021		31/03/2021		**-43.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

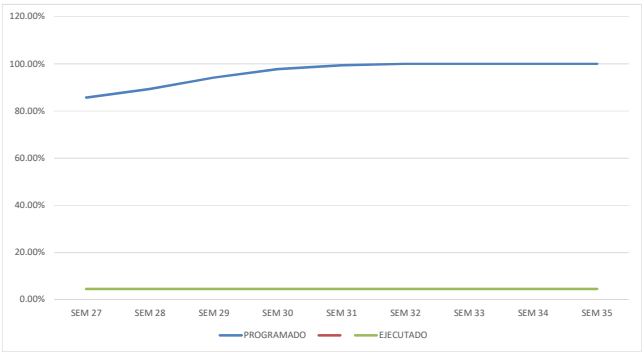

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	85.74%	4.55%	**-81.19%**
SEM 28	89.31%	4.55%	**-84.76%**
SEM 29	94.15%	4.55%	**-89.60%**
SEM 30	97.74%	4.55%	**-93.19%**
SEM 31	99.43%	4.55%	**-94.88%**
SEM 32	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 33	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 34	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 35	100.00%	4.55%	**-95.45%**
	ALERTAS		**-95.45%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

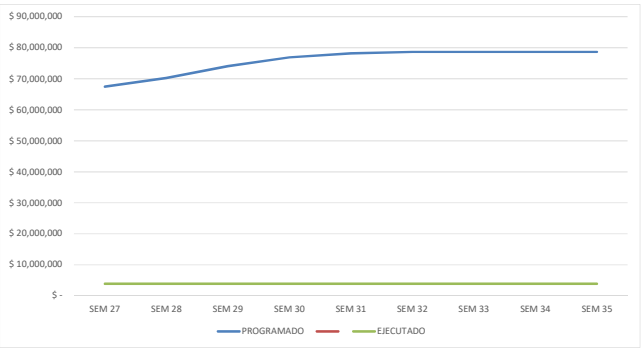

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 67,448,585	$ 3,868,158.32	**$ -63,580,426.85**
SEM 28	$ 70,260,586	$ 3,868,158.32	**$ -66,392,427.99**
SEM 29	$ 74,067,936	$ 3,868,158.32	**$ -70,199,777.38**
SEM 30	$ 76,890,131	$ 3,868,158.32	**$ -73,021,972.21**
SEM 31	$ 78,217,317	$ 3,868,158.32	**$ -74,349,158.78**
SEM 32	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 33	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 34	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 35	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020	9/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	EJECUCION		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/11/2020		31/03/2021		-173	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/02/2021		25/03/2021		-74	
5	LAVADO DE TANQUES	29/01/2021		24/02/2021		-86	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	17/02/2021		23/02/2021		-67	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020		23/12/2020		-153	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	23/11/2020	9/10/2020	23/12/2020	EJECUCION	45	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/11/2020		31/03/2021		-153	
	NO PREVISTO	15/01/2021		31/03/2021		-100	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	4
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	4

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES.
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA






Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS







Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

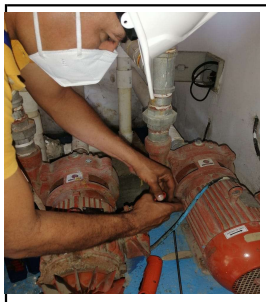



Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

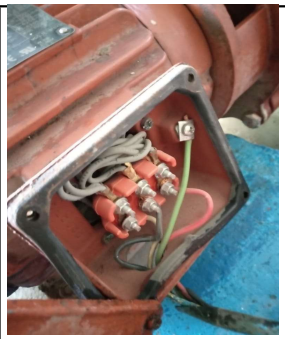

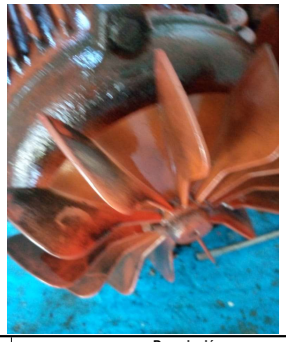

Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

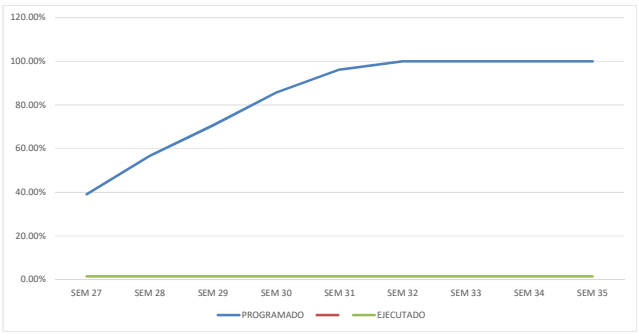

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	39.16%	1.59%	**-37.57%**
SEM 28	56.75%	1.59%	**-55.16%**
SEM 29	70.68%	1.59%	**-69.08%**
SEM 30	85.74%	1.59%	**-84.14%**
SEM 31	96.21%	1.59%	**-94.61%**
SEM 32	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 33	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 34	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 35	100.00%	1.59%	**-98.41%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

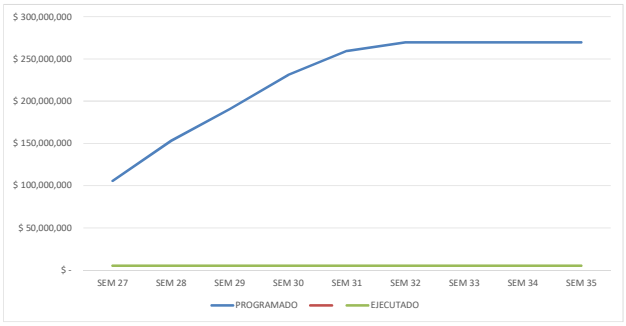

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 105,671,807	$ 5,293,269.28	**$ -100,378,537.48**
SEM 28	$ 153,137,455	$ 5,293,269.28	**$ -147,844,185.39**
SEM 29	$ 190,704,521	$ 5,293,269.28	**$ -185,411,251.48**
SEM 30	$ 231,340,869	$ 5,293,269.28	**$ -226,047,600.09**
SEM 31	$ 259,591,480	$ 5,293,269.28	**$ -254,298,210.27**
SEM 32	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 33	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 34	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 35	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	24/11/2020	8/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020	EJECUCION		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	12/02/2021		31/03/2021		**-72.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	23/02/2021		31/03/2021		**-61.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	24/02/2021		31/03/2021		**-60.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	24/02/2021		18/03/2021		**-60.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		6/03/2021		**-142.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	4/12/2020	8/10/2020	6/03/2021	EJECUCION	**57.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	26/01/2021		31/03/2021		**-89.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/02/2021		31/03/2021		**-62.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENT DE AIRES	4
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	4

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN LA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION


SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE



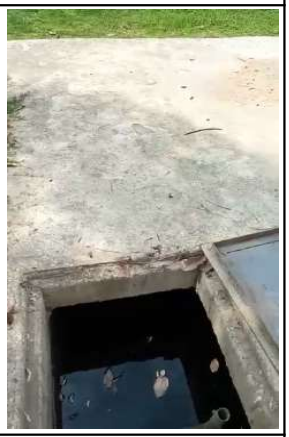

Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

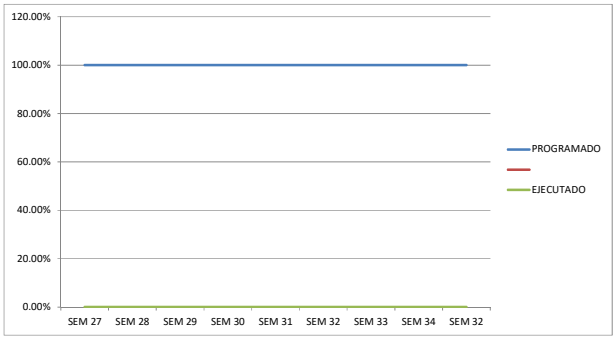

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 28	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 29	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 30	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

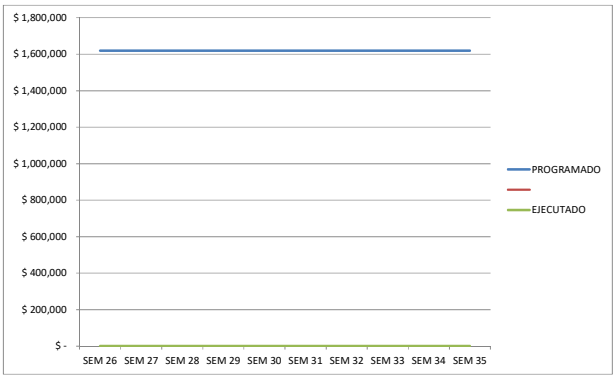

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 27	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 28	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 29	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 30	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 31	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 32	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 33	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 34	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 35	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	7/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	7/12/2020		31/12/2020		**-139.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/12/2020		18/12/2020		**-137.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	18/12/2020		24/12/2020		**-128.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		18/12/2020		**-137.00**	
	NO PREVISTAS	9/12/2020		31/12/2020		**-137.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA









Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS			MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

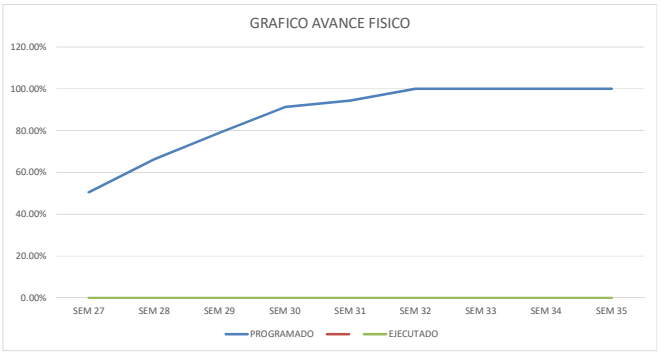

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	50.50%	0.00%	**-50.50%**
SEM 28	66.32%	0.00%	**-66.32%**
SEM 29	78.99%	0.00%	**-78.99%**
SEM 30	91.24%	0.00%	**-91.24%**
SEM 31	94.36%	0.00%	**-94.36%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

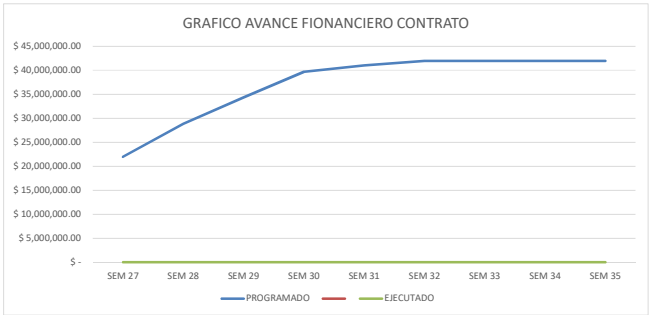

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 21,965,276.52	$ -	**$ -21,965,276.52**
SEM 28	$ 28,845,062.61	$ -	**$ -28,845,062.61**
SEM 29	$ 34,353,609.68	$ -	**$ -34,353,609.68**
SEM 30	$ 39,683,320.11	$ -	**$ -39,683,320.11**
SEM 31	$ 41,039,164.86	$ -	**$ -41,039,164.86**
SEM 32	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 33	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 34	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 35	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2021		**-159.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/01/2021		31/03/2021		**-92.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

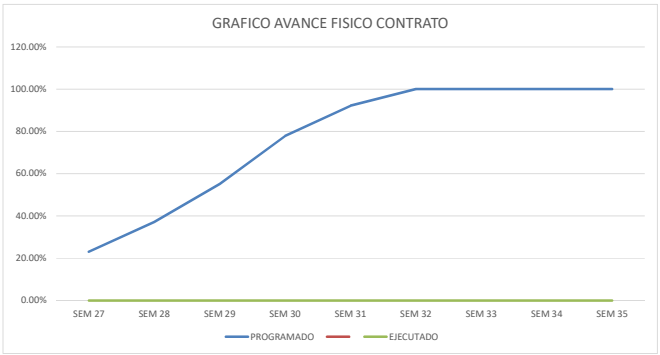

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	23.11%	0.00%	**-23.11%**
SEM 28	37.19%	0.00%	**-37.19%**
SEM 29	55.16%	0.00%	**-55.16%**
SEM 30	77.84%	0.00%	**-77.84%**
SEM 31	92.18%	0.00%	**-92.18%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

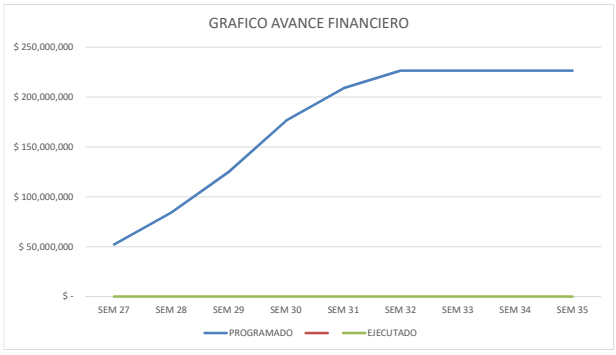

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 52,336,250	$ -	**$ -52,336,249.55**
SEM 28	$ 84,203,036	$ -	**$ -84,203,036.06**
SEM 29	$ 124,906,423	$ -	**$ -124,906,422.94**
SEM 30	$ 176,260,309	$ -	**$ -176,260,309.03**
SEM 31	$ 208,725,076	$ -	**$ -208,725,076.37**
SEM 32	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 33	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 34	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 35	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	14/01/2021		31/03/2021		**-101.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	18/03/2021		31/03/2021		**-38.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/02/2021		31/03/2021		**-57.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	16/02/2021		25/02/2021		**-68.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	15/03/2021		23/03/2021		**-41.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18/02/2021		31/03/2021		**-66.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	16/02/2021		31/03/2021		**-68.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		31/03/2021		**-79.00**	
	NO PREVISTOS	5/02/2021		31/03/2021		**-79.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**66**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
15/01/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	21-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
22/01/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	28-feb	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

VEINTISEIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA









Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS			MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

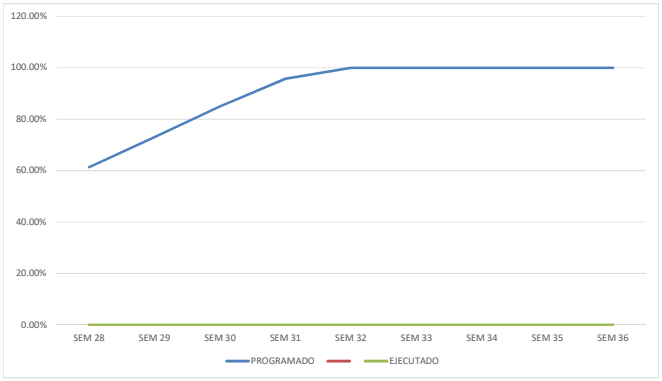

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	61.32%	0.00%	**-61.32%**
SEM 29	73.00%	0.00%	**-73.00%**
SEM 30	84.99%	0.00%	**-84.99%**
SEM 31	95.77%	0.00%	**-95.77%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTA		**-53.18%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

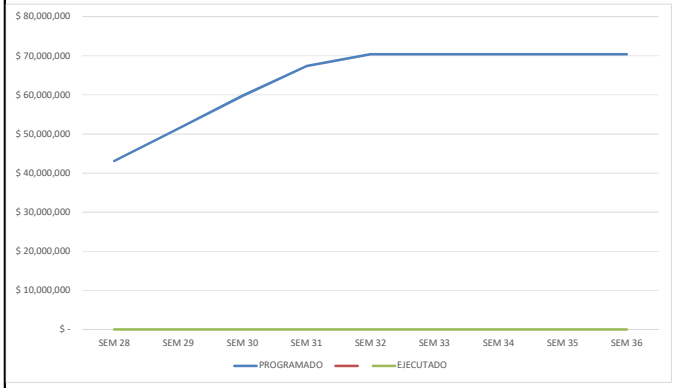

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 43,130,846	$ -	**$ -43,130,846.07**
SEM 29	$ 51,350,628	$ -	**$ -51,350,628.16**
SEM 30	$ 59,782,428	$ -	**$ -59,782,427.64**
SEM 31	$ 67,366,159	$ -	**$ -67,366,158.80**
SEM 32	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 33	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 34	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 35	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**
SEM 36	$ 70,389,608	$ -	**$ -70,389,607.99**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	30/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	18/03/2021		31/03/2021		**-45.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	18/02/2021		15/03/2021		**-73.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	18/02/2021		2/03/2021		**-73.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	18/02/2021		15/03/2021		**-73.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/02/2021		9/02/2021		**-86.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	5/02/2021		31/03/2021		**-86.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		19/02/2021		**-86.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,SE ENTRAGAN DOCUMENTOS DE PERSONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SE ENTREGA DOCUMENTACION DE PERSONAL

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

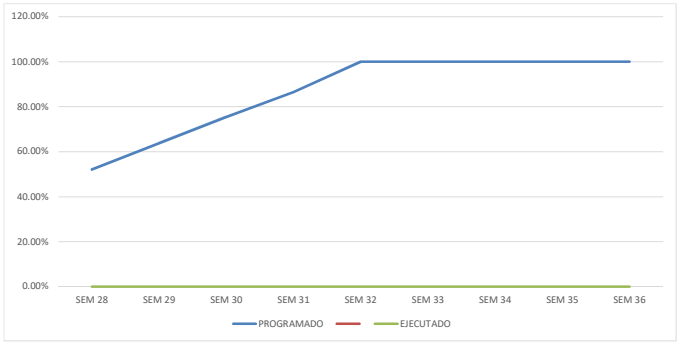

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	52.11%	0.00%	**-52.11%**
SEM 29	63.77%	0.00%	**-63.77%**
SEM 30	75.44%	0.00%	**-75.44%**
SEM 31	86.46%	0.00%	**-86.46%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

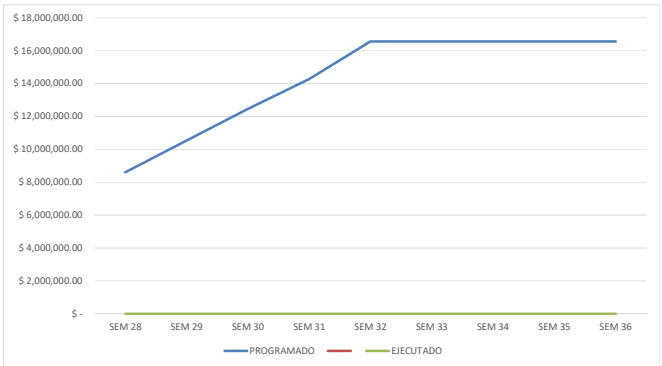

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 8,604,695.78	$ -	**$ -8,604,695.78**
SEM 29	$ 10,531,150.05	$ -	**$ -10,531,150.05**
SEM 30	$ 12,457,604.32	$ -	**$ -12,457,604.32**
SEM 31	$ 14,277,602.82	$ -	**$ -14,277,602.82**
SEM 32	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 33	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 34	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 35	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**
SEM 36	$ 16,563,014.78	$ -	**$ -16,563,014.78**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
1	**SEDES BOLIVAR**						
2	**Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera**	14/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	16/02/2021		26/03/2021		**-61.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	26/03/2021		31/03/2021		**-23.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/02/2021		31/03/2021		**-61.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES	16/02/2021		6/03/2021		**-61.00**	
	NO PREVISTAS	13/03/2021		31/03/2021		**-36.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

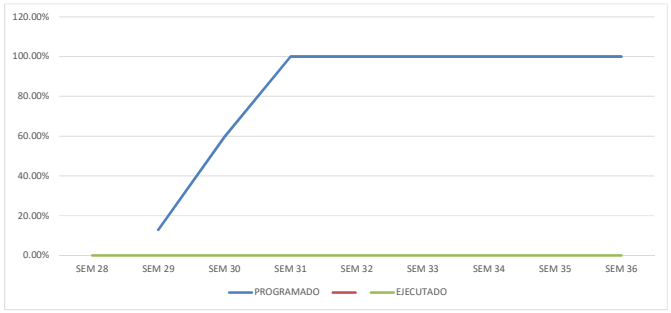

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28		0.00%	**0.00%**
SEM 29	12.92%	0.00%	**-12.92%**
SEM 30	59.65%	0.00%	**-59.65%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28		$ -	$ -
SEM 29	$ 130,405	$ -	$ -130,404.89
SEM 30	$ 601,808	$ -	$ -601,808.09
SEM 31	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 32	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 33	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 34	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 35	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65
SEM 36	$ 1,008,983	$ -	$ -1,008,982.65

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	21/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	21/12/2020		22/12/2020		**-132.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	13/03/2021		28/12/2020		**-50.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	6/01/2021		2/02/2021		**-116.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	17/03/2021		23/03/2021		**-46.00**	
	NO PREVISTAS	23/03/2021		31/03/2021		**-40.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES , ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	28/02/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES , ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

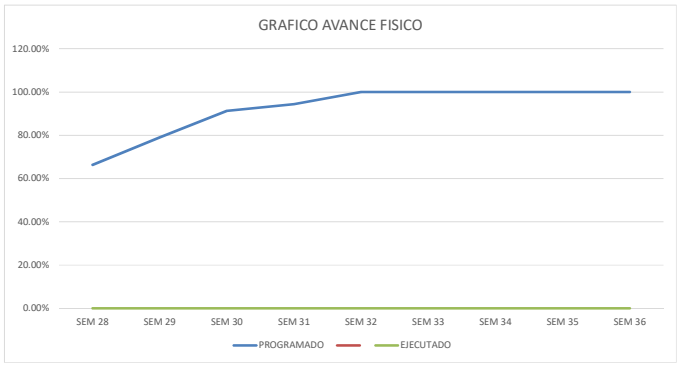

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	66.32%	0.00%	**-66.32%**
SEM 29	78.99%	0.00%	**-78.99%**
SEM 30	91.24%	0.00%	**-91.24%**
SEM 31	94.36%	0.00%	**-94.36%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

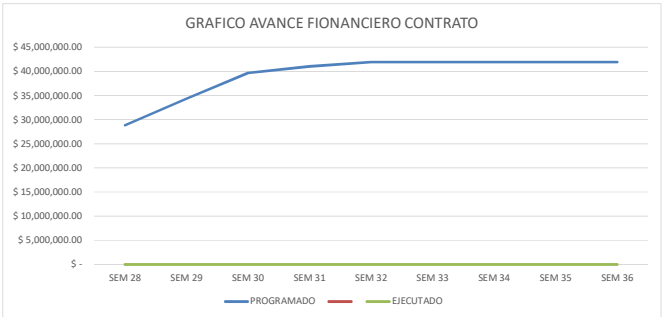

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 28,845,062.61	$ -	**$ -28,845,062.61**
SEM 29	$ 34,353,609.68	$ -	**$ -34,353,609.68**
SEM 30	$ 39,683,320.11	$ -	**$ -39,683,320.11**
SEM 31	$ 41,039,164.86	$ -	**$ -41,039,164.86**
SEM 32	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 33	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 34	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 35	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**
SEM 36	$ 41,943,061.36	$ -	**$ -41,943,061.36**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2021		**-166.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/01/2021		31/03/2021		**-99.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURDURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

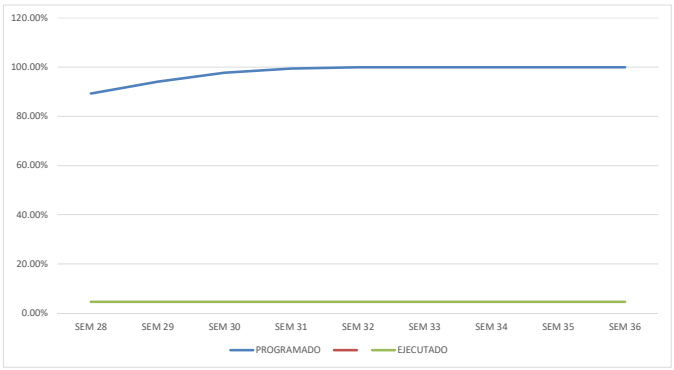

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	89.31%	4.55%	**-84.76%**
SEM 29	94.15%	4.55%	**-89.60%**
SEM 30	97.74%	4.55%	**-93.19%**
SEM 31	99.43%	4.55%	**-94.88%**
SEM 32	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 33	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 34	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 35	100.00%	4.55%	**-95.45%**
SEM 36	100.00%	4.55%	**-95.45%**
	ALERTAS		**-95.45%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

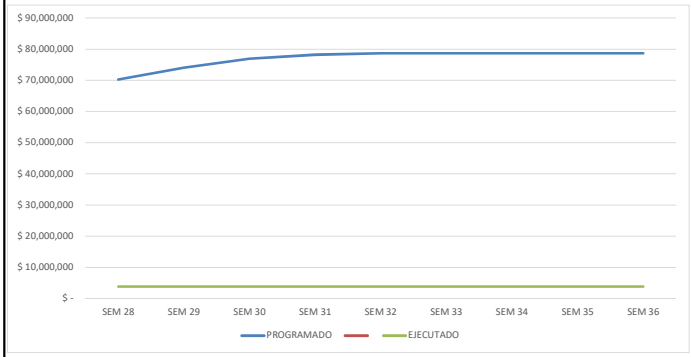

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 70,260,586	$ 3,868,158.32	**$ -66,392,427.99**
SEM 29	$ 74,067,936	$ 3,868,158.32	**$ -70,199,777.38**
SEM 30	$ 76,890,131	$ 3,868,158.32	**$ -73,021,972.21**
SEM 31	$ 78,217,317	$ 3,868,158.32	**$ -74,349,158.78**
SEM 32	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 33	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 34	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 35	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**
SEM 36	$ 78,658,610	$ 3,868,158.32	**$ -74,790,451.45**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020	9/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	EJECUCION		
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	3/11/2020		31/03/2021		-180	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/02/2021		25/03/2021		-81	
5	LAVADO DE TANQUES	29/01/2021		24/02/2021		-93	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	17/02/2021		23/02/2021		-74	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	23/11/2020		23/12/2020		-160	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	23/11/2020	9/10/2020	23/12/2020	EJECUCION	45	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	23/11/2020		31/03/2021		-160	
	NO PREVISTO	15/01/2021		31/03/2021		-107	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	0
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

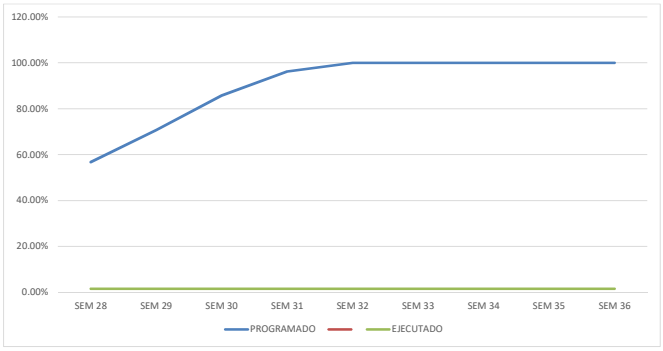

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	56.75%	1.59%	**-55.16%**
SEM 29	70.68%	1.59%	**-69.08%**
SEM 30	85.74%	1.59%	**-84.14%**
SEM 31	96.21%	1.59%	**-94.61%**
SEM 32	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 33	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 34	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 35	100.00%	1.59%	**-98.41%**
SEM 36	100.00%	1.59%	**-98.41%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

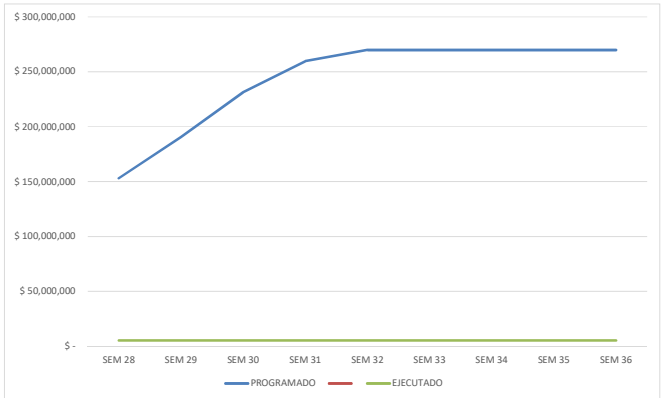

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 153,137,455	$ 5,293,269.28	**$ -147,844,185.39**
SEM 29	$ 190,704,521	$ 5,293,269.28	**$ -185,411,251.48**
SEM 30	$ 231,340,869	$ 5,293,269.28	**$ -226,047,600.09**
SEM 31	$ 259,591,480	$ 5,293,269.28	**$ -254,298,210.27**
SEM 32	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 33	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 34	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 35	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**
SEM 36	$ 269,840,052	$ 5,293,269.28	**$ -264,546,782.44**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	24/11/2020	8/10/2020	31/03/2021	EJECUCION		
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020	EJECUCION		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	12/02/2021		31/03/2021		**-79.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	23/02/2021		31/03/2021		**-68.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	24/02/2021		31/03/2021		**-67.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	24/02/2021		18/03/2021		**-67.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	4/12/2020		6/03/2021		**-149.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	4/12/2020	8/10/2020	6/03/2021	EJECUCION	**57.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	26/01/2021		31/03/2021		**-96.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	22/02/2021		31/03/2021		**-69.00**	
28							
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENT DE AIRES	0
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE





Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

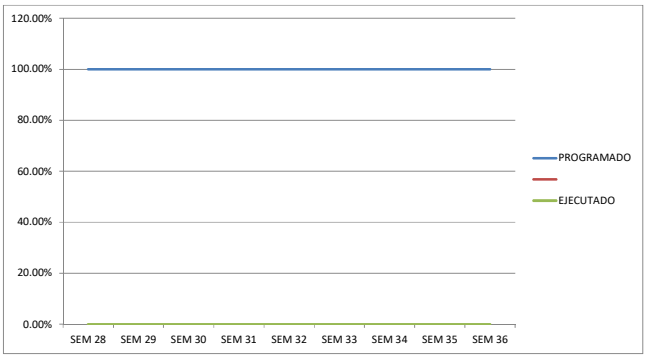

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 29	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 30	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 31	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

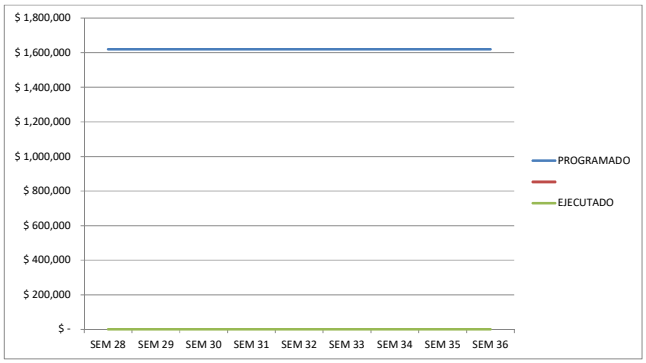

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 29	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 30	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 31	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 32	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 33	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 34	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 35	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 36	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	7/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	7/12/2020		31/12/2020		**-146.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/12/2020		18/12/2020		**-144.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	18/12/2020		24/12/2020		**-135.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9/12/2020		18/12/2020		**-144.00**	
	NO PREVISTAS	9/12/2020		31/12/2020		**-144.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

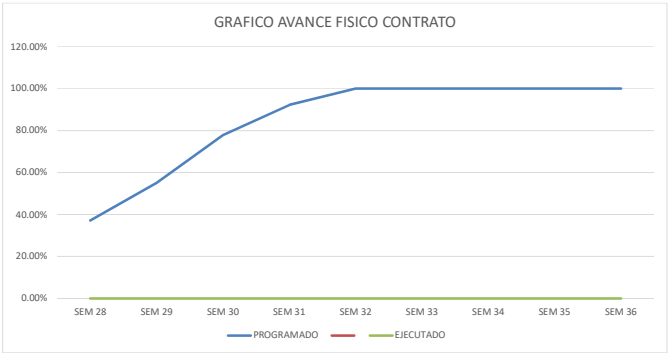

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	37.19%	0.00%	**-37.19%**
SEM 29	55.16%	0.00%	**-55.16%**
SEM 30	77.84%	0.00%	**-77.84%**
SEM 31	92.18%	0.00%	**-92.18%**
SEM 32	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 33	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 34	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 35	100.00%	0.00%	**-100.00%**
SEM 36	100.00%	0.00%	**-100.00%**
	ALERTAS		**-100.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

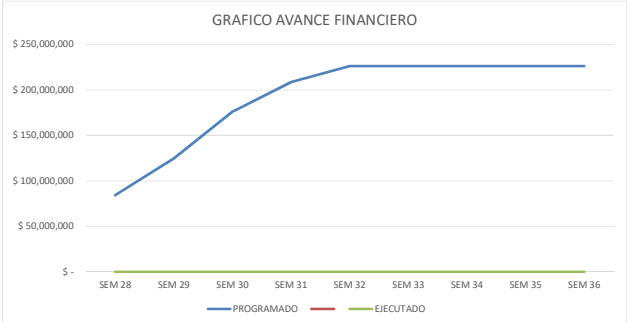

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 84,203,036	$ -	**$ -84,203,036.06**
SEM 29	$ 124,906,423	$ -	**$ -124,906,422.94**
SEM 30	$ 176,260,309	$ -	**$ -176,260,309.03**
SEM 31	$ 208,725,076	$ -	**$ -208,725,076.37**
SEM 32	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 33	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 34	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 35	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**
SEM 36	$ 226,449,048	$ -	**$ -226,449,047.96**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	17/11/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	14/01/2021		31/03/2021		**-108.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	18/03/2021		31/03/2021		**-45.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/02/2021		31/03/2021		**-64.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	16/02/2021		25/02/2021		**-75.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	15/03/2021		23/03/2021		**-48.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18/02/2021		31/03/2021		**-73.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	16/02/2021		31/03/2021		**-75.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/02/2021		31/03/2021		**-86.00**	
	NO PREVISTOS	5/02/2021		31/03/2021		**-86.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**59**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	7-mar	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS AJUSTES Y OBSERVACIONES DE LOS PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS , NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	14-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	21-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	28-mar	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

TRES	3	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

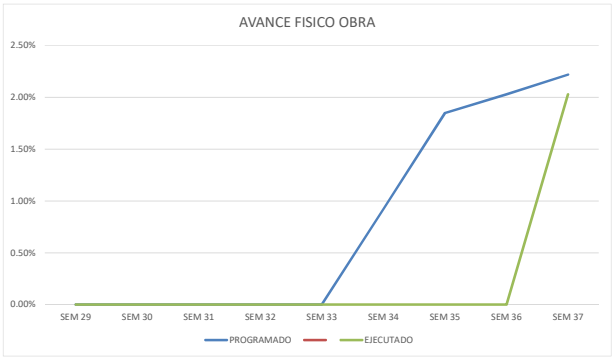

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.92%	0.00%	**-0.92%**
SEM 35	1.85%	0.00%	**-1.85%**
SEM 36	2.03%	0.00%	**-2.03%**
SEM 37	2.22%	2.03%	**-0.19%**
	ALERTA		**-0.19%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

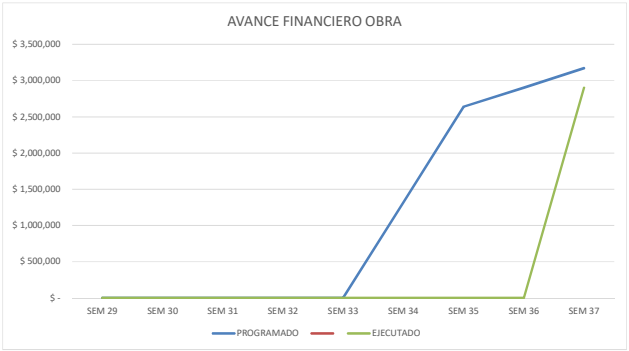

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 1,320,022	$ -	$ -1,320,022.34
SEM 35	$ 2,640,045	$ -	$ -2,640,044.68
SEM 36	$ 2,901,147	$ -	$ -2,901,147.15
SEM 37	$ 3,172,461	$ 2,901,148.38	$ -271,312.21

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**					
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	16/04/2021		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/05/2021		30/06/2021		**6.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	23/04/2021	**-7.00**	**7.00**
5	LAVADO DE TANQUES	5/05/2021		15/05/2021		**-4.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1/06/2021		21/06/2021		**23.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15/05/2021		19/06/2021		**6.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		12/06/2021		**15.00**	
	NO PREVISTOS	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,SE ENTRAGAN DOCUMENTOS DE PERSONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SE ENTREGA DOCUMENTACION DE PERSONAL
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SE ENTREGA DOCUMENTACION DE PERSONAL

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

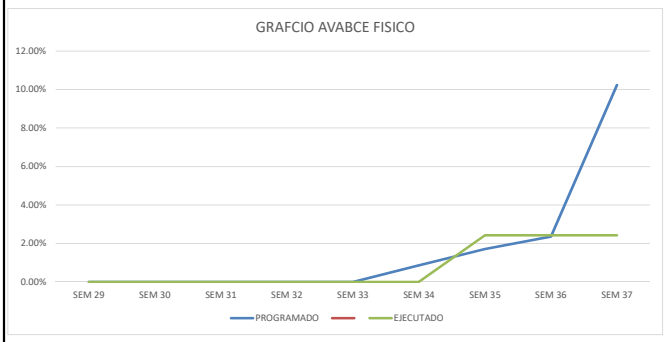

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.86%	0.00%	**-0.86%**
SEM 35	1.72%	2.42%	**0.71%**
SEM 36	2.36%	2.42%	**0.06%**
SEM 37	10.24%	2.42%	**-7.81%**
		ALERTAS	**-7.81%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

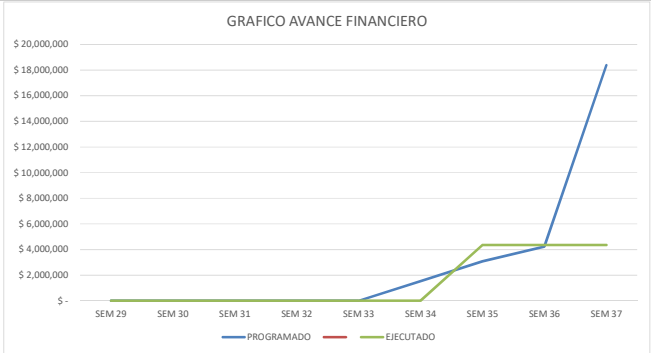

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 1,540,499	$ -	$ -1,540,499.48
SEM 35	$ 3,080,999	$ 4,354,283.96	$ 1,273,285.00
SEM 36	$ 4,240,270	$ 4,354,283.96	$ 114,013.97
SEM 37	$ 18,385,459	$ 4,354,283.96	$ -14,031,174.63

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	16/04/2021		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	9/10/2020		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/05/2021		30/06/2021		**6.0**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021	24/04/2021	30/06/2021	24/04/2021	**-8.00**	
	LAVADO DE TANQUES	5/05/2021		15/05/2021		**-4.0**	
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1/06/2021		21/06/2021		**23.0**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**-2.0**	
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	23/11/2020	9/10/2020	23/12/2020	EJECUCION	**45.00**	
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15/05/2021		19/06/2021		**6.0**	
	NO PREVISTO	7/05/2021		30/06/2021		**-2.0**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	0
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

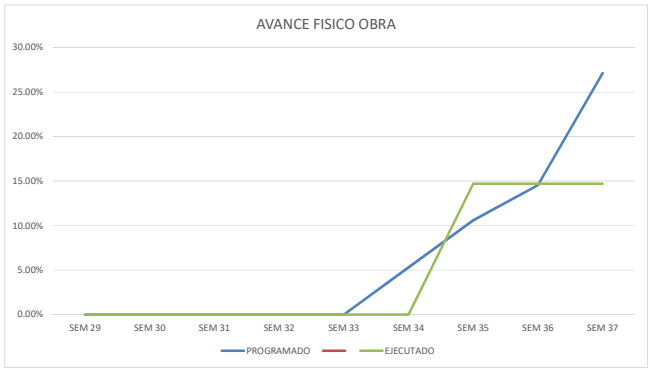

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	5.29%	0.00%	**-5.29%**
SEM 35	10.58%	14.69%	**4.11%**
SEM 36	14.55%	14.69%	**0.15%**
SEM 37	27.14%	14.69%	**-12.45%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

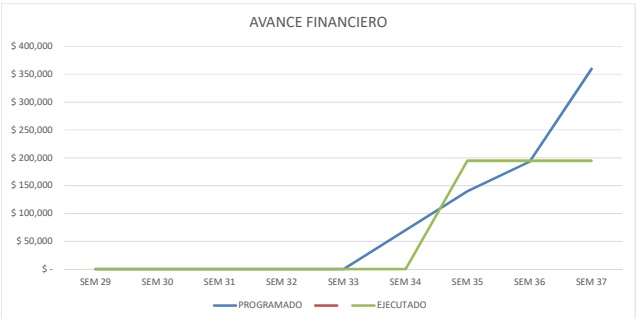

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 70,068	$ -	$ -70,067.73
SEM 35	$ 140,135	$ 194,633.53	$ 54,498.08
SEM 36	$ 192,686	$ 194,633.53	$ 1,947.60
SEM 37	$ 359,502	$ 194,633.53	$ -164,868.80

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	21/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOCOS BIOSEGURIDAD	21/12/2020		22/12/2020			
4	EQUIPO DE BOMBEOS	16/04/2021		30/04/2021		**-23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/05/2021		15/05/2021		**-4.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	NO PREVISTOS	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES , ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES , ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES , ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

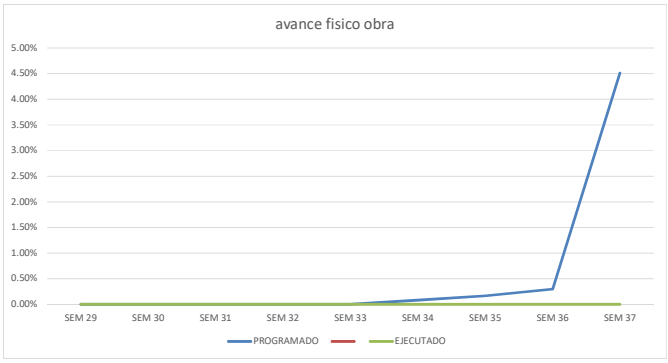

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.08%	0.00%	**-0.08%**
SEM 35	0.16%	0.00%	**-0.16%**
SEM 36	0.30%	0.00%	**-0.30%**
SEM 37	4.51%	0.00%	**-4.51%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

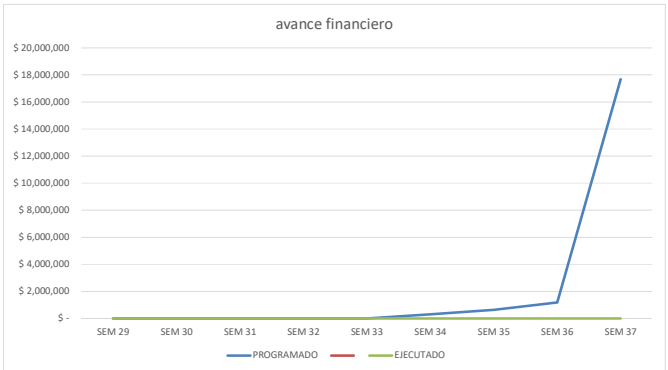

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 320,591	$ -	$ -320,591.18
SEM 35	$ 641,182	$ -	$ -641,182.36
SEM 36	$ 1,175,503	$ -	$ -1,175,502.64
SEM 37	$ 17,671,913	$ -	$ -17,671,912.64

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	16/04/2021		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020	EJECUCION		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	17/05/2021		26/06/2021		**8.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/05/2021		30/06/2021		**6.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	24/05/2021		29/05/2021		**15.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021		30/04/2021		**-23.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	4/12/2020	8/10/2020	6/03/2021	EJECUCION	**57.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15/05/2021		12/06/2021		**6.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		12/06/2021		**15.00**	
	NO PREVISTOS	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENT DE AIRES	0
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.
3/03/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE LOGRÓ REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE MOTOBOMBAS EL CUAL NOS ENCONTRAMOS QUE LAS MOTOBOMBAS ESTAN SUMERGIDAS Y/O EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE ACCESO POR ESTAR LLENO DE AGUA, LO QUE IMPOSIBILITÓ LA ACTIVIDAD, SE RECOMENDÓ AL CONTTRATISTA Y AL SUPERVISOR DEL SENA REALIZAR EL MANTENMIMIENTO EN EL MOMENTO DE QUE SE EJECUTE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE TANQUES Y A SU VEZ RELIZAR COMITÉ PARA DEFINIR REUBICACION DE LAS MOTOBOMBAS DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO CUAL EN SU UBICACION ACTUAL SERÍA UN GRAVE PELIGRO DE MANIPULACION.

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE





Georeferenciación	Descripción
	MOTOBOMBAS DENTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

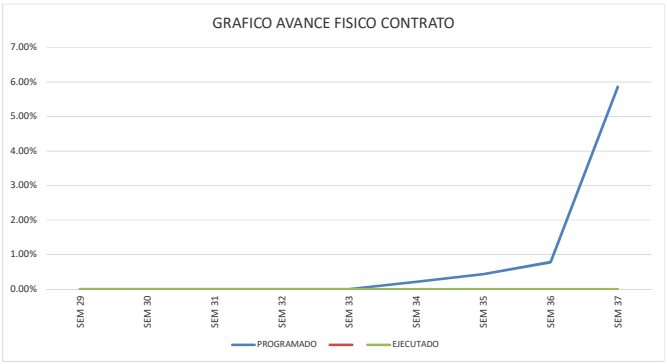

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.21%	0.00%	**-0.21%**
SEM 35	0.43%	0.00%	**-0.43%**
SEM 36	0.78%	0.00%	**-0.78%**
SEM 37	5.86%	0.00%	**-5.86%**
	ALERTAS		**-5.86%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

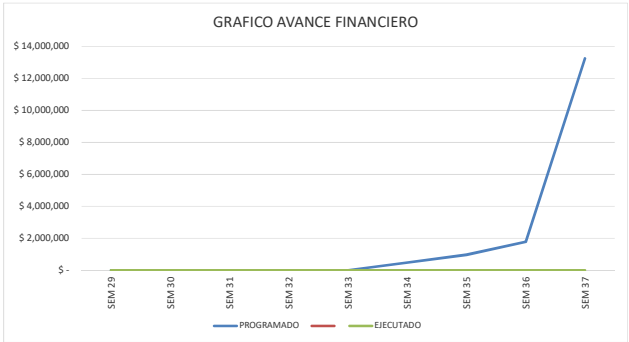

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 484,947	$ -	$ -484,947.45
SEM 35	$ 969,895	$ -	$ -969,894.90
SEM 36	$ 1,772,263	$ -	$ -1,772,263.29
SEM 37	$ 13,260,000	$ -	$ -13,259,999.87

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	17/11/2020		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/05/2021		30/06/2021		**6.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	17/05/2021		22/05/2021		**8.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021		30/04/2021		**-23.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/05/2021		15/05/2021		**-4.00**	
6	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1/06/2021		21/06/2021		**23.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15/05/2021		19/06/2021		**6.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		12/06/2021		**15.00**	
	NO PREVISTOS	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

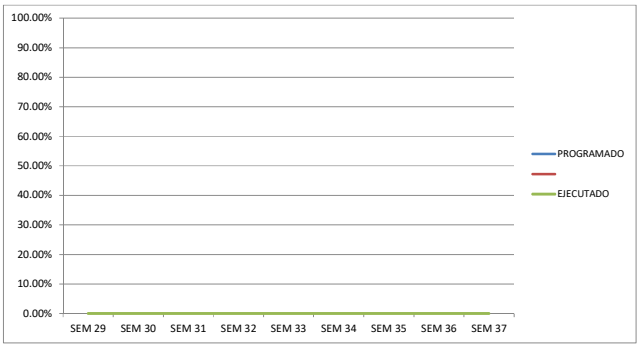

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 35	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 36	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 37	0.00%	0.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

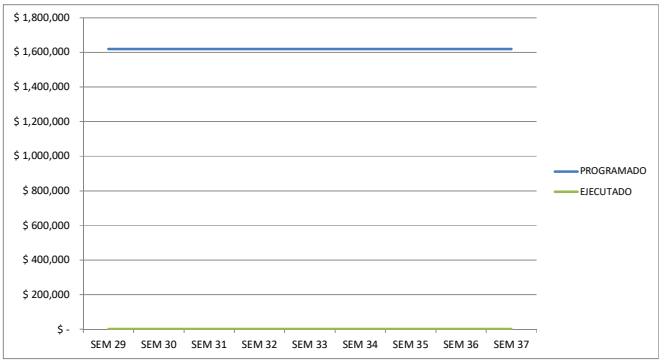

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 30	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 31	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 32	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 33	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 34	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 35	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 36	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**
SEM 37	$ 1,619,744	$ -	**$ -1,619,744.49**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	7/12/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	7/12/2020		31/12/2020		**-146.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021		30/04/2021		**-16.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	5/05/2021		15/05/2020		**3.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**5.00**	
	NO PREVISTAS	7/05/2021		30/06/2021		**5.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

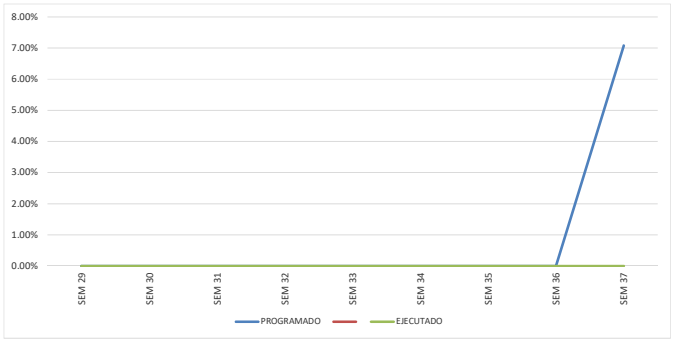

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 35	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 36	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 37	7.08%	0.00%	**-7.08%**
	ALERTAS		**-7.08%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

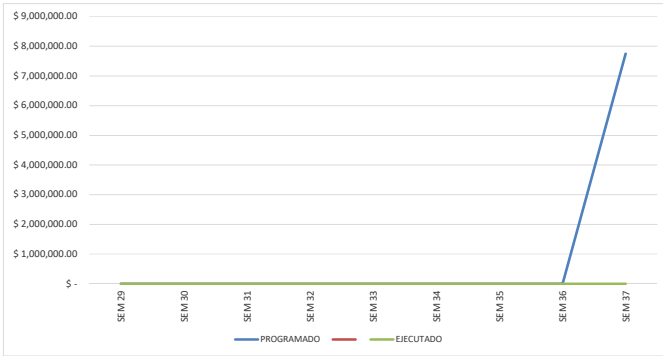

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -
SEM 36	$ -	$ -	$ -
SEM 37	$ 7,747,740.39	$ -	$ -7,747,740.39

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	16/04/2021		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	15/05/2021		30/06/2021		**6.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	16/04/2021	22/04/2021	30/04/2021	22/04/2021	**-6.00**	**8.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15/05/2021		19/06/2021		**6.00**	
	NO PREVISTAS	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

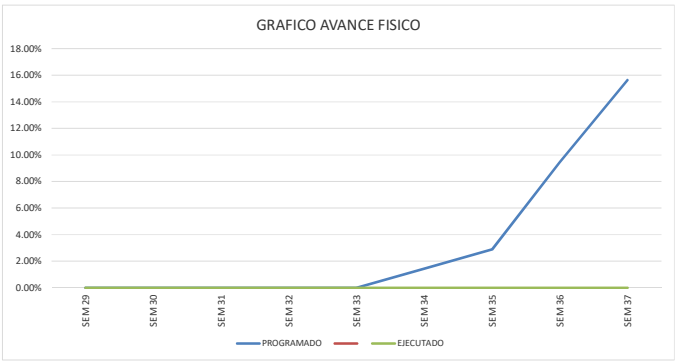

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 30	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 31	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 32	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 33	0.00%	0.00%	**0.00%**
SEM 34	1.44%	0.00%	**-1.44%**
SEM 35	2.88%	0.00%	**-2.88%**
SEM 36	9.46%	0.00%	**-9.46%**
SEM 37	15.64%	0.00%	**-15.64%**
	ALERTAS		**-15.64%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

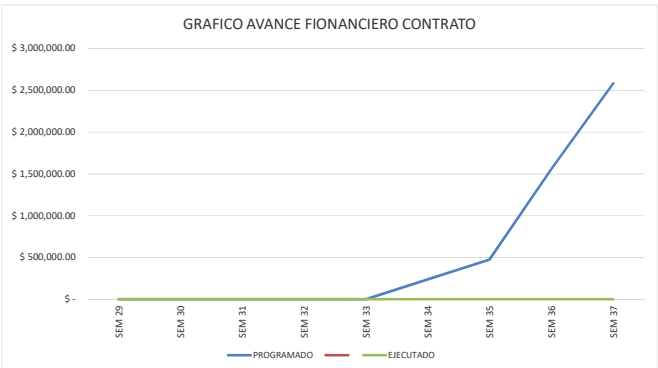

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 29	$ -	$ -	$ -
SEM 30	$ -	$ -	$ -
SEM 31	$ -	$ -	$ -
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ 238,064.78	$ -	$ -238,064.78
SEM 35	$ 476,129.55	$ -	$ -476,129.55
SEM 36	$ 1,562,047.76	$ -	$ -1,562,047.76
SEM 37	$ 2,582,877.77	$ -	$ -2,582,877.77

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	7/05/2021		30/06/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2020			
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	24/05/2021		26/06/2021		**15.00**	
	NO PREVISTO	7/05/2021		30/06/2021		**-2.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURDURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	0	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	CARLOS ENRIQUE OROZCO VISBAL		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7781671801	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7781675414	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7781673683	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	4-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE, SE REALIZÓ NUEVAMENTE RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS SEDES PARA RETOMAR ACTIVIDADES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	11-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	18-abr	NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES EN ESTA SEDE.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	25-abr	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	2-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	9-may	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, ESTAN EN ENTRGA DE DOCUMENTACION DE PERSONAL.

DIEZ	10	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.


NO APLICA

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada.

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	|	**Programación LOTE 1**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 7.023.410.231,35**
1		**INICIO**	0 días	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 0,00
2		**REGIONAL ATLANTICO**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.518.674.751,44**
3		**COLOMBO ALEMÁN - CLL 30# 3E-165 - BARRANQUILLA**	**52,75 días?**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 293.024.751,04**
4	5	LAVADO DE TANQUE	5,75 días?	lun 19/04/21	lun 26/04/21	$ 1.880.607,07
5	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	15,75 días	dom 2/05/21	vie 21/05/21	$ 1.813.328,00
6	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza. Demoliciones. Pinturas. Estructuras. Etc.)	43 días	lun 3/05/21	mié 30/06/21	$ 82.101.968,76
7	9	UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17 días	vie 28/05/21	sáb 19/06/21	$ 20.314.208,00
8	NP	NO PREVISTOS	22 días	lun 26/04/21	mar 25/05/21	$ 186.914.639,21
9		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN BARRANQUILLA**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 320.950.109,88**
10	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	mar 18/05/21	mié 30/06/21	$ 113.801.088,08
11	NP	NO PREVISTOS	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 207.149.021,80
12		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial- zona Urbana**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 159.339.013,47**
13	1	Impermeabilizaciones	11 días	lun 10/05/21	lun 24/05/21	$ 9.762.888,00
14	2	Sistemas electricos	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 46.810.151,00
15	5	LAVADO DE TANQUES	5 días	mar 1/06/21	lun 7/06/21	$ 2.651.138,00
16	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.872.902,00
17	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 73.052.274,00
18	NP	NO PREVISTOS	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 17.189.660,47
19		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial - El Caney- Rural**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 140.584.943,72**
20	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días	mar 18/05/21	lun 31/05/21	$ 3.452.868,00
21	2	SISTEMAS ELECTRICOS	14 días	vie 11/06/21	mié 30/06/21	$ 62.215.049,00
22	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 14/06/21	sáb 19/06/21	$ 2.129.134,00
23	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	lun 21/06/21	mié 30/06/21	$ 2.967.264,00
24	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 32.321.167,14
25	NP	NO PREVISTOS	14 días	sáb 12/06/21	mié 30/06/21	$ 37.499.461,58
26		**DESPACHO REGIONAL - KR 43 # 42-40, BARRANQUILLA**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 162.155.624,79**
27	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días?	lun 26/04/21	sáb 8/05/21	$ 1.716.610,00
28	2	SISTEMAS ELECTRICOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 2.618.115,00
29	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 7/06/21	sáb 12/06/21	$ 11.278.020,00
30	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 21.027.513,80
31	NP	NO PREVISTOS	1 día?	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 125.515.365,99
32		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 442.620.308,54**
33	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 251.338.966,00
34	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 7/06/21	sáb 19/06/21	$ 12.514.756,00
35	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 21/06/21	sáb 26/06/21	$ 204.263,00
36	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 39.714.994,00
37	8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 128.292.947,22
38	9	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 10.127.715,00
39	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 426.667,32
40		**REGIONAL BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 935.200.880,20**
41		**AGROEMPRESARIAL - MOMPOX**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.072.478,00**
42	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
43	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
44	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
45	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 134.908,00

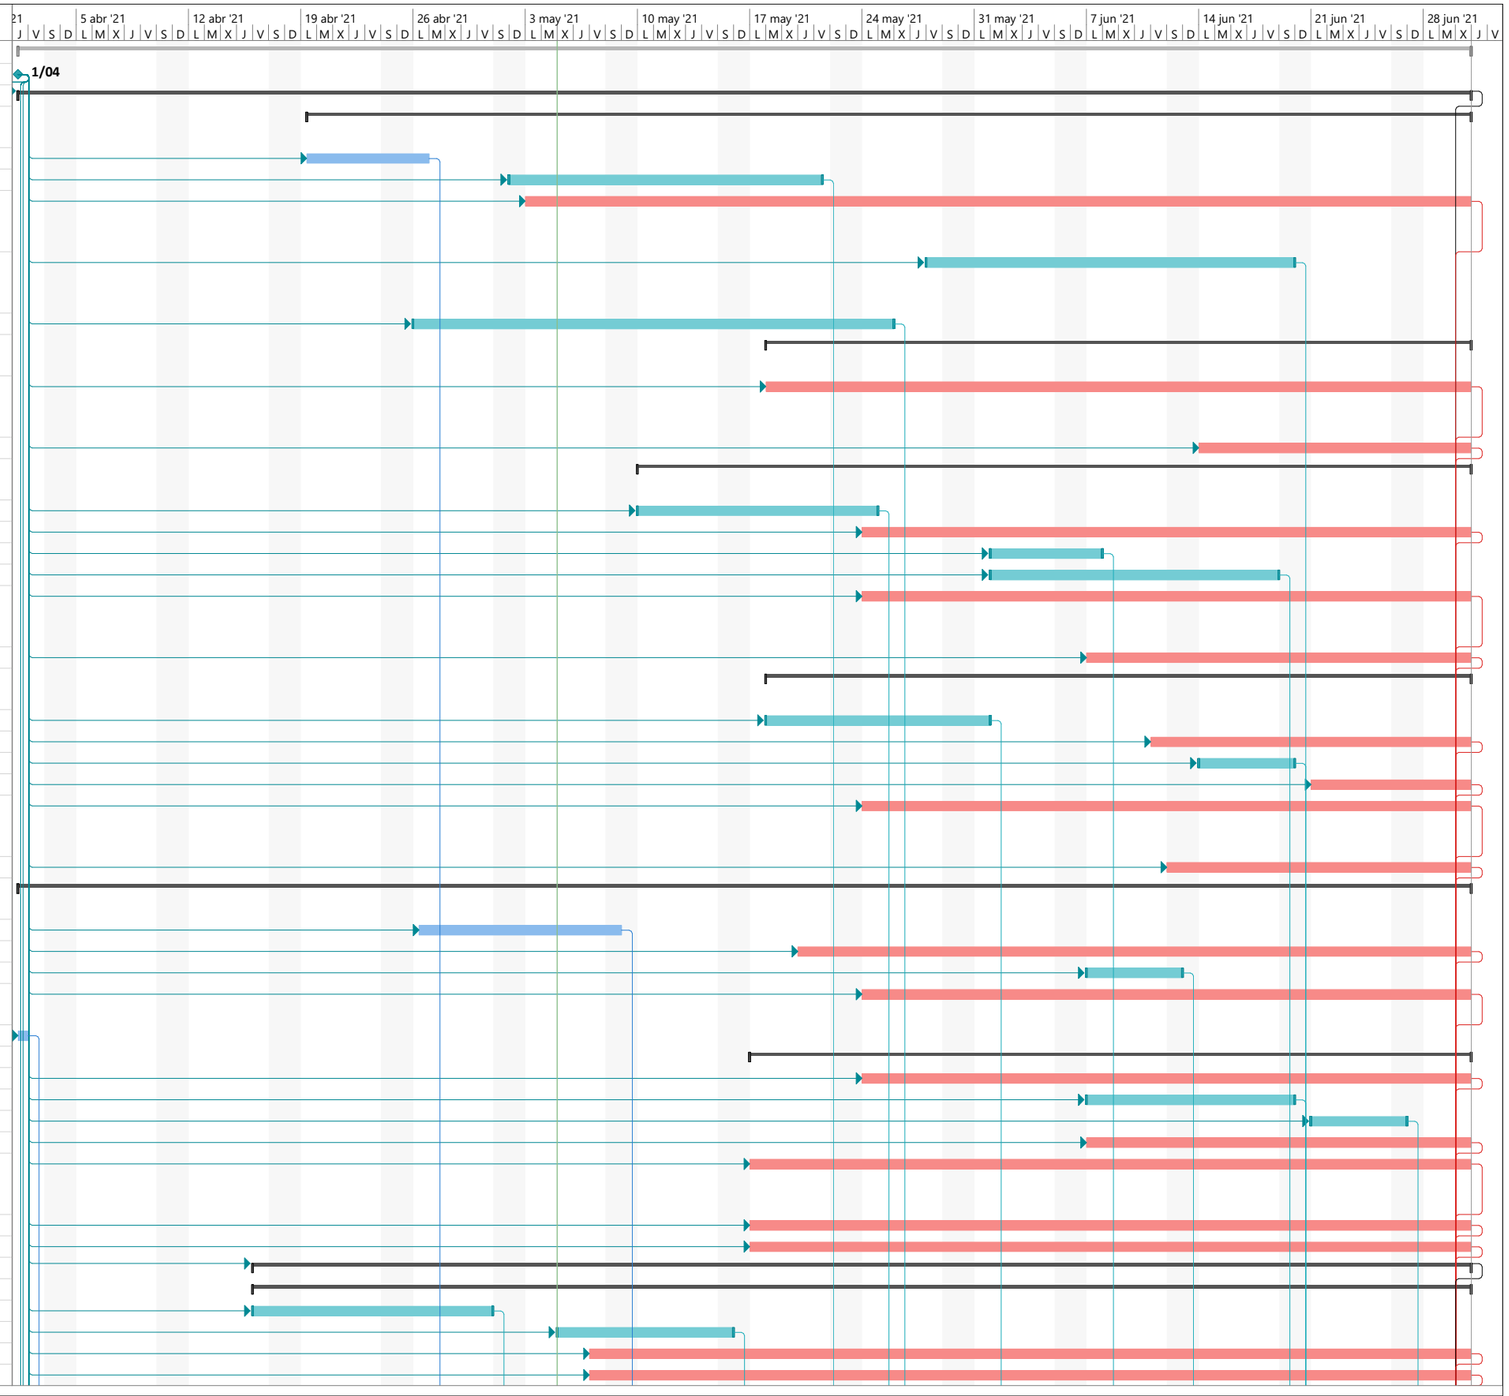

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
46		**CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 145.445.387,65**
47	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 28.918.644,00
48	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 3.429.844,00
49	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 283.680,00
50	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.401.019,00
51	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	38 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 6.181.800,00
52	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.483.624,00
53	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 81.746.776,65
54		**MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 251.927.637,92**
55	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 4.094.306,00
56	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 324.190,00
57	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 1.888.500,00
58	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 2.395.520,00
59	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 2.007.717,00
60	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 62.182.842,00
61	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 108.367.661,00
62	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 406.610,00
63	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 70.260.291,92
64		**AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 2.650.749,00**
65	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
66	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
67	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.153.936,00
68	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.218.635,00
69		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 12.762.841,00**
70	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
71	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 713.946,00
72	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 7.253.312,00
73	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 2.425.423,00
74	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 337.270,00
75		**CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 317.043.127,14**
76	1	Impermeabilizaciones	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 12.460.498,00
77	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 12.105.284,00
78	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	sáb 29/05/21	$ 7.620.950,00
79	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 961.440,00
80	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 5.552.188,00
81	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 163.471.220,00
82	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 16.310.261,00
83	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 98.561.286,14
84		**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.**	**38,75 días**	**vie 7/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 88.628.579,23**
85	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26 días	lun 24/05/21	sáb 26/06/21	$ 27.464.369,00
86	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 61.164.210,23
87		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 115.670.080,26**
88	2	Sistemas Electricos	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
89	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 2.349.108,00
90	5	Lavado de tanques	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 378.240,00
91	6	Sistemas contra incendio.	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.226.504,00
92	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 73.650,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
93	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 49.830.486,00
94	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.063.428,00
95	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 58.715.774,26
96		**REGIONAL SUCRE**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 176.361.446,39**
97		**SEDE COROZAL Cra 26 #261a-83**	**5 días**	**lun 26/04/21**	**sáb 1/05/21**	**$ 1.153.936,00**
98	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.153.936,00
99		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SEDE BOSTON**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 23.964.200,00**
100	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 3.063.676,00
101	3	SERVICIO DE JARDINERIA	21 días	lun 3/05/21	sáb 29/05/21	$ 711.000,00
102	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
103	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 11.374.512,00
104	NP	ITEMS NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 7.387.120,00
105		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA- KR 1 #20-10 - TOLU**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.658.890,00**
106	1	IMPERMEABILIZACIONES	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 17.544.650,00
107	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 11.528.878,00
108	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
109	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.296.960,00
110	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	36 días	lun 10/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.028.400,00
111	NP	NO PREVISTOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 6.832.110,00
112		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS - KILÓMETRO 5 VÍA SAMPUÉS - GALLERA**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 97.584.420,39**
113	1	IMPERMEBEALIZACIONES	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 16.947.550,00
114	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 23.941.301,00
115	3	SERVICIO DE JARDINERIA	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 14.418.000,00
116	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.669.753,00
117	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 8.901.792,00
118	NP	NO PREVISTOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 28.706.024,39
119		**REGIONAL GUAJIRA**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 618.070.994,22**
120		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA - KM 1 VIA BARRANCAS -FONSECA**	**29,75 días**	**jue 20/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 56.959.490,02**
121	3	SERVICIO DE JARDINERIA	13 días	jue 20/05/21	lun 7/06/21	$ 34.281.230,00
122	5	LAVADO TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 3.032.458,00
123	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 299.153,00
124	NP	NO PREVISTOS	15 días	jue 10/06/21	mié 30/06/21	$ 19.346.649,02
125		**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 286.201.175,54**
126	2	SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 69.468.968,00
127	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 23.925.760,00
128	5	LAVADO DE TANQUES	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 847.249,67
129	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 3.907.399,00
130	NP	NO PREVISTOS	18 días	mar 18/05/21	jue 10/06/21	$ 188.051.798,87
131		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA-TRONCAL DEL CARIBE A MAICAO KM5**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 122.063.512,66**
132	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 73.612.818,00
133	3	SERVICIO JARDINERIA	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 35.197.280,00
134	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
135	NP	NO PREVISTOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 12.594.022,66
136		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO-CARRERA42A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 152.846.816,00**
137	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 8.063.170,00
138	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 494.544,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
139	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	22 días	sáb 15/05/21	sáb 12/06/21	$ 254.430,00
140	NP	NO PREVISTOS	27 días	mar 25/05/21	mié 30/06/21	$ 144.034.672,00
141		**REGIONAL MAGDALENA**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 514.295.901,45**
142		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- EL BANCO**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 11.177.239,18**
143	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 518.704,00
144	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 771.961,00
145	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 3.022.424,96
146	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 152.612,00
147	NP	NO PREVISTOS	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 6.711.537,22
148		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- CIENAGA**	**27 días**	**jue 6/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 15.539.726,42**
149	1	IMPERMEABILIZACIONES	8 días	jue 6/05/21	sáb 15/05/21	$ 1.189.560,00
150	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 62.598,72
151	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 906.664,00
152	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 4.000.000,00
153	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	8 días	jue 27/05/21	sáb 5/06/21	$ 397.280,00
154	NP	NO PREVISTOS	11 días	lun 31/05/21	sáb 12/06/21	$ 8.983.623,70
155		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.417.282,09**
156	1	IMPERMEABILIZACIONES	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 2.167.680,00
157	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 10/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.070.402,00
158	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
159	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 205.396,20
160	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 659.392,00
161	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 6.528.910,00
162	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 3.316.019,00
163	NP	NO PREVISTOS	36 días	mié 12/05/21	mié 30/06/21	$ 34.755.536,89
164		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- SANTA MARTA**	**30,75 días**	**mié 12/05/21**	**mié 23/06/21**	**$ 61.717.316,82**
165	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	jue 20/05/21	vie 4/06/21	$ 1.341.600,00
166	2	SISTEMAS ELECTRICOS	17 días	sáb 15/05/21	sáb 5/06/21	$ 9.089.754,00
167	3	SERVICIO DE JARDINERIA	7 días	sáb 15/05/21	sáb 22/05/21	$ 13.215.320,00
168	4	EQUIPOS DE BOMBEO	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.644.412,00
169	5	LAVADO TANQUES	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.152.914,00
170	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mié 12/05/21	jue 20/05/21	$ 1.648.480,00
171	NP	NO PREVISTOS	9 días	sáb 12/06/21	mié 23/06/21	$ 29.624.836,82
172		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Santa Marta**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 263.535.125,41**
173	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 2.855.784,00
174	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 195.061,79
175	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 13.139.318,00
176	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	53 días	lun 19/04/21	mié 30/06/21	$ 98.185.464,15
177	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	7 días	jue 20/05/21	vie 28/05/21	$ 6.416.694,00
178	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 142.742.803,47
179		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Fundación**	**25 días**	**lun 10/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 24.877.230,45**
180	2	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 60.290,00
181	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 989.088,00
182	NP	NO PREVISTOS	11 días	mar 18/05/21	mar 1/06/21	$ 23.827.852,45
183		**Dirección Regional, APE y Servicios Medicos – Santa Marta, Av. Ferrocarril 27 – 97.**	**44,75 días**	**jue 29/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 84.031.981,08**

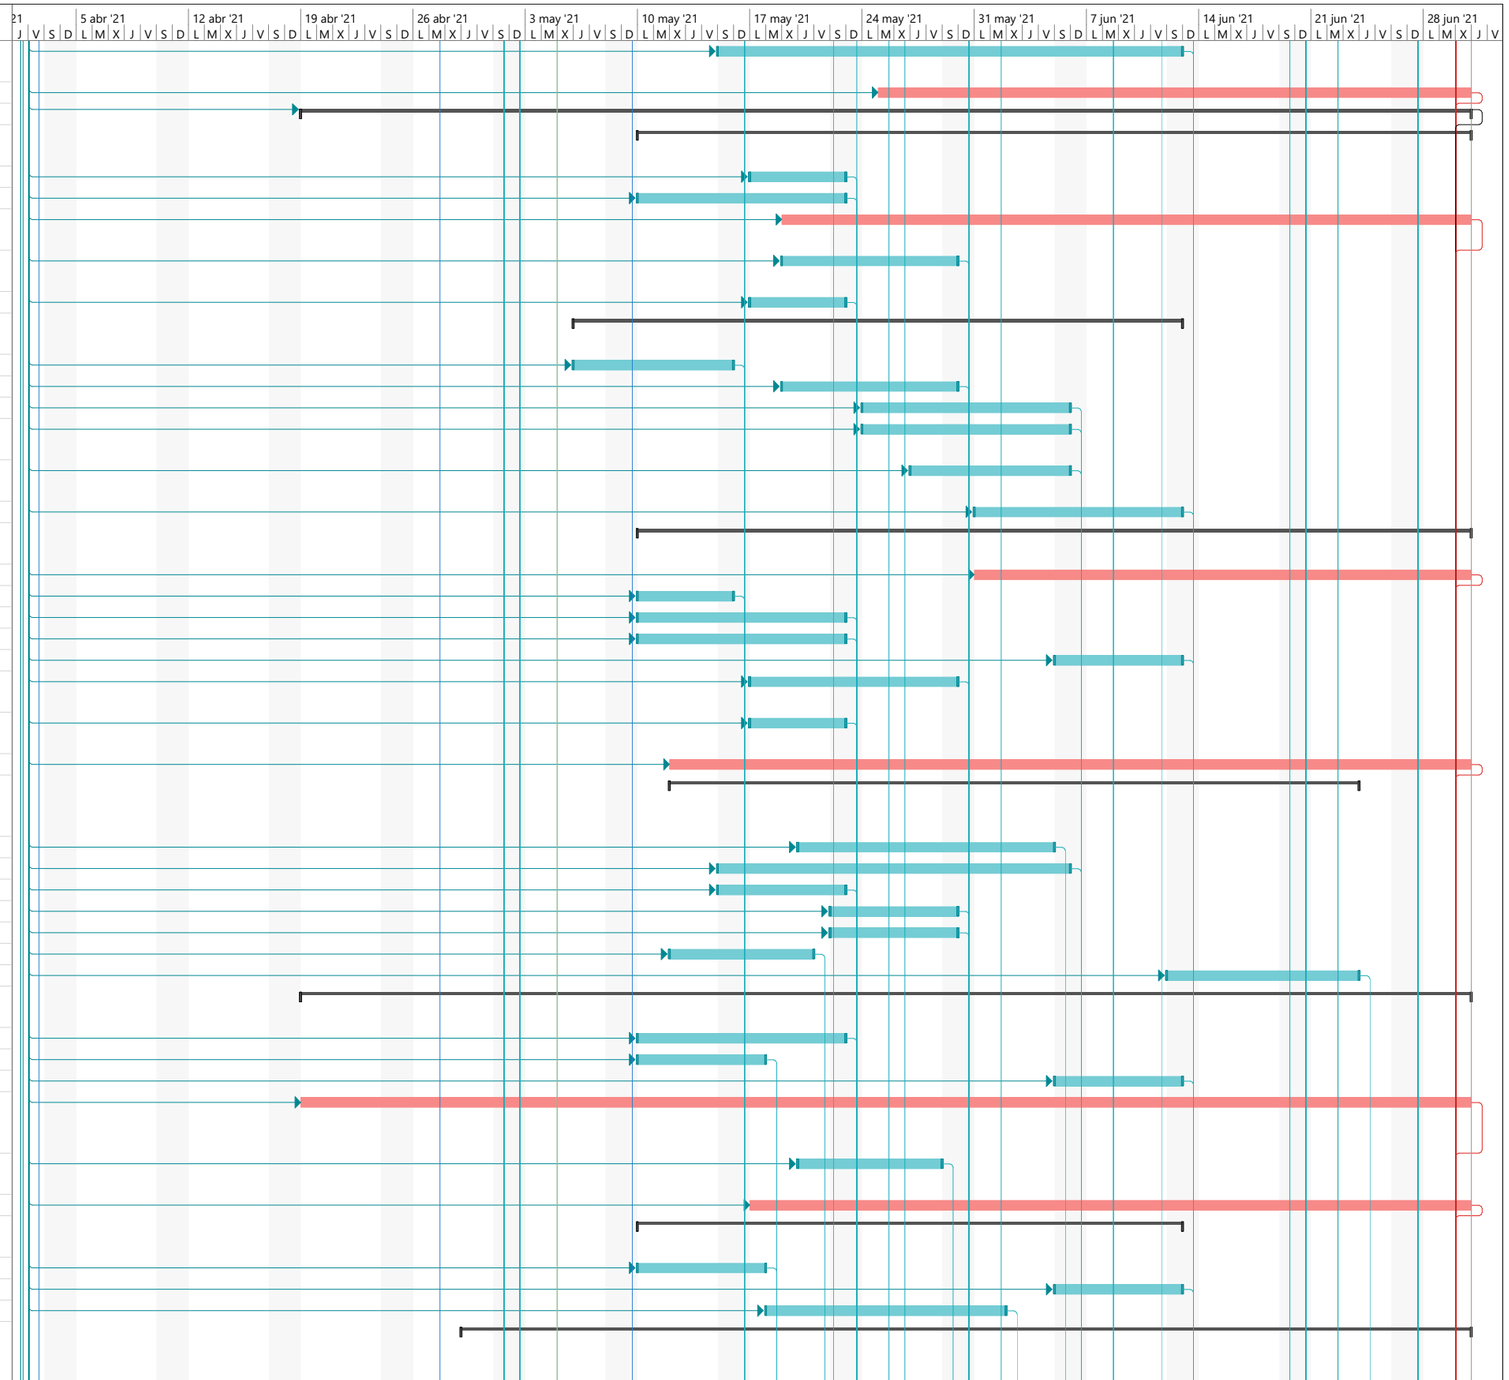

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
184	1	IMPERMEABILIZACIONES	25 días	jue 29/04/21	mié 2/06/21	$ 389.466,00
185	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 585.225,00
186	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	mar 25/05/21	mar 1/06/21	$ 129.676,00
187	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
188	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 17/05/21	lun 24/05/21	$ 36.449,00
189	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	14 días	mié 19/05/21	sáb 5/06/21	$ 2.802.416,00
190	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13 días	jue 20/05/21	sáb 5/06/21	$ 28.269.502,60
191	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13 días	jue 27/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.900.384,00
192	NP	NO PREVISTOS	24 días	mié 19/05/21	lun 21/06/21	$ 49.204.916,48
193		**REGIONAL CORDOBA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.315.235.044,57**
194		**DESPACHO REGIONAL- SEDE ADMINISTRATIVA MONTERIA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 248.861.411,64**
195	1	IMPERMEABILIZACIONES	17 días	vie 14/05/21	sáb 5/06/21	$ 10.490.530,00
196	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 6.408.290,00
197	4	EQUIPOS DE BOMBEO	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.130.762,00
198	5	LAVADO DE TANQUES	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.111.028,00
199	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.268.859,00
200	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	sáb 8/05/21	sáb 19/06/21	$ 155.483.034,00
201	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.318.481,00
202	NP	NO PREVISTOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 52.650.427,64
203		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 381.881.237,30**
204	1	IMPERMEABILIZACIONES	32 días	sáb 1/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.108.600,00
205	2	SISTEMAS ELECTRICOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 56.613.580,00
206	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.136.568,40
207	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 16.151.334,00
208	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 195.074.173,61
209	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 7.504.581,00
210	NP	NO PREVISTOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 98.292.400,29
211		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MONTELÍBANO**	**15 días?**	**lun 26/04/21**	**sáb 15/05/21**	**$ 90.451.995,90**
212	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 6.633.000,00
213	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.349.108,00
214	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.173.560,00
215	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.526.308,00
216	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS,	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 69.233.330,00
217	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 163.962,00
218	NP	NO PREVISTOS	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.372.727,90
219		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 196.881.708,43**
220	1	IMPERMEABILIZACIONES	39 días	sáb 8/05/21	mié 30/06/21	$ 1.080.964,00
221	2	SISTEMAS ELECTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 844.730,00
222	3	SERVICIO DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.990.980,00
223	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.664.304,00
224	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.049.355,00
225	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.640.496,00
226	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 23.500.297,14
227	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.659.790,00
228	NP	NO PREVISTOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 153.450.792,29

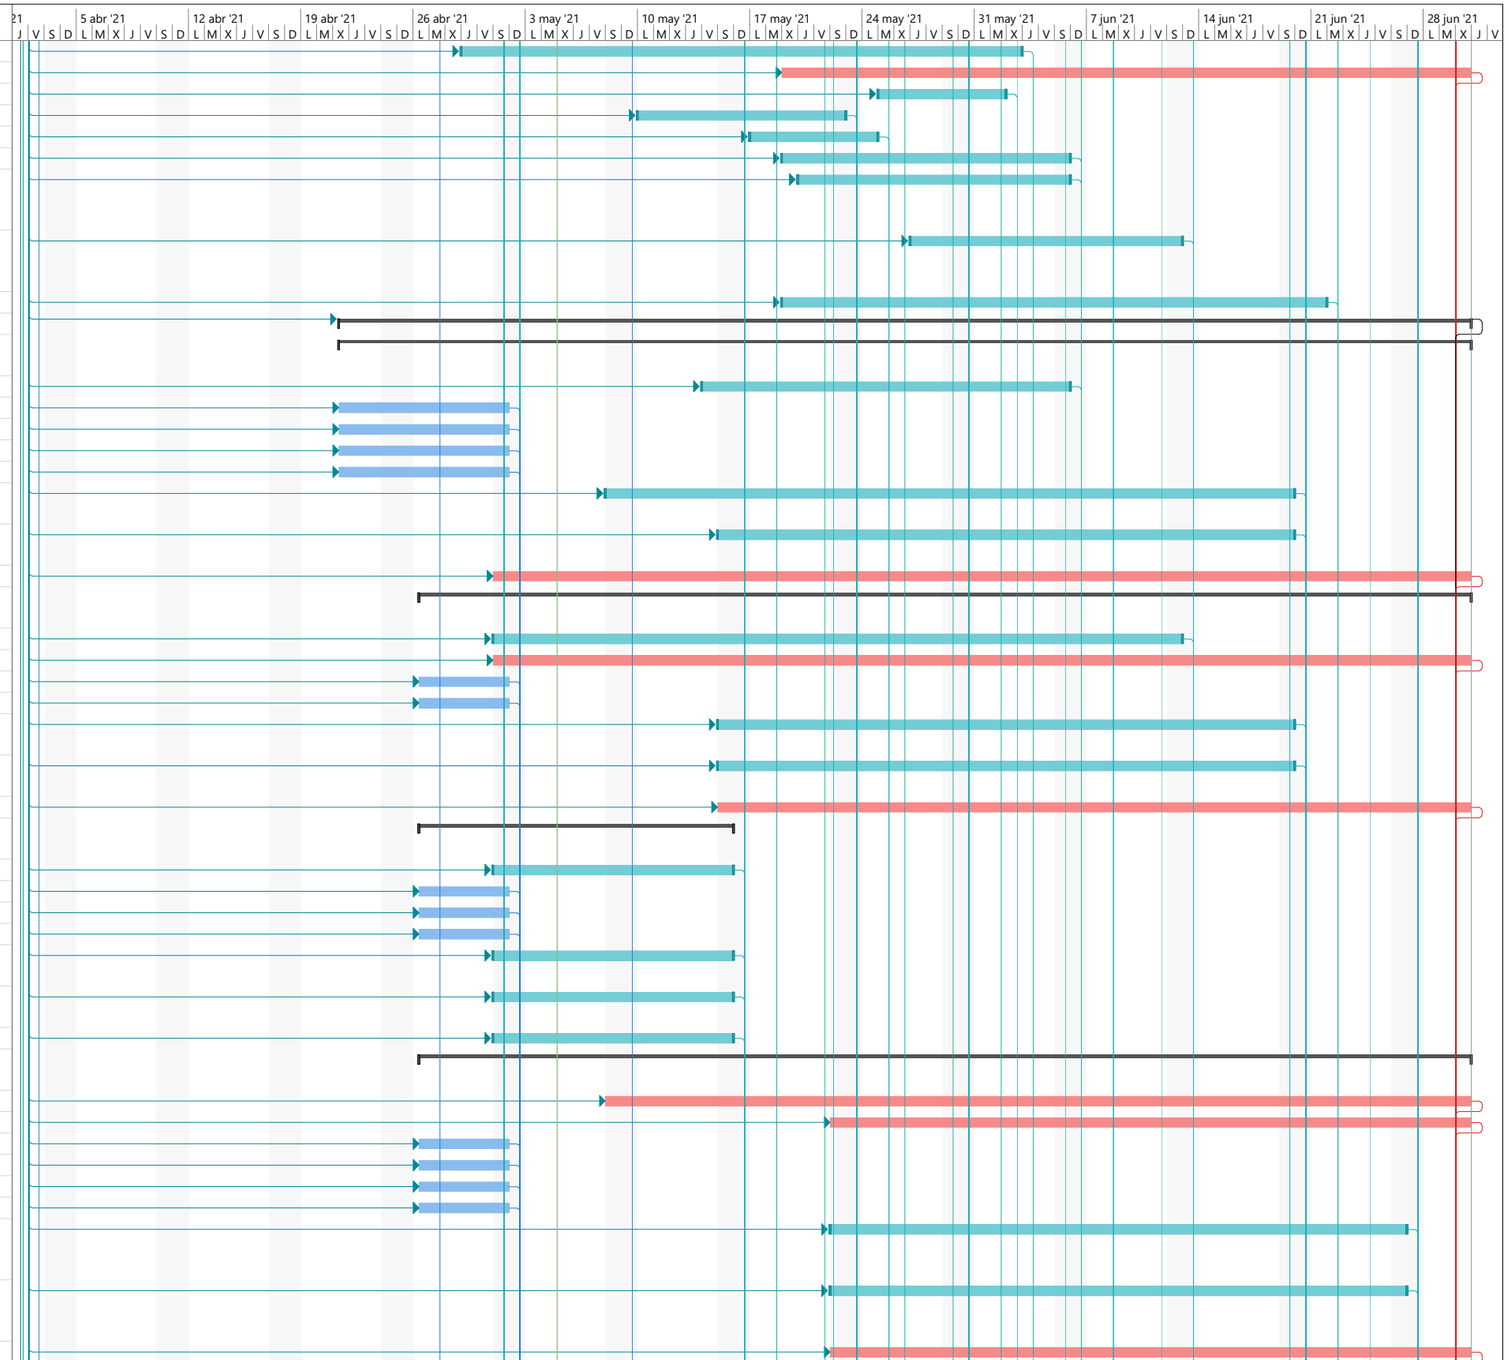

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
229		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 121.619.572,20**
230	1	IMPERMEABILIZACIONES	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.024.900,00
231	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 37.142.034,00
232	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 648.380,00
233	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.703.706,00
234	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.558.063,00
235	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	vie 30/04/21	$ 659.392,00
236	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.601.940,00
237	NP	NO PREVISTOS	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 39.281.157,20
238		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 275.539.119,10**
239	1	IMPERMEABILIZACIONES	22 días	sáb 22/05/21	sáb 19/06/21	$ 32.555.600,00
240	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.296.760,00
241	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.878.260,00
242	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 13.130.389,00
243	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 18.478.790,00
244	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 52.979.039,00
245	NP	NO PREVISTOS	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 153.220.281,10
246		**REGIONAL CESAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.549.213.285,52**
247		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 817.425.460,29**
248	1	IMPERMEABILIZACIONES	5 días	vie 2/04/21	jue 8/04/21	$ 18.613.036,51
249	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 58.169.642,00
250	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	10 días	vie 2/04/21	jue 15/04/21	$ 7.993.942,46
251	4	EQUIPOS DE BOMBEO	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 460.608,00
252	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	vie 2/04/21	vie 9/04/21	$ 2.217.240,00
253	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.682.935,00
254	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	52 días	vie 2/04/21	lun 14/06/21	$ 225.565.569,48
255	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 13.104.018,20
256	NP	NO PREVISTOS	63,75 días	vie 2/04/21	mié 30/06/21	$ 481.618.468,64
257		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 267.312.680,77**
258	1	Impermeabilizaciones	20 días	lun 24/05/21	vie 18/06/21	$ 31.718.873,40
259	2	Sistemas eléctricos	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 500.070,00
260	3	Servicio de jardinería	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 26.709.252,00
261	4	Equipos de bombeo	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 1.888.500,00
262	5	Lavado de tanques	10 días	mar 1/06/21	lun 14/06/21	$ 1.675.812,78
263	7	Sistemas de refrigeración.	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 6.951.771,00
264	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	55,75 días	vie 2/04/21	vie 18/06/21	$ 92.460.942,80
265	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	32,75 días	vie 2/04/21	mar 18/05/21	$ 9.457.360,20
266	NP	NO PREVISTOS	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 95.950.098,59
267		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**43 días**	**vie 2/04/21**	**mar 1/06/21**	**$ 101.044.686,74**
268	1	IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 10/05/21	sáb 29/05/21	$ 43.615.906,30
269	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	22 días	sáb 1/05/21	lun 31/05/21	$ 4.249.228,00
270	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	43 días	vie 2/04/21	mar 1/06/21	$ 30.333.354,62
271	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 2.969.042,00
272	NP	NO PREVISTOS	16 días	lun 10/05/21	lun 31/05/21	$ 19.877.155,82

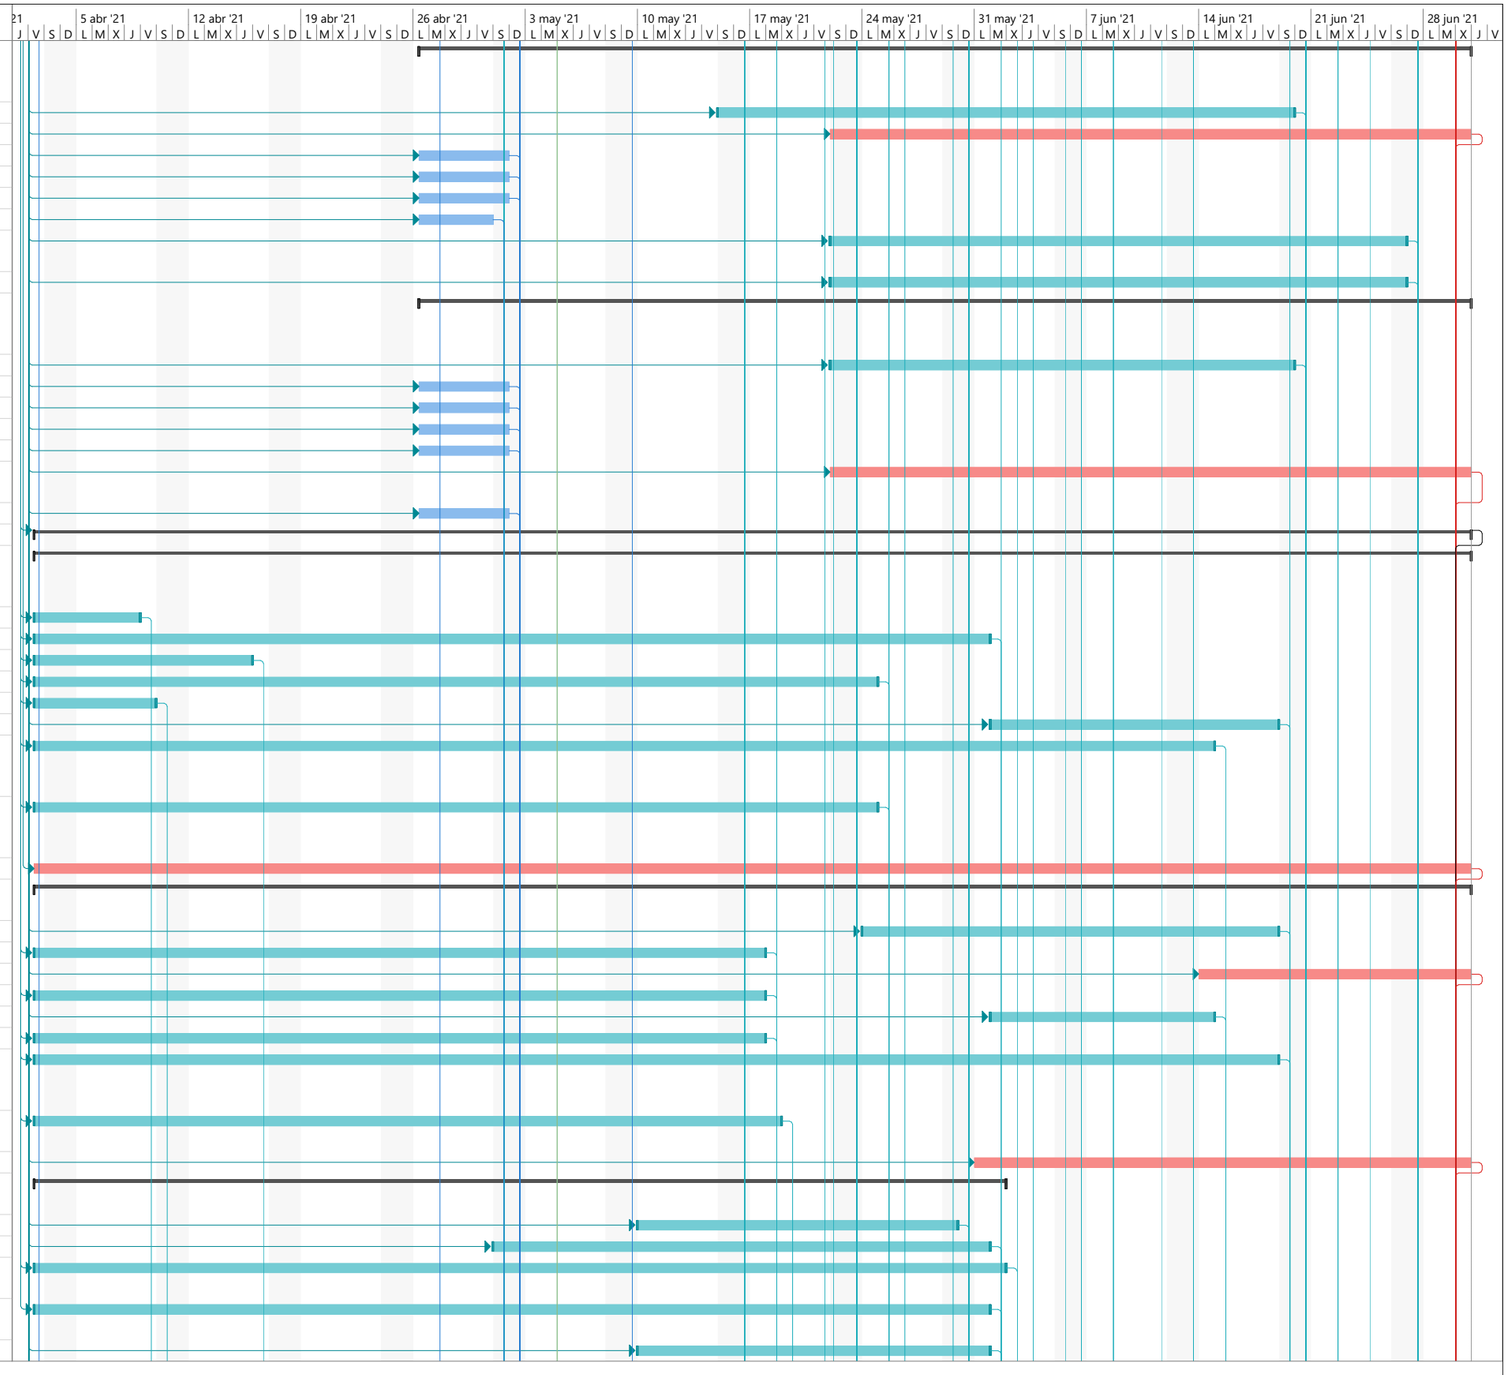

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
273		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 68.756.078,84**
274	1	IMPERMEABILIZACIONES	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 2.076.312,00
275	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	lun 31/05/21	$ 18.454.000,00
276	5	LAVADO DE TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 567.360,00
277	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 751.120,00
278	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	lun 14/06/21	vie 25/06/21	$ 1.895.752,00
279	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 13.927.644,00
280	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 5.405.010,00
281	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 25.678.880,84
282		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**43,75 días**	**vie 30/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 294.674.378,88**
283	1	IMPERMEABILIZACIONES	15 días	vie 30/04/21	jue 20/05/21	$ 15.809.445,00
284	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 109.532.908,00
285	3	SERVICIO DE JARDINERIA	15,75 días	lun 17/05/21	lun 7/06/21	$ 6.883.600,00
286	4	EQUIPOS DE BOMBEO	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.348.118,00
287	5	LAVADO DE TANQUES	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.459.987,00
288	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.353.797,00
289	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 67.756.610,00
290	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 37.366.634,00
291	NP	NO PREVISTOS	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 32.163.279,88
292		**REGIONAL SAN ANDRES**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
293		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
294	2	SISTEMAS ELECTRICOS	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 15.996.158,00
295	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 2.027.834,90
296	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 17.826.269,00
297	5	LAVADO DE TANQUES	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 5.705.388,00
298	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	27 días	sáb 24/04/21	sáb 29/05/21	$ 7.604.360,00
299	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 13.918.405,00
300	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	59 días	sáb 10/04/21	mié 30/06/21	$ 70.097.714,99
301	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	sáb 8/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.500.603,00
302	NP	NO PREVISTOS	56 días	lun 12/04/21	sáb 26/06/21	$ 259.681.194,67
303		**FIN**	0 días	mié 30/06/21	mié 30/06/21	$ 0,00

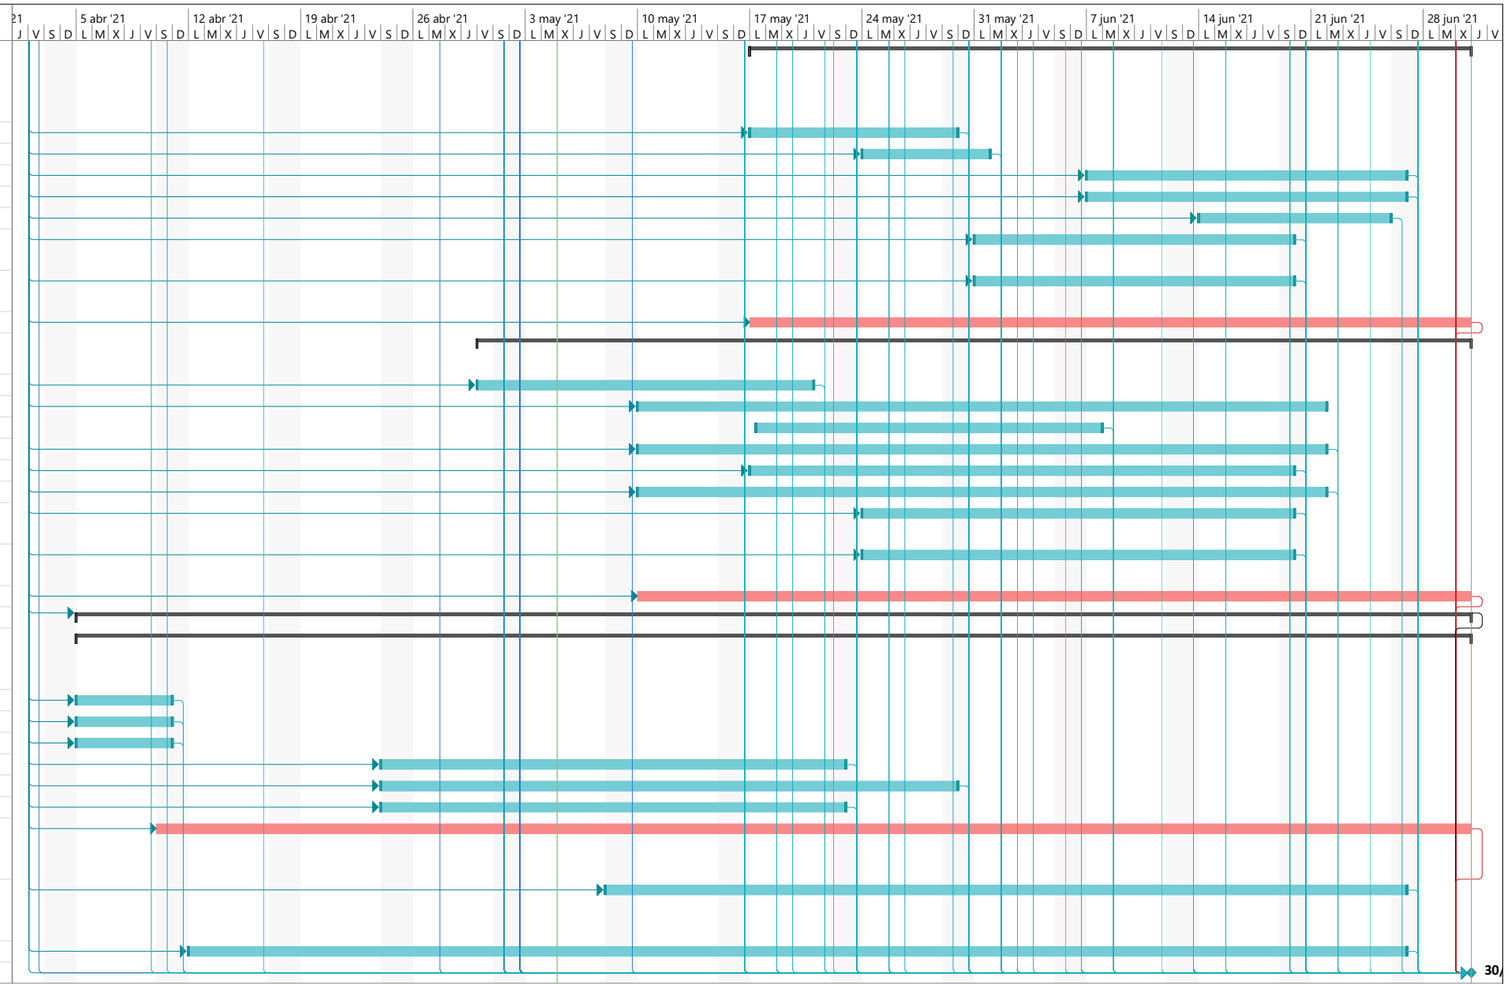

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

JUE 1/04/21 - MIÉ 30/06/21

COSTO

$ 7.023.410.231,35

COSTO RESTANTE


$ 7.023.410.231,35

% COMPLETADO

0%

PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.

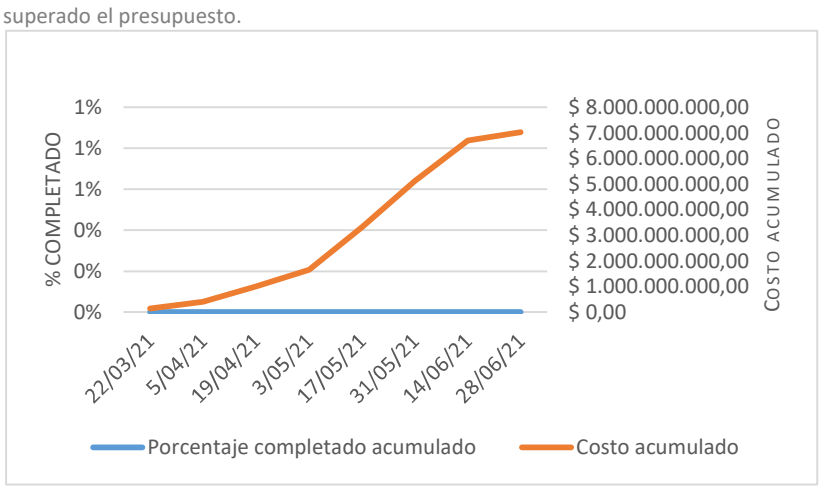

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
INICIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REGIONAL ATLANTICO	$ 0,00	$ 1.518.674.751,44	$ 0,00	$ 1.518.674.751,44	$ 1.518.674.751,44
REGIONAL BOLIVAR	$ 0,00	$ 935.200.880,20	$ 0,00	$ 935.200.880,20	$ 935.200.880,20
REGIONAL SUCRE	$ 0,00	$ 176.361.446,39	$ 0,00	$ 176.361.446,39	$ 176.361.446,39
REGIONAL GUAJIRA	$ 0,00	$ 618.070.994,22	$ 0,00	$ 618.070.994,22	$ 618.070.994,22
REGIONAL MAGDALENA	$ 0,00	$ 514.295.901,45	$ 0,00	$ 514.295.901,45	$ 514.295.901,45
REGIONAL CORDOBA	$ 0,00	$ 1.315.235.044,57	$ 0,00	$ 1.315.235.044,57	$ 1.315.235.044,57
REGIONAL CESAR	$ 0,00	$ 1.549.213.285,52	$ 0,00	$ 1.549.213.285,52	$ 1.549.213.285,52
REGIONAL SAN ANDRES	$ 0,00	$ 396.357.927,56	$ 0,00	$ 396.357.927,56	$ 396.357.927,56
FIN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base

