SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 10

PERÍODO: 12 DE MAYO DE 2021 AL 11 DE JUNIO DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: JULIO DE AVILA GOMEZ	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 6
1.4. LOCALIZACIÓN 6

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8

2.1. FORMA DE PAGO: 9
2.2. ANTICIPO DE OBRA 9
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 10
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 10
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 12
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 12
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 12

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
3.2. FORMA DE PAGO 14
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 15
3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 15
3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 16
3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 16
3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 16
3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 17

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 18

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 18

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 18

6.1 CONCLUSIONES: 18
6.2 RECOMENDACIONES: 18

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de las Zonas del proyecto 6
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto.....7

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 8
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020. 10
Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra.....12
Tabla 4. Relación del personal Contrato 12
Tabla 5. Información general del contrato de interventoría 13
Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 14

Tabla 7. Control financiero interventoría 15
Tabla 8. Relación del personal de Interventoría 15
Tabla 9. Relación de equipos del interventor 16

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 10, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.",* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de Mayo 2021 y el 11 de Junio del 2021 correspondiente al primer mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, en San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto
Sede San Andres



Grafica 2. Localización de la zona del proyecto
Sede Providencia



2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	3 MESES
PRORROGA No. 03:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su décimo mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 3.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	29/03/2021	30/12/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		29/03/2021	30/06/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		30/06/2021	30/06/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		29/03/2021	30/12/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de MAYO de 2021 y el 11 de JUNIO de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Semana 38: DEL 10 DE MAYO DE 2021 AL 16 DE MAYO DE 2021.
Programado 52,08%
Ejecutado12,35%

Semana 39: DEL 17 DE MAYO DE 2021 AL 23 DE MAYO DE 2021.
Programado: 60,63%
Ejecutado: 12,35%

Semana 40: DEL 24 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE MAYO DE 2021.
Programado: 68,25%
Ejecutado: 18,30%

Semana 41: DEL 31 DE MAYO DE 2021 AL 06 DE MAYO DE 2021.
Programado 75,74%
Ejecutado: 19,10%

Semana 42: DEL 07 DE MAYO DE 2021 AL 13 DE MAYO DE 2021.
Programado 83,23%
Ejecutado: 19,50%

FOTOS













Imagen - Fotografías Cafetería Bloque Hotel, shingle cubierta

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra No. 3, 4 y 5 mediante los comunicados *“CINP-BTA-023-0798-2969”. “CINP-BTA-023-0799-2970”* y *“CINP-BTA-023-0800-2971”.* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20–20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20–20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21–20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21–20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21–20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
TOTALES		**$1.344.806.789**	**$316.029.597,02**	**$1.660.836.385,57**	**$1.660.836.386**	**$7.116.462.371,4**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato "Control de Personal Contratista", en el Anexo No.02, y el resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	JUAN PABLO OLIVERO
4	Profesional SST	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, no ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato "Control de Maquinaria y Equipos" y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de Mayo de 2021 y el 11 de Junio de 2021, se diligencia formato "Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No.06.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	15 DÍAS
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del décimo mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 3.

Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	01/03/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	14/07/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	30/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	28/08/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante los comunicados "CINP-BTA-023-0801-2973; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA", "CINP-BTA-023-0802-2974; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA" y "CINP-BTA-023-0803-2975; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORIA", Esta

Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 3, 4 y 5, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
TOTALES		**$110.008.418**	**$20.901.600**	**$130.910.018**	**$130.910.018**	**$560.637.882**

3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría conto con el siguiente personal para la ejecución del quinto mes comprendido entre el 12 de Mayo de 2021 y el 11 de Junio de 2021. Se diligencia formato "Control de Personal Interventoría", se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JULIO DE AVILA GOMEZ
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato "Control de Maquinaria y Equipos Interventoría". Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron comités de obra.

3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 11 de Mayo de 2021 al 11 de Junio de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).

- Revisión y requerimiento de reiteración de inicio de actividades que según programación no han iniciado.

- Revisión de presupuestos y flujos de caja, los cuales se le ha hecho observaciones por inconsistencias con los presupuestos.

- Revisión de cronograma de actividades discriminadas por sedes. Se solicitó al contratista revisar actividades que fueron eliminadas sin la justificación requerida.

- Realización de actas de seguimientos semanales con personal del contratista y la entidad.

- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Suscripción de actas de comité registradas en el período.

- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.

- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y acompañamiento de las actividades iniciadas tales como: Sistema de refrigeración, servicio de jardinería, sistema eléctrico.

- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.

- Seguimiento al avance de obra registrado en el período

- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.

- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.

- Revison de presupuestos y programaciones enviadas por el contratista.

- Visitas de seguimiento a las actividades y revisión de implementación de EPP

3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

De acuerdo al informe semanal N° 42, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 344.900.828	83,23%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 80.807.781	19,50%
ATRASO		-63.73%

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha presenta retraso en todas las actividades programadas, por lo cual la interventoría ha solicitado un plan de contingencia con el fin de mitigar los atrasos.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 EL CONTRATISTA presenta inicio de actividades , pero a la fecha presenta retrasos según lo programado en el flujo de caja y lo ejecutado.

Respecto a la sede providencias, debido al huracán IOTA, que destruyo la isla de en un 95% se dispuso trasladar la inversión de las instalaciones a la sede de San Andrés.

Contratista hizo entrega de presupuestos y programaciones los cuales se le dio respuesta con observaciones en comunicado CINP-BTA-023-0932-3902 para que sean corregidos para aprobación de la interventoría.

El contratista no contrata el suficiente personal para las actividades encomendadas del proyecto, se requiere mayor agilidad en la parte administrativa de personal de obra.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda la contratista iniciar lo mas pronto posible los frentes de trabajo que a la fecha deben estar iniciado, con el fin de bajar los índices de atrasos presentados.

Es necesario la entrega de la documentación necesaria para la revisión de item no previstos, para su revisión y aprobación.

Se solicita al contratista realizar la implementación de los protocoles de seguridad, ya que se están utilizando los requeridos por la entidad, toda ves que el contratista manifestó en documentación recibida por esta interventoría la implementación de los mismos.

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato.

Se inicio mantenimiento de bombas de equipo bombeo, las cuales presentaron averías dejando el edificio de la entidad sin el servicio de agua en sus instalaciones.

El contratista requiere de un plan de contingencia con el fin de sopesar los atrasos presentados en el inicio de la obra, toda vez que no hay justificación por la demoras en el inicio de las actividades, con el fin de no realizar proceso por incumplimiento.

Se requiere aumento de personal y frentes de trabajo con el fin de aumentar los rendimientos y disminuir los atrasos presentados.

Se recomienda al contratista a tender de manera urgente los inconvenientes presentados en fugas de la cubierta impermeabilizada del hotel escuela, como también las filtraciones en la instalación de Shingle de la cubierta de la sede gente de mar.

Se requiere adelantar trabajos de las actividades eléctricas del hotel escuela, en especial el RETIE, y puesta en marcha de los ascensores.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG
Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 JUNIO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429,047,013.00	$ 100,826,048.69	$ 529,873,061.69	$ 8,247,425,695.31	$ 529,873,061.69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272,113,036.00	$ 63,946,563.88	$ 336,059,599.88	$ 7,911,366,095.43	$ 865,932,661.57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114,077,060.00	$ 26,808,109.07	$ 140,885,169.00	$ 7,770,480,926.43	$ 1,006,817,830.57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193,777,640.00	$ 45,537,746.00	$ 239,315,386.00	$ 7,531,165,540.43	$ 1,246,133,216.57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335,792,040.00	$ 78,911,129.38	$ 414,703,169.00	$ 7,116,462,371.43	$ 1,660,836,385.57
6		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1,344,806,789.00**	**$ 316,029,597.02**	**$ 1,660,836,385.57**	**$ 7,116,462,371**	**$ 1,660,836,386**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/05/2021 AL 11/06/2021

FECHA	MAYO																			JUNIO											OBSERVACIONES	
CARGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
COORDINADOR TÉCNICO - **JUAN PABLO OLIVERO**	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
PROFESIONAL SOCIAL -																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**3**			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**			**3**	**3**	**3**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**75**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE MAYO AL 11 DE MAYO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	MAYO																			JUNIO										
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	4	8	7	8	8	8	8	8	8	4	4	2	4	3	0	6	6	4	4	8	6	8	6	4	8	6	4	8	4	4	154
Nublado		2		1	0	0	3	2	0	0	0	1	2	4	5	8	2	2	4	1	6	2	6	2	2	1	2	4	2	4	4	67
Lluvias intensas									1							8					2					4							14
Lluvias moderadas		0	2	1		8	1	2		1	1			8	1		1	1	2		1		1	3	1	2	2	4	1			41
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	2	1	0	8	1	8	4	1	1	0	0	8	1	4	1	1	2	0	8	0	1	3	1	6	4	8	1	0	4	66

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 JUNIO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	$ 691,547,900.00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35,100,414.00	$ 6,669,079.00	$ 41,769,493			$ 649,778,407.00	$ 41,769,493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22,257,382.00	$ 4,228,903.00	$ 26,486,285			$ 623,292,122.00	$ 68,255,778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9,356,236.00	$ 1,777,685.00	$ 11,133,921			$ 612,158,201.00	$ 79,389,699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15,864,923.00	$ 3,014,335.00	$ 18,879,258			$ 593,278,943.00	$ 98,268,957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27,429,463.00	$ 5,211,598.00	$ 32,641,061			$ 560,637,882.00	$ 130,910,018
6	Ene Feb	$ -	$ -	$ -			$ -	$
TOTALES		**$ 110,008,418.00**	**$ 20,901,600.00**	**$ 130,910,018.00**			**$ 560,637,882.00**	$ 130,910,018.00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA INTERVENTORIA [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 MAYO AL 11 JUNIO 2021

FECHA / CARGO	MAYO																			JUNIO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **JULIO DE AVILA GOMEZ**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7790547811**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1010137443

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.395.400	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 157.200	$ 0	$ 0	$ 5.709.800	$ 0	$ 5.709.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 265.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.400	$ 0	$ 265.400
SUBTOTALES:										**$ 7.705.000**	**$ 0**	**$ 7.705.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.242.800	$ 0	$ 0	$ 3.242.800
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.600	$ 0	$ 0	$ 278.600
SUBTOTALES:													**$ 3.978.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.978.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 420.100	$ 420.100	$ 0	$ 0	$ 420.100
SUBTOTALES:									**$ 420.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 420.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.844.200	$ 0	$ 1.844.200
SUBTOTALES:			**$ 1.844.200**	**$ 0**	**$ 1.844.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																									
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.473.680	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.473.680		$ 102.600	30	$ 1.473.680	CCF24-COMPENSAR	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32773848	ROLON AMAYA KUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
3	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
6	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI														27-30					25-14 COLPENSIONES	4	$ 928.200	$ 148.600	$ 4.700	$ 4.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.000	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 928.200	$ 37.200	$ 0	$ 37.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 928.200		$ 0	4	$ 928.200	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	26	$ 6.033.300	$ 965.400	$ 30.200	$ 30.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.025.800	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 6.033.300	$ 241.400	$ 0	$ 241.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 6.033.300		$ 31.500	26	$ 6.033.300	CCF24-COMPENSAR	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7790547811			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1010137443		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CCO CAMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI												04-11						230301-PORVENIR	8	$ 323.556	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.800	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 323.556	$ 13.000	$ 0	$ 13.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 323.556		$ 0	8	$ 323.556	CCF24-COMPENSAR	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	22	$ 1.334.667	$ 213.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.600	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.334.667	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1.334.667		$ 92.900	22	$ 1.334.667	CCF24-COMPENSAR	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 15.181.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7791096668**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1010144565

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	14	$ 5.658.000	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 5.698.000	$ 0	$ 5.698.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 785.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	$ 825.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.796.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 1.843.400	$ 0	$ 1.843.400
SUBTOTALES:										**$ 8.366.800**	**$ 0**	**$ 8.366.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 334.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 168.700
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 264.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 805.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.100	$ 0	$ 0	$ 805.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 223.400
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
SUBTOTALES:													**$ 2.060.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.060.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.266.000	$ 2.266.000	$ 0	$ 0	$ 2.266.000
SUBTOTALES:									**$ 2.266.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.266.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 360.000	$ 0	$ 360.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 1.320.200	$ 0	$ 1.320.200
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:			**$ 2.060.200**	**$ 0**	**$ 2.060.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP					FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																												
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	21	$ 1.190.000	$ 190.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.400	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.190.000	$ 47.600	$ 0	$ 47.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.190.000		$ 82.900	21	$ 1.190.000	CCF24-COMPENSAR	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI												13-21						230301-PORVENIR	9	$ 340.001	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 54.500	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 340.001	$ 13.700	$ 0	$ 13.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 340.001		$ 0	9	$ 340.001	CCF24-COMPENSAR	$ 13.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1013644090	CASTANEDA SUAREZ MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7791096668		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/06/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1010144565

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.958.000	$ 473.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.958.000	$ 118.400	$ 0	$ 118.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.958.000		$ 15.500	30	$ 2.958.000	CCF24-COMPENSAR	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1072168255	GARZON RAMIREZ ANA MILENA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 20.900	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000		$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.600.000		$ 250.600	30	$ 3.600.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.753.200

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7791604728**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1010157579

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 128.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/05/2021	CINP-BTA-023-0809-3038	Correo electrónico; Observaciones comunicado DCS-556-CO1.2323; Presupuestos ajustados lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/05/2021	CINP-BTA-023-0810-3040	Comunicado DCS-582-CO1. 2323; Documentos del residente del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/05/2021	CINP-BTA-023-0811-3054	Comunicado DCS-583-CO1.2323, Informe mensual No. 1 SST y ambiental, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0812-3069	Comunicado DCS-583-CO1.2323, Informe mensual No. 2 SST y ambiental, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0813-3070	Comunicado DCS-583-CO1.2323, Informe mensual No. 3 SST y ambiental, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0814-3071	Comunicado DCS-583-CO1. 2323; Observaciones informe mensual No. 4 Ambiental, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0815-3072	Comunicado DCS-583-CO1. 2323; Observaciones informe mensual No. 4 SST, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0816-3073	Comunicados DCS-575-CO1. 2323 y DCS-583-CO1. 2323; Observaciones Informe Mensual No.5 Ambiental, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0817-3075	Comunicados DCS-575-CO1. 2323 y DCS-583-CO1. 2323; Observaciones Informe Mensual No.5 SST, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0818-3077	Oficio NIS 2021-01-165760 radicado 92021039506, Aclaración informe semanal No. 35 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0819-3088	Solicitud documentación pendiente Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/05/2021	CINP-BTA-023-0820-3089	Oficio 92021039562; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra No.CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0821-3096	Comunicado DCS-588-CO1.2323; Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0822-3097	Comunicado DCS-587-CO1.2323; Documentos del Residente del departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0823-3098	Comunicado DCS-586-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0824-3112	Actividad de mantenimiento preventivo aires acondicionados – Sedes Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0825-3113	Actividades de mantenimiento del contrato de la referencia relacionado con las sedes de Sabanalarga, Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/05/2021	CINP-BTA-023-0826-3114	Informes semanales No. 37, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/05/2021	CINP-BTA-023-0827-3134	Informe semanal No. 37 Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/05/2021	CINP-BTA-023-0828-3154	Reiteración Solicitud aclaración costos contrato de Interventoría por prorroga No.03.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0829-3158	Observaciones componente SST, de la regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0830-3159	Comunicado DCS-591-CO1. 2323; Respuesta observaciones CINP-BTA-023-0823-3098, comunicado DCS-586-CO1. 2323, Personal Relación y documentos del personal del Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0831-3160	Comunicado DCS-592-CO1. 2323; Respuesta observaciones CINP-BTA-023-0823-3098, comunicado DCS-587-CO1.2323; Documentos de Auxiliar de coordinador del departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0832-3161	Comunicado DCS-593-CO1.2323; Documentos de personal de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0833-3162	Solicitud de respuesta a derecho de petición presentado por Madak Ingeniería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0834-3163	Comunicado DCS-589-CO1.2323 Diseño de cuneta sede Colombo Alemán, Barranquilla-Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0835-3180	Comunicado DCS-594-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/05/2021	CINP-BTA-023-0836-3182	Correo electrónico; Informe de estado de actual de actividades y solicitud a problemas encontrados departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/05/2021	CINP-BTA-023-0837-3194	Aclaración sobre la disponibilidad del Coordinador del departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/05/2021	CINP-BTA-023-0838-3195	Comunicado DCS-590-CO1.2323; Solicitud de Modificación de los Integrantes del Consorcio Constructor Alfa.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
20/05/2021	CINP-BTA-023-0839-3202	Informes semanales No. 38, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/05/2021	CINP-BTA-023-0480-3216	Comunicado DCS-595-CO1.2323, Corte de Obra No. 6.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/05/2021	CINP-BTA-023-0481-3217	Radicado No. 7-2021-140043, PQRS -QUEJA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/05/2021	CINP-BTA-023-0842-3241	Observaciones componente Seguridad y Salud en el Trabajo, regional Bolivar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/05/2021	CINP-BTA-023-0843-3243	Comunicado DCS-599-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolivar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/05/2021	CINP-BTA-023-0844-3276	Solicitud copia pólizas actualizadas contra modificación No. 4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/05/2021	CINP-BTA-023-0845-3299	Informes Mensuales No. 9, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0846-3303	Comunicado DCS-600-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0847-3304	Estado Actual Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0848-3305	Estado Actual Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0849-3308	Revisión informe mensual No.9 Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0850-3309	Retraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba según Programación ajustada prórroga No.3.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/05/2021	CINP-BTA-023-0851-3311	Comunicado DCS-601-CO1. 2323; Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0780-2859, DCS- 567-CO1.2323 Y DCS-580-CO1.2323, Relación de personal Córdoba; Sucre, Bolívar, Magdalena y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/05/2021	CINP-BTA-023-0852-3355	Comunicado DCS-598-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/05/2021	CINP-BTA-023-0853-3361	Presupuestos ajustados Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/05/2021	CINP-BTA-023-0854-3380	Solicitud de entrega de documentación componente SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/05/2021	CINP-BTA-023-0855-3381	Remodelación cafetería piso 3 sede Comercio y Servicio – Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0856-3435	Solicitud de entrega de documentación componente SST requerida para trabajos en Bloque C, regional Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0857-3436	Comunicado DCS-602-CO1.2323, Remisión garantías actualizadas contra modificación No. 4 (Prórroga No. 3) de su Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0858-3453	Programación visitas a las sedes, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0859-3454	Comunicado DCS-609-CO1.2323; Relación y documentos del personal de Archipiélago San Andrés providencia y santa catalina.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0860-3455	Comunicado DCS-608-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/05/2021	CINP-BTA-023-0861-3456	Solicitud de informe de aplicación del protocolo de bioseguridad para el posible caso Covid -19 en CCIT de Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0862-3465	Informe mensual No. 9, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0863-3480	Comunicado DCS-604-CO1.2323; Alcance solicitud de Modificación de los Integrantes del Consorcio Constructor Alfa.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0864-3481	Correo electrónico; Diagnostico Eléctrico Sedes de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0865-3482	Comunicado DCS-606-CO1. 2323; Remisión ítems no previstos CESAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0866-3483	Formatos trámite aprobación ítems no previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0867-3487	Solicitud documentación pendiente Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
31/05/2021	CINP-BTA-023-0868-3494	Informes Mensuales No. 9, Guajira y Magdalena, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
31/05/2021	CINP-BTA-023-0869-3506	Informes semanales No. 37, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/06/2021	CINP-BTA-023-0870-3510	Correo electrónico; Evidencia Locativa - Predio la Vitrina.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/06/2021	CINP-BTA-023-0871-3511	Comunicado DCS-612-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/06/2021	CINP-BTA-023-0872-3515	Comunicado DCS-610-CO1. 2323; Variables causantes de retrasos en ejecución cubierta sede dirección regional Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/06/2021	CINP-BTA-023-0873-3516	Correo electrónico; Solicitud mantenimiento aires acondicionado.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/06/2021	CINP-BTA-023-0874-3535	Comunicado DCS-611-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/06/2021	CINP-BTA-023-0875-3564	Obligaciones Contractuales - Departamento Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/06/2021	CINP-BTA-023-0876-3574	Comunicado DCS-618-CO1. 2323; Solicitud de Pago Facturas de fecha 10 de mayo de 2021.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/06/2021	CINP-BTA-023-0877-3596	Correo electrónico; Relación y documentos del personal eléctrico departamentos de guajira y magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/06/2021	CINP-BTA-023-0878-3597	Solicitud de retiro de RCD de la Sede COMM Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/06/2021	CINP-BTA-023-0879-3598	Comunicado DCS-619-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/06/2021	CINP-BTA-023-0880-3599	Comunicado DCS--CO1. 2323; CINP-BTA-023-0841-3217 Respuesta al radicado No. 7-2021-140043, PQRS –Queja Dubys Valenzuela.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/06/2021	CINP-BTA-023-0881-3600	Correo electrónico; Observaciones comunicado DCS-556-CO1.2323 PRESUPUESTOS AJUSTADOS LOTE 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0882-3622	Informes semanales No. 39, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0883-3628	Comunicado DCS-623-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0861-3456; Informe de aplicación del protocolo de bioseguridad en CCIT de Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0884-3629	Alcance comunicado CINP-BTA-023-0881-3600; Observaciones comunicado DCS-556-CO1.2323; Presupuestos Ajustados Lote 1 Departamento Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0885-3630	Comunicado DCS-620-CO1. 2323; Respuesta a observaciones de los comunicados CINP-BTA-023-0856-3435 y CINP-BTA-023-0842-3241.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0886-3631	Comunicado DCS-621-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0887-3634	Comunicado DCS-615-CO1.2323; Entrega APU No Previstos, Departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/06/2021	CINP-BTA-023-0888-3635	Reiteración de Retraso en la ejecución de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0889-3670	Comunicado DCS-630-CO1. 2323; Remisión a informes SST Nº6 y Nº7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0890-3671	Comunicado DCS-625-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0891-3673	Comunicado DCS-614-CO1. 2323; Aprobación de informes SST Y PMA No.4.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0892-3674	Comunicado DCS-614-CO1. 2323; Aprobación de informes SST Y PMA No.5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0893-3675	Comunicado DCS-627-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0894-3676	Comunicado DCS-626-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico municipio Sabanalarga.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0895-3677	Comunicado DCS-628-CO1. 2323; Respuesta a observaciones comunicado CINP-BTA-023-0804-2990, Comunicado DCS-577-CO1.2323. Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0896-3692	Informe Mensual No. 9, Bolívar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/06/2021	CINP-BTA-023-0897-3693	Informe Mensual No. 9, Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/06/2021	CINP-BTA-023-0898-3698	Solicitud de priorización de mantenimiento red sanitaria Casa del Marques Premio Real, Regional Departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/06/2021	CINP-BTA-023-0899-3700	Comunicado DCS-632-CO1. 2323; Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0885-3630 y solicitud de reinicio de trabajos de altura Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/06/2021	CINP-BTA-023-0900-3702	Comunicado DCS-631-CO1.2323; Relación y documentos del personal de la Jagua departamento de CESAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/06/2021	CINP-BTA-023-0901-3705	Solicitud de entrega de balances y presupuestos ajustados sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/06/2021	CINP-BTA-023-0902-3706	Observaciones a la actividad NP-10.297SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO) en cubierta del bloque Hotel escuela sede San	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/06/2021	CINP-BTA-023-0903-3709	Comunicado DCS-635-CO1.2323, Corte de Obra No. 6.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0904-3723	Comunicado DCS-629-CO1.2323; Cambio Coordinador de obra, Regionales Bolívar y Sucre, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0905-3724	Solicitud de entrega de documentos SST-MA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0906-3727	Comunicado DCS-638-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de GUAJIRA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0907-3728	Comunicado DCS-633-CO1. 2323; Remisión informe SST Nº8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0908-3729	Comunicado DCS-637-CO1. 2323; Solicitud de reinicio de trabajos de altura Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0909-3735	Comunicado DCS-624-CO1.2323; Solicitud prórroga No. 4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0910-3739	RECOMENDACION INICIO DE ACCIONES SANCIONATORIAS CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.1552323	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0911-3744	Solicitud prórroga No. 4 y adición, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0912-3745	Correo electrónico; Reiteración de Evidencia Locativa - Predio la Vitrina.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/06/2021	CINP-BTA-023-0913-3756	Informes semanales No. 40, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	38	DEL	10 de mayo de 2021	AL	16 de mayo de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

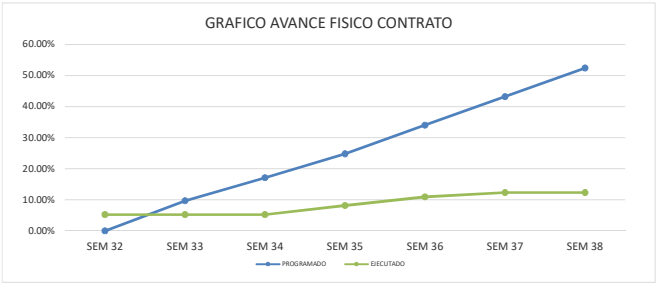


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	5.26%	**5.26%**
SEM 33	9.67%	5.26%	**-4.41%**
SEM 34	17.10%	5.26%	**-11.84%**
SEM 35	24.82%	8.15%	**-16.67%**
SEM 36	34.02%	10.93%	**-23.09%**
SEM 37	43.22%	12.35%	**-30.87%**
SEM 38	52.42%	12.35%	**-40.07%**
	ALERTAS		**-40.07%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

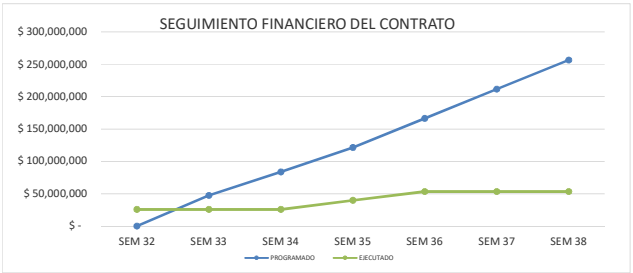

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ 25,747,807	**$ 25,747,807**
SEM 33	$ 47,354,936	$ 25,747,807	**$ -21,607,129**
SEM 34	$ 83,694,782	$ 25,747,807	**$ -57,946,974**
SEM 35	$ 121,479,970	$ 39,894,416	**$ -81,585,553**
SEM 36	$ 166,520,265	$ 53,488,849	**$ -113,031,416**
SEM 37	$ 211,560,561	$ 53,488,849	**$ -158,071,712**
SEM 38	$ 256,600,857	$ 53,488,849	**$ -203,112,008**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	38	DEL	10 de mayo de 2021	AL	16 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021		31/03/2021		-44249.00	-44286.00
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	-44296.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	-191.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	-44296.00
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		22/05/2021		-44310.00	-44338.00
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		22/05/2021		-44315.00	-44338.00
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	-44338.00
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	-44346.00
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		26/06/2021		-44324.00	-44373.00
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	-44373.00
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						30/06/2021

Plazo total del Proyecto en Días	**314**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**45**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Contratista no ha reiniciado actividades. Actividades se encuebtran suspendidasdesde el pasado 27 Octubre
Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades se encuentran suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	38	DEL	10 de mayo de 2021	AL	16 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se inicio trabajos de revision inst electricas bloque hotel Se realizo revision de ascensor en bloque hotel
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Se inicio trabajos de construccion plantilla cubierta bloque hotel Se realizo revision de sistema de bombas
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Se fundió en mortero la plantilla de la cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se realizó demolicion de ceramica en bloque de mantenimiento.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Se Inicio instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se incio pintura en vinilo de pasillos bloque Av. Newball.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se realizo recorrido a las instalaciones con personal de auditoria del Sena, con el fin de ver avances del contrato Contratista realizó entrega de presupuestos a lainterventortia para su revision.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.

DIECIOCHO	18	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	38	DEL	10 de mayo de 2021	AL	16 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque hotel

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	39	DEL	17 de mayo de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	23 de mayo de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$691.547.950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

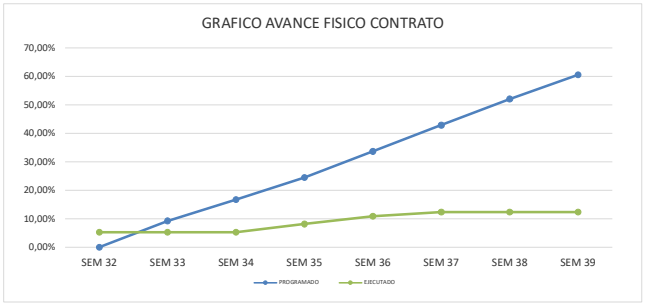


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0,00%	5,26%	**5,26%**
SEM 33	9,25%	5,26%	**-3,99%**
SEM 34	16,74%	5,26%	**-11,48%**
SEM 35	24,51%	8,15%	**-16,36%**
SEM 36	33,70%	10,93%	**-22,78%**
SEM 37	42,89%	12,35%	**-30,54%**
SEM 38	52,08%	12,35%	**-39,73%**
SEM 39	60,63%	12,35%	**-48,28%**
ALERTAS			**-100,00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

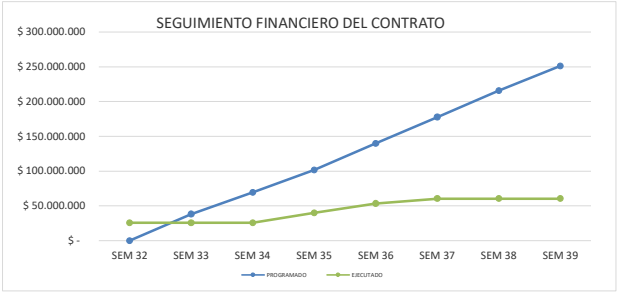

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ 25.747.807	$ **25.747.807**
SEM 33	$ 38.344.078	$ 25.747.807	$ **-12.596.271**
SEM 34	$ 69.379.853	$ 25.747.807	$ **-43.632.046**
SEM 35	$ 101.585.946	$ 39.894.416	$ **-61.691.530**
SEM 36	$ 139.666.620	$ 53.488.849	$ **-86.177.771**
SEM 37	$ 177.747.294	$ 60.453.502	$ **-117.293.792**
SEM 38	$ 215.827.968	$ 60.453.502	$ **-155.374.466**
SEM 39	$ 251.231.910	$ 60.453.502	$ **-190.778.408**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	39	DEL	17 de mayo de 2021	AL	23 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0,00	0,00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1,00	2,00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0,00	0,00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0,00	0,00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021		31/03/2021		-90,00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187,00	
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187,00	-191,00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17,00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		22/05/2021		-29,00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		22/05/2021		-24,00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206,00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16,00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		26/06/2021		-15,00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14,00	
						0,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			

Plazo total del Proyecto en Días	**313**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**38**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	39	DEL	17 de mayo de 2021	AL	23 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Se inicio trabajos de construccion plantilla cubierta bloque hotel Se realizo revision de sistema de bombas
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Se fundió en mortero la plantilla de la cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se realizó demolicion de ceramica en bloque de mantenimiento.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Se Inicio instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se incio pintura en vinilo de pasillos bloque Av. Newball.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se realizo recorrido a las instalaciones con personal de auditoria del Sena, con el fin de ver avances del contrato Contratista realizó entrega de presupuestos a lainterventortia para su revision.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.

VEINTICUATRO	24	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	40	DEL	24 de mayo de 2021	AL	30 de mayo de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

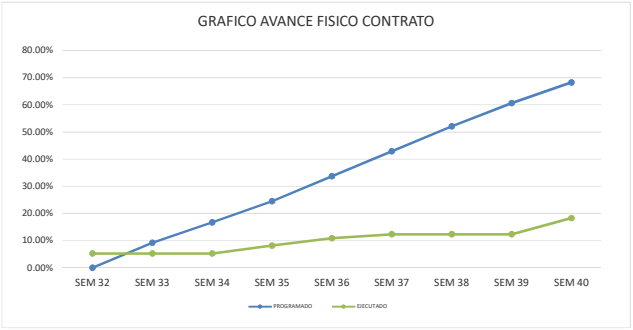


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	5.26%	**5.26%**
SEM 33	9.25%	5.26%	**-3.99%**
SEM 34	16.74%	5.26%	**-11.48%**
SEM 35	24.51%	8.15%	**-16.36%**
SEM 36	33.70%	10.93%	**-22.78%**
SEM 37	42.89%	12.35%	**-30.54%**
SEM 38	52.08%	12.35%	**-39.73%**
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
	ALERTAS		**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

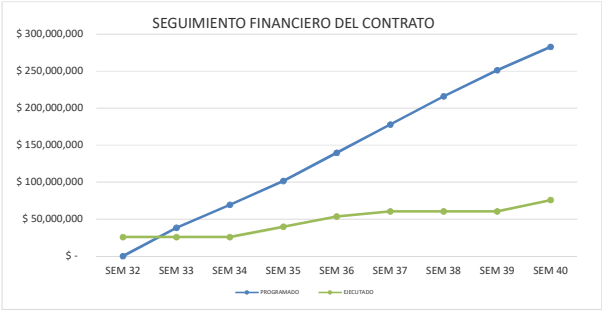

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ 25,747,807	$ **25,747,807**
SEM 33	$ 38,344,078	$ 25,747,807	$ **-12,596,271**
SEM 34	$ 69,379,853	$ 25,747,807	$ **-43,632,046**
SEM 35	$ 101,585,946	$ 39,894,416	$ **-61,691,530**
SEM 36	$ 139,666,620	$ 53,488,849	$ **-86,177,771**
SEM 37	$ 177,747,294	$ 60,453,502	$ **-117,293,792**
SEM 38	$ 215,827,968	$ 60,453,502	$ **-155,374,466** #
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	$ **-190,778,408**
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	$ **-206,994,283**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	40	DEL	24 de mayo de 2021	AL	30 de mayo de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021		31/03/2021		-97.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	-191.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		22/05/2021		-36.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		22/05/2021		-31.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		26/06/2021		-22.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**313**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**31**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	40	DEL	24 de mayo de 2021	AL	30 de mayo de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Se fundió en mortero la plantilla de la cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se realizó demolicion de ceramica en bloque de mantenimiento.
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Se Inicio instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se incio pintura en vinilo de pasillos bloque Av. Newball.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se realizo recorrido a las instalaciones con personal de auditoria del Sena, con el fin de ver avances del contrato Contratista realizó entrega de presupuestos a lainterventortia para su revision.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.

TREITA Y UNO	31	días del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	40	DEL	24 de mayo de 2021	AL	30 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Mamposteria cafeteria



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Mamposteria cafeteria



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Mamposteria cafeteria



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Pintura fachada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	41	DEL	31 de mayo de 2021	AL	6 de junio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

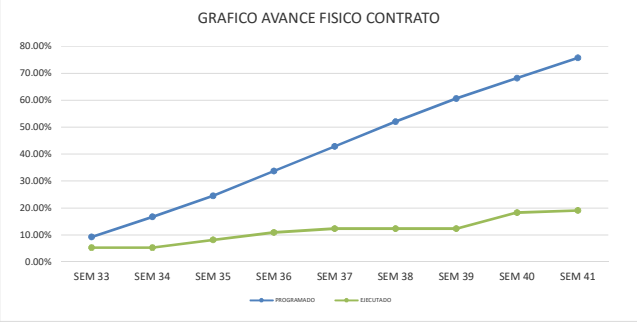


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 33	9.25%	5.26%	**-3.99%**
SEM 34	16.74%	5.26%	**-11.48%**
SEM 35	24.51%	8.15%	**-16.36%**
SEM 36	33.70%	10.93%	**-22.78%**
SEM 37	42.89%	12.35%	**-30.54%**
SEM 38	52.08%	12.35%	**-39.73%**
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
SEM 41	75.74%	19.10%	**-56.64%**
	ALERTAS		**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

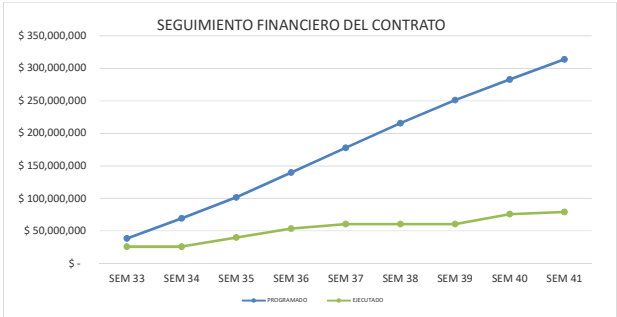

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 33	$ 38,344,078	$ 25,747,807	$ **-12,596,271**	
SEM 34	$ 69,379,853	$ 25,747,807	$ **-43,632,046**	
SEM 35	$ 101,585,946	$ 39,894,416	$ **-61,691,530**	
SEM 36	$ 139,666,620	$ 53,488,849	$ **-86,177,771**	
SEM 37	$ 177,747,294	$ 60,453,502	$ **-117,293,792**	
SEM 38	$ 215,827,968	$ 60,453,502	$ **-155,374,466**	##
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	$ **-190,778,408**	#
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	$ **-206,994,283**	#
SEM 41	$ 313,865,053	$ 79,150,186	$ **-234,714,867**	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	41	DEL	31 de mayo de 2021	AL	6 de junio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021		31/03/2021		-104.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	-191.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		22/05/2021		-43.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		22/05/2021		-38.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		26/06/2021		-29.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	
						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**313**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**24**	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se reinici actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	41	DEL	31 de mayo de 2021	AL	6 de junio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Se Inicio instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se incio el acopio de materiel de shingle para cubierta edificacion Se incio pintura en vinilo de pasillos bloque Av. Newball.
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se realizo recorrido a las instalaciones con personal de auditoria del Sena, con el fin de ver avances del contrato Contratista realizó entrega de presupuestos a lainterventortia para su revision.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.

OCHO	8	días del mes de	JUNIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	41	DEL	31 de mayo de 2021	AL	6 de junio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	42	DEL	8 de junio de 2021	AL	14 de junio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación inicial	1 DE DICIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

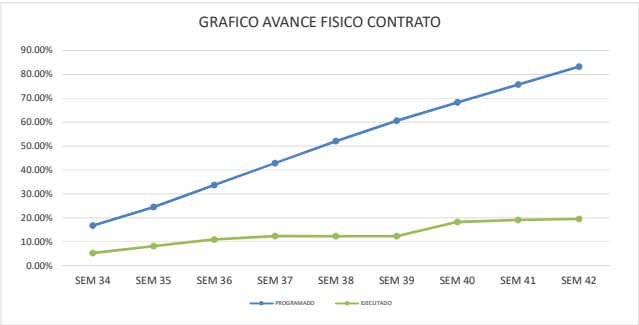


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 34	16.74%	5.26%	**-11.48%**
SEM 35	24.51%	8.15%	**-16.36%**
SEM 36	33.70%	10.93%	**-22.78%**
SEM 37	42.89%	12.35%	**-30.54%**
SEM 38	52.08%	12.35%	**-39.73%**
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
SEM 41	75.74%	19.10%	**-56.64%**
SEM 42	83.23%	19.50%	**-63.73%**
	ALERTAS		**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

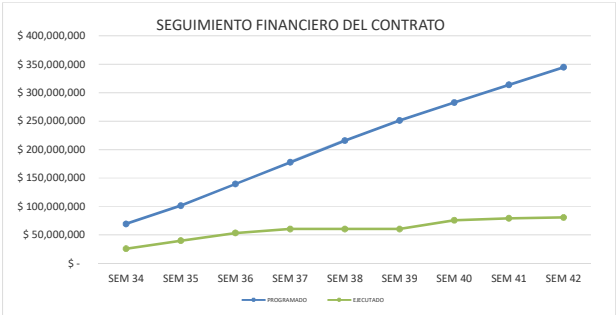

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 34	$ 69,379,853	$ 25,747,807	**$ -43,632,046**
SEM 35	$ 101,585,946	$ 39,894,416	**$ -61,691,530**
SEM 36	$ 139,666,620	$ 53,488,849	**$ -86,177,771**
SEM 37	$ 177,747,294	$ 60,453,502	**$ -117,293,792**
SEM 38	$ 215,827,968	$ 60,453,502	**$ -155,374,466**
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	**$ -190,778,408**
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	**$ -206,994,283**
SEM 41	$ 313,865,053	$ 79,150,186	**$ -234,714,867**
SEM 42	$ 344,900,828	$ 80,807,781	**$ -264,093,047**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	42	DEL	8 de junio de 2021	AL	14 de junio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021		31/03/2021		-112.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	-191.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		22/05/2021		-51.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		22/05/2021		-46.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		26/06/2021		-37.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**17**	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se Inician trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	42	DEL	8 de junio de 2021	AL	14 de junio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7790547811	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7791604728	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7791096668	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se realizo recorrido a las instalaciones con personal de auditoria del Sena, con el fin de ver avances del contrato Contratista realizó entrega de presupuestos a lainterventortia para su revision.
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	14-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato. Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista.

CATORCE	14	días del mes de	JUNIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	42	DEL	8 de junio de 2021	AL	14 de junio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica Hotel Escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica Hotel Escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica Hotel Escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica Hotel Escuela

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S CONSORCIOINTERINGECOGNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	10/06/2021	MES UNO DE OBRA	No. 10	DEL	12/05/2021	AL	11/06/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES UNO DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Adecuacion fachada



FOTOGRAFÍA No. 2: Adecuacion fachada



FOTOGRAFÍA No. 3: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 4: Cubierta en shingle



FOTOGRAFÍA No. 5:const cafeteria 5to piso



FOTOGRAFÍA No. 6: const cafeteria 5to piso



FOTOGRAFÍA No. 7: Instalacion Manto caliente



FOTOGRAFÍA No. 8: Instalacion Manto caliente



FOTOGRAFÍA No. 9: Instalacion electrica



FOTOGRAFÍA No. 10: Instalacion electrica



FOTOGRAFÍA No. 11: Instalacion electrica



FOTOGRAFÍA No. 12: Instalacion electrica

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada.

DCS-571-CO1. 2323

Bogotá D.C.,5 de mayo de 2021

Señores
CONSORCIO INTERINGECOGNC
Atn. PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director Interventoría
Ciudad

Asunto: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL.",* Programaciones actualizadas

Cordial Saludo:


Se remite programaciones y flujo de caja de todas las sedes de LOTE 1 actualizadas a la prórroga de obra Nº3. Para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

SERGIO NICOLAS MOLINA SAAVEDRA
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Nit. 901382278-7


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	|	**Programación LOTE 1**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 7.023.410.231,35**
1		**INICIO**	0 días	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 0,00
2		**REGIONAL ATLANTICO**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.518.674.751,44**
3		**COLOMBO ALEMÁN - CLL 30# 3E-165 - BARRANQUILLA**	**52,75 días?**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 293.024.751,04**
4	5	LAVADO DE TANQUE	5,75 días?	lun 19/04/21	lun 26/04/21	$ 1.880.607,07
5	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	15,75 días	dom 2/05/21	vie 21/05/21	$ 1.813.328,00
6	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza. Demoliciones. Pinturas. Estructuras. Etc.)	43 días	lun 3/05/21	mié 30/06/21	$ 82.101.968,76
7	9	UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17 días	vie 28/05/21	sáb 19/06/21	$ 20.314.208,00
8	NP	NO PREVISTOS	22 días	lun 26/04/21	mar 25/05/21	$ 186.914.639,21
9		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN BARRANQUILLA**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 320.950.109,88**
10	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	mar 18/05/21	mié 30/06/21	$ 113.801.088,08
11	NP	NO PREVISTOS	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 207.149.021,80
12		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial- zona Urbana**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 159.339.013,47**
13	1	Impermeabilizaciones	11 días	lun 10/05/21	lun 24/05/21	$ 9.762.888,00
14	2	Sistemas electricos	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 46.810.151,00
15	5	LAVADO DE TANQUES	5 días	mar 1/06/21	lun 7/06/21	$ 2.651.138,00
16	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.872.902,00
17	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 73.052.274,00
18	NP	NO PREVISTOS	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 17.189.660,47
19		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial - El Caney- Rural**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 140.584.943,72**
20	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días	mar 18/05/21	lun 31/05/21	$ 3.452.868,00
21	2	SISTEMAS ELECTRICOS	14 días	vie 11/06/21	mié 30/06/21	$ 62.215.049,00
22	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 14/06/21	sáb 19/06/21	$ 2.129.134,00
23	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	lun 21/06/21	mié 30/06/21	$ 2.967.264,00
24	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 32.321.167,14
25	NP	NO PREVISTOS	14 días	sáb 12/06/21	mié 30/06/21	$ 37.499.461,58
26		**DESPACHO REGIONAL - KR 43 # 42-40, BARRANQUILLA**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 162.155.624,79**
27	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días?	lun 26/04/21	sáb 8/05/21	$ 1.716.610,00
28	2	SISTEMAS ELECTRICOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 2.618.115,00
29	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 7/06/21	sáb 12/06/21	$ 11.278.020,00
30	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 21.027.513,80
31	NP	NO PREVISTOS	1 día?	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 125.515.365,99
32		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 442.620.308,54**
33	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 251.338.966,00
34	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 7/06/21	sáb 19/06/21	$ 12.514.756,00
35	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 21/06/21	sáb 26/06/21	$ 204.263,00
36	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 39.714.994,00
37	8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 128.292.947,22
38	9	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 10.127.715,00
39	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 426.667,32
40		**REGIONAL BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 935.200.880,20**
41		**AGROEMPRESARIAL - MOMPOX**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.072.478,00**
42	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
43	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
44	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
45	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 134.908,00

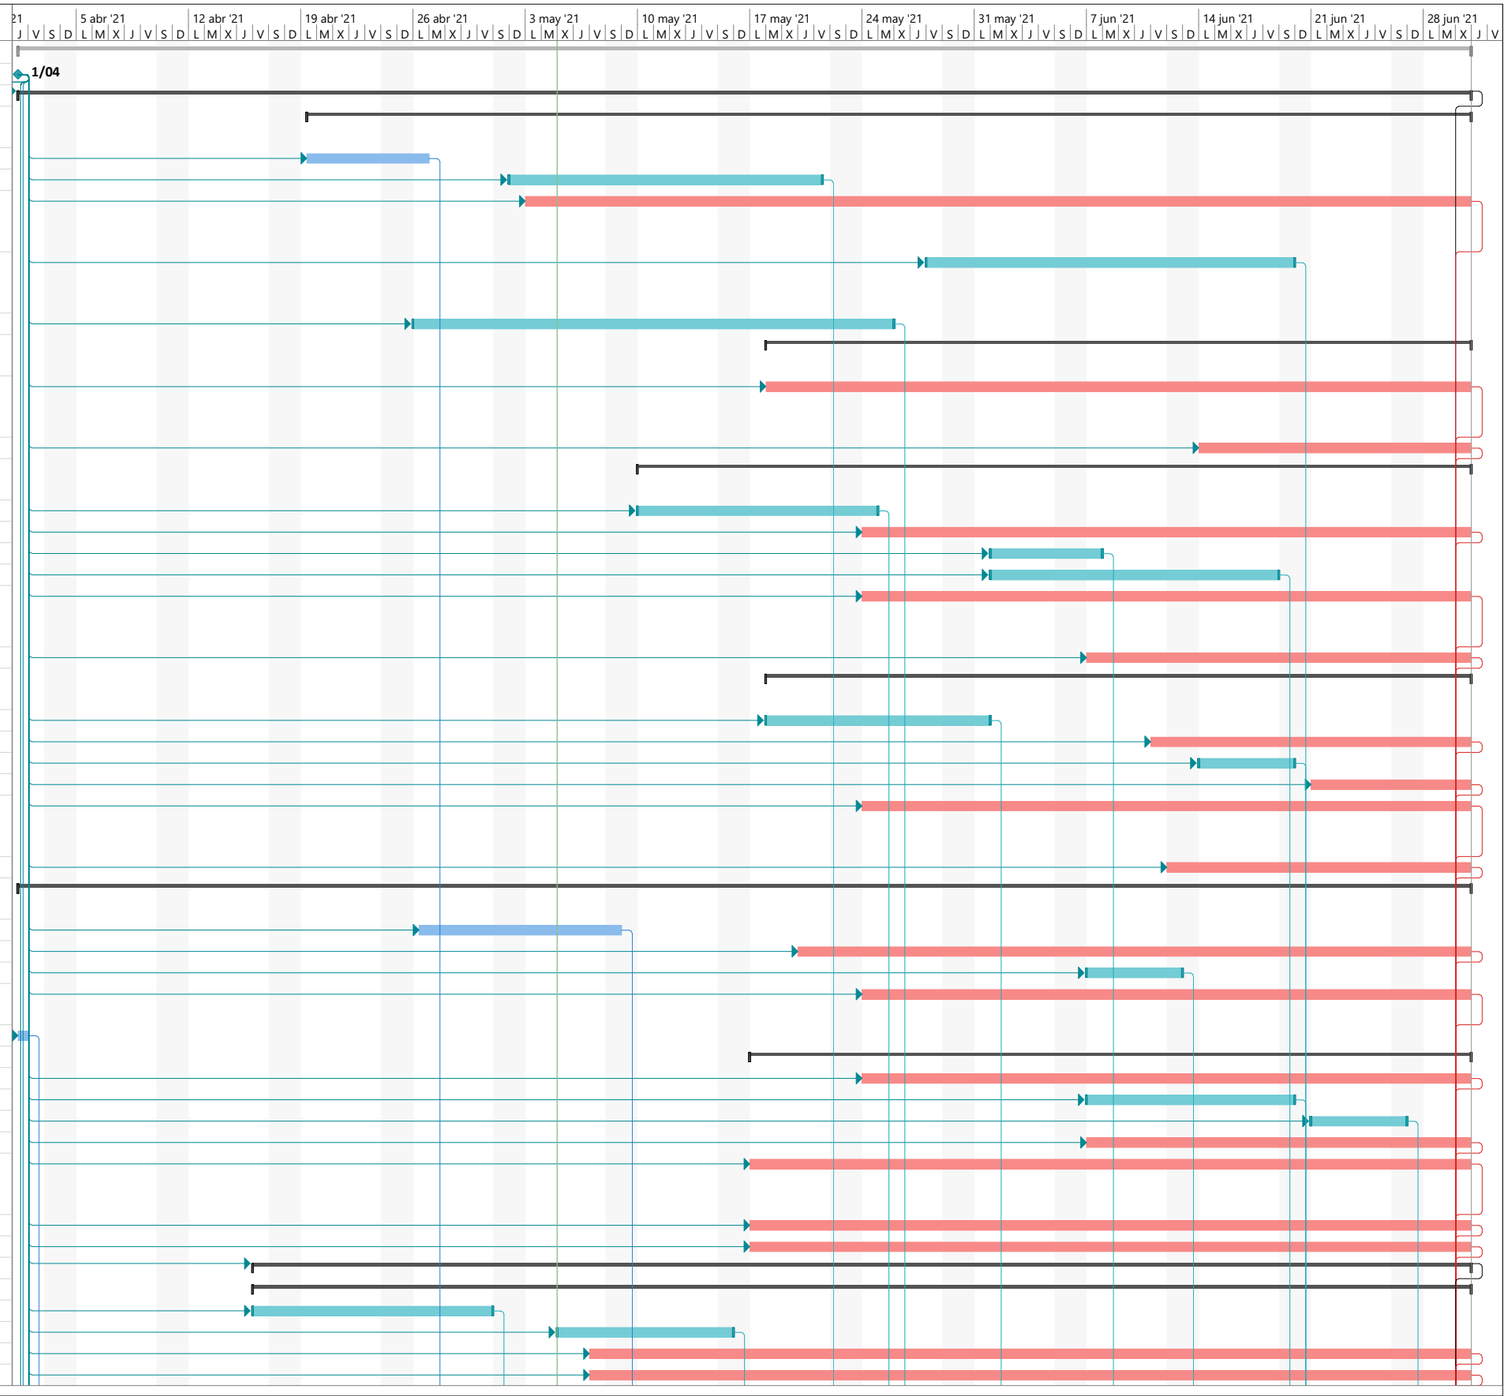

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
46		**CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 145.445.387,65**
47	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 28.918.644,00
48	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 3.429.844,00
49	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 283.680,00
50	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.401.019,00
51	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	38 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 6.181.800,00
52	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.483.624,00
53	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 81.746.776,65
54		**MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 251.927.637,92**
55	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 4.094.306,00
56	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 324.190,00
57	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 1.888.500,00
58	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 2.395.520,00
59	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 2.007.717,00
60	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 62.182.842,00
61	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 108.367.661,00
62	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 406.610,00
63	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 70.260.291,92
64		**AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 2.650.749,00**
65	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
66	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
67	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.153.936,00
68	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.218.635,00
69		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 12.762.841,00**
70	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
71	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 713.946,00
72	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 7.253.312,00
73	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 2.425.423,00
74	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 337.270,00
75		**CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 317.043.127,14**
76	1	Impermeabilizaciones	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 12.460.498,00
77	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 12.105.284,00
78	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	sáb 29/05/21	$ 7.620.950,00
79	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 961.440,00
80	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 5.552.188,00
81	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 163.471.220,00
82	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 16.310.261,00
83	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 98.561.286,14
84		**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.**	**38,75 días**	**vie 7/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 88.628.579,23**
85	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26 días	lun 24/05/21	sáb 26/06/21	$ 27.464.369,00
86	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 61.164.210,23
87		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 115.670.080,26**
88	2	Sistemas Electricos	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
89	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 2.349.108,00
90	5	Lavado de tanques	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 378.240,00
91	6	Sistemas contra incendio.	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.226.504,00
92	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 73.650,00

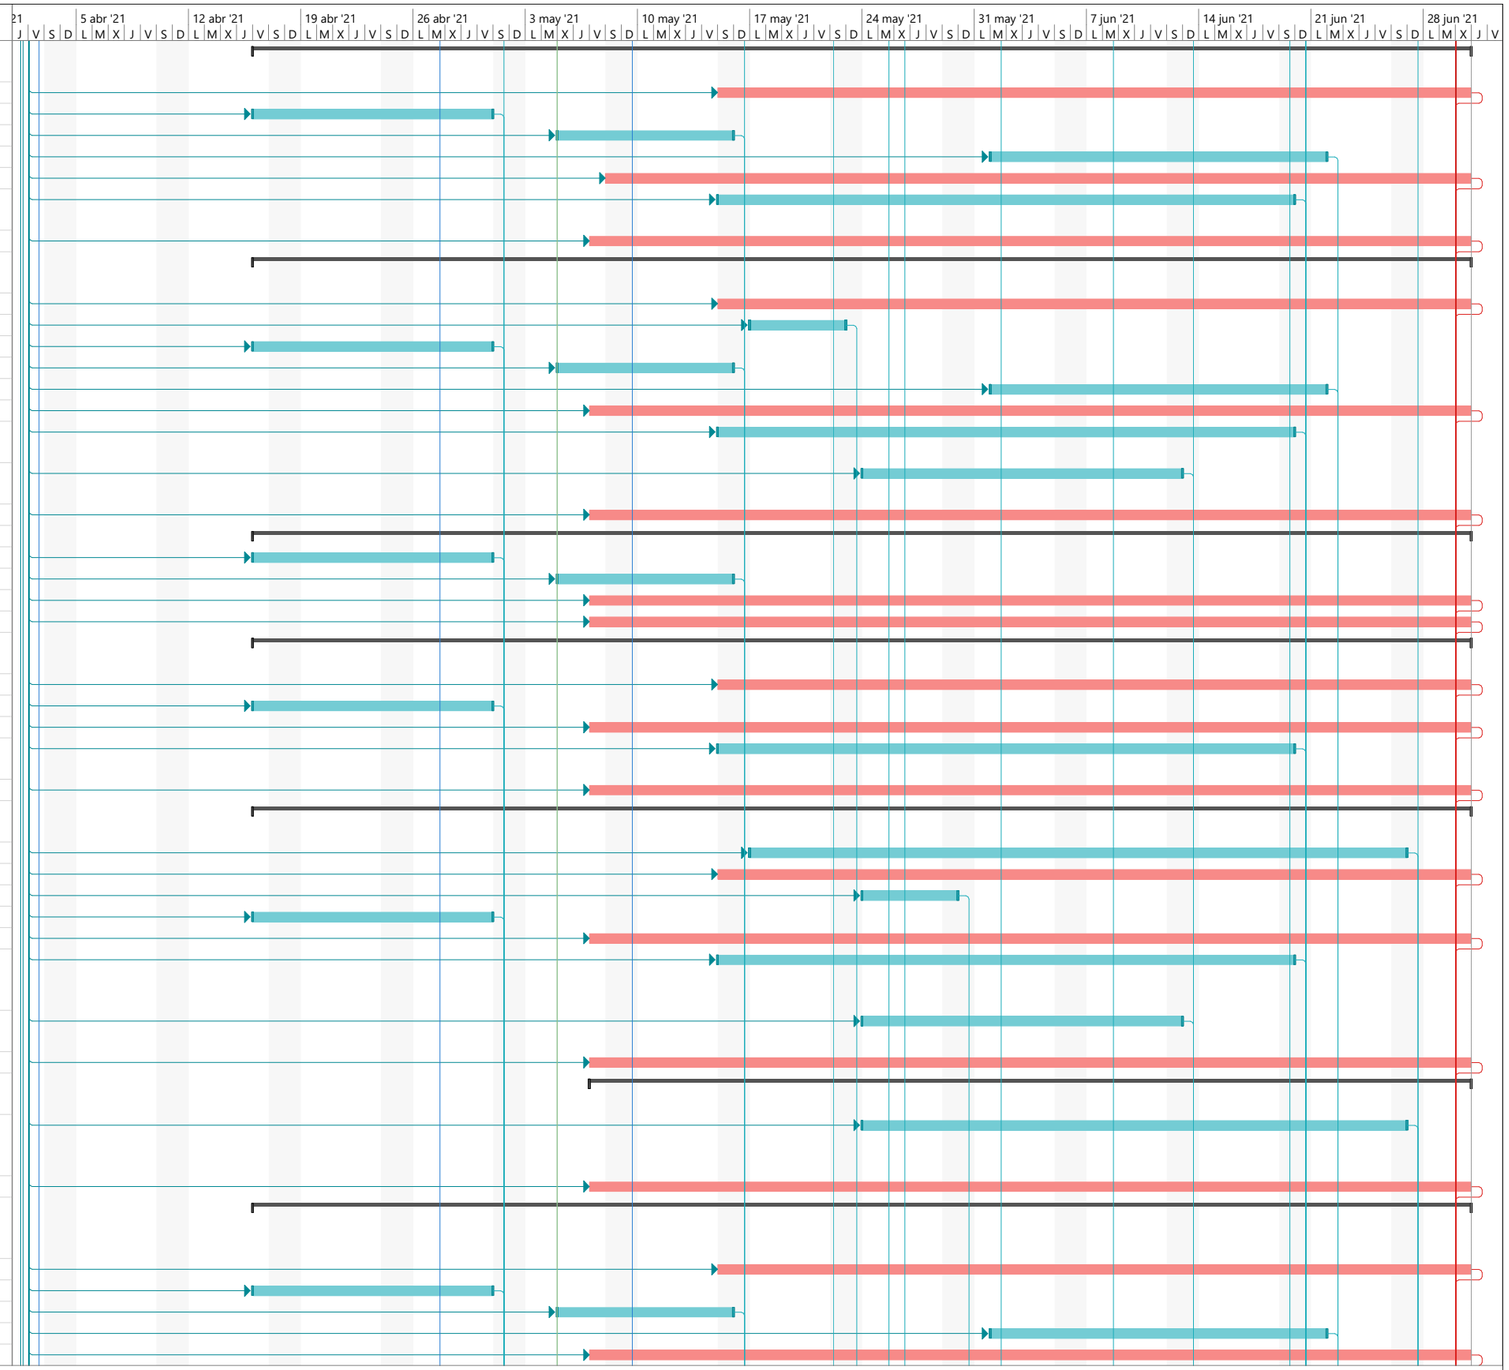

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
93	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 49.830.486,00
94	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.063.428,00
95	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 58.715.774,26
96		**REGIONAL SUCRE**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 176.361.446,39**
97		**SEDE COROZAL Cra 26 #261a-83**	**5 días**	**lun 26/04/21**	**sáb 1/05/21**	**$ 1.153.936,00**
98	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.153.936,00
99		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SEDE BOSTON**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 23.964.200,00**
100	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 3.063.676,00
101	3	SERVICIO DE JARDINERIA	21 días	lun 3/05/21	sáb 29/05/21	$ 711.000,00
102	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
103	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 11.374.512,00
104	NP	ITEMS NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 7.387.120,00
105		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA- KR 1 #20-10 - TOLU**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.658.890,00**
106	1	IMPERMEABILIZACIONES	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 17.544.650,00
107	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 11.528.878,00
108	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
109	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.296.960,00
110	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	36 días	lun 10/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.028.400,00
111	NP	NO PREVISTOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 6.832.110,00
112		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS - KILÓMETRO 5 VÍA SAMPUÉS - GALLERA**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 97.584.420,39**
113	1	IMPERMEBEALIZACIONES	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 16.947.550,00
114	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 23.941.301,00
115	3	SERVICIO DE JARDINERIA	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 14.418.000,00
116	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.669.753,00
117	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 8.901.792,00
118	NP	NO PREVISTOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 28.706.024,39
119		**REGIONAL GUAJIRA**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 618.070.994,22**
120		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA - KM 1 VIA BARRANCAS -FONSECA**	**29,75 días**	**jue 20/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 56.959.490,02**
121	3	SERVICIO DE JARDINERIA	13 días	jue 20/05/21	lun 7/06/21	$ 34.281.230,00
122	5	LAVADO TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 3.032.458,00
123	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 299.153,00
124	NP	NO PREVISTOS	15 días	jue 10/06/21	mié 30/06/21	$ 19.346.649,02
125		**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 286.201.175,54**
126	2	SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 69.468.968,00
127	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 23.925.760,00
128	5	LAVADO DE TANQUES	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 847.249,67
129	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 3.907.399,00
130	NP	NO PREVISTOS	18 días	mar 18/05/21	jue 10/06/21	$ 188.051.798,87
131		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA-TRONCAL DEL CARIBE A MAICAO KM5**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 122.063.512,66**
132	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 73.612.818,00
133	3	SERVICIO JARDINERIA	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 35.197.280,00
134	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
135	NP	NO PREVISTOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 12.594.022,66
136		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO-CARRERA42A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 152.846.816,00**
137	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 8.063.170,00
138	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 494.544,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
139	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	22 días	sáb 15/05/21	sáb 12/06/21	$ 254.430,00
140	NP	NO PREVISTOS	27 días	mar 25/05/21	mié 30/06/21	$ 144.034.672,00
141		**REGIONAL MAGDALENA**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 514.295.901,45**
142		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- EL BANCO**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 11.177.239,18**
143	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 518.704,00
144	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 771.961,00
145	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 3.022.424,96
146	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 152.612,00
147	NP	NO PREVISTOS	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 6.711.537,22
148		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- CIENAGA**	**27 días**	**jue 6/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 15.539.726,42**
149	1	IMPERMEABILIZACIONES	8 días	jue 6/05/21	sáb 15/05/21	$ 1.189.560,00
150	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 62.598,72
151	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 906.664,00
152	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 4.000.000,00
153	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	8 días	jue 27/05/21	sáb 5/06/21	$ 397.280,00
154	NP	NO PREVISTOS	11 días	lun 31/05/21	sáb 12/06/21	$ 8.983.623,70
155		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.417.282,09**
156	1	IMPERMEABILIZACIONES	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 2.167.680,00
157	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 10/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.070.402,00
158	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
159	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 205.396,20
160	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 659.392,00
161	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 6.528.910,00
162	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 3.316.019,00
163	NP	NO PREVISTOS	36 días	mié 12/05/21	mié 30/06/21	$ 34.755.536,89
164		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- SANTA MARTA**	**30,75 días**	**mié 12/05/21**	**mié 23/06/21**	**$ 61.717.316,82**
165	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	jue 20/05/21	vie 4/06/21	$ 1.341.600,00
166	2	SISTEMAS ELECTRICOS	17 días	sáb 15/05/21	sáb 5/06/21	$ 9.089.754,00
167	3	SERVICIO DE JARDINERIA	7 días	sáb 15/05/21	sáb 22/05/21	$ 13.215.320,00
168	4	EQUIPOS DE BOMBEO	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.644.412,00
169	5	LAVADO TANQUES	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.152.914,00
170	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mié 12/05/21	jue 20/05/21	$ 1.648.480,00
171	NP	NO PREVISTOS	9 días	sáb 12/06/21	mié 23/06/21	$ 29.624.836,82
172		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Santa Marta**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 263.535.125,41**
173	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 2.855.784,00
174	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 195.061,79
175	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 13.139.318,00
176	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	53 días	lun 19/04/21	mié 30/06/21	$ 98.185.464,15
177	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	7 días	jue 20/05/21	vie 28/05/21	$ 6.416.694,00
178	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 142.742.803,47
179		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Fundación**	**25 días**	**lun 10/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 24.877.230,45**
180	2	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 60.290,00
181	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 989.088,00
182	NP	NO PREVISTOS	11 días	mar 18/05/21	mar 1/06/21	$ 23.827.852,45
183		**Dirección Regional, APE y Servicios Medicos – Santa Marta, Av. Ferrocarril 27 – 97.**	**44,75 días**	**jue 29/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 84.031.981,08**

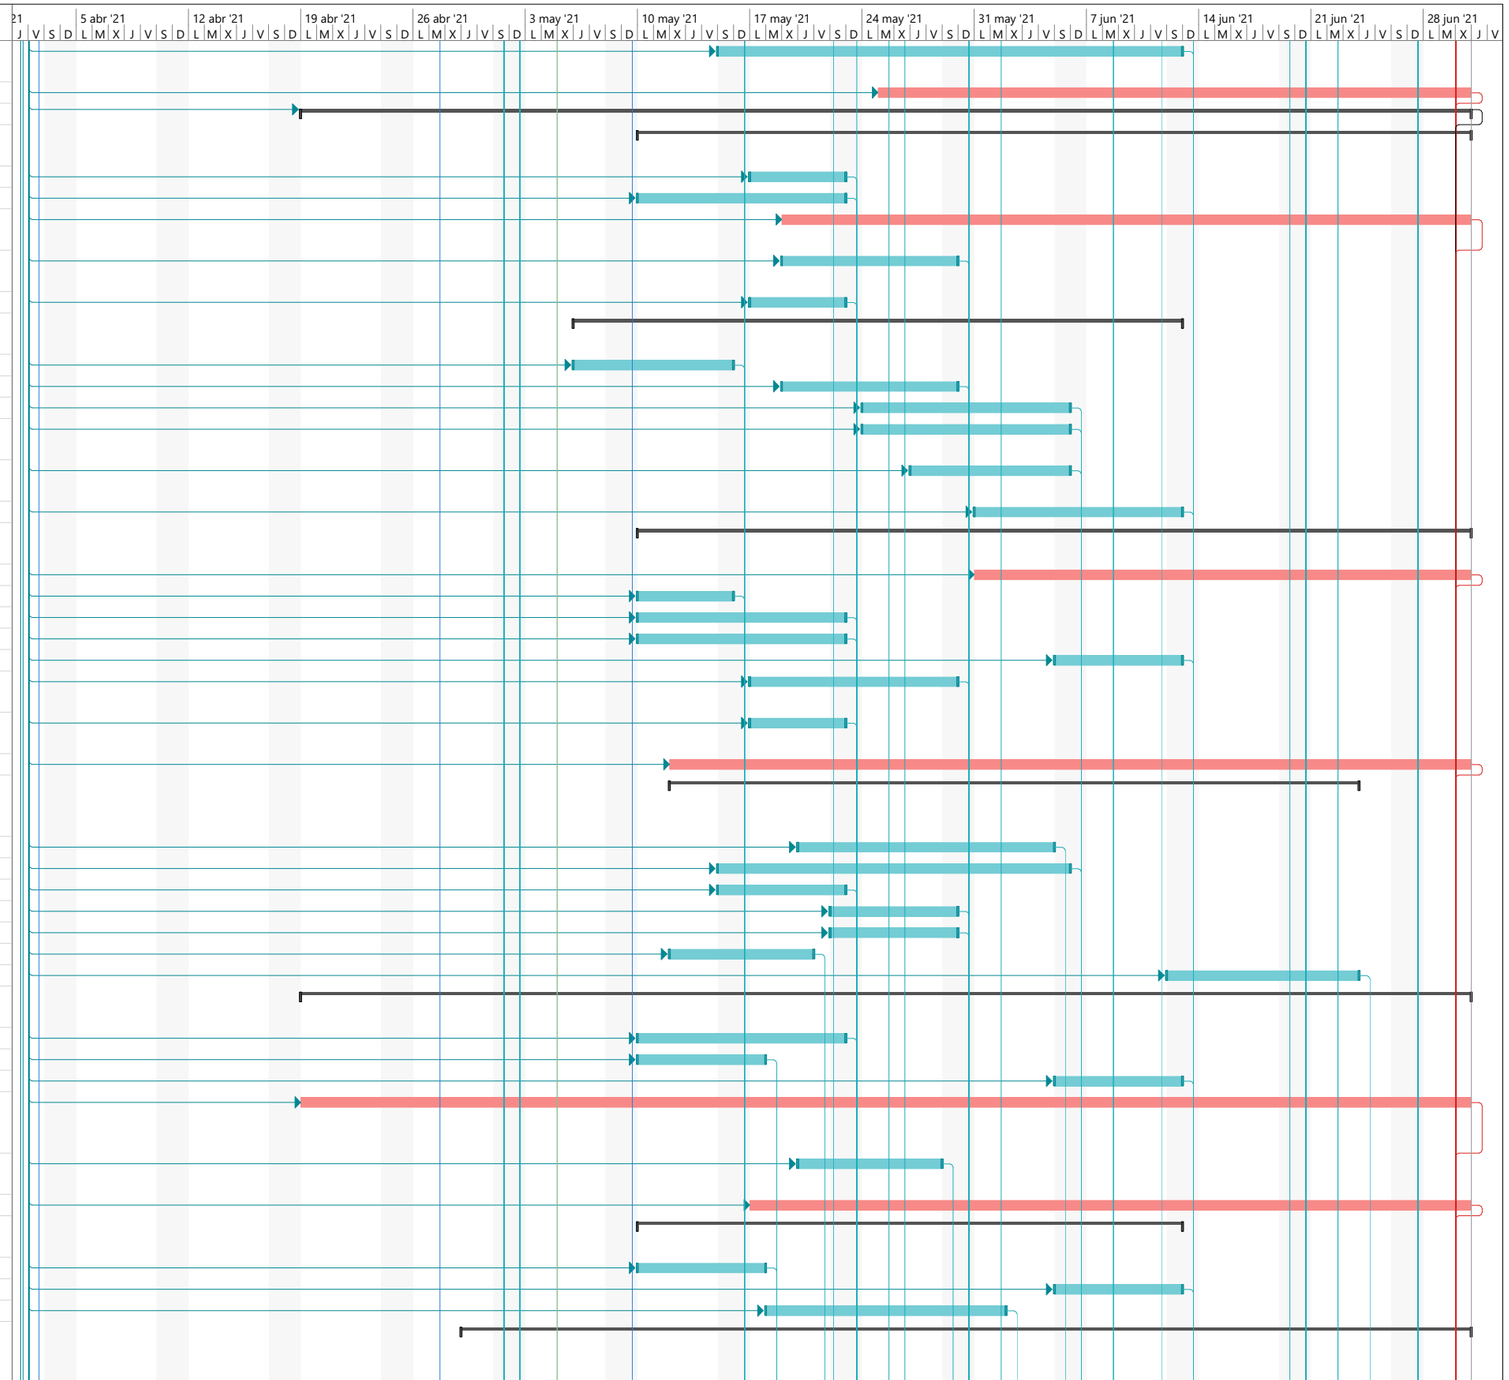

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
184	1	IMPERMEABILIZACIONES	25 días	jue 29/04/21	mié 2/06/21	$ 389.466,00
185	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 585.225,00
186	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	mar 25/05/21	mar 1/06/21	$ 129.676,00
187	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
188	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 17/05/21	lun 24/05/21	$ 36.449,00
189	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	14 días	mié 19/05/21	sáb 5/06/21	$ 2.802.416,00
190	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13 días	jue 20/05/21	sáb 5/06/21	$ 28.269.502,60
191	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13 días	jue 27/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.900.384,00
192	NP	NO PREVISTOS	24 días	mié 19/05/21	lun 21/06/21	$ 49.204.916,48
193		**REGIONAL CORDOBA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.315.235.044,57**
194		**DESPACHO REGIONAL- SEDE ADMINISTRATIVA MONTERIA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 248.861.411,64**
195	1	IMPERMEABILIZACIONES	17 días	vie 14/05/21	sáb 5/06/21	$ 10.490.530,00
196	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 6.408.290,00
197	4	EQUIPOS DE BOMBEO	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.130.762,00
198	5	LAVADO DE TANQUES	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.111.028,00
199	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.268.859,00
200	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	sáb 8/05/21	sáb 19/06/21	$ 155.483.034,00
201	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.318.481,00
202	NP	NO PREVISTOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 52.650.427,64
203		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 381.881.237,30**
204	1	IMPERMEABILIZACIONES	32 días	sáb 1/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.108.600,00
205	2	SISTEMAS ELECTRICOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 56.613.580,00
206	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.136.568,40
207	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 16.151.334,00
208	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 195.074.173,61
209	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 7.504.581,00
210	NP	NO PREVISTOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 98.292.400,29
211		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MONTELÍBANO**	**15 días?**	**lun 26/04/21**	**sáb 15/05/21**	**$ 90.451.995,90**
212	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 6.633.000,00
213	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.349.108,00
214	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.173.560,00
215	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.526.308,00
216	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS,	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 69.233.330,00
217	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 163.962,00
218	NP	NO PREVISTOS	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.372.727,90
219		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 196.881.708,43**
220	1	IMPERMEABILIZACIONES	39 días	sáb 8/05/21	mié 30/06/21	$ 1.080.964,00
221	2	SISTEMAS ELECTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 844.730,00
222	3	SERVICIO DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.990.980,00
223	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.664.304,00
224	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.049.355,00
225	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.640.496,00
226	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 23.500.297,14
227	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.659.790,00
228	NP	NO PREVISTOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 153.450.792,29

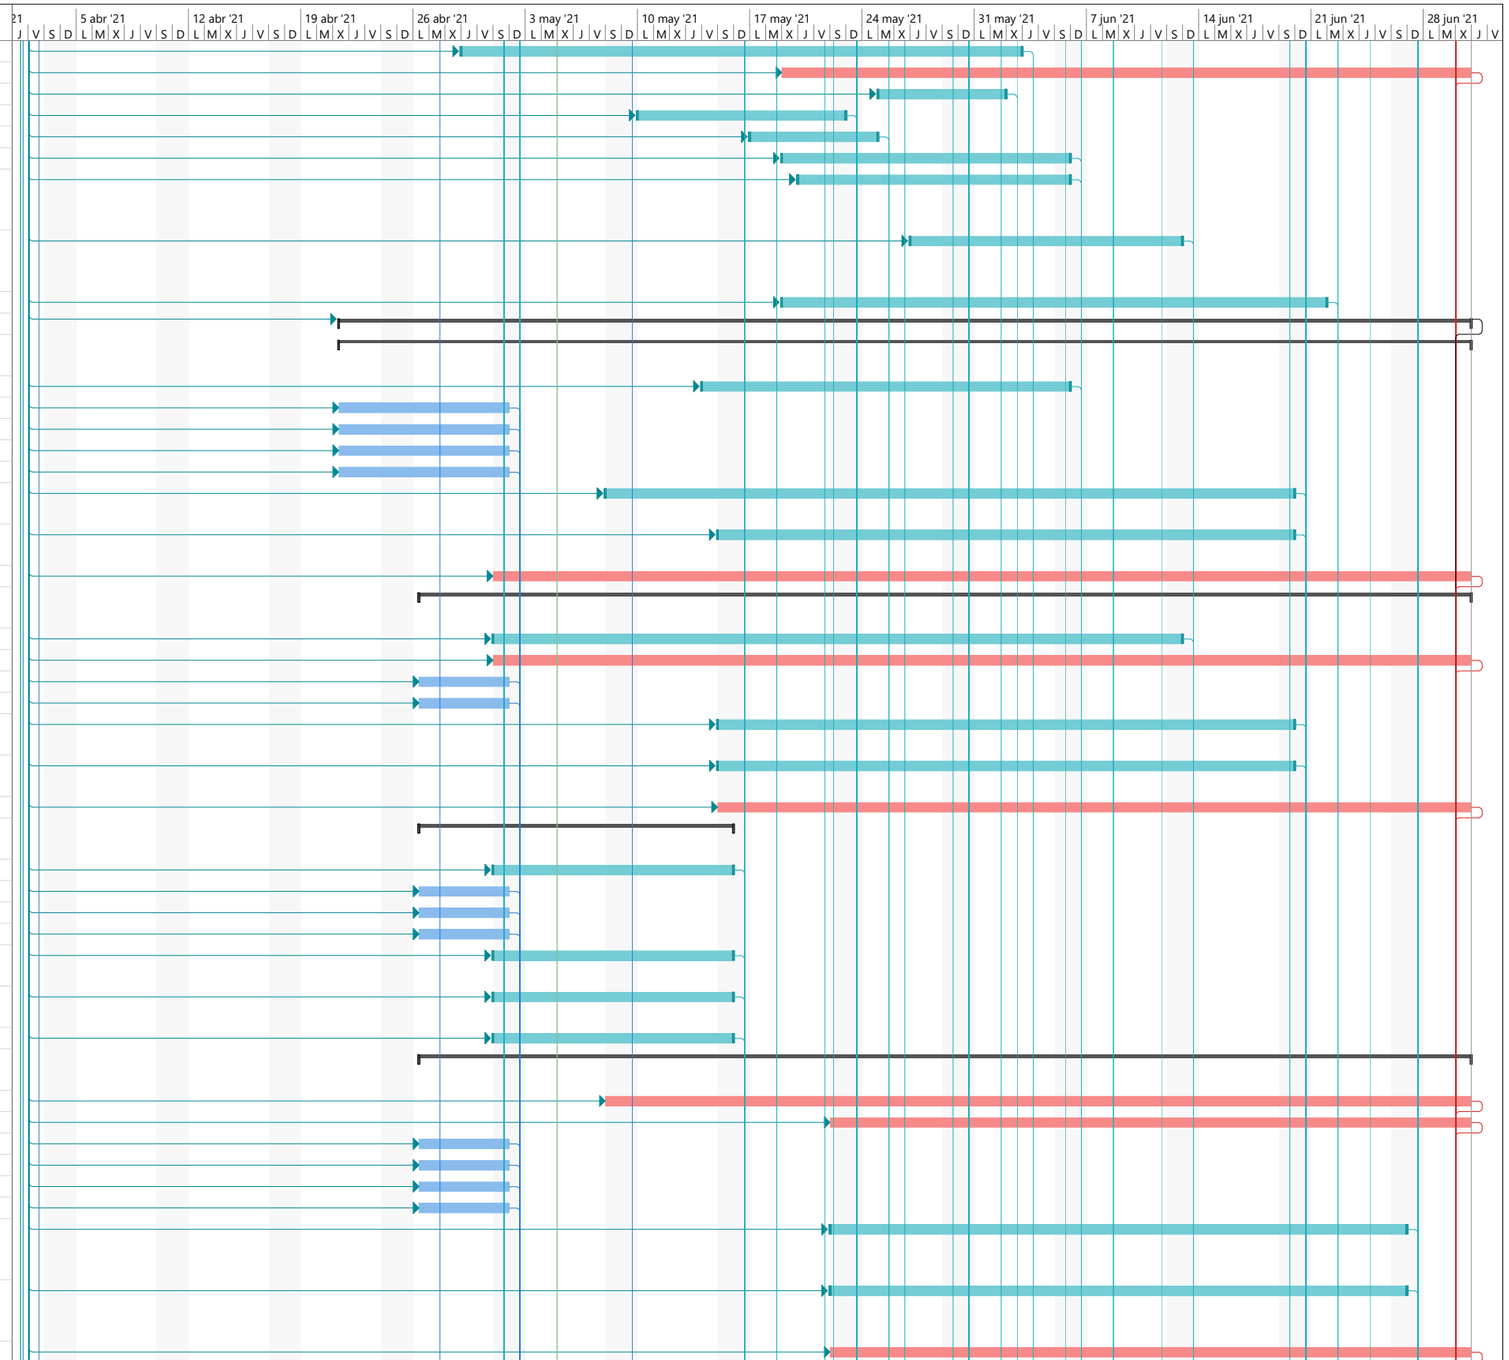

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
229		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 121.619.572,20**
230	1	IMPERMEABILIZACIONES	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.024.900,00
231	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 37.142.034,00
232	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 648.380,00
233	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.703.706,00
234	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.558.063,00
235	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	vie 30/04/21	$ 659.392,00
236	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.601.940,00
237	NP	NO PREVISTOS	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 39.281.157,20
238		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 275.539.119,10**
239	1	IMPERMEABILIZACIONES	22 días	sáb 22/05/21	sáb 19/06/21	$ 32.555.600,00
240	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.296.760,00
241	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.878.260,00
242	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 13.130.389,00
243	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 18.478.790,00
244	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 52.979.039,00
245	NP	NO PREVISTOS	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 153.220.281,10
246		**REGIONAL CESAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.549.213.285,52**
247		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 817.425.460,29**
248	1	IMPERMEABILIZACIONES	5 días	vie 2/04/21	jue 8/04/21	$ 18.613.036,51
249	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 58.169.642,00
250	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	10 días	vie 2/04/21	jue 15/04/21	$ 7.993.942,46
251	4	EQUIPOS DE BOMBEO	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 460.608,00
252	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	vie 2/04/21	vie 9/04/21	$ 2.217.240,00
253	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.682.935,00
254	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	52 días	vie 2/04/21	lun 14/06/21	$ 225.565.569,48
255	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 13.104.018,20
256	NP	NO PREVISTOS	63,75 días	vie 2/04/21	mié 30/06/21	$ 481.618.468,64
257		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 267.312.680,77**
258	1	Impermeabilizaciones	20 días	lun 24/05/21	vie 18/06/21	$ 31.718.873,40
259	2	Sistemas eléctricos	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 500.070,00
260	3	Servicio de jardinería	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 26.709.252,00
261	4	Equipos de bombeo	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 1.888.500,00
262	5	Lavado de tanques	10 días	mar 1/06/21	lun 14/06/21	$ 1.675.812,78
263	7	Sistemas de refrigeración.	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 6.951.771,00
264	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	55,75 días	vie 2/04/21	vie 18/06/21	$ 92.460.942,80
265	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	32,75 días	vie 2/04/21	mar 18/05/21	$ 9.457.360,20
266	NP	NO PREVISTOS	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 95.950.098,59
267		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**43 días**	**vie 2/04/21**	**mar 1/06/21**	**$ 101.044.686,74**
268	1	IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 10/05/21	sáb 29/05/21	$ 43.615.906,30
269	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	22 días	sáb 1/05/21	lun 31/05/21	$ 4.249.228,00
270	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	43 días	vie 2/04/21	mar 1/06/21	$ 30.333.354,62
271	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 2.969.042,00
272	NP	NO PREVISTOS	16 días	lun 10/05/21	lun 31/05/21	$ 19.877.155,82

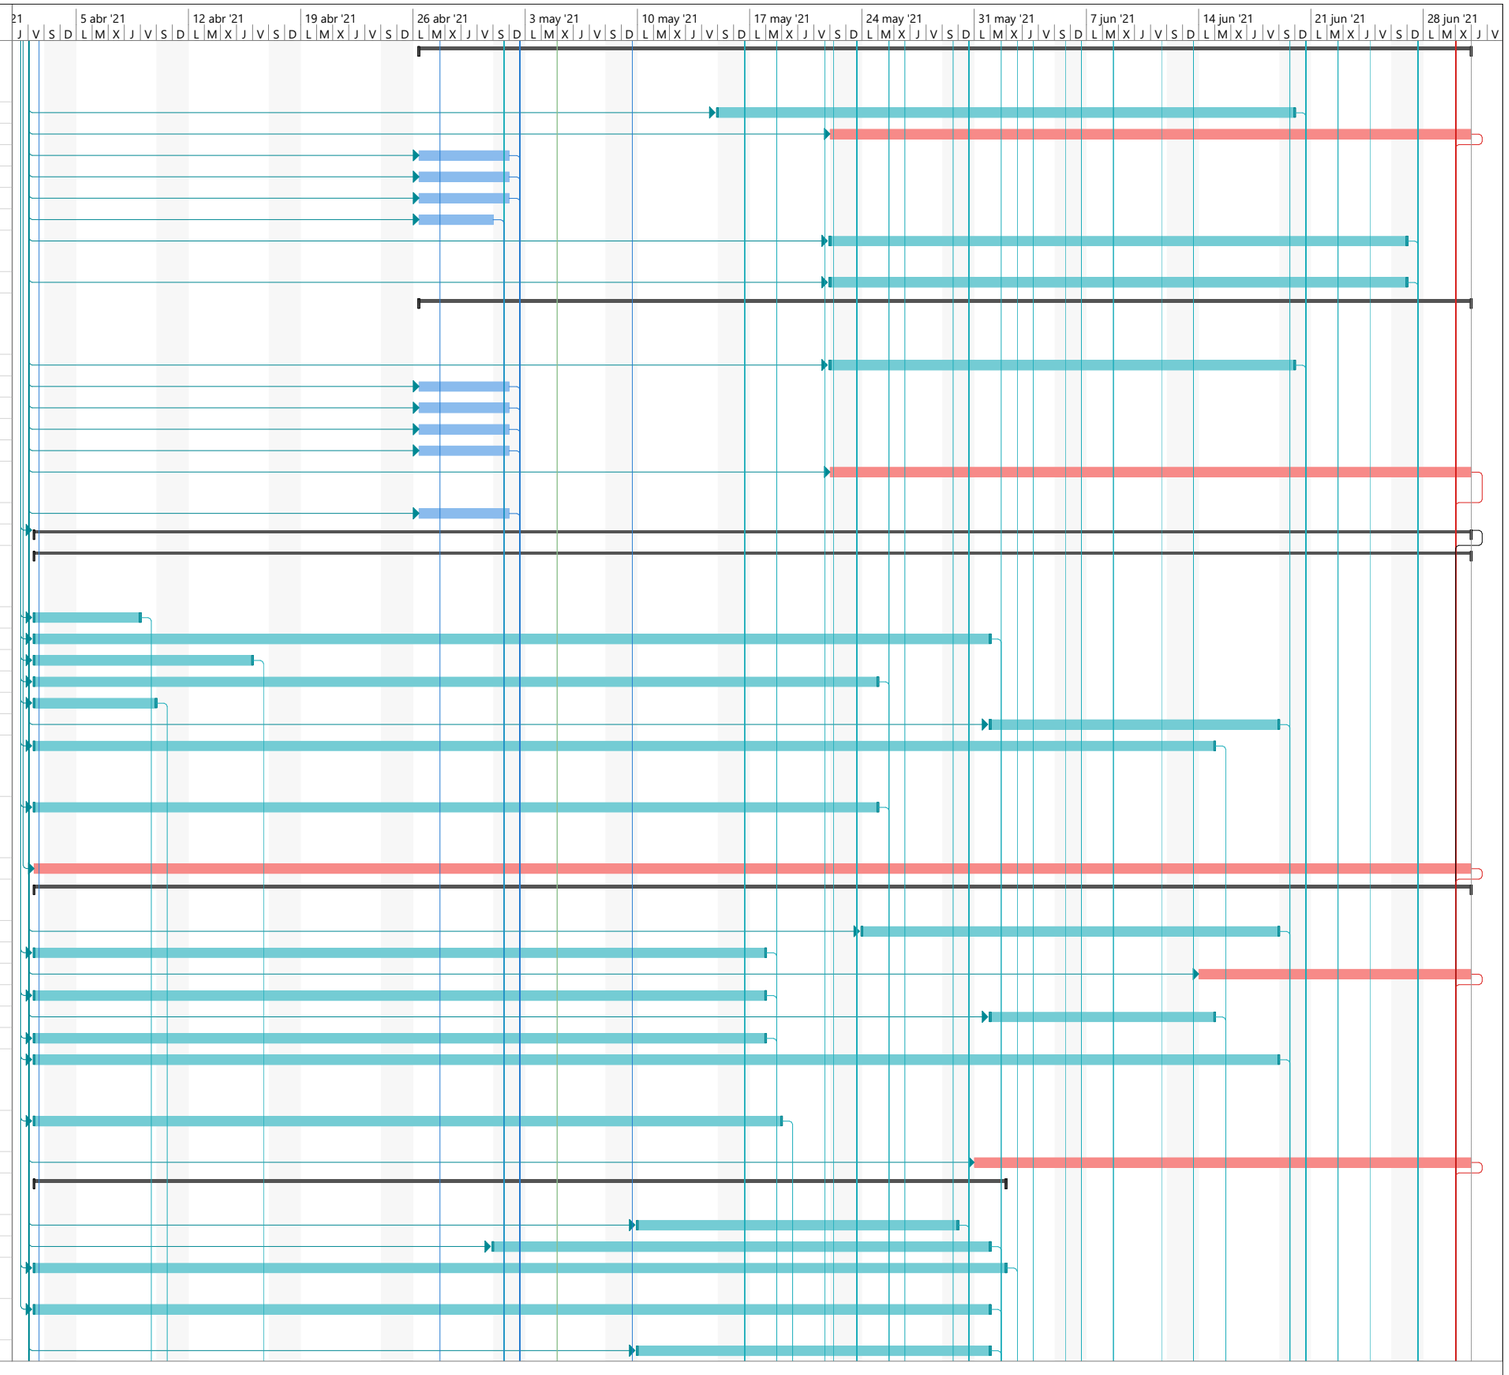

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
273		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 68.756.078,84**
274	1	IMPERMEABILIZACIONES	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 2.076.312,00
275	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	lun 31/05/21	$ 18.454.000,00
276	5	LAVADO DE TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 567.360,00
277	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 751.120,00
278	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	lun 14/06/21	vie 25/06/21	$ 1.895.752,00
279	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 13.927.644,00
280	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 5.405.010,00
281	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 25.678.880,84
282		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**43,75 días**	**vie 30/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 294.674.378,88**
283	1	IMPERMEABILIZACIONES	15 días	vie 30/04/21	jue 20/05/21	$ 15.809.445,00
284	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 109.532.908,00
285	3	SERVICIO DE JARDINERIA	15,75 días	lun 17/05/21	lun 7/06/21	$ 6.883.600,00
286	4	EQUIPOS DE BOMBEO	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.348.118,00
287	5	LAVADO DE TANQUES	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.459.987,00
288	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.353.797,00
289	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 67.756.610,00
290	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 37.366.634,00
291	NP	NO PREVISTOS	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 32.163.279,88
292		**REGIONAL SAN ANDRES**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
293		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
294	2	SISTEMAS ELECTRICOS	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 15.996.158,00
295	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 2.027.834,90
296	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 17.826.269,00
297	5	LAVADO DE TANQUES	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 5.705.388,00
298	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	27 días	sáb 24/04/21	sáb 29/05/21	$ 7.604.360,00
299	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 13.918.405,00
300	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	59 días	sáb 10/04/21	mié 30/06/21	$ 70.097.714,99
301	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	sáb 8/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.500.603,00
302	NP	NO PREVISTOS	56 días	lun 12/04/21	sáb 26/06/21	$ 259.681.194,67
303		**FIN**	0 días	mié 30/06/21	mié 30/06/21	$ 0,00

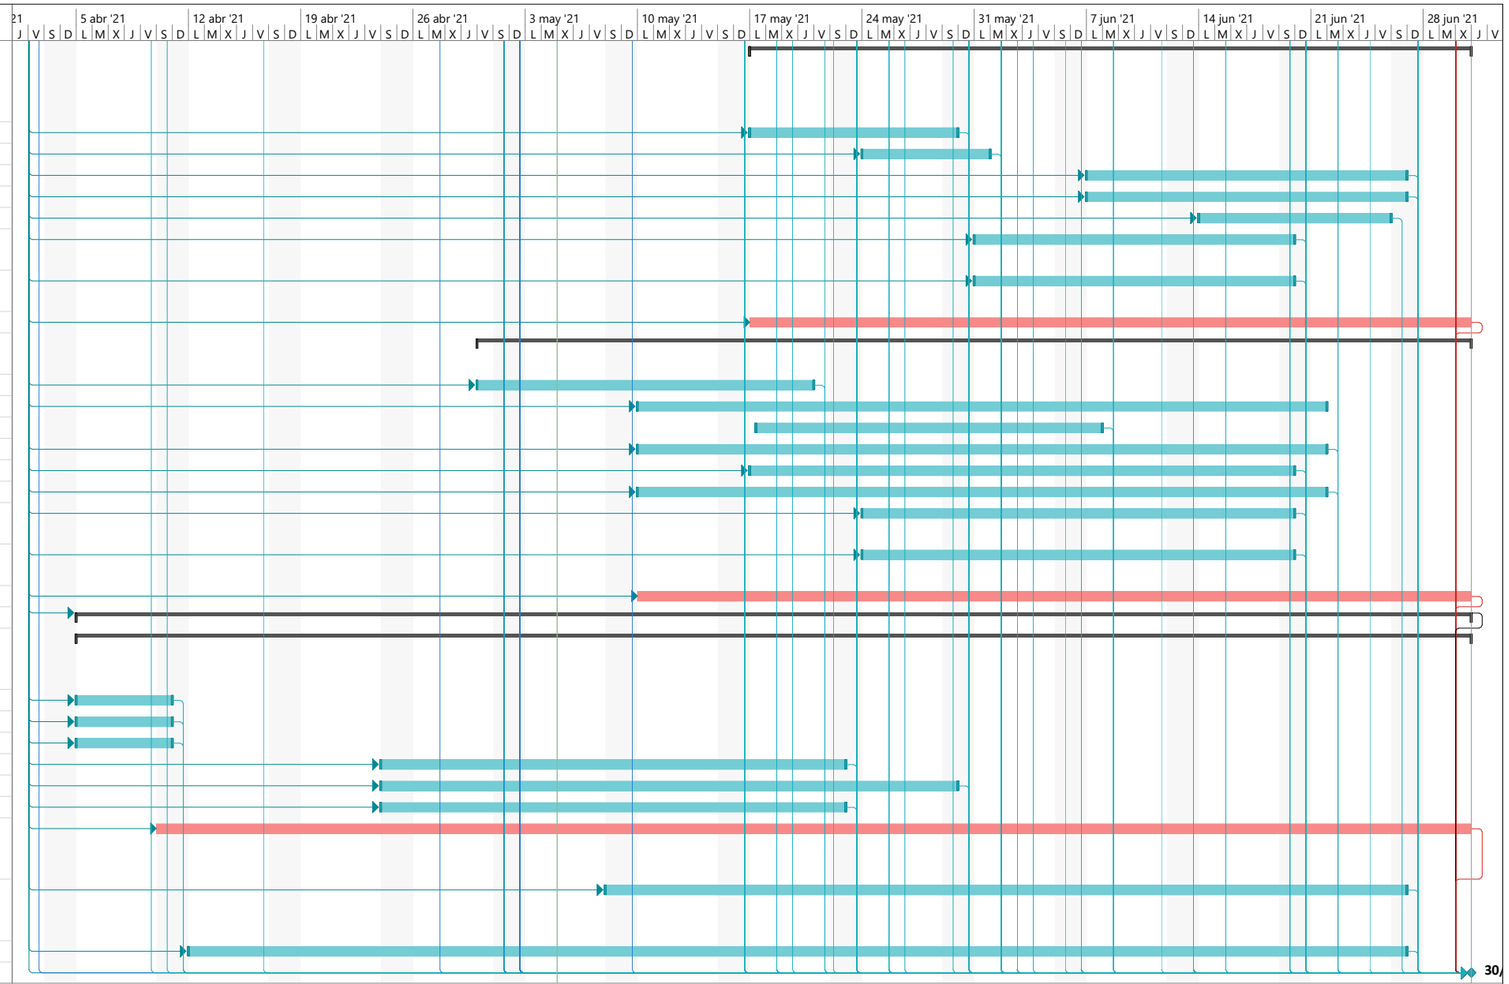

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
