SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 11

PERÍODO: 12 DE JUNIO DE 2021 AL 11 DE JULIO DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Julio De Ávila Gómez	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 6
1.4. LOCALIZACIÓN 6

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8

2.1. FORMA DE PAGO: 9
2.2. ANTICIPO DE OBRA 9
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 10
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 10
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 12
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 12
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 12

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.2. FORMA DE PAGO 15
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 16
3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 16
3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 17
3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 17
3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 17
3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 18

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 19

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 19

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 19

6.1 CONCLUSIONES: 19
6.2 RECOMENDACIONES: 19

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de las Zonas del proyecto 6
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto……..……7

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 8
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020. 10
Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra.....12
Tabla 4. Relación del personal Contrato 12
Tabla 5. Información general del contrato de interventoría 14
Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 15
Tabla 7. Control financiero interventoría 16
Tabla 8. Relación del personal de Interventoría 16
Tabla 9. Relación de equipos del interventor 17

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 11, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.",* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de Junio 2021 y el 11 de Julio del 2021 correspondiente al primer mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”


1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, en San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto
Sede San Andrés



Grafica 2. Localización de la zona del proyecto
Sede Providencia

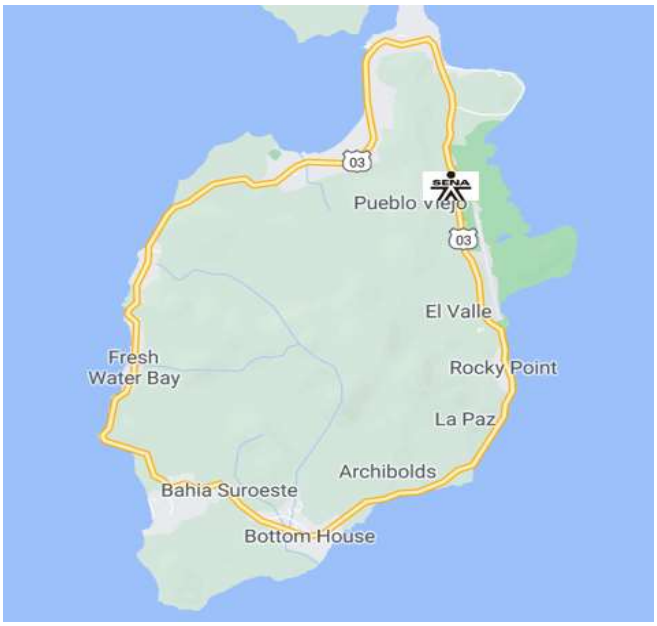

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AUI
VALOR ADICION No. 01	QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE $501.925.456
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	3 MESES
PRORROGA No. 03:	3 MESES
PRORROGA No. 04:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su undécimo mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 4.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	25/06/2021	28/02/2022
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		25/06/2021	31/08/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/08/2021	31/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		25/06/2021	28/02/2022
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de JUNIO de 2021 y el 11 de JULIO de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Semana 43: DEL 14 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JUNIO DE 2021.
Programado 90,72%
Ejecutado19,50%

Semana 44: DEL 21 DE JUNIO DE 2021 AL 27 DE JUNIO DE 2021.
Programado: 98,21%
Ejecutado: 25,90%

Semana 45: DEL 28 DE JUNIO DE 2021 AL 04 DE JULIO DE 2021.
Programado: 3,70%
Ejecutado: 25,90%

Semana 46: DEL 05 DE JULIO DE 2021 AL 11 DE JULIO DE 2021.
Programado: 25,90%
Ejecutado: 29,90%

FOTOS













Imagen - Fotografías Cafetería Bloque Hotel, shingle cubierta

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra No. 6 y 7 mediante los comunicados *“CINP-BTA-023-0943-3891”. “CINP-BTA-023-0984-4251”,* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20–20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20–20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21–20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21–20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21–20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
6	21/04/21–20/05/21	$806.299.796	$189.480.452,1	$995.780.248,1	$2.656.616.633,67	$6.120.682.123,3
7	21/05/21–20/06/21	$760.409.199	$178.696.161,4	$939.105.360,4	$3.595.721.994,07	$5.181.576.762,9
TOTALES		**$1.344.806.789**	**$316.029.597,02**	**$1.660.836.385,57**	**$1.660.836.386**	**$7.116.462.371,4**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No.02, y el resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	JUAN PABLO OLIVERO
4	Profesional SST	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de JUNIO de 2021 y el 11 de JULIO de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No.06.

ESTADO DEL TIEMPO PERÍODO 1																																
ESTADO		DICIEMBRE												ENERO																		
DÍA	TOTAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SECO	258	10	10		10	10	10	10	10	10		9	10		10	10	10		10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	9	10	10
NUBLADO																																
LLUVIAS FUERTES	1											1																				
LLOVIZNAS	1																													1		
TOTAL HORAS LLUVIA	2																															



3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (251.471.964)
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	15 DÍAS
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 04:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del undécimo mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 4.

Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	01/05/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	14/09/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	30/10/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	28/10/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante los comunicados "CINP-BTA-023-0944-4005; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORIA", y "CINP-BTA-023-0988-4282; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORIA", Esta

Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 6 y 7, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
6	21/04/21-20/05/21	$65.900.447	$12.521.085	$78.421.532	$209.331.550	$482.216.350
7	21/05/21-20/06/21	$148.759.405	$28.264.287	$177.023.692	$386.355.242	$305.192.658
TOTALES		**$324.668.270**	**$61.686.972**	**$386.355.242**	**$386.355.242**	**$305.192.658**

3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

En cumplimiento del contrato, la Interventoría cuenta con el siguiente personal para desarrollo del mismo. Se diligencia formato "Control de Personal Interventoría", se encuentra en el Anexo No. 08:

Tabla 8. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	ANDRES BARROS
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato "Control de Maquinaria y Equipos Interventoría". Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron comités de obra.

3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de JUNIO de 2021 al 11 de JULIO de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).

- Revisión y requerimiento de reiteración de inicio de actividades que según programación no han iniciado.

- Revisión de presupuestos y flujos de caja, los cuales se le ha hecho observaciones por inconsistencias con los presupuestos.

- Revisión de cronograma de actividades discriminadas por sedes. Se solicitó al contratista revisar actividades que fueron eliminadas sin la justificación requerida.

- Realización de actas de seguimientos semanales con personal del contratista y la entidad.

- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Suscripción de actas de comité registradas en el período.

- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.

- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y acompañamiento de las actividades iniciadas tales como: Sistema de refrigeración, servicio de jardinería, sistema eléctrico.

- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.

- Seguimiento al avance de obra registrado en el período

- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.

- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.

- Revison de presupuestos y programaciones enviadas por el contratista.

- Visitas de seguimiento a las actividades y revisión de implementación de EPP

3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

De acuerdo al informe semanal N° 46, para el presente informe el reporte de avance según la última programación de obra aprobada por esta Interventoría:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 132.631.746	25,92%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 153.074.189	29,91%
ADELANTO		4.01%

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha presenta retraso en todas las actividades programadas, por lo cual la interventoría ha solicitado un plan de contingencia con el fin de mitigar los atrasos.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 EL CONTRATISTA presenta inicio de actividades , pero a la fecha presenta retrasos según lo programado en el flujo de caja y lo ejecutado.

Respecto a la sede providencias, debido al huracán IOTA, que destruyo la isla de en un 95% se dispuso trasladar la inversión de las instalaciones a la sede de San Andrés.

Contratista hizo entrega de presupuestos y programaciones los cuales se le dio respuesta con observaciones en comunicado CINP-BTA-023-0932-3902 para que sean corregidos para aprobación de la interventoría.

El contratista no contrata el suficiente personal para las actividades encomendadas del proyecto, se requiere mayor agilidad en la parte administrativa de personal de obra.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda la contratista iniciar lo mas pronto posible los frentes de trabajo que a la fecha deben estar iniciado, con el fin de bajar los índices de atrasos presentados.

Es necesario la entrega de la documentación necesaria para la revisión de ítem no previstos, para su revisión y aprobación.

Se solicita al contratista realizar la implementación de los protocoles de seguridad, ya que se están utilizando los requeridos por la entidad, toda ves que el contratista manifestó en documentación recibida por esta interventoría la implementación de los mismos.

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato.

Se inicio mantenimiento de bombas de equipo bombeo, las cuales presentaron averías dejando el edificio de la entidad sin el servicio de agua en sus instalaciones.

El contratista requiere de un plan de contingencia con el fin de sopesar los atrasos presentados en el inicio de la obra, toda vez que no hay justificación por la demoras en el inicio de las actividades, con el fin de no realizar proceso por incumplimiento.

Se requiere aumento de personal y frentes de trabajo con el fin de aumentar los rendimientos y disminuir los atrasos presentados.

Se realizaron trabajos de mantenimiento de filtraciones en cubiertas de la sede gente de mar y hotel escuela.

Se requiere adelantar trabajos de las actividades eléctricas del hotel escuela, en especial el RETIE, y puesta en marcha de los ascensores.

Se realizan los trabajos de construcción de cafetería en cuarto piso hotel escuela, levantes de muro, enchapes pintura. Los cuales presenta retrasos, se requiere mayor logística de personal e insumos.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 JULIO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8.777.298.757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429.047.013,00	$ 100.826.048,69	$ 529.873.061,69	$ 8.247.425.695,31	$ 529.873.061,69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272.113.036,00	$ 63.946.563,88	$ 336.059.599,88	$ 7.911.366.095,43	$ 865.932.661,57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114.077.060,00	$ 26.808.109,07	$ 140.885.169,00	$ 7.770.480.926,43	$ 1.006.817.830,57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193.777.640,00	$ 45.537.746,00	$ 239.315.386,00	$ 7.531.165.540,43	$ 1.246.133.216,57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335.792.040,00	$ 78.911.129,38	$ 414.703.169,00	$ 7.116.462.371,43	$ 1.660.836.385,57
6	21 Abr 20 May	$ 806.299.796,00	$ 189.480.452,10	$ 995.780.248,10	$ 6.120.682.123,33	$ 2.656.616.633,67
7	21 May 20 Jun	$ 760.409.199,00	$ 178.696.161,40	$ 939.105.360,40	$ 5.181.576.762,93	$ 3.595.721.994,07
TOTALES		**$ 2.911.515.784,00**	**$ 684.206.210,52**	**$ 3.595.721.994,07**	**$ 5.181.576.763**	**$ 3.595.721.994**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/06/2021 AL 11/07/2021

FECHA	JUNIO																			JULIO											OBSERVACIONES
CARGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
COORDINADOR TÉCNICO - **JUAN PABLO OLIVERO**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																															
PROFESIONAL SOCIAL -																															
AYUDANTES																															
OPERADORES DE MAQUINARIA																															
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																															
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**TOTAL PERIODO** **72**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	JUNIO																			JULIO										
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	2	4	2	7	8	8	8	8	2	8	2	4	2	4	3	0	6	6	4	4	8	6	8	2	4	8	6	4	8	4	4	136
Nublado		2		1	0	0	3	2	0	0	0	1	2	4	5	8	2	2	4	1	6	2	6	2	2	1	2	4	2	4	4	67
Lluvias intensas									1							8					2					4						14
Lluvias moderadas		0	2	2		2	1	2		1	1			8	1		1	1	2		1		1	2	1	2	2	4	1			35
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	2	2	0	8	1	8	4	1	1	0	0	8	1	4	1	1	2	0	8	0	1	2	1	2	4	8	1	0	4	62

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing. Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

GNG Ingeniería S.A.S. | CONSORCIO INTERINGECO GNG | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 JULIO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	$ 691.547.900,00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35.100.414,00	$ 6.669.079,00	$ 41.769.493			$ 649.778.407,00	$ 41.769.493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22.257.382,00	$ 4.228.903,00	$ 26.486.285			$ 623.292.122,00	$ 68.255.778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9.356.236,00	$ 1.777.685,00	$ 11.133.921			$ 612.158.201,00	$ 79.389.699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15.864.923,00	$ 3.014.335,00	$ 18.879.258			$ 593.278.943,00	$ 98.268.957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27.429.463,00	$ 5.211.598,00	$ 32.641.061			$ 560.637.882,00	$ 130.910.018
6	21 Abril 20 May	$ 65.900.447,00	$ 12.521.085,00	$ 78.421.532			$ 482.216.350,00	$ 209.331.550
7	21 May 20 Jun	$ 148.759.405,00	$ 28.264.287,00	$ 177.023.692			$ 305.192.658,00	$ 386.355.242
TOTALES		**$ 324.668.270,00**	**$ 61.686.972,00**	**$ 386.355.242,00**			**$ 305.192.658,00**	$ 386.355.242,00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 JUNIO AL 11 JULIO 2021

FECHA / CARGO	MAYO																			JUNIO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
RESIDENTE TÉCNICO - **JULIO DE AVILA GOMEZ**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7801602111**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1052465563

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERTH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.408.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7803047334**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1052438949

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 291.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.395.400	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 157.200	$ 0	$ 0	$ 5.709.800	$ 0	$ 5.709.800
SUBTOTALES:										**$ 7.730.800**	**$ 0**	**$ 7.730.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 59.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 3.249.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 278.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
SUBTOTALES:													**$ 3.985.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.985.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 382.300	$ 382.300	$ 0	$ 0	$ 382.300
SUBTOTALES:									**$ 382.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 382.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.720.700	$ 0	$ 1.720.700
SUBTOTALES:			**$ 1.720.700**	**$ 0**	**$ 1.720.700**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI														15-30				$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	16	$ 785.963	$ 31.500	$ 0	$ 31.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	16	$ 785.963		$ 0	16	$ 785.963	CCF24-COMPENSAR	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	14	$ 687.718	$ 27.600	$ 0	$ 27.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	14	$ 687.718		$ 47.900	14	$ 687.718	CCF24-COMPENSAR	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
4	CC 38465287	MOSQUERA BARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
7	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI														01-18				25-14 COLPENSIONES	18	$ 4.176.900	$ 668.400	$ 20.900	$ 20.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 710.200	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 4.176.900	$ 167.100	$ 0	$ 167.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 4.176.900		$ 0	18	$ 4.176.900	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7803047334**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1052438949		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
9	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	12	$ 2.784.600	$ 445.600	$ 14.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.600	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 2.784.600	$ 111.400	$ 0	$ 111.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 2.784.600		$ 14.600	12	$ 2.784.600	CCF24-COMPENSAR	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.820.000	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.820.000		$ 126.700	30	$ 1.820.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.052.800**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7801830384**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1052449299

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 785.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	$ 825.400
230301	230301-PORVENIR	13	$ 5.008.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.008.400	$ 0	$ 5.008.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.860.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 1.907.400	$ 0	$ 1.907.400
SUBTOTALES:										**$ 7.741.200**	**$ 0**	**$ 7.741.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 168.700
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 214.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.300	$ 0	$ 0	$ 214.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 661.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.100	$ 0	$ 0	$ 661.100
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 264.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 340.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
SUBTOTALES:													**$ 1.913.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.913.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.304.900	$ 2.304.900	$ 0	$ 0	$ 2.304.900
SUBTOTALES:									**$ 2.304.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.304.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 376.000	$ 0	$ 376.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	12	$ 1.157.800	$ 0	$ 1.157.800
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
SUBTOTALES:			**$ 1.913.800**	**$ 0**	**$ 1.913.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1013644090	CASTAÑEDA SUAREZ MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI	30																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO NOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	23	$ 2.267.800	$ 362.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362.900	EPS017-FAMISANAR	23	$ 2.267.800	$ 90.800	$ 0	$ 90.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	23	$ 2.267.800		$ 11.900	23	$ 2.267.800	$CCF24-COMPENSAR	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7801830384**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1052449299

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL.OMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO		SI												07-13					230301-PORVENIR	7	$ 460.134	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 73.700	EPS017-FAMISANAR	7	$ 460.134	$ 18.500	$ 0	$ 18.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 460.134		$ 0	7	$ 460.134	CCF24-COMPENSAR	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000		$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1143169144	PEREZ BARRAGAN GERMAN GUSTAVO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI	21																25-14 COLPENSIONES	10	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 400.000		$ 27.900	10	$ 400.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.600.000		$ 250.600	30	$ 3.600.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 13.873.700

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15/06/2021	CINP-BTA-023-0914-3760	Informes semanales No. 41, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0915-3763	Solicitud inicio de actividades Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0916-3783	Informes semanales No. 38, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0917-3785	Comunicado DCS-634-CO1. 2323; Remisión informe SST No.9, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0918-3786	Comunicado DCS-639-CO1. 2323; Remisión a informes SST Nº6 y 7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0919-3788	Comunicado DCS-640-CO1. 2323; Remisión a informe PMA Nº6, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0920-3789	Comunicado DCS-640-CO1. 2323; Remisión a informe PMA Nº7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0921-3790	Comunicado DCS-640-CO1. 2323; Remisión a informe SST Nº8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0922-3793	Reiteración de Actividades en las sedes de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/06/2021	CINP-BTA-023-0923-3796	Comunicado DCS-635-CO1.2323 Informe Mensual de Obra No. 9, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/06/2021	CINP-BTA-023-0924-3826	Comunicado DCS-642-CO1.2323; Relación y documentos del personal de Aguachica – Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0925-3838	Solicitud de informe de aplicación del protocolo de bioseguridad para el caso COVID -19 en el departamento de Sucre sede Gallera.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0926-3841	Advertencia al desarrollo de actividades de trabajo en alturas en el Centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial-Sabanalarga -Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0927-3849	Comunicado DCS-643-CO1.2323; Entrega APU No Previstos, Departamento San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0928-3851	Comunicado DCS-622-CO1.2323; Respuesta Comunicado CINP-BTA-023-0872-3515 Relación de documentos personal Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0929-3857	Comunicado DCS-645-CO1.2323, Corte de Obra No. 6.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/06/2021	CINP-BTA-023-0930-3859	Solicitud información tramite de prórroga contrato de obra y prórroga y adición contrato de interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/06/2021	CINP-BTA-023-0931-3884	Correo electrónico, Solicitud del Abogado Luis Enrique Castro Ruiz, Información Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/06/2021	CINP-BTA-023-0932-3902	Comunicado DCS-647-CO1.2323; Presupuesto y programación San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/06/2021	CINP-BTA-023-0933-3903	Correo electrónico; Observaciones Impermeabilización sede Fundación Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0934-3919	Informes semanales No. 42, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0935-3920	Comunicado DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0936-3923	Solicitud información trámite de prórroga contrato de obra y prórroga y adición contrato de interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0937-3930	Comunicado DCS-648-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0883-3628 ajuste informe de aplicación del protocolo de bioseguridad en CCIT de Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0938-3931	Comunicado DCS-644-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0889-3670 Correcciones informe SST No.7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/06/2021	CINP-BTA-023-0939-3932	Respuesta Comunicación. - Referente a su labor como Profesional HSE del CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	DUBYS VALENZUELA SÁNCHEZ
22/06/2021	CINP-BTA-023-0940-3971	Comunicado DCS-654-CO1.2323; Relación y documentos del personal, unidades sanitarias de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/06/2021	CINP-BTA-023-0941-3972	Observaciones a la actividad NP-10.194; Suministro E Instalación De Cubierta Tipo Shingle - Teja en cubierta del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y De Servicios (Av. Francisco Newball) sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/06/2021	CINP-BTA-023-0942-3973	Deterioro en impermeabilización realizada sede Colombo Alemán, Barranquilla- Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/06/2021	CINP-BTA-023-0943-3981	Comunicado DCS-658-CO1.2323; Acta de pago parcial No.6, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/06/2021	CINP-BTA-023-0944-4005	Acta de pago parcial No.6, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/06/2021	CINP-BTA-023-0945-4007	Oficio 9-2021-001109; Solicitud Recursos Presupuestales Para Mantenimiento Aires Acondicionaos San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/06/2021	CINP-BTA-023-0946-4008	Comunicado DCS-652-CO1.2323; Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-0918-3786 aclaración informe SST No. 6, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/06/2021	CINP-BTA-023-0947-4010	Comunicado DCS-653-CO1.2323; Relación y documentos del personal, actividades varias departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0948-4028	Correo electrónico, Reiteración de Condiciones Inseguras en Infraestructura Centro de Formación. Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0949-4029	Solicitud entrega informe mensual No. 10, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0950-4032	Comunicado DCS-657-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0925-3838 solicitud de informe de aplicación del protocolo de bioseguridad para COVID 19 en la sede Gallera de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0951-4034	Comunicado DCS-659-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Magdalena y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0952-4035	Comunicado DCS-660-CO1. 2323; Respuesta. - Derecho de Petición remitido por el señor EMIRO DOMÍNGUEZ ARROYO de fecha veintiséis (26) de marzo de 2021.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	EMIRO DOMÍNGUEZ ARROYO
24/06/2021	CINP-BTA-023-0953-4038	Comunicado DCS-662-CO1.2323; Relación y documentos del personal de la Jagua departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0954-4042	Informes semanales No. 39, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/06/2021	CINP-BTA-023-0955-4044	Informes semanales No. 42 Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/06/2021	CINP-BTA-023-0956-4049	Oficio radicado 9-2021-049904, NIS 2021-02-175586, Solicitud información Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/06/2021	CINP-BTA-023-0957-4054	Comunicado DCS-651-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0889-3670 remisión informes PMA No 6, 8 y 9, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/06/2021	CINP-BTA-023-0958-4055	Comunicado DCS-640-CO1. 2323; Aprobación de informe PMA No. 7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/06/2021	CINP-BTA-023-0959-4063	Informes semanales No. 43, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/06/2021	CINP-BTA-023-0960-4072	Informes semanales No. 40, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0961-4139	Comunicado DCS-663-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Magdalena y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0962-4142	Correo electrónico; Daños en techo sala TIC por humedad Centro Acuícola y Agroindustrial de Gira departamento de Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0963-4143	Comunicado DCS-647-CO1.2323; Presupuesto y programación San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0964-4144	Comunicado DCS-640-CO1. 2323; Aprobación de informe SSTMA No.6 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0965-4148	Solicitud actualización matriz de identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0966-4157	Comunicado DCS-666-CO1.2323, Programación ajustada solicitud prórroga No.4, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/06/2021	CINP-BTA-023-0967-4165	Informe Mensual No. 10, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0968-4166	Informe Mensual No. 10, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0969-4169	Comunicado DCS-665-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0970-4171	Correo electrónico; Solicitud de informe de mantenimientos tanques de agua y bombas regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0971-4174	Informe Mensual No. 10, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0972-4181	Informe Mensual No. 10, Guajira, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0973-4184	Informe Mensual No. 10, Magdalena, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/07/2021	CINP-BTA-023-0974-4186	Informe semanal No. 43 Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/07/2021	CINP-BTA-023-0975-4191	Informes semanales No. 41, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/07/2021	CINP-BTA-023-0976-4206	Comunicado DCS-664-CO1. 2323-Ítems no previstos del NP-10.423 al NP-10.430.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/07/2021	CINP-BTA-023-0977-4210	Informes semanales No. 42, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0978-4224	Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0979-4227	Actividades atrasadas según programación en el departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0980-4230	Comunicado DCS-672-CO1.2323; Entrega APU No Previstos desde NP423 al NP430.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0981-4236	Comunicado DCS-669-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0982-4237	Comunicado DCS-671-CO1.2323; Corte de obra No.07.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/07/2021	CINP-BTA-023-0983-4244	Informes semanales No. 44, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/07/2021	CINP-BTA-023-0984-4251	Comunicado DCS-673-CO1.2323; Acta de pago parcial No.7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/07/2021	CINP-BTA-023-0985-4259	Informes semanales No. 44, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/07/2021	CINP-BTA-023-0986-4271	Informe Mensual No. 10, Bolívar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0987-4281	Informe mensual No. 10, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0988-4282	Acta de pago parcial No.7, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0989-4283	Correo electrónico, Factura Acta de pago parcial No.7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0990-4284	Comunicado DCS-671-CO1.2323 Informe Mensual Técnico de Obra No. 10.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0991-4289	Correo electrónico; Traslado de Comunicación 7-2021-180394 sindicato Regional departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/07/2021	CINP-BTA-023-0992-4291	Correo electrónico; Seguimiento contrato de Mantenimiento General Lote 1 - Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0993-4325	Remisión de garantías contra OTROSI No. 4 Prorroga No. 4-Adición No. 1, Contrato De Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0994-4327	Comunicado DCS-675-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0995-4329	Comunicado DCS-668-CO1.2323; Respuesta CINP-BTA-023-0841-3217; Derecho de petición de la señora Dubys Valenzuela Sánchez.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0996-4332	CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DEL ABOGADO LUIS ENRIQUE CASTRO RUIZ INFORMACION CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0997-4340	Informe Mensual No. 10, Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0998-4342	Informe Mensual No. 10, San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/07/2021	CINP-BTA-023-0999-4349	Informes semanales No. 45, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	14 de junio de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	20 de junio de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	31 DE MARZO DE 2021	Fecha de Terminación	31 DE MARZO DE 2021
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

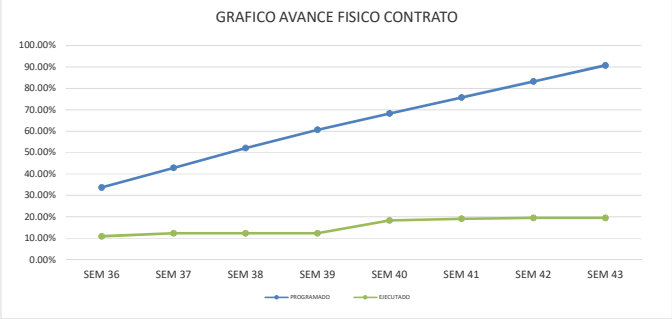


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 36	33.70%	10.93%	**-22.78%**
SEM 37	42.89%	12.35%	**-30.54%**
SEM 38	52.08%	12.35%	**-39.73%**
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
SEM 41	75.74%	19.10%	**-56.64%**
SEM 42	83.23%	19.50%	**-63.73%**
SEM 43	90.72%	19.50%	**-71.22%**
ALERTAS			**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

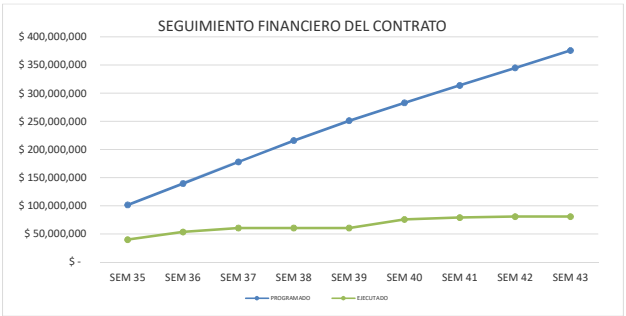

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 35	$ 101,585,946	$ 39,894,416	$ **-61,691,530**
SEM 36	$ 139,666,620	$ 53,488,849	$ **-86,177,771**
SEM 37	$ 177,747,294	$ 60,453,502	$ **-117,293,792**
SEM 38	$ 215,827,968	$ 60,453,502	$ **-155,374,466** #
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	$ **-190,778,408**
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	$ **-206,994,283**
SEM 41	$ 313,865,053	$ 79,150,186	$ **-234,714,867**
SEM 42	$ 344,900,828	$ 80,807,781	$ **-264,093,047**
SEM 43	$ 375,936,603	$ 80,807,781	$ **-295,128,822**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	14 de junio de 2021	AL	20 de junio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021		31/03/2021		-118.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	-191.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		22/05/2021		-57.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		22/05/2021		-52.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		26/06/2021		-43.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	
						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**10**	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	14 de junio de 2021	AL	20 de junio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7790547811	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7791604728	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7791096668	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Se Sigue instalacion de Manto cubierta bloque hotel Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Interventoria autoriza personal para trabajos en cubuierta shingle. Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.
10/05/2021	16/05/2021	SEMANA No. 38	17-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	14-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato. Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.segun oficio DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andres, para revison de interventoria Contratista realizo entrega de DCS-643-CO1.2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS, DEPARTAMENTO SAN ANDRES, para revison de interventoria, la cual fue revisada y se le hicieron observaciones. Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

VEINTIUN (Día en letras) | **21** (Día en números) **días del mes de** **JUNIO** **de** **2021** (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	14 de junio de 2021	AL	20 de junio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque mantenimiento



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Impermeabilizacion cubierta Bloque mantenimiento

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	44	DEL	21 de junio de 2021	AL	27 de junio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	01 DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

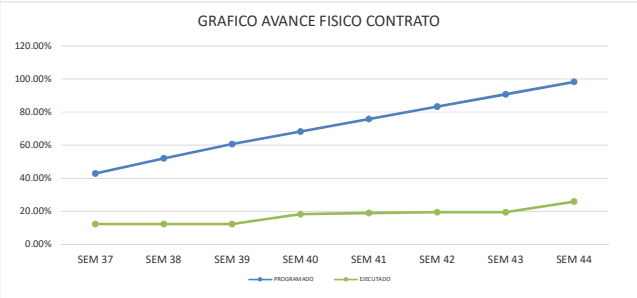


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 37	42.89%	12.35%	**-30.54%**
SEM 38	52.08%	12.35%	**-39.73%**
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
SEM 41	75.74%	19.10%	**-56.64%**
SEM 42	83.23%	19.50%	**-63.73%**
SEM 43	90.72%	19.50%	**-71.22%**
SEM 44	98.21%	25.92%	**-72.29%**
	ALERTAS		**-100.00%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

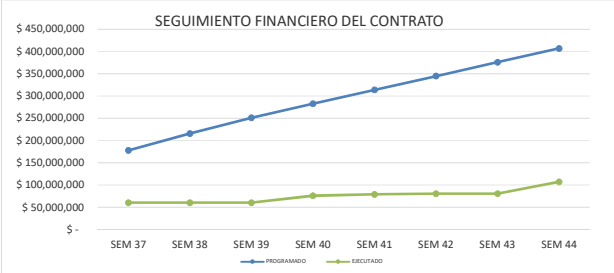

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 37	$ 177,747,294	$ 60,453,502	$ -117,293,792	
SEM 38	$ 215,827,968	$ 60,453,502	$ -155,374,466	##
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	$ -190,778,408	#
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	$ -206,994,283	#
SEM 41	$ 313,865,053	$ 79,150,186	$ -234,714,867	
SEM 42	$ 344,900,828	$ 80,807,781	$ -264,093,047	
SEM 43	$ 375,936,603	$ 80,807,781	$ -295,128,822	
SEM 44	$ 406,972,378	$ 107,412,189	$ -299,560,189	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	44	DEL	21 de junio de 2021	AL	27 de junio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/06/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021		31/03/2021		-125.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021		-187.00	
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	10/04/2021	1/10/2020	-187.00	191.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	10/04/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		22/05/2021		-64.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		22/05/2021		-59.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	22/05/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	30/05/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		26/06/2021		-50.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	26/06/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**313**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**3**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se reinician trabajos de adecuaciones fachada auditorio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	44	DEL	21 de junio de 2021	AL	27 de junio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7790547811	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7791604728	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7791096668	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
17/05/2021	23/05/2021	SEMANA No. 39	24-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	14-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato. Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.segun oficio DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andres, para revison de interventoria Contratista realizo entrega de DCS-643-CO1.2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS, DEPARTAMENTO SAN ANDRES, para revison de interventoria, la cual fue revisada y se le hicieron observaciones. Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

VEINTIOCHO	28	días del mes de	JUNIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	44	DEL	21 de junio de 2021	AL	27 de junio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria Hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria Hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion electrica

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	45	DEL	28 de junio de 2021	AL	4 de julio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	01 DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

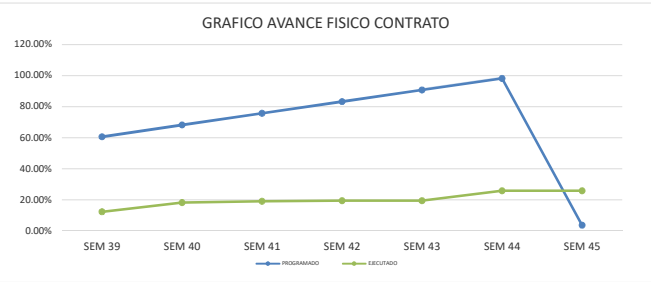


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 39	60.63%	12.35%	**-48.28%**
SEM 40	68.25%	18.30%	**-49.95%**
SEM 41	75.74%	19.10%	**-56.64%**
SEM 42	83.23%	19.50%	**-63.73%**
SEM 43	90.72%	19.50%	**-71.22%**
SEM 44	98.21%	25.92%	**-72.29%**
SEM 45	3.70%	25.92%	**22.22%**
	ALERTAS		**-25.92%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

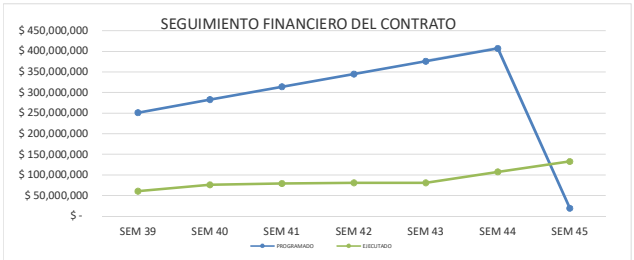

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 39	$ 251,231,910	$ 60,453,502	$ -190,778,408	#
SEM 40	$ 282,829,278	$ 75,834,995	$ -206,994,283	#
SEM 41	$ 313,865,053	$ 79,150,186	$ -234,714,867	
SEM 42	$ 344,900,828	$ 80,807,781	$ -264,093,047	
SEM 43	$ 375,936,603	$ 80,807,781	$ -295,128,822	
SEM 44	$ 406,972,378	$ 107,412,189	$ -299,560,189	
SEM 45	$ 18,957,961	$ 132,654,062	$ 113,696,100	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	45	DEL	28 de junio de 2021	AL	4 de julio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	31/08/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021				-132.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		23/07/2021		-71.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		23/07/2021		-66.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		6/08/2021		-57.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**58**	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se reinician trabajos de adecuaciones fachada auditorio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	45	DEL	28 de junio de 2021	AL	4 de julio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7790547811	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7791604728	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7791096668	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	Suspensión de actividades por paro nacional Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	14-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato. Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.segun oficio DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andres, para revison de interventoria Contratista realizo entrega de DCS-643-CO1.2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS, DEPARTAMENTO SAN ANDRES, para revison de interventoria, la cual fue revisada y se le hicieron observaciones. Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	5-jul	Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

CINCO	5	días del mes de	JULIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	45	DEL	28 de junio de 2021	AL	4 de julio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	45	DEL	28 de junio de 2021	AL	4 de julio de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede Edificio Leda	Fachada Principal



Georeferenciación	Descripción
Sede Edificio Leda	Fachada Principal



Georeferenciación	Descripción
Sede Carmelo	Fachada Principal



Georeferenciación	Descripción
Sede Carmelo	Fachada Principal



Georeferenciación	Descripción
Sede Little Hill	Cubierta en mal estado



Georeferenciación	Descripción
Sede Little Hill	Cisterna y Tanque de agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	46	DEL	5 de julio de 2021	AL	11 de julio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DAVER MARIMON
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	LUZ GREYS RUIZ RODRIGUEZ
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	YALILE RINCON RUIZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 43	90.72%	19.50%	**-71.22%**
SEM 44	98.21%	25.92%	**-72.29%**
SEM 45	3.70%	25.92%	**22.22%**
SEM 46	25.92%	29.91%	**3.99%**
	ALERTAS		**3.99%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 43	$ 375,936,603	$ 80,807,781	**$ -295,128,822**
SEM 44	$ 406,972,378	$ 107,412,189	**$ -299,560,189**
SEM 45	$ 18,957,961	$ 132,654,062	**$ 113,696,100**
SEM 46	$ 132,631,746	$ 153,074,189	**$ 20,442,443**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	46	DEL	5 de julio de 2021	AL	11 de julio de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/08/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021				-139.00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		23/07/2021		-78.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		23/07/2021		-73.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		6/08/2021		-64.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**51**	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se reinician trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se reinician trabajos de cuberta y mesones de cafeteria bloque Hotel escuela

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	46	DEL	5 de julio de 2021	AL	11 de julio de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	7-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	14-jun	Suspensión de actividades por paro nacional Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato. Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.segun oficio DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andres, para revison de interventoria Contratista realizo entrega de DCS-643-CO1.2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS, DEPARTAMENTO SAN ANDRES, para revison de interventoria, la cual fue revisada y se le hicieron observaciones. Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	5-jul	Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
5/07/2021	11/07/2021	SEMANA No. 46	12-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

DOCE	12	días del mes de	JULIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	46	DEL	5 de julio de 2021	AL	11 de julio de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Instalacion Shingle cubierta sede gente de mar



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Caeteria hotel escuela

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	46	DEL	5 de julio de 2021	AL	11 de julio de 2021




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Manto cubierta auditorio




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Manto cubierta auditorio



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Manto cubierta auditorio





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG — INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	11/07/2021	MES ONCE DE OBRA	No. 11	DEL	12/06/2021	AL	11/07/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES UNO DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 2: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 3: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 4: Instalacion electrica



FOTOGRAFÍA No. 5: Instalacion electrica



FOTOGRAFÍA No. 6: const cafeteria 5to piso



FOTOGRAFÍA No. 7: const cafeteria 5to piso



FOTOGRAFÍA No. 8: const cafeteria 5to piso




FOTOGRAFÍA No. 9: Recoleccion de basuras




FOTOGRAFÍA No. 10: Instalacion Manto caliente



FOTOGRAFÍA No. 11: Instalacion Manto caliente





FOTOGRAFÍA No. 12: Instalacion electrica

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

06/06/2021

No se labora por ser día de descanso

07/06/2021

Día Festivo

08/06/2021

Continúan con instalaciones de teja tipo Shingle y jornada de aseo en el edificio Principal continúan con el suministro de cerradura y llaves para gabinetes de red eléctricas para lámparas se retoman las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menor.

09/06/2021

No se registran actividades, no fue posible el ingreso del personal debido al paro nacional y bloqueo al acceso de la sede

10/06/2021

Se inicia recorrido en el cuarto piso del edificio hotel escuela con el fin de detectar filtraciones en bajante se hacen sus respectivas reparaciones, continúan con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudante
1 técnico electricista
2 oficiales electricistas
2 ayudante electricista

Equipo
Herramienta menor

11/06/2021

continúan con instalaciones de teja tipo shingle y aplicación de emulsión alifático finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipos
Herramientas menores

12/06/2021

continúan con instalación de teja tipo shingle y aplicación de emulsión asfáltica finalizan con jornada de aseo

personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menor.

13/6/2021

Día de descanso

14/06/2021

Día Festivo

15/06/2021

Inician actividades con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela continúan con instalación de teja tipo shingle y con jornada de aseo en el edificio Principal

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudante

Equipo
Herramienta menores y equipo de soldadura

Escaneado con CamS

16/06/2021

continúan con la instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal continúan con suministro e instalación de salidas electricas para tomas, continúan con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes eléctricos

Equipo
Herramienta menores y equipo de soldadura

17/06/2021

continúan actividades con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continúan con la instalación de teja tipo Shingle y con jornada de aseo en el edificio principal

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux. de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menores y equipos de soldadura.

18/06/2021

Se mantienen las actividades con soldadura en la construcción del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. De otro lado, continúa la instalación de teja tipo Shingle y finaliza la jornada con aseo en el edificio principal.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
1 soldador
2 ayudantes

Equipos
Herramientas menores y equipo

19/06/2021

se adelantan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Continúa la instalación de teja tipo shingle y finalizar la jornada con aseo en el edificio principal

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 maestro
1 soldador
2 ayudantes

Equipo
Herramientas menores y equipo de Soldadura

20/06/2021

Día de descanso

21/06/2021

se adelantan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 soldador
1 ayudantes

Equipos
Herramienta menor y equipo de soldador.

22/06/2021

continúan actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 SISO
1 soldador
4 ayudante

Equipo
Herramientas menores y equipo de soldadura.

Escaneado con CamS

28/06/2021

continúan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 siso
1 soldador
1 ayudante

EQUIPO
Herramienta menores y equipo de soldadura

24/06/2021

Se retoman las actividades en la fachada de edificio auditorio con lijada en vigas y columnas metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar. continúa las actividades con soldadura de los perfiles en C. y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 siso
1 soldador
1 maestro
2 ayudantes

Equipos
herramienta menores y equipos de Soldadura.

25/06/2021

Prosiguen las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada, pulida y aplicación de anticorrosivo en vigas y columnas. Se suspenden actividades desde 9:50 am hasta 11:36 am; 1:20 pm - 5:00 pm por condiciones climáticas, un día recargado de lluvias debido a las lluvias que se presentan, las actividades con soldadura son suspendidas y se reforman los anclajes y cortes de angulos metalicos para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra

1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Soldador.
1 maestro
2 ayudantes

EQUIPOS
Herramienta menor y equipo de Soldadura.

26/06/2021

Se retoman las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columnas metálicas del edidificio de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra
1 residente de obra
1 Aux residente de obra
1 siso
1 soldador
2 maestros
3 ayudantes

EQUIPOS
Herramientas menores y equipo de Soldadora

27/06/2021

Día de descanso

28/06/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columnas metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar. continúa las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Se retoman las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del SPA del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso

EQUIPOS
Herramienta menores y equipo de soldadura

Escaneado con CamS

1 soldadora
2 maestros
3 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

29/06/2021

siguen las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida y aplicación de anticorrosivo en vigas y columnas. se suspenden actividades desde 9:50 am hasta 11:35am; 1:20 PM - 3:00 PM por condiciones climáticas, un día recargado de lluvias. Debido a las lluvias que se presentan, las actividades con soldadura son suspendidas y se retoman los anclajes y cartas de ángulos metálicos y aplicación de anticorrosivo para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Se continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del SPA del edificio Hotel escuela

Personal en obra:	Equipos
1 Residente de obra	Herramienta menores y equipo
1 aux Residente de obra	de soldadura.
1 SISO	
1 Soldador	
1 maestro	
2 ayudantes	
1 técnico electricista	
1 oficiales electricistas	
2 ayudantes eléctricos	

30/06/2021

continuan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columnas metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar. Continuan actividades con soldadura de los perfiles en C y

continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del spa del edificio Hotel escuela

Personal en obra	Equipos
1 Residente de obra	Herramientas menores y equipos de
1 Aux residente de obra	Soldadura.
1 SISO	
1 Soldador	
1 maestro	
2 ayudante.	
1 tecnico electricista	
2 oficiales electricos	
2 ayudantes electricos	

1/07/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columna metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar, finalizan las actividades con soldadura de los perfiles en C y se continuan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el area del SPA del edificio Hotel escuela

Persona en obra	Equipos
1 Residente de obra	Herramienta menores
1 aux Residente de obra	
1 SISO.	
1 maestro	
2 ayudantes	
1 tecnico electricista	
2 oficiales electricos	
2 ayudantes electricos.	

2/07/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, finalizan la actividad de tratamiento a la [illegible]. continúan las actividades con suministro

Escaneado con CamS

e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del cuarto piso del edificio hotel escuela.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 siso
1 técnico electrico
1 maestro
2 ayudante.
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricistas

Equipos
Herramientas menores.

3/07/2021

Prosiguen con las actividades de instalación de teja tipo shingle en el edificio Principal, continuan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
2 maestro
2 ayudantes

Equipos
Herramientas menores

4/07/2021

Día de descanso

5/07/2021

Día Festivo

6/07/2021

continuan con las actividades de instalacion de teja tipo shingle en el edificio Principal, continúan con la conformacion del muro para el bar de cubierta del edificio Hotel escuela. continúa con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se retoma la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 oficial de impermeabilizaciones
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes eléctricos

Equipos:
Herramientas menores.

07/07/2021

Prosiguen con las actividades de manto asfaltico en la cubierta del edificio auditorio continuan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela, continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas y tablero del edificio hotel escuela, se hace entrega del ascensor thyssenkrupp del edificio hotel escuela quien recibe, el arquitecto regional jemgelbert silgado fox, administrador del edificio Henry agustin doaw archibold, operador de mantenimiento Gonzalo romero stephens, arquitecta sena dirección general bogota viviana sanchez, tecnico electricista Romel mosquera, técnico electromecánico eduiun cobo guerrero

Personal en obra:
1 residente de obra
1 aux. Residente de obra
1 siso
1 oficial de impermeabilizaciones
1 maestro
2 ayudantes
1 tecnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudante eléctricos

Equipo
herramientas menores

Escaneado con CamS

8/07/2021

Se inicia con el demonte de panel solar en el edificio auditorio, continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan con la conformación del muro con la aplicación de Graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continuan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela se continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. se continua con el ascensor thyssenkrupp con el dragnóstico del edificio hotel escuela

Personal en obra:	Equipos
1 Residente de obra	Herramientas menores.
1 aux Residente de obra	
1 siso	
1 Oficial de impermeabilización	
1 maestro	
2 ayudantes	
1 técnico electricista	
2 oficiales electricistas	
2 ayudantes electricos	

9/07/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio Principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de Graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela Continuan con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. finalizan con jornada de aseo. se continua con el ascensor thyssenkrupp con el dragnóstico del edificio hotel escuela

Personal en obra:	Equipos
1 Residente de obra	Herramientas menores.
1 Aux. Residente de obra	
1 siso	
1 Oficial de impermeabilizaciones	
1 maestro	
2 ayudantes	
1 técnico electricista	
2 oficiales electricistas	
2 ayudantes electricos	

10/07/2021

Prosiguen con las actividades de instalación de teja tipo Shingle en el edificio Principal, continuan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continúan las actividades con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. Finalizan con jornada de aseo, se continua con el ascensor thyssenkrupp con el dragnóstico del edificio hotel escuela.

Personal en obra	Equipo
1 Residente de obra	Herramientas menores
1 aux Residente de obra	
1 siso	
1 Oficial de impermeabilización	
1 maestro	
2 ayudantes	
1 técnico electricista	
2 oficiales electricista	
2 ayudantes electricista	

11/07/2021

Dia de descanso.

Escaneado con CamS

12/07/2021

Se inician actividades con la instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal continúan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela se suspende la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio por fuertes brisas y lluvias repentinas y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela finalizan con jornada de aseo

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipos:
Herramienta menores

13/07/2021

Inician actividades con el mantenimiento de aires acondicionado, continúan con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio Hotel escuela continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela Se continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muro en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio Hotel escuela. Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipo
Herramienta menores

14/07/2021

Inician con pintura tipo 1 y reparación de fisuras en las áreas de la azotea del edificio hotel escuela continúan con mantenimiento de aires acondicionado, con la instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal, continúan con la conformación de muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. Finalizan con jornada de aseo.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipos
Herramienta menores.

15/07/2021

Prosiguen con pintura tipo 1 y reparación de fisuras en las áreas de la azotea del edificio hotel escuela continúan con mantenimiento de aire acondicionado, continúa con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela finaliza con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra

Equipo
Herramienta menores

Escaneado con CamS

Anexo No. 16: Programación actualizada.

DCS-666-CO1. 2323

Bogotá D.C., 30 de junio de 2021

Señores
CONSORCIO INTERINGECOGNC
Atn. PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director Interventoría
Ciudad

Asunto: Contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL.",* Alcance al oficio DCS-624-CO1. 2323 Programación prorroga.

Cordial Saludo:


Dando alcance al oficio DCS-624-CO1. 2323 por el que se dio la Solicitud de prórroga al contrato de obra, se adjunta la programación a la fecha solicitada.

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

SERGIO NICOLAS MOLINA SAAVEDRA
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
Nit. 901382278-7


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Programación LOTE 1**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
1		**REGIONAL ATLANTICO**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
2		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
3		**COLOMBO ALEMÁN - CLL 30# 3E-165 - BARRANQUILLA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
4		LAVADO DE TANQUE	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
5		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
6		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza. Demoliciones. Pinturas. Estructuras. Etc.)	25 días	mar 29/06/21	lun 2/08/21
7		UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
8		NO PREVISTOS	22 días	vie 16/07/21	sáb 14/08/21
9		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN BARRANQUILLA**	**37 días**	**vie 2/07/21**	**sáb 21/08/21**
10		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	vie 2/07/21	sáb 14/08/21
11		NO PREVISTOS	20 días	lun 26/07/21	sáb 21/08/21
12		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial- zona Urbana**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
13		Impermeabilizaciones	24 días	mar 29/06/21	jue 29/07/21
14		Sistemas electricos	25 días	lun 19/07/21	sáb 21/08/21
15		LAVADO DE TANQUES	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
16		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
17		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	34 días	mié 30/06/21	sáb 14/08/21
18		NO PREVISTOS	25 días	lun 19/07/21	sáb 21/08/21
19		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial - El Caney- Rural**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
20		IMPERMEABILIZACIONES	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
21		SISTEMAS ELECTRICOS	15 días	lun 2/08/21	sáb 21/08/21
22		LAVADO DE TANQUES	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
23		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
24		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31 días	lun 12/07/21	sáb 21/08/21
25		NO PREVISTOS	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
26		**DESPACHO REGIONAL - KR 43 # 42-40, BARRANQUILLA**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
27		IMPERMEABILIZACIONES	15 días	mar 13/07/21	sáb 31/07/21
28		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
29		LAVADO DE TANQUES	20 días	lun 26/07/21	sáb 21/08/21
30		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
31		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
32		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
33		SISTEMAS ELÉCTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
34		EQUIPOS DE BOMBEO	15 días	lun 2/08/21	sáb 21/08/21
35		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	39 días	mié 30/06/21	sáb 21/08/21
36		UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15 días	lun 2/08/21	sáb 21/08/21
37		NO PREVISTOS	10 días	lun 26/07/21	sáb 7/08/21
38		**LIQUIDACIÓN**	**6 días**	**lun 23/08/21**	**lun 30/08/21**
39		LIQUIDACIÓN Y CIERRE ATLANTICO	6 días	lun 23/08/21	lun 30/08/21
40		**REGIONAL BOLIVAR**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
41		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
42		**AGROEMPRESARIAL - MOMPOX**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**vie 6/08/21**
43		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
44		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21

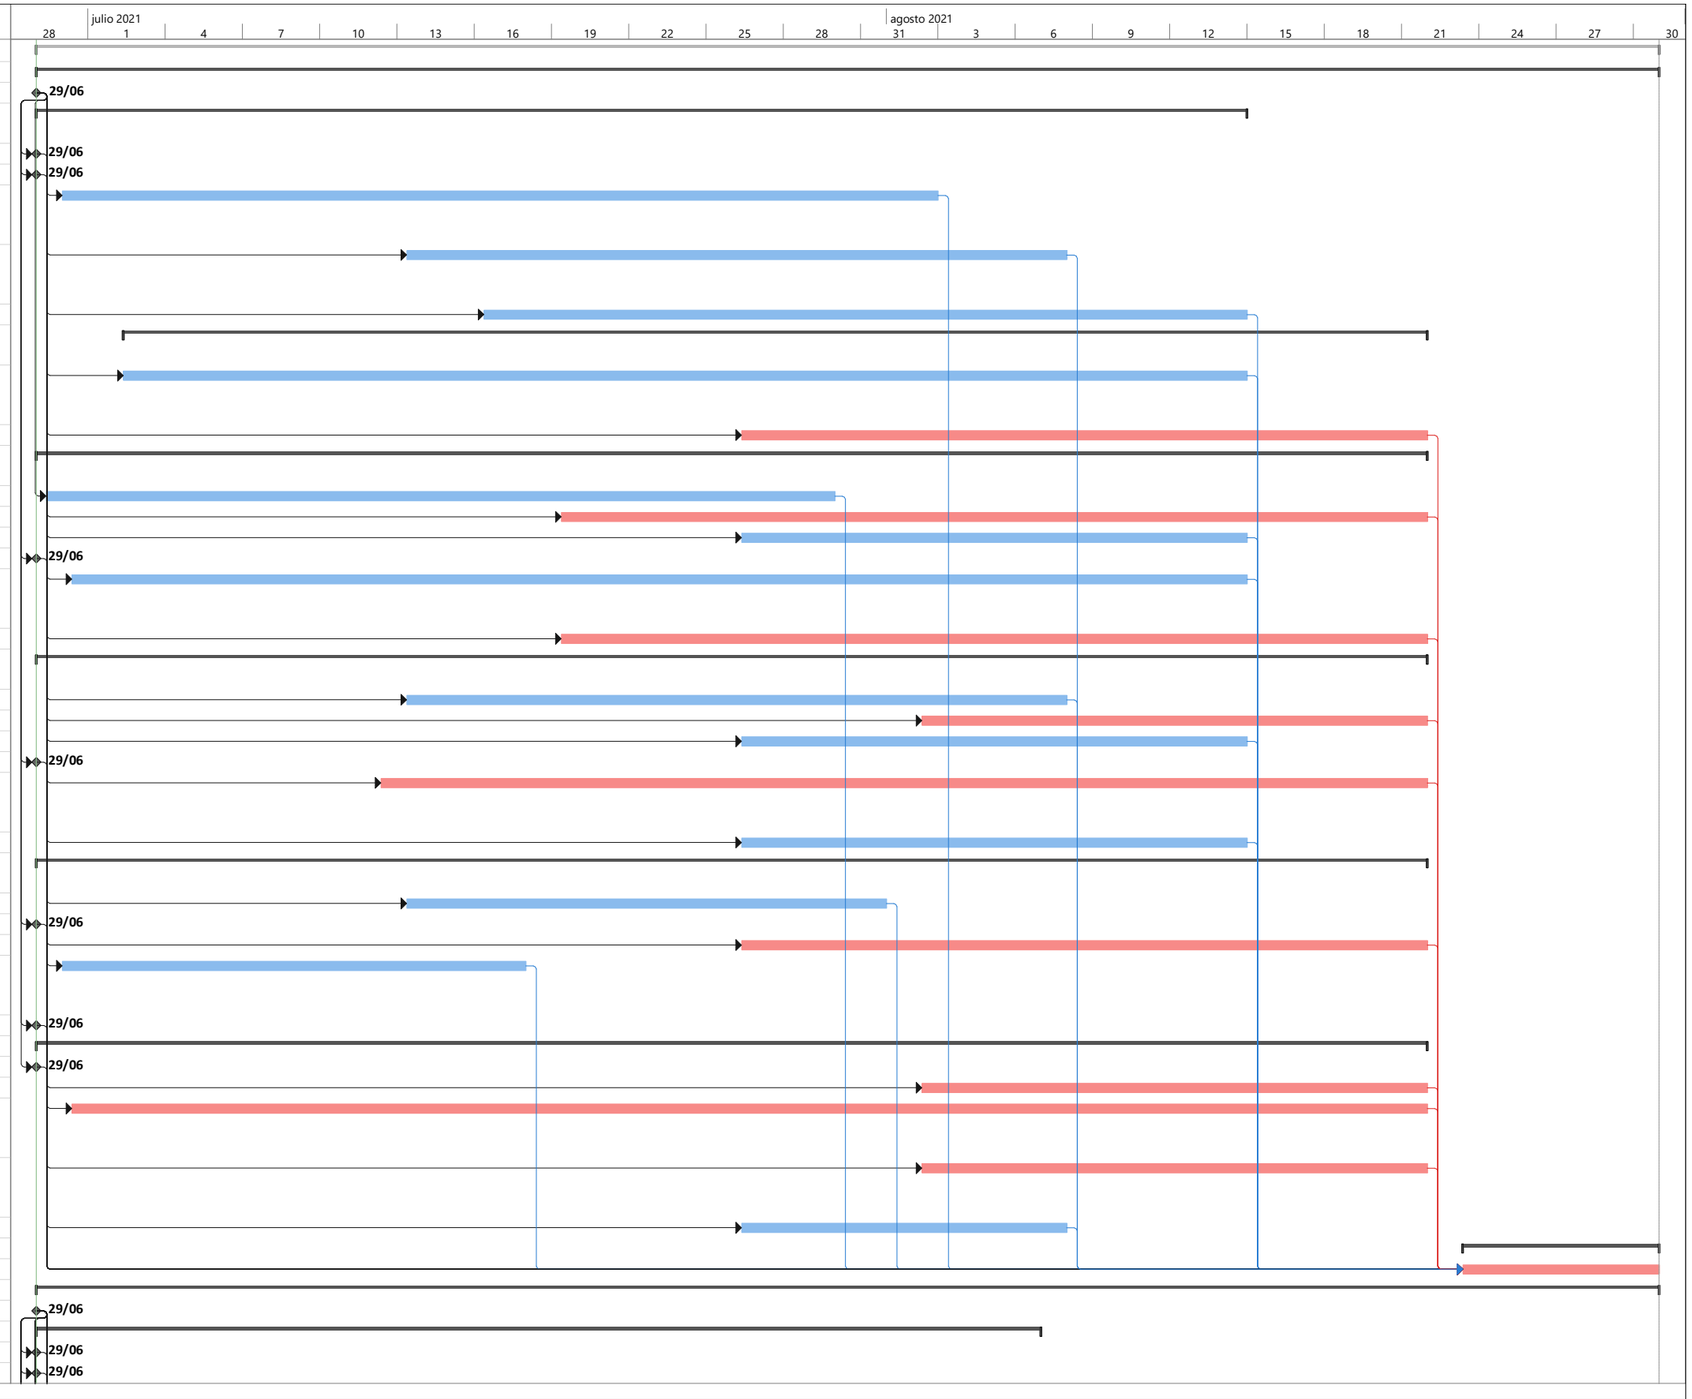

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	mar 29/06/21	mar 6/07/21
46		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	vie 6/08/21
47		**CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
48		SISTEMAS ELECTRICOS	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
49		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
50		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
51		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
52		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
53		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	vie 2/07/21	sáb 7/08/21
54		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
55		**MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
56		SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
57		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
58		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
59		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
60		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
61		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
62		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
63		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
64		NO PREVISTOS	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
65		**AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
66		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
67		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
68		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días	lun 19/07/21	sáb 24/07/21
69		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
70		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
71		SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
72		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
73		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
74		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6 días	vie 9/07/21	sáb 17/07/21
75		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
76		**CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
77		Impermeabilizaciones	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
78		SISTEMAS ELECTRICOS	15 días	lun 19/07/21	sáb 7/08/21
79		SERVICIO DE JARDINERIA	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21
80		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
81		Sistemas de refrigeración	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
82		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	35 días	mar 29/06/21	sáb 14/08/21
83		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	35 días	mar 29/06/21	sáb 14/08/21
84		NO PREVISTOS	35 días	mar 29/06/21	sáb 14/08/21
85		**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
86		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	40 días	mar 29/06/21	sáb 21/08/21
87		NO PREVISTOS	40 días	mar 29/06/21	sáb 21/08/21
88		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ**	**41 días**	**mar 29/06/21**	**lun 23/08/21**
89		Sistemas Electricos	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
90		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21

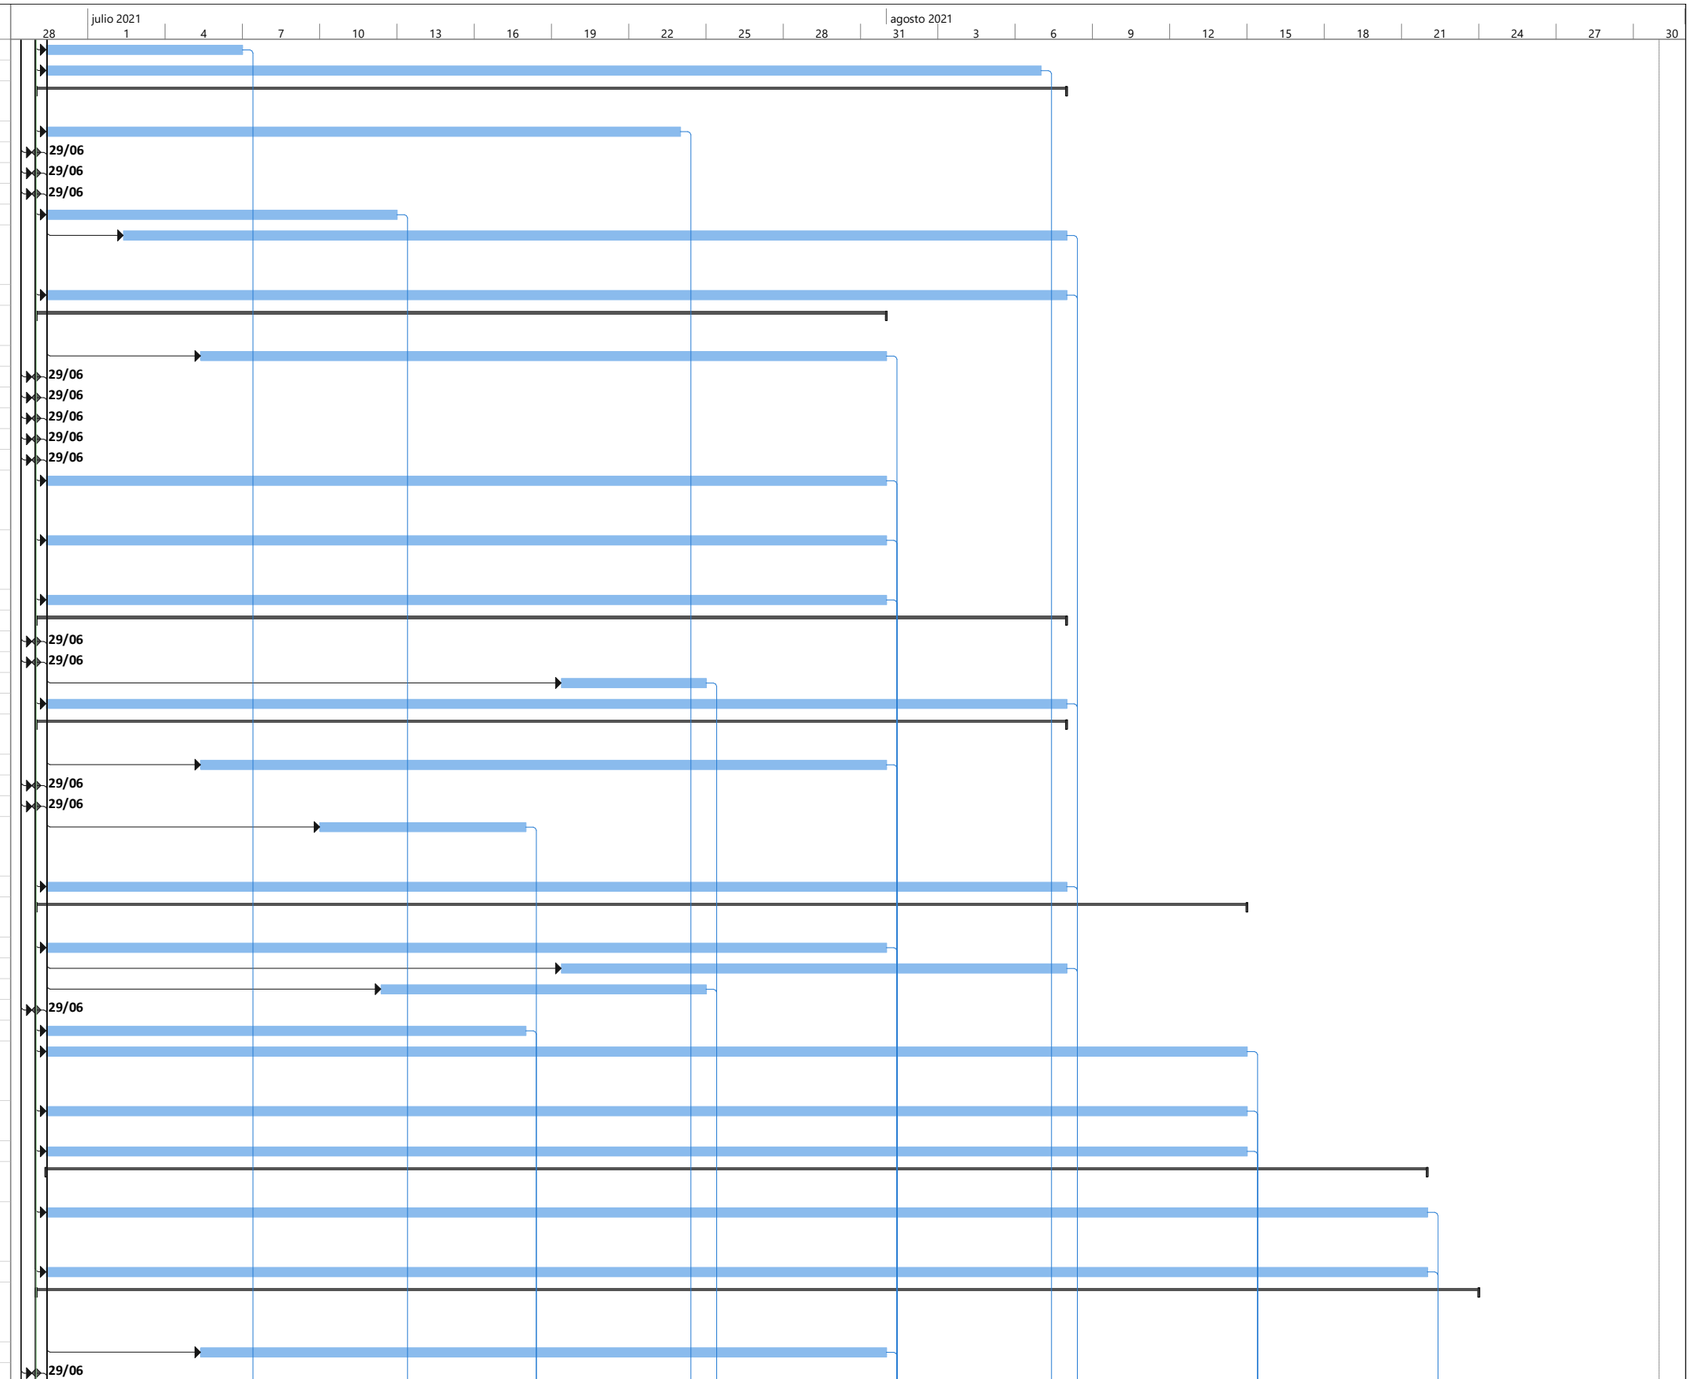

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
91		Lavado de tanques	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
92		Sistemas contra incendio.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
93		Sistemas de refrigeración	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
94		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	40 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
95		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
96		NO PREVISTOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
97		**LIQUIDACIÓN**	**5 días**	**mar 24/08/21**	**lun 30/08/21**
98		LIQUIDACIÓN Y CIERRE BOLIVAR	5 días	mar 24/08/21	lun 30/08/21
99		**REGIONAL SUCRE**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
100		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
101		**SEDE COROZAL Cra 26 #261a-83**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
102		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
103		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SEDE BOSTON**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
104		SISTEMAS ELÉCTRICOS	11 días	vie 2/07/21	sáb 17/07/21
105		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
106		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
107		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26 días	lun 5/07/21	sáb 7/08/21
108		ITEMS NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
109		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA- KR 1 #20-10 - TOLU**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
110		IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 12/07/21	sáb 31/07/21
111		SISTEMAS ELÉCTRICOS	15 días	lun 19/07/21	sáb 7/08/21
112		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
113		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	lun 9/08/21	sáb 21/08/21
114		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	15 días	lun 2/08/21	sáb 21/08/21
115		NO PREVISTOS	32 días	vie 2/07/21	sáb 14/08/21
116		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS - KILÓMETRO 5 VÍA SAMPUÉS - GALLERA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
117		IMPERMEBEALIZACIONES	14,75 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
118		SISTEMAS ELÉCTRICOS	16 días	lun 12/07/21	sáb 31/07/21
119		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
120		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
121		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20 días	lun 19/07/21	sáb 14/08/21
122		NO PREVISTOS	20 días	lun 19/07/21	sáb 14/08/21
123		**LIQUIDACIÓN**	**6 días**	**lun 23/08/21**	**lun 30/08/21**
124		LIQUIDACIÓN Y CIERRE SUCRE	6 días	lun 23/08/21	lun 30/08/21
125		**REGIONAL GUAJIRA**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
126		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
127		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA - KM 1 VIA BARRANCAS -FONSECA**	**24,25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
128		SERVICIO DE JARDINERIA	14 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
129		LAVADO TANQUES	14 días	mié 7/07/21	sáb 24/07/21
130		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9 días	mar 20/07/21	sáb 31/07/21
131		NO PREVISTOS	22 días	vie 2/07/21	sáb 31/07/21
132		**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
133		IMPERMEABILIZACIONES	4 días	mar 29/06/21	sáb 3/07/21
134		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
135		SERVICIO DE JARDINERIA	9 días	mar 6/07/21	sáb 17/07/21
136		LAVADO DE TANQUES	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
137		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
138		NO PREVISTOS	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
139		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA-TRONCAL DEL CARIBE A MAICAO KM5**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**

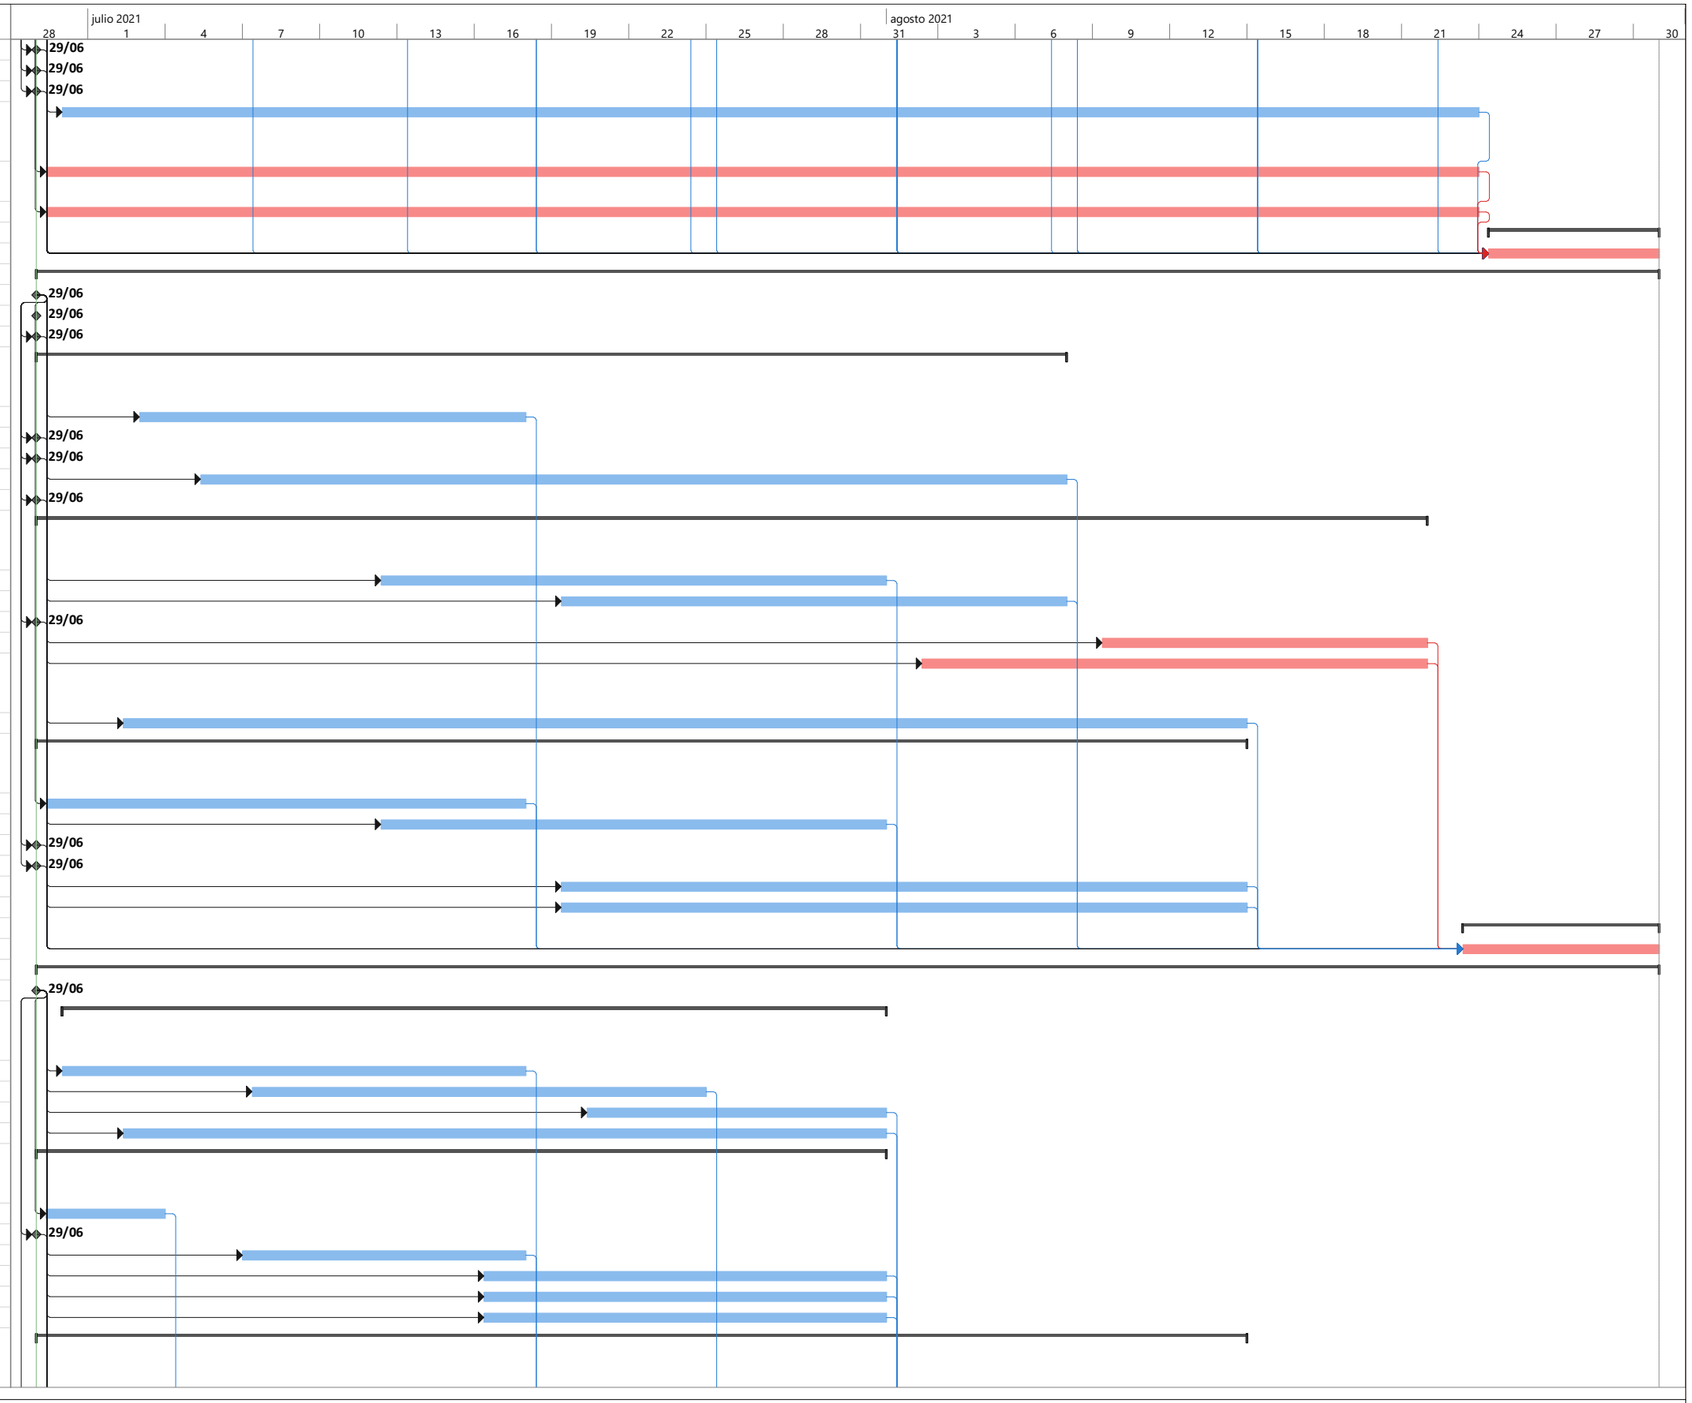

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
140		SISTEMAS ELECTRICOS	32 días	vie 2/07/21	sáb 14/08/21
141		SERVICIO JARDINERIA	15,75 días	mar 20/07/21	mar 10/08/21
142		LAVADO DE TANQUES	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
143		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
144		NO PREVISTOS	19 días	mar 20/07/21	sáb 14/08/21
145		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO-CARRERA42A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE**	**24,25 días**	**lun 19/07/21**	**sáb 21/08/21**
146		SERVICIO DE JARDINERIA	13 días	mié 4/08/21	sáb 21/08/21
147		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	lun 9/08/21	sáb 21/08/21
148		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	8 días	lun 2/08/21	jue 12/08/21
149		NO PREVISTOS	24 días	lun 19/07/21	vie 20/08/21
150		**LIQUIDACIÓN**	**6 días**	**lun 23/08/21**	**lun 30/08/21**
151		LIQUIDACIÓN Y CIERRE GUAJIRA	6 días	lun 23/08/21	lun 30/08/21
152		**REGIONAL MAGDALENA**	**45,75 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
153		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
154		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- EL BANCO**	**27,25 días**	**jue 1/07/21**	**sáb 7/08/21**
155		SERVICIO DE JARDINERIA	5 días	jue 1/07/21	jue 8/07/21
156		LAVADO DE TANQUES	2 días	jue 1/07/21	lun 5/07/21
157		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13 días	mié 7/07/21	jue 22/07/21
158		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5 días	mar 6/07/21	mar 13/07/21
159		NO PREVISTOS	23 días	jue 8/07/21	sáb 7/08/21
160		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- CIENAGA**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
161		IMPERMEABILIZACIONES	10 días	lun 5/07/21	sáb 17/07/21
162		LAVADO DE TANQUES	10 días	lun 19/07/21	sáb 31/07/21
163		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
164		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
165		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6,75 días	mar 13/07/21	mar 20/07/21
166		NO PREVISTOS	6 días	jue 8/07/21	jue 15/07/21
167		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
168		IMPERMEABILIZACIONES	12 días	vie 9/07/21	sáb 24/07/21
169		SERVICIO DE JARDINERIA	10 días	lun 5/07/21	sáb 17/07/21
170		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 2/08/21	sáb 7/08/21
171		LAVADO DE TANQUES	6 días	vie 23/07/21	lun 2/08/21
172		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
173		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	20 días	mar 6/07/21	sáb 31/07/21
174		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	18 días	jue 8/07/21	sáb 31/07/21
175		NO PREVISTOS	29 días	mié 30/06/21	sáb 7/08/21
176		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- SANTA MARTA**	**40,75 días**	**mar 29/06/21**	**lun 23/08/21**
177		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 19/07/21	sáb 24/07/21
178		SISTEMAS ELECTRICOS	5 días	lun 2/08/21	sáb 7/08/21
179		SERVICIO DE JARDINERIA	9 días	mié 14/07/21	lun 26/07/21
180		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
181		LAVADO TANQUES	10 días	lun 26/07/21	sáb 7/08/21
182		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
183		NO PREVISTOS	10 días	lun 9/08/21	lun 23/08/21

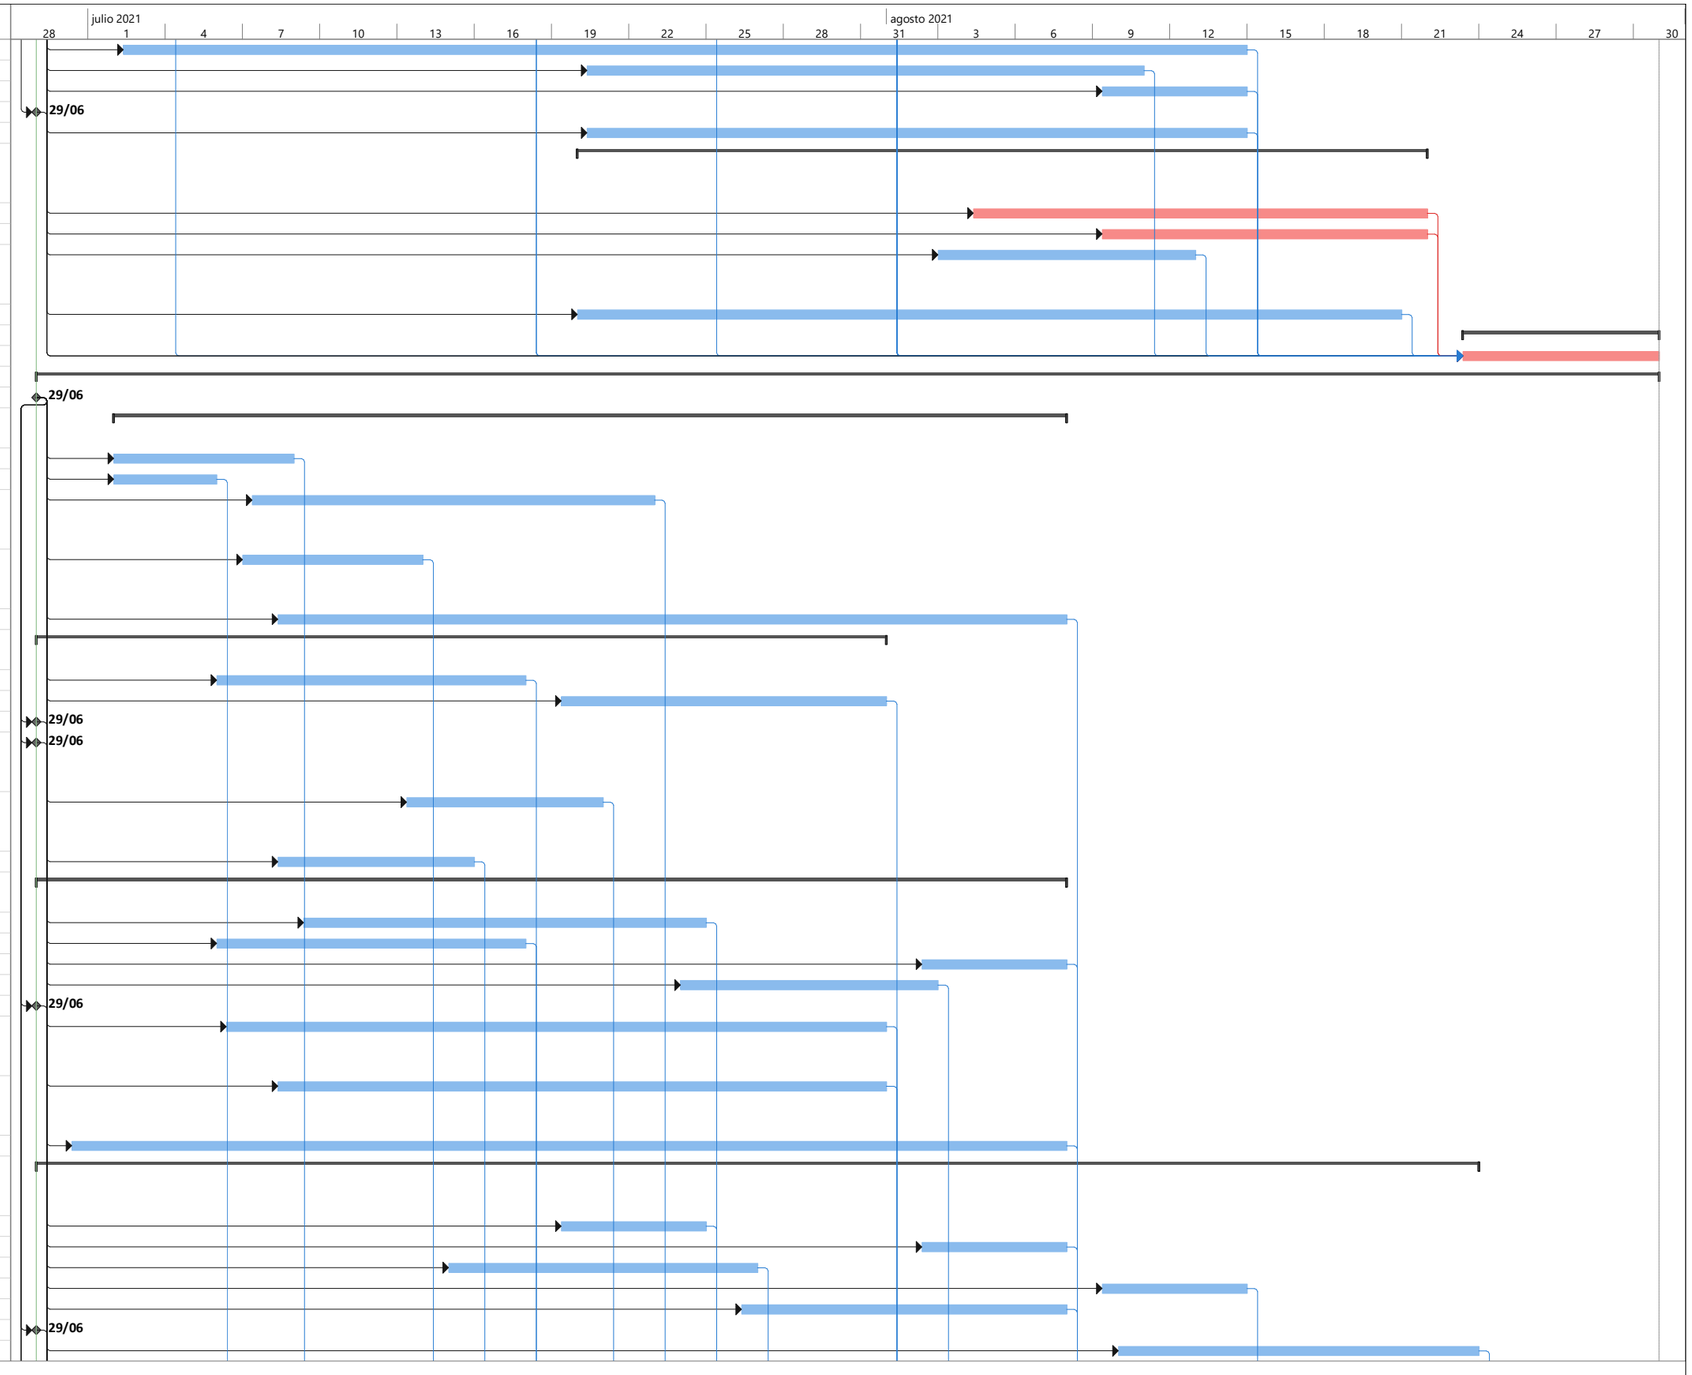

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
184		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Santa Marta**	**40 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 21/08/21**
185		EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	vie 6/08/21	vie 13/08/21
186		LAVADO DE TANQUES	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
187		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
188		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
189		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 13/07/21	sáb 14/08/21
190		NO PREVISTOS	33 días	jue 8/07/21	sáb 21/08/21
191		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Fundación**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
192		LAVADO DE TANQUES	10 días	lun 19/07/21	sáb 31/07/21
193		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
194		NO PREVISTOS	10 días	sáb 17/07/21	jue 29/07/21
195		**Dirección Regional, APE y Servicios Medicos – Santa Marta, Av. Ferrocarril 27 – 97.**	**41,75 días**	**mar 29/06/21**	**mar 24/08/21**
196		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 26/07/21	sáb 31/07/21
197		SISTEMAS ELECTRICOS	11 días	vie 6/08/21	sáb 21/08/21
198		SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	vie 2/07/21	lun 12/07/21
199		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
200		LAVADO DE TANQUES	6 días	vie 9/07/21	sáb 17/07/21
201		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
202		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7 días	vie 30/07/21	mar 10/08/21
203		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	18 días	jue 8/07/21	sáb 31/07/21
204		NO PREVISTOS	38 días	vie 2/07/21	mar 24/08/21
205		**LIQUIDACIÓN**	**4 días**	**mar 24/08/21**	**lun 30/08/21**
206		LIQUIDACIÓN Y CIERRE MAGDALENA	4 días	mar 24/08/21	lun 30/08/21
207		**REGIONAL CORDOBA**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
208		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
209		**DESPACHO REGIONAL- SEDE ADMINISTRATIVA MONTERIA**	**20 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 24/07/21**
210		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 5/07/21	sáb 10/07/21
211		SERVICIOS DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
212		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
213		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
214		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
215		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
216		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
217		NO PREVISTOS	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
218		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA**	**41 días**	**mar 29/06/21**	**lun 23/08/21**
219		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
220		SISTEMAS ELECTRICOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
221		SERVICIOS DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
222		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
223		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
224		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
225		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
226		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MONTELÍBANO**	**9 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 10/07/21**

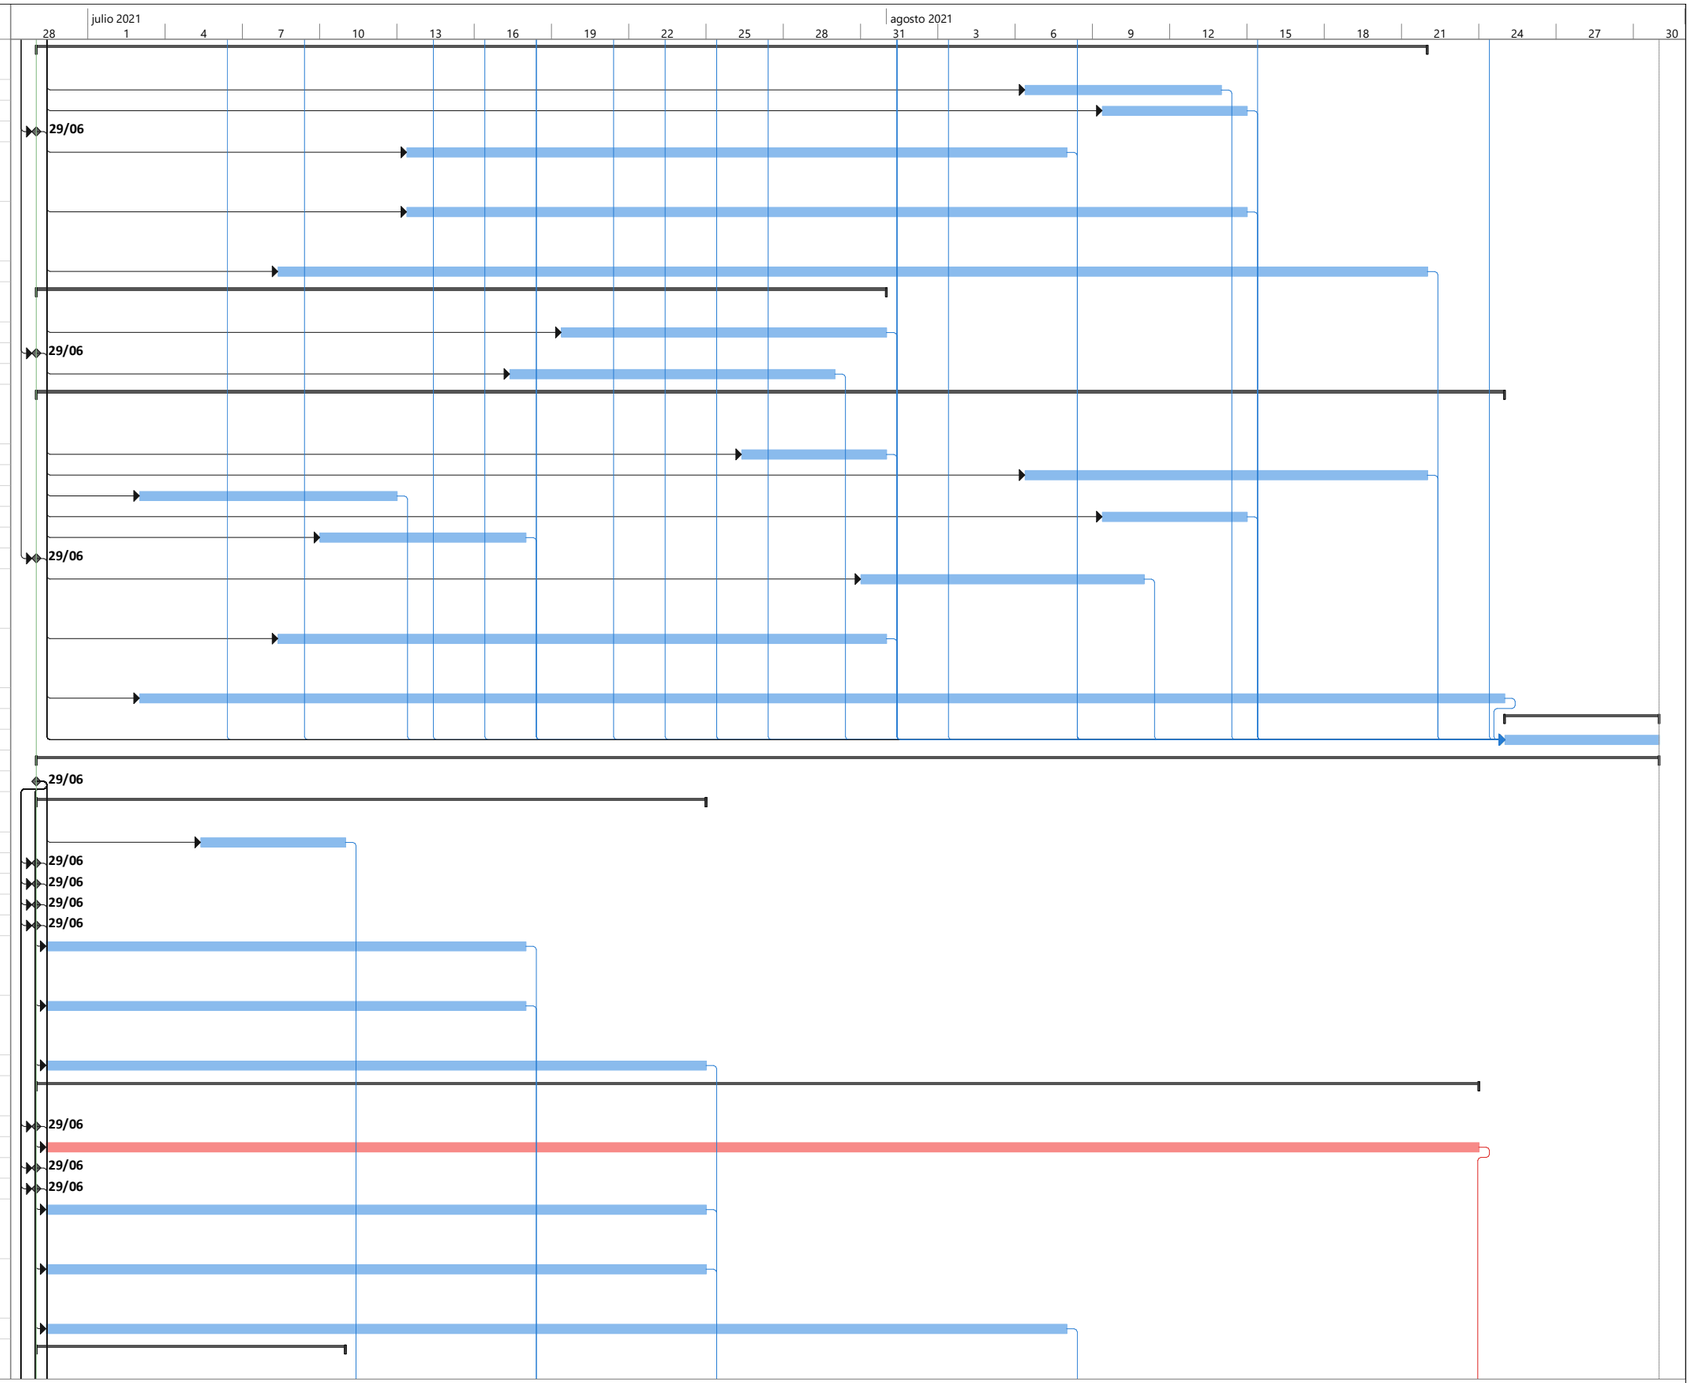

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
227		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
228		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
229		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
230		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
231		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
232		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
233		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
234		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**41 días**	**mar 29/06/21**	**lun 23/08/21**
235		IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 5/07/21	sáb 24/07/21
236		SISTEMAS ELECTRICOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
237		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
238		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
239		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
240		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
241		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
242		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
243		NO PREVISTOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
244		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
245		IMPERMEABILIZACIONES	11 días	vie 2/07/21	sáb 17/07/21
246		SISTEMAS ELÉCTRICOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
247		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
248		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
249		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
250		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
251		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
252		NO PREVISTOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
253		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
254		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
255		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
256		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
257		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
258		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
259		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	26 días	lun 12/07/21	sáb 14/08/21
260		NO PREVISTOS	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
261		**LIQUIDACIÓN**	**5 días**	**mar 24/08/21**	**lun 30/08/21**
262		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CORDOBA	5 días	mar 24/08/21	lun 30/08/21
263		**REGIONAL CESAR**	**45,75 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
264		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
265		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**43 días**	**mar 29/06/21**	**mié 25/08/21**
266		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
267		SISTEMAS ELÉCTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
268		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 17/08/21	mar 17/08/21
269		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 5/07/21	sáb 10/07/21
270		LAVADO DE TANQUES	3 días	mié 28/07/21	sáb 31/07/21
271		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	12 días	vie 2/07/21	lun 19/07/21

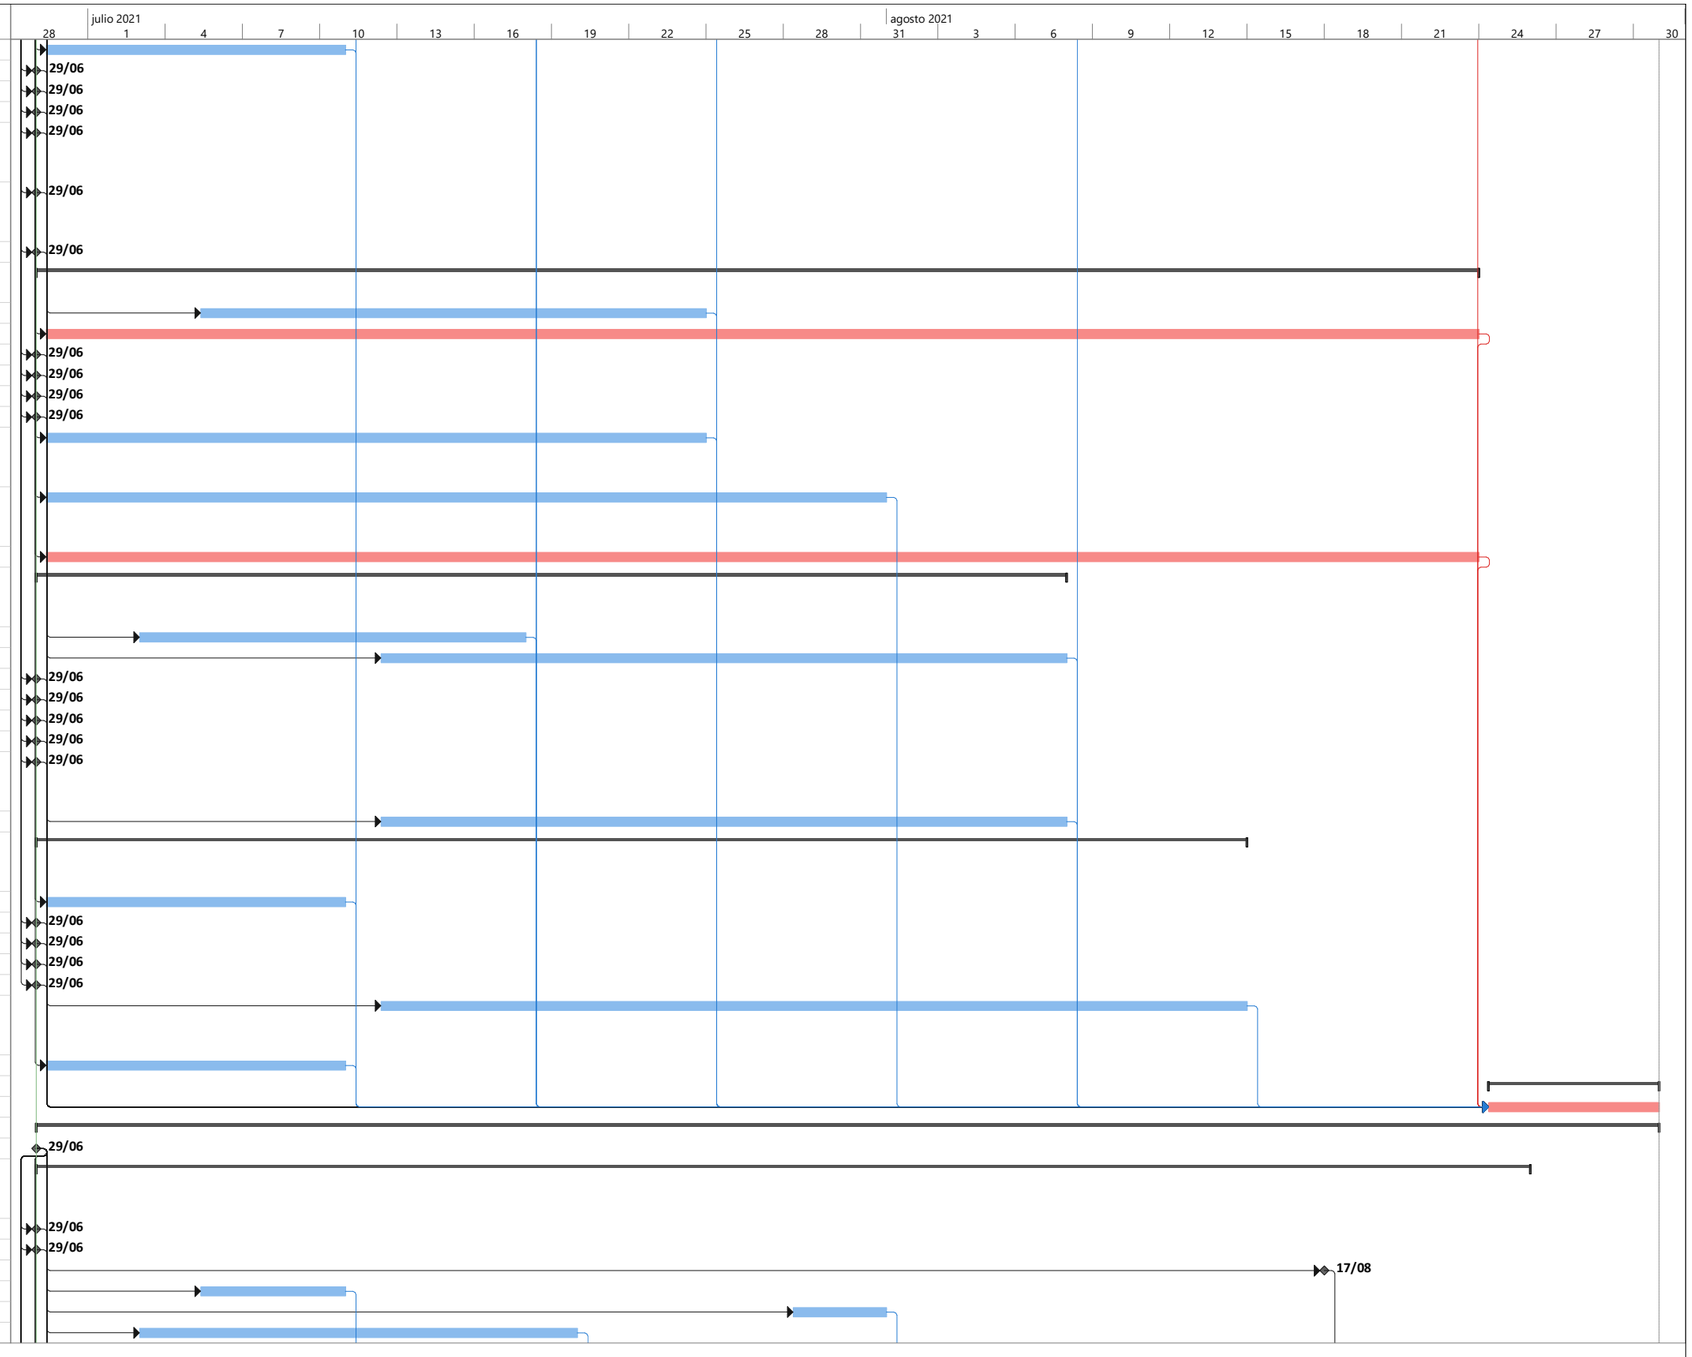

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
272		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	43 días	mar 29/06/21	mié 25/08/21
273		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
274		NO PREVISTOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
275		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
276		Impermeabilizaciones	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
277		Sistemas eléctricos	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
278		Servicio de jardinería	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
279		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
280		Lavado de tanques	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
281		Sistemas de refrigeración.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
282		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
283		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
284		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
285		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
286		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
287		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
288		MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
289		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
290		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
291		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
292		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
293		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
294		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
295		SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
296		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
297		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
298		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
299		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
300		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**43,75 días**	**mar 29/06/21**	**jue 26/08/21**
301		IMPERMEABILIZACIONES	5,75 días	lun 12/07/21	sáb 17/07/21
302		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
303		SERVICIO DE JARDINERIA	5 días	lun 16/08/21	sáb 21/08/21
304		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
305		LAVADO DE TANQUES	4 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21
306		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
307		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	42,75 días	mar 29/06/21	mié 25/08/21
308		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21 días	sáb 17/07/21	sáb 14/08/21
309		NO PREVISTOS	24,75 días	lun 19/07/21	vie 20/08/21
310		**LIQUIDACIÓN**	**2 días**	**jue 26/08/21**	**lun 30/08/21**
311		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CESAR	2 días	jue 26/08/21	lun 30/08/21
312		**REGIONAL SAN ANDRES**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**

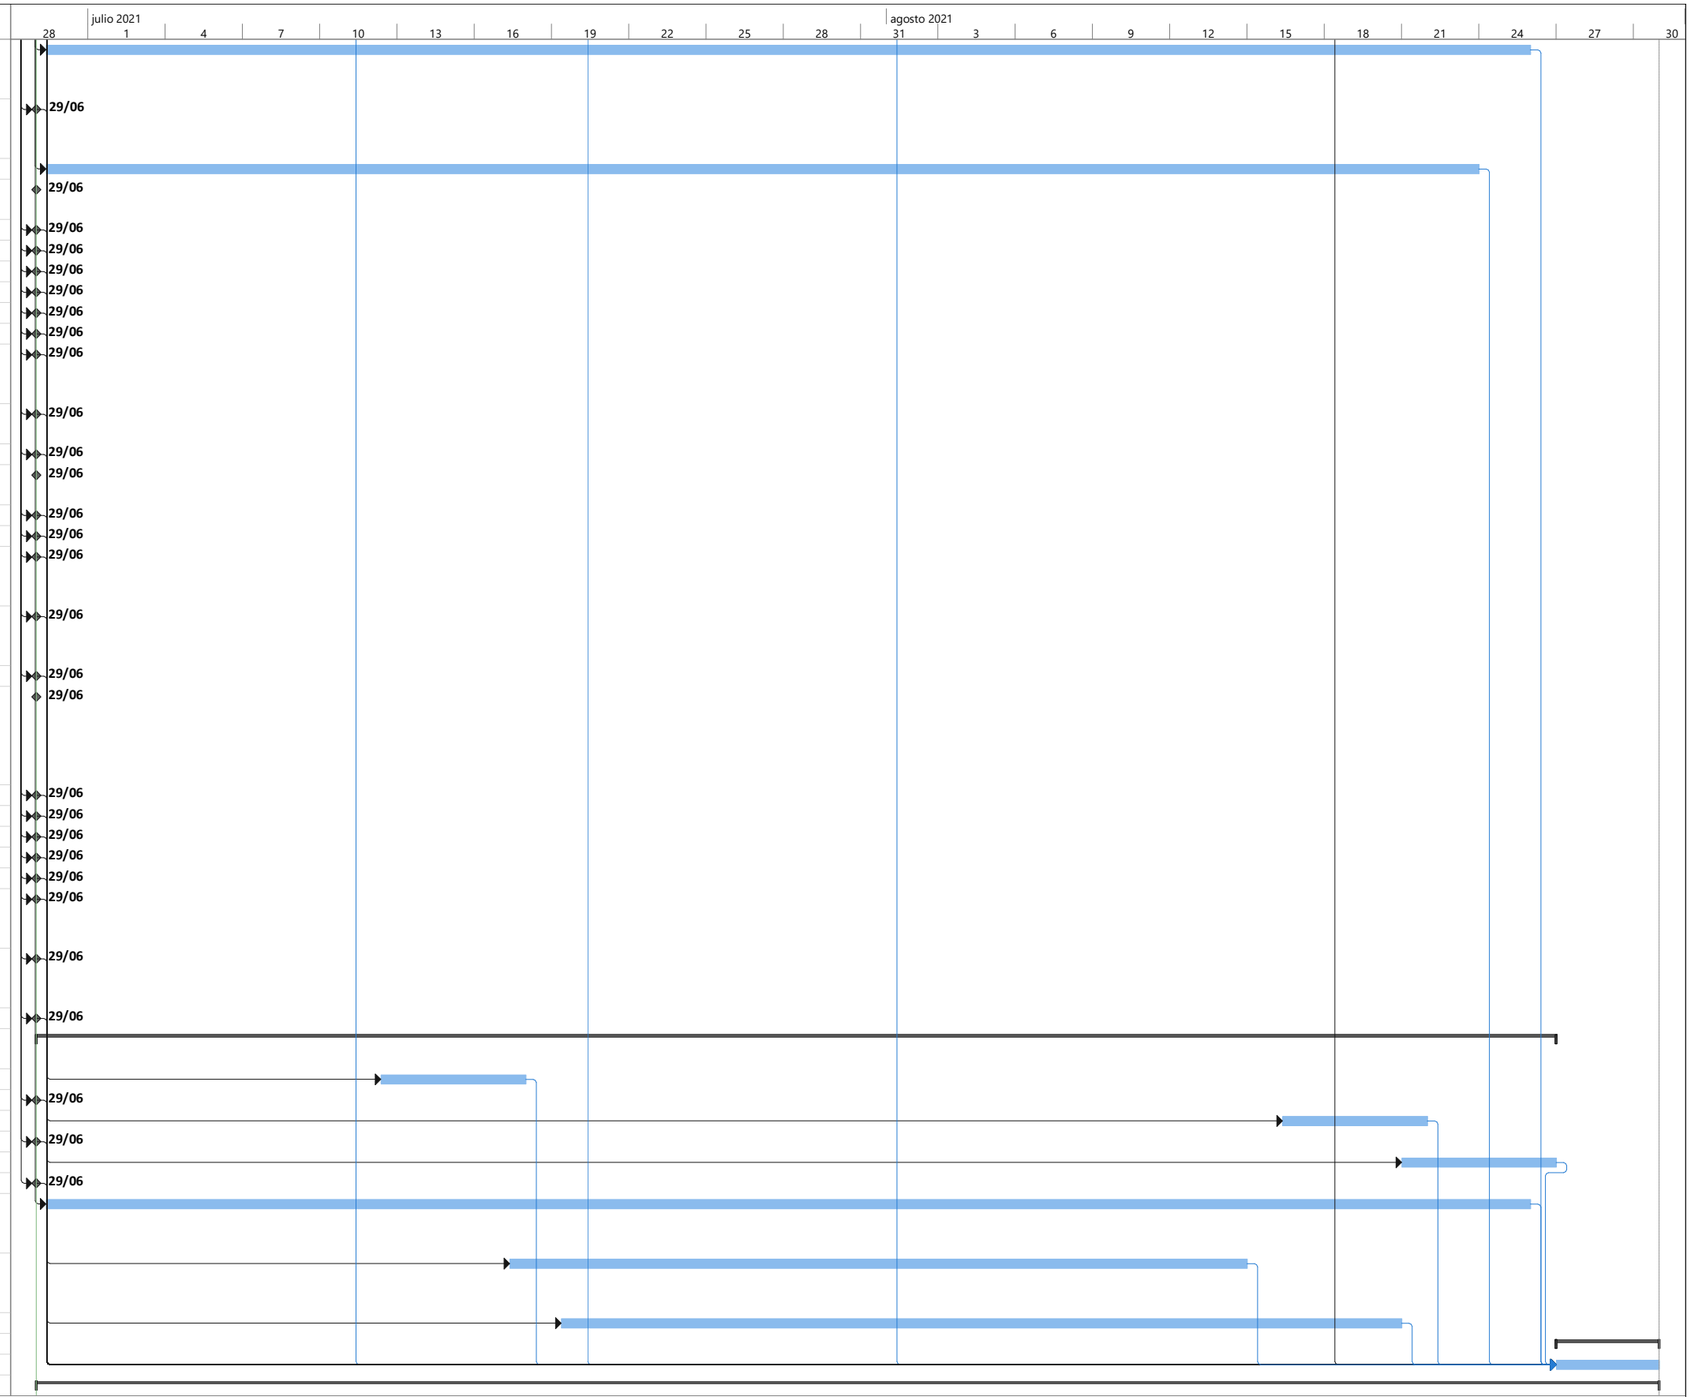

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
313		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
314		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**vie 13/08/21**
315		SISTEMAS ELECTRICOS	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
316		SERVICIO DE JARDINERIA	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
317		EQUIPOS DE BOMBEO	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
318		LAVADO DE TANQUES	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
319		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
320		SISTEMA DE REFRIGERACION	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
321		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30 días	mar 29/06/21	vie 6/08/21
322		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	30 días	mar 29/06/21	vie 6/08/21
323		NO PREVISTOS	35 días	mar 29/06/21	vie 13/08/21
324		**LIQUIDACIÓN**	**11 días**	**lun 16/08/21**	**lun 30/08/21**
325		LIQUIDACIÓN Y CIERRE VICHADA	11 días	lun 16/08/21	lun 30/08/21

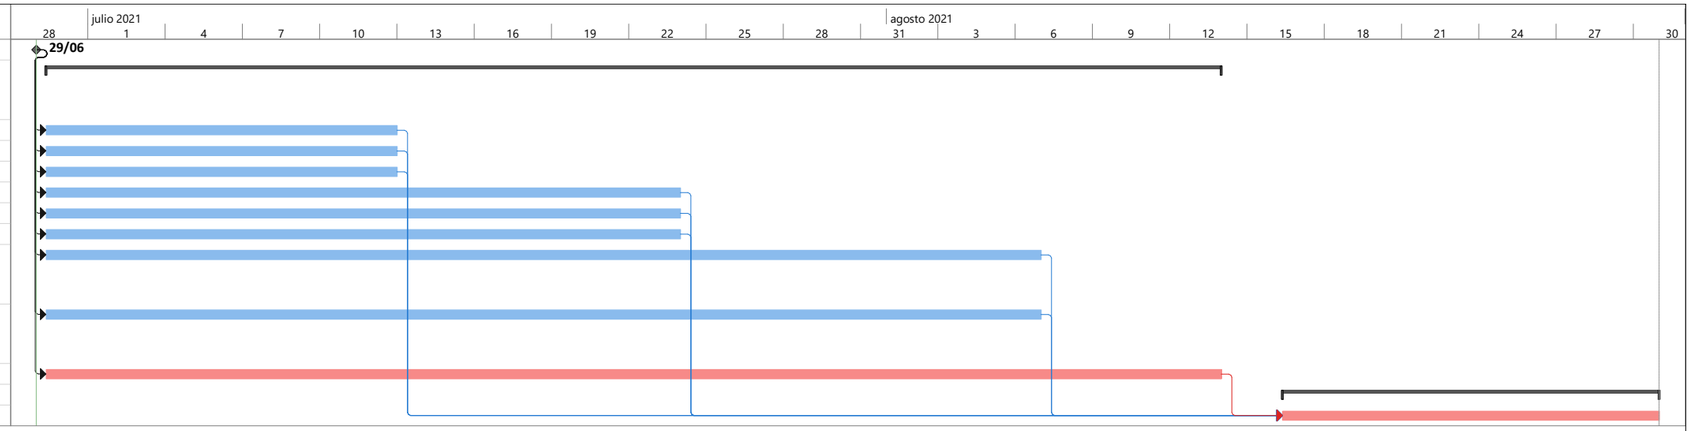

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
