SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES - CESAR

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 12

PERÍODO: 12 DE JULIO DE 2021 AL 11 DE AGOSTO DE 2021

ELABORÓ:	APROBÓ:
Firma: Jose Morales	Firma:
Nombre: Ing. José Fidel Morales Galindo	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 7
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 8
1.4. LOCALIZACIÓN 8

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 11

2.1. FORMA DE PAGO 12
2.2. ANTICIPO DE OBRA 13
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 13
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 14
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 14
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 18
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 18
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 19
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 19

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
3.2. FORMA DE PAGO 21
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 22
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 23
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 23
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 23
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 23
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 24

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 24

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 25

6.1 CONCLUSIONES: 26
6.2 RECOMENDACIONES: 27

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 8
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Valledupar 9
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV - Valledupar 9
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO BIOTECNOLÓGICO Y DEL CARIBE – CBC - Valledupar 9
Grafica 5. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico 10
Grafica 6. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE - Aguachica 10

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 11
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020. 13
Tabla 3 Control financiero Contratista.....18
Tabla 4 Relación del personal Contrato 19
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 20
Tabla 6. estado legal del contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 21
Tabla 7. Control financiero interventoría 22
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría.....22
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 23
Tabla 10 Presupuesto por sedes Cesar.....25

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 12, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2021 y el 11 de agosto de 2021 correspondiente al décimo segundo mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

Por hechos ajenos al contratista de obra, la interventoría fue adjudicada 3 meses después a la fecha de adjudicación del contrato de obra.

Hasta el 21 de agosto del 2020 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

1. Lo anterior, causo disminución en el tiempo planeado por parte del contratista para la ejecución del contrato de obra, toda vez que la duración inicial del contrato era de siete (7) meses contados desde la fecha de adjudicación, es decir, en el mes de mayo del 2020, y con la firma del acta de inicio disminuyo en aproximadamente cuatro (4) meses.

2. Al inicio de la ejecución del contratista el país ya se encontraba con declaración de emergencia por la pandemia a través de la Resolución 844 de 2020. Lo que dificulto la movilidad y los tiempos de ejecución de las visitas de diagnóstico.

Finalmente, teniendo en cuenta que es necesario realizar acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga del contrato de obra, nos permitimos solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $351.284.787,00. La prórroga en tiempo fue autorizada por el Sena.

Teniendo en cuenta el comunicado del contratista con el que se aprobó la solicitud de prórroga al contrato de obra, esta interventoría se permite solicitar una prórroga al contrato de la referencia por un periodo de tres (03) meses, hasta el día 31 de marzo de 2021.

Lo anterior, considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0690-2079 del 29 de marzo de 2021, a través del cual la interventoría Consorcio Inter INGECO GNG hace llegar el comunicado No. DCS-466-CO1. 2323 del contratista de obra, Consorcio Constructor ALFA, donde esta última, solicita una prórroga al plazo contractual de noventa (90) días, teniendo como fecha de terminación el día 30 de junio de 2021, la interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las visitas realizadas a las sedes en intervención cada una de las Regionales ha presentado nuevas necesidades de actividades a ejecutar.

Que persiste para la Entidad la satisfacción de las necesidades que originaron la suscripción de los contratos, y que la ejecución contractual se ha visto afectada por las situaciones expuestas anteriormente tanto por parte del contratista como por parte de la interventoría, quien avala y aprueba dicha solicitud, el supervisor encuentra necesario acoger esta solicitud, y prorrogar el Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323, y el Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.1636309 el contrato hasta el 30 de junio de 2021.

Atendiendo el comunicado DCS-624-CO1.2323, por medio el Cual el Consorcio Constructor Alfa realiza la Solicitud de prórroga No. 4 por dos (02) meses a su contrato de obra, a partir de la terminación actual del proyecto, argumentado las demoras en la ejecución del proyecto por El tercer pico de la Pandemia, El Paro Nacional y Bloqueos y por los Ajustes a los Presupuesto, una vez revisada la información suministrada por el contratista, nos permitimos precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual, es decir, 30 de Junio de 2021, por lo que esta Interventoría considera procedente la solicitud de prorrogar el Contrato de Obra dos (02) meses, con el fin de dar cumplimiento con el objeto contractual, y se pone a consideración formal de la Entidad.

Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-023-0909-3735 de fecha 11 de Junio de 2021 se aprobó la solicitud de prórroga No. 4 al contrato de obra No CO1.PCCNTR.1552323, basado en los argumentos como el tercer pico de la pandemia, El paro nacional y bloqueos a la movilidad, y el ajuste a presupuestos y aprobación de actividades no previstas; considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra, esta Interventoría se permite solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, dos (02) meses, y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $251.471.964.

Teniendo en cuenta esta situación real y presupuestal del contrato de interventoría, se hace necesario acogerse a la solicitud de esta, realizada mediante CINP-BTA-023-0911- 3744 del 11 de junio de 2021y ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2021.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-1108-5006 de 9 de agosto de 2021 y debido al ajuste presupuestal de acuerdo a las visitas conjuntas con la supervisión del contrato y reuniones en los Departamentos de Cesar, Bolívar, Atlántico, Córdoba y San Andrés que se han efectuado para incluir actividades indispensables se hizo necesario precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual, es decir, 30 de Agosto de 2021, por lo que esta Interventoría considera procedente la solicitud de prorrogar el Contrato de Obra dos (02) meses, con el fin de dar cumplimiento con el objeto contractual, y se pone a consideración formal de la Entidad.

Del mismo modo mediante comunicado CINP-BTA-023-1108-5006 de 9 de agosto de 2021 y teniendo en cuenta que se aprobó la solicitud de prórroga No. 5 al contrato de obra, basado en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir; considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra, esta Interventoría se permite solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, dos (02) meses, y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $251.471.964.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría en las sedes del departamento de Cesar durante el periodo comprendido entre el 12 de julio al 11 de agosto de 2021 correspondiente al décimo segundo mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de

unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020


El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN


Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento del Cesar, en los Municipios de Valledupar (SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores), Valledupar (SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL Diag. 18 No. 28 - 48), Valledupar (SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE, Km 7 Salida La Paz), La Jagua de Ibirico (SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico Transv. 6 Diag. 4 – 105) y Aguachica (SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga)




Grafica 1. Localización de la zona del proyecto

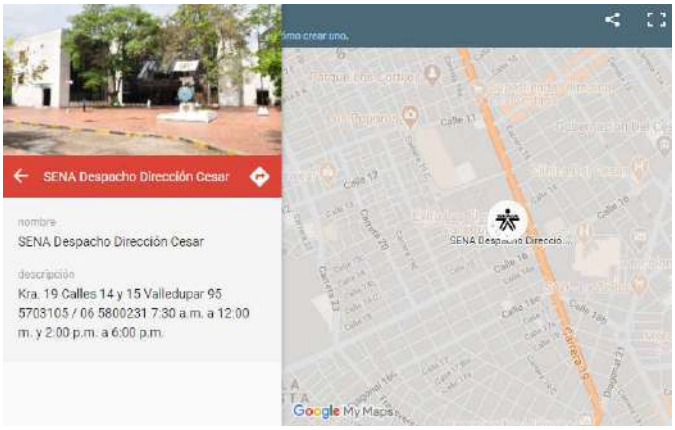


Grafica 2. Localización geográfica del proyecto SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Valledupar

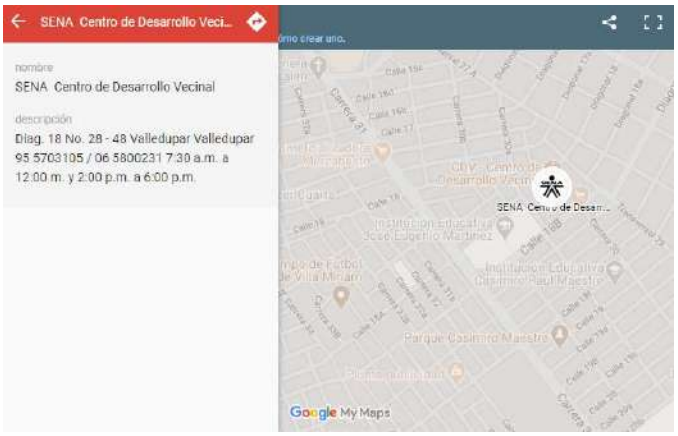


Grafica 3. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV - Valledupar

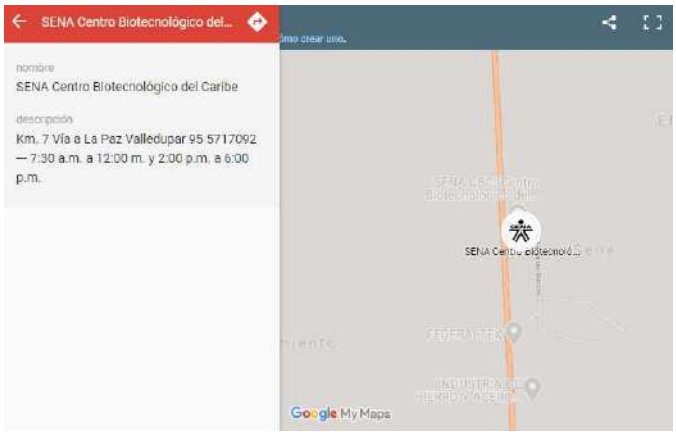

Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE – CBC - Valledupar

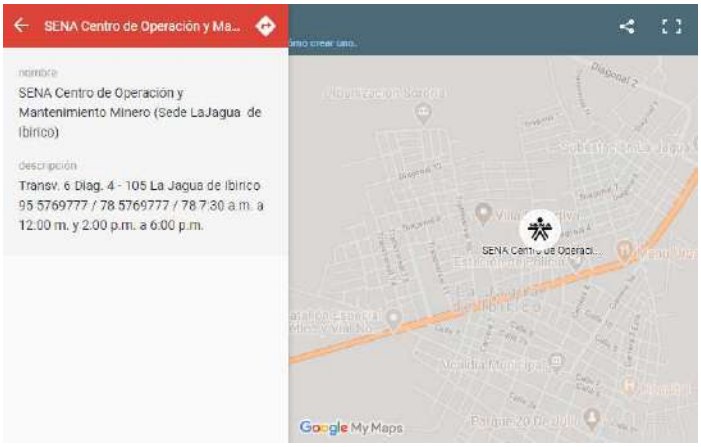

Grafica 5. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico

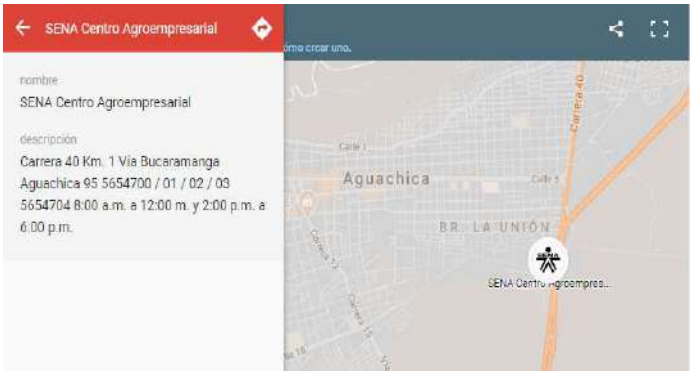

Grafica 6. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE - Aguachica

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Valledupar - SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - COMM, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores. Valledupar - SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, Diag. 18 No. 28 – 48. Valledupar - SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE - CBC, Km 7 Salida La Paz La Jagua de Ibirico - SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico, Transv. 6 Diag. 4 – 105 Aguachica - SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE $501.925.456
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el

	Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	UN (01) MES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	TRES (03) MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	TRES (03) MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 04:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

El valor del contrato de obra No CO1.PCCNTR.1552323 corresponde a la suma de **OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757),** incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el

contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual. Cuya distribución por departamento es la siguiente:

Lote	Regional	Valor regional	Valor lote
Lote 1	Atlántico	$ 1.927.435.510	$ 8.777.298.757
	Bolívar	$ 1.155.028.536	
	Cesar	$ 1.941.943.334	
	Córdoba	$ 1.624.740.669	
	Guajira	$ 763.321.793	
	Magdalena	$ 635.158.598	
	San Andrés	$ 511.782.645	
	Sucre	$ 217.887.672	

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su décimo segundo mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 4.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	25/06/2021	28/02/2022
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		25/06/2021	31/08/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/08/2021	31/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		25/06/2021	28/02/2022
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2021 y el 11 de agosto de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR SEDE A FECHA DE CORTE		
SEDE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO -COMM, VALLEDUPAR	77,65%	38,77%
CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, VALLEDUPAR	100%	93,46%
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – CBC, VALLEDUPAR	100%	55,75%
CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO -COMM, LA JAGUA DE IBIRICO	100%	36,14%
CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE, AGUACHICA	86,14%	46,22%

Semana 47: DEL 12 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1019-4401, Comunicado DCS-678-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. SEBASTIAN SUAZA LIZARAZO c.c. 1.096.229.395 cargo: OFICIAL DE OBRA. 2. VLEYDYS PERDOMO TAFUR c.c. 1.096.236.196 cargo: OFICIAL DE OBRA.

* Mediante oficio Comunicado DCS-682-CO1. 2323, el consorcio Constructor Alfa, remiten ítems no previsto del 431 a 434 correspondientes al departamento de Cesar, para su revisión y aprobación, y de los cuales adjunta: Análisis de precios unitarios en Excel, Especificaciones técnicas, Cotizaciones y acta de aprobación de ítems no previstos.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1029-4481, Comunicado DCS-680-CO1.2323; Relación y documentos del personal Valledupar departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. JOSE JHON CRESPO OSPINO c.c: 1.065.855.359 cargo: AYUDANTE 2. OSWALDO RAFAEL CRESPO OSPINO c.c: 1.065.855.920 cargo: AYUDANTE 3. CARLOS ENRIQUE GAMEZ CARACAS c.c:77.018.735 cargo: OFICIAL 4. LUIS MIGUEL GIRALDO MARTINEZ c.c: 1.065.861.489 cargo: AYUDANTE.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1035-4492, Comunicado DCS-681-CO1.2323; Relación y documentos del personal Valledupar departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. ALBERTO JOSE VILLADIEGO SUAREZ c.c: 1.067.280.698 cargo: AYUDANTE 2. JOSE MIGUEL ORDOÑEZ RIVERA c.c: 73.266.133 cargo: AYUDANTE 3. WALMER JESUS MUÑOZ LOPEZ c.c:1.065.606.354 cargo: AYUDANTE.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1037-4494, Comunicado DCS-682-CO1.2323; Entrega APU No Previstos desde NP431 al NP434, Departamento del Cesar. se remite al ente contratante de los siguientes APU No previstos del NP 431 al NP 434, correspondientes al departamento del Cesar, los cuales se encuentran debidamente revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

* Mediante oficioCINP-BTA-023-1039-4522, Comunicado DCS-693-CO1.2323, Remisión garantías actualizadas contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra. se remite al ente contratante copia de las garantías actualizadas
correspondiente a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra.

* En esta semana continuaron actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continúan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, inician actividades de repotenciación de tubería sanitaria de 6" continuaron actividades de pintura anti hongos para fachadas y pintura tipo 1 para interiores en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron mantenimiento de cerramiento metálico en la sede CAE - Aguachica.

Semana 48: DEL 19 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1047-4583 Reiteración comunicado CINP-BTA-023-0979-4227 Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico, según

prórroga. se le informó a la firma contratista, que aún no tenemos respuesta del comunicado CINP-BTA-023-0979-4227 del 06 de julio de 2021, donde se solicitó al Consorcio Constructor Alfa, realizar los ajustes de la programación de las sedes CDV-Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar, para realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la terminación del proyecto.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1049-4586, Comunicado DCS-690-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. EDUARDO JOSE CANDELARIO DIAZ c.c: 72.216.829 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA sede: TODOS LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, SUCRE, ATLÁNTICO; MAGDALENA; CESAR,
CÓRDOBA, GUAJIRA.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1057-4668, Comunicado DCS-698-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. LUIS BLANCO RODRIGUEZ c.c:7.601.979 cargo: TECNICO EN REFRIGERACION. 2. JAVIER ROMERO VITOLA c.c: 85.476.950 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES 3. NELSON FAJARDO HERNANDEZ c.c: 85.474.511 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES
4. EMIRO GARCIA HERRRERA c.c: 12.563.338 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES. 5. ASIR RODRIGUEZ OSORIO c.c: 1.082.929.756 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES.

* En esta semana continuaron actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continúan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura anti hongos para fachadas y pintura tipo 1 para interiores en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura bajo placa, pintura para fachadas anti hongos en la sede CAE - Aguachica.

Semana 49: DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1065-4721, Comunicado DCS-701-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. LORAINE GRACIELA PEREZ AMAYA c.c: 1.065.825.697 cargo: SISO lugar: TODOS LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR..

* Mediante oficio CINP-BTA-023-1072-4747, Oficio 92021058423; Entrega APU No Previstos NP431-NP434 Lote 1. Por medio del presente y para los fines pertinentes nos permitimos remitirle copia del oficio del asunto con el que la Entidad indica que con el “Acta de mayores y

menores cantidades de obra” (o Acta de modificación de cantidades de obra) no podrán modificarse los montos de los rubros presupuestales establecidos en el contrato de obra, ni los montos de los rubros de inversión determinados en el registro presupuestal, sin previa modificación contractual. De igual manera, remiten el acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada por el equipo SENA, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de éste. Por lo anterior, se solicitan los cronogramas ajustados y actualizados con base en los Ítems no previstos, de la misma manera el balance de obra debidamente suscrito por obra e interventoría.

* En esta semana continuaron actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuaron con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura anti hongos para fachadas en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura para fachadas anti hongos en la sede CAE - Aguachica.

Semana 50: DEL 02 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DE 2021

* El día 03 de agosto de 2021, se remite el balance por cada una de las sedes intervenidas y el consolidado de actas parciales para su revisión y concepto.

En esta semana continuaron actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuaron con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura anti hongos para fachadas en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura bajo placa, pintura para fachadas anti hongos en la sede CAE - Aguachica.

* A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

* A la fecha no ha dado respuesta del oficio CINP-BTA-023-0979-4227, donde se solicitó el ajuste de la Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 38,88% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 77,65% del acumulado y se ha ejecutado 38,77%

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 6,54% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,46%.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 44,25% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 55,75%.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 63,86% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 36,14%.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agro empresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 39,92% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 86,14% del acumulado y se ha ejecutado 46,22%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 46,57%.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra No. 6 y 7 mediante los comunicados *“CINP-BTA-023-0943-3891”. “CINP-BTA-023-0984-4251”,* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero Contratista

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20–20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20–20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21–20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21–20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21–20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
6	21/04/21–20/05/21	$806.299.796	$189.480.452,1	$995.780.248,1	$2.656.616.633,67	$6.120.682.123,3
7	21/05/21–20/06/21	$760.409.199	$178.696.161,4	$939.105.360,4	$3.595.721.994,07	$5.181.576.762,9
TOTALES		**$1.344.806.789**	**$316.029.597,02**	**$1.660.836.385,57**	**$1.660.836.386**	**$7.116.462.371,4**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO MOLINA
3	Residente de Obra	DINA LUZ BARRERA
4	Profesional SST	SERGIO FERNAN ALONSO
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de julio de 2021 y el 11 de agosto de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
	JULIO																			AGOSTO										
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	8	7	7	8		5		8	8	8	8		7	2	7	8	8	8		7	4	2	6	7	8		8	7	5	169
Nublado				1	1			2							1	4	1					1	4	6	2	1			1	3	28
Lluvias intensas																2								0								2
Lluvias moderadas																								1								1
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																3

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Valledupar - SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - COMM, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores. Valledupar - SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, Diag. 18 No. 28 – 48. Valledupar - SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE - CBC, Km 7 Salida La Paz La Jagua de Ibirico - SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico, Transv. 6 Diag. 4 – 105 Aguachica - SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga.
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (251.471.964)
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	QUINCE (15) DÍAS

DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	TRES (03) MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 3:	TRES (03) MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 4:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 4:	31 DE AGOSTO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del undécimo mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 4.

Tabla 6. estado legal del contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VALOR ASEGURADO**	**NUMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				Iniciación	**Terminación**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	01/05/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	14/09/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	30/10/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	28/10/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante los comunicados “CINP-BTA-023-0944-4005; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 6 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, y “CINP-BTA-023-0988-4282; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 6 y 7, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
6	21/04/21-20/05/21	$65.900.447	$12.521.085	$78.421.532	$209.331.550	$482.216.350
7	21/05/21-20/06/21	$148.759.405	$28.264.287	$177.023.692	$386.355.242	$305.192.658
TOTALES		**$324.668.270**	**$61.686.972**	**$386.355.242**	**$386.355.242**	**$305.192.658**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del décimo segundo mes comprendido entre el 12 de julio de 2021 y el 11 de agosto de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JOSE MORALES
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron comités de obra.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de julio de 2021 al 11 de agosto de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (programación y presupuesto).
- Revisión y requerimiento de Pólizas de Garantía presentadas por el contratista.
- Actualización y remisión de Pólizas de Garantía de la interventoría a la suscripción del Acta de Inicio conforme a lo establecidos en los pliegos del contrato.
- Remisión de Enfoque y metodología, programación y Pac de la interventoría conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Gestionamiento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redireccionamiento al SENA, de comunicados presentados por el contratista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados de las actividades en los frentes de trabajo como la poda y corte de árboles, e instalación de manto asfaltico.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Cesar de $1.941.943.334.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 10 Presupuesto por sedes Cesar

SEDE	DIRECCIÓN		VALOR
CENTRO AGROEMPRESARIAL	KR 40 # 11-170 (CARRERA 40 KM 1 VIA BUCARAMANGA)	AGUACHICA	$ 294,674,378.88
CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE	KM 7 SALIDA LA PAZ	VALLEDUPAR	$ 267,312,680.77
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO	TV 6A CON DG 4 -105	JAGUA DE IBIRICO	$ 68,756,078.74
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO	DIAGONAL 18A NO. 29-63	VALLEDUPAR	-
CENTRO DE DESARROLLO VECINAL			$ 101,044,686.74
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO	KR 19 # 14Y 15 -50 BARRIO LAS FLORES	VALLEDUPAR	$ 817,425,460.30
DIRECCION REGIONAL			$ -

De acuerdo al informe semanal N° 50, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE COMM - VALLEDUPAR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 783.898.367,97	77,65%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 391.399.849,75	38,77%
ATRASO		38.885

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CDV - VALLEDUPAR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 124.790.188,12	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 116.627.409,06	93,46%
ATRASO		6.54%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CBC - VALLEDUPAR		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 330.131.160,75	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 184.061.799,10	55,75%
ATRASO		44.255

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE COMM - LA JAGUA DE IBIRICO		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 84.913.757,37	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 30.689.923,71	36,14%
ATRASO		63.865

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CAE - AGUACHICA		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 313.493.772,65	86,14%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 168.218.824,06	46,22%
ATRASO		39.92%

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El avance del Contrato de obra hasta el corte de este Informe presenta una Inversión Programada de $ 1.637.227.246,86 que equivale el 85,57% Vs una Inversión Ejecutada de $ 890.997.805,68 que equivale el 46,57% del presupuesto asignado al Departamento del Cesar, lo que representa un atraso del 39,00% teniendo en cuenta la programación y los presupuestos aprobados para las sedes del departamento del Cesar.

Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.

Se devolvieron el Informe Mensual de Obra No 11 y el Acta de Obra presentados por el Contratista debido que a ambos documentos presentan observaciones y es necesarios sus correcciones para su respectiva aprobación.

Actualmente el contratista ha dado inicio de actividades en todas las 5 sedes, están son: COMM – Valledupar, CDV – Valledupar, CBC – Valledupar, CAE – Aguachica y sede COMM – La Jagua de Ibirico. Pero aún no han implementado los protocolos de bioseguridad de ésta última.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la firma CONSTRUCTOR ALFA, realizar la implementación de los protocolos de bioseguridad en las sedes Centro de Operaciones y Mantenimiento minero COMM – La Jagua de Ibirico.

También se recomienda al Contratista responder los Comunicados enviados por la Interventoría dentro de las fechas establecidas, como también enviar los informes, actas solicitados.

El pasado 30 de junio de 2021, el Consorcio Constructor Alfa mediante comunicado DCS-666-CO1.2323 presentó una nueva programación para las sedes del Lote 1, se pudo evidenciar que para las sedes CDV-Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar, no se realizaron los respectivos ajustes en la programación para dar cumplimiento de las actividades a fecha del 31 de agosto del 2021, Por lo tanto, se le recomienda al Consorcio Alfa realizar los ajustes de la programación de las sedes CDV-Valledupar, CBC-Valledupar y sede COMM-Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar, para realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la terminación del proyecto.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG
Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JULIO AL 11 AGOSTO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8.777.298.757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429.047.013,00	$ 100.826.048,69	$ 529.873.061,69	$ 8.247.425.695,31	$ 529.873.061,69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272.113.036,00	$ 63.946.563,88	$ 336.059.599,88	$ 7.911.366.095,43	$ 865.932.661,57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114.077.060,00	$ 26.808.109,07	$ 140.885.169,00	$ 7.770.480.926,43	$ 1.006.817.830,57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193.777.640,00	$ 45.537.746,00	$ 239.315.386,00	$ 7.531.165.540,43	$ 1.246.133.216,57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335.792.040,00	$ 78.911.129,38	$ 414.703.169,00	$ 7.116.462.371,43	$ 1.660.836.385,57
6	21 Abr 20 May	$ 806.299.796,00	$ 189.480.452,10	$ 995.780.248,10	$ 6.120.682.123,33	$ 2.656.616.633,67
7	21 May 20 Jun	$ 760.409.199,00	$ 178.696.161,40	$ 939.105.360,40	$ 5.181.576.762,93	$ 3.595.721.994,07
TOTALES		**$ 2.911.515.784,00**	**$ 684.206.210,52**	**$ 3.595.721.994,07**	**$ 5.181.576.763**	**$ 3.595.721.994**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12/07/2021 AL 11/08/2021

FECHA	JULIO																			AGOSTO											OBSERVACIONES	
CARGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
COORDINADOR TÉCNICO - **DINA LUZ BARRERA**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																	
PROFESIONAL SOCIAL -																																	
AYUDANTES																																	
OPERADORES DE MAQUINARIA																																	
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																	
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**78**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR DE LA HOZ HERNADEZ **PERIODO:** 12 de Julio de 2021 y el 11 de Agosto de 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	JULIO																			AGOSTO										
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	8	7	7	8		5		8	8	8	8		7	2	7	8	8	8		7	4	2	6	7	8		8	7	5	169
Nublado				1	1			2							1	4	1					1	4	6	2	1				1	3	28
Lluvias intensas																2								0								2
Lluvias moderadas																								1								1
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																3

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JULIO AL 11 AGOSTO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	$ 691.547.900,00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35.100.414,00	$ 6.669.079,00	$ 41.769.493			$ 649.778.407,00	$ 41.769.493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22.257.382,00	$ 4.228.903,00	$ 26.486.285			$ 623.292.122,00	$ 68.255.778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9.356.236,00	$ 1.777.685,00	$ 11.133.921			$ 612.158.201,00	$ 79.389.699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15.864.923,00	$ 3.014.335,00	$ 18.879.258			$ 593.278.943,00	$ 98.268.957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27.429.463,00	$ 5.211.598,00	$ 32.641.061			$ 560.637.882,00	$ 130.910.018
6	21 Abril 20 May	$ 65.900.447,00	$ 12.521.085,00	$ 78.421.532			$ 482.216.350,00	$ 209.331.550
7	21 May 20 Jun	$ 148.759.405,00	$ 28.264.287,00	$ 177.023.692			$ 305.192.658,00	$ 386.355.242
TOTALES		**$ 324.668.270,00**	**$ 61.686.972,00**	**$ 386.355.242,00**			**$ 305.192.658,00**	$ 386.355.242,00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 JULIO AL 11 AGOSTO 2021

FECHA / CARGO	MAYO																				JUNIO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **JOSE MORALES**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7805125014**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1075298525

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERTH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.408.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7804994973**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1075283190

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.300	$ 0	$ 291.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.395.300	$ 0	$ 0	$ 157.200	$ 157.200	$ 0	$ 0	$ 5.709.700	$ 0	$ 5.709.700
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
SUBTOTALES:										**$ 7.730.800**	**$ 0**	**$ 7.730.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 278.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.300	$ 0	$ 0	$ 3.249.300
SUBTOTALES:													**$ 3.985.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.985.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 396.100	$ 396.100	$ 0	$ 0	$ 396.100
SUBTOTALES:									**$ 396.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 396.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.863.500	$ 0	$ 1.863.500
SUBTOTALES:			**$ 1.863.500**	**$ 0**	**$ 1.863.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES							
																												PENSIÓN									SALUD								ARP																			
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI														01-06					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	6	$ 294.736	$ 11.800	$ 0	$ 11.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 294.736		$ 0	6	$ 294.736	CCF24-COMPENSAR	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	24	$ 1.178.944	$ 47.200	$ 0	$ 47.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	24	$ 1.178.944		$ 82.100	24	$ 1.178.944	CCF24-COMPENSAR	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
4	CC 38465287	MOSQUERA BARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
7	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.961.500	$ 1.113.900	$ 34.900	$ 34.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.183.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.961.500	$ 278.500	$ 0	$ 278.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.961.500		$ 36.400	30	$ 6.961.500	CCF24-COMPENSAR	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7804994973**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1075283190

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD								ARP														
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI														21-30				230301-PORVENIR	10	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 24.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 606.667		$ 0	10	$ 606.667	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	20	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.200	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 48.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 1.213.334		$ 84.500	20	$ 1.213.334	CCF24-COMPENSAR	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.209.400**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7805123941**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1075295454

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	13	$ 5.298.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.298.500	$ 0	$ 5.298.500
230201	230201- PROTECCION	2	$ 785.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	$ 825.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.260.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 2.307.400	$ 0	$ 2.307.400
SUBTOTALES:										**$ 8.431.300**	**$ 0**	**$ 8.431.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 204.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 264.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.400	$ 0	$ 0	$ 291.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 368.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.700	$ 0	$ 0	$ 368.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 645.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.100	$ 0	$ 0	$ 645.100
SUBTOTALES:													**$ 2.086.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.086.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No, COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.548.800	$ 2.548.800	$ 0	$ 0	$ 2.548.800
SUBTOTALES:									**$ 2.548.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.548.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No, COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	12	$ 1.194.200	$ 0	$ 1.194.200
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 408.000	$ 0	$ 408.000
SUBTOTALES:			**$ 2.086.200**	**$ 0**	**$ 2.086.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI							01-30											230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1018493401	SANDOVAL RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7805123941**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1075295454

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																											PENSIÓN									SALUD									ARP																						
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.958.000	$ 473.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.958.000	$ 118.400	$ 0	$ 118.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.958.000		$ 15.500	30	$ 2.958.000	CCF24-COMPENSAR	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000		$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1143169144	PEREZ BARRAGAN GERMAN GUSTAVO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000		$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.600.000		$ 250.600	30	$ 3.600.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 76328109	GALLEGO SOTELO PABLO EMILIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI	01	30																230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.600.000		$ 181.000	30	$ 2.600.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.152.500**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/07/2021	CINP-BTA-023-1000-4351	Informes semanales No. 45, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1001-4366	Informes semanales No. 43, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1002-4367	Observaciones a la actividad NP-10.297; Suministro e instalación de manto asfaltico: Manto Poliester aluminio de 3mm de espesor (incluye aplicación pigmento reflectivo de aluminio) en cubierta del bloque Hotel escuela sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1003-4368	Oficio 92021054213; Entrega APU No Previstos NP423-NP430 Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1004-4369	Oficio 92021054194; Pólizas actualizadas contra modificación No. 4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1005-4370	Oficio 9-2021-054188; Comunicado DCS-618-CO1.2323; Solicitud de pago facturas de fecha 10 de mayo de 2021.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1006-4371	Oficio 92021054183; Reiteración de solicitud comunicado DCS-623-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0861-3456; Informe de aplicación del protocolo de bioseguridad en CCIT de Montería	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1007-4372	Oficio 92021054183; Reiteración de solicitud comunicado DCS-623-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0861-3456; Informe de aplicación del protocolo de bioseguridad en CCIT de Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1008-4373	Comunicado DCS-670-CO1.2323; Solicitud permiso instalación de cubierta en la garita sede Ternera Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1009-4374	Comunicado DCS-676-CO1.2323, Informe técnico tablero general SENA seccional Banco Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/07/2021	CINP-BTA-023-1010-4375	Correo electrónico; Hundimiento Cubierta Fruver Centro CABP - El Porvenir Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1011-4389	Correo electrónico; Ejecución de contrato de mantenimiento Centro Agroempresarial y Minero regional del Departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1012-4391	Correo electrónico; Ejecución contrato de mantenimiento Centro comercio y servicios regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1013-4394	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de Córdoba	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1014-4395	Comunicado DCS-674-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0978-4224; Informes SST No. 7, 8 y 9 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1015-4396	Comunicado DCS-674-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0978-4224; Informes SST No. 6 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1016-4397	Comunicado DCS-674-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0978-4224; Informes Ambientales No. 8 y 9 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1017-4399	Trabajos en cafetería tercer piso, sede Comercio y Servicios, Barranquilla-Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1018-4400	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1019-4401	Comunicado DCS-678-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1020-4404	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de SUCRE Y BOLIVAR.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1021-4407	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1022-4410	Comunicado DCS-679-CO1.2323; Relación y documentos del personal, impermeabilización departamento de Bolívar y Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1023-4411	Correo electrónico; Retrasos en las actividades electicas en las sedes de la Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1024-4415	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento del Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1025-4416	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de la Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/07/2021	CINP-BTA-023-1026-4430	Correo electrónico; Observaciones Sistemas Eléctricos sede Comercio y Servicios – Riohacha, Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/07/2021	CINP-BTA-023-1027-4472	Informes semanales No. 45, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/07/2021	CINP-BTA-023-1030-4483	Comunicado DCS-674-CO1. 2323- Respuesta a CINP-BTA-023-0978-4224, Aprobación de informe PMA No. 8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/07/2021	CINP-BTA-023-1034-4489	Solicitud copia pólizas actualizadas contra modificación No. 5-Prórroga No. 4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15/07/2021	CINP-BTA-023-1035-4492	Comunicado DCS-681-CO1.2323; Relación y documentos del personal Valledupar departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/07/2021	CINP-BTA-023-1036-4493	Comunicado DCS-686-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/07/2021	CINP-BTA-023-1037-4494	Comunicado DCS-682-CO1.2323; Entrega APU No Previstos desde NP431 al NP434, Departamento del Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/07/2021	CINP-BTA-023-1038-4518	Informes semanales No. 44, Bolívar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/07/2021	CINP-BTA-023-1039-4522	Comunicado DCS-693-CO1.2323, Remisión garantías actualizadas contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/07/2021	CINP-BTA-023-1040-4527	Comunicado DCS-688-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-1015-4396; Informe SST No.6 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/07/2021	CINP-BTA-023-1041-4529	Comunicado DCS-692-CO1.2323, Solicitud Actas de aprobación de ítems no previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/07/2021	CINP-BTA-023-1042-4538	Informes semanales No. 44, Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/07/2021	CINP-BTA-023-1043-4539	Comunicado DCS-694-CO1.2323, Remisión garantías actualizadas contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/07/2021	CINP-BTA-023-1044-4544	Informes semanales No. 45, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/07/2021	CINP-BTA-023-1045-4570	Informes semanales No. 46, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1046-4581	Informes semanales No. 45, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1047-4583	Reiteración oficio CINP-BTA-023-0979-4227 Programación sedes CDV-Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico, según prórroga.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1048-4584	Comunicado DCS-695-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1049-4586	Comunicado DCS-690-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1050-4587	Comunicado DCS-691-CO1. 2323: Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1015-4396 informe SST No 8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1051-4588	Comunicado DCS-691-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-0231014-4395, Aprobación informe mensual SST No. 7, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1052-4592	Correo electrónico; Reporte de Actividades de Mantenimiento Pendientes Sede Ppal, Lorica Y San Jorge.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1053-4593	Correo electrónico; Situación Manteamiento General de las Sedes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/07/2021	CINP-BTA-023-1054-4605	Informes semanales No. 46, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/07/2021	CINP-BTA-023-1055-4624	Correo electrónico; Observaciones sede GAIRA Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
22/07/2021	CINP-BTA-023-1056-4625	Correo electrónico, solicitud copia derecho de petición del Señor Danny Julián Quintana Torres.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/07/2021	CINP-BTA-023-1057-4668	Comunicado DCS-698-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
23/07/2021	CINP-BTA-023-1058-4669	Correo electrónico, certificación afiliación ARL Señor Eduardo José Candelario Diaz.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
23/07/2021	CINP-BTA-023-1059-4670	Correo electrónico; Solicitud información del personal vacunado contra el COVID- 19, pendiente por vacunación y el que no contempla vacunarse.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/07/2021	CINP-BTA-023-1060-4671	Comunicado DCS-696-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
23/07/2021	CINP-BTA-023-1061-4674	Reiteración solicitud comunicado CINP-BTA-023-0935-4143; presupuesto San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/07/2021	CINP-BTA-023-1062-4699	Informes semanales No. 47, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
26/07/2021	CINP-BTA-023-1063-4718	Informes semanales No. 47, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
26/07/2021	CINP-BTA-023-1064-4720	Comunicado DCS-700-CO1.2323 Cronograma de lavado de tanques Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
26/07/2021	CINP-BTA-023-1065-4721	Comunicado DCS-701-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
26/07/2021	CINP-BTA-023-1066-4722	Comunicado DCS-697-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
26/07/2021	CINP-BTA-023-1067-4724	Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
26/07/2021	CINP-BTA-023-1068-4725	Comunicado DCS-697-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/07/2021	CINP-BTA-023-1069-4741	Oficio NIS 2021-01-239637 radicado 92021058191, cargue de pólizas SECOP II, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
27/07/2021	CINP-BTA-023-1070-4742	Oficio NIS 2021-01-252426 radicado 92021058192, cargue de pólizas SECOP II, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/07/2021	CINP-BTA-023-1071-4745	Comunicado DCS-702-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
27/07/2021	CINP-BTA-023-1072-4747	Oficio 92021058423; Entrega APU No Previstos NP431-NP434 Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/07/2021	CINP-BTA-023-1073-4758	Comunicado DCS-705-CO1.2323, Respuesta Oficio NIS 2021-01-252426 radicado 92021058192, cargue de pólizas SECOP II, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
28/07/2021	CINP-BTA-023-1074-4759	Comunicado DCS-704-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
28/07/2021	CINP-BTA-023-1075-4760	Comunicado DCS-703-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.
28/07/2021	CINP-BTA-023-1076-4785	Reiteración solicitud comunicados CINP-BTA-023-0935-4143 y CINP-BTA-023-1061-4674; Presupuesto actualizado San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/07/2021	CINP-BTA-023-1077-4790	Trabajos en cafetería 3er piso, sede Comercio y Servicios, Barranquilla-Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/07/2021	CINP-BTA-023-1078-4799	Comunicado DCS-706-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/07/2021	CINP-BTA-023-1079-4807	Informe Mensual No. 11, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/07/2021	CINP-BTA-023-1080-4822	Informe Mensual No. 11, San Andrés y Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/07/2021	CINP-BTA-023-1081-4830	Informes semanales No. 48, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/07/2021	CINP-BTA-023-1081-4831	Comunicado DCS-699-CO1.2323; Respuesta Comunicado CINP-BTA-023-1050-4587, Aprobación informe mensual SST No. 8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1083-4847	Informes semanales No. 47, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1084-4848	Informes semanales No. 48, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1085-4849	Informes semanales No. 48, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1086-4852	Comunicado DCS-707-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1087-4853	Correo electrónico; Reiteración de Situación Manteamiento General de las Sedes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1088-4855	Correo electrónico; Derecho de petición Julián Quintana Torres - Construcciones T&H S.A.S.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1089-4857	Correo electrónico; Solicitud de información contratos mantenimiento regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
2/08/2021	CINP-BTA-023-1090-4869	Informe Mensual No. 11, Guajira y Magdalena, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1091-4905	Correo electrónico, Solicitud información Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1092-4910	Comunicado DCS-709-CO1.2323; Informe Técnico de Obra – daños por lluvia ocasionados sede CCAG -Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1093-4913	Correo electrónico; Daños en techo sala TIC por humedad Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, sede Fundación - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1094-4915	Comunicado DCS-710-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/08/2021	CINP-BTA-023-1095-4916	Suministro e instalación de cielo raso en aulas piso 2 en sede Industrial y Aviación, Barranquilla – Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1096-4918	Correo electrónico; Observaciones sedes Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/08/2021	CINP-BTA-023-1097-4925	Comunicado DCS-708-CO1.2323, Corte de Obra No. 8 y acta de bioseguridad No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/08/2021	CINP-BTA-023-1098-4955	Correo electrónico, Puesta en Funcionamiento Motobombas Sede Principal Montería	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/08/2021	CINP-BTA-023-1099-4979	Informe mensual No. 11, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/08/2021	CINP-BTA-023-1100-4981	Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/08/2021	CINP-BTA-023-1101-4984	Informes semanales No. 49, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1102-4990	Informes semanales No. 49, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1103-4992	Informes semanales No. 47, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1104-5002	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento de la Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1105-5003	Reiteración atraso en el inicio de las actividades en las sedes del departamento del Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1106-5004	Correo electrónico; Mantenimiento Planta De Procesamiento De Alimentos CAAG - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1107-5005	Comunicado DCS-712-CO1.2323; Informe Técnico de Obra – daños en sede FGTM2 Fundación – Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1108-5006	Comunicado DCS-713-CO1.2323; Solicitud prórroga No. 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1109-5007	Solicitud prórroga No. 5 y adición, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1110-5008	Correo electrónico; Reiteración de Situación Manteamiento General de las Sedes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
9/08/2021	CINP-BTA-023-1111-5014	Reiteración Solicitud Actas de aprobación de ítems no previstos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/08/2021	CINP-BTA-023-1112-5023	Oficio 92021061292; Reiteración comunicados CINP-BTA-023-0861-3456 y CINP-BTA-023-1007-4372; Informe de aplicación del protocolo de bioseguridad en CCIT de Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/08/2021	CINP-BTA-023-1113-5024	Correo electrónico; Tuberías Motobombas Sede Principal Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/08/2021	CINP-BTA-023-1114-5026	Correo electrónico; Sistema Contra Incendio - Edificio Administrativa Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/08/2021	CINP-BTA-023-1115-5034	Acta de terminación de contrato con la empresa Unión Temporal XSLC.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
11/08/2021	CINP-BTA-023-1116-5058	Correo electrónico; Falta de actividades Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

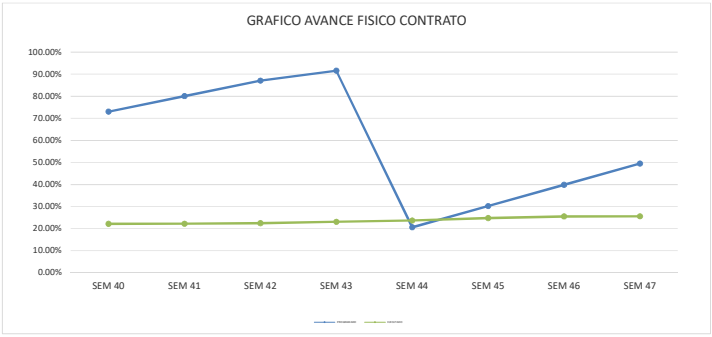


$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	73.05%	22.19%	-50.87%
SEM 41	80.07%	22.25%	-57.81%
SEM 42	87.08%	22.44%	-64.64%
SEM 43	91.58%	23.07%	-68.51%
SEM 44	20.60%	23.67%	3.07%
SEM 45	30.26%	24.77%	-5.49%
SEM 46	39.86%	25.55%	-14.31%
SEM 47	49.46%	25.59%	-23.87%
	ALERTAS		-23.87%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

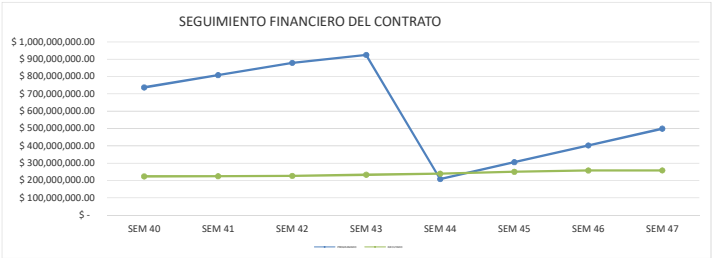

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	$ 737,473,755.60	$ 223,978,013.44	$ -513,495,742
SEM 41	$ 808,273,852.65	$ 224,633,854.26	$ -583,639,998
SEM 42	$ 879,073,949.69	$ 226,509,927.69	$ -652,564,022
SEM 43	$ 924,549,185.07	$ 232,928,127.97	$ -691,621,057
SEM 44	$ 207,945,780.98	$ 238,969,951.70	$ 31,024,171
SEM 45	$ 305,450,342.40	$ 250,054,556.91	$ -55,395,785
SEM 46	$ 402,386,052.95	$ 257,933,297.77	$ -144,452,755
SEM 47	$ 499,321,763.49	$ 258,299,787.72	$ -241,021,976

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**1/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**10.00**	**-10.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	29/06/2021		**25.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/04/2021		17/08/2021		**-107.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	**29.00**	**311.00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		10/07/2021		**-107.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	2/04/2021		31/07/2021		**-107.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/06/2021		19/07/2021		**-47.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	19/07/2021		**-2.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	19/07/2021	22/10/2020	**-27.00**	**270.00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		25/08/2021		**-107.00**	
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	25/08/2021		**-43.00**	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-56.00**	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	25/08/2021		**-11.00**	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	25/08/2021		**2.00**	
8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	4/03/2021	27/04/2021	25/08/2021		**-54.00**	
8.71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS	2/04/2021	4/05/2021	25/08/2021		**-32.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	2/04/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-3.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	29/06/2021		**-18.00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	2/04/2021		23/08/2021		**-107.00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.	2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31.00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED	2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31.00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN	2/04/2021	7/04/2021	23/08/2021		**-5.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
4	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
8	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
9	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

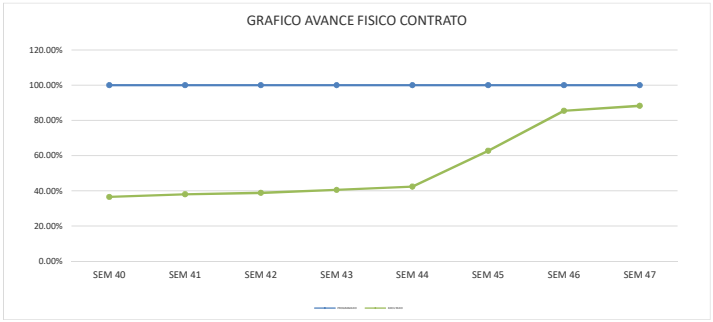


$ 124,790,188.12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	100.00%	36.57%	-63.43%
SEM 41	100.00%	38.04%	-61.96%
SEM 42	100.00%	38.88%	-61.12%
SEM 43	100.00%	40.56%	-59.44%
SEM 44	100.00%	42.44%	-57.56%
SEM 45	100.00%	62.79%	-37.21%
SEM 46	100.00%	85.44%	-14.56%
SEM 47	100.00%	88.31%	-11.69%
	ALERTAS		-11.69%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

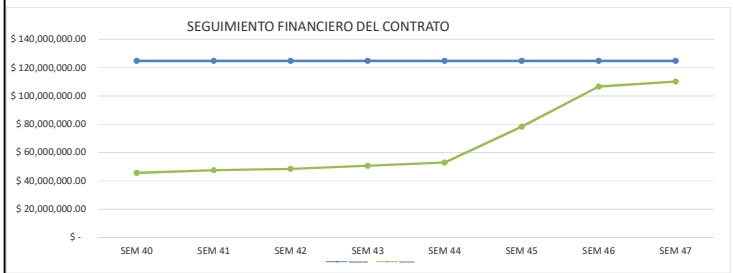

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	$ 124,790,188.12	$ 45,639,225.28	$ -79,150,963
SEM 41	$ 124,790,188.12	$ 47,473,583.13	$ -77,316,605
SEM 42	$ 124,790,188.12	$ 48,522,937.93	$ -76,267,250
SEM 43	$ 124,790,188.12	$ 50,617,621.43	$ -74,172,567
SEM 44	$ 124,790,188.12	$ 52,963,666.95	$ -71,826,521
SEM 45	$ 124,790,188.12	$ 78,357,366.45	$ -46,432,822
SEM 46	$ 124,790,188.12	$ 106,624,766.80	$ -18,165,421
SEM 47	$ 124,790,188.12	$ 110,204,854.95	$ -14,585,333

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/06/2021		**-69.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		29/06/2021		**-78.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	29/06/2021		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-20.00**	**250.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	29/06/2021		**-48.00**	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-69.00**	
8.75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	29/06/2021		**-91.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-54.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-11.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		29/06/2021		**-69.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
5	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

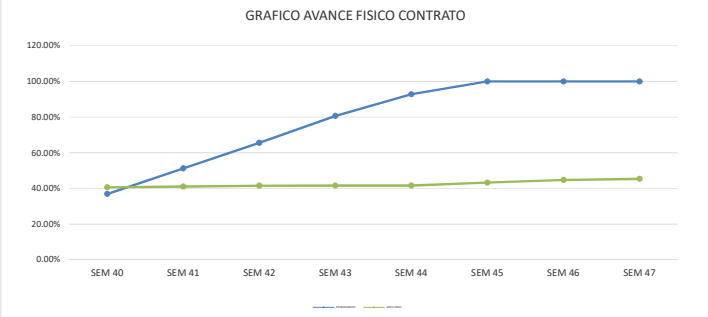


$ 330,131,160.75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	36.93%	40.65%	3.72%
SEM 41	51.26%	41.03%	-10.23%
SEM 42	65.59%	41.54%	-24.05%
SEM 43	80.65%	41.60%	-39.05%
SEM 44	92.82%	41.66%	-51.16%
SEM 45	100.00%	43.25%	-56.75%
SEM 46	100.00%	44.78%	-55.22%
SEM 47	100.00%	45.40%	-54.60%
	ALERTAS		-54.60%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

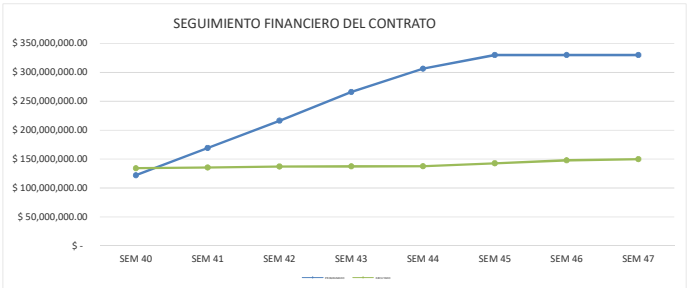

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	$ 121,914,712.13	$ 134,189,308.62	$ 12,274,596
SEM 41	$ 169,222,575.79	$ 135,449,811.37	$ -33,772,764
SEM 42	$ 216,530,439.44	$ 137,125,558.17	$ -79,404,881
SEM 43	$ 266,238,848.93	$ 137,335,026.52	$ -128,903,822
SEM 44	$ 306,431,486.39	$ 137,544,494.87	$ -168,886,992
SEM 45	$ 330,131,160.75	$ 142,781,203.62	$ -187,349,957
SEM 46	$ 330,131,160.75	$ 147,845,729.39	$ -182,285,431
SEM 47	$ 330,131,160.75	$ 149,887,846.35	$ -180,243,314

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	24/05/2021		29/06/2021		**-55.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	14/06/2021		29/06/2021		**-34.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	29/06/2021		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	1/06/2021		29/06/2021		**-47.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	29/06/2021		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-19.00**	**250.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	29/06/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-107.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	29/06/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021	29/06/2021			
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	29/06/2021		**-37.00**	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/05/2021		29/06/2021		**-48.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHULIET PAOLA CORRO UCROS		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
5	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

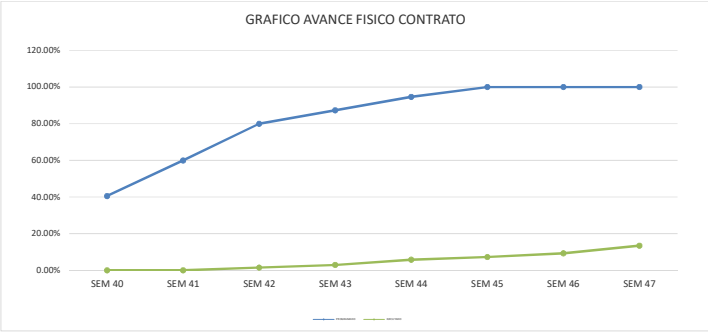


$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	40.53%	0.00%	-40.53%
SEM 41	59.92%	0.00%	-59.92%
SEM 42	79.96%	1.45%	-78.50%
SEM 43	87.31%	2.91%	-84.40%
SEM 44	94.66%	5.82%	-88.85%
SEM 45	100.00%	7.27%	-92.73%
SEM 46	100.00%	9.31%	-90.69%
SEM 47	100.00%	13.42%	-86.58%
	ALERTAS		-86.58%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

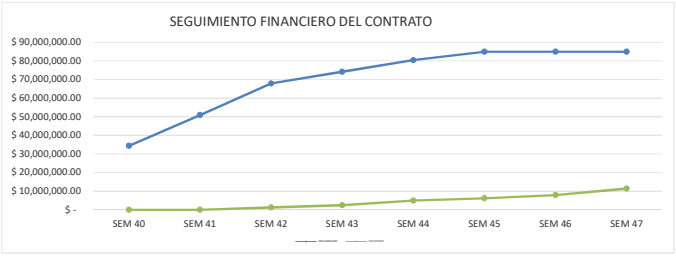

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	$ 34,415,911.84	$ -	$ -34,415,912
SEM 41	$ 50,884,313.95	$ -	$ -50,884,314
SEM 42	$ 67,895,490.33	$ 1,235,000.00	$ -66,660,490
SEM 43	$ 74,139,379.72	$ 2,470,000.00	$ -71,669,380
SEM 44	$ 80,383,269.10	$ 4,940,000.00	$ -75,443,269
SEM 45	$ 84,913,757.37	$ 6,175,000.00	$ -78,738,757
SEM 46	$ 84,913,757.37	$ 7,904,000.00	$ -77,009,757
SEM 47	$ 84,913,757.37	$ 11,396,649.36	$ -73,517,108

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/05/2021		29/06/2021		-62.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/05/2021		29/06/2021		-55.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/06/2021		29/06/2021		-41.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	7/06/2021		29/06/2021		-41.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	14/06/2021		29/06/2021		-34.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31/05/2021		29/06/2021		-48.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/05/2021		29/06/2021		-48.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	17/05/2021		29/06/2021		-62.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

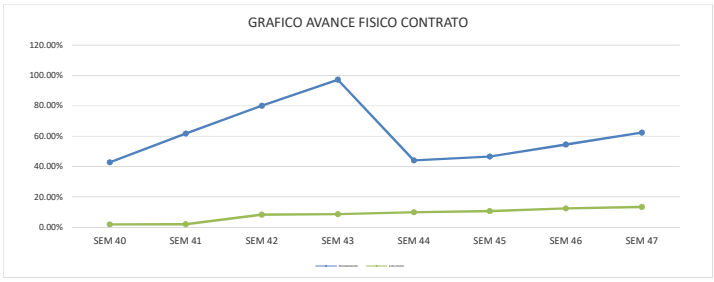


$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	42.79%	1.88%	-40.91%
SEM 41	61.82%	1.98%	-59.84%
SEM 42	80.07%	8.31%	-71.77%
SEM 43	97.27%	8.68%	-88.59%
SEM 44	44.04%	9.88%	-34.15%
SEM 45	46.59%	10.70%	-35.89%
SEM 46	54.51%	12.47%	-42.04%
SEM 47	62.42%	13.34%	-49.08%
	ALERTAS		-49.08%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

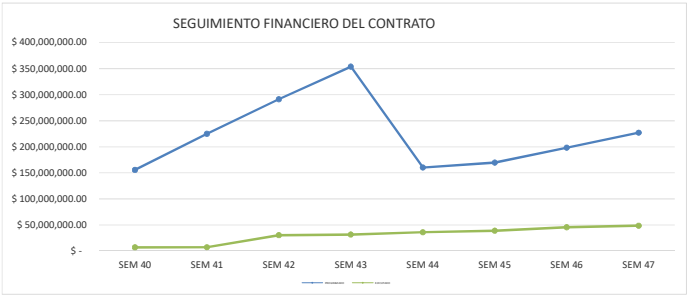

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	$ 155,718,627.66	$ 6,835,063.04	$ -148,883,565
SEM 41	$ 224,981,406.30	$ 7,213,639.94	$ -217,767,766
SEM 42	$ 291,410,436.27	$ 30,227,412.93	$ -261,183,023
SEM 43	$ 353,992,445.25	$ 31,599,133.61	$ -322,393,312
SEM 44	$ 160,257,719.00	$ 35,969,144.06	$ -124,288,575
SEM 45	$ 169,555,431.59	$ 38,948,970.58	$ -130,606,461
SEM 46	$ 198,377,808.76	$ 45,399,227.38	$ -152,978,581
SEM 47	$ 227,156,799.74	$ 48,534,001.94	$ -178,622,798

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		17/07/2021		-79.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		29/06/2021		-69.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		21/08/2021		-62.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		29/06/2021		-69.00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		26/08/2021		-62.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		29/06/2021		-69.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		25/08/2021		-55.00	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11.00	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		14/08/2021		-55.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		20/08/2021		-69.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	HECTOR GARCIA BALLESTA		
5	AYUDANTE	ISMAEL ALFARO LOPEZ		
6	AYUDANTE	WILSON LEON ROMERO		

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**44**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1019-4401 , Comunicado DCS-678-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. se remiteal ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. SEBASTIAN SUAZA LIZARAZO c.c. 1.096.229.395 cargo:OFICIAL DE OBRA. 2. VLEYDYS PERDOMO TAFUR c.c. 1.096.236.196 cargo: OFICIAL DE OBRA.

Mediante oficio Comunicado DCS-682-CO1. 2323, el consorcio Contructor Alfa, remiten ítems no previsto del 431 a 434 correspondientes al departamento de Cesar, para su revisión y aprobación, y de los cuales adjunta: Análisis de precios unitarios en Excel, Especificaciones técnicas, Cotizaciones y acta de aprobación de ítems no previstos.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1029-4481, Comunicado DCS-680-CO1.2323; Relación y documentos del personal Valledupar departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. JOSE JHON CRESPO OSPINO c.c: 1.065.855.359 cargo: AYUDANTE 2. OSWALDO RAFAEL CRESPO OSPINO c.c: 1.065.855.920 cargo: AYUDANTE 3. CARLOS ENRIQUE GAMEZ CARACAS c.c:77.018.735 cargo: OFICIAL 4. LUIS MIGUEL GIRALDO MARTINEZ c.c: 1.065.861.489 cargo: AYUDANTE

Mediante oficio CINP-BTA-023-1035-4492, Comunicado DCS-681-CO1.2323; Relación y documentos del personal Valledupar departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas:
1. ALBERTO JOSE VILLADIEGO SUAREZ c.c: 1.067.280.698 cargo: AYUDANTE 2. JOSE MIGUEL ORDOÑEZ RIVERA c.c: 73.266.133 cargo: AYUDANTE 3. WALMER JESUS MUÑOZ LOPEZ c.c:1.065.606.354 cargo: AYUDANTE

Mediante oficio CINP-BTA-023-1037-4494, Comunicado DCS-682-CO1.2323; Entrega APU No Previstos desde NP431 al NP434, Departamento del Cesar. se remite al ente contratante de los siguientes APU No previstos del NP 431 al NP 434, correspondientes al departamento del Cesar, los cuales se encuentran debidamente revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

Mediante oficioCINP-BTA-023-1039-4522, Comunicado DCS-693-CO1.2323, Remisión garantías actualizadas contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra. se remite al ente contratante copia de las garantías actualizadas correspondiente a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contra modificación No. 5 (Prórroga No. 4) de su Contrato de Obra.

En esta semana continuan actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, ininian actividades de repotenciación de tubería sanitaria de 6" continuaron actividades de pintura antihongos para fachadas y pintura tipo 1 para interiores en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron mantenimiento de cerramiento metálico en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no ha dado respuesta del oficio CINP-BTA-023-0979-4227, donde se solicita el ajuste de la Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 23,87% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 49,46% del acumulado y se ha ejecutado 25,59%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 11,69% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 88,31%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 54,60% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 45,40%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 86,58% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 13,42%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 49,08% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 62,42% del acumulado y se ha ejecutado 13,34%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 30,23%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	14	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	**Hasta**	**No. Informe**	**Fecha entrega**	**Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES**
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	En esta semana la sede CDV - Valledupar, debería estar ejecutada el 100% según la programación aprobada, y solamente se ha ejecutado 36,57%
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	8-jun	Se iniciaron labores de demolición, suministro e instalación de cerámica para piso de baños en el COMM-Valledupar.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	15-jun	Inicio de actividades de rocería en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Inicio de pañete impermeabilizado sobre muro sede COMM - Valledupar.
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se suscribe otro si # 4 al contrato de obra y al contrato de Interventoría con fecha del 26 de Junio de 2021 - fecha de terminación actual 31 de Agosto de 2021.
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	6-jul	Lavado de tanques plásticos en sede CBC - Valledupar.
5/07/2021	11/07/2021	SEMANA No. 46	12-jul	Mantenimiento de cuerta en teja de barro, sede CDV - Valledupar.
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

DIECINUEVE	19	dias del mes de	JULIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Mantenimiento en cubierta, teja de barro



Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Mantenimiento en cubierta, teja de barro



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Pañete impermeabilizado sobre muro



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura antihongos para fachada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	47	DEL	12 de julio de 2021	AL	18 de julio de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Instalación tubería sanitaria de 6"



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo 1





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Mantenimiento cerramiento metálico





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Rocería

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

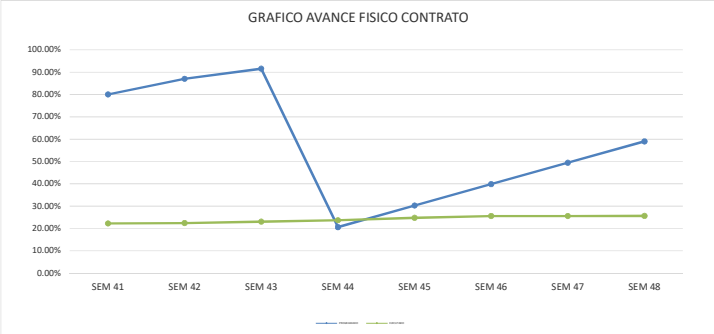


$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	80.07%	22.25%	-57.81%
SEM 42	87.08%	22.44%	-64.64%
SEM 43	91.58%	23.07%	-68.51%
SEM 44	20.60%	23.67%	3.07%
SEM 45	30.26%	24.77%	-5.49%
SEM 46	39.86%	25.55%	-14.31%
SEM 47	49.46%	25.59%	-23.87%
SEM 48	59.04%	25.62%	-33.41%
ALERTAS			-33.41%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

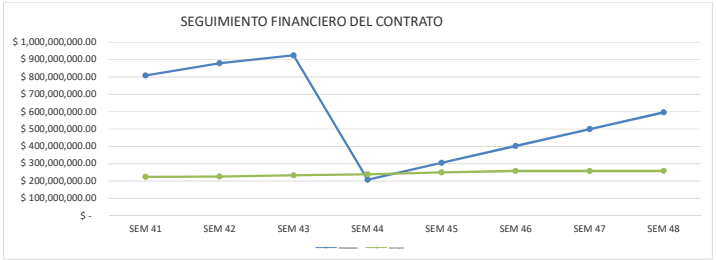

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	$ 808,273,852.65	$ 224,633,854.26	$ -583,639,998
SEM 42	$ 879,073,949.69	$ 226,509,927.69	$ -652,564,022
SEM 43	$ 924,549,185.07	$ 232,928,127.97	$ -691,621,057
SEM 44	$ 207,945,780.98	$ 238,969,951.70	$ 31,024,171
SEM 45	$ 305,450,342.40	$ 250,054,556.91	$ -55,395,785
SEM 46	$ 402,386,052.95	$ 257,933,297.77	$ -144,452,755
SEM 47	$ 499,321,763.49	$ 258,299,787.72	$ -241,021,976
SEM 48	$ 596,006,159.25	$ 258,683,366.37	$ -337,322,793

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	29/06/2021		25.00	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/04/2021		17/08/2021		-114.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	29.00	311.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		10/07/2021		-114.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	2/04/2021		31/07/2021		-114.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/06/2021		19/07/2021		-54.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	19/07/2021		-2.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	19/07/2021	22/10/2020	-27.00	270.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL		25 de julio de 2021			
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**			2/04/2021		25/08/2021		**-114.00**	
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)			8/02/2021	23/03/2021	25/08/2021		**-43.00**	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS			8/02/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-56.00**	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)			18/02/2021	1/03/2021	25/08/2021		**-11.00**	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA			3/03/2021	1/03/2021	25/08/2021		**2.00**	
8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO			4/03/2021	27/04/2021	25/08/2021		**-54.00**	
8.71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS			2/04/2021	4/05/2021	25/08/2021		**-32.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			2/04/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-3.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**			2/04/2021		29/06/2021		**44288.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL			18/02/2021	8/03/2021	29/06/2021		**-18.00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS			2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**			2/04/2021		23/08/2021		**-114.00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31.00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31.00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN			2/04/2021	7/04/2021	23/08/2021		**-5.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
4	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
8	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
9	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

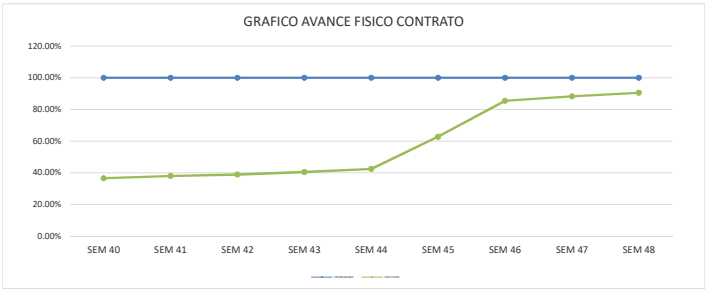


$ 124,790,188.12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 40	100.00%	36.57%	-63.43%
SEM 41	100.00%	38.04%	-61.96%
SEM 42	100.00%	38.88%	-61.12%
SEM 43	100.00%	40.56%	-59.44%
SEM 44	100.00%	42.44%	-57.56%
SEM 45	100.00%	62.79%	-37.21%
SEM 46	100.00%	85.44%	-14.56%
SEM 47	100.00%	88.31%	-11.69%
SEM 48	100.00%	90.54%	-9.46%
ALERTAS			-9.46%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

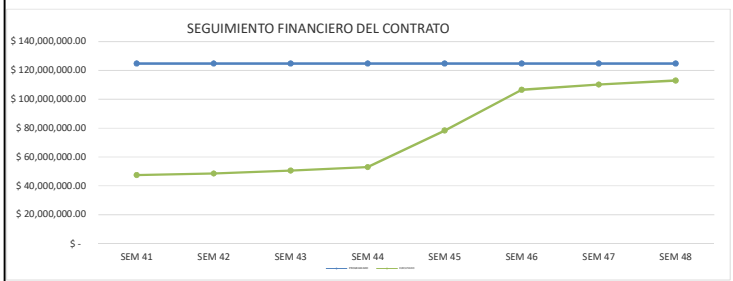

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	$ 124,790,188.12	$ 47,473,583.13	$ -77,316,605
SEM 42	$ 124,790,188.12	$ 48,522,937.93	$ -76,267,250
SEM 43	$ 124,790,188.12	$ 50,617,621.43	$ -74,172,567
SEM 44	$ 124,790,188.12	$ 52,963,666.95	$ -71,826,521
SEM 45	$ 124,790,188.12	$ 78,357,366.45	$ -46,432,822
SEM 46	$ 124,790,188.12	$ 106,624,766.80	$ -18,165,421
SEM 47	$ 124,790,188.12	$ 110,204,854.95	$ -14,585,333
SEM 48	$ 124,790,188.12	$ 112,989,367.95	$ -11,800,820

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/06/2021		**-76.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		29/06/2021		**-85.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	29/06/2021		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-20.00**	**250.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-114.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	29/06/2021		**-48.00**	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-69.00**	
8.75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-114.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	29/06/2021		**-91.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-54.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-11.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		29/06/2021		**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
5	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

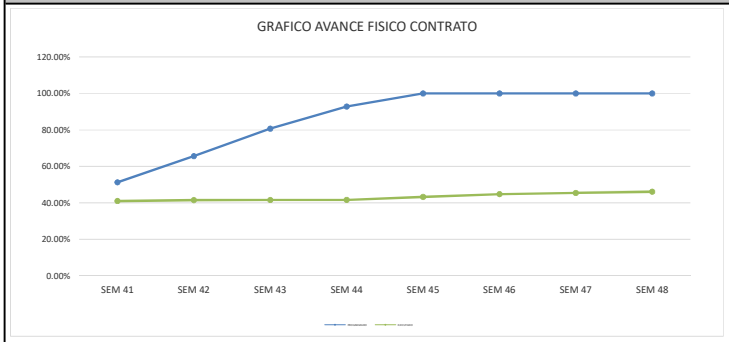


$ 330,131,160.75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	51.26%	41.03%	-10.23%
SEM 42	65.59%	41.54%	-24.05%
SEM 43	80.65%	41.60%	-39.05%
SEM 44	92.82%	41.66%	-51.16%
SEM 45	100.00%	43.25%	-56.75%
SEM 46	100.00%	44.78%	-55.22%
SEM 47	100.00%	45.40%	-54.60%
SEM 48	100.00%	46.10%	-53.90%
	ALERTAS		-53.90%
	INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

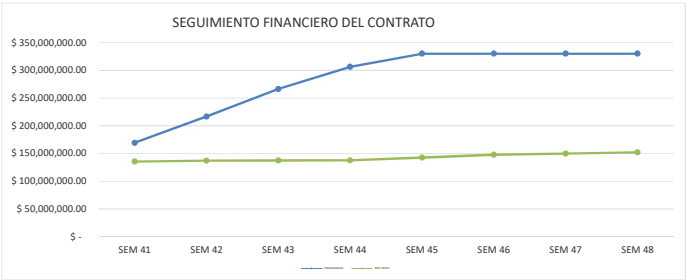

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	$ 169,222,575.79	$ 135,449,811.37	$ -33,772,764
SEM 42	$ 216,530,439.44	$ 137,125,558.17	$ -79,404,881
SEM 43	$ 266,238,848.93	$ 137,335,026.52	$ -128,903,822
SEM 44	$ 306,431,486.39	$ 137,544,494.87	$ -168,886,992
SEM 45	$ 330,131,160.75	$ 142,781,203.62	$ -187,349,957
SEM 46	$ 330,131,160.75	$ 147,845,729.39	$ -182,285,431
SEM 47	$ 330,131,160.75	$ 149,887,846.35	$ -180,243,314
SEM 48	$ 330,131,160.75	$ 152,192,503.31	$ -177,938,657
	Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)		

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	24/05/2021		29/06/2021		-62.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/06/2021		29/06/2021		-41.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	29/06/2021		-12.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
5	LAVADO DE TANQUES	1/06/2021		29/06/2021		-54.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	29/06/2021		-1.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	-19.00	250.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	29/06/2021		-57.00	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	29/06/2021		-28.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/04/2021		29/06/2021		-114.00	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	29/06/2021		-33.00	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021	29/06/2021			
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	29/06/2021		-37.00	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		-31.00	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	-31.00	55.00
10	ITEMS NO PREVISTOS	31/05/2021		29/06/2021		-55.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHULIET PAOLA CORRO UCROS		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
5	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

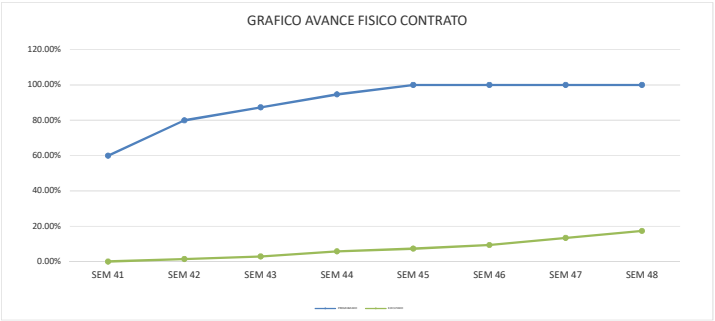


$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	59.92%	0.00%	-59.92%
SEM 42	79.96%	1.45%	-78.50%
SEM 43	87.31%	2.91%	-84.40%
SEM 44	94.66%	5.82%	-88.85%
SEM 45	100.00%	7.27%	-92.73%
SEM 46	100.00%	9.31%	-90.69%
SEM 47	100.00%	13.42%	-86.58%
SEM 48	100.00%	17.33%	-82.67%
ALERTAS			-82.67%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

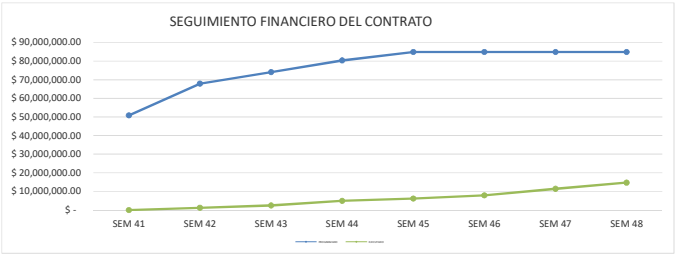

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	$ 50,884,313.95	$ -	$ -50,884,314
SEM 42	$ 67,895,490.33	$ 1,235,000.00	$ -66,660,490
SEM 43	$ 74,139,379.72	$ 2,470,000.00	$ -71,669,380
SEM 44	$ 80,383,269.10	$ 4,940,000.00	$ -75,443,269
SEM 45	$ 84,913,757.37	$ 6,175,000.00	$ -78,738,757
SEM 46	$ 84,913,757.37	$ 7,904,000.00	$ -77,009,757
SEM 47	$ 84,913,757.37	$ 11,396,649.36	$ -73,517,108
SEM 48	$ 84,913,757.37	$ 14,716,626.99	$ -70,197,130

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/05/2021		29/06/2021		-69.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/05/2021		29/06/2021		-62.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/06/2021		29/06/2021		-48.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	7/06/2021		29/06/2021		-48.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	14/06/2021		29/06/2021		-41.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		-13.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		-13.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31/05/2021		29/06/2021		-55.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/05/2021		29/06/2021		-55.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	17/05/2021		29/06/2021		-69.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

$ 363,922,857.92

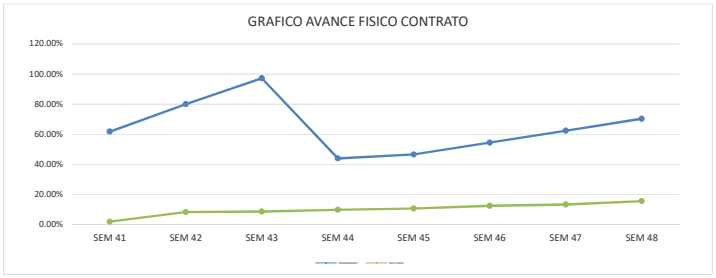


% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	61.82%	1.98%	-59.84%
SEM 42	80.07%	8.31%	-71.77%
SEM 43	97.27%	8.68%	-88.59%
SEM 44	44.04%	9.88%	-34.15%
SEM 45	46.59%	10.70%	-35.89%
SEM 46	54.51%	12.47%	-42.04%
SEM 47	62.42%	13.34%	-49.08%
SEM 48	70.33%	15.63%	-54.69%
ALERTAS			-54.69%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

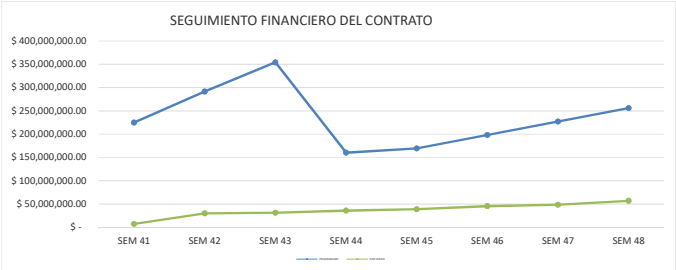

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 41	$ 224,981,406.30	$ 7,213,639.94	$ -217,767,766
SEM 42	$ 291,410,436.27	$ 30,227,412.93	$ -261,183,023
SEM 43	$ 353,992,445.25	$ 31,599,133.61	$ -322,393,312
SEM 44	$ 160,257,719.00	$ 35,969,144.06	$ -124,288,575
SEM 45	$ 169,555,431.59	$ 38,948,970.58	$ -130,606,461
SEM 46	$ 198,377,808.76	$ 45,399,227.38	$ -152,978,581
SEM 47	$ 227,156,799.74	$ 48,534,001.94	$ -178,622,798
SEM 48	$ 255,935,790.71	$ 56,894,365.32	$ -199,041,425

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		17/07/2021		-86.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		29/06/2021		-76.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		21/08/2021		-69.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		29/06/2021		-76.00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		26/08/2021		-69.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		29/06/2021		-76.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		25/08/2021		-62.00	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11.00	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		14/08/2021		-62.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		20/08/2021		-76.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	HECTOR GARCIA BALLESTA		
5	AYUDANTE	ISMAEL ALFARO LOPEZ		
6	AYUDANTE	WILSON LEON ROMERO		

Plazo total del Proyecto en Días	375	
Plazo faltante del Proyecto en Días	37	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1047-4583 Reiteración comunicado CINP-BTA-023-0979-4227 Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico, según prórroga. se le informó a la firma contratista, que aún no tenemos respuesta del comunicado CINP-BTA-023-0979-4227 del 06 de julio de 2021, donde se solicitó al Consorcio Constructor Alfa, realizar los ajustes de la programación de las sedes CDV-Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-Jagua de Ibirico, del departamento del Cesar, para realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de tal forma que se cumplan con la nueva fecha pactada para la terminación del proyecto.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1049-4586, Comunicado DCS-690-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. EDUARDO JOSE CANDELARIO DIAZ c.c: 72.216.829 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA sede:TODOS LAS SEDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, SUCRE, ATLÁNTICO; MAGDALENA; CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1057-4668, Comunicado DCS-698-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. LUIS BLANCO RODRIGUEZ c.c:7.601.979 cargo: TECNICO EN REFRIGERACION. 2. JAVIER ROMERO VITOLA c.c: 85.476.950 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES 3. NELSON FAJARDO HERNANDEZ c.c: 85.474.511 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES
4. EMIRO GARCIA HERRRERA c.c: 12.563.338 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES. 5. ASIR RODRIGUEZ OSORIO c.c: 1.082.929.756 cargo: AUXILIAR DE OPERACIONES.

En esta semana continuan actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura antihongos para fachadas y pintura tipo 1 para interiores en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura bajo placa, pintura para fachadas antihongos en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no ha dado respuesta del oficio CINP-BTA-023-0979-4227, donde se solicita el ajuste de la Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 33,41% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 59,04% del acumulado y se ha ejecutado 25,62%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 9,46% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 90,54%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 53,90% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 46,10%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 82,67% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 17,33%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 54,69% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 70,33% del acumulado y se ha ejecutado 15,63%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 31,12%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	14	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
24/05/2021	30/05/2021	SEMANA No. 40	31-may	En esta semana la sede CDV - Valledupar, debería estar ejecutada el 100% según la programación aprobada, y solamente se ha ejecutado 36,57%
31/05/2021	6/06/2021	SEMANA No. 41	8-jun	Se iniciaron labores de demolición, suministro e instalación de cerámica para piso de baños en el COMM-Valledupar.
7/06/2021	13/06/2021	SEMANA No. 42	15-jun	Inicio de actividades de rocería en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
14/06/2021	20/06/2021	SEMANA No. 43	21-jun	Inicio de pañete impermeabilizado sobre muro sede COMM - Valledupar.
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se suscribe otro si # 4 al contrato de obra y al contrato de Interventoría con fecha del 26 de Junio de 2021 - fecha de terminación actual 31 de Agosto de 2021.
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	6-jul	Lavado de tanques plásticos en sede CBC - Valledupar.
5/07/2021	11/07/2021	SEMANA No. 46	12-jul	Mantenimiento de cuerta en teja de barro, sede CDV - Valledupar.
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	El contratista aún no presenta los ajustes de la programación de las sedes sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.
		SEMANA No. 49		

VENTISEIS	26	días del mes de	JULIO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Pintura tipo para fachada antihongos



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Pintura bajo placa



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Pintura tipo para fachada antihongos



Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Mantenimiento cubierta teja de barro

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	48	DEL	19 de julio de 2021	AL	25 de julio de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo 1



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo 1



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Corte de cesped con guadaña



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Corte de cesped con guadaña

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

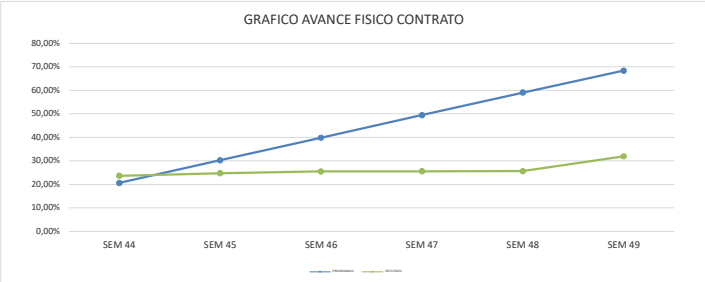


$ 1.009.520.443,47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	20,60%	23,67%	3,07%
SEM 45	30,26%	24,77%	-5,49%
SEM 46	39,86%	25,55%	-14,31%
SEM 47	49,46%	25,59%	-23,87%
SEM 48	59,04%	25,62%	-33,41%
SEM 49	68,34%	31,94%	-36,41%
ALERTAS			-36,41%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 207.945.780,98	$ 238.969.951,70	$ 31.024.171
SEM 45	$ 305.450.342,40	$ 250.054.556,91	$ -55.395.785
SEM 46	$ 402.386.052,95	$ 257.933.297,77	$ -144.452.755
SEM 47	$ 499.321.763,49	$ 258.299.787,72	$ -241.021.976
SEM 48	$ 596.006.159,25	$ 258.683.366,37	$ -337.322.793
SEM 49	$ 689.952.263,61	$ 322.434.810,98	$ -367.517.453

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10,00	-10,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/04/2021		29/06/2021		-121,00	
1.1	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)	29/06/2021	19/07/2021	29/06/2021	30/07/2021	-20,00	-31,00
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	29/06/2021	23/07/2021	25,00	-24,00
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/04/2021		29/06/2021		-121,00	
2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	30/07/2021	-27,00	-31,00
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	-31,00	-31,00
2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	29/06/2021	21/06/2021	29/06/2021	30/07/2021	8,00	-31,00
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	-31,00	-31,00
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	-31,00	-31,00
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	-31,00	-31,00
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	-31,00	32,00
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	-31,00	32,00
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	-31,00	32,00
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	-31,00	32,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/04/2021		17/08/2021		-121,00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	29,00	311,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/04/2021		10/07/2021		-121,00	
4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-14,00	-13,00
5	LAVADO DE TANQUES	2/04/2021		31/07/2021		-121,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1/06/2021		19/07/2021		-61,00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	19/07/2021		-2,00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	19/07/2021	22/10/2020	-27,00	270,00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL			1 de agosto de 2021		
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**			2/04/2021		25/08/2021		**-121,00**	
8,3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021	7/05/2021	**-31,00**	**110,00**
8,6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31,00**	
8,19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)			8/02/2021	23/03/2021	25/08/2021		**-43,00**	
8,55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS			8/02/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-56,00**	
8,67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)			18/02/2021	1/03/2021	25/08/2021		**-11,00**	
8,68	PINTURA MALLA ESLABONADA			3/03/2021	1/03/2021	25/08/2021		**2,00**	
8,70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO			4/03/2021	27/04/2021	25/08/2021		**-54,00**	
8,71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS			2/04/2021	4/05/2021	25/08/2021		**-32,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			2/04/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-3,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**			2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL			18/02/2021	8/03/2021	29/06/2021		**-18,00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS			2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31,00**	**55,00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**			2/04/2021		23/08/2021		**-121,00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31,00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31,00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN			2/04/2021	7/04/2021	23/08/2021		**-5,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELÍAS NAISIR		
6	OFICIAL DE INSTALACIÓN	SEBASTIAN SUAZA		
7	AYUDANTE DE INSTALACIÓN	BLEIDIS PERDOMO		
8	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

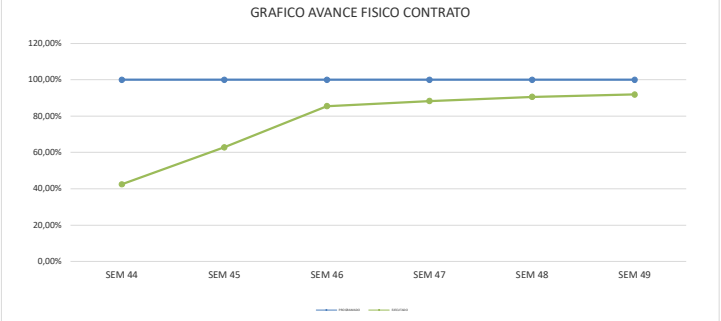


$ 124.790.188,12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	100,00%	42,44%	-57,56%
SEM 45	100,00%	62,79%	-37,21%
SEM 46	100,00%	85,44%	-14,56%
SEM 47	100,00%	88,31%	-11,69%
SEM 48	100,00%	90,54%	-9,46%
SEM 49	100,00%	91,84%	-8,16%
ALERTAS			-8,16%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

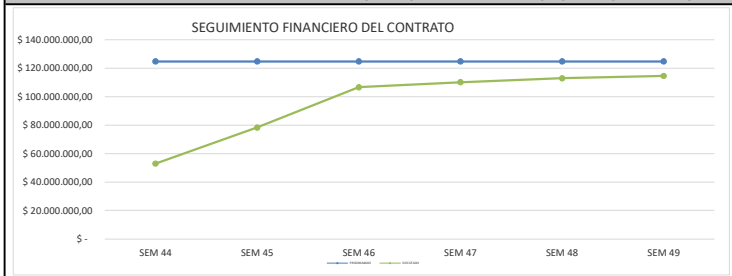

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 124.790.188,12	$ 52.963.666,95	$ -71.826.521
SEM 45	$ 124.790.188,12	$ 78.357.366,45	$ -46.432.822
SEM 46	$ 124.790.188,12	$ 106.624.766,80	$ -18.165.421
SEM 47	$ 124.790.188,12	$ 110.204.854,95	$ -14.585.333
SEM 48	$ 124.790.188,12	$ 112.989.367,95	$ -11.800.820
SEM 49	$ 124.790.188,12	$ 114.611.640,40	$ -10.178.548

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/06/2021		**-83.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		29/06/2021		**-92.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	29/06/2021		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-20.00**	**250.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-121.00**	
8,19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	29/06/2021		**-48,00**	
8,65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-69,00**	
8,75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	29/06/2021		**-91,00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-54,00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-11.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		29/06/2021		**-83,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

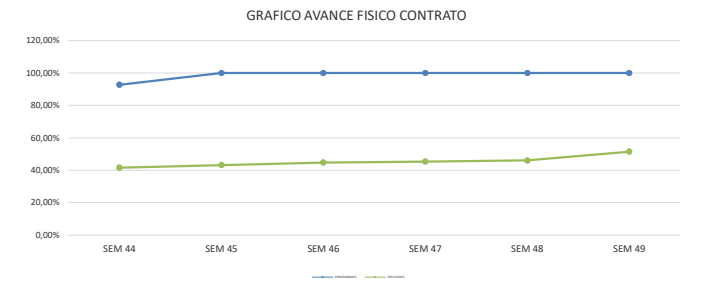


$ 330.131.160,75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	92,82%	41,66%	-51,16%
SEM 45	100,00%	43,25%	-56,75%
SEM 46	100,00%	44,78%	-55,22%
SEM 47	100,00%	45,40%	-54,60%
SEM 48	100,00%	46,10%	-53,90%
SEM 49	100,00%	51,53%	-48,47%
ALERTAS			-48,47%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

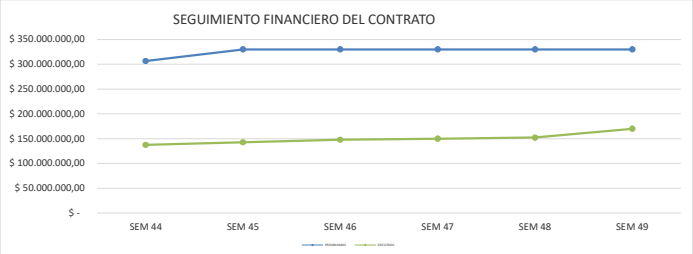

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 306.431.486,39	$ 137.544.494,87	$ -168.886.992
SEM 45	$ 330.131.160,75	$ 142.781.203,62	$ -187.349.957
SEM 46	$ 330.131.160,75	$ 147.845.729,39	$ -182.285.431
SEM 47	$ 330.131.160,75	$ 149.887.846,35	$ -180.243.314
SEM 48	$ 330.131.160,75	$ 152.192.503,31	$ -177.938.657
SEM 49	$ 330.131.160,75	$ 170.121.227,78	$ -160.009.933

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2,00**	**-2,00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	24/05/2021		29/06/2021		**-69,00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	14/06/2021		29/06/2021		**-48,00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	29/06/2021		**-12,00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	1/06/2021		29/06/2021		**-61,00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	29/06/2021		**-1,00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-19,00**	**250,00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	29/06/2021		**-57,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-28,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-121,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	29/06/2021		**-33,00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021	29/06/2021			
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	29/06/2021		**-37,00**	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31,00**	**55,00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/05/2021		29/06/2021		**-62,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINE PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

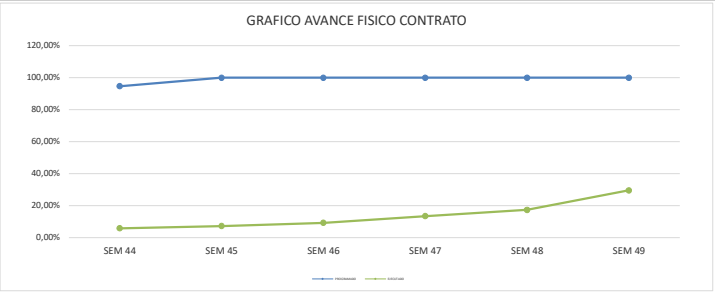


$ 84.913.757,37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	94,66%	5,82%	-88,85%
SEM 45	100,00%	7,27%	-92,73%
SEM 46	100,00%	9,31%	-90,69%
SEM 47	100,00%	13,42%	-86,58%
SEM 48	100,00%	17,33%	-82,67%
SEM 49	100,00%	29,55%	-70,45%
ALERTAS			-70,45%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

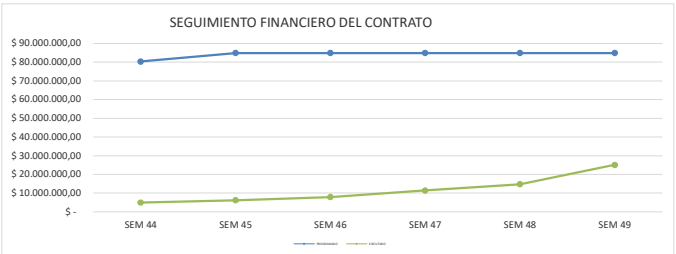

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 80.383.269,10	$ 4.940.000,00	$ -75.443.269
SEM 45	$ 84.913.757,37	$ 6.175.000,00	$ -78.738.757
SEM 46	$ 84.913.757,37	$ 7.904.000,00	$ -77.009.757
SEM 47	$ 84.913.757,37	$ 11.396.649,36	$ -73.517.108
SEM 48	$ 84.913.757,37	$ 14.716.626,99	$ -70.197.130
SEM 49	$ 84.913.757,37	$ 25.095.693,95	$ -59.818.063

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**31/10/2020**		**3/11/2020**			
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	17/05/2021		29/06/2021		**-76,00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	24/05/2021		29/06/2021		**-69,00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	7/06/2021		29/06/2021		**-55,00**	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO.**	7/06/2021		29/06/2021		**-55,00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	14/06/2021		29/06/2021		**-48,00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		**-13,00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		**-13,00**	
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	31/05/2021		29/06/2021		**-62,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	31/05/2021		29/06/2021		**-62,00**	
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	17/05/2021		29/06/2021		**-76,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

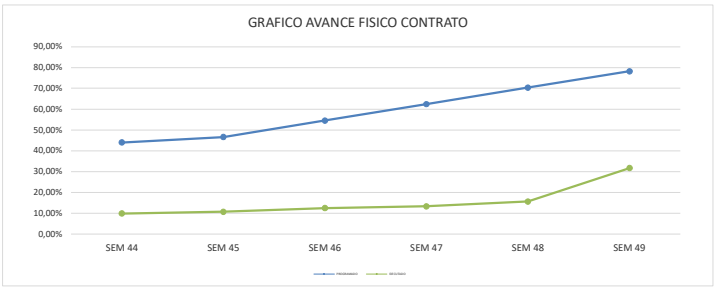


$ 363.922.857,92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	44,04%	9,88%	-34,15%
SEM 45	46,59%	10,70%	-35,89%
SEM 46	54,51%	12,47%	-42,04%
SEM 47	62,42%	13,34%	-49,08%
SEM 48	70,33%	15,63%	-54,69%
SEM 49	78,23%	31,73%	-46,50%
ALERTAS			-46,50%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 160.257.719,00	$ 35.969.144,06	$ -124.288.575
SEM 45	$ 169.555.431,59	$ 38.948.970,58	$ -130.606.461
SEM 46	$ 198.377.808,76	$ 45.399.227,38	$ -152.978.581
SEM 47	$ 227.156.799,74	$ 48.534.001,94	$ -178.622.798
SEM 48	$ 255.935.790,71	$ 56.894.365,32	$ -199.041.425
SEM 49	$ 284.714.781,68	$ 115.477.110,82	$ -169.237.671

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		17/07/2021		-93,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		29/06/2021		-83,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		21/08/2021		-76,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		29/06/2021		-83,00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		26/08/2021		-76,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		29/06/2021		-83,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		25/08/2021		-69,00	
8,65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11,00	
8,67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		14/08/2021		-69,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		20/08/2021		-83,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**30**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1065-4721, Comunicado DCS-701-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. se remite al ente contratante, los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. LORAINE GRACIELA PEREZ AMAYA c.c: 1.065.825.697 cargo: SISO lugar: TODOS LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1072-4747, Oficio 92021058423; Entrega APU No Previstos NP431-NP434 Lote 1. Por medio del presente y para los fines pertinentes nos permitimos remitirle copia del oficio del asunto con el que la Entidad indica que con el "Acta de mayores y menores cantidades de obra" (o Acta de modificación de cantidades de obra) no podrán modificarse los montos de los rubros presupuestales establecidos en el contrato de obra, ni los montos de los rubros de inversión determinados en el registro presupuestal, sin previa modificación contractual. De igual manera, remiten el acta de aprobación de ítems no previstos, debidamente firmada por el equipo SENA, con el ánimo de continuar con el desarrollo del contrato y cumplir satisfactoriamente con el objeto de éste. Por lo anterior, se solicitan los cronogramas ajustados y actualizados con base en los ítems no previstos, de la misma manera el balance de obra debidamente suscrito por obra e interventoría,

En esta semana continuan actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura antihongos para fachadas en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura para fachadas antihongos en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no ha dado respuesta del oficio CINP-BTA-023-0979-4227, donde se solicita el ajuste de la Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 36,41% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 68,34% del acumulado y se ha ejecutado 31,94%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 8,16% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 91,84%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 48,47% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 51,53%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 70,45% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 29,55%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 46,50% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 78,23% del acumulado y se ha ejecutado 31,73%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 39,08%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	4	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	13			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	5	TOTAL	20	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se suscribe otro si # 4 al contrato de obra y al contrato de Interventoría con fecha del 26 de Junio de 2021 - fecha de terminación actual 31 de Agosto de 2021.
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	6-jul	Lavado de tanques plásticos en sede CBC - Valledupar.
5/07/2021	11/07/2021	SEMANA No. 46	12-jul	Mantenimiento de cuerta en teja de barro, sede CDV - Valledupar.
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	El contratista aún no presenta los ajustes de la programación de las sedes sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	

DOS	2	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo para fachada antihongos





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo para fachada antihongos



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo para fachada antihongos





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo para fachada antihongos



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación línea de vida





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación de pescantes

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	49	DEL	26 de julio de 2021	AL	1 de agosto de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación puntos de anclajes



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Mantenimiento condensadoras



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Corte de cesped con guadaña





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Mantenimiento cerramiento metálico

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

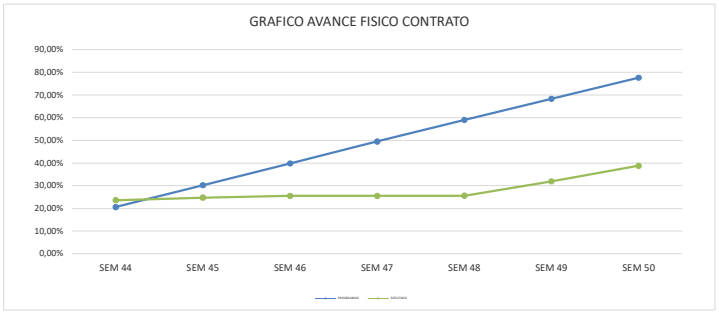


$ 1.009.520.443,47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	20,60%	23,67%	3,07%
SEM 45	30,26%	24,77%	-5,49%
SEM 46	39,86%	25,55%	-14,31%
SEM 47	49,46%	25,59%	-23,87%
SEM 48	59,04%	25,62%	-33,41%
SEM 49	68,34%	31,94%	-36,41%
SEM 50	77,65%	38,77%	-38,88%
ALERTAS			-38,88%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

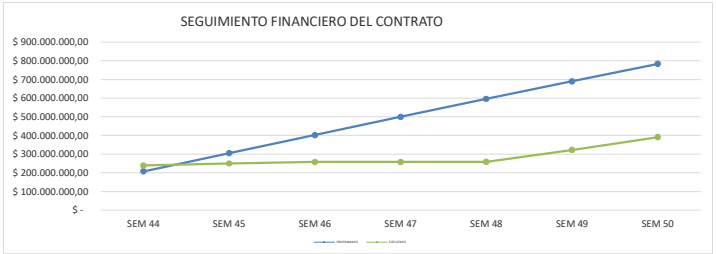

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 207.945.780,98	$ 238.969.951,70	$ 31.024.171
SEM 45	$ 305.450.342,40	$ 250.054.556,91	$ -55.395.785
SEM 46	$ 402.386.052,95	$ 257.933.297,77	$ -144.452.755
SEM 47	$ 499.321.763,49	$ 258.299.787,72	$ -241.021.976
SEM 48	$ 596.006.159,25	$ 258.683.366,37	$ -337.322.793
SEM 49	$ 689.952.263,61	$ 322.434.810,98	$ -367.517.453
SEM 50	$ 783.898.367,97	$ 391.399.849,75	$ -392.498.518

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**1/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**10,00**	**-10,00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
1.1	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)	29/06/2021	19/07/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-20,00**	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	29/06/2021	23/07/2021	**25,00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
2.1	ORGANIZACIÓN DE CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACION, CUADRO DE CARGAS,IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES EXIGIDO EN EL RETIE, ACTUALIZACIÓN DE DIRECTORIO.	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-27,00**	
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-31,00**	
2.3	MARCACIÓN DE TUBERÍA EMT CON COLOR ANARANJADO.	29/06/2021	21/06/2021	29/06/2021	30/07/2021	**8,00**	
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-31,00**	
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-31,00**	
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	30/07/2021	**-31,00**	
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	**-31,00**	
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	**-31,00**	
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	**-31,00**	
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	28/05/2021	**-31,00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/04/2021		17/08/2021		**-128,00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	**29,00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		10/07/2021		**-128,00**	
4.1	PRUEBAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EQUIPO DE PRESIÓN	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	**-14,00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	2/04/2021		31/07/2021		**-128,00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/06/2021		19/07/2021		**-68,00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	19/07/2021		**-2,00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	19/07/2021	22/10/2020	**-27,00**	**270,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**50**	**DEL**	2 de agosto de 2021	**AL**			8 de agosto de 2021		
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**			2/04/2021		25/08/2021		**-128,00**	
8,3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021	7/05/2021	**-31,00**	**110,00**
8,6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31,00**	
8,19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)			8/02/2021	23/03/2021	25/08/2021		**-43,00**	
8,55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO			2/04/2021	3/05/2021	25/08/2021		**-31,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS			8/02/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-56,00**	
8,67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)			18/02/2021	1/03/2021	25/08/2021		**-11,00**	
8,68	PINTURA MALLA ESLABONADA			3/03/2021	1/03/2021	25/08/2021		**2,00**	
8,70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO			4/03/2021	27/04/2021	25/08/2021		**-54,00**	
8,71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS			2/04/2021	4/05/2021	25/08/2021		**-32,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)			2/04/2021	5/04/2021	25/08/2021		**-3,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**			2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL			18/02/2021	8/03/2021	29/06/2021		**-18,00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS			2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31,00**	**55,00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**			2/04/2021		23/08/2021		**-128,00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31,00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED			2/04/2021	3/05/2021	23/08/2021		**-31,00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN			2/04/2021	7/04/2021	23/08/2021		**-5,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELÍAS NAISIR		
6	OFICIAL DE INSTALACIÓN	SEBASTIAN SUAZA		
7	AYUDANTE DE INSTALACIÓN	BLEIDIS PERDOMO		
8	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

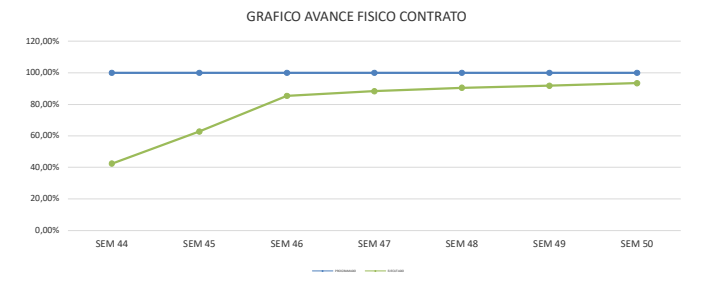


$ 124.790.188,12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	100,00%	42,44%	-57,56%
SEM 45	100,00%	62,79%	-37,21%
SEM 46	100,00%	85,44%	-14,56%
SEM 47	100,00%	88,31%	-11,69%
SEM 48	100,00%	90,54%	-9,46%
SEM 49	100,00%	91,84%	-8,16%
SEM 50	100,00%	93,46%	-6,54%
ALERTAS			-6,54%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 124.790.188,12	$ 52.963.666,95	$ -71.826.521
SEM 45	$ 124.790.188,12	$ 78.357.366,45	$ -46.432.822
SEM 46	$ 124.790.188,12	$ 106.624.766,80	$ -18.165.421
SEM 47	$ 124.790.188,12	$ 110.204.854,95	$ -14.585.333
SEM 48	$ 124.790.188,12	$ 112.989.367,95	$ -11.800.820
SEM 49	$ 124.790.188,12	$ 114.611.640,40	$ -10.178.548
SEM 50	$ 124.790.188,12	$ 116.627.409,06	$ -8.162.779

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/06/2021		**-90.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		29/06/2021		**-99.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	29/06/2021		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-20.00**	**250.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-128.00**	
8,19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	29/06/2021		**-48,00**	
8,65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-69,00**	
8,75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	29/06/2021		**-91,00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-54,00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	29/06/2021		**-11,00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31.00**	**55.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		29/06/2021		**-90,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

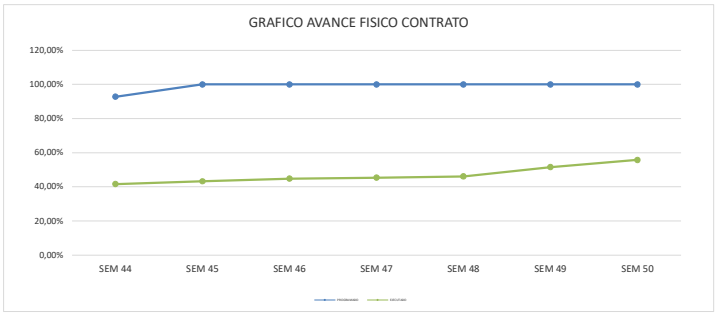


$ 330.131.160,75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	92,82%	41,66%	-51,16%
SEM 45	100,00%	43,25%	-56,75%
SEM 46	100,00%	44,78%	-55,22%
SEM 47	100,00%	45,40%	-54,60%
SEM 48	100,00%	46,10%	-53,90%
SEM 49	100,00%	51,53%	-48,47%
SEM 50	100,00%	55,75%	-44,25%
ALERTAS			-44,25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

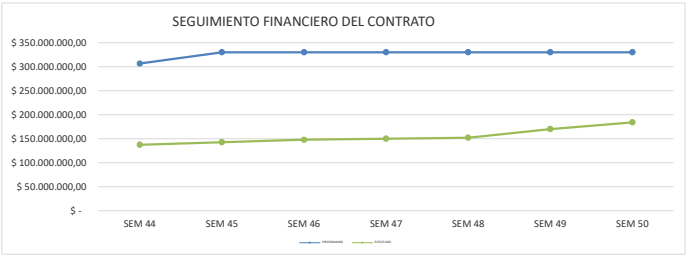

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 306.431.486,39	$ 137.544.494,87	$ -168.886.992
SEM 45	$ 330.131.160,75	$ 142.781.203,62	$ -187.349.957
SEM 46	$ 330.131.160,75	$ 147.845.729,39	$ -182.285.431
SEM 47	$ 330.131.160,75	$ 149.887.846,35	$ -180.243.314
SEM 48	$ 330.131.160,75	$ 152.192.503,31	$ -177.938.657
SEM 49	$ 330.131.160,75	$ 170.121.227,78	$ -160.009.933
SEM 50	$ 330.131.160,75	$ 184.061.799,10	$ -146.069.362

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2,00**	**-2,00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	24/05/2021		29/06/2021		**-76,00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	14/06/2021		29/06/2021		**-55,00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	29/06/2021		**-12,00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	1/06/2021		29/06/2021		**-68,00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	29/06/2021		**-1,00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	**-19,00**	**250,00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
8,62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	29/06/2021		**-57,00**	
8,72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	29/06/2021		**-28,00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		29/06/2021		**-128,00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	29/06/2021		**-33,00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021	29/06/2021			
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	29/06/2021		**-37,00**	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021		**-31,00**	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	29/06/2021	5/05/2021	**-31,00**	**55,00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/05/2021		29/06/2021		**-69,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**31/08/2021**			**31/08/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINE PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

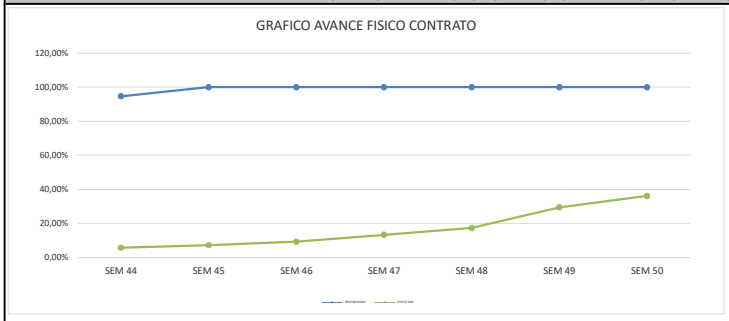


$ 84.913.757,37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	94,66%	5,82%	-88,85%
SEM 45	100,00%	7,27%	-92,73%
SEM 46	100,00%	9,31%	-90,69%
SEM 47	100,00%	13,42%	-86,58%
SEM 48	100,00%	17,33%	-82,67%
SEM 49	100,00%	29,55%	-70,45%
SEM 50	100,00%	36,14%	-63,86%
ALERTAS			-63,86%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 80.383.269,10	$ 4.940.000,00	$ -75.443.269
SEM 45	$ 84.913.757,37	$ 6.175.000,00	$ -78.738.757
SEM 46	$ 84.913.757,37	$ 7.904.000,00	$ -77.009.757
SEM 47	$ 84.913.757,37	$ 11.396.649,36	$ -73.517.108
SEM 48	$ 84.913.757,37	$ 14.716.626,99	$ -70.197.130
SEM 49	$ 84.913.757,37	$ 25.095.693,95	$ -59.818.063
SEM 50	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/05/2021		29/06/2021		-83,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/05/2021		29/06/2021		-76,00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/06/2021		29/06/2021		-62,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	7/06/2021		29/06/2021		-62,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	14/06/2021		29/06/2021		-55,00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		-13,00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021		-13,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31/05/2021		29/06/2021		-69,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/05/2021		29/06/2021		-69,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	17/05/2021		29/06/2021		-83,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

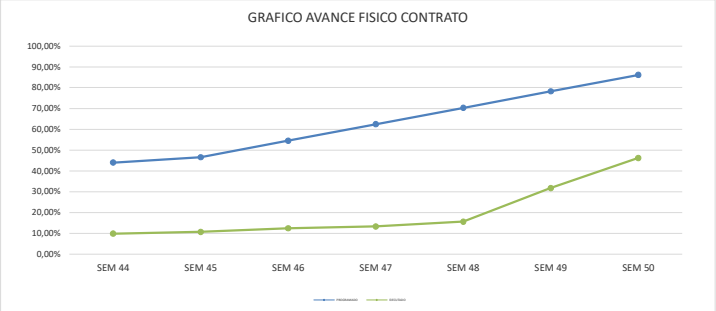


$ 363.922.857,92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	44,04%	9,88%	-34,15%
SEM 45	46,59%	10,70%	-35,89%
SEM 46	54,51%	12,47%	-42,04%
SEM 47	62,42%	13,34%	-49,08%
SEM 48	70,33%	15,63%	-54,69%
SEM 49	78,23%	31,73%	-46,50%
SEM 50	86,14%	46,22%	-39,92%
ALERTAS			-39,92%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

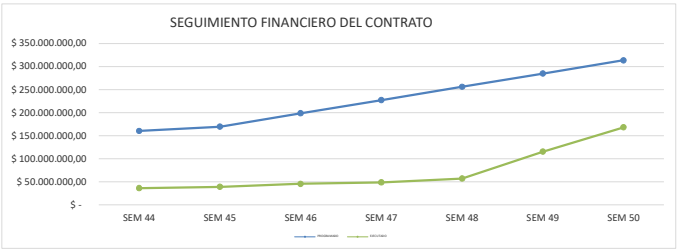

VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 44	$ 160.257.719,00	$ 35.969.144,06	$ -124.288.575
SEM 45	$ 169.555.431,59	$ 38.948.970,58	$ -130.606.461
SEM 46	$ 198.377.808,76	$ 45.399.227,38	$ -152.978.581
SEM 47	$ 227.156.799,74	$ 48.534.001,94	$ -178.622.798
SEM 48	$ 255.935.790,71	$ 56.894.365,32	$ -199.041.425
SEM 49	$ 284.714.781,68	$ 115.477.110,82	$ -169.237.671
SEM 50	$ 313.493.772,65	$ 168.218.824,06	$ -145.274.949

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		17/07/2021		-100,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		29/06/2021		-90,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		21/08/2021		-83,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		29/06/2021		-90,00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		26/08/2021		-83,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		29/06/2021		-90,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		25/08/2021		-76,00	
8,65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11,00	
8,67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	24/05/2021	13/05/2021	25/08/2021		11,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		14/08/2021		-76,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		20/08/2021		-90,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/08/2021			31/08/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**23**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El día 03 de Agosto de 2021, se remite el balance por cada una de las sedes intervenidas y el consolidado de actas parciales para su revisión y concepto.

En esta semana continuan actividades de pañete impermeabilizado sobre muro y pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuan con actividades de mantenimiento de cubierta en teja de barro, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura antihongos para fachadas en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería e inician actividades de mantenimiento de aires en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron pintura bajo placa, pintura para fachadas antihongos en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no ha dado respuesta del oficio CINP-BTA-023-0979-4227, donde se solicita el ajuste de la Programación sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 38,88% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 77,65% del acumulado y se ha ejecutado 38,77%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 6,54% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,46%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 44,25% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 55,75%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 63,86% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 36,14%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 39,92% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 86,14% del acumulado y se ha ejecutado 46,22%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 46,57%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	14	TOTAL	5	TOTAL	0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
21/06/2021	27/06/2021	SEMANA No. 44	28-jun	Se suscribe otro si # 4 al contrato de obra y al contrato de Interventoría con fecha del 26 de Junio de 2021 - fecha de terminación actual 31 de Agosto de 2021.
28/06/2021	4/07/2021	SEMANA No. 45	6-jul	Lavado de tanques plásticos en sede CBC - Valledupar.
5/07/2021	11/07/2021	SEMANA No. 46	12-jul	Mantenimiento de cuerta en teja de barro, sede CDV - Valledupar.
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	El contratista aún no presenta los ajustes de la programación de las sedes sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Instalación de puntos de anclajes y lineas de vida.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	

NUEVE	9	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura tipo fachada antihongos





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura para fachada antihongos



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Pañete impermeabilizado sobre muro



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación puntos de anclajes



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación linea de vida





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Mantenimiento cruz fachada interna

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	50	DEL	2 de agosto de 2021	AL	8 de agosto de 2021





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Mantenimiento condensadoras





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - La Jagua de Ibirico	Corte de cesped con guadaña



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Aplicación de pintura tipo 1





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Mantenimiento cerramiento metálico

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	12/08/2021	MES DOCE DE OBRA	No. 12	DEL	12/07/2021	AL	11/08/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES SEIS DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Sede CDV, Valledupar - mantenimiento teja de barro



FOTOGRAFÍA No. 2: Sede COMM, Valledupar - Pañete impermeabilizado sobre muro



FOTOGRAFÍA No. 3: Sede CBC, Valledupar - Aplicación de pintura para exteriores.





FOTOGRAFÍA No. 4: Sede CAE, Aguachica - Mantenimiento de cerramiento metálico.



FOTOGRAFÍA No. 5: Sede CBC - Instalación de tubería de 6"



FOTOGRAFÍA No. 6: Sede CBC - Pintura tipo 1



FOTOGRAFÍA No. 7: Sede CAE, Aguachica - Pintura antihongos.





FOTOGRAFÍA No. 8: Sede COMM, La Jagua de Ibirico - Rocería.



FOTOGRAFÍA No. 9: Sede CAE, Aguachica - Pintura bajo placa



FOTOGRAFÍA No. 10: Sede CDV, Valledupar - Mantenimiento teja de barro.





FOTOGRAFÍA No. 11: Sede CBC - Valledupar - Pintura antihongos para fachadas.





FOTOGRAFÍA No. 12: Sede COMM - LaJagua de Ibirico - Rocería



FOTOGRAFÍA No. 13: Sede CBC, Valledupar - Pintura antihongos para fachada.





FOTOGRAFÍA No. 14: Sede COMM, Valledupar - Instalación de puntos de anclajes.





FOTOGRAFÍA No. 15: Sede CBC, Valledupar - Pintura antihongos para fachada.

GNG Ingeniería S.A.S | CONSORCIO INTERINGECO GNG | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	12/08/2021	MES DOCE DE OBRA	No. 12	DEL	12/07/2021	AL	11/08/2021



FOTOGRAFÍA No. 16: Sede COMM, Valledupar - Instalación de líne de vida



FOTOGRAFÍA No. 17: Sede COMM, Valledupar - Instalación de puntos de anclajes.



FOTOGRAFÍA No. 18: Sede COMM, La Jagua de Ibirico - Mantenimiento de aies mini split.



FOTOGRAFÍA No. 19: Sede COMM - LaJagua de Ibirico - Rocería





FOTOGRAFÍA No. 20: Sede CAE, Aguachica - Mantenimiento de cerramiento metálico.



FOTOGRAFÍA No. 21: Sede CBC, Valledupar - Pintura antihongos para fachada.





FOTOGRAFÍA No. 22: Sede CBC, Valledupar - Pintura antihongos para fachada.



FOTOGRAFÍA No. 23: Sede COMM, Valledupar - Pañete impermeabilizado sobre muro



FOTOGRAFÍA No. 24: Sede COMM, Valledupar - Instalación de puntos de anclajes.



FOTOGRAFÍA No. 25: Sede COMM, Valledupar - Instalación de líne de vida





FOTOGRAFÍA No. 26:Sede CDV - Valledupar - Mantenimiento cruz entrada principal.





FOTOGRAFÍA No. 27: Sede COMM, La Jagua de Ibirico - Mantenimiento de aies piso techo.



FOTOGRAFÍA No. 28: Sede CAE, Aguachica - Pintura tipo 1



FOTOGRAFÍA No. 29: Sede COMM - LaJagua de Ibirico - Rocería





FOTOGRAFÍA No. 30: Sede CAE, Aguachica - Mantenimiento de cerramiento metálico.

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO


* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

NO APLICA

Anexo No. 16: Programación actualizada.


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
227		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
228		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
229		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
230		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
231		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
232		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
233		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
234		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**41 días**	**mar 29/06/21**	**lun 23/08/21**
235		IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 5/07/21	sáb 24/07/21
236		SISTEMAS ELECTRICOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
237		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
238		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
239		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
240		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
241		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
242		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
243		NO PREVISTOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
244		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
245		IMPERMEABILIZACIONES	11 días	vie 2/07/21	sáb 17/07/21
246		SISTEMAS ELÉCTRICOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
247		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
248		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
249		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
250		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
251		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
252		NO PREVISTOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
253		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
254		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
255		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
256		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
257		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
258		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
259		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	26 días	lun 12/07/21	sáb 14/08/21
260		NO PREVISTOS	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
261		**LIQUIDACIÓN**	**5 días**	**mar 24/08/21**	**lun 30/08/21**
262		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CORDOBA	5 días	mar 24/08/21	lun 30/08/21
263		**REGIONAL CESAR**	**45,75 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**
264		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
265		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**43 días**	**mar 29/06/21**	**mié 25/08/21**
266		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
267		SISTEMAS ELÉCTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
268		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 17/08/21	mar 17/08/21
269		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 5/07/21	sáb 10/07/21
270		LAVADO DE TANQUES	3 días	mié 28/07/21	sáb 31/07/21
271		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	12 días	vie 2/07/21	lun 19/07/21

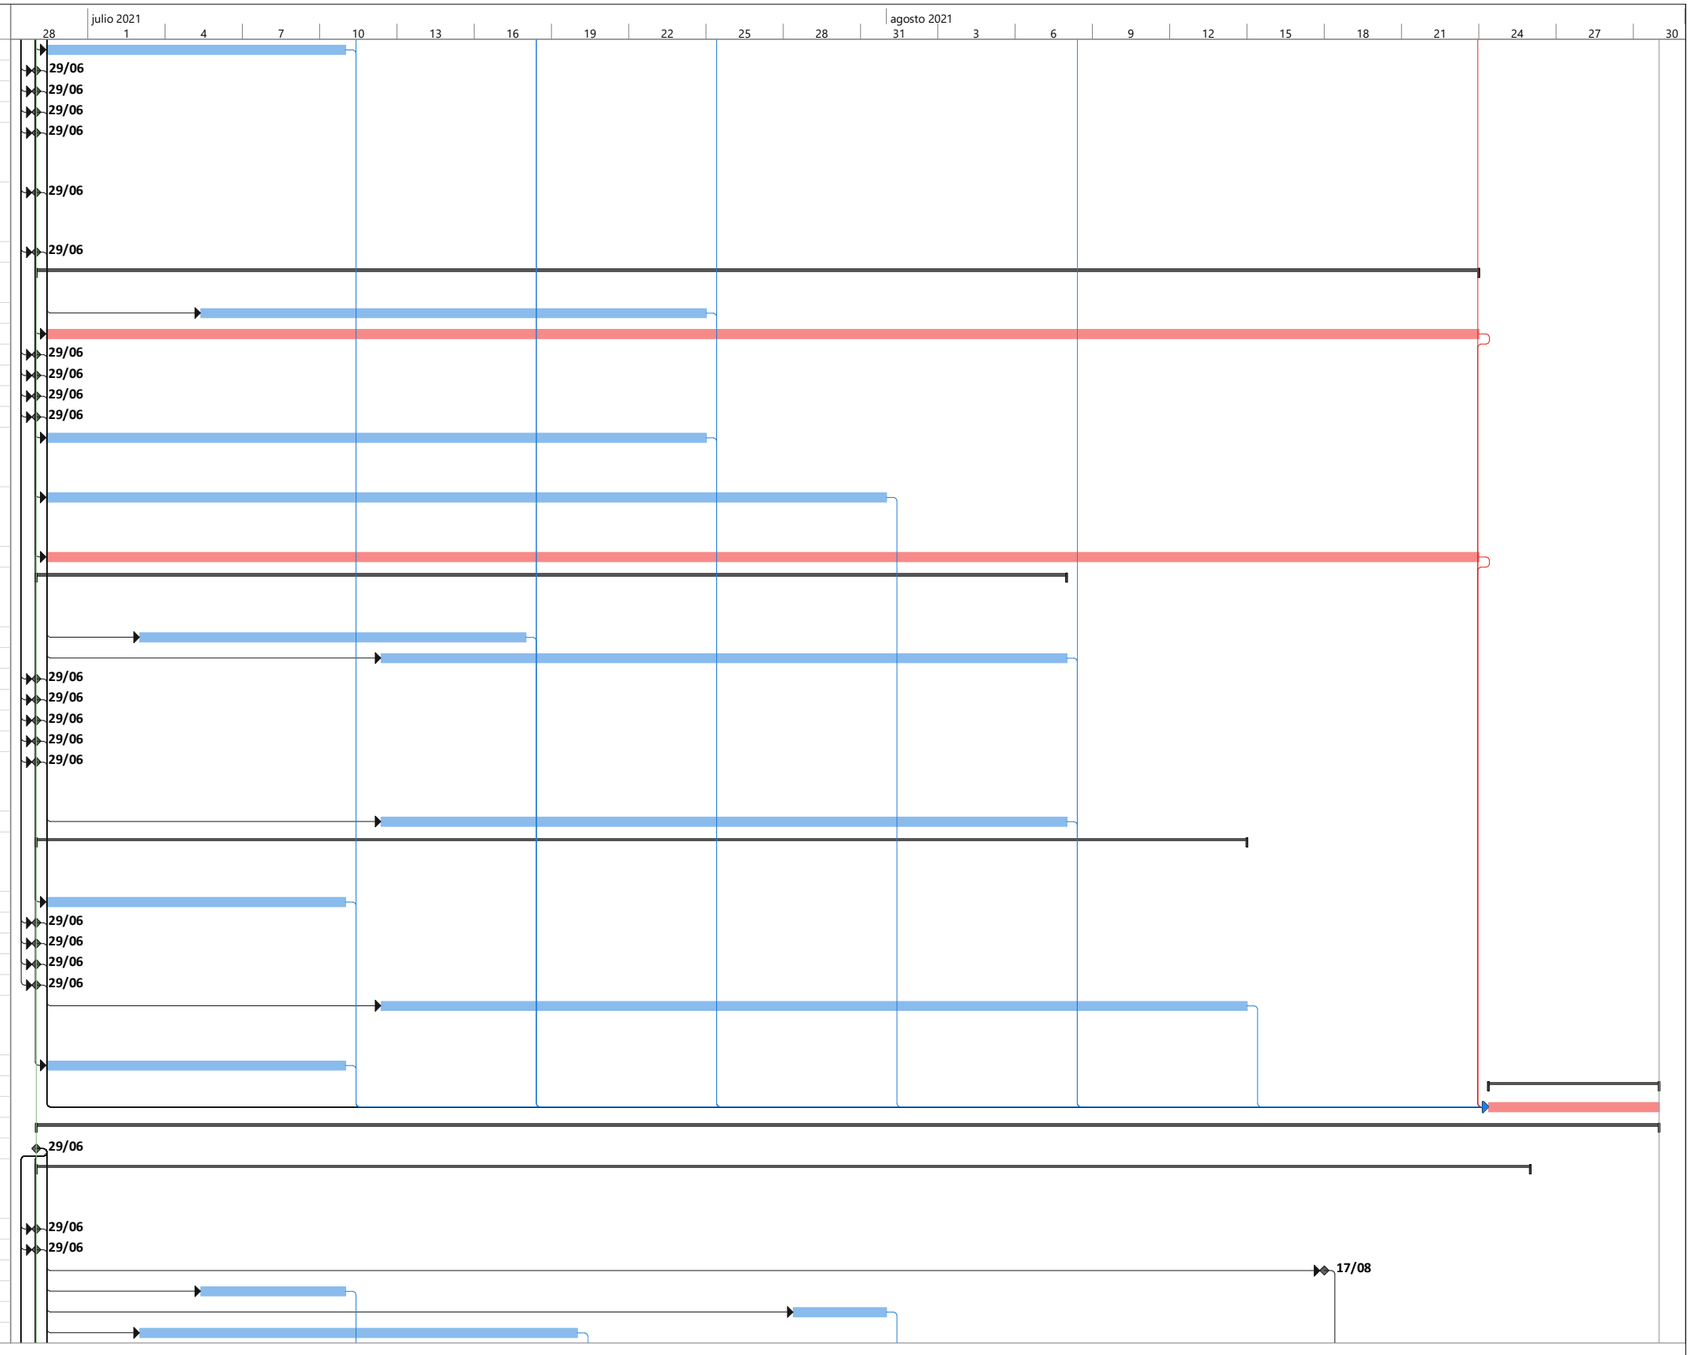

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
272		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	43 días	mar 29/06/21	mié 25/08/21
273		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
274		NO PREVISTOS	41 días	mar 29/06/21	lun 23/08/21
275		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
276		Impermeabilizaciones	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
277		Sistemas eléctricos	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
278		Servicio de jardinería	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
279		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
280		Lavado de tanques	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
281		Sistemas de refrigeración.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
282		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
283		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
284		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
285		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
286		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
287		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
288		MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
289		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
290		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
291		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
292		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
293		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
294		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
295		SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
296		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
297		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
298		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
299		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
300		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**43,75 días**	**mar 29/06/21**	**jue 26/08/21**
301		IMPERMEABILIZACIONES	5,75 días	lun 12/07/21	sáb 17/07/21
302		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
303		SERVICIO DE JARDINERIA	5 días	lun 16/08/21	sáb 21/08/21
304		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
305		LAVADO DE TANQUES	4 días	vie 20/08/21	jue 26/08/21
306		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
307		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	42,75 días	mar 29/06/21	mié 25/08/21
308		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	21 días	sáb 17/07/21	sáb 14/08/21
309		NO PREVISTOS	24,75 días	lun 19/07/21	vie 20/08/21
310		**LIQUIDACIÓN**	**2 días**	**jue 26/08/21**	**lun 30/08/21**
311		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CESAR	2 días	jue 26/08/21	lun 30/08/21
312		**REGIONAL SAN ANDRES**	**46 días**	**mar 29/06/21**	**lun 30/08/21**

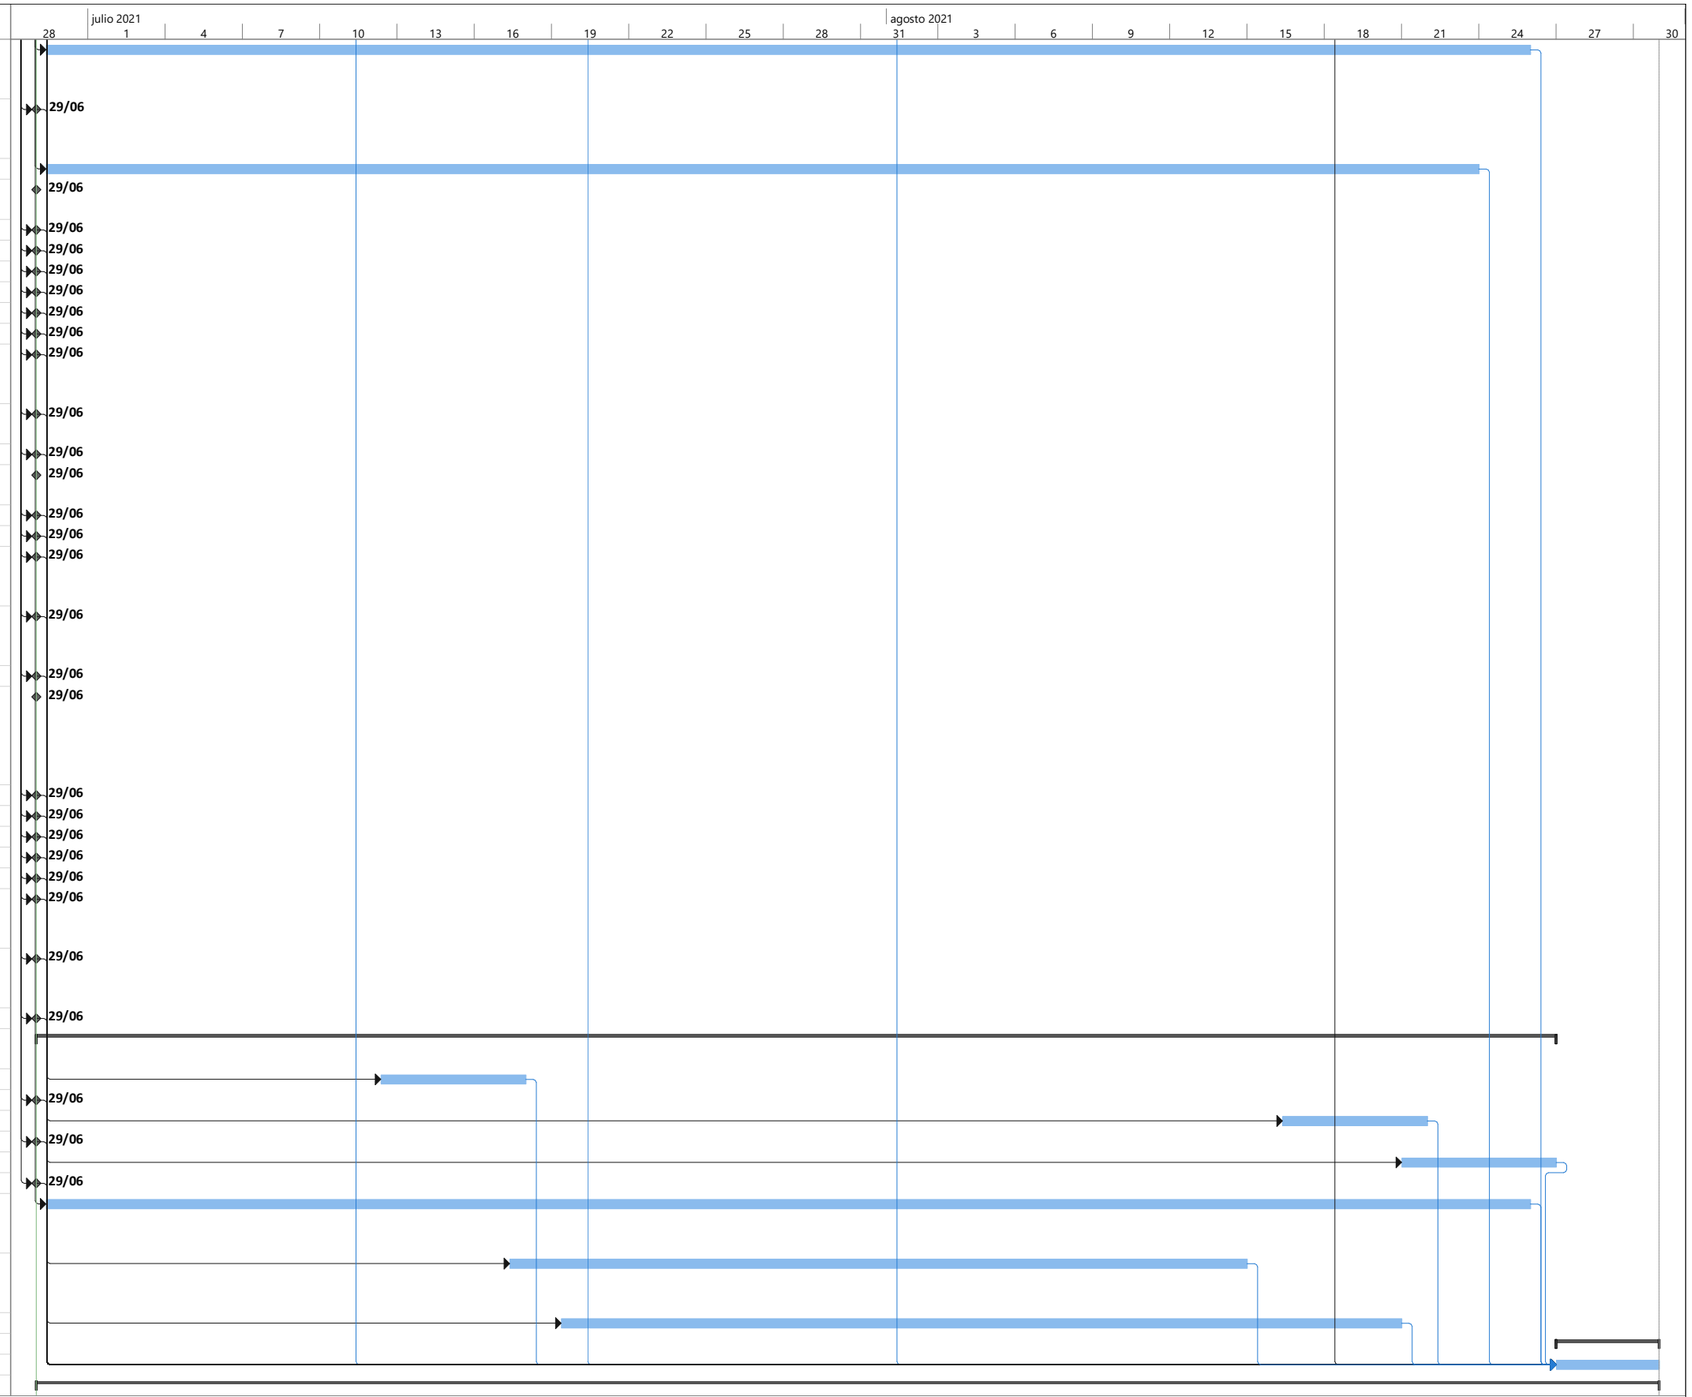

Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mar 29/06/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
