
Cronograma contrato de Obra No.020 de 2021.Cuyo objeto es :"SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO (INCLUYENDO PARTE ELECTRICA) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO, PASILLO Y SALAS DE REUNION DEL SOTANO 1 Y EL DESMONTE DEL ACTUAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO DEL AUDITORIO, LAS SALAS DE REUNION Y SALA DE SISTEMAS DEL PALACIO DE JUSTICIA FABIO CALDERON BOTERO EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO"

Cronograma de actividades

Item	Nombre de tarea / Título	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso (%)	Duración (Dias)
1	**Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado**	**11/10/2021**	**09/12/2021**	81%	**60**
1.1	Solicitud de Equipos VRF	11/10/2021	13/10/2021	100%	**2**
1.2	Solicitud de Materiales y Activos	11/10/2021	08/11/2021	100%	**28**
1.3	Construcción bases UCAs	25/10/2021	02/11/2021	100%	**8**
1.4	Desmonte de Aire Acondicionado Tipo Paquete capacidades de 15 TR más ductería, tuberías de hierro galb, recolección y acopio de refrigerante, desinstalación eléctrica.	14/10/2021	19/10/2021	100%	**5**
1.5	Desmonte de Aire Acondicionado Tipo Paquete capacidades de 3.5 TR más ductería, tuberías de hierro galb, recolección y acopio de refrigerante, desinstalación eléctrica.	18/10/2021	22/10/2021	100%	**4**
1.6	Adecuación acometida eléctrica fuerza y control.	26/10/2021	12/11/2021	100%	**17**
1.7	Llegada de Equipos.	27/10/2021	25/11/2021	100%	**29**
1.8	Instalación redes de refrigeración.	26/10/2021	20/11/2021	100%	**25**
1.9	Instalación de equipos VRF	28/10/2021	03/12/2021	87%	**36**
1.10	Conexión de Conexión de equipos VRF, Instalación red de Drenaje para equipos VRF Interiores.	30/11/2021	04/12/2021	0	**4**
1.11	Pruebas de Presión en Redes de refrigeración.	01/12/2021	03/12/2021	0	**2**
1.12	Vacío redes de Refrigeración.	03/12/2021	04/12/2021	0	**1**
1.13	Llenado redes de refrigeración con R410A.	04/12/2021	05/12/2021	0	**1**
1.14	Protocolos de arranque de equipos.	05/12/2021	06/12/2021	0	**1**
1.15	Configuración Equipos VRF interiores.	06/12/2021	07/12/2021	0	**1**
1.16	Capacitación del Sistema al Cliente.	07/12/2021	08/12/2021	0	**1**
1.17	Entrega manuales de operación y mantenimiento, Entrega de planos as built, Entrega de reportes de pruebas.	08/12/2021	09/12/2021	0	**1**

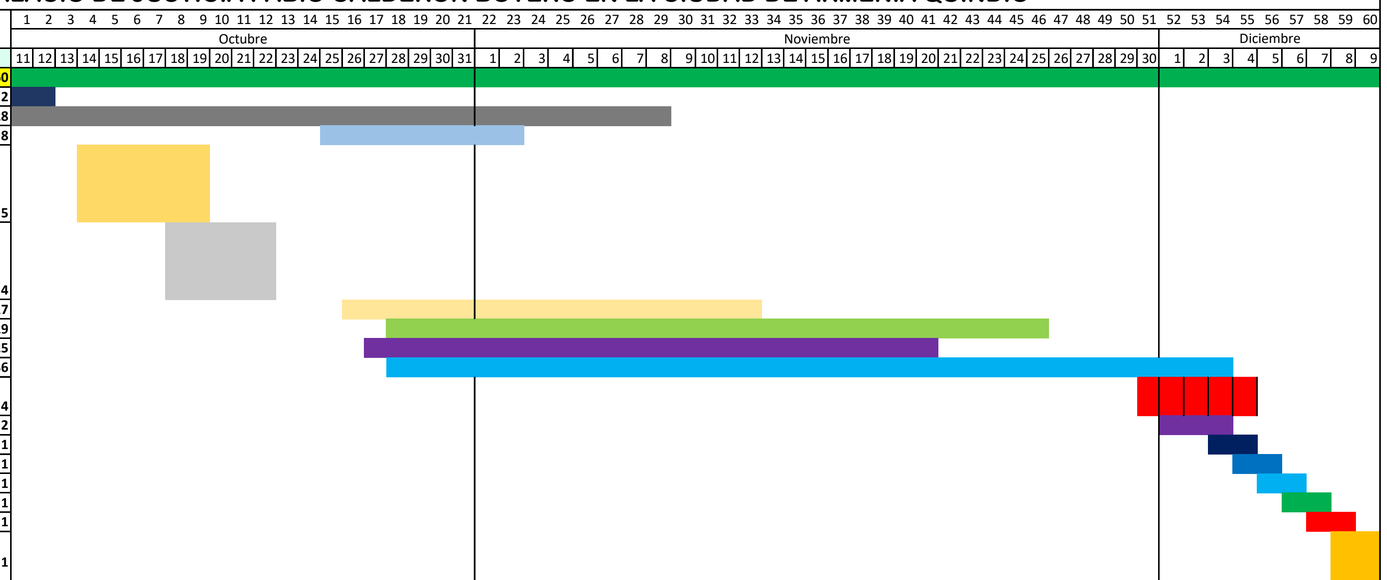

RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
Representante Legal RAELJA INGENIERIA S.A.S
