
Id	Nombre de tarea	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	% DE EJECUCIÓN
0	**Programación ICBF CALDAS(31-DIC-2021)**	**73 días**	**22/09/2021**	**31/12/2021**	**33%**
1	**ICBF - LA DORADA CALDAS**	**73 días**	**22/09/2021**	**31/12/2021**	**33%**
2	**PRELIMINARES**	**36 días**	**22/09/2021**	**10/11/2021**	**75%**
3	Demolición de cieloraso existente en malla gallinero y revoque, desprendido y fisurado por humedades provenientes de placa producidas por lluvias intensas.	7 días	22/09/2021	30/09/2021	100%
4	Desmonte de cielo raso en pvc, incluido estructura, presenta deterioro por agua lluvia	7 días	1/10/2021	11/10/2021	100%
5	Desmonte de luminarias instaladas	2 días	12/10/2021	13/10/2021	100%
6	Drenaje de placas llenas de aguas filtradas	2 días	1/10/2021	4/10/2021	100%
7	Demolición de revoques en muro estucados y pintados, afectados por humedades causadas por lluvias intensas.	6 días	1/11/2021	8/11/2021	0%
8	Retiro de bajantes de aguas lluvias de 3"	1 día	1/10/2021	1/10/2021	100%
9	Desmonte de puertas existentes en triplex	2 días	9/11/2021	10/11/2021	0%
10	Desmonte de aires acondicionados para poder intervenir áreas afectadas	5 días	24/09/2021	30/09/2021	100%
11	**BAJANTE DE A.LL**	**2 días**	**5/10/2021**	**6/10/2021**	**100%**
12	Suministro e instalacion de BALL de 4 "en reemplazo de las bajantes retiradas de 3"para aumnetar el recibo de Caudal que es insuficiente	2 días	5/10/2021	6/10/2021	100%
13	Suministro e instalación de rejillas tipo granada de 4"	1 día	6/10/2021	6/10/2021	100%
14	**CIELORASOS**	**12 días**	**14/10/2021**	**29/10/2021**	**92%**
15	Suministro e instalacion de Cieloraso en PVC,	12 días	14/10/2021	29/10/2021	92%
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS**	**21 días**	**11/10/2021**	**8/11/2021**	**32%**
17	Reinstalacion de lamparas existentes	4 días	1/11/2021	4/11/2021	0%
18	Suministro e instalacion de malla polo a tierra	7 días	11/10/2021	19/10/2021	100%
19	Reinstalación de aires acondicionados	6 días	1/11/2021	8/11/2021	0%
20	Revisión general red electrica existente,voz y datos	5 días	1/11/2021	5/11/2021	0%
21	**CUBIERTAS Y PLACAS**	**19 días**	**22/09/2021**	**18/10/2021**	**100%**
22	Mortero impermeabilizado sobre placa cubierta para evitar los ingresos de agua hacia el interior del edificio	4 días	7/10/2021	12/10/2021	100%
23	Recorrido general de cubiertas en piso dos	2 días	22/09/2021	23/09/2021	100%
24	Impermeabilizante sobre mortero TIPO SIKAFILLPOWER para sellado completo de placa incluye medias cañas	4 días	13/10/2021	18/10/2021	100%
25	**REVOQUES IMPERMEABILIZADOS EN MUROS Y FACHADAS**	**9 días**	**9/11/2021**	**19/11/2021**	**9%**
26	Revoque impermeabilizado de muros afectados por humedad interna .	4 días	9/11/2021	12/11/2021	17%
27	Revoques impermeabilizados en fachadas	5 días	15/11/2021	19/11/2021	2%
28	**ESTUCO Y PINTURA**	**38 días**	**10/11/2021**	**31/12/2021**	**1%**
29	Estuco y pintura muros intervenidos en revoque	7 días	10/11/2021	18/11/2021	9%
30	repinte general muros internos dos manos con pintura vinilo tipo 1	12 días	12/11/2021	29/11/2021	0%
31	Estuco y pintura tipo koraza para interperie, en muros en fachada piso uno	14 días	10/12/2021	29/12/2021	0%
32	Estuco y pintura tipo koraza para interperie, en muros en fachada piso dos	11 días	17/12/2021	31/12/2021	0%
33	**CARPINTERIA DE MADERA**	**8 días**	**16/11/2021**	**25/11/2021**	**0%**
34	Puertas en post formado RH ,80*2,10 incluyen chapas	8 días	16/11/2021	25/11/2021	0%
35	Puertas dobles en post formado RH incluyen chapas	4 días	18/11/2021	23/11/2021	0%
36	**CARPINTERIA METALICA**	**15 días**	**19/11/2021**	**9/12/2021**	**0%**
37	Revisión y sellamiento general para evitar ingresos de agua de ventaneria metalica y de aluminio	15 días	19/11/2021	9/12/2021	0%
38	Suministro e instalación de celosias en ventaneria escaleras	3 días	22/11/2021	24/11/2021	0%
39	**REVISION GENERAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**7 días**	**15/11/2021**	**23/11/2021**	**0%**
40	Revision general de instalaciones hidrosanitarias y baterias de baños	7 días	15/11/2021	23/11/2021	0%
41	**ASEO GENERAL**	**2 días**	**30/12/2021**	**31/12/2021**	**0%**
42	Aseo general area intervenida,incluye retiro de escombros	2 días	30/12/2021	31/12/2021	0%

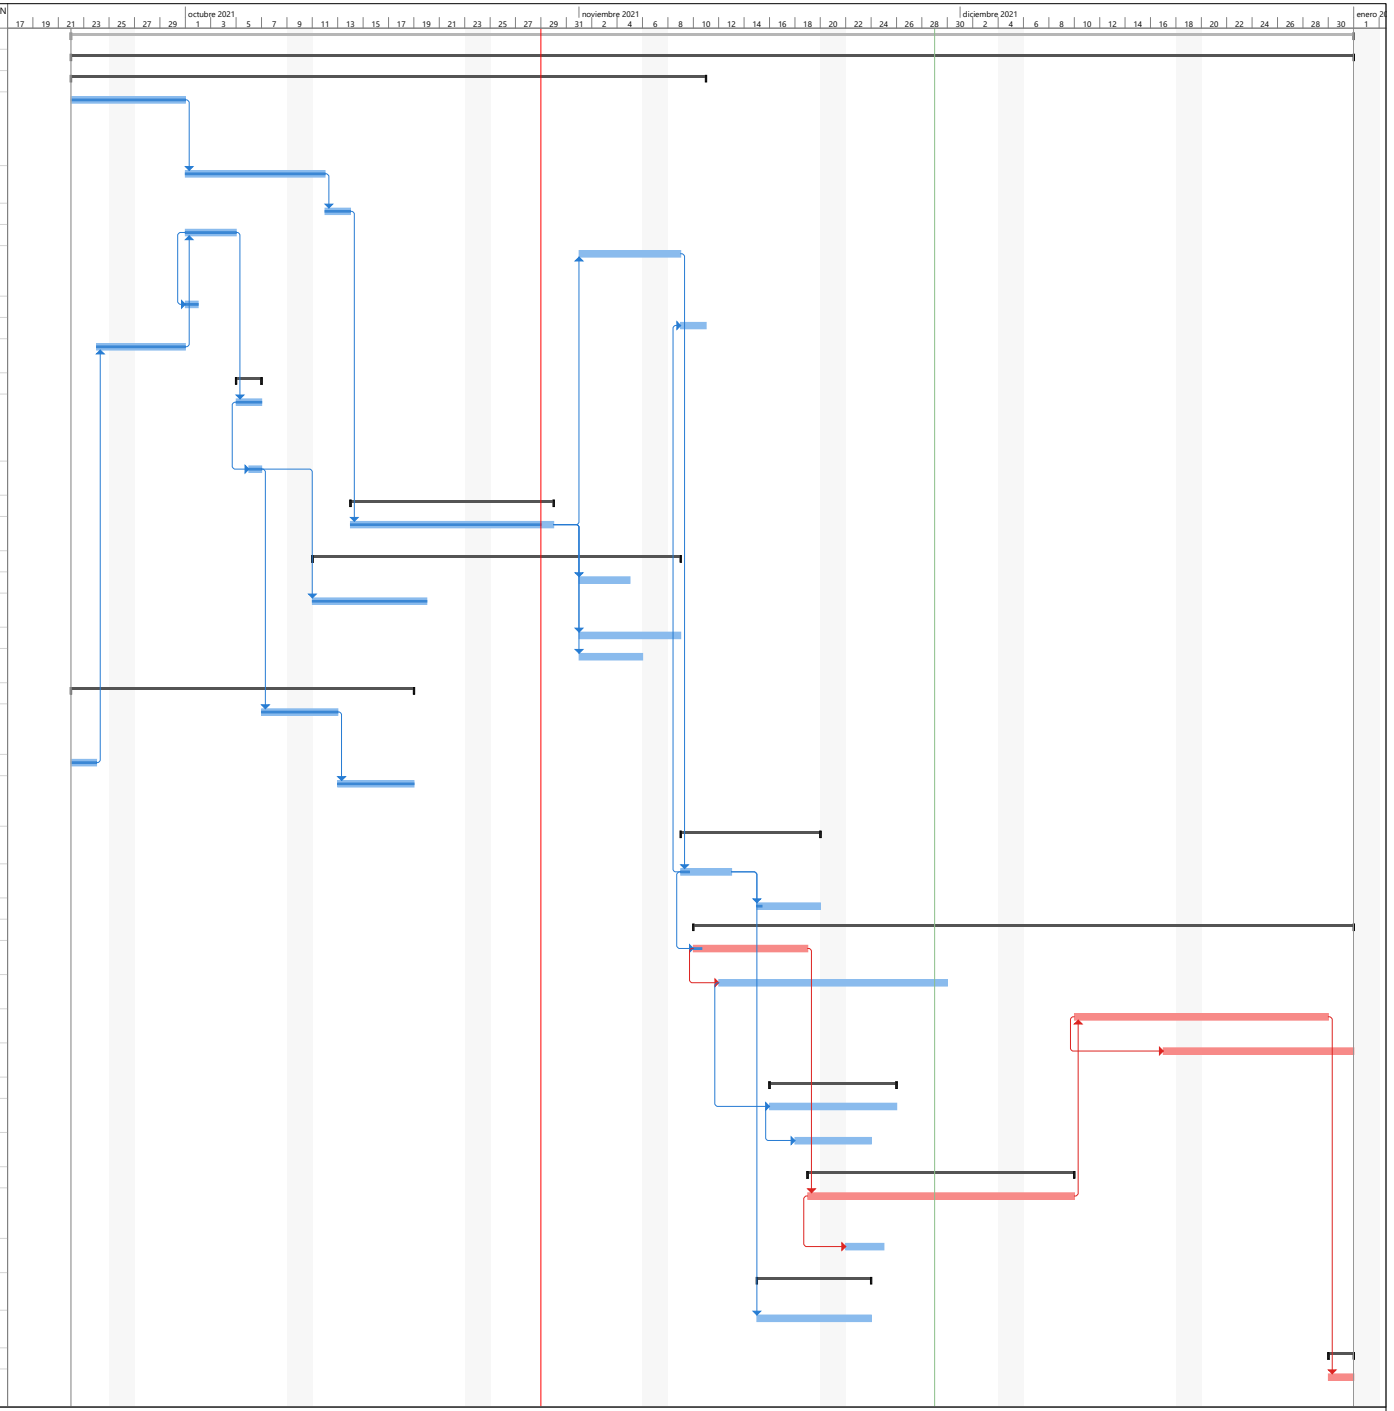

Proyecto: Programación ICBF C
Fecha: 29/11/2021

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas criticas
División critica
Progreso
Progreso manual
