SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable	INFORME FINAL CONTRATO	CODIGO : F-OP-026 REVISION No : 02 FECHA : 17/11/2020



CONTRATO No:	**85001122021**	**CONTRATANTE:**	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CASANARE	**CICLO:**	2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL ICBF REGIONAL CASANARE, EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, VILLANUEVA Y PAZ DE ARIPORO Y LIMPIEZA DE VIGA CANALES DE LA REGIONAL Y CZ YOPAL, CON EL FIN DE PREVENIR RIESGOS PARA LA SALUD DE TRABAJADORES DEL ICBF Y USUARIOS QUE ASISTAN A LAS INSTALACIONES				
FECHA TERMINACION:	10/12/2021	**VALOR :**	$ 9.183.169	**SUPERVISOR:**	DIANA MILENA CATAÑO GOMEZ
FECHA DE SERVICIO	Noviembre 20 de 2021	**LUGAR:**	Centro Zonal de Paz de Ariporo		

Iten	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
3	**Servicio de fumigación Control plagas y roedores - Centro Zonal Paz de Ariporo / 760 (M2)** **Fecha de Servicio: 20-Nov-2021** **Cl 7 N0. 10-46**	**Se realizar diagnóstico de situación en las Instalaciones;** Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua, Se evidencia drenajes con rejilla, Ventanas y puertas exteriores se mantienen cerradas, Se observan recipientes separados para clasificación de residuos generando condiciones físicas y medioambientales adversas para la proliferación de plagas. En inspección visual se observa precencia de mosquitos y hormigas, en entrevista con personal de seguridad fisica refiere presencia de roedores.
		Control de Vectores: Se aplicó por aspersión **FENDONA 60 SC** (Alfacipermetrina) insecticida piretroide de alta residualita, indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores; Registro Sanitario: RGSP: 292-2008 - BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A) Se aplicó en áreas internas de Centro Zonal Paz de Ariporo (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, bodegas, shuts de residuos.)
		DESINFECCION DE AMBIENTES Se realizó aplicación de solución desinféctate de PURSUE (Sales de amonio cuaternario de Quita Generación). A una concentración de 380 ppm. (10ml/Litro Agua) para la elimienacion de hongos virus y vacterias en áreas internas de oficinas, baños, cafeteria, archivo por el metodo de nebulizacion en frio.
		En **CONTROL DE ROEDORES**: Se colocaron Cebos Rodenticidas parafinados de **RATUNET BLOQUE** (Brodifacuoma 0.005%) Es un anticoagulante monodósico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día, Se instalaron 8 cebaderos en PVC con 2 unidades en área internas de archivo y shut de residuos.
		Registro Fotografico





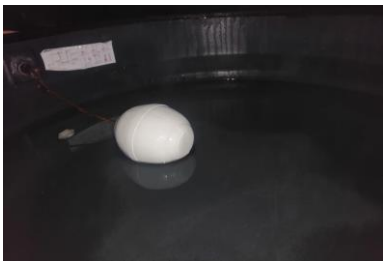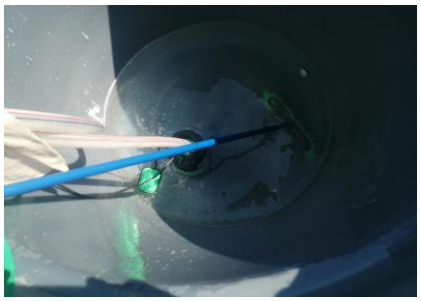


8	Centro Zonal Paz de Ariporo: Servicio de lavado y desinfección tanque de 250 lt - Nivel + 0,0 / 2 (UN) **Fecha de Servicio: 20-Nov-2021**	Se verifica estado físico de tanque buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Tanque en buen estado.
		Se retirar la tapa de del tanque permitiendo la aireación, se cierra válvula de ingreso de agua y se abren válvulas de salida hasta alcanzar Nivel mínimo y vaciar tuberías.
		Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.
		Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento adecuado.
	Registro Fotografico	
	    	
9	Centro Zonal Paz de Ariporo: Servicio de lavado y desinfección tanque de 1000 lt - Nivel + 2,0 / 4 (UN) **Fecha de Servicio: 20-Nov-2021**	Se verifica estado físico de tanque buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Tanque en buen estado.
		Se retirar la tapa de del tanque permitiendo la aireación, se cierra válvula de ingreso de agua y se abren válvulas de salida hasta alcanzar Nivel mínimo y vaciar tuberías.
		Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.
		Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento adecuado.
	Registro Fotografico	
	   	

JOSE MERARY ACOSTA ROA
Supervisor
Soambientales S.A.S
