PROCESO

**INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA**

SUBPROCESO

**CONSULTORÍA**

TITULO

**INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°** | **2** | | **29/08/2021** (de/mm/yyyy) | **AL:** | **4/09/2021** (dd/mm/yyyy) |
| **CONTRATO DE OBRA Nº** | **795 DE 2021** | **CONTRATISTA:** | **AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S** | | |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA Nº** | **798 DE 2021** | **CONTRATISTA:** | **CONSTRUMARCA SAS** | | |
| **OBJETO:** | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.".** | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA:** | **20/08/2021** (dd/mm/yyyy) | | | **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:** | **4/02/2022** (dd/mm/yyyy) |
| **FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:** | **20/08/2021** (dd/mm/yyyy) | | | **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:** | **7/03/2022** (dd/mm/yyyy) |

## 1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

**LEGAL:**

La interventoría radicó ante la secretaria distrital de habitat el informe semanal No.01

**TÉCNICO:**

* El componente técnico apoyó al componente social en la reunión de socialización ante la comunidad que se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar, en el territorio conocido como habitarte el día 31 de agosto del 2021.
* Se asitió a reunión convocada por la Secretaria Distrital del Habitat, el día 2 de septiembre de 2021, se contó con la asistencia del personal tecnico de la SDHT,contratista e interventoria; con el fin de presentar el equipo de profesionales que harán parte del proyecto y aclarar dudas sobre los formatos.
*El plan de gestion de calidad presentado por el contratista, se encuentra en revisión de la interventoría.

**SST:**

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas. No se han iniciado actividades de campo.

| IDENTIFICACION MV | ESTADO | FECHA APERTURA | DIRECCION | TCO - TPM | NOMBRES Y APELLIDOS | % DE AVANCE | DÍAS DE ATRASO ENTREGA DE MV | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BLOQUE 8** | | | | | | | | |
| **CIUDAD BOLIVAR** | | | | | | | | |
| MVJA_2830 | | | KR 18M BIS 62 16 SUR | JALISCO | MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA | | | |
| MVCB_5209 | | | DG 69Q SUR 18N 73 | HABITARTE 2019-MV | MARCELINDA MURCIA | | | |
| MV_04993 | | | CL 70T SUR 27C 23 MJ 1 | CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE | ROSALBINA ZABALA MENDOZA | | | |
| MVJA_1378 | | | CL 65 SUR 18N 47 | TRANSICION - JALISCO | JOSE GONZALO HILARION PARRA | | | |
| MVJA_1460 | | | CL 65B SUR 18M 16 | TRANSICION - JALISCO | WILSON MAURICIO BRICEÑO | | | |
| MVJA_3226 | | | KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | CARMEN ROSA ACUNA PEREZ | | | |
| MVJA_3228 | | | KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | FRANZ GARRY PARRA ROJAS | | | |
| MVJA_3235 | | | KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | FLOR ALBA BUCURU HERRADA | | | |
| MVJA_3285 | | | KR 18P BIS B 61A 84 SUR | TRANSICION - JALISCO | LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA | | | |
| MVJA_1786 | | | DG 64 BIS SUR 19 23 | TRANSICION - JALISCO | GEORGINA SALAZAR | | | |
| MVJA_2797 | | | KR 18M BIS 61B 13 SUR | TRANSICION - JALISCO | LUZ MILA VASQUEZ PAEZ | | | |
| MVJA_2899 | | | KR 18N 61A 64 SUR | TRANSICION - JALISCO | JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ | | | |
| MVJA_3227 | | | KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO | | | |
| MVJA_0571 | | | CL 62A SUR 18N 15 | TRANSICION - JALISCO | RITO JULIO ROJAS SAENZ | | | |
| MVJA_2733 | | | KR 18M 62A 20 SUR | TRANSICION - JALISCO | MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA | | | |
| MVJA_2920 | | | KR 18N 62 49 SUR | TRANSICION - JALISCO | FERNANDO CRUZ ORTEGON | | | |
| MVJA_3139 | | | KR 18P 62A 24 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS | | | |
| MVJA_3399 | | | KR 18Q 63D 18 SUR | TRANSICION - JALISCO | PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ | | | |
| MVJA_0387 | | | CL 62 SUR 18K 59 | TRANSICION - JALISCO | MARTIN MEDINA BERRIO | | | |
| MVJA_0538 | | | CL 62A SUR 18L 39 | TRANSICION - JALISCO | DORIS VASQUEZ | | | |
| MVJA_2721 | | | KR 18M 62 54 SUR | TRANSICION - JALISCO | MICHAEL STIVEN CAMACHO VEGA | | | |
| MVJA_0277 | | | CL 61D SUR 18R 54 | TRANSICION - JALISCO | DIOSELINA FLOREZ MONTES | | | |
| MVJA_0853 | | | CL 63A SUR 18R 13 | TRANSICION - JALISCO | RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO | | | |
| MVJA_0964 | | | CL 63D SUR 18K 38 | TRANSICION - JALISCO | MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVJA_3328 | | | KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA | | | |
| MVJA_4354 | | | TV 18Q BIS D 61B 52 SUR | TRANSICION - JALISCO | ALICIA ALMARIO NUNEZ | | | |
| MVJA_2340 | | | KR 18J BIS 63D 20 SUR | TRANSICION - JALISCO | MANUEL ANTONIO ROMERO LEON | | | |
| MVJA_2772 | | | KR 18M 64A 17 SUR | TRANSICION - JALISCO | ROSA RUBIANO OCHOA | | | |
| MVJA_3293 | | | KR 18P BIS B 61C 11 SUR | TRANSICION - JALISCO | GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ | | | |
| MVJA_3385 | | | KR 18Q 63A 15 SUR | TRANSICION - JALISCO | SONIA JANETH PAEZ | | | |
| MVJA_4378 | | | TV 18R 61B 51 SUR | TRANSICION - JALISCO | LUZ DARY GUAPACHA LARGO | | | |
| MVJA_4328 | | | TV 18Q BIS B 61B 76 SUR | TRANSICION - JALISCO | SOR MARIA GOMEZ NARANJO | | | |
| MVCB_1762 | | | CL 70K SUR 18N 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | GILMA MARIA GODOY DE NEIRA | | | |
| MVCB_1823 | | | CL 70K BIS SUR 18N 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CANDELARIA GUERRERO DE PARDO | | | |
| MVCB_1833 | | | CL 70K SUR 18N 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO | | | |
| MVCB_1834 | | | CL 70K SUR 18N 09 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS | | | |
| MVCB_5202 | | | DG 69Q BIS SUR 18N 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA TERESA CHAVARRO PARRA | | | |
| MVCB_5254 | | | DG 69Q BIS SUR 18N 51 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO | | | |
| MVCB_2431 | | | KR 18M BIS 69A 76 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA | | | |
| MVCB_2474 | | | KR 18L BIS B 69A 77 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CONSUELO RAMIREZ | | | |
| MVCB_2597 | | | KR 18L BIS B 69A 40 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA DE JESUS SAMACA DE PIRAGAUTA | | | |
| MVCB_3012 | | | KR 18M BIS A 69A 77 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO | | | |
| MVCB_3019 | | | KR 18M BIS A 69A 74 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA SULINDA VILLAMIL CANOM | | | |
| MVCB_3032 | | | KR 18M BIS 69A 89 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARLENY JARAMILLO ROMERO | | | |
| MVCB_5179 | | | CL 69P BIS A SUR 18N 16 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA MAGDALENA LONDOBO DE POSADA | | | |
| MVCB_2176 | | | CL 69B BIS A SUR 18R 39 | TRANSICION HABITARTE 2019 | SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ | | | |
| MVCB_2192 | | | KR 18R BIS 69B 29 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA | | | |
| MVCB_5416 | | | CL 70C SUR 18R 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA | | | |
| MVCB_5418 | | | KR 18R 70C 05 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | IDOLFO AGUILAR ESCOBAR | | | |
| MVCB_5419 | | | CL 70C SUR 18R 11 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO | | | |
| MVCB_5430 | | | CL 70D SUR 18R 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA | | | |
| MVCB_5434 | | | CL 70D SUR 18R 29 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ALFONSO GARCIA GARAVITO | | | |
| MVCB_5435 | | | CL 70F SUR 18R 04 | TRANSICION HABITARTE 2019 | FLOR ELIZA ORTIZ FORERO | | | |
| MVCB_2963 | | | DG 69A BIS D SUR 18M 18 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS | | | |
| MVCB_2966 | | | DG 69A BIS D SUR 18M 32 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JENIFER JARAMILLO BOLIVAR | | | |
| MVCB_2968 | | | DG 69A BIS D SUR 18M 40 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROBERTO ANTONIO ISAZA | | | |
| MVCB_2971 | | | TV 18M BIS B 69A 53 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ PATRICIA MORALES | | | |
| MVCB_2972 | | | TV 18M BIS B 69A 57 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ DARY ROBAYO RAMIREZ | | | |
| MVCB_2973 | | | TV 18M BIS B 69A 61 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MARINA CASTILLO ANGEL | | | |
| MVCB_5106 | | | TV 18P BIS 69L 27 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SANDRA MILENA RUIZ VILLAMIL | | | |
| MVCB_5117 | | | TV 18P BIS 69N 09 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | DEISY PAOLA RAMIREZ ROMERO | | | |
| MVCB_5329 | | | TV 18N BIS 69R 21 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | HERCILIA SOTELO VEGA | | | |
| MVCB_5338 | | | TV 18N BIS 69R 50 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SAULINA DEL TRANSITO AREVALO BUITRAGO | | | |
| MVCB_5339 | | | TV 18N BIS 69R 40 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA ANUNCIACION JIMENEZ DE AGREDO | | | |
| MVCB_5342 | | | TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ASCENCION MELO FERRUCHO | | | |
| MVCB_2465 | | | DG 69A BIS C SUR 18L 85 | TRANSICION HABITARTE 2019 | DEISY LIZCANO CORNELIO | | | |
| MVCB_2471 | | | DG 69A BIS C SUR 18L 51 | TRANSICION HABITARTE 2019 | AMPARO OSPINA ORTIZ | | | |
| MVCB_2599 | | | KR 18L BIS B 69A 28 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ | | | |
| MVCB_2769 | | | KR 18L BIS B 69A 41 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SEGUNDO OCTAVIO SIERRA | | | |
| MVCB_2772 | | | DG 69A BIS C SUR 18L 78 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BETULIA SANCHEZ ARDILA | | | |
| MVCB_2912 | | | DG 69A BIS B SUR 18M 10 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA JOAQUINA NINO DE TORRES | | | |
| MVCB_3002 | | | DG 69A BIS B SUR 18M 03 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS | | | |
| MVCB_5163 | | | CL 69P SUR 18N 40 | TRANSICION HABITARTE 2019 | FABIO ALEJANDRO AVELLANEDA AVELLANEDA | | | |
| MVCB_5270 | | | DG 69Q SUR 18N 43 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ALEJANDRINA RODRIGUEZ PALACIO | | | |
| MVCB_5279 | | | TV 18N BIS A 69Q 48 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ | | | |
| MVCB_5281 | | | TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROSALBA CHAVARRO PARRA | | | |
| MVCB_1368 | | | CL 70J SUR 18L 35 | TRANSICION HABITARTE 2019 | OTILIA PICO BARRERA | | | |
| MVCB_1392 | | | CL 70J SUR 18L 70 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ GILMA CUCUNUBA BARRERA | | | |
| MVCB_1551 | | | KR 18N 70I 24 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LORENA AVILA SUAREZ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVCB_1552 | | | KR 18N 70I 14 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA | | | |
| MVCB_1554 | | | CL 70I SUR 18M 21 | TRANSICION HABITARTE 2019 | SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS | | | |
| MVCB_1557 | | | KR 18M 70I 11 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE JOAQUIN PACHECO QUIROGA | | | |
| MVCB_3025 | | | KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES | | | |
| MVCB_3479 | | | TV 18P BIS 69A 36 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SARA ELISA PRIETO CASTILLO | | | |
| MVCB_3606 | | | TV 18N BIS A 69A 62 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MARINA ZULETA OROZCO | | | |
| MVCB_5451 | | | KR 19A 70D 15 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA | | | |
| MVCB_5453 | | | KR 19F 70C 54 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | EMELINA PALACIOS MATEUS | | | |
| MVCB_5521 | | | CL 70C SUR 19G 06 | TRANSICION HABITARTE 2019 | NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO | | | |
| MVCB_2112 | | | KR 18W 69B 06 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | FLOR MIREYA NIVIA CHAVEZ | | | |
| MVCB_1627 | | | KR 19 70H 04 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ELIZABETH ROJAS CARDENAS | | | |
| MVCB_1629 | | | KR 19 70G 16 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | DEISY AREVALO TALERO | | | |
| MVCB_1723 | | | CL 70I SUR 18Q 09 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CECILIA BARATO BETANCOURT | | | |
| MVCB_1769 | | | CL 70J SUR 18N 53 | TRANSICION HABITARTE 2019 | GERARDO VEGA VICTORIA | | | |
| MVCB_2162 | | | KR 18V 68C 91 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | OLGA CECILIA RUIZ | | | |
| MVCB_3266 | | | KR 18U BIS A 68C 23 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUCIA SANCHEZ POBLADOR | | | |
| MVCB_1497 | | | CL 70H SUR 18J 81 | TRANSICION HABITARTE 2019 | PABLO VALBUENA | | | |
| MVCB_1430 | | | CL 70H SUR 18L 45 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUIS ENRIQUE TORRES NIETO | | | |
| MVCB_1434 | | | CL 70H SUR 18L 21 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA | | | |
| MVCB_1446 | | | CL 70H SUR 18L 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MARY MAYORGA MACANA | | | |
| MVCB_5204 | | | DG 69Q BIS SUR 18N 60 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ | | | |
| MVCB_5210 | | | DG 69Q SUR 18N 69 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | NANCY DUARTE CALDERON | | | |
| MVCB_5267 | | | TV 18N BIS A 69Q 24 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARBILUZ JAVELA PALOMINO | | | |
| MVCB_5553 | | | DG 69Q SUR 18N 94 | TRANSICION HABITARTE 2019 | NUBIA PALOMINO OSORIO | | | |
| MVCB_2838 | | | DG 69C BIS SUR 18M 84 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA | | | |
| MVCB_2977 | | | TV 18M BIS B 69A 77 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ | | | |
| MVCB_2986 | | | TV 18N 69A 64 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | DORIS GUARIN | | | |
| MVCB_3006 | | | KR 18M BIS B 69A 74 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE EMILIO VARGAS | | | |
| MVCB_5064 | | | TV 18P BIS 69K 08 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MARINA JIMENEZ FONSECA | | | |
| MVCB_5071 | | | TV 18P BIS A 69K 22 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | GRACIELA VELASCO OVALLE | | | |
| MVCB_5086 | | | DG 69L BIS SUR 18P 64 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | GERMAN CASTRO HERNANDEZ | | | |
| MVCB_5091 | | | CL 69L BIS SUR 18N 42 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CARLOS JULIO GOMEZ JIMENEZ | | | |
| MVCB_5100 | | | CL 69N SUR 18P 20 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | MELANIA MANCILLA HERNANDEZ | | | |
| MVCB_5101 | | | CL 69N SUR 18P 24 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JULIA GALINDO RANGEL | | | |
| MVCB_5103 | | | DG 69L BIS SUR 18P 43 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | LAUREANO RODRIGUEZ VASQUEZ | | | |
| MVCB_5116 | | | TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA TERESA GALINDO RANGEL | | | |
| MVCB_5140 | | | CL 69L BIS SUR 18N 59 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | DIANA MATILDE GOMEZJIMENEZ | | | |
| MVCB_5160 | | | CL 69N SUR 18N 29 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE EFRAIN ROMERO RODRIGUEZ | | | |
| MVCB_5167 | | | CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUIS HERNANDO SOSA ACEVEDO | | | |
| MVCB_5168 | | | CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ISABEL PERALTA RUIZ | | | |
| MVCB_2876 | | | DG 69C SUR 18N 15 | TRANSICION HABITARTE 2019 | EDUARDO AREVALO SOSA | | | |
| MVCB_2931 | | | TV 18N 69A 91 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | GLORIA INES VILLAMIL CAÑON | | | |
| MVCB_2937 | | | TV 18N BIS 69A 92 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | BETULIA ARIZA MORENO | | | |
| MVCB_3639 | | | TV 18N BIS 69A 67 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SALOMON TRIANA SALGUERO | | | |
| MVCB_2122 | | | KR 18W 68C 40 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CARLOS JULIO JEREZ BLANCO | | | |
| MVCB_2151 | | | KR 18V 68C 51 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | NUBIA STELLA ALARCON MORALES | | | |
| MVCB_5217 | | | CL 69Q SUR 18P 12 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MARINA TRIANA DE SOSA | | | |
| MVCB_1741 | | | CL 70J SUR 18N 26 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ORLANDO VELASCO ARDILA | | | |
| MVCB_1743 | | | CL 70J SUR 18N 40 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ERNESTO TENORIO SANCHEZ | | | |
| MVCB_1744 | | | CL 70J SUR 18N 48 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ | | | |
| MVCB_2547 | | | KR 18K 70B 16 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA MERCEDES HUERTAS | | | |
| MVCB_2645 | | | CL 70C SUR 18I 95 | TRANSICION HABITARTE 2019 | NORA TERESA PENAGOS CAYCEDO | | | |
| MVCB_2649 | | | CL 70C SUR 18I 79 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARCO AURELIO BERNAL RIVERA | | | |
| MVCB_2663 | | | CL 70D SUR 18I 91 | TRANSICION HABITARTE 2019 | FREDY ALEXANDER ORDOÑEZ GALINDO | | | |
| MVCB_1115 | | | DG 69D SUR 18J 51 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ZORAIDA VERA | | | |
| MVCB_1116 | | | DG 69D SUR 18J 47 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JESUS ELIAS AYALA GUZMAN | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVCB_1152 | | | DG 69D BIS SUR 18J 39 | TRANSICION HABITARTE 2019 | FLORALBA AVILA | | | |
| MVCB_1248 | | | CL 70N SUR 18L 84 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA OLIVA BUSTOS | | | |
| MVCB_1257 | | | CL 70M SUR 18L 71 | TRANSICION HABITARTE 2019 | QUERUBIN OSPINA | | | |
| MVCB_1353 | | | CL 70K SUR 18L 68 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BEATRIZ PATIÑO ARDILA | | | |
| MVCB_1447 | | | TV 18M 70G 16 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | VITALIA CARDENAS DUCUARA | | | |
| MVCB_1536 | | | KR 18M 70M 05 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO PRECIADO | | | |
| MVCB_5079 | | | TV 18R 69K 04 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ | | | |
| MVCB_5325 | | | DG 69R SUR 18N 31 | TRANSICION HABITARTE 2019 | GILMA TULIA RUIZ | | | |
| MVCB_5406 | | | CL 70D SUR 18R 42 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ | | | |
| MVCB_5410 | | | KR 19D BIS 70C 10 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ | | | |
| MVCB_5556 | | | TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS | | | |
| MVCB_2866 | | | DG 69C SUR 18N 59 | TRANSICION HABITARTE 2019 | FABIO OLAYA CIFUENTES | | | |
| MVCB_2965 | | | DG 69A BIS D SUR 18M 28 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA GLADYS LAVERDE | | | |
| MVCB_3008 | | | KR 18M BIS B 69A 64 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA ORFILIA RAYO ROJAS | | | |
| MVCB_3013 | | | KR 18M BIS A 69A 83 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES | | | |
| MVCB_3171 | | | KR 18R 69 75 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ARCICIO ALFONSO FORERO | | | |
| MVCB_3580 | | | TV 18N BIS A 69A 53 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO | | | |
| MVCB_3582 | | | TV 18N BIS A 69A 57 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | AMIRA YANETH VEGA BUITRAGO | | | |
| MVCB_5250 | | | TV 18P 69Q 18 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | YHON ALEXANDER PEREZ PULIDO | | | |
| MVCB_5399 | | | CL 70C SUR 18R 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | RODRIGO DELGADO | | | |
| MVCB_5407 | | | CL 70D SUR 18R 48 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO | | | |
| MVCB_5411 | | | KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ | | | |
| MVCB_5414 | | | CL 70C SUR 18R 41 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA | | | |
| MVCB_5421 | | | CL 70D SUR 19A 16 | TRANSICION HABITARTE 2019 | VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL | | | |
| MVCB_5417 | | | CL 70C SUR 18R 17 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ | | | |
| MVCB_1612 | | | CL 70F SUR 18N 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | RUBIANO SANCHEZ MENDEZ | | | |
| MVCB_1792 | | | KR 18R 70K 27 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ELDA INES CANDELA ZABALA | | | |
| MVCB_2976 | | | TV 18M BIS B 69A 73 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ARCENETH OLAYA TABORDA | | | |
| MVJA_2105 | | | DG 64A SUR 19B 39 | TRANSICION - JALISCO | MARIA DEL TRANSITO POLANIA CRUZ | | | |
| MVJA_0307 | | | CL 62 BIS SUR 18K 10 | TRANSICION - JALISCO | DAGOBERTO RODRIGUEZ CANTOR | | | |
| MVJA_0369 | | | CL 62 SUR 18J 70 | TRANSICION - JALISCO | JOSE LEOPOLDO PEÑALOZA | | | |
| MVJA_0917 | | | CL 63C SUR 18P 05 | TRANSICION - JALISCO | ERNESTO TIBANA BLANCO | | | |
| MVJA_3405 | | | KR 18Q BIS 63A 20 SUR | TRANSICION - JALISCO | MARY INGRE MILENA | | | |
| MVJA_0261 | | | CL 61D SUR 18P 12 IN 11 | TRANSICION - JALISCO | MARIA DE LOS ANGELES SILVA DUQUE | | | |
| MVJA_2915 | | | KR 18N 62 24 SUR | TRANSICION - JALISCO | MARIA MAGDALENA GALEANO | | | |
| MVJA_4290 | | | TV 18Q BIS 61B 40 SUR | TRANSICION - JALISCO | BLANCA YANET SABOGAL ARDILA | | | |
| MVJA_4299 | | | TV 18Q BIS A 61A 13 SUR | TRANSICION - JALISCO | DORA CECILIA ACOSTA CASTAÐEDA | | | |
| MVJA_2438 | | | KR 18K BIS 61 31 SUR | TRANSICION - JALISCO | BLANCA LEONOR AVENDANO | | | |
| MVJA_2512 | | | KR 18L 61B 26 SUR | TRANSICION - JALISCO | ALEX ARNULFO OLAYA DURAN | | | |
| MVJA_0316 | | | CL 62 BIS SUR 18K 28 | TRANSICION - JALISCO | MARIA EBELIA LEAL | | | |
| MVJA_0187 | | | CL 61C SUR 18N 09 | TRANSICION - JALISCO | OVIDIO GOMEZ VARGAS | | | |
| MVJA_3144 | | | KR 18P 62A 39 SUR MJ | TRANSICION - JALISCO | CELIA ROMERO DUARTE | | | |
| MVJA_1265 | | | CL 64D SUR 18M 20 | TRANSICION - JALISCO | DIANA MARCELA MRTINEZ RODRIGUEZ | | | |
| MVJA_2536 | | | KR 18L 63D 17 SUR | TRANSICION - JALISCO | GRACIELA CARBONEL DE GUZMAN | | | |
| MV_42760-IDU | | | CALLE 71 I BIS SUR 27A-05 | TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-TRANSICION - CIUDAD | NELSON DARIO GUERRERO CASTEBLANCO | | | |
| MV_42764-IDU | | | CARRERA 27F 71D 34 SUR | TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-TRANSICION - CIUDAD | FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO | | | |
| MV_42802-IDU | | | CL 71G BIS SUR 27A 33 | TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-TRANSICION - CIUDAD | JOSE RICARDO GARZON MENDEZ | | | |
| MV_42803-IDU | | | CARRERA 27D 71D-58SUR | TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL- | EDWIN ANDRES CASTRO | | | |
| MVCB_1118 | | | DG 69D SUR 18J 39 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOHN RAMIREZ MALDONADO | | | |
| MVCB_1119 | | | DG 69D SUR 18J 35 | TRANSICION HABITARTE 2019 | NOEMI MALDONADO DE RAMIREZ | | | |
| MVCB_1163 | | | KR 18J 69F 23 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO | | | |
| MVCB_1216 | | | DG 69G SUR 18J 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | YORMARY GALINDO ORDOÑEZ | | | |
| MVCB_1268 | | | CL 70M SUR 18L 50 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MONICA CRISTINA PEREZ BARRIGA | | | |
| MVCB_1269 | | | CL 70M SUR 18L 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA DORIS SEGURA | | | |
| MVCB_1270 | | | CL 70M SUR 18L 58 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LILIA CUCUNUBA DE CRUZ | | | |
| MVCB_1370 | | | CL 70J SUR 18L 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CARLOS JULIO MURILLO RODRIGUEZ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVCB_1422 | | | CL 70I SUR 18L 60 | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA SILVIA CRUZ RAMIREZ | | | |
| MVCB_1444 | | | CL 70H SUR 18L 40 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ | | | |
| MVCB_1445 | | | CL 70H SUR 18L 46 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUIS ALONSO MORA MEJIA | | | |
| MVCB_1569 | | | KR 18R 70F 21 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO | | | |
| MVCB_1596 | | | CL 70F SUR 18N 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | RUTH ORJUELA DE TAPIERO | | | |
| MVCB_1602 | | | CL 70G SUR 18N 28 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA | | | |
| MVCB_1676 | | | CL 70I SUR 18N 08 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ | | | |
| MVCB_1727 | | | KR 18Q 70J 08 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ENRIQUE SABINO LEON BARRETO | | | |
| MVCB_1736 | | | KR 18P 70J 03 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | SIXTO ALFONSO LAITON COY | | | |
| MVCB_1753 | | | CL 70I SUR 18N 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ | | | |
| MVCB_1782 | | | CL 70K SUR 18Q 14 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | GLICERIO RODRIGUEZ | | | |
| MVCB_1790 | | | KR 18Q 70J 05 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA JULIA BERNAL BELLO | | | |
| MVCB_3462 | | | TV 18P BIS 69A 88 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE MIGUEL GUZMAN | | | |
| MVCB_3505 | | | TV 18P 69A 25 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CHARLIE EDGARDO GARCIA CABALLERO | | | |
| MVCB_5115 | | | CL 69N SUR 18P 19 | TRANSICION HABITARTE 2019 | VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ | | | |
| MVCB_5119 | | | CL 69P BIS C SUR 18P 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE ANTONIO VEGA | | | |
| MVCB_5126 | | | CL 69N SUR 18N 40 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | HERNANDO GONZALEZ LOZANO | | | |
| MVCB_5145 | | | CL 69P SUR 18N 42 | TRANSICION HABITARTE 2019 | WILSON CORTES CONTRERAS | | | |
| MVCB_5165 | | | TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON | | | |
| MVCB_5249 | | | DG 69R SUR 18N 66 | TRANSICION HABITARTE 2019 | GLORIA PRIETO CASTRO | | | |
| MVCB_5316 | | | TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ | | | |
| MVCB_5462 | | | CL 70C SUR 19B 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO | | | |
| MVCB_5477 | | | KR 19C BIS 70C 56 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUCRECIA LARIN LOZANO | | | |
| MVCB_2554 | | | CL 70B SUR 18J 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARY NATALY BECERRA GOMEZ | | | |
| MVCB_2556 | | | CL 70B SUR 18J 15 | TRANSICION HABITARTE 2019 | EDILIA CHACON MORA | | | |
| MVCB_5182 | | | TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA ISABEL MORENO FONSECA | | | |
| MVCB_5290 | | | DG 69T SUR 18P 40 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE MANUEL CASTRO | | | |
| MVCB_5322 | | | TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS | | | |
| MVCB_5345 | | | TV 18N 69R 43 SUR MJ 3 | TRANSICION HABITARTE 2019 | YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES | | | |
| MVCB_5347 | | | TV 18N 69R 55 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | ISMAEL CRUZ FIERRO | | | |
| MVCB_5392 | | | CL 70B SUR 18R 47 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA | | | |
| MVCB_1475 | | | CL 70G SUR 18K 33 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MIGUEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ | | | |
| MVCB_1324 | | | CL 70K SUR 18L 45 | TRANSICION HABITARTE 2019 | SUSANA REYES DE SÁNCHEZ | | | |
| MVCB_1340 | | | CL 70K SUR 18L 16 | TRANSICION HABITARTE 2019 | YOLANDA VARGAS ESPAÑA | | | |
| MVCB_1401 | | | CL 70I SUR 18L 69 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO | | | |
| MVCB_1605 | | | CL 70G SUR 18N 44 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA ACOSTA USECHE | | | |
| MVCB_1888 | | | KR 18N 70L 05 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ EDITH GARCIA SOZA | | | |
| MVCB_2149 | | | KR 18V 68C 47 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ISAÍ GARZÓN CLAVIJO | | | |
| MVCB_2644 | | | CL 70C SUR 18I 99 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA AMPARO TORRES ARIAS | | | |
| MVCB_2964 | | | DG 69A BIS D SUR 18M 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | AURA CECILIA ANTOLINEZ | | | |
| MVCB_2975 | | | TV 18M BIS B 69A 69 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | PEDRO DE ALCANTARA REYES | | | |
| MVCB_3162 | | | KR 18R 69 09 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CLARAIBEL MORENO FERRUCHO | | | |
| MVCB_3545 | | | TV 18P 69A 46 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARTHA VICTORIA MENDEZ | | | |
| MVCB_3576 | | | TV 18N BIS A 69A 39 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA FLOR RAMIREZ ESTRADA | | | |
| MVCB_3583 | | | TV 18N BIS A 69A 61 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | RUTH LUCILA TOVAR | | | |
| MVCB_3590 | | | TV 18N BIS A 69A 87 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ | | | |
| MVCB_3617 | | | TV 18N BIS A 69A 26 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | EVELIA MORALES GARCIA | | | |
| MVCB_5455 | | | KR 19C 70C 42 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARIA JACQUELINE ROJAS | | | |
| MVCB_5468 | | | KR 19B 70D 13 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | FLORALBA SIMIJACA CAMACHO | | | |
| MVCB_5488 | | | KR 19F 70C 23 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | INES GALVIS CHAVEZ | | | |
| MVJA_0091 | | | CL 61A SUR 18N 27 | TRANSICION - JALISCO | JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA | | | |
| MVJA_1028 | | | CL 63F SUR 18Q 10 | TRANSICION - JALISCO | BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ | | | |
| MVJA_1405 | | | CL 65 SUR 18R 42 | TRANSICION - JALISCO | CESAR CRUZ MOLANO | | | |
| MVJA_2659 | | | KR 18L BIS A 62A 31 SUR | TRANSICION - JALISCO | LEONILDE RINCON ARIAS | | | |
| MVJA_2714 | | | KR 18M 62 35 SUR | TRANSICION - JALISCO | FERNANDO ANTONIO SIERRA | | | |
| MVJA_3462 | | | KR 18R 61 57 SUR | TRANSICION - JALISCO | REINALDA GAMBOA | | | |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVJA_3713 | | | KR 19 62A 23 SUR | TRANSICION - JALISCO | ANA ADELINA PARRAGA MOYA | | | |
| MVJA_0370 | | | CL 62 SUR 18J 71 | TRANSICION - JALISCO | ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON | | | |
| MVCB_1355 | | | CLL 70K # 18L-76 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ODILIA PRADA DIAZ | | | |
| MVCB_1879 | | | KR 18 P 70 K 36 | TRANSICION HABITARTE 2019 | GRACIELA MEDINA NIÑO | | | |
| MVCB_1911 | | | CRA 18P 70M-42 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO | | | |
| MVCB_2942 | | | TV 18 N BIS 69 A 72 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CRISTINA GARCIA DE ARDILA | | | |
| MVCB_5150 | | | CLL 69 P SUR · 18 P 20 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA NELLY MARTINEZ | | | |
| MVCB_1271 | | | CL 70 M SUR 18 L 62 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA | | | |
| MVCB_2160 | | | KR 18V 68C 83 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | EDILBERTO RIVERA SANCHEZ | | | |
| MVCB_1845 | | | KR 18 P 70 M 04 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUCILA QUIROGA HERNANDEZ | | | |
| MVCB_1868 | | | KR 18P 70L 05 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO | | | |
| MVCB_2705 | | | TV 18Q 69A 64 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | GUILLERMO MORALES SALINAS | | | |
| MVCB_1466 | | | CL 70 H SUR 18J 64 | TRANSICION HABITARTE 2019 | SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL | | | |
| MVCB_2212 | | | CL 69 B BIS A SUR 18 U 35 | TRANSICION HABITARTE 2019 | BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO | | | |
| MVCB_2387 | | | KR 18K BIS 69T 22 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO | | | |
| MVCB_2803 | | | CL 69 C SUR 18 U 63 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE ALEXANDER DIAZ FETIVA | | | |
| MVCB_3088 | | | TV 18 W 69 C 23 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ | | | |
| MVCB_3117 | | | CL 69B BIS SUR 18U 14 | TRANSICION HABITARTE 2019 | MARÍA INÉS CÁRDENAS | | | |
| MVCB_3118 | | | CL 69B BIS SUR 18U 18 | TRANSICION HABITARTE 2019 | LUZ MYRIAM GÓMEZ ARDILA | | | |
| MVCB_5223 | | | CL 69 P BIS C SUR 18P-49 | TRANSICION HABITARTE 2019 | JOSE GUSTAVO GRAJALES | | | |
| MVCB_5398 | | | CALLE 70 C SUR 18R-12 | TRANSICION HABITARTE 2019 | WILLINGTON GUEVARA HUERTAS | | | |
| **RAFAEL URIBE URIBE** | | | | | | | | |
| MV_044 | | | KR 9D 38 24 SUR | LOMAS | ANA BEATRIZ RINCON RAMOS | | | |
| MV_113 | | | KR 9H 37 27 SUR | LOMAS | LUZ HELENA OSORIO CASTRO | | | |
| MV_115 | | | KR 9H 37 35 SUR | LOMAS | LUIS ANTONIO ROPERO ARDILA | | | |
| MV_116 | | | KR 9H 39 05 SUR | LOMAS | PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN | | | |
| MV_124 | | | KR 9H 39 51 SUR | LOMAS | BLANCA INES FIQUE AREVALO | | | |
| MV_148 | | | Cl 41 SUR 10A 74 | LOMAS | JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE | | | |
| MV_152 | | | CL 41 SUR 10A 50 | LOMAS | MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS | | | |
| MV_155 | | | CL 41 SUR 10A 32 | LOMAS | BLANCA CECILIA CALDERON | | | |
| MV_159 | | | CL41 SUR 10A 07 | LOMAS | MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO | | | |
| MV_162 | | | CL 41 SUR 10A 23 | LOMAS | MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO | | | |
| MV_163 | | | CL 41 SUR 10A 27 | LOMAS | LIGIA GIL ARIAS | | | |
| MV_164 | | | CL 41 SUR 10A 31 | LOMAS | GLORIA NANCY VARGAS SUTA | | | |
| MV_202 | | | KR 11A 41 50 SUR | LOMAS | LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ | | | |
| MV_204 | | | KR 11A 41 44 SUR | LOMAS | CARMEN FERNANDEZ GIL | | | |
| MV_209 | | | KR 11A 41 28 SUR | LOMAS | CLARA LUCIA TORRES BUITRAGO | | | |
| MV_213 | | | KR 11A 41 16 SUR | LOMAS | CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA | | | |
| MV_228 | | | KR 11 39 04 SUR | LOMAS | MARIELA TOVAR HERNANDEZ | | | |
| MV_282 | | | KR 10A 36F 40 SUR | LOMAS | FERNANDO REYES BURBANO | | | |
| MV_330 | | | Cl 36 D SUR 11A 65 | LOMAS | ELIAS NIÑO CORREDOR | | | |
| MV_344 | | | CL 36D SUR 11C 47 | LOMAS | JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA | | | |
| MV_361 | | | CL 36F SUR 11C 36 | LOMAS | ROSA HERMINDA RODRIGUEZ GOMEZ | | | |
| MV_398 | | | CL 36F SUR 11A 38 | LOMAS | MARIO COPETE CASTELLANOS | | | |
| MV_415 | | | CL 36F SUR 11A 02 | LOMAS | DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO | | | |
| MV_447 | | | CL 36G SUR 11A 65 | LOMAS | JAIRO ROJAS NIETO | | | |
| MV_462 | | | CL 36 SUR11C 13 | LOMAS | AMPARO OLAYA | | | |
| MV_483 | | | CL 36G SUR 11C 63 | LOMAS | MARIO DELFIN VELASCO | | | |
| MV_500 | | | CL 36H SUR 11C 95 | LOMAS | ELSA REYES BAQUERO | | | |
| MV_506 | | | CL 36H SUR 11C 82 | LOMAS | MARIA MARGARITA CRUZ | | | |
| MV_507 | | | Cl 36H SUR 11C 81 | LOMAS | EDELMIRA RAMIREZ DE ORJUELA | | | |
| MV_512 | | | CL 36H SUR 11C 69 | LOMAS | MARIA GLADYS BRICEÑO MARTINEZ | | | |
| MV_515 | | | CL 36H SUR 11C 63 | LOMAS | LEONOR RINCON CORREDOR | | | |
| MV_520 | | | CL 36H SUR 11C 51 | LOMAS | NUBIA RAMIREZ RUEDA | | | |
| MV_530 | | | CL 36H SUR 11C 28 | LOMAS | MARIA SORAIDA PARRA LEGUIZAMON | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV_532 | | | Cl 36H SUR 11C 23 | LOMAS | GUSTAVO CUESTA AMAYA | | | |
| MV_543 | | | CL 36H SUR 11A 58 | LOMAS | VICTOR MANUEL CARDENAS RINCON | | | |
| MV_546 | | | CL 36H SUR 11A 46 | LOMAS | CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA | | | |
| MV_627 | | | CL 38 SUR 11B 16 | LOMAS | DORA INES RUBIANO | | | |
| MV_748 | | | Cl 40 SUR 11A 60 | LOMAS | MYRIAM MOSQUERA TORRES | | | |
| MV_765 | | | Cl 40 SUR 11A 83 | LOMAS | ANA PAULINA SARMIENTO | | | |
| MV_788 | | | KR 11C 40 17 SUR | LOMAS | LUZ MERY ALVAREZ BELLO | | | |
| MV_091 | | | KR 9 H 39 58 SUR | LOMAS | MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO | | | |
| **BOSA** | | | | | | | | |
| MVBL_1875 | | | CL 66 SUR 89A 77 | BOSA LA LIBERTAD | MARIA LUZ BONILLA | | | |
| | | | | | | 0% | | |

**2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

| | DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE | ADELANTO / ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| | **EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE** | | **0%** | |
| | **PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE** | | **0%** | |
| | **TOTAL VALOR VALIDADO FRENTE DE OBRA** | | **0%** | |

| NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT | NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS | NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR | NUMERO VIVIENDAS APERTURADAS | NUMERO DE VIVIENDAS POR APERTURAR | NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS | NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR | NUMERO DE VIVIENDAS PAGADAS | CASOS ESPECIALES RENUNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **310** | **0** | **310** | **0** | **310** | **0** | **0** |

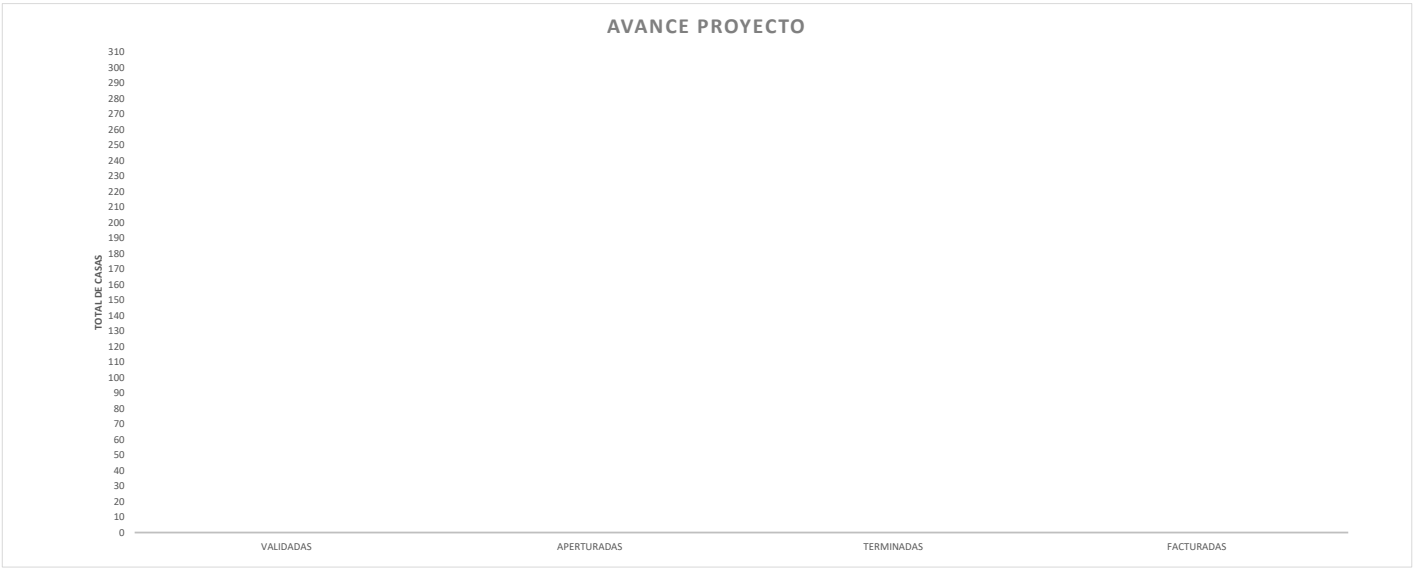

**3. PLAZO**

| Fecha de terminación de ejecución de obra. | | | 4/02/2022 |
|---|---|---|---|
| **CANT. DÍAS** | **Total** | **Transcurrido** | **Faltantes** |
| Contractual | 165 | 15 | 150 |
| Proyección | 165 | 15 | 150 |

**4- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN**

| | Días (atraso/ adelanto) | Fecha Terminación Obra | % Tiempo Transcurrido |
|---|---|---|---|
| Semana Anterior | 0 | 4/02/2022 | 4,85% |
| Semana Actual | 0 | 4/02/2022 | 9,09% |

**5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**JUSTIFICACIÓN:**

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas.
No se han iniciado actividades en territorio, hasta el momento tanto contratista como interventoria está diseñando los planes de trabajo y la organización logística necesaria para iniciar actividades de manera optima.

**6- DESCRIPCIÓN CASOS ESPECIALES**

**7- CONTROL DE COSTOS**

| Detalle | Presupuesto | | Inversión a la Fecha a Corte | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL | $ | | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 5.130.409.981,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | $ 5.130.409.981,00 | | | | | |

**8- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**9- ESTADO DEL TIEMPO**

Interventoría- GRUPO 2
CONTRUMARCA

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha:** 4 de Agosto de 2021. | **Periodo:** 28 de Agosto al 4 de Septiembre de 2021 | **Informe No.:** Semanal No. 002 |
| **Proyecto**: **CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 1 Y 2 - 2021."** | | |
| **Cliente:** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | | **Contrato No.:** 798 del 2021 |

| DATOS DEL PROYECTO | |
|---|---|
| Nº CONTRATO | 798 del 2021 |
| OBJETO | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT GRUPO 1 Y 2-2021. |
| CONTRATISTA | Ambientalmente Ingeniería |
| PLAZO | 5 meses y 15 días |
| FECHA DE INICIO | 20 de agosto del 2021 |
| FECHA FINAL | 4 de febrero del 2022 |
| PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE | LINA ESTEFANIA CELEITA YATE |

## GRUPO 2

### I. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. El día martes 31 de agosto de 2021 se realizó 4 reuniones de inicio de o socialización del proyecto de mejoramiento de vivienda en el sector Habitarte borde rural cable, salón comunal Nueva Colombia donde asistieron en total, 211 beneficiarios. La primera reunión inicio a las 8: 45 AM y asistieron 48 personas, la segunda a las 10: 45 AM, y asistieron 52 personas, la tercera a la 1:15 PM y asistieron 45 personas y la última a las 3:15 PM donde asistieron 45 personas. Faltaron a la reunión 21 personas. La interventoría acompañó esta actividad realizando inicialmente verificación de implementación de protocolo de bioseguridad al momento del ingreso de los asistentes al salón. Por otra parte se verificó que el contratista haya tomado la asistencia de los beneficiarios citados a las reuniones. Se verificó distanciamiento entre las sillas dispuestas para los asistentes. Se tomaron fotos al ingreso, durante el desarrollo de la reunión y la salida solicitando previamente evacuar de manera organizada y por filas para evitar aglomeraciones en la puerta.

b. Objetivo de la Reunión: Realizar la socialización sobre las fases de ejecución de obra del proyecto de mejoramiento de vivienda para los beneficiarios que realizaron todo el proceso de postulación, cumplieron

con los requisitos y fueron seleccionados para ser beneficiados del subsidio de Mejoramiento de vivienda. La Trabajadora Social de la SDHT, recordó algunos de los requisitos como lo es; Contar con cédula de ciudadanía vigente, acreditar la posesión o propiedad de una vivienda, la vivienda no debe estar ubicada en zona de alto riesgo, el barrio en el que se encuentra la vivienda debe estar legalizado, no haber recibido subsidios para adquisición o construcción de vivienda.

c. Seguidamente interviene la Arquitecta Stella Acevedo, para hacer referencia al decreto 145 de 2021 el cual establece los lineamientos para el desarrollo del programa de mejoramiento de vivienda en la ciudad de Bogotá, por otra parte menciona que las mejoras que se pretenden llevar a cabo en las viviendas de las familias beneficiadas serán locativas como: enchape, pintura, pañete, alistados de piso, instalación de puertas en los baños. Por lo anterior la funcionaria recuerda que el programa, no interviene nada estructural. Existen unos espacios priorizados en todas las viviendas y que se pueden verificar o cambiar en la fase de validación la intervención en dichos espacios buscan mejorar las condiciones habitacionales y de vida del beneficiario o beneficiaria.

d. Los espacios priorizados para ejecutar las obras de mejora son: cocina, baño, reemplazo de cubierta este último, siempre y cuando la vivienda lo permita, habitación del beneficiario, si el presupuesto alcanza, se intervendrán otros espacios de la vivienda como el área social o escaleras. Se recordó a la comunidad que este subsidio que otorga el distrito tiene un tope hasta de 18 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) sin embrago a Trabajadora Social Isabel Serrano de la SDHT, explica que no en todas las viviendas se va a ejecutar el total del subsidio precisamente porque no todas las viviendas tienen las mismas necesidades, por esta razón es posible que en algunas casas se ejecute menos de los 18 (SMMLV). Estas necesidades son determinadas desde la parte técnica.

e. La Trabajadora Social de la SDHT Isabel Serrano, manifiesta que para este momento, el programa se encuentra en la etapa 4 llamada ejecución, la primera se llama Estructuración de Proyectos, 2 Otorgamiento, 3 Asignación, 4 Ejecución, y por último Liquidación. Se resalta que los actores más importantes del programa son los beneficiarios, seguido del contratista de obra denominado Ambientalmente, Ingeniería, a través del contrato 795 de 2021 y la interventoría denominada Construmarca SAS bajo el contrato 798 de 2021 quien es veedor y garantizará que todo se cumpla teniendo en cuenta las especificaciones. Finalmente la Secretaria Distrital del Hábitat SDHT quien acompañara todo el proceso de ejecución de las obras.

f. Se realizó las recomendaciones a los beneficiarios relacionados con el no préstamo de herramientas, ni de dinero, no hacer contratos de comida, por la pérdida de alguno de los anteriores artículos la SDHT no se hace responsable. también se recomendó mantener un trato cordial y respetuoso con el personal de obra y con los profesionales. Asimismo transmitir las dudas e inquietudes a los profesionales del contratista e interventoría, no al personal de obra.

g. Se recuerda que el material es del contratista no del beneficiario, para este último se le garantizara la entrega de obra terminada, medible, con el aval de la interventoría. Los beneficiarios tienen un papel de corresponsabilidad, harán el papel de custodios del material, disponiendo un espacio o lugar óptimo para que el contratista lo pueda dejar, también podrán utilizar la bitácora de obra, para registrar el material que ingreso a la vivienda y el que se sacó por parte del contratista ya que esta en toda su autonomía de hacerlo.

h. Para la entrega de obra a satisfacción también se debe tener en cuenta que no haya en el predio escombros. De lo contrario el beneficiario no debe firmar el acta de entrega de las mejoras realizadas. Se envió soportes de las cuatro reuniones de inicio realizadas en el sector Habitarte borde rural cable, salón

comunal Nueva Colombia. Finalmente se agradece la asistencia a los beneficiarios y se hace entrega de refrigerio.

i. Se visitó el sector para continuar con la búsqueda de una oficina para interventoría el 3 de septiembre del 2021.

**a. CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL**

No se realizaron caracterizaciones durante la semana

| VALIDACIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA VALIDACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| | | | | | | |

**b. APERTURAS**

No se realizaron aperturas durante la semana

| APERTURAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA INICIO DE OBRAS** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**c. ATENCIÓN PQR**

No se atendieron PQRS

| PQR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

**d. ENTREGAS**

No se realizaron entregas durante el periodo.

| ENTREGAS DE OBRA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA ENTREGA DE OBRAS** | **OBSEVACIONES** |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

### e. HISTORIAS DE VIDA

No se realizaron caracterizaciones durante la semana

### f. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

No se presentaron ninguna de las anteriores.

### g. CONSOLIDADO FINAL

| | |
|---|---|
| Socializaciones | 5 |
| Caracterizaciones | 0 |
| Aperturas | 0 |
| Cierres PQR | 0 |
| Entregas | 0 |

## II. PROGRAMACIÓN SEMANA SIGUIENTE

a. Se llevará a cabo una reunión de inicio con los beneficiarios en el sector de Jalisco, localidad Ciudad Bolívar el día martes 24 de agosto de 2021 a las 10: 00 AM.
b. Se realizará recorrido para ubicar posible lugar para oficina del equipo técnico y social de interventoría.
c. Búsqueda de PAC de interventoría.

**LINA ESTEFANIA CELEITA YATE**
**Coordinadora social de Interventoría**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Registro Fotográfico primera reunión Salón Comunal Nueva Colombia – Habitarte Borde Rural - Cable. | Registro Fotográfico segunda reunión Salón Comunal Nueva Colombia Habitarte Borde Rural - Cable. |
|  |  |
| Registro Fotográfico Tercera reunión Salón Comunal Nueva Colombia Habitarte Borde Rural - Cable. | Registro Fotográfico Cuarta reunión Salón Comunal Nueva Colombia Habitarte Borde Rural - Cable |

| | |
|---|---|
|   |   |
| Registro fotográfico proceso de busqueda oficina de interventoria | Registro fotográfico proceso de busqueda oficina de interventoria |

Elaboró Residente Social: Carolina Arévalo

| | |
|---|---|
| CONSTRUMARCA S.A.S. | **INFORME SEMANAL PAPSO**<br>**INTERVENTORIA** |
| | **SEMANA 2** |

| **DATOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| **Nº CONTRATO** | 798 DE 2021 |
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021 |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUMARCA S.A.S. |
| **PLAZO** | 6 MESES Y 15 DÍAS. |
| **FECHA DE INICIO** | 20 DE AGOSTO DE 2021 |
| **FECHA FINAL** | 7 DE MARZO DE 2022 |

## INFORME SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DE 2021

## IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) POR PARTE DEL CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

Reportar las medidas sanitarias y lineamientos técnicos para el trabajo seguro durante la emergencia nacional, control para la prevención y mitigación el contagio por COVID19, que promueve por medio de actividades de prevención de la salud del personal de CONSTRUMARCA S.A.S, para poder controlar la propagación del virus a nivel nacional como también a todo el personal como contratistas y del equipo de interventoría**.**

Se le realiza e seguimiento al plan de trabajo presentado por el consorcio AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S, al cual se le ha dado cumplido en las actividades propuestas.

El contratista sito a los beneficiarios a la jornada de Socialización programada, a la cual se le hace el cumplimiento al protocolo de socialización.

Se verificó el distanciamiento social, la limpieza de áreas, señalización, información para el correcto lavado de manos.

| | |
|---|---|
| CONSTRUMARCA S.A.S | **INFORME SEMANAL PAPSO**<br>**INTERVENTORIA** |
| | **SEMANA 2** |

## REGISTRO FOTOGRAFICO

Evidencia fotográfica de la gestión realizada del protocolo de bioseguridad durante el desarrollo de los mejoramientos vivienda por parte de interventoría y el contratista.

| | | |
|---|---|---|
| **Toma de temperatura los beneficiarios que asistieron a la socialización** | **Toma de temperatura los beneficiarios que asistieron a la socialización** | **Toma de temperatura los beneficiarios que asistieron a la socialización** |
|  |  |  |
| **Distanciamiento entre los beneficiarios** | **Distanciamiento entre los beneficiarios** | **Distanciamiento entre los beneficiarios** |
|  |  |  |

Elaborado



Dalia Cárdenas
Profesional SST
Construmarca S.A.S

| FORMATO |
|---|
| INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA |
| **PROCESO** |
| EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS<br>SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT |

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA** AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** CONSTRUMARCA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830509427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $5.130.409.981 |
| Valor Adicional 1 | N.A |
| Valor Actualizado | $5.130.409.981 |
| Plazo Inicial | 5 MESES 15 DIAS |
| Plazo Prórroga 1 | N.A |
| Plazo Actualizado | 5 MESES 15 DIAS |
| Fecha de Iniciación | 20 de agosto de 2021 |
| Fecha de Terminación Inicial | 4 de febrero de 2022 |
| Fecha de Terminación Actual | 4 de febrero de 2022 |
| No. de empleos generados | 10 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $615.594.670 |
| Valor Adicional 1 | N.A |
| Valor Actualizado | $615.594.670 |
| Plazo Inicial | 6 MESES 15 DIAS |
| Plazo Prorroga 1 | N.A |
| Plazo Actualizado | 6 MESES 15 DIAS |
| Fecha de Iniciación | 20 de agosto de 2021 |
| Fecha de Terminación Inicial | 7 marzo de 2022 |
| Fecha de Terminación Actual | 7 marzo de 2022 |
| No. De empleos generados | 11 |

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LINA MARIA SAZIPA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor Hábitat)

## 2. AVANCES DEL CONTRATO

**META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO**

**Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra** 1-2021-39587 (Escriba el número del oficio radicado Hábitat ) **de fecha** 23/09/2021 (dd-mm-aa)

**A. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO VISITADOS DURANTE LA SEMANA SISO - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD COVID 19**

| No | ID DE LA VIVIENDA - MV | DIRECCIÓN | BARRIO | LOCALIDAD | Estado del MV | KIT DE PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO A LO IMPLEMENTADO POR EL CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVCB_5430 | CL 70D SUR 18R 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 2 | MVCB_5434 | CL 70D SUR 18R 29 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 3 | MVCB_5249 | DG 69R SUR 18N 66 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 4 | MVCB_5345 | TV 18N 69R 43 SUR MJ 3 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 5 | MVCB_5316 | TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 6 | MVCB_5279 | TV 18N BIS A 69Q 48 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 7 | MVCB_5281 | TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 8 | MVCB_5325 | DG 69R SUR 18N 31 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 9 | MVCB_5290 | DG 69T SUR 18P 40 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 10 | MVCB_5322 | TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 11 | MVCB_5347 | TV 18N 69R 55 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 12 | MVCB_5411 | KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 13 | MVCB_5414 | CL 70C SUR 18R 41 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 14 | MVCB_5415 | KR 19D SUR 70C 05 SUR MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

**1. DATOS GENERALES**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA** AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MVCB_5398 | CALLE 70 C SUR 18R-12 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 16 | MVCB_5419 | CL 70C SUR 18R 11 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 17 | MVCB_5416 | CL 70C SUR 18R 23 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 18 | MVCB_5453 | KR 19F 70C 54 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 19 | MVCB_5451 | KR 19A 70D 15 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 20 | MVCB_5407 | CL 70D SUR 18R 48 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 21 | MVCB_1554 | CALLE 70 I SUR N°18M -21 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 22 | MVCB_5435 | CL 70F SUR 18R 04 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 23 | MVCB_5521 | CALLE 70 C SUR N°19C-06 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 24 | MVCB_1551 | CRA 18 M N°70 I-24 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 25 | MVCB_1823 | CL 70K BIS SUR 18N 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 26 | MVCB_1834 | CALLE 70 K SUR N°18 N-09 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 27 | MVCB_1762 | CALLE70 K SUR N°18N-24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 28 | MVCB_5399 | CL 70C SUR 18R 24 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 29 | MVCB_5488 | KR 19F 70C 23 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 30 | MVCB_1612 | CL 70F SUR 18N 27 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 31 | MVCB_1911 | CRA 18P 70M-42 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 32 | MVCB_1845 | KR 18 P 70 M 04 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 33 | MVCB_5202 | DG 69Q BIS SUR 18N 52 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 34 | MVCB_5254 | DG 69Q BIS SUR 18N 51 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 35 | MVCB_5410 | KR 19D BIS 70C 10 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 36 | MVCB_5477 | KR 19C BIS 70C 56 SUR | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |
| 37 | MVCB_5392 | CL 70B SUR 18R 47 MJ | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |

| FORMATO |
|---|
| INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA |
| **PROCESO** |
| EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS<br>SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT |

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA** AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | MVCB_5406 | CL 70D SUR 18R 42 | TRANSICION HABITARTE 2019 | CIUDAD BOLIVAR | | Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa. |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**REGISTRO FOTOGRAFÍCO - KIT, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN**











| COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS | DISPOSICIÓN RCD M3 | | ESCOMBRERA |
|---|---|---|---|
| No se han generado residuos ni escombros | SEMANA | | |
| | MES | | |
| | PROYECTO | | |

**COMPONENTE SST: Actividades Ejecutadas:**

**Contratista:**

Semana 3.
Durante el periodo se iniciaron actividades de campo - fase I validación. Se realizó revisión de documentación del personal profesional y administrativo, el contratista ya cuenta con el Pac en el sector de Habitarte, está debidamente señalizado. En desarrollo de la fase de validación se hizo entrega de dos (02) tapabocas por vivienda, se está diligenciando formato de vacunación COVID.
Se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 2. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Durante la visita de seguimiento realizada por los profesionales de Secretaria Distrital del Hábitat se hace acompañamiento.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se incluyó la actualización del protocolo como actividad adicional, sin embargo, en aras de la protección ambiental y en vista que en lo corrido del proyecto se han presentado nuevas normas se propone que la actualización sea digital, mientras se trate de solo normatividad que no cambie la esencia del protocolo o haya un cambio radical en el mismo.

**Interventoría**:

Semana 3
Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 2. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Durante la visita de seguimiento realizada por personal del Hábitat se hace acompañamiento.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se incluyó la actualización del protocolo como actividad adicional, sin embargo, en aras de la protección ambiental y en vista que en lo corrido del proyecto se han presentado nuevas normas se propone que la actualización sea digital, mientras se trate de solo normatividad que no cambie la esencia del protocolo o haya un cambio radical en el mismo.

| FORMATO |
|---|
| INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA |
| **PROCESO** |
| EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS<br>SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT |

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA** AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

**DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO**

Accidentes e incidentes:
**Contratista:** 0
**Interventoría:0**

**PERSONAL MANO DE OBRA - HORAS HOMBRE TRABAJADAS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPACITACIONES PROGRAMADAS** | **0** | **CAPACITACONES REALIZADAS** | **0** | **PERSONAS INCAPACITADAS** | | **CAPACITACIONES PROGRAMADAS** | **0** | **CAPACIONES REALIZADAS** | **0** | **PERSONAS INCAPACITADAS** | **0** |
| **CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA** | | **11** | **TELETRABAJO** | **0** | | **CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA** | | **10** | **TELETRABAJO** | **0** | |

| DATOS | HORAS TRABAJADAS | | | HORAS CAPACITACION | | | AUSENTISMO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS CONTRATISTA | HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA | HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS TOTAL | HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN CONTRATISTA | HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN INTERVENTORIA | HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN TOTAL | DIAS AUSENTISMO ENFERMEDAD GENERAL | | # CASOS COVID CONFIRMADOS | | DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS CONFIRMADOS | | # CASOS COVID SOSPECHOSOS | | DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS SOSPECHOSOS | | DIAS AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL | | DIAS TOTAL AUSENTISMO | |
| | | | | | | | CONT | INT | CONT | INT | CONT | INT | CONT | INT | CONT | INT | CONT | INT | CONT | INT |
| HHT SEMANA | 1250 | 327 | 1577 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHT MES | 1250 | 327 | 1577 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HHT PROYECTO | 1250 | 327 | 1577 | 5,00 | 2,25 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BIOSEGURIDAD INDICADORES**

| Indicadores - Contratista | | Indicadores - Interventoría | |
|---|---|---|---|
| a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100: | 0,00 % | a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100: | 0,00 % |
| b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100. | 0,00 % | b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100 | 0,00 % |
| c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100. | 0,00 % | c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100. | 0,00 % |
| d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100. | 100,00 % | d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100 | 100,00 % |
| e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100. | 100,00 % | e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100. | #¡DIV/0! % |

## 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:**
El desarrollo de las actividades se viene realizando coordinadamente entre contratista y la interventoría; procurando cumplir con los protocolos y seguimientos semanales, a fin de reportar lo realizado en el punto PAC, trabajadores y hogares, según lo solicitado por la Secretaría Distrital del Hábitat.

**RECOMENDACIONES:** Cumplir con las responsabilidades contractuales y la legislación vigente y aplicable contractualmente.

| FORMATO |
|---|
| INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA |
| **PROCESO** |
| EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS<br>SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT |

**SEMANA No.** 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No** 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

**CONTRATISTA** AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

**INTERVENTOR** CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

## 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ADICIONALES

| INFORMACIÓN GENERAL | PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE VACUNACION COVID 19 |
|---|---|












**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES**

## 6. ANEXOS

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Cronograma | x | |
| 2. Registro Fotográfico | | x |
| 3.Anexo XXXXXXXX | | x |
| 4. Anexo XXXXXXXXX | | x |
| 5. Otro | | |

Cual?

**Nota:** Si lo requiere.

Se deja constancia que este informe fue remitido el **27-SEP-2021** al correo electrónico del profesional de apoyo técnico de la Secretaría Distrital del Hábitat

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los once de septiembre (Día en letras) 11/09/2021 (Día en números)

días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2021 (Año de firma del informe)

DALIA CARDENAS

(Nombre) Interventor a cargo

# INFORME SEMANAL No. 2
# AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

## CONTRATO No. 795 de 2021

## OBJETO DEL PROYECTO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021

## BOGOTÁ D.C. AGOSTO DE 2021

## TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN ..... 3

**1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** ..... 4

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO ..... 4

**2. AVANCE DEL PROYECTO.** ..... 14

**3.RECURSO HUMANO** ..... 15

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la secretaria Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe Uribe.

La empresa Ambientalmente ingeniería S.A.S, celebró el contrato No. 795 de 2021 cuyo objeto corresponde a **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021**

Durante este periodo se inició la primera fase de validación en los territorios de habitarte, jalisco y lomas.

A continuación, se realiza una descripción del avance de las actividades en cada una de las localidades y conciernen al período evaluado del 28 de Agosto de 2021 al 3 de septiembre de 2021, correspondiente al informe técnico semanal No. 02.

## 1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | AMBIENTALMENTE INGENIERISA S.A.S |
| **NIT** | 900628905 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | EDUARDO MANRIQUE PINZON |
| **DATOS DE CONTACTO** | administrativo@ambientalmente.com.co |
| **N° CONTRATO** | 795-2021 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021 |
| **PLAZO DEL CONTRATO INICIAL** | 5 meses y 15 días |
| **FECHA FIRMA ACTA DE INICIO** | 20 agosto del 2021 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04 de febrero de 2021 |
| **FIRMA INTERVENTORA** | Construmarca s.a.s |
| **N° CONTRATO** | 798-2021 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 5.130.409,5 |

### 1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el Supervisor.
3. Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.
4. Presentar al interventor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten

las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable), para la ejecución del contrato.
5. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción acta de inicio, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.
6. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.
7. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.
8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos.
9. Alimentar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.
10. Suministrar los equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.
11. Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
12. El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado de este.
13. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.
14. Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra.
15. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Común para cada grupo 20 la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.

16. Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.
17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a que haya lugar.
18. Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.
19. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.
20. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.
21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades. 22. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.
23. Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.
24. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
25. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.
26. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
27. Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.
28. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
29. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
30. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la SDHT, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.

31. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.
32. Dar estricto cumplimiento a la programación del mejoramiento, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión.
33. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 21 Supervisor, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.
34. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.
35. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.
36. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones.
37. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
38. Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda.
39. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo tecnico a cabalidad.

40. Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato

### 1.2 Descripción del proyecto

Para la ejecución de la obra en cumplimiento al objetivo general del proyecto se considera la implementación de tres fases:

**Fase de validación:** En la ejecución de esta fase programa y desarrolla una (1) reunión con los beneficiarios del proyecto de cada bloque de viviendas e informarlos del objetivo del contrato, los actores involucrados, los puntos de atención a la comunidad y los días y horarios de atención. Esto con el fin de resolver las expectativas e inquietudes de la comunidad y demás generalidades de las viviendas entregadas por la SDHT.

Durante esta primera fase, se realizará el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman cada uno de los bloques, así como, identificar las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Desde el componente técnico se realizará la validación del estado de cada vivienda que conforma el bloque. Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, se modificará el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la entidad estructuradora, de tal modo que se requerirá adelantar una validación de la información para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.

Dicho alcance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades:

- Realizarlas mediciones pertinentes.
- Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda.
- Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso.

**Fase de ejecución de obras:** Durante esta fase se procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, ejecutando las obras de acuerdo con los presupuestos de obra finales y sus especificaciones técnicas para cada una de las mismas.

Para seguimiento de la ejecución se realizarán actas de inicio de obra, de entrega y recibo a satisfacción por cada vivienda. Así mismo, se contará con una bitácora por vivienda, en donde se registrarán las actividades adelantadas desde el primer día de ejecución hasta su finalización, garantizando que en la misma se consignen los imprevistos y observaciones al respecto de la obra programada.

Las obras para ejecutar corresponden a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento de una vivienda.

**Fase de cierre del proyecto**: En esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada con recibido a satisfacción del beneficiario y la interventoría, de igual manera, concluir los diferentes procesos establecidos en el proyecto. Se entregará un informe final de ejecución de obras.

En cuanto al componente social, se presentará un *"informe de análisis"* de impacto social el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución.





**Figura 1. Fases del proyecto**

## 1.3 Localización del Proyecto

El contrato se ejecutará en los territorios de Habitarte- Ciudad Bolívar, Lomas-Rafael Uribe Uribe, Jalisco- Ciudad Bolívar y Bosa la libertad – Bosa.

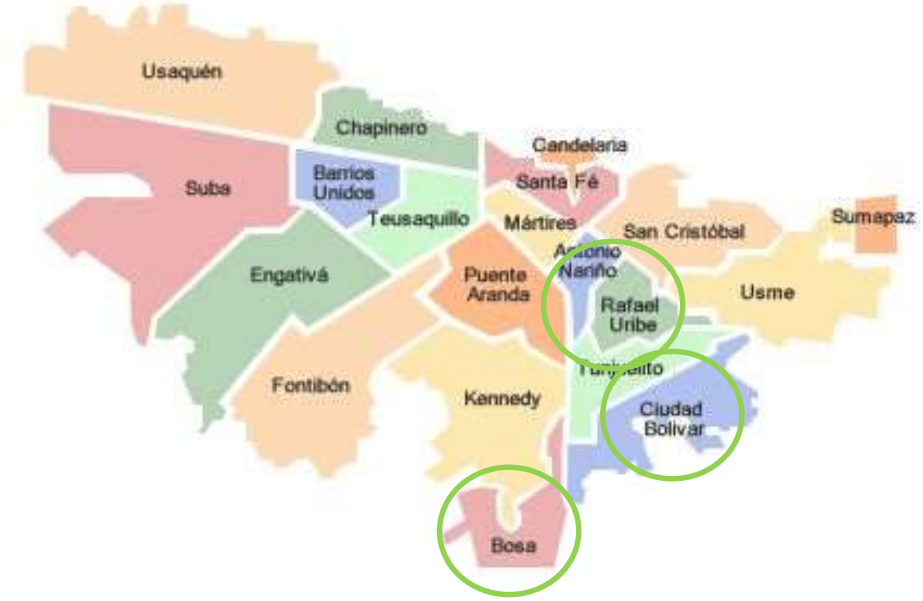



**Figura 2.** Localidades de Bogotá.

## 1.4 Territorio de Habitarte – Ciudad Bolívar.

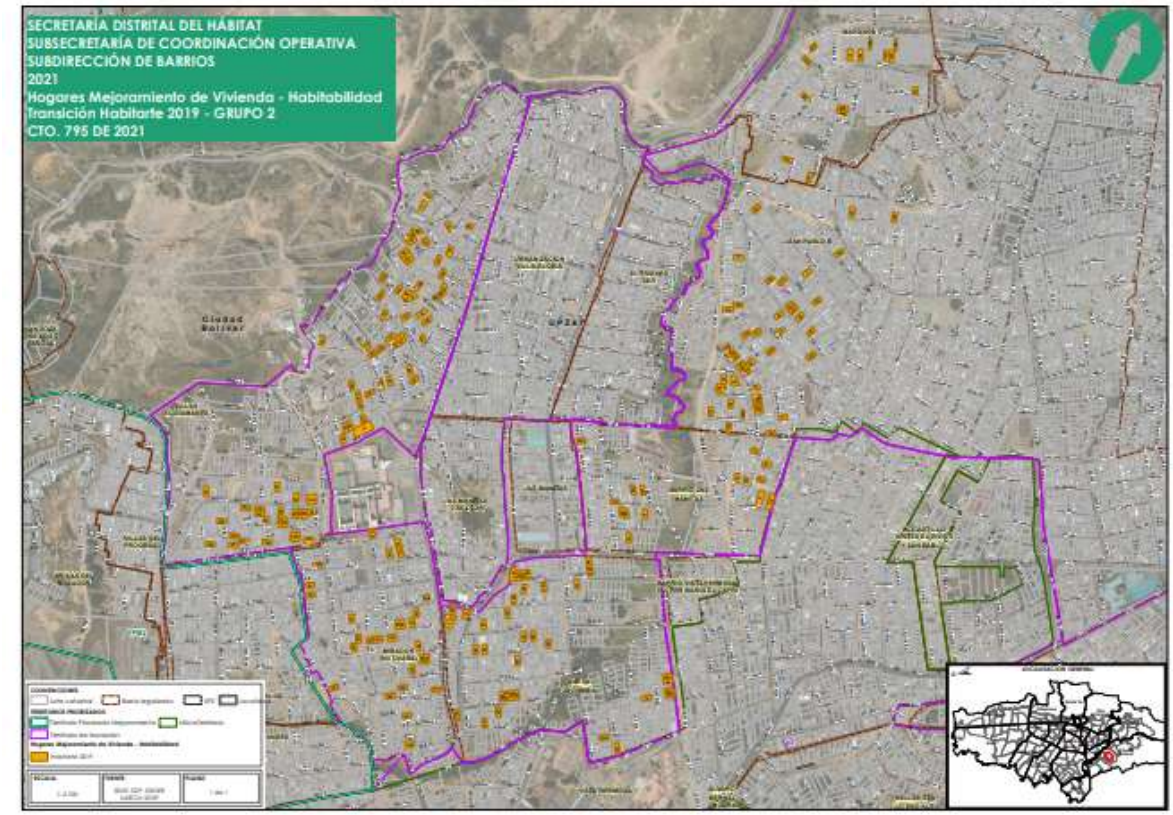



**Figura 3.** Plano de Habitarte – Ciudad Bolívar.

### 1.4.1 Territorio de Jalisco – Ciudad Bolívar.

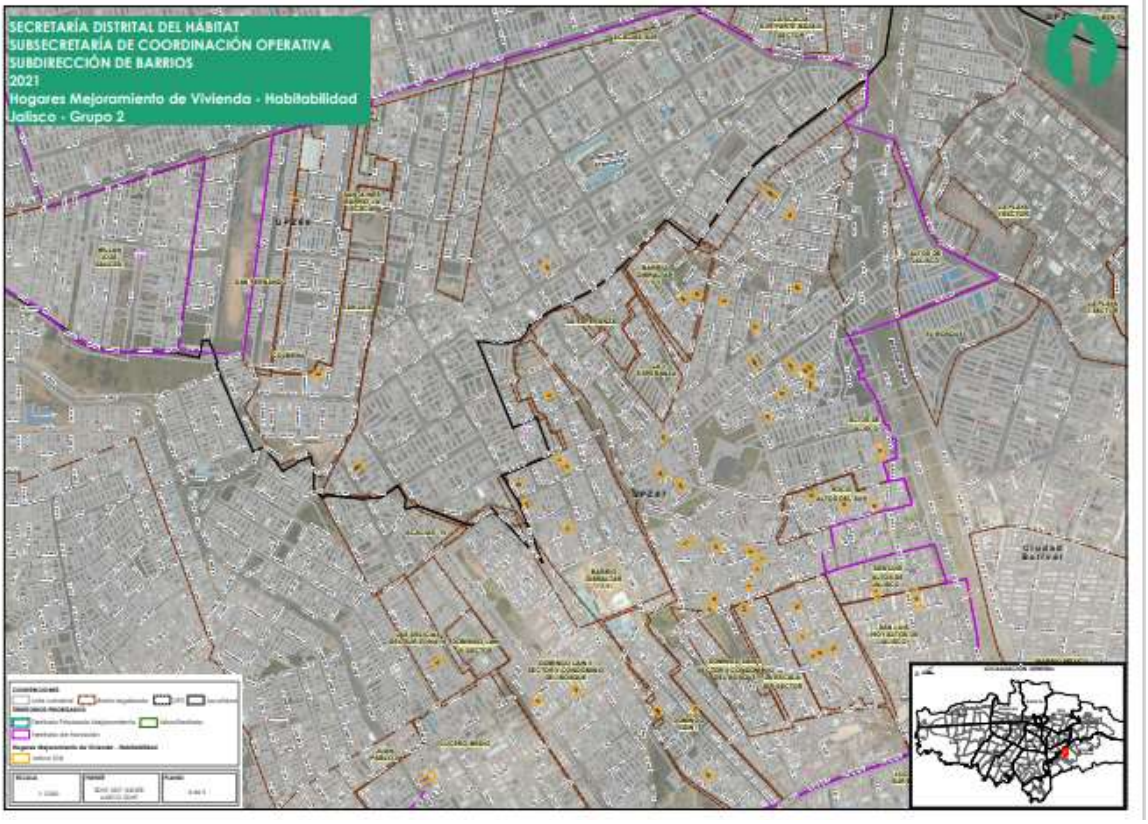



**Figura 3.** Plano de Jalisco – Ciudad Bolívar.

### 1.3.3 Territorio de Lomas – Rafael Uribe Uribe

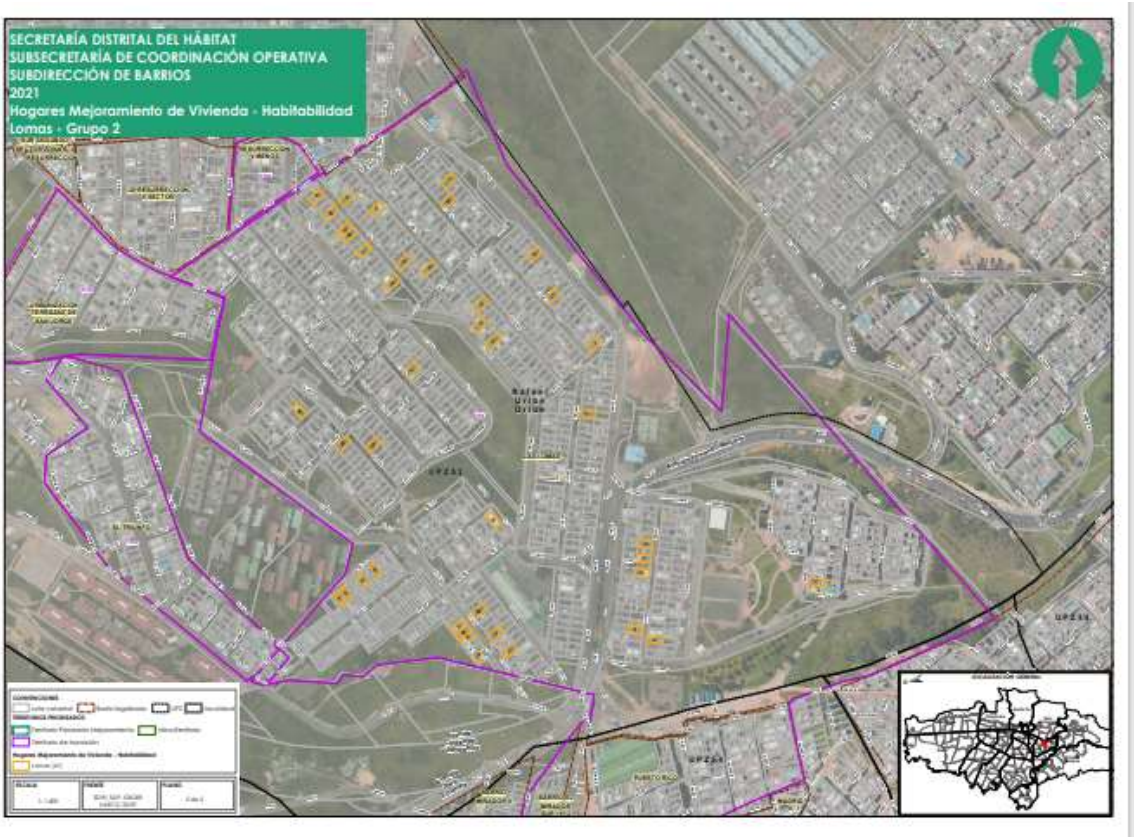



**Figura 4.** Plano de Lomas – Rafael Uribe Uribe

### 1.3.4 Territorio de Bosa la Libertad – Bosa.

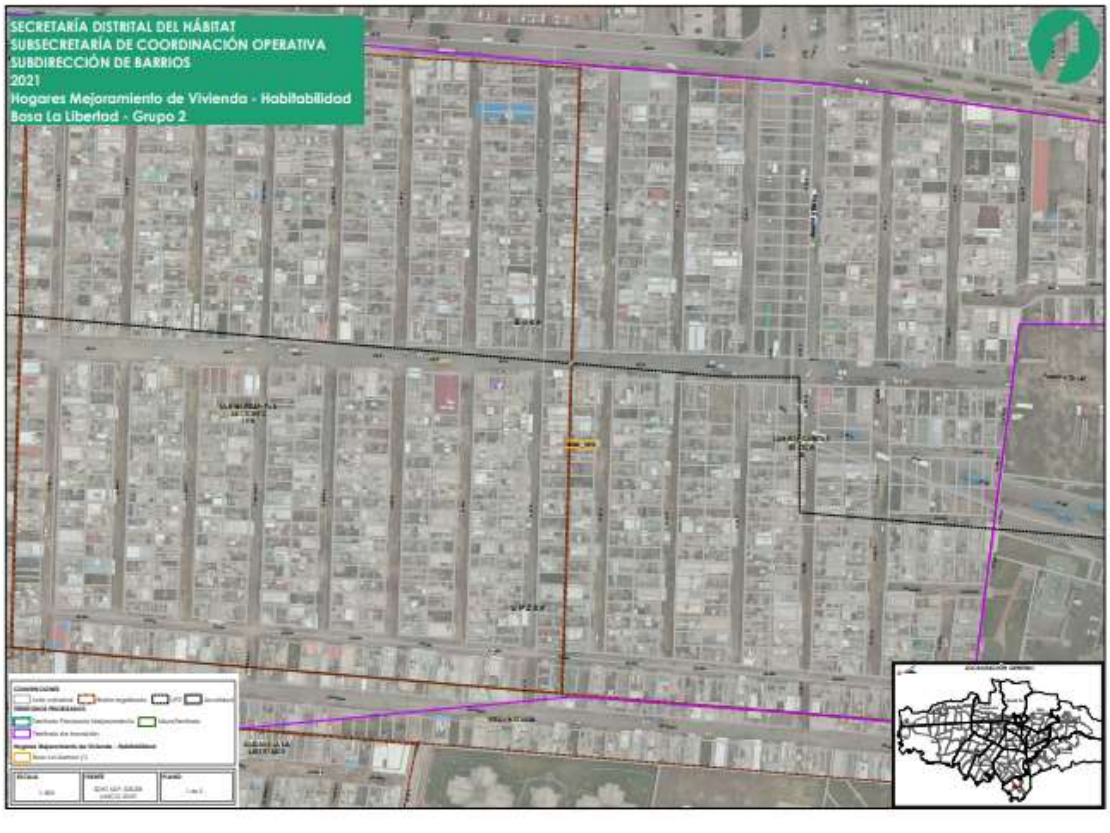



**Figura 5.** Plano de Bosa la libertad – Bosa.

## 2. AVANCE DEL PROYECTO.

En esta semana, se logro subsanar las observaciones de las hojas de vida que mando la interventoría. También, se tuvo una reunión con el proveedor de home center donde llegamos a un acuerdo y le pasamos el presupuesto para que nos cotizara todos los precios de los materiales, para la ejecución. Por otro lado, se logro realizar la primera reunión de presentación con la interventoría, donde se debatieron varios temas sobre la ejecución de la obra y por último, se realizó la primera

socialización en el territorio de jalisco con todos los beneficiarios, donde estuvo la secretaria presente.

## 3.RECURSO HUMANO

Para iniciar el proyecto se convocaron los siguientes profesionales, para la aprobación de la interventoría.

| CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS | CC |
|---|---|---|
| **Coordinadora Social** | Diana Loaiza Cantor | 52.731.408 |
| **Profesional Social** | Yessenia Gámez | 1.120.745.285 |
| **Profesional Social** | Pablo Chitiva | 1.030.647.671 |
| **Profesional Social** | Marguie Rincón | 1.015.449.947 |
| **Profesional Social** | Lina Colorado | 1.019.022.812 |
| **Director de Obra** | Carlos García | 79.883.138 |
| **Residente de Obra** | Ricardo Jaime | 19.144.052 |
| **Residente de Obra** | María Isabel Garzón | 52.890.684 |
| **Residente de Obra** | Horacio Triviño Gutiérrez | 79.144.042 |
| **Residente de Obra** | Julián Peña | 1.013.624.438 |
| **Profesional sst** | Giovanna Ibáñez | 2787257 |

## 4. CORRESPONDENCIA

| **CORRESPONDENCIA** ENVIADAS HASTA LA FECHA | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **NUMERO** | **FECHA** | **ASUNTO** |
| **9** | **COMUNICADO AMB-09-2021** | 28/08/2021 | Entrega acta de reunión 001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | **COMUNICADO AMB-10-2021** | 2/09/2021 | Solicitud préstamo de auditorio. |
| **11** | **COMUNICADO AMB-11-2021** | 2/09/2021 | Respuesta a oficio 798- 2021g2-003-2021 pas v1 con observaciones subsanadas |

## 5. CONCLUSION

Durante todo el proceso de preparación de documentos se logró subsanar las observaciones del personal idóneo para la ejecución del proyecto, Por otro lado, se logró realizar la primera reunión con todo el personal e interventoría, donde se concluyeron muchos temas que son importantes para el desarrollo del proyecto. Por último, se realizó la primera socialización con todos los beneficiarios, donde estuvo la secretaria haciendo algunas observaciones.

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | **Periodo**: DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE | | **Informe: 4** |
| **17 DE SEPTIEMBRE DE 2021** | **Proyecto**: CONTRATO 795 DE 2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT." | | |
| **Cliente:** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT | | | **Contrato No.:** 795 DE 2021 |

| **DATOS DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| N.º CONTRATO | 795 DE 2021 |
| OBJETO | EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT |
| CONTRATISTA | AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S |
| INTERVENTORÍA | CM CONSTRUMARCA |

*1.* **RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:**

**GRUPO 2**

**1.1 SOCIALIZACIONES Y OTROS.**

Se realizó socialización el día 11 de septiembre, a las 11:30 am en el barrio Lomas de la localidad Rafael Uribe Uribe.
Se envió a la interventoría el acta y los soportes de convocatoria y asistencia de la reunión de inicio de Lomas.
Se enviaron las vallas con los datos sugeridos a la interventoría con el fin de obtener aprobación de las mismas.

**1.2 CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL**

| **VALIDACIONES** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA VALIDACIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | MVCB_5462 | CL 70C SUR 19B 27 | VILLAS EL DIAMANTE | LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO | 13/09/2021 | Recibe la visita Daniel Pineda (hijo), la beneficiaria trabaja gran parte del día por lo que dejara al hijo Daniel Pineda a cargo de la obra, se expresa la posibilidad de que se pueda hacer proceso de Historia de Vida. |
| 2 | MVCB_5179 | CL 69P BIS A SUR 18N 16 | VILLAS EL DIAMANTE | MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA | 13/09/2021 | La beneficiaria es una persona de alta vulnerabilidad ya que es una persona de la tercera edad y la hija nos expresa que hace poco la señora María inicio quimioterapia. La familia informa que la señora María no estará presente durante las obras por seguridad y |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dejará a cargo a la hija. |
| 3 | MVCB_5556 | TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ | VILLAS EL DIAMANTE | MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS | 13/09/2021 | |
| 4 | MVCB_5182 | TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ | VILLAS EL DIAMANTE | ANA ISABEL MORENO FONSECA | 13/09/2021 | Atiende la visita María del Transito Penagos, la vivienda esta arrendada y la beneficiaria esta en Ibagué. Deja encargada a la señora María del Transito Penagos, la inquilina. |
| 5 | MVCB_5119 | CL 69P BIS C SUR 18P 52 | VILLAS EL DIAMANTE | JOSE ANTONIO VEGA | 13/09/2021 | Atiende la visita Paola Vega (hija), actualmente se encuentran los hijos del señor José viviendo en el predio, se dejará a cargo a la hija Paola Vega. |
| 6 | MVCB_5145 | CL 69P SUR 18N 42 | VILLAS EL DIAMANTE | WILSON CORTES CONTRERAS | 14/09/2021 | El señor Wilson expresa que la vivienda lleva varios meses sola y que permanecerá así durante las mejoras, se le pide al señor Wilson bastante cuidado ya que el acceso del segundo piso esta poco asegurado. |
| 7 | MVCB_5115 | CL 69N SUR 18P 19 | VILLAS EL DIAMANTE | VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ | 14/09/2021 | |
| 8 | MVCB_5165 | TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ | VILLAS EL DIAMANTE | JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON | 14/09/2021 | Atiende la visita Johanna Suarez (sobrina) expresa que es bastante difícil comunicarse con el señor Jaime por la zona que tiene muy baja señal, se piden medios alternos de comunicación. |
| 9 | MVCB_5126 | CL 69N SUR 18N 40 MJ | VILLAS EL DIAMANTE | HERNANDO GONZALEZ LOZANO | 14/09/2021 | El señor Hernando es una persona de tercera edad y vive solo con la esposa que también es una persona de la tercera edad. |
| 10 | MVCB_5079 | TV 18R 69K 04 SUR | VILLAS EL DIAMANTE | ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ | 14/09/2021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MVJA_0370 | CL 62 SUR 18J 71 | CIUDAD MILAGRO | ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON | 15/09/2021 | Existen dos perros en la vivienda y se le hace la recomendación a la beneficiaria sobre dejar a los perros en una habitación asegurada para que no obstruyan las obras o dañen el material. |
| 12 | MVJA_2659 | KR 18L BIS A 62A 31 SUR | ALTOS DE JALISCO | LEONILDE RINCON ARIAS | 15/09/2021 | Existen dos perros en la vivienda y se le hace la recomendación a la beneficiaria sobre dejar a los perros en una habitación asegurada para que no obstruyan las obras o dañen el material. Beneficiaria expresa altos niveles de vandalismo en la zona. |
| 13 | MVJA_2714 | KR 18M 62 35 SUR | ALTOS DE JALISCO | FERNANDO ANTONIO SIERRA | 15/09/2021 | |
| 14 | MVJA_1028 | CL 63F SUR 18Q 10 | BARRIO GIBRALTAR I Y II | BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ | 15/09/2021 | Atiende la visita Leidy García (hija), la beneficiaria es una persona de la tercera edad y es oxigeno dependiente, la familia manifiesta que tan pronto se confirme la fecha de ejecución ellos trasladaran a la señora Nubia para que su salud no se vea afectada por las obras. |
| 15 | MVJA_3713 | KR 19 62A 23 SUR | ACACIAS SUR | ANA ADELINA PARRAGA MOYA | 15/09/2021 | Recibe la visita José Joaquín Villareal (esposo), manifiesta que la beneficiaria esta de viaje y no podrá estar a cargo y que el quedará como autorización de la ejecución. |
| 16 | MVJA_3462 | KR 18R 61 57 SUR | ALTOS DE JALISCO | REINALDA GAMBOA | 15/09/2021 | |
| 17 | MVCB_1602 | CL 70G SUR 18N 28 | MIRADOR (NUTIVARA) | JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA | 16/09/2021 | Atiende la visita Ginna Pineda (hija), expresa que el señor Jaime no |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | podrá atender obras debido a su trabajo y ella quedará a cargo de las obras. |
| 18 | MVCB_1596 | CL 70F SUR 18N 52 | MIRADOR (NUTIVARA) | RUTH ORJUELA DE TAPIERO | 16/09/2021 | La beneficiaria realizó modificaciones a la vivienda durante la visita inicial y la validación, equipo técnico ajustara presupuesto acorde a la nueva estructura de la vivienda. |
| 19 | MVCB_1569 | KR 18R 70F 21 SUR | MIRADOR (NUTIVARA) | RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO | 16/09/2021 | La beneficiaria no podrá estar a cargo de las mejores y se queda a la espera de quien quedará autorizado. |
| 20 | MVCB_1723 | CL 70I SUR 18Q 09 | MIRADOR (NUTIVARA) | CECILIA BARATO BETANCOURT | 16/09/2021 | Validación Fallida, la señora Cecilia manifiesta querer el mejoramiento en el segundo piso, la visita realizada por caja de vivienda considero pertinente realizar las mejoras en el primer piso ya que el segundo piso carecía estructura (muros y conexiones), en visita de validación se evidencia que ya existen muros y cubierta lo que da paso a que bajo concepto técnico se valide el segundo piso para que el beneficio sea mayor. La señora Cecilia se compromete a tener listas las conexiones para el 10 de octubre y poder realizar revalidación de la vivienda. Se levanta acta sobre esta decisión, se firma por parte del contratista e interventoría. |
| 21 | MVCB_1790 | KR 18Q 70J 05 SUR | MIRADOR (NUTIVARA) | ANA JULIA BERNAL BELLO | 16/09/2021 | La beneficiaria expresa querer el mejoramiento en el primer piso, ya que |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | caja de vivienda considero el mejoramiento en el segundo piso. Bajo concepto técnico y lineamientos sobre priorización de la SDHT se decide que el primer piso será el que reciba el mejoramiento. Se levanta acta sobre esta decisión, se firma por parte del contratista e interventoría. |
| 22 | MVCB_1743 | CL 70J SUR 18N 40 | MIRADOR (NUTIVARA) | ERNESTO TENORIO SANCHEZ | 16/09/2021 | El hogar presenta altas condiciones de vulnerabilidad ya que el señor Ernesto (78 años) y su esposa (91 años) son personas de tercera edad y viven solos. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MV_546 | CL 36H SUR 11A 46 | LOMAS | CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA | 13/09/2021 | |
| 24 | MV_627 | CL 38 SUR 11B 16 | LOMAS | DORA INES RUBIANO | 13/09/2021 | |
| 25 | MV_748 | Cl 40 SUR 11A 60 | LOMAS | MYRIAM MOSQUERA TORRES | 13/09/2021 | |
| 26 | MV_765 | Cl 40 SUR 11A 83 | LOMAS | ANA PAULINA SARMIENTO | 13/09/2021 | |
| 27 | MV_091 | KR 9 H 39 58 SUR | LOMAS | MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO | 13/09/2021 | |
| 28 | MV_148 | Cl 41 SUR 10A 74 | LOMAS | JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE | 14/09/2021 | |
| 29 | MV_152 | CL 41 SUR 10A 50 | LOMAS | MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS | 14/09/2021 | |
| 30 | MV_155 | CL 41 SUR 10A 32 | LOMAS | BLANCA CECILIA CALDERON | 14/09/2021 | |
| 31 | MV_159 | CL41 SUR 10A 07 | LOMAS | MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO | 14/09/2021 | |
| 32 | MV_163 | CL 41 SUR 10A 27 | LOMAS | LIGIA GIL ARIAS | 16/09/2021 | |
| 33 | MV_164 | CL 41 SUR 10A 31 | LOMAS | GLORIA NANCY VARGAS SUTA | 16/09/2021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MV_202 | KR 11A 41 50 SUR | LOMAS | LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ | 16/09/2021 | **pendiente área técnica interventoría** |
| 35 | MV_204 | KR 11A 41 44 SUR | LOMAS | CARMEN FERNANDEZ GIL | 16/09/2021 | **pendiente área técnica interventoría** |
| 36 | MV_213 | KR 11A 41 16 SUR | LOMAS | CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA | 16/09/2021 | |
| 37 | MV_788 | KR 11C 40 17 SUR | LOMAS | LUZ MERY ALVAREZ BELLO | 16/09/2021 | |
| 38 | MV_228 | KR 11 39 04 SUR | LOMAS | MARIELA TOVAR HERNANDEZ | 17/09/2021 | |
| 39 | MV_282 | KR 10A 36F 40 SUR | LOMAS | FERNANDO REYES BURBANO | 17/09/2021 | |
| 40 | MV_330 | Cl 36 D SUR 11A 65 | LOMAS | ELIAS NIÑO CORREDOR | 17/09/2021 | |
| 41 | MV_344 | CL 36D SUR 11C 47 | LOMAS | JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA | 17/09/2021 | |
| 42 | MV_162 | CL 41 SUR 10A 23 | LOMAS | MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO | 17/09/2021 | |
| 43 | 1629 | KR 19 70G #16 SUR | MIRADOR (NUTIVARA) | DEISY AREVALO TALERO | 13-09-2021 | |
| 44 | 1434 | CL 70H SUR #18L 21 | NUEVA COLOMBIA | MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA | 13-09-2021 | |
| 45 | 1430 | CL 70H SUR #18L 45 | NUEVA COLOMBIA | LUIS ENRIQUE TORRES NIETO | 13-09-2021 | |
| 46 | 1769 | CL 70J SUR #18N 53 | MIRADOR (NUTIVARA) | GERARDO VEGA VICTORIA | 13-09-2021 | |
| 47 | 1497 | CL 70H SUR #18J 81 | NUEVA COLOMBIA | PABLO VALBUENA | 13-09-2021 | |
| 48 | 3025 | KR 18M BIS #69A 59 SUR MJ | JUAN PABLO II | JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES | 14-09-2021 | |
| 49 | 3002 | DG 69A BIS B SUR #18M 03 | JUAN PABLO II | ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS | 14-09-2021 | |
| 50 | 2772 | DG 69A BIS C SUR #18L 78 | LAS MANITAS | BETULIA SANCHEZ ARDILA | 14-09-2021 | Se realiza visita de validación con la señora Yulieth Gaitán (Nieta) quien es autorizada mediante carta por la beneficiaria. Se realiza acta ya que |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | la carta correspondía a la reunión, esta información se valida telefónicamente con la beneficiaria y autoriza. |
| 51 | 2599 | KR 18L BIS B #69A 28 SUR | LAS MANITAS | ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ | 14-09-2021 | |
| 52 | 2471 | DG 69A BIS C SUR #18L 51 | LAS MANITAS | AMPARO OSPINA ORTIZ | 14-09-2021 | Durante la visita la beneficiaria manifiesta que se trasladara de vivienda en el momento que se lleve a cabo las obras de mejoramiento, se le informa que este no es necesario y es voluntario, no se reconoce económicamente |
| 53 | 2769 | KR 18L BIS B #69A 41 SUR | LAS MANITAS | SEGUNDO OCTAVIO SIERRA | 14-09-2021 | |
| 54 | 2912 | DG 69A BIS B SUR #18M 10 | JUAN PABLO II | ANA JOAQUINA NINO DE TORRES | 14-09-2021 | La visita de validación es atendida en compañía de dos hijos, puesto que la señora Ana se fatiga al hablar por su enfermedad EPOC |
| 55 | 2431 | KR 18M BIS #69A 76 SUR | JUAN PABLO II | NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA | 14-09-2021 | |
| 56 | 3032 | KR 18M BIS #69A 89 SUR | JUAN PABLO II | MARLENY JARAMILLO ROMERO | 14-09-2021 | Se evidencia pareja de adultos mayores con carencias económicas, además de relación distante con sus hijos. |
| 57 | 2963 | DG 69A BIS D SUR #18M 18 | JUAN PABLO II | ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS | 15-09-2021 | |
| **58** | **1627** | **KR 19 #70H 04 SUR** | **MIRADOR (NUTIVARA)** | **ELIZABETH ROJAS CARDENAS** | **15-09-2021** | Durante la visita estuvo presente el señor Rafael Ex esposo de la señora Elizabeth, se evidencian relaciones conflictivas |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **2838** | **DG 69C BIS SUR #18M 84** | **JUAN PABLO II** | **ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA** | **15-09-2021** | Kimberly Diaz hija del beneficiario sufre de discapacidad cognitiva -focal |
| **60** | **3606** | **TV 18N BIS A #69A 62 SUR** | **JUAN PABLO II** | **LUZ MARINA ZULETA OROZCO** | **15-09-2021** | |
| **61** | **2968** | **TV 18N BIS A #69A 62 SUR** | **JUAN PABLO II** | **ROBERTO ANTONIO ISAZA** | **15-09-2021** | La señora Gina Isaza hija del beneficiario, presenta discapacidad cognitiva - focal |
| **62** | **2986** | **TV 18N 69A #64 SUR** | **JUAN PABLO II** | **DORIS GUARIN** | **15-09-2021** | Se evidencia que su red de apoyo primaria presenta dificultades, falta de comunicación asertiva |
| **63** | **2973** | **TV 18M BIS B #69A 61 SUR** | **JUAN PABLO II** | **LUZ MARINA CASTILLO ANGEL** | **15-09-2021** | |
| **64** | **2966** | **DG 69A BIS D SUR #18M 32** | **JUAN PABLO II** | **JENIFER JARAMILLO BOLIVAR** | **15-09-2021** | Se realiza visita de validación con Michael Daza hijo de la beneficiaria, quien fue autorizado mediante carta. |
| **65** | **3006** | **KR 18M BIS B #69A 74 SUR** | **JUAN PABLO II** | **JOSE EMILIO VARGAS** | **15-09-2021** | Se realiza visita de validación con Cecilia Villamil esposa del beneficiario, quien fue autorizado mediante carta. |
| **66** | **2977** | **TV 18M BIS B #69A 77 SUR** | **JUAN PABLO II** | **LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ** | **16-09-2021** | Se realiza visita de validación con Carolina Forero cuñada de la beneficiaria, quien fue autorizado mediante carta. Se evidencia relaciones conflictiva entre los familiares, por otra parte la señora Carolina manifiesta inconformidad con el subsidio ya que la vivienda pertenece a una herencia familiar, por ende el mejoramiento debe ser para todos |
| 67 | 2176 | CL 69B BIS A SUR #18R 39 | MARANDU | SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ | 16-09-2021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2192 | KR 18R BIS #69B 29 SUR | MARANDU | ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA | 16-09-2021 | |
| 69 | 5116 | TV 18P BIS #69N 05 SUR MJ | VILLAS EL DIAMANTE | MARIA TERESA GALINDO RANGEL | 16-09-2021 | |
| 70 | 2465 | DG 69A BIS C SUR #18L 85 | LAS MANITAS | DEISY LIZCANO CORNELIO | 16-09-2021 | La beneficiaria manifiesta tener conflictos personales con sus vecinos |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | MVCB_1879 | KR 18 P 70 K 36 | NUEVA COLOMBIA | GRACIELA MEDINA NIÑO | 13/09/2021 | |
| 72 | MVCB_1868 | KR 18P 70L 05 SUR | NUTIVARA | ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO | 13/09/2021 | |
| 73 | MVCB_1401 | CL 70I SUR 18L 69 | NUEVA COLOMBIA | MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO | 13/09/2021 | |
| 74 | MVCB_1324 | CL 70K SUR 18L 45 | NUEVA COLOMBIA | SUSANA REYES DE SÁNCHEZ | 13/09/2021 | |
| 75 | MVCB_1340 | CL 70K SUR 18L 16 | NUEVA COLOMBIA | YOLANDA VARGAS ESPAÑA | 13/09/2021 | |
| 76 | MVCB_1271 | CL 70 M SUR 18 L 62 | NUEVA COLOMBIA | LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA | 13/09/2021 | |
| 77 | MVCB_1792 | KR 18R 70K 27 SUR | MIRADOR (NUTIVARA) | ELDA INES CANDELA ZABALA | 14/09/2021 | |
| 78 | MVCB_5417 | CL 70C SUR 18R 17 MJ | VILLAS EL DIAMANTE | MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ | 14/09/2021 | |
| 79 | MVCB_5455 | KR 19C 70C 42 SUR | VILLAS EL DIAMANTE | MARIA JACQUELINE ROJAS | 14/09/2021 | |
| 80 | MVCB_1466 | CL 70 H SUR 18J 64 | NUEVA COLOMBIA | SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL | 14/09/2021 | |
| 81 | MVCB_1888 | KR 18N 70L 05 SUR | MIRADOR (NUTIVARA) | LUZ EDITH GARCIA SOZA | 15/09/2021 | |
| 82 | MVCB_3013 | KR 18M BIS A 69A 83 SUR | JUAN PABLO II | LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES | 15/09/2021 | |
| 83 | MVCB_2937 | TV 18N BIS 69A 92 SUR | JUAN PABLO II | BETULIA ARIZA MORENO | 15/09/2021 | |
| 84 | MVCB_3580 | TV 18N BIS A 69A 53 SUR | JUAN PABLO II | JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO | 15/09/2021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | MVCB_2976 | TV 18M BIS B 69A 73 SUR | JUAN PABLO II | ARCENETH OLAYA TABORDA | 15/09/2021 | |
| 86 | MVCB_3617 | TV 18N BIS A 69A 26 SUR | JUAN PABLO II | EVELIA MORALES GARCIA | 15/09/2021 | |
| 87 | MVCB_2644 | CL 70C SUR 18I 99 | BARRIO LAS MANITAS | MARIA AMPARO TORRES ARIAS | 16/09/2021 | |
| 88 | MVCB_2387 | KR 18K BIS 69T 22 SUR | JUAN PABLO II | JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO | 16/09/2021 | |
| 89 | MVCB_2975 | TV 18M BIS B 69A 69 SUR | JUAN PABLO II | PEDRO DE ALCANTARA REYES | 16/09/2021 | |
| 90 | MVCB_3171 | KR 18R 69 75 SUR | JUAN PABLO II | ARCICIO ALFONSO FORERO | 16/09/2021 | |
| 91 | MVCB_2876 | DG 69C SUR 18N 15 | JUAN PABLO II | EDUARDO AREVALO SOSA | 16/09/2021 | |
| 92 | MVCB_3639 | TV 18N BIS 69A 67 SUR | JUAN PABLO II | SALOMON TRIANA SALGUERO | 16/09/2021 | Se realiza proceso de validación social y técnica, esta visita se hace en compañía de la interventoría. La visita fue atendida por el beneficiario quien desde el inicio de la validación presento inconformidad con el proceso de la actividad y manifestó en repetidas ocasiones su deseo de renunciar al mejoramiento de vivienda. |
| 93 | MVCB_3545 | TV 18P 69A 46 SUR | JUAN PABLO II | MARTHA VICTORIA MENDEZ | 17/09/2021 | |
| 94 | MVCB_3583 | TV 18N BIS A 69A 61 SUR | JUAN PABLO II | RUTH LUCILA TOVAR | 17/09/2021 | |
| 95 | MVCB_2705 | TV 18Q 69A 64 SUR | JUAN PABLO II | GUILLERMO MORALES SALINAS | 17/09/2021 | |
| 96 | MVCB_2149 | KR 18V 68C 47 SUR | MARANDU | ISAÍ GARZÓN CLAVIJO | 17/09/2021 | |
| 97 | MVCB_3088 | TV 18 W 69 C 23 SUR | MARANDU | ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ | 17/09/2021 | |

### 1.3 APERTURAS

| APERTURAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | ID_DMV | DIRECCIÓN | DESARROLLO | NOMBRE BENEFICIARIO | FECHA INICIO DE OBRAS | OBSERVACIONES |
| | | | | | | |

### 1.4 SEGUIMIENTOS RELEVANTES

1. 17/09/2021: MV 152; MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS; Dada la situación presentada en el momento de la validación, donde se evidencia que las áreas priorizadas ya se encuentran terminadas, a excepción de la cocina. Se evidencia la filtración de agua en el segundo piso de la vivienda, por ende, se hace necesario la presencia de la interventoría técnica, quien junto con el Arquitecto residente del contratista llegan al acuerdo con la beneficiaria y su familia, de generar en un plazo mínimo de 20 días y máximo de 30 días la construcción de los muros perimetrales para la instalación de la cubierta que requiere la vivienda, beneficiaria acepta el compromiso.

2. Se realiza visita de validación al beneficiario correspondiente al MVCB _ 3639- SALOMON TRIANA, en compañía de la interventoría y la Secretaria Distrital del Hábitat, al llegar a la vivienda se da inicio al proceso de validación técnica y caracterización social, en donde el beneficiario manifestó inconformidad con lo concerniente al mejoramiento de vivienda. Al darle finalización al proceso en mención el beneficiario pregunta a la parte técnica ¿QUE ACTIVIDADES SE VAN A EJECUTAR EN LA VIVIENDA? Quienes por su parte le dan a conocer al beneficiario que no se tiene claridad hasta no levantar un presupuesto de obra y que esta información se le dará en la siguiente visita que será programada por la parte social - apertura de obra, a lo que alude que él no está dispuesto a recibir este subsidio a no ser que sea instalación de cubierta, la parte técnica de la interventoría en conjunto con los técnicos de la Secretaria del Hábitat y del contratista explican al beneficiario que las instalaciones de cubiertas cumplen con unas condiciones para poder ser intervenidas y que su vivienda no cumple con esas condiciones ya no cuenta con la estructura requerida ni con la ventilación exigida para poder instalarla, luego de esta explicación el señor SALOMON TRIANA manifestó a la parte social que él esperaba el proceso de apertura pero que si en esta visita no se le informa que se instalara cubierta a su vivienda el no aceptara el beneficio y renunciara. Se levanta acta de la visita.
   El día 17/09/2021 el señor Salomón Triana se comunica con la parte social del contratista y les solicita que se le haga el proceso de renuncia ya que él no desea el mejoramiento de vivienda debido a que necesita irse a trabajar y además que el solo quiere cubierta y que está seguro que el mejoramiento no se la instalara. De lo anterior se levanta acta y se firma renuncia.

3. MVCB_ 2971 Luz Patricia Morales: Para este MV la hija de la beneficiaria había renunciado al subsidio de mejoramiento de vivienda el día en el que se realizó la reunión de inicio de obra, pero debido a que se iniciaron a realizar las validaciones la beneficiaria manifestó el día 15 de septiembre de 2021 que deseaba continuar con el proceso de mejoramiento de vivienda debido a que en un principio iba a vender la casa, pero el comprador se retractó, por ende, para el día 18 de septiembre la coordinación social del contratista en compañía de la coordinación social de interventoría, contactan a la beneficiaria vía telefónica debido a que ella se encuentra fuera de la ciudad, quien corrobora la información de querer continuar con el subsidio de mejoramiento y que está dispuesta a estar en la vivienda para cuando se inicie la obra, en el caso de la validación, dejara a su hija autorizada y una carta que desea continuar con el mejoramiento. La coordinadora social explica todas las recomendaciones e información que se brinda en la reunión de inicio de obra.

4. MVBL - 18 75 _ María Luz Bonilla, se realizó contacto telefónico con la beneficiaria al número 313-878-4636 quién manifiesto que hace un año hizo el proceso de renuncia del mejoramiento de vivienda directamente en la Secretaría del hábitat, la beneficiaria informo que vive hace un año en Ibagué y que la vivienda postulada al mejoramiento fue vendida y por parte de sus antiguos vecinos sabe que la casa ya cuenta con cuatro pisos.
   Además, informa no tener soporte de los documentos radicados en secretaria del hábitat debido a que perdió su antiguo teléfono en donde almacenaba los registros fotográficos.

### 1.5 ATENCIÓN PQR

| PQR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N.º | ID_DMV | NOMBRE BENEFICIARIO | ESTADO | OBSERVACIONES |
| | | | | |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

**1.6 ENTREGAS**
Durante las presentes semanas se realizaron _0__

| ENTREGAS DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º** | **ID_DMV** | **DIRECCIÓN** | **DESARROLLO** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA ENTREGA DE OBRAS** |
| | | | | | |

**1.7 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**
Se realiza atención a la comunidad en el PAC ubicado en el sector Nueva Colombia CARRERA 70 J SUR # 18 N - 26 NUEVA COLOMBIA – CIUDAD BOLÍVAR; Los días:

Martes: 8:30 am a 12:00 pm
Jueves: 12:00 pm a 3:00 pm
Sábados: 8:30 a 12:00 pm

Donde se atendieron a _0___

**1.8 HISTORIAS DE VIDA**

**1.9 ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)**

**1.10 CONSOLIDADO FINAL**

| | |
|---|---|
| Socializaciones | 1 |
| Caracterizaciones | 97 |
| Aperturas | 0 |
| Cierres PQR | 0 |
| Entregas | 0 |
| Renuncias | 2 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***MVCB_5462***<br>***CL 70C SUR 19B 27***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO***<br>***13/09/2021*** | ***MVCB_5179***<br>***CL 69P BIS A SUR 18N 16***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA***<br>***13/09/2021*** |
|  |  |
| ***MVCB_5556***<br>***TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS***<br>***13/09/2021*** | ***MVCB_5182***<br>***TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***ANA ISABEL MORENO FONSECA***<br>***13/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***MVCB_5119***<br>***CL 69P BIS C SUR 18P 52***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***JOSE ANTONIO VEGA***<br>***13/09/2021*** | ***MVCB_5145***<br>***CL 69P SUR 18N 42***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***WILSON CORTES CONTRERAS***<br>***14/09/2021*** |
|  |  |
| ***MVCB_5115***<br>***CL 69N SUR 18P 19***<br>***VILLAS EL DIAMANTE VIVIANA***<br>***MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ***<br>***14/09/2021*** | ***MVCB_5165***<br>***TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ***<br>***VILLAS EL DIAMANTE***<br>***JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON***<br>***14/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**





***MVCB_5126***
***CL 69N SUR 18N 40 MJ***
***VILLAS EL DIAMANTE***
***HERNANDO GONZALEZ LOZANO***
***14/09/2021***




***MVCB_5079***
***TV 18R 69K 04 SUR***
***VILLAS EL DIAMANTE***
***ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ***
***14/09/2021***






***MVJA_3462***
***KR 18R 61 57 SUR***
***ALTOS DE JALISCO***
***REINALDA GAMBOA***
***15/09/2021***

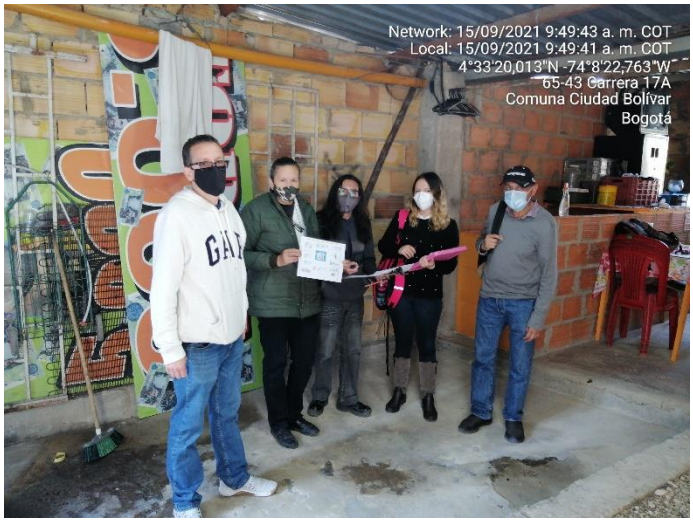


***MVJA_0370***
***CL 62 SUR 18J 71***
***CIUDAD MILAGRO***
***ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON***
***15/09/2021***


**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**
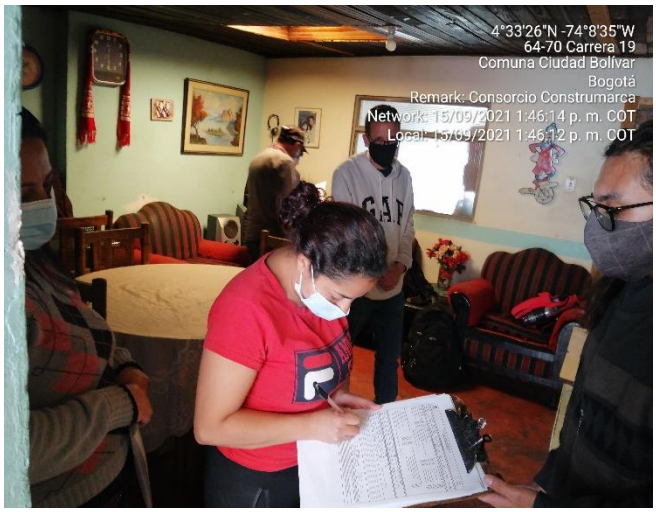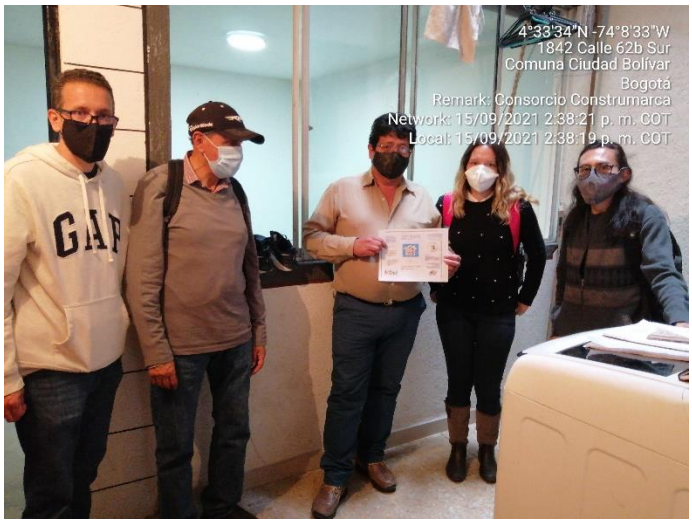
| | |
|---|---|
|  |  |
| ***MVJA_2659***<br>***KR 18L BIS A 62A 31 SUR***<br>***ALTOS DE JALISCO***<br>***LEONILDE RINCON ARIAS***<br>***15/09/2021*** | ***MVJA_2714***<br>***KR 18M 62 35 SUR***<br>***ALTOS DE JALISCO***<br>***FERNANDO ANTONIO SIERRA***<br>***15/09/2021*** |
|  |  |
| ***MVJA_1028***<br>***CL 63F SUR 18Q 10***<br>***BARRIO GIBRALTAR I Y II***<br>***BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ***<br>***15/09/2021*** | ***MVJA_3713***<br>***KR 19 62A 23 SUR***<br>***ACACIAS SUR***<br>***ANA ADELINA PARRAGA MOYA***<br>***15/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***MVCB_1743***
***CL 70J SUR 18N 40***
***MIRADOR (NUTIVARA)***
***ERNESTO TENORIO SANCHEZ***
***16/09/2021***

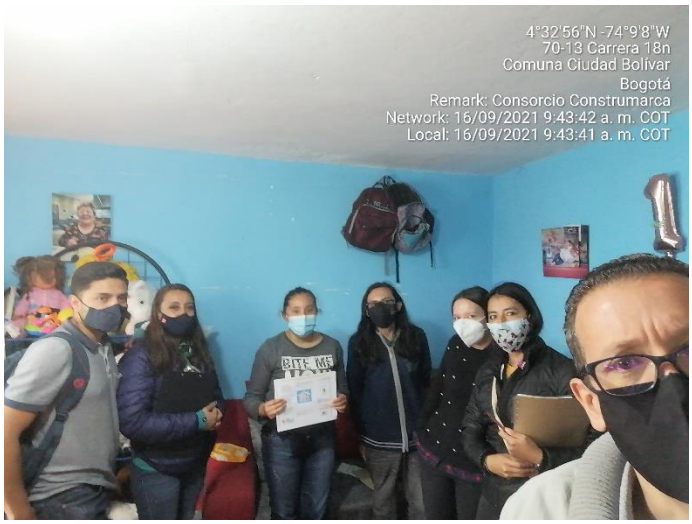


***MVCB_1602***
***CL 70G SUR 18N 28***
***MIRADOR (NUTIVARA)***
***JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA***
***16/09/2021***




***MVCB_1596***
***CL 70F SUR 18N 52***
***MIRADOR (NUTIVARA)***
***RUTH ORJUELA DE TAPIERO***
***16/09/2021***




***MVCB_1569***
***KR 18R 70F 21 SUR***
***MIRADOR (NUTIVARA)***
***RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO***
***16/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***MVCB_1723***<br>***CL 70I SUR 18Q 09***<br>***MIRADOR (NUTIVARA)***<br>***CECILIA BARATO BETANCOURT***<br>***16/09/2021*** | ***MVCB_1790***<br>***KR 18Q 70J 05 SUR***<br>***MIRADOR (NUTIVARA***<br>***ANA JULIA BERNAL BELLO***<br>***16/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 546***<br>***Fecha:13/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 627***<br>***Fecha:13/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 765***<br>***Fecha:13/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 091***<br>***Fecha:13/09/2021*** |
|  |  |


**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 748***<br>***Fecha:13/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 155***<br>***Fecha:14/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 148***<br>***Fecha:14/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 159***<br>***Fecha:14/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 152***<br>***Fecha:14/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 163***<br>***Fecha:16/09/2021*** |
|  |  |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**


| | |
|---|---|
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 164***<br>***Fecha:16/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 213***<br>***Fecha:16/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 204***<br>***Fecha:16/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 202***<br>***Fecha:16/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 788***<br>***Fecha:16/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 228***<br>***Fecha:17/09/2021*** |
|  |  |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**
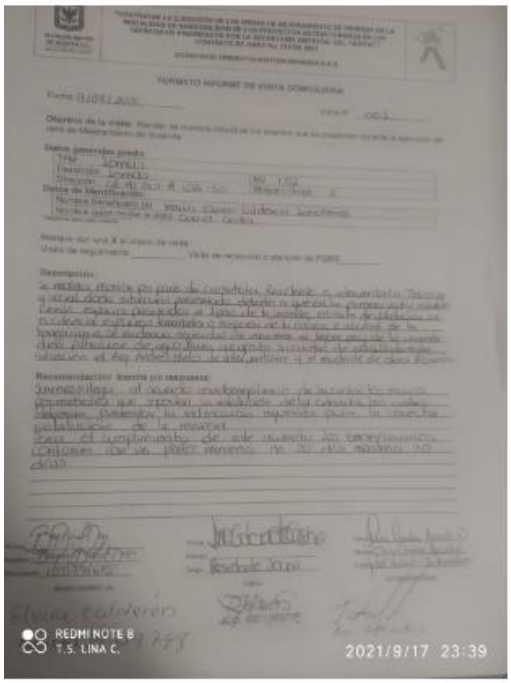
| | |
|---|---|
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 282***<br>***Fecha:17/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 330***<br>***Fecha:17/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 162***<br>***Fecha:17/09/2021*** | ***Actividad: CARACTERIZACION SOCIAL***<br>***MV: 344***<br>***Fecha:17/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: SEGUIMIENTO, VISITA CON INTERVENTORIA TECNICA***<br>***MV: 152***<br>***Fecha:17/09/2021*** | ***Actividad: SEGUIMIENTO, VISITA CON INTERVENTORIA TECNICA***<br>***MV: 152***<br>***Fecha:17/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
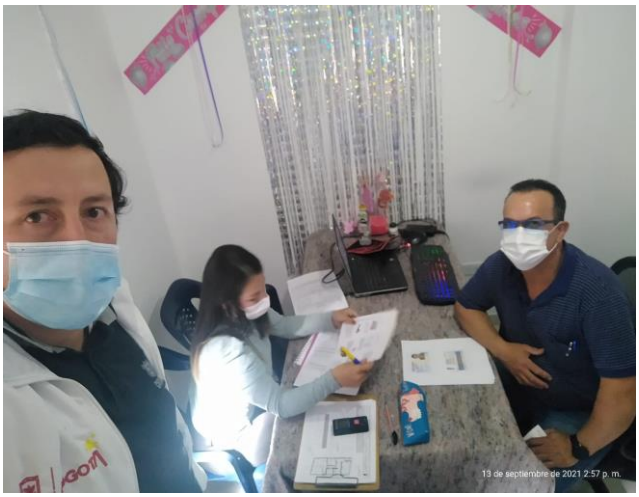
| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 1629***<br>***Fecha: 13/09/2021*** | ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 1434***<br>***Fecha: 13/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 1497***<br>***Fecha: 13/09/2021*** | ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 1430***<br>***Fecha: 13/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 1769***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 3025***
***Fecha:14/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 3002***
***Fecha: 14/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2772***
***Fecha: 14/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2599***
***Fecha:14 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2471***
***Fecha: 14/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2769***
***Fecha:14 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2912***
***Fecha:14 /09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación***
***MVCB_2431***
***Fecha:14 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_3032***
***Fecha:14 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2963***
***Fecha: 15/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 1627***
***Fecha:15 /09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2838***
***Fecha: 15/09/2021***



***Actividad: Validación***
***MVCB_ 3606***
***Fecha:15 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2968***
***Fecha:15 /09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_2986***
***Fecha: 15/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
|  |  |
| ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_2973***<br>***Fecha: 15/09/2021*** | ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 2966***<br>***Fecha: 15/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 3006***<br>***Fecha: 15/09/2021*** | ***Actividad: Validación***<br>***MVCB_ 2977***<br>***Fecha: 16/09/2021*** |

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2176***
***Fecha: 16/09/2021***



***Actividad: Validación***
***MVCB_ 2192***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_ 5116***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación***
***MVCB_2465***
***Fecha: 15/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1879***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1845***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1401***
***Fecha: 13/09/2021***



***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1340***
***Fecha: 13/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1324***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1355***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1271***
***Fecha: 13/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1792***
***Fecha: 14/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 5417***
***Fecha: 14/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 5455***
***Fecha: 14/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1466***
***Fecha: 14/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 1888***
***Fecha: 15/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 3013***
***Fecha: 15/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 2937***
***Fecha: 15/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 3580***
***Fecha: 15/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB:2976***
***Fecha: 15/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB:3617***
***Fecha: 15/09/202***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB:2644***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación Social / fallida***
***MVCB: 2387***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación Social / fallida***
***MVCB: 2975***
***Fecha: 16/09/2021***

**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 3171***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 2876***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación Social / posible renuncia***
***MVCB: 3639***
***Fecha: 16/09/2021***




***Actividad: Validación Social***
***MVCB: 3545***
***Fecha: 17/09/2021***






**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
**INFORME SEMANAL SOCIAL No 4**

| | |
|---|---|
| ***Actividad: Validación Social***<br>***MVCB: 3583***<br>***Fecha: 17/09/2021*** | ***Actividad: Validación Social***<br>***MVCB: 2705***<br>***Fecha: 17/09/2021*** |
|  |  |
| ***Actividad: Validación Social***<br>***MVCB: 2149***<br>***Fecha: 17/09/2021*** | ***Actividad: Validación Social***<br>***MVCB: 3088***<br>***Fecha: 17/09/2021*** |
