PROCESO

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA

SUBPROCESO

CONSULTORÍA

TITULO

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 2

INFORME N°	**3**		**5/9/2021** de/mm/yyyy	**AL:**	**11/9/2021** dd/mm/yyyy
CONTRATO DE OBRA Nº	**795 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S**		
CONTRATO INTERVENTORÍA Nº	**798 DE 2021**	**CONTRATISTA:**	**CONSTRUMARCA SAS**		
OBJETO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.".**				

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA:	**20/8/2021** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:**	**4/2/2022** dd/mm/yyyy
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:	**20/8/2021** dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA:**	**7/3/2022** dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LEGAL:

La interventoría radicó ante la secretaria distrital de habitat el informe semanal No.02

TÉCNICO:

El componente técnico apoyó al componente social en la reunión de socialización ante la comunidad que se realizó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el territorio conocido como Lomas, el día 11 de septiembre del 2021.

Se realizaron un total de 38 validaciones en territorio de habitarte en la localidad de ciudad bolivar, de la siguiente manera:

Miercoles:
MVCB_5430, MVCB_5434, MVCB_5249, MVCB_5316, MVCB_5345
Jueves:
MVCB_5416 ,MVCB_5418 ,MVCB_5419 ,MVCB_5451 ,MVCB_5453, MVCB_5407 ,MVCB_5411 ,MVCB_5414, MVCB_5398, MVCB_5325, MVCB_5347, MVCB_5322, MVCB_5290, MVCB_5279, MVCB_5281.
Viernes:
MVCB_1762 ,MVCB_1823 ,MVCB_1834 ,MVCB_5435 ,MVCB_1551 ,MVCB_1554 ,MVCB_5521 ,MVCB_5399 ,MVCB_1612 ,MVCB_5488 ,MVCB_1911 y MVCB_1845, MVCB_5202, MVCB_5254, MVCB_5410, MVCB_5477, MVCB_5392, MVCB_5406

SST

Durante el periodo se iniciaron actividades de campo - fase I validación. Se realizó revisión de documentación del personal profesional y administrativo, el contratista ya cuenta con el Pac en el sector de Habitarte, está debidamente señalizado.
En desarrollo de la fase de validación se hizo entrega de dos (02) tapabocas por vivienda, se está diligenciando fomato de vacunación covid.

IDENTIFICACION MV	ESTADO	FECHA APERTURA	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE	DÍAS DE ATRASO ENTREGA DE MV	OBSERVACIONES
BLOQUE 8								
CIUDAD BOLIVAR								
MVJA_2830			KR 18M BIS 62 16 SUR	JALISCO	MARIA LUISA CONTRERAS SANABRIA			
MVCB_5209			DG 69Q SUR 18N 73	HABITARTE 2019-MV	MARCELINDA MURCIA			
MV_04993			CL 70T SUR 27C 23 MJ 1	CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE	ROSALBINA ZABALA MENDOZA			
MVJA_1378			CL 65 SUR 18N 47	TRANSICION - JALISCO	JOSE GONZALO HILARION PARRA			
MVJA_1460			CL 65B SUR 18M 16	TRANSICION - JALISCO	WILSON MAURICIO BRICEÑO			
MVJA_3226			KR 18P BIS A 61A 64 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CARMEN ROSA ACUNA PEREZ			
MVJA_3228			KR 18P BIS A 61A 75 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	FRANZ GARRY PARRA ROJAS			
MVJA_3235			KR 18P BIS A 61C 08 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	FLOR ALBA BUCURU HERRADA			
MVJA_3285			KR 18P BIS B 61A 84 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUIS ALFREDO CASTRO MENJURA			
MVJA_1786			DG 64 BIS SUR 19 23	TRANSICION - JALISCO	GEORGINA SALAZAR			
MVJA_2797			KR 18M BIS 61B 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUZ MILA VASQUEZ PAEZ			
MVJA_2899			KR 18N 61A 64 SUR	TRANSICION - JALISCO	JAIRO MUÑOZ HERNANDEZ			
MVJA_3227			KR 18P BIS A 61A 65 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	JORGE ENRIQUE LANCHEROS RENGIFO			
MVJA_0571			CL 62A SUR 18N 15	TRANSICION - JALISCO	RITO JULIO ROJAS SAENZ			
MVJA_2733			KR 18M 62A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL CARMEN LEAL QUESADA			
MVJA_2920			KR 18N 62 49 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO CRUZ ORTEGON			
MVJA_3139			KR 18P 62A 24 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	JAIME DE JESUS NEMOCON ROSAS			
MVJA_3399			KR 18Q 63D 18 SUR	TRANSICION - JALISCO	PAOLA ANDREA CASTRILLON FLOREZ			
MVJA_0387			CL 62 SUR 18K 59	TRANSICION - JALISCO	MARTIN MEDINA BERRIO			
MVJA_0538			CL 62A SUR 18L 39	TRANSICION - JALISCO	DORIS VASQUEZ			
MVJA_2721			KR 18M 62 54 SUR	TRANSICION - JALISCO	MICHAEL STIVEN CAMACHO VEGA			
MVJA_0277			CL 61D SUR 18R 54	TRANSICION - JALISCO	DIOSELINA FLOREZ MONTES			
MVJA_0853			CL 63A SUR 18R 13	TRANSICION - JALISCO	RAFAEL ENRIQUE URIBE LOZANO			
MVJA_0964			CL 63D SUR 18K 38	TRANSICION - JALISCO	MARIA ARCENIA COMBITA TINJACA			
MVJA_3328			KR 18P BIS B 62A 31 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	ISRAEL ANTONIO CABRERA ZAPATA			

MVJA_4354			TV 18Q BIS D 61B 52 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALICIA ALMARIO NUNEZ			
MVJA_2340			KR 18J BIS 63D 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MANUEL ANTONIO ROMERO LEON			
MVJA_2772			KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	ROSA RUBIANO OCHOA			
MVJA_3293			KR 18P BIS B 61C 11 SUR	TRANSICION - JALISCO	GABRIEL SIMBAQUEVA GONZALEZ			
MVJA_3385			KR 18Q 63A 15 SUR	TRANSICION - JALISCO	SONIA JANETH PAEZ			
MVJA_4378			TV 18R 61B 51 SUR	TRANSICION - JALISCO	LUZ DARY GUAPACHA LARGO			
MVJA_4328			TV 18Q BIS B 61B 76 SUR	TRANSICION - JALISCO	SOR MARIA GOMEZ NARANJO			
MVCB_1762	**validada**		CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1823	**validada**		CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1833			CL 70K SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	MYRIAM RUBIELA PAZ MURILLO			
MVCB_1834	**validada**		CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5202	**validada**		DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA			
MVCB_5254	**validada**		DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO			
MVCB_2431			KR 18M BIS 69A 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA			
MVCB_2474			KR 18L BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CONSUELO RAMIREZ			
MVCB_2597			KR 18L BIS B 69A 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE JESUS SAMACA DE PIRAGAUTA			
MVCB_3012			KR 18M BIS A 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA PATRICIA LOPEZ OSORIO			
MVCB_3019			KR 18M BIS A 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA SULINDA VILLAMIL CANOM			
MVCB_3032			KR 18M BIS 69A 89 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLENY JARAMILLO ROMERO			
MVCB_5179			CL 69P BIS A SUR 18N 16	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA			
MVCB_2176			CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ			
MVCB_2192			KR 18R BIS 69B 29 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA			
MVCB_5416	**validada**		CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5418	**validada**		KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5419	**validada**		CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5430	**validada**		CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA			se valido el dia 8 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5434	**validada**		CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO			se valido el dia 8 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5435	**validada**		CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_2963			DG 69A BIS D SUR 18M 18	TRANSICION HABITARTE 2019	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS			
MVCB_2966			DG 69A BIS D SUR 18M 32	TRANSICION HABITARTE 2019	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR			
MVCB_2968			DG 69A BIS D SUR 18M 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBERTO ANTONIO ISAZA			
MVCB_2971			TV 18M BIS B 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ PATRICIA MORALES			
MVCB_2972			TV 18M BIS B 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ DARY ROBAYO RAMIREZ			
MVCB_2973			TV 18M BIS B 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL			
MVCB_5106			TV 18P BIS 69L 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA MILENA RUIZ VILLAMIL			
MVCB_5117			TV 18P BIS 69N 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY PAOLA RAMIREZ ROMERO			
MVCB_5329			TV 18N BIS 69R 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	HERCILIA SOTELO VEGA			
MVCB_5338			TV 18N BIS 69R 50 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SAULINA DEL TRANSITO AREVALO BUITRAGO			
MVCB_5339			TV 18N BIS 69R 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ANUNCIACION JIMENEZ DE AGREDO			
MVCB_5342			TV 18N BIS 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ASCENCION MELO FERRUCHO			
MVCB_2465			DG 69A BIS C SUR 18L 85	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY LIZCANO CORNELIO			
MVCB_2471			DG 69A BIS C SUR 18L 51	TRANSICION HABITARTE 2019	AMPARO OSPINA ORTIZ			
MVCB_2599			KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ			
MVCB_2769			KR 18L BIS B 69A 41 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA			
MVCB_2772			DG 69A BIS C SUR 18L 78	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA SANCHEZ ARDILA			
MVCB_2912			DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES			
MVCB_3002			DG 69A BIS B SUR 18M 03	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS			
MVCB_5163			CL 69P SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO ALEJANDRO AVELLANEDA AVELLANEDA			
MVCB_5270			DG 69Q SUR 18N 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEJANDRINA RODRIGUEZ PALACIO			
MVCB_5279	**validada**		TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ			
MVCB_5281	**validada**		TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA			
MVCB_1368			CL 70J SUR 18L 35	TRANSICION HABITARTE 2019	OTILIA PICO BARRERA			

MVCB_1392			CL 70J SUR 18L 70	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ GILMA CUCUNUBA BARRERA			
MVCB_1551	**validada**		KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1552			KR 18N 70I 14 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA			
MVCB_1554	**validada**		CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1557			KR 18M 70I 11 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE JOAQUIN PACHECO QUIROGA			
MVCB_3025			KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES			
MVCB_3479			TV 18P BIS 69A 36 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SARA ELISA PRIETO CASTILLO			
MVCB_3606			TV 18N BIS A 69A 62 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULETA OROZCO			
MVCB_5451	**validada**		KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5453	**validada**		KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5521	**validada**		CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_2112			KR 18W 69B 06 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR MIREYA NIVIA CHAVEZ			
MVCB_1627			KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS			
MVCB_1629			KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO			
MVCB_1723			CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT			
MVCB_1769			CL 70J SUR 18N 53	TRANSICION HABITARTE 2019	GERARDO VEGA VICTORIA			
MVCB_2162			KR 18V 68C 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	OLGA CECILIA RUIZ			
MVCB_3266			KR 18U BIS A 68C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCIA SANCHEZ POBLADOR			
MVCB_1497			CL 70H SUR 18J 81	TRANSICION HABITARTE 2019	PABLO VALBUENA			
MVCB_1430			CL 70H SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO			
MVCB_1434			CL 70H SUR 18L 21	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA			
MVCB_1446			CL 70H SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARY MAYORGA MACANA			
MVCB_5204			DG 69Q BIS SUR 18N 60	TRANSICION HABITARTE 2019	MERCEDES ALBINO RODRIGUEZ			
MVCB_5210	**validada**		DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	NANCY DUARTE CALDERON			
MVCB_5267			TV 18N BIS A 69Q 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARBILUZ JAVELA PALOMINO			
MVCB_5553			DG 69Q SUR 18N 94	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA PALOMINO OSORIO			
MVCB_2838			DG 69C BIS SUR 18M 84	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA			
MVCB_2977			TV 18M BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ			
MVCB_2986			TV 18N 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS GUARIN			
MVCB_3006			KR 18M BIS B 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EMILIO VARGAS			
MVCB_5064			TV 18P BIS 69K 08 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA JIMENEZ FONSECA			
MVCB_5071			TV 18P BIS A 69K 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA VELASCO OVALLE			
MVCB_5086			DG 69L BIS SUR 18P 64 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GERMAN CASTRO HERNANDEZ			
MVCB_5091			CL 69L BIS SUR 18N 42 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO GOMEZ JIMENEZ			
MVCB_5100			CL 69N SUR 18P 20 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MELANIA MANCILLA HERNANDEZ			
MVCB_5101			CL 69N SUR 18P 24 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JULIA GALINDO RANGEL			
MVCB_5103			DG 69L BIS SUR 18P 43 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LAUREANO RODRIGUEZ VASQUEZ			
MVCB_5116			TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL			
MVCB_5140			CL 69L BIS SUR 18N 59 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	DIANA MATILDE GOMEZJIMENEZ			
MVCB_5160			CL 69N SUR 18N 29 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EFRAIN ROMERO RODRIGUEZ			
MVCB_5167			CL 69P BIS A SUR 18P 30 IN 3 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS HERNANDO SOSA ACEVEDO			
MVCB_5168			CL 69PBISA SUR 18P 30 IN 2 MJ1	TRANSICION HABITARTE 2019	ISABEL PERALTA RUIZ			
MVCB_2876			DG 69C SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDUARDO AREVALO SOSA			
MVCB_2931			TV 18N 69A 91 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON			
MVCB_2937			TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO			
MVCB_3639			TV 18N BIS 69A 67 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SALOMON TRIANA SALGUERO			
MVCB_2122			KR 18W 68C 40 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO JEREZ BLANCO			
MVCB_2151			KR 18V 68C 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA STELLA ALARCON MORALES			
MVCB_5217			CL 69Q SUR 18P 12	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA TRIANA DE SOSA			
MVCB_1741			CL 70J SUR 18N 26	TRANSICION HABITARTE 2019	ORLANDO VELASCO ARDILA			
MVCB_1743			CL 70J SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ERNESTO TENORIO SANCHEZ			
MVCB_1744			CL 70J SUR 18N 48	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ			
MVCB_2547			KR 18K 70B 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MERCEDES HUERTAS			
MVCB_2645			CL 70C SUR 18I 95	TRANSICION HABITARTE 2019	NORA TERESA PENAGOS CAYCEDO			
MVCB_2649			CL 70C SUR 18I 79	TRANSICION HABITARTE 2019	MARCO AURELIO BERNAL RIVERA			
MVCB_2663			CL 70D SUR 18I 91	TRANSICION HABITARTE 2019	FREDY ALEXANDER ORDOÑEZ GALINDO			

MVCB_1115			DG 69D SUR 18J 51	TRANSICION HABITARTE 2019	ZORAIDA VERA			
MVCB_1116			DG 69D SUR 18J 47	TRANSICION HABITARTE 2019	JESUS ELIAS AYALA GUZMAN			
MVCB_1152			DG 69D BIS SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA AVILA			
MVCB_1248			CL 70N SUR 18L 84	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA OLIVA BUSTOS			
MVCB_1257			CL 70M SUR 18L 71	TRANSICION HABITARTE 2019	QUERUBIN OSPINA			
MVCB_1353			CL 70K SUR 18L 68	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ PATIÑO ARDILA			
MVCB_1447			TV 18M 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	VITALIA CARDENAS DUCUARA			
MVCB_1536			KR 18M 70M 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO PRECIADO			
MVCB_5079			TV 18R 69K 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ			
MVCB_5325	**validada**		DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ			
MVCB_5406	**validada**		CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ			
MVCB_5410			KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ			
MVCB_5556			TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS			
MVCB_2866			DG 69C SUR 18N 59	TRANSICION HABITARTE 2019	FABIO OLAYA CIFUENTES			
MVCB_2965			DG 69A BIS D SUR 18M 28	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA GLADYS LAVERDE			
MVCB_3008			KR 18M BIS B 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS			
MVCB_3013			KR 18M BIS A 69A 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES			
MVCB_3171			KR 18R 69 75 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCICIO ALFONSO FORERO			
MVCB_3580			TV 18N BIS A 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO			
MVCB_3582			TV 18N BIS A 69A 57 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	AMIRA YANETH VEGA BUITRAGO			
MVCB_5250			TV 18P 69Q 18 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	YHON ALEXANDER PEREZ PULIDO			
MVCB_5399	**validada**		CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5407	**validada**		CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5411	**validada**		KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5414	**validada**		CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_5421			CL 70D SUR 19A 16	TRANSICION HABITARTE 2019	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL			
MVCB_5417			CL 70C SUR 18R 17 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ			
MVCB_1612	**validada**		CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1792			KR 18R 70K 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELDA INES CANDELA ZABALA			
MVCB_2976			TV 18M BIS B 69A 73 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCENETH OLAYA TABORDA			
MVJA_2105			DG 64A SUR 19B 39	TRANSICION - JALISCO	MARIA DEL TRANSITO POLANIA CRUZ			
MVJA_0307			CL 62 BIS SUR 18K 10	TRANSICION - JALISCO	DAGOBERTO RODRIGUEZ CANTOR			
MVJA_0369			CL 62 SUR 18J 70	TRANSICION - JALISCO	JOSE LEOPOLDO PEÑALOZA			
MVJA_0917			CL 63C SUR 18P 05	TRANSICION - JALISCO	ERNESTO TIBANA BLANCO			
MVJA_3405			KR 18Q BIS 63A 20 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARY INGRE MILENA			
MVJA_0261			CL 61D SUR 18P 12 IN 11	TRANSICION - JALISCO	MARIA DE LOS ANGELES SILVA DUQUE			
MVJA_2915			KR 18N 62 24 SUR	TRANSICION - JALISCO	MARIA MAGDALENA GALEANO			
MVJA_4290			TV 18Q BIS 61B 40 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA YANET SABOGAL ARDILA			
MVJA_4299			TV 18Q BIS A 61A 13 SUR	TRANSICION - JALISCO	DORA CECILIA ACOSTA CASTAÐEDA			
MVJA_2438			KR 18K BIS 61 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	BLANCA LEONOR AVENDANO			
MVJA_2512			KR 18L 61B 26 SUR	TRANSICION - JALISCO	ALEX ARNULFO OLAYA DURAN			
MVJA_0316			CL 62 BIS SUR 18K 28	TRANSICION - JALISCO	MARIA EBELIA LEAL			
MVJA_0187			CL 61C SUR 18N 09	TRANSICION - JALISCO	OVIDIO GOMEZ VARGAS			
MVJA_3144			KR 18P 62A 39 SUR MJ	TRANSICION - JALISCO	CELIA ROMERO DUARTE			
MVJA_1265			CL 64D SUR 18M 20	TRANSICION - JALISCO	DIANA MARCELA MRTINEZ RODRIGUEZ			
MVJA_2536			KR 18L 63D 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	GRACIELA CARBONEL DE GUZMAN			
MV_42760-IDU			CALLE 71 I BIS SUR 27A-05	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Comunal 1481	NELSON DARIO GUERRERO CASTEBLANCO			
MV_42764-IDU			CARRERA 27F 71D 34 SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Comunal 1481	FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ URREGO			
MV_42802-IDU			CL 71G BIS SUR 27A 33	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Comunal 1481	JOSE RICARDO GARZON MENDEZ			
MV_42803-IDU			CARRERA 27D 71D-58SUR	TRANSICION - CIUDAD BOLIVAR-BORDE RURAL-CABLE / Comunal 1481	EDWIN ANDRES CASTRO			
MVCB_1118			DG 69D SUR 18J 39	TRANSICION HABITARTE 2019	JOHN RAMIREZ MALDONADO			
MVCB_1119			DG 69D SUR 18J 35	TRANSICION HABITARTE 2019	NOEMI MALDONADO DE RAMIREZ			
MVCB_1163			KR 18J 69F 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORA IDALI GALINDO TRIVIÑO			
MVCB_1216			DG 69G SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	YORMARY GALINDO ORDOÑEZ			
MVCB_1268			CL 70M SUR 18L 50	TRANSICION HABITARTE 2019	MONICA CRISTINA PEREZ BARRIGA			
MVCB_1269			CL 70M SUR 18L 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA DORIS SEGURA			

MVCB_1270			CL 70M SUR 18L 58	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIA CUCUNUBA DE CRUZ			
MVCB_1370			CL 70J SUR 18L 27	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS JULIO MURILLO RODRIGUEZ			
MVCB_1422			CL 70I SUR 18L 60	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CRUZ RAMIREZ			
MVCB_1444			CL 70H SUR 18L 40	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA LIGIA SUAREZ GOMEZ			
MVCB_1445			CL 70H SUR 18L 46	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALONSO MORA MEJIA			
MVCB_1569			KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO			
MVCB_1596			CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO			
MVCB_1602			CL 70G SUR 18N 28	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA			
MVCB_1676			CL 70I SUR 18N 08	TRANSICION HABITARTE 2019	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ			
MVCB_1727			KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO			
MVCB_1736			KR 18P 70J 03 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SIXTO ALFONSO LAITON COY			
MVCB_1753			CL 70I SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ			
MVCB_1782			CL 70K SUR 18Q 14 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	GLICERIO RODRIGUEZ			
MVCB_1790			KR 18Q 70J 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JULIA BERNAL BELLO			
MVCB_3462			TV 18P BIS 69A 88 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MIGUEL GUZMAN			
MVCB_3505			TV 18P 69A 25 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CHARLIE EDGARDO GARCIA CABALLERO			
MVCB_5115			CL 69N SUR 18P 19	TRANSICION HABITARTE 2019	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ			
MVCB_5119			CL 69P BIS C SUR 18P 52	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ANTONIO VEGA			
MVCB_5126			CL 69N SUR 18N 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	HERNANDO GONZALEZ LOZANO			
MVCB_5145			CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS			
MVCB_5165			TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON			
MVCB_5249	**validada**		DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO			
MVCB_5316	**validada**		TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ			
MVCB_5462			CL 70C SUR 19B 27	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO			
MVCB_5477	**validada**		KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO			
MVCB_2554			CL 70B SUR 18J 27	TRANSICION HABITARTE 2019	MARY NATALY BECERRA GOMEZ			
MVCB_2556			CL 70B SUR 18J 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILIA CHACON MORA			
MVCB_5182			TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ISABEL MORENO FONSECA			
MVCB_5290	**validada**		DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO			
MVCB_5322	**validada**		TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS			
MVCB_5345	**validada**		TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES			
MVCB_5347	**validada**		TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO			
MVCB_5392	**validada**		CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA			
MVCB_1475			CL 70G SUR 18K 33	TRANSICION HABITARTE 2019	MIGUEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ			
MVCB_1324			CL 70K SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ			
MVCB_1340			CL 70K SUR 18L 16	TRANSICION HABITARTE 2019	YOLANDA VARGAS ESPAÑA			
MVCB_1401			CL 70I SUR 18L 69	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO			
MVCB_1605			CL 70G SUR 18N 44 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA ACOSTA USECHE			
MVCB_1888			KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA			
MVCB_2149			KR 18V 68C 47 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO			
MVCB_2644			CL 70C SUR 18I 99	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA AMPARO TORRES ARIAS			
MVCB_2964			DG 69A BIS D SUR 18M 24	TRANSICION HABITARTE 2019	AURA CECILIA ANTOLINEZ			
MVCB_2975			TV 18M BIS B 69A 69 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO DE ALCANTARA REYES			
MVCB_3162			KR 18R 69 09 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLARAIBEL MORENO FERRUCHO			
MVCB_3545			TV 18P 69A 46 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTHA VICTORIA MENDEZ			
MVCB_3576			TV 18N BIS A 69A 39 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA FLOR RAMIREZ ESTRADA			
MVCB_3583			TV 18N BIS A 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH LUCILA TOVAR			
MVCB_3590			TV 18N BIS A 69A 87 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ			
MVCB_3617			TV 18N BIS A 69A 26 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EVELIA MORALES GARCIA			
MVCB_5455			KR 19C 70C 42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA JACQUELINE ROJAS			
MVCB_5468			KR 19B 70D 13 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	FLORALBA SIMIJACA CAMACHO			
MVCB_5488	**validada**		KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVJA_0091			CL 61A SUR 18N 27	TRANSICION - JALISCO	JOSE ALEXANDER GOMEZ MORA			
MVJA_1028			CL 63F SUR 18Q 10	TRANSICION - JALISCO	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ			
MVJA_1405			CL 65 SUR 18R 42	TRANSICION - JALISCO	CESAR CRUZ MOLANO			
MVJA_2659			KR 18L BIS A 62A 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS			
MVJA_2714			KR 18M 62 35 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA			
MVJA_3462			KR 18R 61 57 SUR	TRANSICION - JALISCO	REINALDA GAMBOA			
MVJA_3713			KR 19 62A 23 SUR	TRANSICION - JALISCO	ANA ADELINA PARRAGA MOYA			

MVJA_0370			CL 62 SUR 18J 71	TRANSICION - JALISCO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON			
MVCB_1355			CLL 70K # 18L-76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ODILIA PRADA DIAZ			
MVCB_1879			KR 18 P 70 K 36	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA MEDINA NIÑO			
MVCB_1911	**validada**		CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_2942			TV 18 N BIS 69 A 72 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CRISTINA GARCIA DE ARDILA			
MVCB_5150			CLL 69 P SUR · 18 P 20	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA NELLY MARTINEZ			
MVCB_1271			CL 70 M SUR 18 L 62	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA			
MVCB_2160			KR 18V 68C 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EDILBERTO RIVERA SANCHEZ			
MVCB_1845	**validada**		KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ			se valido el dia 10 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
MVCB_1868			KR 18P 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO			
MVCB_2705			TV 18Q 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GUILLERMO MORALES SALINAS			
MVCB_1466			CL 70 H SUR 18J 64	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL			
MVCB_2212			CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO			
MVCB_2387			KR 18K BIS 69T 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO			
MVCB_2803			CL 69 C SUR 18 U 63	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ALEXANDER DIAZ FETIVA			
MVCB_3088			TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ			
MVCB_3117			CL 69B BIS SUR 18U 14	TRANSICION HABITARTE 2019	MARÍA INÉS CÁRDENAS			
MVCB_3118			CL 69B BIS SUR 18U 18	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MYRIAM GÓMEZ ARDILA			
MVCB_5223			CL 69 P BIS C SUR 18P-49	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE GUSTAVO GRAJALES			
MVCB_5398	**validada**		CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS			se valido el dia 9 de septiembre en compañia del residente del contratista julian peña y estamos a la espera de que el contratista monte el presupuesto para poder realizar la evaluacion y su posterior aprobacion
RAFAEL URIBE URIBE								
MV_044			KR 9D 38 24 SUR	LOMAS	ANA BEATRIZ RINCON RAMOS			
MV_113			KR 9H 37 27 SUR	LOMAS	LUZ HELENA OSORIO CASTRO			
MV_115			KR 9H 37 35 SUR	LOMAS	LUIS ANTONIO ROPERO ARDILA			
MV_116			KR 9H 39 05 SUR	LOMAS	PEDRO JESUS FERRER ESTUPIÑAN			
MV_124			KR 9H 39 51 SUR	LOMAS	BLANCA INES FIQUE AREVALO			
MV_148			Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE			
MV_152			CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS			
MV_155			CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON			
MV_159			CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO			
MV_162			CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO			
MV_163			CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS			
MV_164			CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA			
MV_202			KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ			
MV_204			KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL			

MV_209			KR 11A 41 28 SUR	LOMAS	CLARA LUCIA TORRES BUITRAGO			
MV_213			KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA			
MV_228			KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ			
MV_282			KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO			
MV_330			Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR			
MV_344			CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA			
MV_361			CL 36F SUR 11C 36	LOMAS	ROSA HERMINDA RODRIGUEZ GOMEZ			
MV_398			CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS			
MV_415			CL 36F SUR 11A 02	LOMAS	DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO			
MV_447			CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO			
MV_462			CL 36 SUR11C 13	LOMAS	AMPARO OLAYA			
MV_483			CL 36G SUR 11C 63	LOMAS	MARIO DELFIN VELASCO			
MV_500			CL 36H SUR 11C 95	LOMAS	ELSA REYES BAQUERO			
MV_506			CL 36H SUR 11C 82	LOMAS	MARIA MARGARITA CRUZ			
MV_507			Cl 36H SUR 11C 81	LOMAS	EDELMIRA RAMIREZ DE ORJUELA			
MV_512			CL 36H SUR 11C 69	LOMAS	MARIA GLADYS BRICEÑO MARTINEZ			
MV_515			CL 36H SUR 11C 63	LOMAS	LEONOR RINCON CORREDOR			
MV_520			CL 36H SUR 11C 51	LOMAS	NUBIA RAMIREZ RUEDA			
MV_530			CL 36H SUR 11C 28	LOMAS	MARIA SORAIDA PARRA LEGUIZAMON			
MV_532			Cl 36H SUR 11C 23	LOMAS	GUSTAVO CUESTA AMAYA			
MV_543			CL 36H SUR 11A 58	LOMAS	VICTOR MANUEL CARDENAS RINCON			
MV_546			CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA			
MV_627			CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO			
MV_748			Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES			
MV_765			Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO			
MV_788			KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO			
MV_091			KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO			
BOSA								
MVBL_1875			CL 66 SUR 89A 77	BOSA LA LIBERTAD	MARIA LUZ BONILLA			
						0%		

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	ADELANTO / ATRASO
	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
	PROGRAMADO ACUMULADO TOTAL DEL FRENTE		0%	
	TOTAL VALOR VALIDADO FRENTE DE OBRA		0%	

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS APERTURADAS	NUMERO DE VIVIENDAS POR APERTURAR	NUMERO VIVIENDAS TERMINADAS	NUMERO VIVIENDAS POR TERMINAR	NUMERO DE VIVIENDAS PAGADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
310	38	272	0	310	0	310	0	0



3. PLAZO

Fecha de terminación de ejecución de obra.			4/2/2022
CANT. DÍAS	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	165	22	143
Proyección	165	22	143

4- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Semana Anterior	0	4/2/2022	9,09%
Semana Actual	0	4/2/2022	13,33%

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

JUSTIFICACIÓN:

Se inició la fase I de validación. Se realizaron 38 validaciones en territorio de habitarte en la localidad de ciudad bolivar.

6- DESCRIPCIÓN CASOS ESPECIALES

7- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha a Corte		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$		$	%
Directos+AIU+IVA	$ 5.130.409.981,00					
TOTAL	$ 5.130.409.981,00					

8- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fue reiterativa la solicitud de interventoria hacia el contratista de llevar todos los formatos necesarios para las validaciones, puesto que en algunos casos no llevaron el presupuesto estructurado o el formato de validacion, razon por la cual se requirió llegar a territorio con toda la informacion necesaria, para que el proceso sea más ágil.

9- ESTADO DEL TIEMPO

martes - no llovio pero clima parcialmente nublado
miercoles - no llovio pero clima parcialmente nublado
jueves - no llovio pero clima parcialmente nublado
viernes - no llovio pero clima parcialmente nublado

Interventoría- GRUPO 2
CONTRUMARCA

Fecha: 13 de Agosto de 2021.	**Periodo:** 5 al 11 de Septiembre de 2021	**Informe No.:** Semanal No. 003
Proyecto: **CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 1 Y 2 - 2021."**		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 798 del 2021

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 del 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT GRUPO 1 Y 2-2021.
CONTRATISTA	Ambientalmente Ingeniería S.A.S.
PLAZO	5 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	20 de agosto del 2021
FECHA FINAL	4 de febrero del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

GRUPO 2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Durante la semana reportada en el informe se dio inicio a las actividades de Visitas de Validación en el territorio de Ciudad Bolívar – Habitarte 2019. Estas visitas se realizaron según la proyección y programación del contratista, sin embargo nos permitieron identificar las necesidades habitacionales fundamentales de los beneficiarios del proyecto y en la misma medida las diferentes situaciones de vulnerabilidad socio económico que presentan las familias.
2. Estas visitas también nos permitieron el reconocimiento geográfico del territorio de Ciudad Bolívar donde se desarrollarán los mejoramientos de vivienda, de esta manera se logró dimensionar diferentes aspectos que representan fortalezas y dificultades al realizar la ejecución de obras en el territorio, entre estos principalmente los temas de accesibilidad a las viviendas, presencia de vías de acceso, temas de seguridad, permitiendo a las áreas técnica y social el diseño para fortalecer dichas oportunidades y prevención en cuanto a las dificultades.

3. CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante la segunda semana del mes de septiembre del año en curso, se efectuó la primera actividad de acompañamiento y verificación por parte de la interventoría **Construmarca S.A.S**, en donde se realizó la división por grupos de profesionales, los cuales se describen a continuación:

*Por Interventorías, TS Daniela Monzón y Arq. Andrés Melo, así dar inicio a la fase de validación y caracterización en el **TPM** Habitarte transición, sector Villas del diamante por el equipo contratista de: Arq. María Isabel Pinzón y TS Pablo Chitiva.

* Por interventoría, TS Carolina Navarro e Ing. Erick Velosa, así dar inicio a la fase de validación y caracterización en el **TPM** Habitarte transición, sector Villas del diamante por el equipo contratista: Arq. Julián Peña y TS. Marguie Rincón.

*Por interventoría, TS Carolina Arévalo e Ing. Erick Velosa, así dar inicio a la fase de validación y caracterización en el **TPM** Habitarte transición, sector Villas del diamante por el equipo contratista: Arq. Julián Peña y TS. Yesenia Gámez.

En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de los dos consorcios, se procede a realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Asimismo, indagación con respecto al carnet de vacunación del COVID-19. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la documentación de la persona a la cual se le otorga el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VALIDACIONES HABITARTE –CIUDAD BOLÍVAR						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Miércoles 8 de septiembre de 2021						
1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA	08/09/2021	Hogar conformado por cinco personas, no se presentan situaciones de discapacidad, se evidencia hacinamiento ya que solo se habilitaron dos habitaciones para dormitorios.

2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	VILLAS EL DIAMANTE	ALFONSO GARCIA GARAVITO	08/09/2021	Hogar conformado por dos adultos mayores con fragilidad socio económico debida a recursos insuficientes para suplir las necesidades básicas.
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	VILLAS DEL DIAMANTE.	GLORIA PRIETO CASTRO.	08-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en sótano habitación 2 y cocina. La beneficiaria informa que los días jueves labora por ende dejará carta de autorización para que esté al tanto Angie Marisol Bermúdez (hija) Marlín Bermúdez (cuñado)
4	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	VILLAS DEL DIAMANTE.	YORLANIS MARÍA MARRIAGA FUENTES.	8-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita no se incluyen hijos que conviven en la vivienda ya que están temporalmente y tiene núcleos independientes
5	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE.	ALBERTO ANDRÉS OROZCO BERMÚDEZ.	8-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita recibida por parte del cónyuge Jenny Marcela Bautista, quien refiere que realizará carta de autorización para familiar quien estará a cargo de las obras.

Jueves 09 de septiembre de 2021						
6	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	CLAUDIA MILENA MORENO DÍAZ.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) se le informa que dicha humedad está presente en el terreno. Se le manifiesta que para ciertas actividades se le solicitará consentimiento en la demolición de piso.
7	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	ROSALBA CHAVARRO PARRA.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción
8	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	VILLAS DEL DIAMANTE	GILMA TULIA RUIZ.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) se le informa que dicha humedad está presente en el terreno. Por ende, no se puede intervenir ciertas áreas que fueron contempladas por el presupuesto de la Caja de Vivienda Popular. Asimismo, se debe tener presente que en el momento de la socialización del

						presupuesto deben estar presentes los hijos ya que la señora es una persona mayor.
9	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	JOSÉ MANUEL CASTRO.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. El beneficiario refiere que dejará autorización para que nieta o pareja sentimental estén presentes en la ejecución de la obra, cuando no se encuentre dentro de la vivienda.
10	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	LUZ OLVEY MARTÍNEZ ARIAS.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita la beneficiaria realiza una petición respecto al presupuesto ya que desea realizar obras en la vivienda (estructura) Sin embargo, se le informa que estas deben ser desarrolladas antes de 20 días puesto que no puede haber obras simultáneas. Se establecen compromisos con la beneficiaria respecto a: Reforzar muro del lado de la cocina por el riesgo que presenta al no contar con una columna según el concepto técnico, cableado en las paredes e informar al profesional social respecto a los avances de obra para determinar las modificaciones en el presupuesto con antelación.

11	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	ISMAEL CRUZ FIERRO.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. El beneficiario se compromete a contar con una persona que esté al tanto de la ejecución de obra. Ya que refiere que no permanece en el predio por motivos laborales.
x	MVCB_5421	CL 70D SUR 19A 16	VILLAS EL DIAMANTE	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL	09/09/2021	La familia informa que el fallecimiento del beneficiario y sobre la persona que quedará a cargo del mejoramiento de vivienda en su representación. Residente social de contratista informa el proceso de gestión correspondiente y la documentación que debe presentar en este caso. No se realiza validación.|
12	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ	09/09/2021	El beneficiario manifestó dudas sobre la permanencia del grupo familiar durante la ejecución de obras, Residente Social de contratista entrega todas las recomendaciones sobre el proceso despejando las dudas presentadas.
13	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	09/09/2021	Hogar conformado por 6 personas se presenta una situación de discapacidad en la familia, se evidencia alta vulnerabilidad socio económico y hacinamiento. El beneficiario presenta una afectación en los ojos lo cual representa para él discapacidad para

						trabajar, los ingresos son altamente insuficientes y la infraestructura de la vivienda no es nada funcional lo cual incrementa su situación vulnerable. Se postula para historia de vida.
14	MVCB_5418	KR 18R 70C 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	09/09/2021	La situación socio económica del beneficiario es altamente vulnerable, la vivienda presenta una infraestructura que no permite en la vivista el diseño del mejoramiento para el caso, Contratista técnico solicitará un comité de revisión con SDHT para revisar y poder suplir las necesidades habitacionales del beneficiario.
15	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	VILLAS DEL DIAMANTE	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	09/09/2021	Se observa deterioro de la vivienda porque no ha sido posible realizar mejoramientos debido a recursos insuficientes.
16	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO	09/09/2021	Atiende la visita de validación la hija del beneficiario, por motivo de viaje, se evidencia la respectiva autorización escrita.
17	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA	09/09/2021	Se entrega a la beneficiaria la información correspondiente a la ejecución de las obras para que se tomen en cuenta las recomendaciones respectivas.
18	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	EMELINA PALACIOS MATEUS	09/09/2021	El hogar presenta jefatura femenina de adulto mayor, se evidencia alta vulnerabilidad económica y no cuentan con

						recursos suficientes para realizar mejoramientos en la vivienda.
19	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA	09/09/2021	Hogar compuesto por dos adultos mayores y su hija de 45 años, se evidencia alta vulnerabilidad económica y jefatura a cargo de dos mujeres.
20	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	VILLAS EL DIAMANTE	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO	09/09/2021	Quién atiende la visita es su hijo Henry Parada Gutiérrez. Hay carta de autorización para visita de validación. Autorizado firma a conformidad.
Viernes 10 de septiembre del 2021						
21	MVCB_1554	CALLE 70 I SUR N°18M -21	VILLAS EL DIAMANTE	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	VILLAS EL DIAMANTE	FLOR ELISA ORTIZ FORERO	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
23	MVCB_5521	CALLE 70 C SUR N°19C-06	VILLAS EL DIAMANTE	NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ RIAÑO	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto. Se evidencia beneficiario insistente en los temas de tiempos y presupuesto del predio
24	MVCB_1551	CRA 18 M N°70 I-24 SUR	NUEVA COLOMBIA	LORENA ÁVILA SUAREZ	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
25	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	NUTIVARA	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto. Se postula para Historia de vida.

26	MVCB_1834	CALLE 70 K SUR N°18 N-09	NUTIVRA	JOSÉ RAMIRO MATEUS MATEUS	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
27	MVCB_1762	CALLE70 K SUR N°18N-24	NUTIVARA	GILMA MARÍA GODOY DE NEIRA	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
28	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	VILLAS EL DIAMANTE	RODRIGO DELGADO	10/09/20121	Al realizar la visita se evidencia que el beneficiario realizó varios trabajos de mejoramiento en la vivienda haciendo necesario re plantear el presupuesto inicial y las áreas de intervención.
29	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	INES GALVIS CHAVEZ	10/09/2021	Se realiza la socialización de la información correspondiente por parte de los residentes sociales reiterando en las recomendaciones para que la familia se organice debido a que convive con ellos un recién nacido, para tomar las debidas precauciones.
30	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ	10/09/2021	Se realiza la socialización de las recomendaciones a tener en cuenta reiterando en la organización familiar al encontrarse en la vivienda una señora adulto mayor oxigeno dependiente. La visita es atendida por la hija del beneficiario con la respectiva autorización escrita.
X	MVCB_1605	CL 70G SUR 18N 44 MJ	MIRADOR (NUTIVARA)	BLANCA ACOSTA USECHE	10/09/2021	La visita permitió evidenciar que se encuentra deshabitada por sus propietarios. Hace un par de meses decidieron volver a ocupar el predio para lo

						cual solicitan unos días de plazo para realizar adecuaciones pendientes para el mejoramiento y para desocupar el acopio de materiales que se presenta en la casa. Se establecen fechas y compromisos de carácter técnico. No se realiza validación
31	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO	10/09/2021	El hogar presenta jefatura de adulto mayor con recursos insuficientes para suplir las necesidades básicas del hogar, su hija es la única aportante del recurso económico y no supera 1 SMMLV y otro adulto en edad productiva se encuentra en desempleo, se evidencia alta fragilidad socio económica.
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	NUTIVARA	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ	10/09/2021	La visita es atendida por el esposo de la beneficiaria debido a sus horarios de trabajo, el encargado presenta la debida autorización escrita y documentación.
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	VILLAS DEL DIAMANTE	MARÍA TERESA CHAVARRO PARRA.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se establecieron compromisos respecto a: Sistema de cableado, antes de inicio de obra en las siguientes áreas. (Sala, comedor, cocina). Se le informa que el piso en cocina y habitación (1). No cuenta con alistado.

34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	VILLAS DEL DIAMANTE	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en habitación 1 y 2 se le manifiesta que si estas áreas son intervenidas donde pernoctan dos hijas menores de edad de la beneficiaria puede que la humedad desaparezca por un tiempo pero puede volver a restablecerse además que se afectaría la garantía de la obra debido a los antecedentes de humedad de la vivienda.
35	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTÍNEZ.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en hall habitación 1 y 2. En visita se determinó con la beneficiaria que no desea la intervención en la cocina puesto que desea tener cocina integral, se le explicó que dicha actividad no está contemplada en el proyecto. El baño se encuentra en adecuadas condiciones estaría pendiente la instalación de puerta.
36	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE		10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación

				LUCRECIA LARIN LOZANO.		de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción
37	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. Se realizará por parte del beneficiario la carta de autorización de otros miembros de la familia para que estén atentos a las obras. Se recomienda a los beneficiarios el acompañamiento durante del proyecto a los funcionarios y personal debido al acceso al sector y la seguridad.
38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	VILLAS DEL DIAMANTE	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. Se realizará por parte del beneficiario la carta de autorización de otros miembros de la familia para que estén atentos a las obras.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Validación MVCB 5430 Carlos Ariel Saavedra Peñalosa.



Validación MVCB 5434 Alfonso García Garavito



MVCB_5249
Beneficiario: Gloria Prieto Castro




MVCB_5316
Beneficiario: Alberto Andrés Orozco.
Atiende visita esposa de beneficiario Jenny Marcela Bautista



MVCB_5345
Beneficiario: Yarlanis Marriago.

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
	
No se pudo realizar validación MVCB 5421 Víctor Julio Tapiero, porque no estaba documentación completa debido a que el beneficiario falleció.	No sé pudo realizar validación MVCB 5468 Flor Alba Simijaca debido a que no estaba la beneficiaria y no había autorización.
	
Validación de vivienda - MVCB -5411 - SILVESTRE ANTONIO FRANCO - se realiza validación y se firma a satisfacción por el beneficiario	MVCB 5414 Juan Carlos Caicedo. Validación realizada. Beneficiario firma a conformidad, en compañía de su esposa.
	
MVCB_5418 Idolfo Aguilar. Visita de Validación.	MVCB 5398 Willinton Guevara Huertas. Validación realizada. El beneficiario firma a conformidad
	
MVCB_5419 Martín Emilio Bermúdez, Visita de Validación, es atendida por hija del beneficiario con respectiva autorización escrita.	MVCB_5416 Esteohania Londoño Triana. Visita de Validación. Familia vulnerable con tres menores de edad.

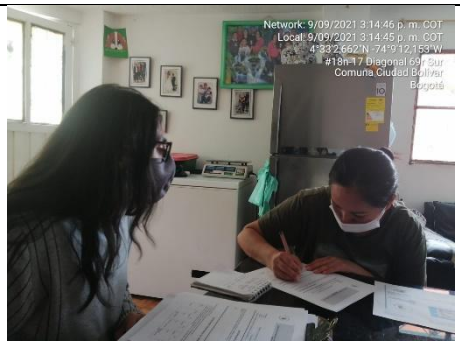	
MVCB_5451 Beatriz Sierra de Cepeda, Visita de Validación.	MVCB_5453 Emelina Palacios Mateus. Visita de Validación
	
MVCB_5279 CLAUDIA MILENA MORENO. Villas El Diamante. Se realiza validación y se firma documentación a conveniencia de la beneficiaria	MVCB_5281 ROSALBA CHAVARRO. Villas El Diamante, Se realiza validación y se firma documentación a conveniencia de la beneficiaria
	
MVCB_5325 GILMA TULIA RUIZ. Atiende hijo Nelson Bermúdez. Se realiza validación y se firma a conformidad	MVCB_5290. JOSE MANUEL CASTRO. Villas El Diamante. Se realiza validación y se firma documentación a conveniencia del beneficiario
	

MVCB_5322 LUZ OLVEY MARTÍNEZ. Se realiza validación, se levanta acta de compromiso ya que la beneficiaria desea realizar construcción antes de iniciar mejoramiento.	MVCB_5347 Validación ISMAEL CRUZ FIERRO.
	
MVCB 5407 Blanca Doris Gutiérrez, quién atiende la visita es su hijo Henry Parada Gutiérrez. Hay carta de autorización para visita de validación. Autorizado firma a conformidad.	
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
	
MVCB_1554 Se realiza validación. La visita fue atendida por el beneficiario, esposa e hija. El beneficiario: Segundo Misael Niño Gualteros quien firma a conformidad.	MVCB_5435 Se realiza validación. La visita es atendida por la beneficiaria. Flor Elisa Ortiz Forero. Quien firmada a conformidad.

	
MVCB_5521 Se realiza validación. La visita es atendida por el beneficiario: Nelson Enrique Rodríguez Riaño, quien firma a conformidad.	MVCB_1551 Se realiza validación. La visita es atendida por la beneficiaria: Lorena Ávila Suárez, quien firma a conformidad.
	
MVCB_1823 Se realiza validación. La visita es atendida por la beneficiaria: Candelaria Guerrero de Pardo, quien firma a conformidad.	MVCB_1834 Se realiza validación. La visita es atendida por el beneficiario: José Ramiro Mateus Mateus, quien firma a conformidad.
	

MVCB_1762 Se realiza validación. La visita es atendida por la beneficiaria: Gilma María Godoy de Neira, quien firma a conformidad.	Visita de validación social y técnica - MVCB - 5399- beneficiario RODRIGO DELGADO - se realiza proceso de validación - y se levanta acta social debido a que la vivienda se encuentra un 85% en total de la ejecución de la obra.
	
Visita de validación social y técnico - MVCB - 5488- se firma validación a satisfacción por la beneficiaria	Validación de obra y social -MVCB - 1612- la visita es atendida por la señora AMALIA CERQUERA - esposa del beneficiario, quien está por poder - se realiza validación y se firma a satisfacción.
	
No se realiza validación.MVCB 1605 al llegar a la vivienda la beneficiaria manifiesta que realizará intervenciones estructurales de una placa para el segundo piso. la parte técnica detiene proceso de validación y la beneficiaria pide 15 días para el proceso de construcción de estructura a realiza	Validación - MVCB - 1911- ser aluza validación y se firma a satisfacción por la beneficiaria
	

MVCB-1845- La visita es recibida por el señor Álvaro Sánchez quien está por poder y es esposo de la beneficiaria se firma y se realiza validación a satisfacción	MVCB_ 5202: Beneficiaria María Teresa Chavarro.
	
MVCB_5254 Beneficiaria: Jennifer Johanna Chavarro.	MVCB_5410 Beneficiaria: Rosa Delia Bernal de Martínez.
	
MVCB_5477 Beneficiaria: Lucrecia Lozano	MVCB_5392 Beneficiario: Antonio Arza Mosquera. Recibe visita la Sra. Yolanda Morales Medina (esposa).
	
MVBC_ 5406 Carlos Alberto Valencia Martínez.	

4. APERTURAS

No se realizaron aperturas durante la semana

APERTURAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**OBSERVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. ATENCIÓN PQR No se atendieron PQRS

PQR				
N.º	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA

6. ENTREGAS

No se realizaron entregas para esta ocasión

ENTREGAS DE OBRA						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**	**OBSEVACIONES**
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7. HISTORIAS DE VIDA

Durante el inicio de proceso de validación el equipo social del contrato, postuló a dos de los siguientes beneficiarios: MVCB_5414 Juan Carlos Caicedo Molina Y MVCB_1823 Candelaria Guerrero De Pardo, las cuales según área técnica y social tanto contratista e interventoría podrían participar en etapa de historias de vida.

8. ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

En esta primera semana de validaciones se presentaron algunas dificultades respecto a la ausencia de los expedientes para corroborar la información de la vivienda en cuanto a: El plano, las memorias, el presupuesto, el piso a intervenir por parte del área técnica. En cuanto al área social si, la persona tiene una tenencia de poseedor o propietario puesto que es indispensable la revisión de expedientes, con el fin que el proceso sea más diligente. Por otro lado, se observa un equipo organizado por parte del contratista no se han presentado dificultades para acceder a la vivienda y que se retrasen los procesos. Se evidencia que algunos números telefónicos están errados o en desuso debido a esto hemos visitado algunas viviendas sin confirmación previa. No han surgido preguntas respecto a la reunión de socialización con los beneficiarios, se observa en las casas

aspectos constructivos de origen como la humedad que afecta la intervención de las áreas y por ende se debe efectuar modificaciones en los presupuestos.

9. CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	5
Caracterizaciones	38
Aperturas	0
Cierres PQR	0
Entregas	0

10. PROGRAMACIÓN SEMANA SIGUIENTE

11. Se llevarán a cabo las visitas de validación correspondientes a la programación del contratista.
12. Se llevará a cabo la reunión de socialización de inicio en sector de Lomas, localidad Rafael Uribe- Uribe.
13. Se realizará recorrido para ubicar posible lugar para oficina del equipo técnico y social de interventoría.
14. Búsqueda de PAC de interventoría.

CONSTRUMARCA S.A.S.	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 3

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 DE 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA S.A.S.
PLAZO	6 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	7 DE MARZO DE 2022

INFORME SEMANAL DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) POR PARTE DEL CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO SEGÚN LA CIRCULAR 001 MV VALIDADOS

Reportar las medidas sanitarias y lineamientos técnicos para el trabajo seguro durante la emergencia nacional, control para la prevención y mitigación el contagio por COVID19, que promueve por medio de actividades de prevención de la salud del personal de CONSTRUMARCA S.A.S, para poder controlar la propagación del virus a nivel nacional como también a todo el personal como contratistas y del equipo de interventoría.

En los PAC de interventoría y del contratista se realiza la señalización y se instalan los puntos de desinfección para los visitantes y el personal administrativo tanto de la interventoría y del contratista.

Durante la semana el vehículo que se utiliza en los recurridos del territorio, el conductor realiza la desinfección a diario antes de empezar las actividades diarias.

Fase I.

Validación: El profesional social del contratista antes de ingresar a la vivienda, le hace entrega de un tapabocas desechable al beneficiario y las personas que se encuentran en la vivienda.

En el momento de la visita de validación, antes de realizar el ingreso a la vivienda se realiza la desinfección de la persona social, técnico y sst del contratista y de interventoría que va a ingresar al MV a realizar sus actividades correspondientes a la validación, el profesional social realiza la verificación de las carnes de la vacunación COVID y realiza el diligenciamiento del formato vacunas COVID y la documentación correspondiente a la validación.

MV VALIDADOS

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
4	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
5	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
6	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
7	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
8	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
9	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR


10	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
11	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
12	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
13	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
14	MVCB_5418	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
15	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
16	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
17	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
18	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
19	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
20	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
21	MVCB_1554	CALLE 70 I SUR N°18M -21	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
23	MVCB_5521	CALLE 70 C SUR N°19C-06	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
24	MVCB_1551	CRA 18 M N°70 I-24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
25	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR

26	MVCB_1834	CALLE 70 K SUR N°18 N-09	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
27	MVCB_1762	CALLE70 K SUR N°18N-24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
28	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
29	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
30	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
31	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
35	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
36	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
37	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR
38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Evidencia fotográfica de la gestión realizada del protocolo de bioseguridad durante el desarrollo de los mejoramientos vivienda por parte de interventoría y el contratista.

CONSTRUMARCA S.A.S	**INFORME SEMANAL PAPSO** **INTERVENTORIA**
	SEMANA 3

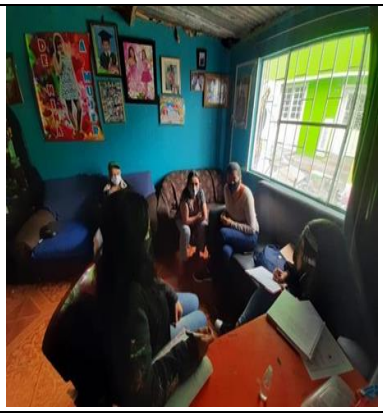Diligenciamiento del formato de vacunación covid	**Diligenciamiento del formato de vacunación covid**	**Diligenciamiento del formato de vacunación covid**
		
Diligenciamiento del formato de vacunación covid	**Diligenciamiento del formato de vacunación covid**	**Diligenciamiento del formato de vacunación covid**
		

Elaborado



Dalia Cárdenas
Profesional SST
Construmarca S.A.S

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830509427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$5.130.409.981
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$5.130.409.981
Plazo Inicial	5 MESES 15 DIAS
Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Actualizado	5 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	4 de febrero de 2022
Fecha de Terminación Actual	4 de febrero de 2022
No. de empleos generados	10

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$615.594.670
Valor Adicional 1	N.A
Valor Actualizado	$615.594.670
Plazo Inicial	6 MESES 15 DIAS
Plazo Prorroga 1	N.A
Plazo Actualizado	6 MESES 15 DIAS
Fecha de Iniciación	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación Inicial	7 marzo de 2022
Fecha de Terminación Actual	7 marzo de 2022
No. De empleos generados	11

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LINA MARIA SAZIPA MORENO (Escriba el nombre del Supervisor Hábitat)

2. AVANCES DEL CONTRATO

META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO

Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra 1-2021-39587 (Escriba el número del oficio radicado Hábitat) **de fecha** 23/09/2021 (dd-mm-aa)

A. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO VISITADOS DURANTE LA SEMANA SISO - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD COVID 19

No	ID DE LA VIVIENDA - MV	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD	Estado del MV	KIT DE PROTOCOLO Y SEGUIMIENTO A LO IMPLEMENTADO POR EL CONTRATISTA
1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
4	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
5	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
6	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
7	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
8	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
9	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
10	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
11	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
12	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
13	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
14	MVCB_5415	KR 19D SUR 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.

SEMANA No. 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

15	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
16	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
17	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
18	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
19	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
20	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
21	MVCB_1554	CALLE 70 I SUR N°18M -21	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
23	MVCB_5521	CALLE 70 C SUR N°19C-06	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
24	MVCB_1551	CRA 18 M N°70 I-24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
25	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
26	MVCB_1834	CALLE 70 K SUR N°18 N-09	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
27	MVCB_1762	CALLE70 K SUR N°18N-24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
28	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
29	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
30	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
31	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
35	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
36	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.
37	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CIUDAD BOLIVAR		Se hizo entrega de 2 unidades de tapabocas para los beneficiarios del programa.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFÍCO - KIT, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN









COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA
No se han generado residuos ni escombros	SEMANA		
	MES		
	PROYECTO		

COMPONENTE SST: Actividades Ejecutadas:

Contratista:

Semana 3.
Durante el periodo se iniciaron actividades de campo - fase I validación. Se realizó revisión de documentación del personal profesional y administrativo, el contratista ya cuenta con el Pac en el sector de Habitarte, está debidamente señalizado. En desarrollo de la fase de validación se hizo entrega de dos (02) tapabocas por vivienda, se está diligenciando formato de vacunación COVID.
Se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 2. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Durante la visita de seguimiento realizada por los profesionales de Secretaria Distrital del Hábitat se hace acompañamiento.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se incluyó la actualización del protocolo como actividad adicional, sin embargo, en aras de la protección ambiental y en vista que en lo corrido del proyecto se han presentado nuevas normas se propone que la actualización sea digital, mientras se trate de solo normatividad que no cambie la esencia del protocolo o haya un cambio radical en el mismo.

Interventoría:

Semana 3
Durante la semana se hace revisión de los informes correspondientes de la semana 2. También se hizo acompañamiento a las validaciones, verificando el cumplimento de los protocolos de ingreso, distanciamiento y uso de tapabocas de parte del contratista y del personal de interventoría, como los beneficiarios. Se actualiza la legislación del protocolo bioseguridad de la interventoría.

Durante la visita de seguimiento realizada por personal del Hábitat se hace acompañamiento.

Las actividades planeadas por el contratista se ejecutaron en su totalidad y se incluyó la actualización del protocolo como actividad adicional, sin embargo, en aras de la protección ambiental y en vista que en lo corrido del proyecto se han presentado nuevas normas se propone que la actualización sea digital, mientras se trate de solo normatividad que no cambie la esencia del protocolo o haya un cambio radical en el mismo.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Accidentes e incidentes:
Contratista: 0
Interventoría:0

PERSONAL MANO DE OBRA - HORAS HOMBRE TRABAJADAS

CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**0**	**CAPACITACONES REALIZADAS**	**0**	**PERSONAS INCAPACITADAS**		**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**	**0**	**CAPACIONES REALIZADAS**	**0**	**PERSONAS INCAPACITADAS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA		**11**	**TELETRABAJO**	**0**		**CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA**		**10**	**TELETRABAJO**	**0**	

DATOS	HORAS TRABAJADAS			HORAS CAPACITACION			AUSENTISMO											
	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS CONTRATISTA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA	HHT HORAS HOMBRE TRABAJADAS TOTAL	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN CONTRATISTA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN INTERVENTORIA	HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN TOTAL	DIAS AUSENTISMO ENFERMEDAD GENERAL		# CASOS COVID CONFIRMADOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS CONFIRMADOS		# CASOS COVID SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR COVID CASOS SOSPECHOSOS		DIAS AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL		DIAS TOTAL AUSENTISMO	
							CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT	CONT	INT
HHT SEMANA	1250	327	1577	1,00	0,25	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT MES	1250	327	1577	3,00	1,25	4,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HHT PROYECTO	1250	327	1577	5,00	2,25	7,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIOSEGURIDAD INDICADORES

Indicadores - Contratista		Indicadores - Interventoría	
a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %	a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100:	0,00 %
b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100	0,00 %
c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %	c. No. de teletrabajadores o en trabajo remoto / No. total de trabajadores * 100.	0,00 %
d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100.	100,00 %	d. No. de trabajadores en frentes de obra, trabajo de campo, oficinas y campamentos / No. total de trabajadores * 100	100,00 %
e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	100,00 %	e. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.	#¡DIV/0! %

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
El desarrollo de las actividades se viene realizando coordinadamente entre contratista y la interventoría; procurando cumplir con los protocolos y seguimientos semanales, a fin de reportar lo realizado en el punto PAC, trabajadores y hogares, según lo solicitado por la Secretaría Distrital del Hábitat.

RECOMENDACIONES: Cumplir con las responsabilidades contractuales y la legislación vigente y aplicable contractualmente.

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA
PROCESO
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT

SEMANA No. 3 (Consecutivo) **DEL** 4 de septiembre de 2021 (dd-mm-aa) **AL** 10 de septiembre 2021 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 798 de 2021 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 795 de 2021 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S **NIT** 900628905-1 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR CONSTRUMARCA S.A.S **NIT** 830509427-9

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ADICIONALES

INFORMACIÓN GENERAL	PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE VACUNACION COVID 19









DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES

6. ANEXOS

	SI	NO
1. Cronograma	x	
2. Registro Fotográfico		x
3.Anexo XXXXXXXX		x
4. Anexo XXXXXXXXX		x
5. Otro		

Cual?

Nota: Si lo requiere.

Se deja constancia que este informe fue remitido el **27-SEP-2021** al correo electrónico del profesional de apoyo técnico de la Secretaría Distrital del Hábitat

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los once de septiembre (Día en letras) 11/09/2021 (Día en números)

días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2021 (Año de firma del informe)

DALIA CARDENAS

(Nombre) Interventor a cargo

INFORME SEMANAL No. 3
AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 795 de 2021

OBJETO DEL PROYECTO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2021

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN 3

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 4

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

2.INFORME TÉCNICO 15

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA. 15

3.RECURSO HUMANO 20

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la secretaria Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe Uribe.

La empresa Ambientalmente ingeniería S.A.S, celebró el contrato No. 795 de 2021 cuyo objeto corresponde a **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021**

Durante este periodo se inició la primera fase de validación en los territorios de habitarte, jalisco y lomas.

A continuación, se realiza una descripción del avance de las actividades en cada una de las localidades y conciernen al período evaluado del 4 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 2021, correspondiente al informe técnico mensual No. 03.

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERISA S.A.S
NIT	900628905
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MANRIQUE PINZON
DATOS DE CONTACTO	administrativo@ambientalmente.com.co
N° CONTRATO	795-2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	5 meses y 15 días
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	20 agosto del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de febrero de 2021
FIRMA INTERVENTORA	Construmarca s.a.s
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.130.409,5

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el Supervisor.
3. Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.
4. Presentar al interventor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable), para la ejecución del contrato.

5. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción acta de inicio, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.
6. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.
7. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.
8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos.
9. Alimentar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.
10. Suministrar los equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.
11. Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
12. El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado de este.
13. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.
14. Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra.
15. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Común para cada grupo 20 la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.
16. Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.

17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a que haya lugar.
18. Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.
19. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.
20. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.
21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades. 22. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.
23. Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.
24. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
25. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.
26. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
27. Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.
28. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
29. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
30. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la SDHT, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.

31. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.

32. Dar estricto cumplimiento a la programación del mejoramiento, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión.
33. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 21 Supervisor, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.
34. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.
35. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.
36. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones.
37. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
38. Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda.
39. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo tecnico a cabalidad.
40. Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato

1.2 Descripción del proyecto

Para la ejecución de la obra en cumplimiento al objetivo general del proyecto se considera la implementación de tres fases:

Fase de validación: En la ejecución de esta fase programa y desarrolla una (1) reunión con los beneficiarios del proyecto de cada bloque de viviendas e informarlos del objetivo del contrato, los actores involucrados, los puntos de atención a la comunidad y los días y horarios de atención. Esto con el fin de resolver las expectativas e inquietudes de la comunidad y demás generalidades de las viviendas entregadas por la SDHT.

Durante esta primera fase, se realizará el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman cada uno de los bloques, así como, identificar las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Desde el componente técnico se realizará la validación del estado de cada vivienda que conforma el bloque. Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, se modificará el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la entidad estructuradora, de tal modo que se requerirá adelantar una validación de la información para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.

Dicho alcance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades:

- Realizarlas mediciones pertinentes.
- Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda.
- Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso.

Fase de ejecución de obras: Durante esta fase se procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, ejecutando las obras de acuerdo con los presupuestos de obra finales y sus especificaciones técnicas para cada una de las mismas.

Para seguimiento de la ejecución se realizarán actas de inicio de obra, de entrega y recibo a satisfacción por cada vivienda. Así mismo, se contará con una bitácora por vivienda, en donde se registrarán las actividades adelantadas desde el primer día de ejecución hasta su finalización, garantizando que en la misma se consignen los imprevistos y observaciones al respecto de la obra programada.

Las obras para ejecutar corresponden a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento de una vivienda.

Fase de cierre del proyecto: En esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada con recibido a satisfacción del beneficiario y la interventoría, de igual manera, concluir los diferentes procesos establecidos en el proyecto. Se entregará un informe final de ejecución de obras.

En cuanto al componente social, se presentará un *"informe de análisis"* de impacto social el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución.




Figura 1. Fases del proyecto

1.3 Localización del Proyecto

El contrato se ejecutará en los territorios de Habitarte- Ciudad Bolívar, Lomas-Rafael Uribe Uribe, Jalisco- Ciudad Bolívar y Bosa la libertad – Bosa-



Figura 2. Localidades de Bogotá.

1.4 Territorio de Habitarte – Ciudad Bolívar.

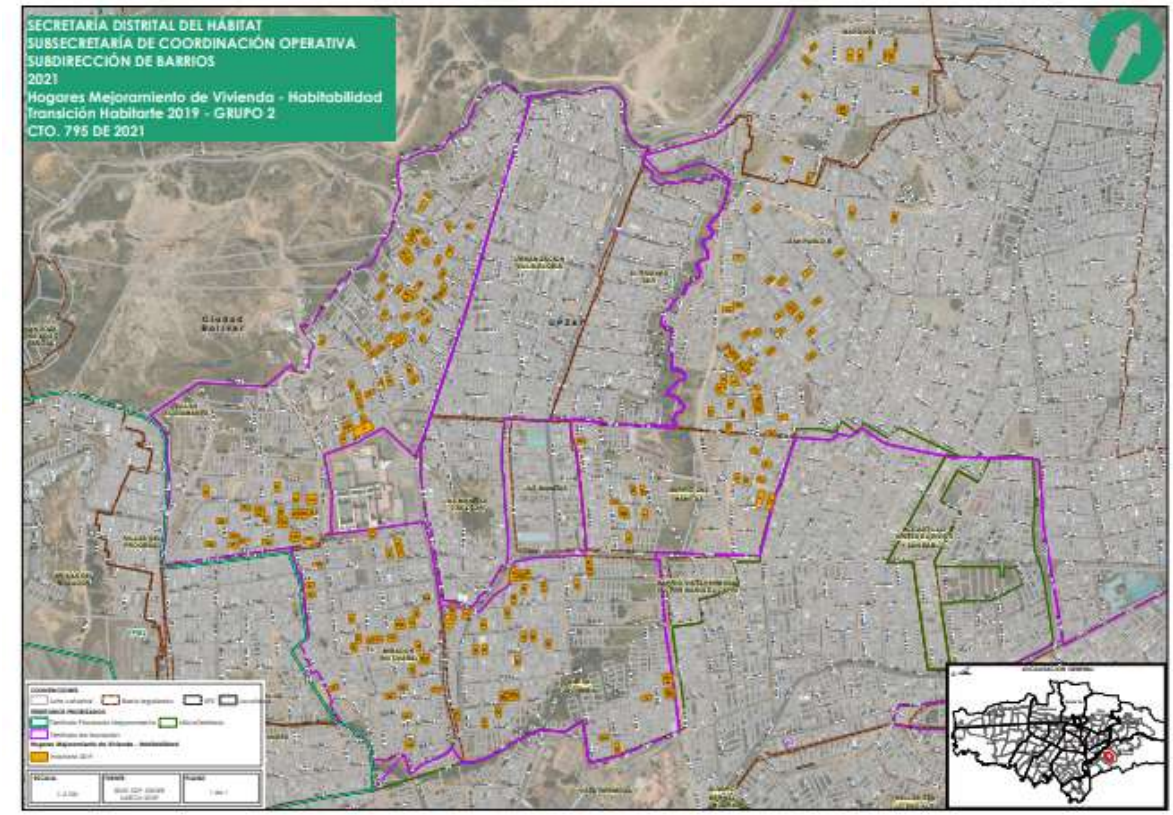


Figura 3. Plano de Habitarte – Ciudad Bolívar.

1.4.1 Territorio de Jalisco – Ciudad Bolívar.

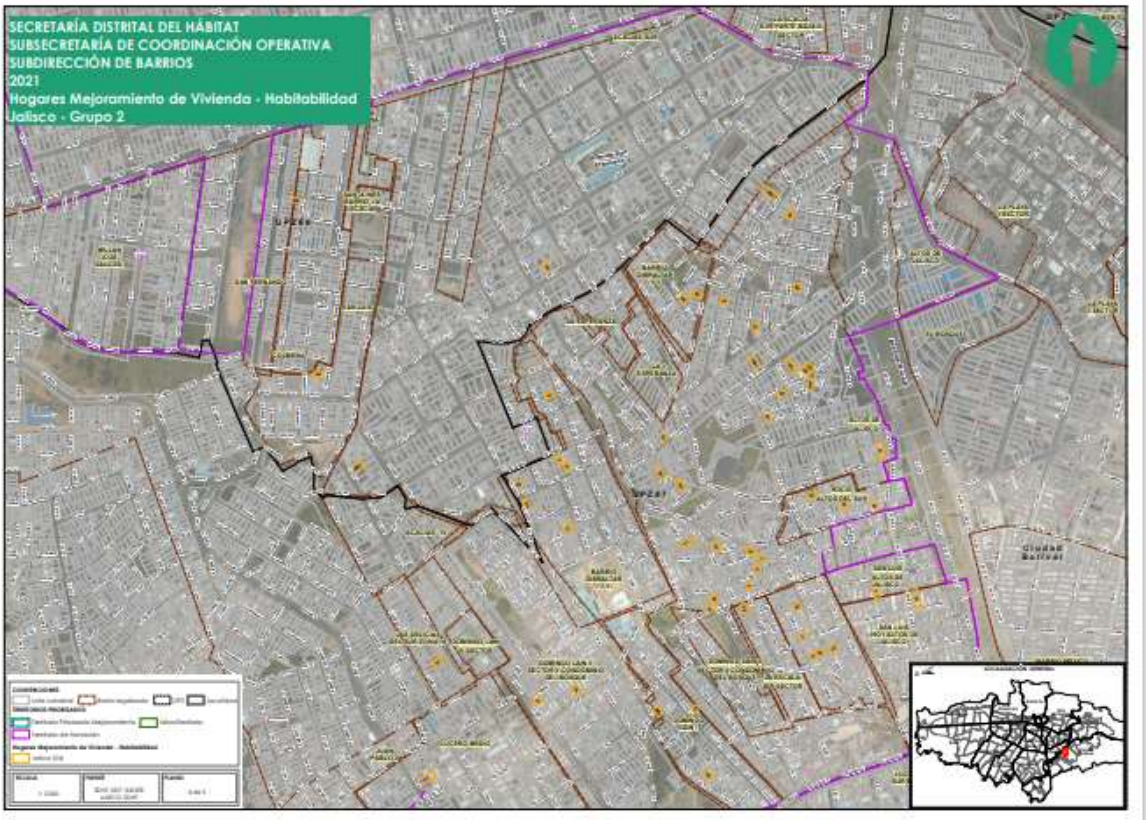


Figura 3. Plano de Jalisco – Ciudad Bolívar.

1.3.3 Territorio de Lomas – Rafael Uribe Uribe.

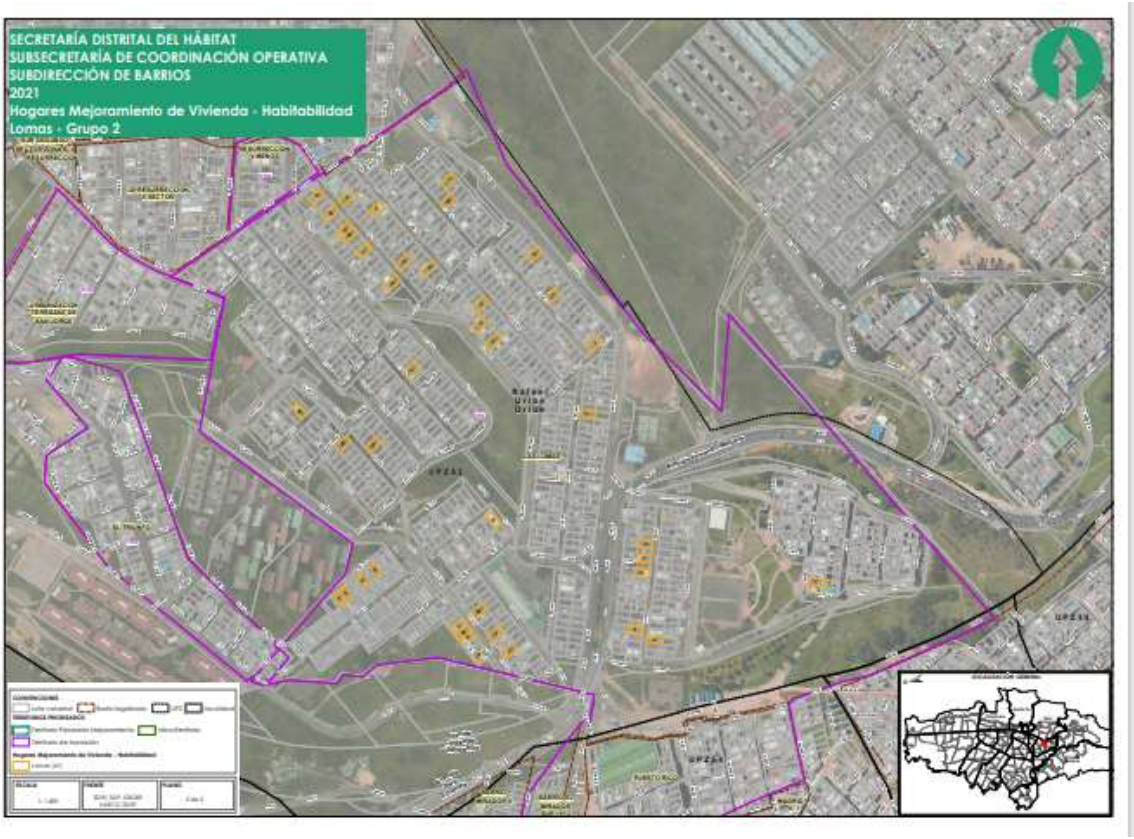


Figura 4. Plano de Lomas –Rafael Uribe Uribe

1.3.4 Territorio de Bosa la Libertad – Bosa.

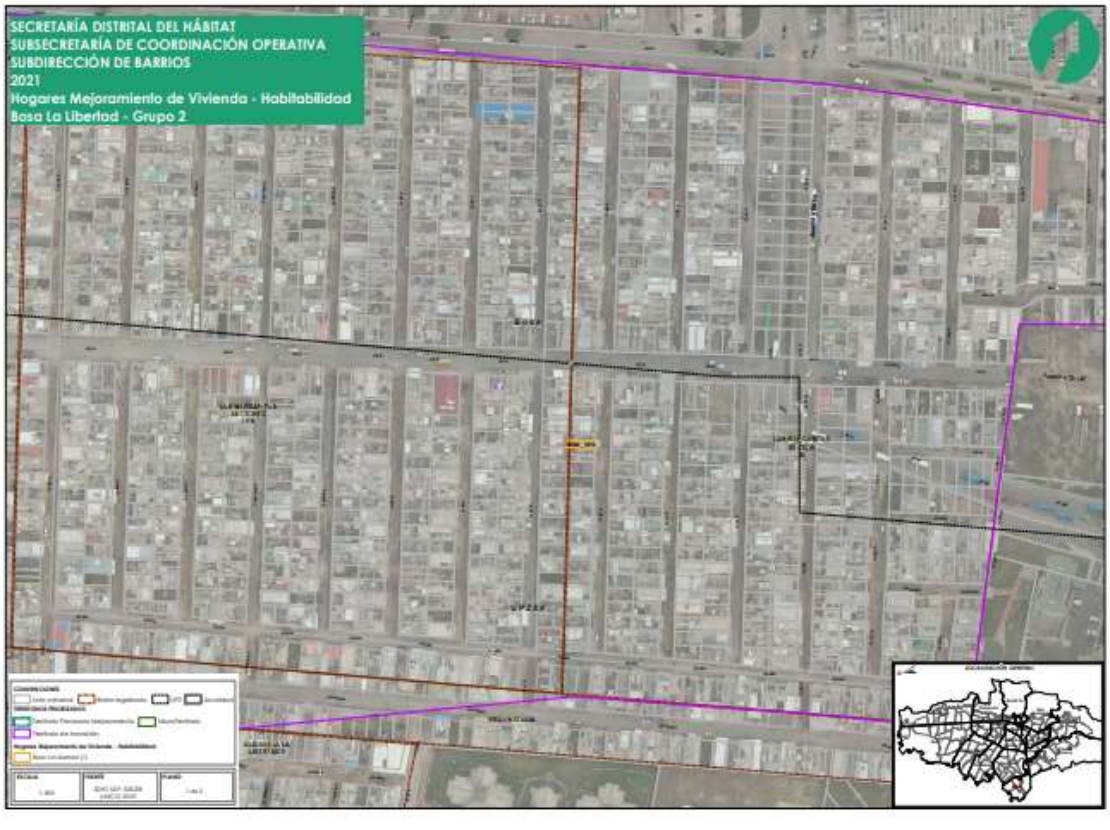


Figura 5. Plano de Bosa la libertad – Bosa.

2.INFORME TÉCNICO

2.1 Actividades realizadas hasta la fecha.

El programa de mejoramiento de vivienda coordinado por la subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat hizo entrega mediante Actas de Reunión debidamente suscritas, junto con los expedientes de los siguientes Mv:



Figura 6. Mapa de localidades con numero de viviendas.

Para dar inicio al proyecto se comenzó con la primera fase de validación, implementando las metodologías de trabajo, se realizaron 4 grupos de trabajos conformados por los siguientes:

- Residente Técnico
- Residente Social
- Residente subcontratista
- Residente Técnico Interventoría
- Residente Social Interventoría.

Esto con el fin de darle un orden al proyecto, se implementó esta metodología para que cada grupo de trabajo estén unidos desde la primera fase hasta el cierre del proyecto. Así puedan ponerse de acuerdo y responder todos por las viviendas asignadas.

Posterior a este proceso, primero los grupos se dirigieron a cada vivienda para corroborar los documentos que las familias ingresaron al momento de postularse para el beneficio que brindo la secretaria distrital del hábitat.

Luego que se realizó correctamente este proceso, los técnicos se encargaron de validar las viviendas de acuerdo con las mediciones del área a intervenir y las condiciones en la que se encontraba cada vivienda, teniendo en cuenta el costo asignado según el subsidio. También, el área social se encargó de recopilar la mayor información en formatos establecidos y se entregaron por vivienda tapabocas para seguir con el protocolo de bioseguridad.

Ahora están en proceso de realizar los respectivos presupuestos para entregárselos a interventoría y que sea para su aprobación.

2.2 Avance de la Validación.

Se hace un análisis de las viviendas intervenidas en la validación, para sacar cuantas viviendas están validadas y cuantas faltan por validar.

IDENTIFICACION MV/ FECHA DE VALIDACION	ESTADO	FECHA APERTURA	DIRECCION	BARRIO	NOMBRE	VALOR PRESUPUESTO
MVCB_5430	VALIDADO PRESUPUESTO	8/09/2021	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA	$ 12.240.676,70
MVCB_5434	VALIDADO PRESUPUESTO	8/09/2021	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO	$ 12.014.881,70

MVCB_5249	VALIDADO PRESUPUESTO	8/09/2021	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO	$ 11.737.165,30
MVCB_5316	VALIDADO PRESUPUESTO	8/09/2021	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ	$ 11.761.449,70
MVCB_5345	VALIDADO PRESUPUESTO	8/09/2021	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES	$ 10.392.470,40
MVCB_5418	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	$ 12.284.668,50
MVCB_5419	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO	$ 12.174.382,50
MVCB_5279	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ	$ 5.559.795,10
MVCB_5281	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA	$ 10.874.408,10
MVCB_5453	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS	$ 11.427.693,90
MVCB_5325	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ	$ 10.798.757,10
MVCB_5407	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO	$ 10.465.892,00

MVCB_5411	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ	$ 11.356.748,00
MVCB_5414	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	$ 10.862.035,00
MVCB_5290	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO	$ 11.846.571,00
MVCB_5322	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS	$ 11.420.439,30
MVCB_5347	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO	$ 9.965.867,00
MVCB_5398	VALIDADO PRESUPUESTO	9/09/2021	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	$ 11.612.619,80
MVCB_1762	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA	$ 11.973.094,92
MVCB_1823	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO	$ 11.984.141,35
MVCB_1834	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS	$ 11.774.728,89
MVCB_5202	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA	$ 9.600.990,50

MVCB_5254	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO	$ 6.462.024,40
MVCB_5435	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO	$ 12.137.568,20
MVCB_1551	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ	$ 11.834.205,90
MVCB_1554	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	$ 11.222.419,30
MVCB_5521	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO	$ 11.453.451,50
MVCB_5406	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ	$ 11.575.542,80
MVCB_5410	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	$ 11.840.690,90
MVCB_5399	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO	$ 11.007.311,00
MVCB_1612	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ	$ 11.590.846,00
MVCB_5477	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO	$ 11.912.177,30

MVCB_5392	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA	$ 10.690.152,59
MVCB_5488	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ	$ 12.009.310,90
MVCB_1845	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO	$ 12.009.310,90
MVCB_1911	VALIDADO PRESUPUESTO	10/09/2021	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ	$ 11.838.972,20

3.RECURSO HUMANO

Para la consecución de las actividades y avance del proyecto, se cuenta con el siguiente personal profesional revisado y aprobado por la interventoría:

MES DE SEPTIEMBRE

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	ESTADO
Coordinadora Social	Diana Loaiza Cantor	52.731.408	Aprobada
Profesional Social	Yessenia Gámez	1.120.745.285	Aprobada
Profesional Social	Pablo Chitiva	1.030.647.671	Aprobada
Profesional Social	Marguie Rincón	1.015.449.947	Aprobada
Profesional Social	Lina Colorado	1.019.022.812	Aprobada
Director de Obra	Carlos García	79.883.138	Aprobada
Residente de Obra	Ricardo Jaime	19.144.052	Aprobada
Residente de Obra	María Isabel Garzón	52.890.684	Aprobada

Residente de Obra	Horacio Triviño Gutiérrez	79.144.042	Aprobada
Residente de Obra	Julián Peña	1.013.624.438	Aprobada
Profesional sst	Giovanna Ibáñez	2787257	Aprobada

4. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADAS HASTA LA FECHA			
12	**COMUNICADO AMB-12-2021**	4-sep-21	Entrega programación de Validación.
13	**COMUNICADO AMB-13-2021**	4-sep-21	Respuesta radicada comunicado 798-2021G2-005-2021 corrección hojas de vida.
14	**COMUNICADO AMB-14-2021**	6-sep-21	Entrega seguridad social de los profesionales
15	**COMUNICADO AMB-15-2021**	7-sep-21	Notificación cambio de material.
16	**COMUNICADO AMB-16-2021**	9-sep-21	Entrega de personal provisional de la empresa Ambientalmente Ingeniería S.A.S
17	**COMUNICADO AMB-17-2021**	9-sep-21	Entrega de programación actualizada

5. CONCLUSION


Durante todo el proceso de validaciones se logró identificar 36 viviendas las cuales fueron validadas a satisfacción, donde los técnicos pudieron medir correctamente las áreas intervenidas e identificar cada una de las actividades, saber la cantidad de materiales de las viviendas, la parte sst logro entregar los tapabocas en cada validación por vivienda y pudo llenar todos los formatos requeridos por la entidad y por ultimo los sociales llegaron a conocer la necesidad de cada una de estas viviendas y de sus habitantes, en cada visita se identificó los mayores inconvenientes estructurales con los que cuentan las familias pertenecientes al mejoramiento de vivienda identificando en cada una de ellas sus fortalezas y debilidades enmarcadas en la pobreza y la falta de apoyo por parte del estado.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


Se relacionaron actividades relevantes realizadas en los bloques en este periodo.


16/09/2021 10:19:18 a. m.
-140° SE
#CONSTRUMARCA
#MVCB_2644
Número de índice: 22


4°32'55"N -74°9'11"W
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 16/09/2021 11:13:13 a. m. COT
Local: 16/09/2021 11:13:10 a. m. COT

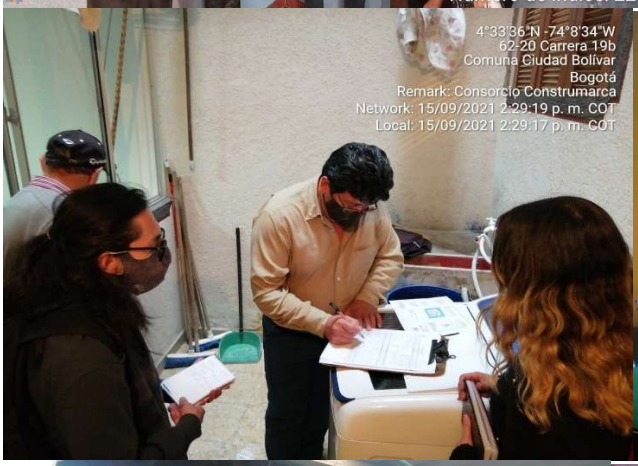
4°33'36"N -74°8'34"W
62-20 Carrera 19b
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 2:29:19 p. m. COT
Local: 15/09/2021 2:29:17 p. m. COT


15 de septiembre de 2021 1:03 p. m.

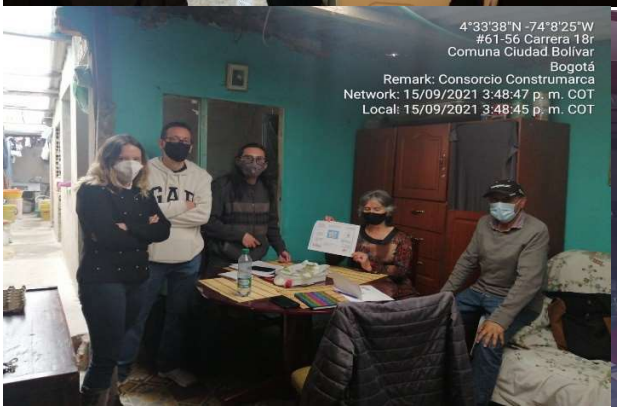
4°33'38"N -74°8'25"W
#61-56 Carrera 18r
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 3:48:47 p. m. COT
Local: 15/09/2021 3:48:45 p. m. COT

