INFORME PARCIAL No.1

NÚMERO DE CONTRATO: G-38-2021	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 13 de octubre de 2021
CONTRATISTA:	**SUPERVISOR:**
NOMBRE: OBCELC S.A.S - NIT No. 804.007.343-1. **REPRESENTANTE LEGAL:** WILLIAM COBOS MESA **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 13'541.674 **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** BUCARAMANGA **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3177969486 - 3186388752	**NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0312 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021. **APOYO A SUPERVISION** HERMES SUÁREZ CABALLERO

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DE IDESAN, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301) RUTA 6602 HASTA LA CARRERA 27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (PR 78+640). (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 O PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 16+300 DE LA RUTA 45 AST 08). (INCLUYE RETORNOS).

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante las fechas 19 de octubre de 2021 al 18 de noviembre 2021 son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD CODIGO 636		**ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**					
PR							
INICIAL	FINAL	ANCHO PROMEDIO [m]	CANTIDAD [m2]	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 71+301	PR 78+640	4	29356	5	5.871	100%	Roceria de gran altura.
PR 10+100	PR 15+000	4	19600	5	3.920	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 340				**LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS**					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 71+301	PR 78+640	2	2	7339	6602	5	1467,8	100%	
PR 10+100	PR 15+000	1,8	1,8	4900	45A ST 08	5	980	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 425				**LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA**					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	VIA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 71+301	PR 78+640	1,5	1,5	7339	6602	5	1467,8	100%	Cunetas colmatadas.
PR 10+100	PR 15+000	1,5	1,5	4900	45A ST 08	5	980	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 625				**LIMPIEZA DE CALZADA. (No se incluyemaquinaria)**					
PR		DIMENSIONES			UNIDAD	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	LONG	ANCHO	AREA					
PR 71+301	PR 78+640	7339	7,5	55042,5	M2	5	11008,5	100%	En los recorridos rutinarios, se despejan la calzada de todo tipo de obstaculos como, rocas, ramas, etc.
PR 10+100	PR 15+000	4900	7,5	36750	M2	5	7350	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 639					**PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES**				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO und/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 71+301	PR 78+640	8	X	X	6602	1	8	100%	Se realiza despeje de señales para su clara visualización por parte del usuario de la via.
PR 10+100	PR 15+000	11	X	X	45A ST 08	1	11	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 678					**LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES**				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 71+301	PR 78+640	185	x	x	6602	2	92,5	100%	Se evidencia que muchas de estas señales están en mal estado y requieren cambio.
PR 10+100	PR 15+000	127	x	x	45A ST 08	2	63,5	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 694				**VIGILANCIA**				
PR		UND	CANTIDAD	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO km/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL							
PR 71+301	PR 78+640	km	7,339	6602	2	3,6695	100%	Sin novedad a

CONCLUSIONES:

1. Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de vía para mejorar la seguridad y el confort del usuario vial, mientras transite por esta. Las actividades adelantadas que se destacan son:
- Rocería y desmonte con la intención controlar la vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad.
- Poda, corte y/o retiro de árboles, despejando las señales de tránsito en la ruta.
- Limpieza de bermas y cunetas, eliminando tierra, basura u otros obstáculos encontrados.


2. Durante el control de vigilancia realizado a la vía en mantenimiento no se destaca novedad importante a mencionar.


RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la entidad encargada, gestionar el retiro del material vegetal y escombros productos de las actividades realizadas, ya que este material mencionado constituye abono que agilizará el crecimiento de los pastos y estéticamente no da los resultados esperados.

ANEXOS



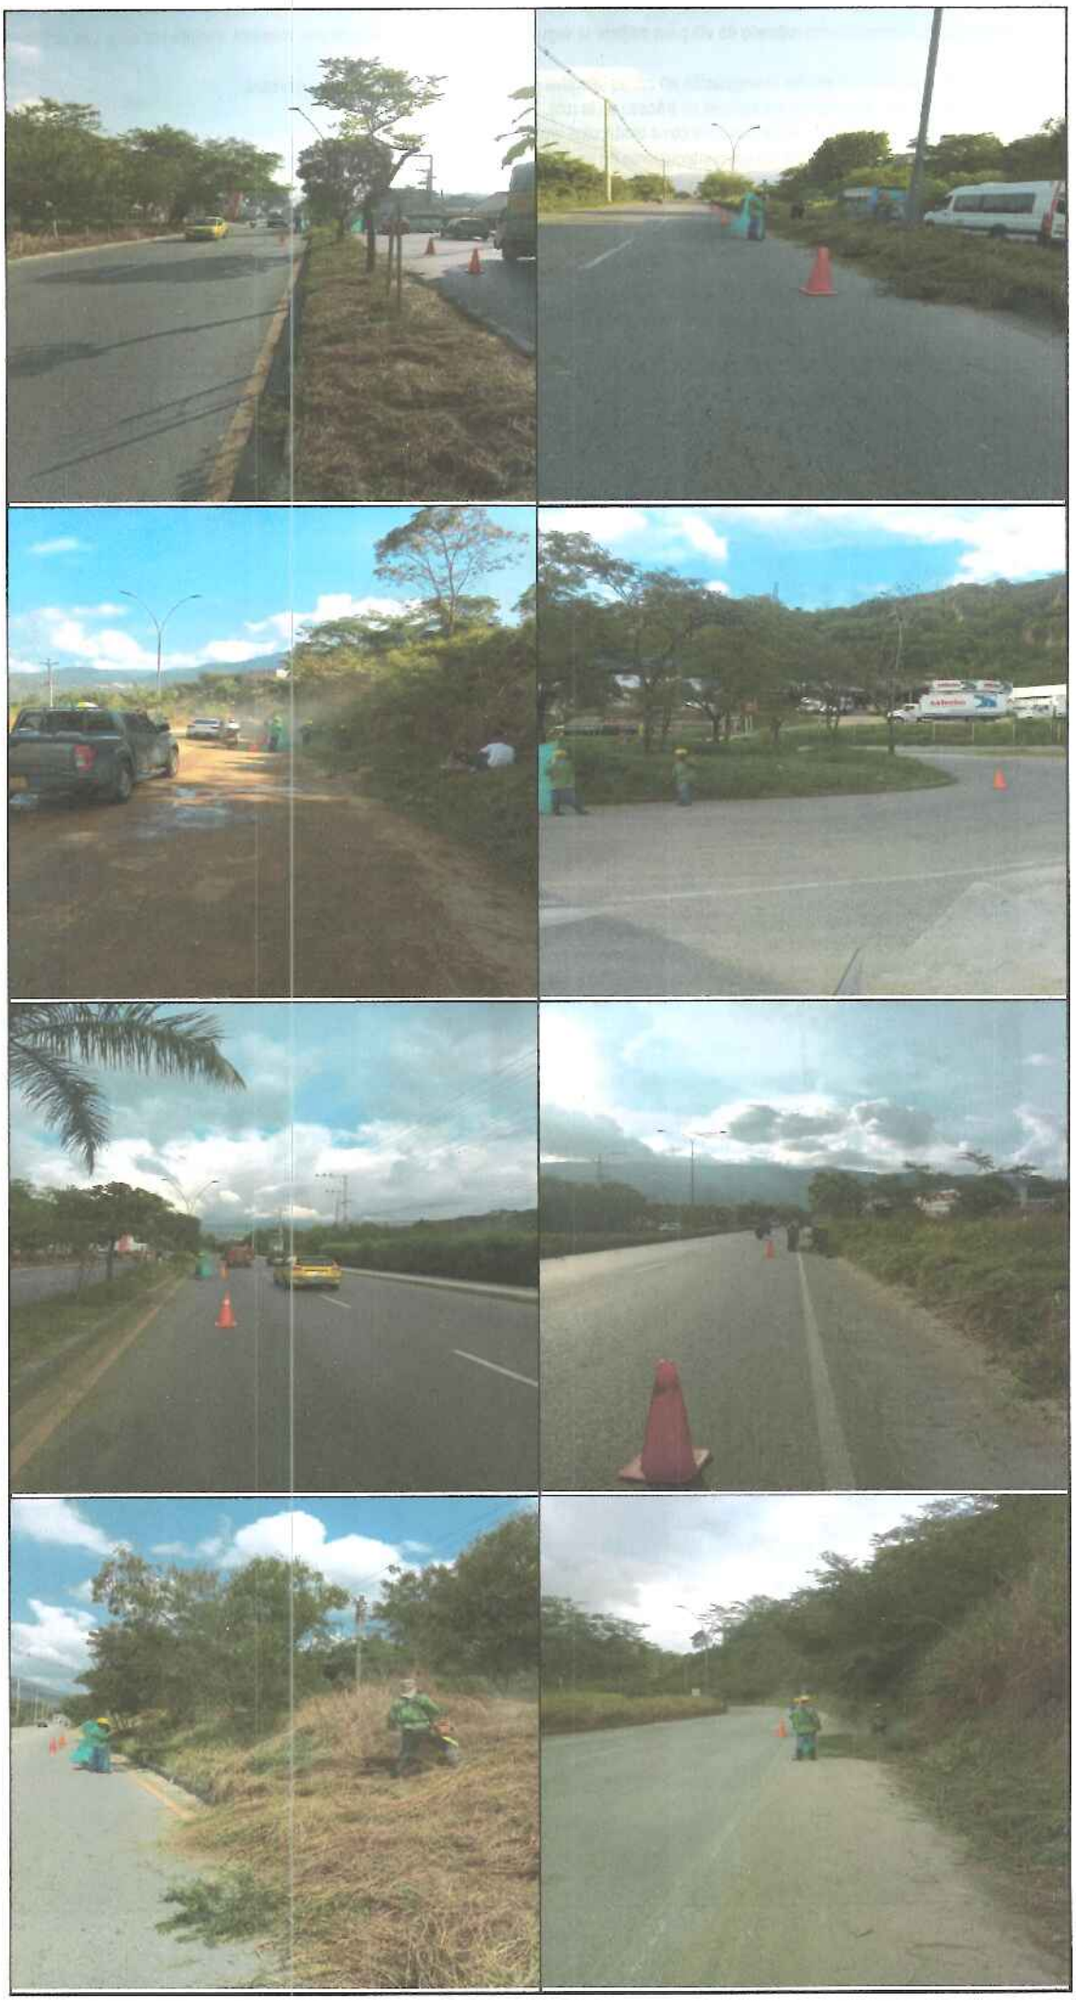

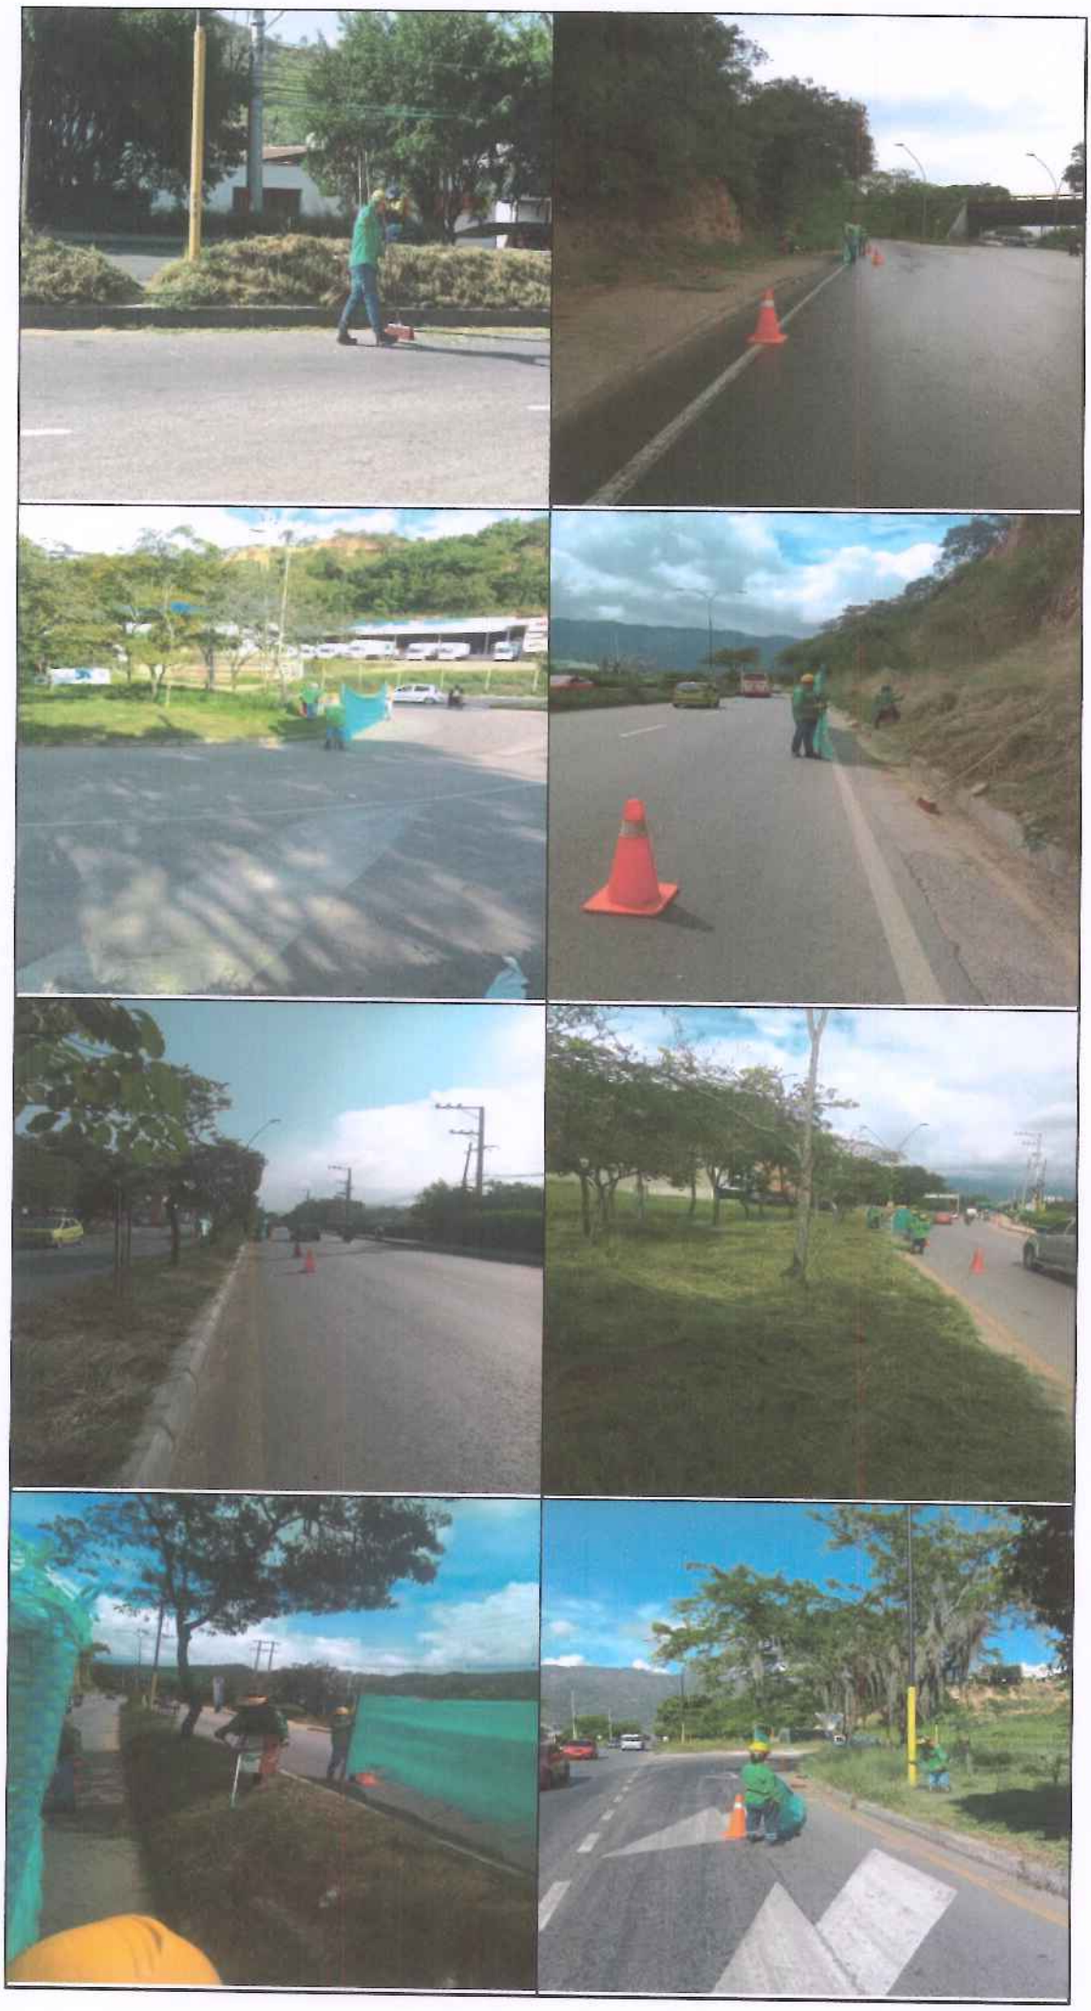



Nota: Registro fotográfico del 71+3017 al PR 78+640 de la vía 6602;y del PR 10+100 al PR 15+000 de la vía 45A ST 08

Se firma en Bucaramanga a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021.

ING. HERMES SUAREZ CABALLERO
APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: WILLIAM COBOS MEZA
Contratista: OBCELC S.A.S
